FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL**			**FECHA:**	20/07/2024
Semana No	**7**	**Del :**	14/07/2024	AL:	20/07/2024
Plazo Total		558	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		45	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		8,06%			
Nombre del Supervisor :		Gisell Sanchez Pastrana			

OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPUERTARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,44%**	**8,26%**	**(%) Ejecutado**	**1,11%**	**3,49%**
Valor programado ($)	**$ 28.749.600,94**	**$ 164.910.905,37**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 22.161.150,72**	**$ 69.677.852,27**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-4,77%**
				Valor Adelanto	**-$ 95.233.053,10**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	ABILE SAS	**Contratista:**	CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024
Contrato No:	23001186 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001301 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 1.996.500.065	**Valor Inicial:**	$ 1.117.574.559
Valor Actualizado al modificatorio :	NA	**Valor Actualizado al modificatorio :**	NA
Valor actualizado 2:	NA	**Valor actualizado 2:**	NA
Plazo inicial:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Plazo inicial:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	NA	**Plazo actualizado:**	NA
Fecha de iniciación:	5-jun-24	**Fecha de iniciación:**	5-jun-24
Fecha de vencimiento:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Fecha de vencimiento:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	NA	**Modificatorio No. Prórroga No.**	NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	NA
Suspensión No.	NA	**Suspensión No.**	NA
Periodo de Suspensión No.	NA	**Periodo de Suspensión No.**	NA
Levantamiento de la suspensión No.	NA	**Levantamiento de la suspensión No.**	NA
Nueva fecha de terminación	NA	**Nueva fecha de terminación**	NA
Valor total actual del contrato	$ 1.996.500.065	**Valor total actual del contrato**	$ 1.117.574.559

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El 18 de julio se realiza comité virtual con participación de supervisió, interventoría y contratista de obra, se resalta la imporancia de entregar informe mensual y semanales, se requiere la radicación de plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos de los documentos del contrato.

OBRAS LADO TIERRA

Se realiza instalación de pintura de blanca en sala de juntas, en zona de baño de sala de espera, en sala de abordaje, en sala de llegadas.
Se realiza limpieza de cubierta con el uso de hidrolavadora.
Se realiza rocería con guadaña en zonas verdes paralelas a via de acceso.
Se realiza limpieza de juntas de vía de entrada principal.

AVANCE DE OBRA
Retiro de canoa de aguas lluvias en zona de salida a plataforma.
Aplicación de Pintura vinilo en paredes sala de juntas, zona de baños, sala de llegadas y sala de abordaje.
Mantenimiento de zonas verdes


FINANCIERO:
A la fecha no se han generado pagos parciales.

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas: Se realiza el decuado acopio de residuos de contrucción.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Sin actividades.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**4**
Personal del Contratista	**7**
Total Personal en Obra	**11**

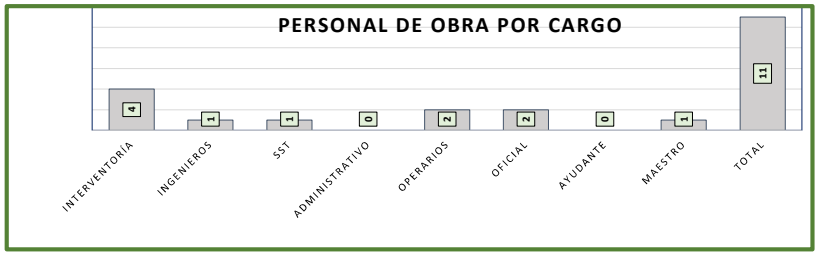

En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 2



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORA		1	
ESCALERA		1	
ANDAMIOS		3	
HIDROLAVADORA		1	
Total Maquinaria		6	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1			Valor Total Contrato Obra
2			$ 1.996.500.065,00
3			Valor facturado Contrato Obra
4			$ 0,00
5			% Avance facturado Acumulado
6			0,00%
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Total Acumulado			

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoria No.				
1			Valor Total Contrato interventoria	
2			$ 1.117.574.559,00	
3			Valor facturado Contrato Interventoria	
4			$ 0,00	
5			% Avance facturado Acumulado	
6			0,00%	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Acumulado				

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se requiere la entrega de documentación como informes semanales, mensual y diagnostico y plan de trabajo. Se envía solicitud de multa a la Aerocivil, por incumplimiento de entrega de plan de trabajo.	ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ
