
Cubingecol

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo
1		**CONTRATO GGC-067-2024 ADECUACIÓN OFICINA DE MASCOTAS EN EL AEROPUERTO EL DORADO Y MANTENIMIENTO CITAG EN EL AEROPUERTO EL DORADO.**	**90 días**	**jue 26/09/24**	**mié 25/12/24**	**3%**	**$ 218.553.316,94**
2		Acta de Inicio	0 días	jue 26/09/24	jue 26/09/24	100%	$ 0,00
3		Radicación y aprobación de documentación OPAIN	8 días	jue 26/09/24	vie 4/10/24	86%	$ 0,00
4		Carnetización cuadrilla de trabajo	4 días	vie 4/10/24	mar 8/10/24	0%	$ 0,00
5		**ADECUACIÓN OFICINA DE MASCOTAS EN EL AEROPUERTO EL DORADO**	**26 días**	**mar 8/10/24**	**dom 3/11/24**	**0%**	**$ 36.497.109,83**
6		**PRELIMINARES**	**4 días**	**mar 8/10/24**	**sáb 12/10/24**	**0%**	**$ 490.408,97**
7		Demolición manual de guardaescobas. Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	0%	$ 24.592,00
8		Demolición manual de muro para ducto de ventilación.	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	0%	$ 7.222,00
9		Desmonte de grifería.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	0%	$ 23.196,00
10		Desmonte de lavamanos.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	0%	$ 23.012,00
11		Desmonte de piso en vinisol.Incluye retiro al botadero autorizado	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	0%	$ 19.195,00
12		Desmonte de puerta en vidrio templado.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	0%	$ 188.696,97
13		Desmonte de puerto de trabajo.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables	1 día	vie 11/10/24	sáb 12/10/24	0%	$ 106.530,00
14		Regata en piso para tubería (incl. mortero de resane).Incluye retiro al botadero autorizado. Área de residuos.	1 día	vie 11/10/24	sáb 12/10/24	0%	$ 97.965,00
15		**MUROS**	**5 días**	**sáb 12/10/24**	**jue 17/10/24**	**0%**	**$ 3.268.310,00**
16		Suministro e instalación de muro superboard 8mm doble cara E=12, con reforzamiento en madera en apoyos superiores, medios e inferiores para el apoyo y soporte de puertas.	3 días	sáb 12/10/24	mar 15/10/24	0%	$ 3.073.948,50
17		Suministro e instalación de dinteles superboard 8mm doble cara E=12, con reforzamiento en madera en apoyos superiores, medios e inferiores para el apoyo y soporte de puertas.	1 día	mar 15/10/24	mié 16/10/24	0%	$ 180.820,50
18		Filos y cinta para rejilla de ventilación de área de residuos.	1 día	mié 16/10/24	jue 17/10/24	0%	$ 13.541,00
19		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**2 días**	**jue 17/10/24**	**sáb 19/10/24**	**0%**	**$ 239.827,00**
20		Suministro e instalación de traslado de Punto sanitario pvc de 2" (3 m). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación para el área de residuos.	1 día	jue 17/10/24	vie 18/10/24	0%	$ 123.211,00
21		Suministro e instalación de Sifón sanitario pvc de 2". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación para el área de residuos.	1 día	vie 18/10/24	sáb 19/10/24	0%	$ 116.616,00
22		**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	**1 día**	**vie 18/10/24**	**sáb 19/10/24**	**0%**	**$ 132.299,00**
23		Suministro e instalación. Punto hidráulico cpvc de 1/2" (3 m). Incluye llave dentro de muro y caja de inspección.	1 día	vie 18/10/24	sáb 19/10/24	0%	$ 132.299,00
24		**PISOS**	**3 días**	**sáb 19/10/24**	**mar 22/10/24**	**0%**	**$ 1.267.970,02**
25		Suministro e instalación de Guardaescoba en vinisol h= 6,8 cm. Incluye todos los accesorios necesario para su correcta instalación. El color debe ser similar o igual al instalado.	1 día	dom 20/10/24	lun 21/10/24	0%	$ 698.294,52
26		Suministro e instalación de Piso en vinisol de 2 mm de 30x30 cm. Incluye todos los accesorios necesario para su correcta instalación. El color debe ser similar o igual al instalado.	1 día	sáb 19/10/24	dom 20/10/24	0%	$ 558.883,50
27		Suministro e instalación de Rejilla para piso en pvc 3"x2". Para área de residuos	1 día	lun 21/10/24	mar 22/10/24	0%	$ 10.792,00
28		**ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**1 día**	**jue 17/10/24**	**vie 18/10/24**	**0%**	**$ 95.270,00**
29		Suministro e instalación de Rejilla ventilación celosía en aluminio 30x30 cm en muro para área de residuos.	1 día	jue 17/10/24	vie 18/10/24	0%	$ 95.270,00
30		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**5 días**	**sáb 12/10/24**	**jue 17/10/24**	**0%**	**$ 746.750,00**
31		Suministro e instalación Puerta cold rolled con diseño liso lámina Cal. 20, 0.90 x 2.05 m (incl pintura gris).Acabado prime anti corrosión. Incluye manija tipo pesado, refuerzo de bisagra calibre 7	5 días	sáb 12/10/24	jue 17/10/24	0%	$ 746.750,00
32		**PINTURA**	**11 días**	**vie 18/10/24**	**mar 29/10/24**	**0%**	**$ 16.328.211,27**
33		Suministro y aplicación de estuco plástico en muros.Incluye resanes, filos y dilataciones	2 días	vie 18/10/24	dom 20/10/24	0%	$ 668.588,67
34		Suministro y aplicación de pintura epoxica en muros.Incluye resanos filos y dilataciones. Tipo pintuco y/o similar.	2 días	dom 20/10/24	mar 22/10/24	0%	$ 8.645.445,90
35		Suministro y aplicación de pintura epoxica en cieloraso.Incluye resanos filos y dilataciones. Tipo pintuco y/o similar.	2 días	mar 22/10/24	jue 24/10/24	0%	$ 1.332.129,50
36		Suministro y aplicación de pintura koraza exterior para fachadas color blanco.Incluye resanos filos y dilataciones. Tipo pintuco y/o similar.	3 días	jue 24/10/24	dom 27/10/24	0%	$ 3.906.407,45
37		Suministro y aplicación de pintura koraza exterior para fachadas color gris zócalo.Incluye resanos filos y dilataciones. Tipo pintuco y/o similar.	2 días	dom 27/10/24	mar 29/10/24	0%	$ 1.775.639,75
38		**VARIOS**	**19 días**	**mar 15/10/24**	**dom 3/11/24**	**0%**	**$ 11.749.006,07**
39		Limpieza y aseo general de todas las áreas intervenidas	1 día	vie 1/11/24	sáb 2/11/24	0%	$ 856.866,40
40		Suministro e instalación de aviso tipo caja, estructura metálica y banner con impresión en alta resolución. Marco metálico color gris plata y/o similar, pintados con imprimación anticorrosiva+pintura acabado.Acrílico frontal translúcido.	2 días	mar 15/10/24	jue 17/10/24	0%	$ 4.567.002,00
41		Cargue manual y retiro de escombros volqueta 7m3.Incluye certificado a la escombrera autorizada. Incluye certificados.	1 día	sáb 2/11/24	dom 3/11/24	0%	$ 1.849.519,00
42		Suministro, transporte e instalación de señalización corporativa en acrílico,20mx0,10 y/o similar,el diseño dependerá de las necesidades y requerimientos de la Entidad.Deberá estar fijado con tornillos y/o pines.	3 días	jue 17/10/24	dom 20/10/24	0%	$ 467.343,00
43		Suministro e Instalación de película frost con impresión de diseño, la película deberá ir con el corte del logo ICA, el diseño dependerá de las necesidades y requerimientos de la Entidad.	3 días	mar 29/10/24	vie 1/11/24	0%	$ 476.528,64
44		Suministro e instalación Aviso ICA en acero en acrílico con vinilo dorado instalado con topes transparentes a 3cm . Medidas 1.40x0.60 aprox.el diseño dependerá de las necesidades y requerimientos de la Entidad	3 días	dom 20/10/24	mié 23/10/24	0%	$ 355.704,30
45		Suministro e instalación de vinilo sobre pared con impresión de diseño con una altura h:0.90, la longitud depende de la pared, el diseño dependerá de las necesidades y requerimientos de la Entidad	3 días	mar 29/10/24	vie 1/11/24	0%	$ 1.783.994,73
46		Suministro e instalación Mesón acero inoxidable ancho:0.60m longhud:1.20m altura:0.90m. Incluye soportes inferiores. Salpicadero 0.07m, espesor 0.05m	3 días	dom 20/10/24	mié 23/10/24	0%	$ 1.392.048,00
47		**MUEBLES**	**5 días**	**lun 21/10/24**	**sáb 26/10/24**	**0%**	**$ 2.179.057,50**
48		Suministro, transporte e instalación MUEBLE DE COCINA EN FÓRMICA DE 1.50 M PARA EL MODULO INFERIOR contiene: Mueble inferior de cocina de 1.50 m fabricado en tablero aglomerado MDP resistente a la humedad de 15mm de espesor, estructura interna en color bl	5 días	lun 21/10/24	sáb 26/10/24	0%	$ 1.044.657,00
49		Suministro e Instalación Mesón en quarztone statuario extra blanco polar y/o similar 20mm de espesor y brillado,ancho:0.60m, longitud:1.50m Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación en mueble de cocina.	5 días	lun 21/10/24	sáb 26/10/24	0%	$ 1.134.400,50
50		**MANTENMIENTO CITAG EN EL AEROPUERTO EL DORADO**	**52 días**	**dom 3/11/24**	**mié 25/12/24**	**0%**	**$ 182.056.207,11**
51		**PRELIMINARES**	**14 días**	**dom 3/11/24**	**dom 17/11/24**	**0%**	**$ 4.987.846,76**
52		Cargue manual y retiro de escombros volqueta 7m3.Incluye certificado a la escombrera autorizada. Incluye certificados.	1 día	dom 3/11/24	lun 4/11/24	0%	$ 360.255,00
53		Desmonte de cielo raso, incluye estructura y demás elementos que componen el cieloraso. Incluye retiro al botadero autorizado.	2 días	dom 3/11/24	mar 5/11/24	0%	$ 277.764,96
54		Desmonte y reinstalación de detectores en área de baños.	2 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	0%	$ 38.232,00
55		Desmonte de flanche en lámina. Incluye retiro al botadero autorizado.	1 día	lun 4/11/24	mar 5/11/24	0%	$ 137.800,00
56		Desmonte de grifería.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacen de los elementos reutilizables	1 día	lun 4/11/24	mar 5/11/24	0%	$ 23.196,00
57		Desmonte de lámpara hermética.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacen de los elementos reutilizables.	2 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	0%	$ 109.428,00
58		Desmonte de avisos fachada. Incluye retiro de sobrantes y/o entrega a almacen de los elementos reutilizables	2 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	0%	$ 279.856,00
59		Desmonte de luminarias tipo campana ubicadas en el establo.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacen de los elementos reutilizables	2 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	0%	$ 382.956,00

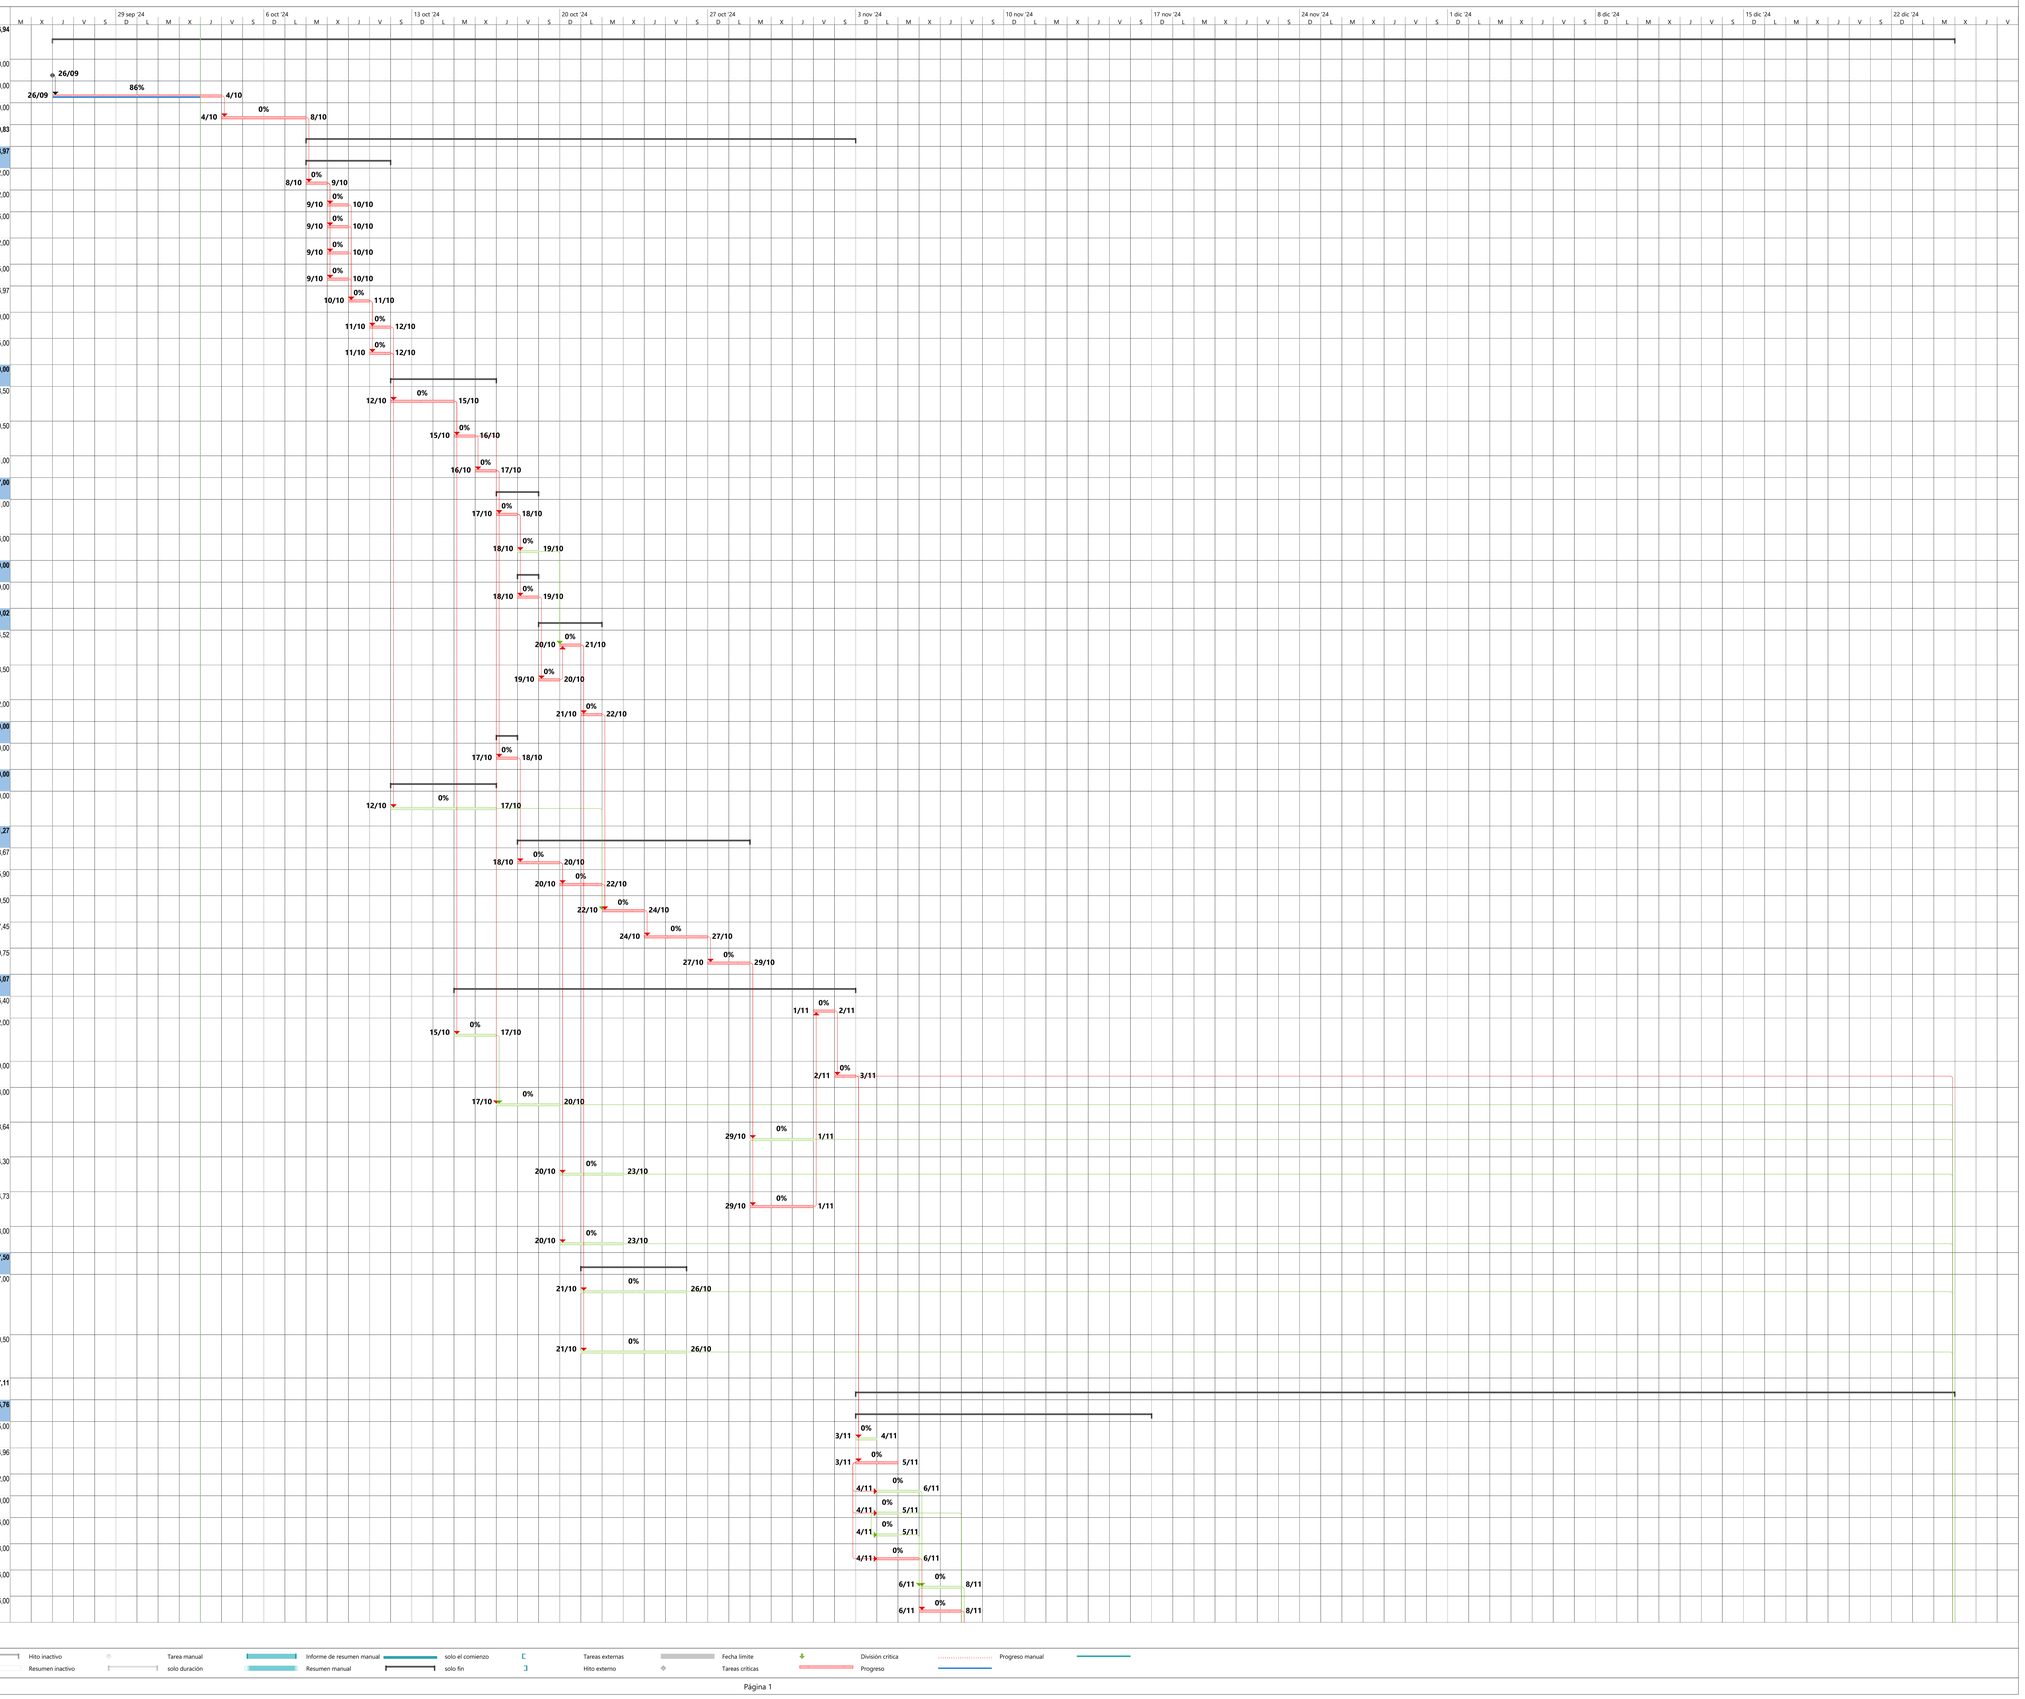


Proyecto: CRONOGRAMA_CTO
Fecha: jue 3/10/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Cubingecol

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo
60		Desmonte de luminarias tipo panel LED.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacen de los elementos reutilizables	2 días	vie 8/11/24	dom 10/11/24	0%	$ 136.770,00
61		Desmonte de manto asfáltico en viga canal. Incluye retiro al botadero autorizado.	3 días	vie 8/11/24	lun 11/11/24	0%	$ 1.182.720,00
62		Desmonte de marcos y puertas.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacen de los elementos reutilizable	2 días	vie 8/11/24	dom 10/11/24	0%	$ 110.980,80
63		Desmonte de reflectores.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacen de los elementos reutilizable	2 días	dom 10/11/24	mar 12/11/24	0%	$ 237.550,00
64		Desmonte de ventana.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacen de los elementos reutilizable	2 días	dom 10/11/24	mar 12/11/24	0%	$ 50.196,00
65		Desmonte de frescasa de cielo raso. Incluye retiro al botadero autorizado.	2 días	dom 10/11/24	mar 12/11/24	0%	$ 56.718,00
66		Desmonte de llave de jardín en área de poceta. Incluye retiro al botadero autorizado.	1 día	mar 12/11/24	mié 13/11/24	0%	$ 46.392,00
67		Desmonte de chapas y cerraduras.Incluye retiro al botadero autorizado.	1 día	mar 12/11/24	mié 13/11/24	0%	$ 221.660,00
68		Demolición de enchape en cerámica muros. Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado	1 día	mar 12/11/24	mié 13/11/24	0%	$ 44.908,00
69		Desmonte de piso en neopreno de establos. Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado	2 días	mar 12/11/24	jue 14/11/24	0%	$ 305.480,00
70		Desmonte de puerta establo con medidas aprox. 4.00x900m.	2 días	mié 13/11/24	vie 15/11/24	0%	$ 475.632,00
71		Desmonte de cárcamo metálicos.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacen de los elementos reutilizable	2 días	mié 13/11/24	vie 15/11/24	0%	$ 368.000,00
72		Desmonte de cubierta en acceso. Incluye estructuras y todos los elementos que componen la estructura. .Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacen de los elementos reutilizable	1 día	vie 15/11/24	sáb 16/11/24	0%	$ 71.752,00
73		Desmonte de avisos , letreros, pancartas	2 días	vie 15/11/24	dom 17/11/24	0%	$ 69.600,00
74		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**1 día**	**dom 17/11/24**	**lun 18/11/24**	**0%**	**$ 514.978,80**
75		Suministro rampa fundida concreto con refuerzo, puerta acceso a cuarto frio 0,10 x 0,15 X 100 cm	1 día	dom 17/11/24	lun 18/11/24	0%	$ 514.978,80
76		**ESTRUCTURA METÁLICA**	**3 días**	**lun 18/11/24**	**jue 21/11/24**	**0%**	**$ 1.595.630,40**
77		Suministro e instalación de estructura para cubierta en perfil metálico rectangular 50 x 25 x 1.1mm C18 x 6m color gris plata y/o similar, pintados con imprimación anticorrosiva+pintura acabado.	3 días	lun 18/11/24	jue 21/11/24	0%	$ 1.595.630,40
78		**CUBIERTAS**	**9 días**	**jue 21/11/24**	**sáb 30/11/24**	**0%**	**$ 23.161.956,20**
79		Suministro e instalación de Flanche de 40 cm de ancho, Cal 26. Incluye todos elementos y accesorios para su correcta instalación. Cubierta y acceso principal. Acceso principal	1 día	mar 26/11/24	mié 27/11/24	0%	$ 1.110.640,00
80		Impermeabilización de cubierta SikaFill®-100 Super CO, impermeabilizate acrílico. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	3 días	sáb 23/11/24	mar 26/11/24	0%	$ 16.925.020,00
81		Suministro de instalación de Teja termoacústica. Incluye todos los elementos para su correcta instalación. Acceso principal	2 días	jue 21/11/24	sáb 23/11/24	0%	$ 639.583,20
82		Suministro e instalacion Escalera de gato + Línea de vida vertical certificada	3 días	mié 27/11/24	sáb 30/11/24	0%	$ 4.486.713,00
83		**PAÑETES (REVOQUES)**	**4 días**	**sáb 30/11/24**	**mié 4/12/24**	**0%**	**$ 45.909.675,00**
84		Suministro y aplicación de impermeabilizante para muros en área exterior para muros de pesebrera.	4 días	sáb 30/11/24	mié 4/12/24	0%	$ 45.909.675,00
85		**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	**10 días**	**mié 27/11/24**	**sáb 7/12/24**	**0%**	**$ 5.654.836,00**
86		Mantenimiento y limpieza de bajantes	3 días	mié 27/11/24	sáb 30/11/24	0%	$ 1.849.536,00
87		Mantenimiento y limpieza de cárcamos	3 días	mié 4/12/24	sáb 7/12/24	0%	$ 3.805.300,00
88		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**3 días**	**sáb 7/12/24**	**mar 10/12/24**	**0%**	**$ 4.578.940,00**
89		Cambio Luminaria alta potencia 50W, para establo	3 días	sáb 7/12/24	mar 10/12/24	0%	$ 1.020.054,00
90		Suministro e instlación de Luminaria led hermética 2x18W T8	2 días	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	0%	$ 1.041.444,00
91		Suministro e instalación Panel led 60x60 cm 38W	2 días	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	0%	$ 752.740,00
92		Suministro e instalación reflector de aviso 100W	1 día	sáb 7/12/24	dom 8/12/24	0%	$ 183.062,00
93		Suministro e instalación aplique ovalado luz led blanca 100W fachada	2 días	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	0%	$ 1.581.640,00
94		**CIELOS RASOS**	**3 días**	**sáb 30/11/24**	**mar 3/12/24**	**0%**	**$ 3.089.393,40**
95		Suministro e instalación de Aislamiento térmico frescasa 3 ½" (con papel). Incluye todos los elementos para su correcta instalación.	1 día	sáb 30/11/24	dom 1/12/24	0%	$ 145.853,40
96		Suministro e instalación Cielo raso en superboard 8 mm.Incluye todos los elementos para su correcta instalación.	3 días	sáb 30/11/24	mar 3/12/24	0%	$ 2.943.540,00
97		**ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**2 días**	**mar 3/12/24**	**jue 5/12/24**	**0%**	**$ 456.564,00**
98		Suministro e instalación de Enchape en cerámica	2 días	mar 3/12/24	jue 5/12/24	0%	$ 456.564,00
99		**APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES**	**1 día**	**mar 3/12/24**	**mié 4/12/24**	**0%**	**$ 212.237,00**
100		Suministro e istalación Grifería lavamanos tipo push	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	0%	$ 212.237,00
101		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**7 días**	**mié 4/12/24**	**mié 11/12/24**	**0%**	**$ 21.357.143,13**
102		Mantenimiento del marco de estructura corrediza y Reinstalación de puerta enrollable garaje en lámina de 9.00 x 3.30 m.	3 días	mié 4/12/24	sáb 7/12/24	0%	$ 4.380.839,10
103		Suministro e instalación de Ventana en aluminio corrediza (vidrio 4 mm)	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	0%	$ 1.798.056,00
104		Mantenimiento de marcos y Reinstalación de puerta metalica de 110 cm de ancho 210 cm (incluye pintura)	2 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	0%	$ 244.428,03
105		Reinstalación y mantenimiento de rampa metálica. Incluye pintura con imprimación anticorrosiva+pintura acabado	2 días	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	0%	$ 4.047.530,00
106		Suministro e instalación de rejilla con marco en lámina perforada en acero inoxidable. Incluye marco anclado al suelo.	2 días	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	0%	$ 9.518.800,00
107		Mantenimiento y cambio de pasamanos para puertas de establo. Incluye candado y sus correspondientes llaves	2 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	0%	$ 1.367.490,00
108		**PINTURA**	**20 días**	**mar 3/12/24**	**lun 23/12/24**	**0%**	**$ 52.828.661,42**
109		Suministro y aplicación de Estuco plástico en cielos para baños y cocina	2 días	mar 3/12/24	jue 5/12/24	0%	$ 528.224,08
110		Suministro y aplicación de Pintura para baños y cocina en cieloraso. Color blanco, tipo pintuco y/o similar.	2 días	jue 5/12/24	sáb 7/12/24	0%	$ 1.201.777,34
111		Suministro y aplicación de Pintura para baños y cocina en muros. Color blanco, tipo pintuco y/o similar.	2 días	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	0%	$ 3.855.727,50
112		Suministro y aplicación tres manos de Pintura vinilo en muros, tipo pintuco y/o similar. Color blanco	2 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	0%	$ 3.093.000,00
113		Suministro y aplicación tres manos de Pintura vinilo en cieloraso. tipo pintuco y/o similar. Color blanco	4 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24	0%	$ 2.319.750,00
114		Suministro y aplicación tres manos de Pintura epóxica en muros de establo, tipo pintuco y/o similar. Color blanco	4 días	mié 11/12/24	dom 15/12/24	0%	$ 11.724.862,50
115		Suministro y aplicación tres manos de Pintura epóxica en pisos de establo, tipo pintuco y/o similar. Color Gris	2 días	dom 15/12/24	mar 17/12/24	0%	$ 3.376.000,00
116		Suministro y aplicación tres manos de pintura color blanca tipo Koraza tipo pintuco y/o similar. Fachada	4 días	mar 17/12/24	sáb 21/12/24	0%	$ 21.218.120,00
117		Suministro y aplicación tres manos de pintura color verde tipo Koraza tipo pintuco y/o similar. Fachada	2 días	sáb 21/12/24	lun 23/12/24	0%	$ 5.511.200,00
118		**VARIOS**	**18 días**	**sáb 7/12/24**	**mié 25/12/24**	**0%**	**$ 17.708.345,00**
119		Suministro e instalación de aviso luminoso tipo caja para exteriores, estrutura metálica y banner con impresión en alta resolución. Marco metálico color gris plata y/o similar, pintados con imprimación anticorrosiva+pintura acabado.	2 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24	0%	$ 4.702.311,00
120		Suministro e instalación de cerraduras. Incluye todos sus elementos para su correcta instalación de apertura y cerrado.	1 día	dom 15/12/24	lun 16/12/24	0%	$ 4.715.160,00
121		Lavado de pisos de establos con hidrolavadora	3 días	sáb 7/12/24	mar 10/12/24	0%	$ 2.668.524,00
122		Limpieza y aseo general de todas las áreas intervenidas	2 días	mar 10/12/24	jue 12/12/24	0%	$ 5.622.350,00
123		**Fin de proyecto**	**0 días**	**mié 25/12/24**	**mié 25/12/24**	**0%**	**$ 0,00**

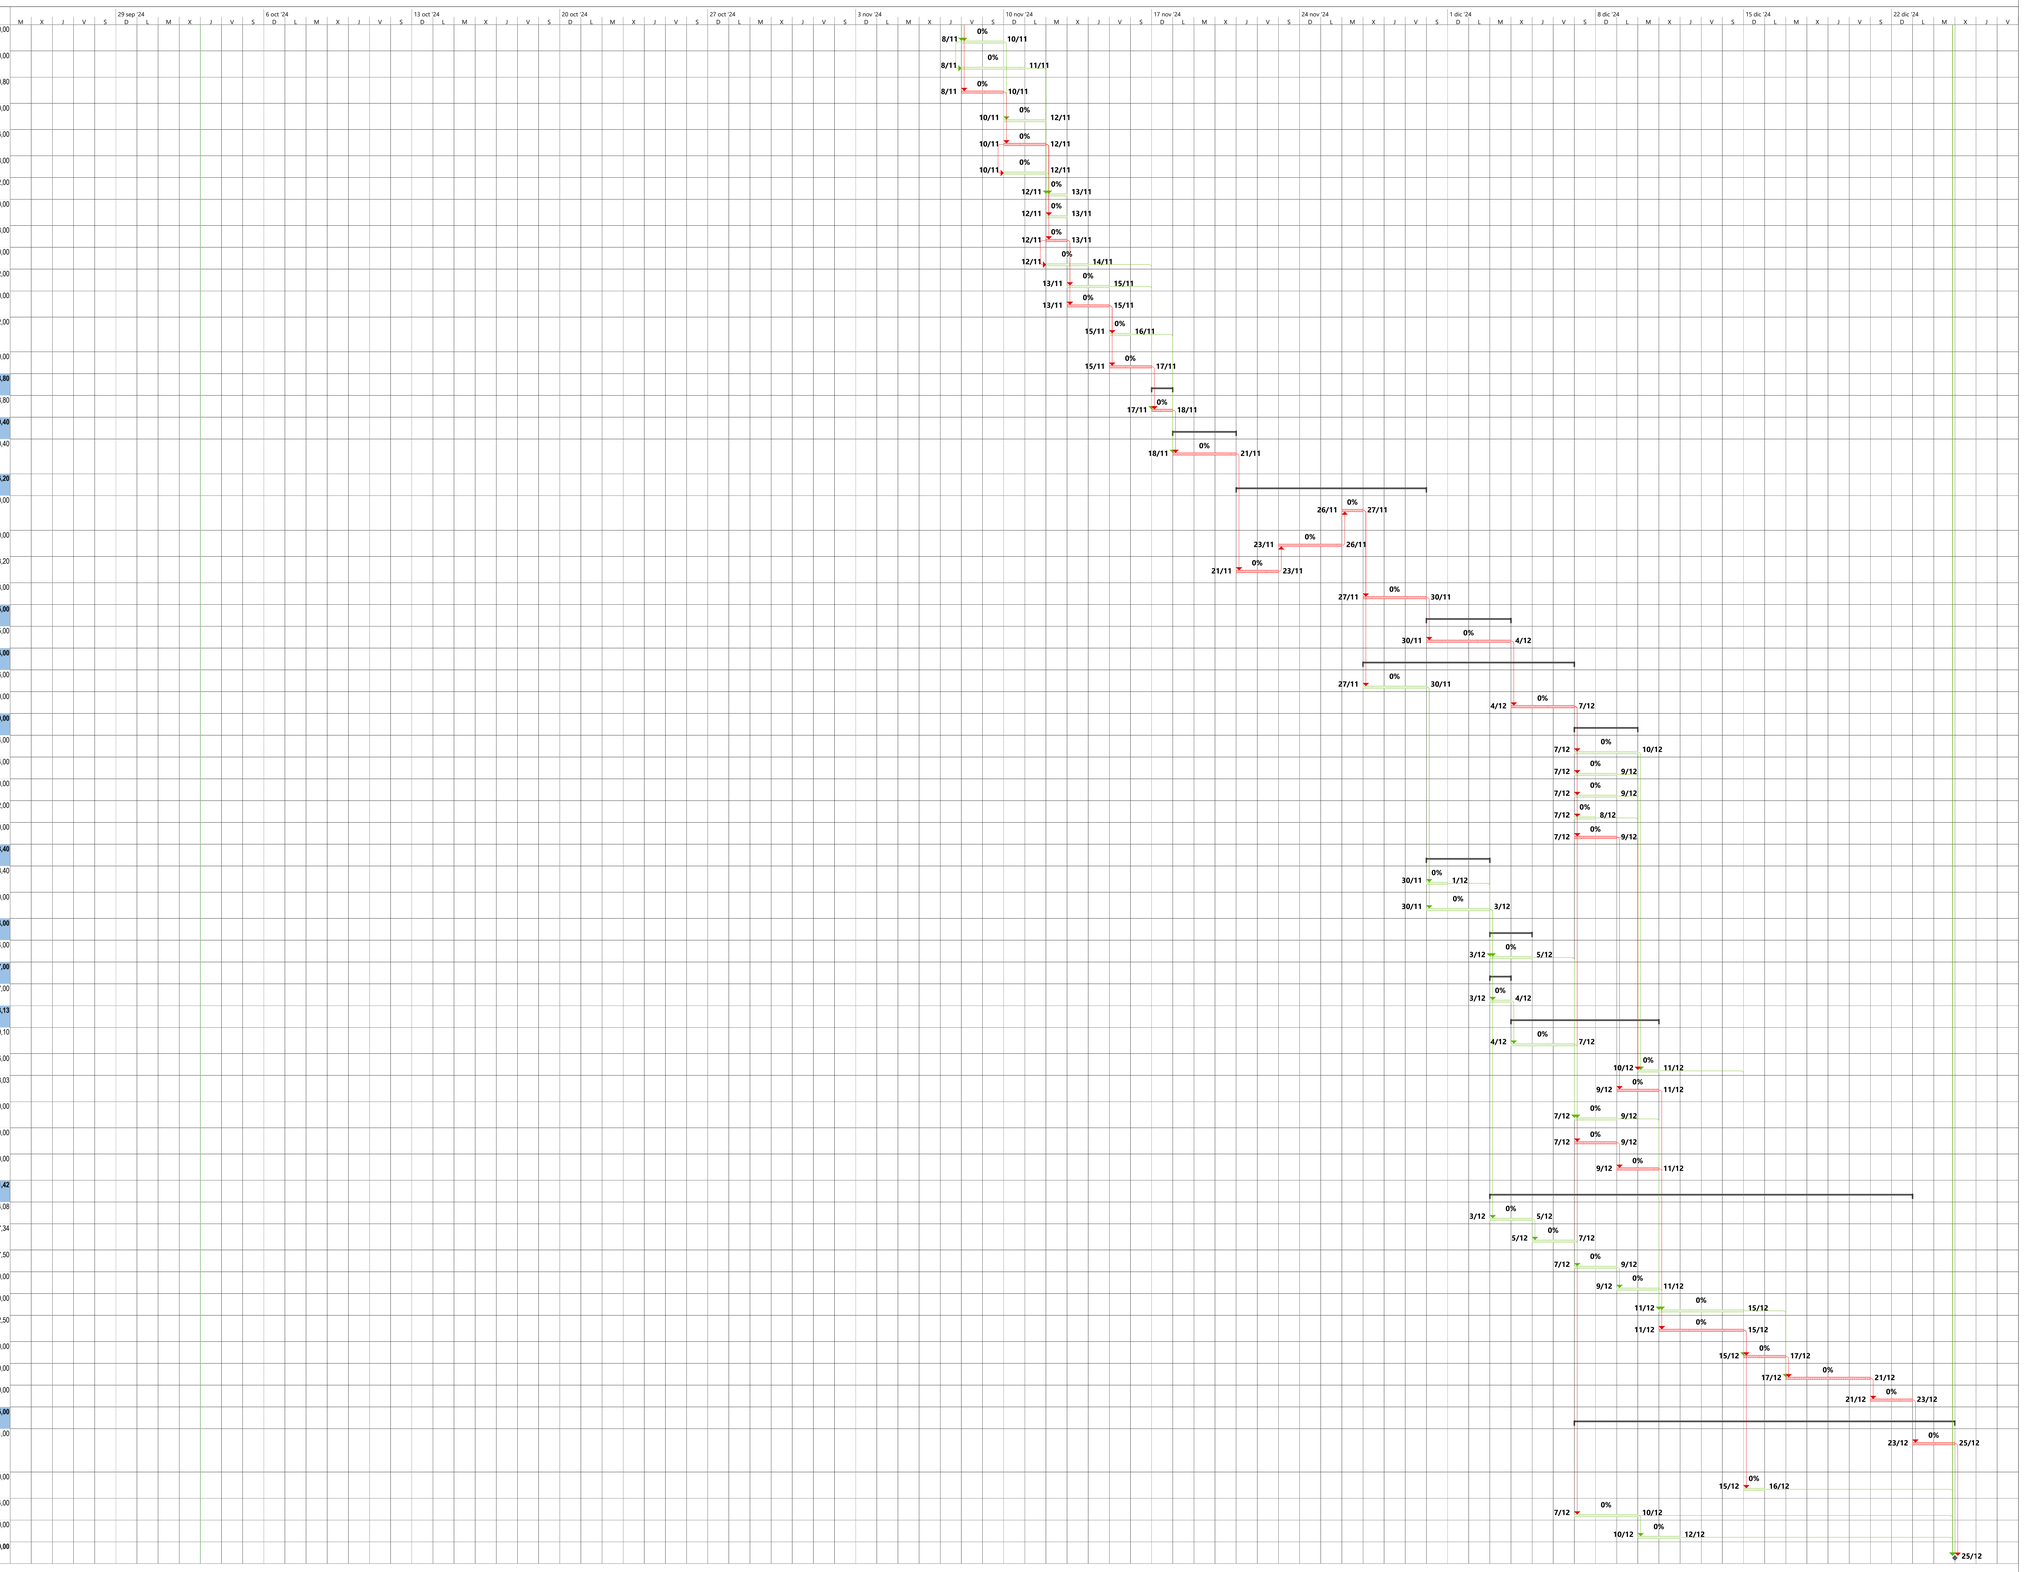

Proyecto: CRONOGRAMA_CTO
Fecha: jue 3/10/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
