EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A
ENTerritorio S.A

ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

COPIA No. 1	AUTORIZADA POR: Representante Legal	EMITIDA PARA: Cliente	RESPONSABLE: Director de Interventoría

PREPARÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
Víctor Luis Murillo **Residente de Interventoría**	**Oscar Mauricio Almario F.** **Director de Interventoría**	**Oscar Mauricio Almario F.** **Representante Legal**

INFORME MENSUAL No. 12
01 de agosto al 31 de agosto 2024
Versión No. 0
Lugar y fecha de elaboración:
Bogotá D.C, agosto de 2024

REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
INFORME MENSUAL 12 (Agosto 2024) INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	ELABORÓ	APROBÓ	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
0	46	31-08-2024	Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Creación del documento

CONTROL DE COPIAS

COPIA No.	AUTORIZADA POR:	EMITIDA PARA:	RESPONSABLE:
1	Representante Legal	Cliente	Director de Interventoría

PREPARÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Victor Murillo Ramírez **Residente de Interventoría**	**Oscar Mauricio Almario F.** **Director de Interventoría**	**Oscar Mauricio Almario F.** **Representante Legal**

RECIBIDO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

CLIENTE: **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A** **ORDEN DE SERVICIO No.:** 2230219 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A** **FIRMA:** **NOMBRE**: Oscar Miguel Hernández López **CARGO:** SUPERVISOR CONTRATO **FECHA**:

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localización Municipio Rio Iro 8
Figura 2. Punto Ecológico 33

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Actividades contractuales 12
Tabla 2. Información general del contrato de Interventoría 13
Tabla 3. Aspectos Contractuales del Contrato de Interventoría 13
Tabla 4. Relación de Pólizas 14
Tabla 5. Valores ejecutados en el periodo por frente de obra 14
Tabla 6. Personal aprobado del contratista Actividad 1 y 2 15
Tabla 7. Personal aprobado de Interventoría Actividad 1 y 2 15
Tabla 8. Maquinaria y equipos 16
Tabla 9. Comités de Aprobación 17
Tabla 10. Comités de seguimientos 17
Tabla 11. Resultados de Diseño de Mezclas 20
Tabla 12. Personal presente en obra (Etapa de Diagnósticos) 20
Tabla 13. Inspecciones realizadas 29
Tabla 14. Inspecciones realizadas 29
Tabla 15. Personal Administrativo 30
Tabla 16. Personal operativo 31
Tabla 17. Personal administrativo y operativo de Interventoría en sitio 31

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades Técnicas, Ambientales, Sociales, financieras y/o de Seguridad y Salud en el Trabajo de la orden de Servicio No. 2230223 dentro del doceavo mes del contrato, entre los días 01 de agosto al 31 de agosto del 2024.

En el presente informe se describe los componentes que conforman la ejecución de las actividades que se estipulan en las reglas de participación actividad 1: Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la norma sismo resistente NSR-10, actividad 2: Diagnóstico, Validación preliminar concertación y planeación de la intervención de esta manera intervenimos dentro del presente periodo adelantando las intervenciones para luego ejecutar la actividad 3: ejecución de las obras de las conexiones de agua potable y saneamiento básico, acta de entrega y recibo de las obras y así cumplir con el objetivo del contrato y la ejecución de la obra brindado al municipio desarrollo y calidad de vida.

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SUS PROYECTOS

1.1. Antecedentes

El Programa de Conexiones se encuentra reglamentado mediante el Decreto 1077 de 2015, Capítulo 4 (modificado parcialmente por el Decreto 1275 de 2021) que establece el alcance del programa y los criterios de priorización y focalización para la identificación de inmuebles potenciales beneficiarios; así como la Resolución 574 de 2022, que establece los lineamientos para su implementación, adicional a esto los proyectos que se estructuren conforme a lo dispuesto en este alcance deberán cumplir con los requisitos y contenidos, establecidos en los siguientes documentos:

- Ley 373 de 1997 "Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua."
- Información técnica de los proyectos viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entregada a ENTerritorio S.A, tales como: Certificaciones de Servicios Públicos, Planeación Municipal, matriz de encuestas tabuladas, cantidad de inmuebles potenciales a ser beneficiados, orden de barrios priorizados y análisis de la información de la ciudad, relativa a la identificación de las necesidades relacionadas con el déficit de conexiones intradomiciliarias.
- La demás normatividad que aplique para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Trabajo.

1.2. Localización

"El Municipio de Rio Iró se encuentra localizado al sur-este del departamento del Chocó, en medio de una vegetación selvática tropical. El territorio se encuentra surcado por los ríos Iró y Condoto. Limita por el norte con Tadó; por el oriente con Condoto; por el sur con los municipios de Condoto y San José del Palmar; y por el occidente con Istmina."



Figura 1. Localización Municipio Río Iró
Fuente: Google Maps

1.3. Descripción

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS	
	REDES HIDROSANITARIAS	
2.1	Redes intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M
2.2	Redes intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M
	PUNTOS HIDROSANITARIOS	
2.4	Punto HIDROSANITARIO **(INODORO).** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	UND

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.5	Punto HIDROSANITARIO de **DUCHA.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	UND
2.6	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAMANOS CON PEDESTAL.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UND
2.7	Punto HIDROSANITARIO de **LAVADERO ESTANDAR** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UND
2.8	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAPLATOS** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UND
APARATOS		
2.9	Suministro e instalación de **SANITARIO (INODORO)**, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UND
2.10	Suministro e instalación de **LAVAMANOS CON PEDESTAL,** incluye grifería	UND
2.11	Suministro e instalación de **LAVADERO ESTANDAR** incluye llave de chorro macho para lavadero	UND
2.12	Suministro e instalación de **LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) CON POCETA** (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	UND
CAJAS DE INSPECCIÓN		
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m. Aplica para **INTRADOMICILIARIAS** (incluye acero de refuerzo)	M
UNIDADES SANITARIAS		
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UND
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UND
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UND
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UND
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con tanque (incluye cubierta en fibrocemento) - incluye manija de agarre (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos).	UND
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - sin cubierta **(**no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	UND
CIMENTACIÓN		
3.7	Relleno compactado con material de sitio	M3
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS		
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2
3.13	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3
	MAMPOSTERIA	
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	UND
	MORTEROS	
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2
	ELEMENTOS	
3.19	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético (0,70 x 2,00 m)	UND
3.20	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)	UND
3.21	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	UND
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UND
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	UND
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	UND
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	M2
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	M
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria y/o intradomiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	UND
	ACABADOS	
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2
3.30	Recuperación de piso esmaltado	M2
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	M2
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	M2
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	M2
	CONEXIONES	
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UND

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	UND
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UND
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UND
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	UND
INTERVENCIONES VARIAS		
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electro soldada 6 mm (15x15)	M2
CAJAS DE INSPECCIÓN		
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para **DOMICILIARIA**, (incluye acero de refuerzo)	M
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para **DOMICILIARIA.**	UND

Tabla 1. Actividades contractuales

Fuente: Contrato contratista de obra

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

2.1. Información General de la Orden de Trabajo

TIPO DE CONTRATO	OBRA
No. CONTRATO	2230223
CONTRATISTA	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS RADA RAYO
OBJETO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE RÍO IRO CHOCO
PLAZO INICIAL	210 DÌAS

TIPO DE CONTRATO	OBRA
VALOR INICIAL	$ 4.164.944.717,87
VALOR ANTICIPO	$ 805.225.665,88
FECHA DE INICIO	24/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ORDEN DE TRABAJO	24/03/2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	24/04/2024
FECHA PRÓRROGA No. 1	24/04/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO SEGÚN PRÓRROGA	31/08/2024
FECHA PRÓRROGA No. 2	31/08/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO SEGÚN PRÓRROGA No. 2	03/11/2024

Tabla 2. Información general de la orden de trabajo

Fuente: Autor

2.2 Información General de la Orden de Servicio

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
No. CONTRATO	2230219
FECHA DE INICIO	24 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATISTA	C&E ENGINEERING SAS
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR MAURICIO ALMARIO
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PLAZO INICIAL	225 DÌAS
VALOR INICIAL	$ 396.843.968,13
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIO	24/08/2023

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
FECHA DE TERMINACION DE LA ORDEN DE SERVICIO	08/04/2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1	18/12/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	08/05/2024
FECHA PRÓRROGA No. 1	08/05/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO SEGÚN PRÓRROGA	31/08/2024
FECHA PRÓRROGA No. 2	31/08/2024
ADICION No. 1	$ 99.210.992,03
ADICION No. 2	$ 23.281.512,78
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 519.336.472,94

Tabla 3. Información general de la orden de Servicio

Fuente: Autor

2.1.1 Aspectos Contractuales

Los documentos de carácter legal que se han suscrito hasta la fecha sq e observan en la Tabla 4. Aspectos Contractuales de la Orden de Trabajo.

DOCUMENTO	FECHA
ORDEN DE SERVICIO No.	2230223
ACTA DE INICIO	24 de agosto de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	18 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	18 de enero de 2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 1	08 de mayo de 2024
FECHA DE PRORROGA No. 2	31 de agosto de 2024

Tabla 4. Aspectos Contractuales de la orden de Trabajo

Fuente: Autor

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 21-45-101415928			
CUMPLIMIENTO	24/08/2023	12/01/2025	$ 148.816.489,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	03/11/2027	$ 49.605.497,00
CALIDAD DEL SERVICIO	11/04/2024	11/04/2027	$ 148.816.489,00
GARANTIA No. 21-40-101214825			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00

Tabla 5. Relación de Pólizas

Fuente: Autor

2.1.2 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas

La orden de servicio se encuentra amparada por las siguientes pólizas, las cuales han sido presentadas por la firma interventora y aprobadas por ENTerritorio S.A. Se hace aclaración que todas las pólizas son expedidas por la misma compañía (Seguros del Estado S.A.).

2.1.3 Aspectos Financieros

El contrato No. 2230223 tiene un valor de $ 4.164.944.717,87, el cual hace parte del contrato suscrito entre CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL y ENTerritorio S.A. A la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente resumen financiero:

No.	FRENTE	PERIODO	VALOR ACTA	ACUMULADO
0	Anticipo	Anticipo	$ 805.225.665,88	$ 805.225.665,88
1	BARRIOS: LA REAL LA UNION EL ROSARIO	24/08/2023 AL 30/06/2024	$ 392.311.654,48	$ 1.197.537.320,36

2			$ 638.553.521,75	$ 1.836.090.842,1
3			$ 333.355.646,94	$ 2.169.446.489,04
TOTAL OBRA				$ 2.169.446.489,04

Tabla 6. Valores ejecutados en el periodo por frente de obra

Fuente: Autor

El contrato No. 2230219 tiene un valor de $ 396.843.968,13, el cual hace parte del contrato suscrito entre C&E ENGINEERING SAS y ENTerritorio S.A. A la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente resumen financiero:

Acta No.	PERIODO	VALOR ACTA	ACUMULADO
1	24 DE AGOSTO DE 2024 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024	$ 42.330.023,26	$ 42.330.023,26
2	25 DE OCTUBRE DE 2023 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 18 DE ENERO DE 2024 AL 24 DE MARZO DE 2024	$ 84.660.046,54	$ 126.990.069,80
3	25 DE MARZO DE 2024 AL 25 DE MAYO DE 2024	$61.021.374,16	$188.011.443,96
4	26 DE MAYO DE 2024 AL 24 DE JUNIO DE 2024	$ 51.583.101,79	$ 239.594.545,75
TOTAL ACUMULADO INTERVENTORÍA			$ 239.594.545,75

Tabla 7. Valores ejecutados en el periodo y/o pagados

Fuente: Autor

2.3 Aspectos Técnicos Contrato

2.3.1 Personal Aprobado del Contratista de obra Actividad 1 y 2

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE
Director de Obra	50%	Miguel Ángel Martínez Amórtegui
Residente de Obra	100%	Jair Alfredo Hernandez Antonio
Profesional técnico en Diagnóstico	100%	Anggy Katherine Ortiz Rayo
Profesional Hidráulico	50%	Diego Fernando García Borrero
Especialista Estructural	50%	Álvaro Rafael Caballero Guerreo
Profesional de Costos y presupuestos	60%	Juan Camilo Guevara Martínez
Profesional HSEQ	20%	Eva del Pilar Diaz Ibañez
Trabajadora social	100%	Saddy Sofía Beltrán García
Trabajadora Social	100%	María Liris Mosquera
Técnico PGIO No. 1	100%	Leidis Margarita Montero Polania
Técnico PGIO No. 2	100%	Jhon Jairo Marín López
Maestro de Obra No. 1	100%	Edgar Fernando Ortiz Javela
Maestro de obra No. 2	100%	Verónica Lizbeth Escandón Polanco

Tabla 8. Personal aprobado del contratista Actividad 2 y 3
Fuente: Consorcio Grupo Empresarial

2.3.2 Personal Aprobado de Interventoría

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE
Director de Interventoría	40%	Oscar Mauricio Almario Fernández
Residente de Interventoría	100%	Víctor Luis Murillo Ramírez
Especialista estructural	3%	David Leonardo Rozo
Especialista HSEQ	20%	Cristian David Galvis Najar

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE
Especialista Hidrosanitario	3%	José Luis Salaiman Lamadrid
Profesional de Costos y Presupuestos	15%	Oscar Mauricio Almario Fernández
Inspector de Interventoría	100%	Luisa Fernanda Herrera
Profesional Social	100%	Candelaria González Medina
Técnico PGIO No. 1	100%	Cristian Alejandro Otalora
Técnico PGIO No. 2	100%	Duvan Felipe Mosquera Mosquera

Tabla 9. Personal aprobado de Interventoría Actividad 1 y 2
Fuente: Autor

2.3.3 Maquinaria y/o Equipo de medición y/o equipos ofimáticos u otros

Durante el periodo y Etapa de DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, Y EJECUCIÓN DE OBRA, CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL, utilizó la siguiente maquinaria y/o equipos para el desarrollo de la misma.

EQUIPO REQUERIDO	EQUIPO APROBADO PARA EL PERIODO	EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO
Equipos de Medición	Flexómetros y Equipo digital	Se han requerido de los flexómetros para la medición y el levantamiento de las viviendas.
Equipo Fotográfico	Cámaras	Para obtener el Registro Fotográficos del estado actual de las viviendas.
Equipo de teléfono GPS	Teléfono GPS	Teniendo en cuenta que se debe tener la georreferenciación de las viviendas a intervenir se cuenta con teléfono con GPS.
Equipo de Computo	Portátiles	Para lograr la recolección y almacenamiento de la información, comunicación y entrega periódica de los Diagnósticos.
Equipo de Impresión	Impresoras	Suministra la información recolectada, para entregas y comités.
Equipo de Red	Internet	Ayuda a la comunicación continua con el contratante e Interventoría, envío de información.
Plataformas Virtuales	Aplicaciones	Conexiones con el contratista e interventoría para facilitar la información y mantener informados a los mismos.

EQUIPO REQUERIDO	EQUIPO APROBADO PARA EL PERIODO	EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO
Equipos de Comunicación	Celulares	Tener continua comunicación con el contratante, interventoría y personal administrativo y en campo del consorcio.

Tabla 10. Maquinaria y/o equipos ofimáticos
Fuente: Autor

NOTA ACLARATORIA: Durante este periodo no se realiza actividad con maquinaria, debido a que no se realizan actividades constructivas que requieran de maquinaria.

2.3.4 Control de Inspección y Ensayo

Previo a la ejecución de la actividad 3, el contratista realiza el diseño de mezcla, el cual fue validado por esta interventoría obteniendo los siguientes resultados.

No DE ORDEN		ENSAYO	
No	**Fecha ensayo o aplica, protocolo**	**Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)**	**Nombre de la norma, protocolo o requisito**
1	15/11/2023		Diseño de mezcla de concreto hidráulico
2	7/12/2023	I.N.V.E-213-13	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos
3	8/12/2023	I.N.V.E-222-13	Densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y absorción de agregados finos
4	7/12/2023	I.N.V.E-217-13	Densidad bulk (peso unitario) y porcentajes de vacíos de los agregados compactados o sueltos
5	8/12/2023	I.N.V.E-307-13	Densidad del cemento hidráulico

6	22/12/2023	NTC 4024	Diseño de mezcla para bloque estructural 10.0 Mpa

Tabla 11. Resultados de Diseño de Mezclas

Fuente: Autor

Durante este periodo, el contratista de obra realiza toma de muestras cilíndricas de concreto, cuyos resultados de laboratorio fueron validados y verificado por esta interventoría, teniendo como resultados que cumplen de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.

NOTA: Se aclara que los resultados de pruebas señaladas anteriormente, corresponden a los informes o resultados aportados por el contratista de obra, por tal motivo, los mismos cumplen de acuerdo a la documentación entregada a la interventoría; por tal motivo, los mismos son autorizados por la interventoría bajo el principio de la buena fe del contratista de obra CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL.

2.3.5 Gestión de comités de seguimiento y/o aprobación.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto del 2024, se realiza 1 comité de seguimiento de aprobación, así mismo, se realiza comités de seguimiento sobre la orden de trabajo, los cuales se relacionan en la Tabla 12 y Tabla 13.

REUNIÓN	FECHA	TEMA DE REUNION
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE APROBACIÓN No. 17	16/08/2024	● Presentación de diagnóstico por parte del contratista a la interventoría para su respectiva revisión y aprobación. ● Aprobación de diagnósticos ● Recomendaciones generales

Tabla 12. Comités de seguimiento de aprobación

Fuente: Autor

REUNIÓN	FECHA	TEMA DE REUNION
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 33	06/08/2024	Seguimiento a la actividad 2 y 3
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 34	13/08/2024	Seguimiento a la actividad 2 y 3
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 32	20/07/2024	Seguimiento a la actividad 2 y 3

Tabla 13. Comités de seguimiento

Fuente: Autor

2.3.6 Descripción de los Trabajos Realizados en el Mes por la Interventoría

Las actividades desarrolladas durante este periodo comprendido desde el 01 de agosto de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024 son las siguientes:

Actividad 1: El contratista de obra remitió los diseños arquitectónicos y estructurales los cuales fueron aprobados por la Interventoría y los mismos cuentan con VoBo del Ministerio desde el día 14 de noviembre del 2023 de acuerdo al cambio de Metodología.

Actividad 2: Diagnóstico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.

Esta actividad se inicia con el Plan de Gestión Social y sus líneas de intervención, para ello se realizaron socialización sectorizada, socializaciones casa a casa, entrega de volantes y folletos informativos con los requisitos documentales del proyecto, perifoneo, instalación de la valla publicitaria, instalación de los buzones de sugerencias en los dos primeros barrios priorizados y demás estrategias de divulgación del proyecto.

La elaboración de los diagnósticos en el municipio de Rio Iró, se realizó por manzanas visitando todas las que se encuentran en la matriz inicial e inclusiones, consiste en identificar las viviendas con el sticker aprobado por la Entidad contratante y la codificación correspondiente a cada vivienda diagnosticada cambiando solamente los últimos números perteneciente a cada una de estas viviendas beneficiadas. Hasta la fecha se realizaron 634 visitas en los barrios priorizados (Barrio Nuevo, la Real, la Unión y el Rosario) de las cuales se verificaron, revisaron y aprobaron 458 diagnósticos; quedando así, 2 viviendas por visitar, 107 viviendas no efectivas y 68 renuncias, de acuerdo al potencial inicial que son 549 viviendas y las inclusiones realizadas. Es importante señalar que a la fecha ya se ha culminado y se ha efectuado cierre a la etapa de inclusión.

Esta actividad se desarrolla de la siguiente manera:

- Revisar la matriz principal, para verificar que la vivienda se encuentre beneficiada por el PCI.
- Diligenciar el Formato PCI – 003, encuesta Potenciales Beneficiarios a cada una de las viviendas intervenidas, siendo este el punto de partida para categorizar las unidades de vivienda como efectivas o no efectivas.

- Determinar las cantidades de puntos requeridos por la vivienda y tipo de intervención de acuerdo con los establecidos en el presente proceso.
- Registrar fotográficamente el antes de las viviendas, evidenciando las condiciones vulnerables de todos los aparatos existentes a intervenir, especialmente cuando se propone reposición por mal estado.
- Realizar el plan de intervención, con esquemas en los cuales se definieron la necesidad y obra a realizarse en cada vivienda.
- Definir el presupuesto de cada vivienda cumpliendo con las estructuras presupuestales.
- Obtener por parte del ocupante, propietario o poseedor de los inmuebles, la Firma del Anexo 2 de la Resolución 494 (Acta de concertación) plasmado el formato PCI 005.
- Instalar los sticker en las puertas de cada vivienda visitada con la respectiva codificación aprobada.
- Se realiza informe individual para los Diagnósticos aprobados en los Formatos PCI establecidos en el PCI-001 Lista de chequeo para aprobación Diagnóstico.
- El contratista de obra presenta a interventoría para su revisión y posterior aval, listados de diagnósticos semanal; Entrega No 1 (18 diagnósticos de los cuales después de las observaciones realizadas, subsanaron y se aprobaron), entrega No 2 (11 Diagnósticos de los cuales después de las observaciones realizadas, subsanaron y se aprobaron), entrega No 3 (40 diagnósticos de los cuales después de las observaciones realizadas, subsanaron y se aprobaron), entrega No 4 (25 diagnósticos de los cuales después de las observaciones realizadas, subsanaron y se aprobaron), entrega No 5 (14 diagnósticos, de los cuales 4 cumplen para su aprobación y 10 son devueltos para su respectiva subsanación), entrega No 6 (42 diagnósticos, los cuales 37 cumplen con los requisitos para su respectiva aprobación), entrega No 7 (11 diagnósticos, los cuales cumplen con los requisitos para su respectiva aprobación), entrega No 8 (40 diagnósticos los cuales después de las observaciones realizadas, subsanaron y se aprobaron), entrega No 9 (29 diagnósticos, los cuales después de las observaciones realizadas, subsanaron y se realiza su respectiva aprobación), No 10 (21 diagnósticos, los cuales después de las observaciones realizadas, subsanaron y se realiza su respectiva aprobación), entrega No 11 (9 diagnósticos, los cuales después de las observaciones, subsanaron y se realiza su respectiva aprobación); entrega No 12 (19 diagnósticos, los cuales después de las observaciones, subsanaron y se realiza su respectiva aprobación); entrega No 13 (25 diagnósticos, los cuales después de las observaciones, subsanaron y se realiza su respectiva aprobación); entrega No 14 (22 diagnósticos,

los cuales después de las observaciones, subsanaron y se realiza su respectiva aprobación); entrega No 15 (6 diagnósticos, los cuales después de las observaciones, subsanaron y se realiza su respectiva aprobación);); entrega No 16 (30 diagnósticos, los cuales después de las observaciones, subsanaron y se realiza su respectiva aprobación); entrega No 17 (31 diagnósticos, los cuales después de las observaciones, subsanaron y se realiza su respectiva aprobación); del mismo modo, el contratista de obra ha remitido a esta interventoría 30 actas de rechazado firmadas por los beneficiarios, arrojando como resultado un total de 458 Diagnósticos Efectivos Aprobados.

A continuación, se presenta resumen de la actividad 2, a corte del presente informe:

BARRIO:	**NUEVO, LA REAL, LA UNIÓN, EL ROSARIO**	
1	**Número de viviendas potencial inicial:**	**459**
2	Total de visitas realizadas por el contratista:	634
3	Total de diagnósticos efectivos:	459
4	Número de Diagnósticos No Efectivos (En revisión):	107
5	Número de Renuncias	68
6	**Total de diagnósticos aprobados por la interventoría**	**458**

Tabla 14. Resumen Actividad 2

Fuente: Autor

Actividad 3: Ejecución de obra

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 agosto de 2024, las actividades realizadas por la interventoría son las siguientes:

- Realización de aperturas y replanteos de las viviendas que se van a intervenir.
- Verificación de entrega de materiales a las viviendas que se van a intervenir.
- Realización de recorridos para la validación de procesos constructivos de las intervenciones.
- Validación de las especificaciones técnicas en el proceso constructivo.
- Acompañamiento y validación de las pruebas realizadas (presión, Flujo y funcionalidad de los aparatos) por el contratista de obra.

- Acompañamiento a toma de muestras cilíndricas y prueba slump.
- Recibo a satisfacción y entrega de viviendas finalizadas.
- Validación de carpetas de diagnósticos y carpetas finales.
- Trabajos administrativos.

Durante el este periodo, se cuenta con 414 viviendas iniciadas las cuales están localizadas en Barrio Nuevo, en el Barrio La Real, el Barrio La Unión y el Barrio El Rosario en las manzanas 1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,7, 8,9 y 10 en las cuales se han realizado actividades significativas correspondientes a fundición de vigas de cimentación, construcción de muros en mampostería estructural, pañetado, enchape de pisos y paredes en cerámica, instalación de combos sanitarios, construcción de lavaderos y lavaplatos, Excavación . Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 414 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 121 viviendas en ejecución, 293 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoría y al beneficiario 279 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución con porcentajes estimados de avance es de 70,91% (Ejecutado Estimado de acuerdo al resumen anexo al presente informe), con respecto al 60,83% que se tiene programado, es decir, presenta un avance del 10,08% respecto a viviendas programadas y terminadas (Con porcentaje estimado). Cabe señalar que si bien el contratista presenta en las 414 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 414 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 279 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoría. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo (Plan de Contingencia) y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoría el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 273 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 6 viviendas en avance.

En la siguiente tabla se presenta resumen de la actividad No. 3 a corte del 31 de agosto de 2024:

Resumen Actividad 3		
1	**Potencial Inicial:**	**459**
2	Viviendas Aperturadas:	414
3	Viviendas Terminadas:	293
4	Viviendas en Ejecución:	121
5	Viviendas Recibidas a Satisfacción por Interventoría y beneficiario	279

6	Viviendas Programa actividad No.3 según plan de trabajo Vigente (Terminadas)	273
7	Viviendas en Atraso por Falta de Terminación de Acuerdo al plan de Trabajo	-20
8	Viviendas Programa actividad No.3 según plan de trabajo Vigente (Recibidas a Satisfacción)	273
9	Viviendas en Atraso por Falta de Recibo a Satisfacción Acuerdo al plan de Trabajo Vigente.	-6

Tabla 15. Resumen Actividad 3

Fuente: Autor

En el periodo del presente informe, la Interventoría reporta que el contratista de obra cuenta con el siguiente personal en obra, distinto al personal operativo y/o ayudantes de obra (Contractual y adicional):

2.3.7 Relación de personal en obra (contratista de obra)

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
JAIR ALFREDO	HERNANDEZ ANTONIO	1111199851	RESIDENTE DE OBRA
SADDY SOFIA	BELTRÁN GARCÍA	1100693213	PROFESIONAL SOCIAL
MARIA LIRIS	MOSQUERA MOSQUERA	1049373887	PROFESIONAL SOCIAL
LAURA CARELIS	ALVARES TAUTIVA	1110593683	ALMACENISTA
JUAN DAVID	TORRES DÁVILA	1076335432	INSPECTOR DE OBRA
VERÓNICA LIZBETH	ESCANDÓN POLANCO	1075222484	INSPECTOR DE OBRA
ALBERT STEVEN	FAJALOZANO	1110579517	INSPECTOR DE OBRA
NEURO RAFAEL	URDANETA ORTIZ	1235241152	INSPECTOR DE OBRA
MELISA	GONZALEZ SERNA	1077477808	INSPECTOR DE OBRA
LEIDIS MARGARITA	MONTERO POLONIA	1052089311	INSPECTORA PGIO
CAMILO	MOSQUERA MOSQUERA	1076331723	CONDUCTOR MOTO CARRO
JOSE ELSIA	MOSQUERA MOSQUERA	1030422170	AYUDANTE MOTO CARRO
JOSÉ ERMES	MOSQUERA RAMIREZ	71377421	AYUDANTE MOTO CARRO
JOSE ISAÍAS	BENÍTEZ QUINTO	9728682	AUXILAR DE ALMACÉN
ROBINSON	PEREA MOSQUERA	1193063956	AYUDANTE MOTO CARRO

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
JOSE EDIER	MOSQUERA MOSQUERA	1128084832	AUXILAR DE ALMACÉN
JORGE ANTONIO	MOSQUERA MOSQUERA	94060764	AUXILIAR DE MOTO CARRO
SEGUNDO MIGUEL	BARLIZA	1147943253	OFICIAL DE OBRA
ALDEMAR ANTONIO	DE LA HOZ PRENTH	8795213	OFICIAL DE OBRA
LUIS EDUARDO	CAMPO GUTIERREZ	1044624736	AYUDANTE DE OBRA
ALFREDO EDUARDO	MORENO AVILA	72209723	OFICIAL DE OBRA
DANIEL SEGUNDO	RODRIGUEZ RAMIREZ	5984930	OFICIAL DE OBRA
MIGUEL ALBERTO	ROMERO RAMIREZ	840044258	OFICIAL DE OBRA
JULIO	CONTRERAS MENDOZA	18880150	AYUDANTE DE OBRA
YSMARIS	PEREA BENITEZ	71686667	AUXILIAR DE ALMACEN
MANUEL	VASQUEZ DE LA HOZ	72300779	OFICIAL DE OBRA
JESUS NOLBERTO	IRIARTE URDANETA	1124362017	OFICIAL DE OBRA

Tabla 16. Personal presente en obra (Etapa de Diagnósticos y/o Etapa de Ejecución)
Fuente: Autor

2.3.8 Situaciones Especiales Ocurridas durante el periodo

- Uno de los principales inconvenientes y dificultades presentadas en el periodo fue la falta del fluido eléctrico, fallas en la cobertura del internet y la falta de señal en la gran mayoría de los días.

- Durante este periodo, se evidencia mal estado de la vía para acceso al municipio de Rio Iró. De acuerdo a lo señalado por el contratista de obra esta situación ha dificultado el correcto suministro de materiales necesario para la ejecución normal de la obra, pues por las condiciones de la vía, varios proveedores se han abstenido de cruzar por la misma, situación que afecta directamente sobre la ejecución de las obras, pues este tipo de situaciones ocasionan una reducción del rendimiento por falta de insumos necesarios para actividades que se encuentran adelantando y que no se cuenta con los materiales que no pudieron ser ingresados de manera oportuna por esta situación presentada. Cabe señalar que frente a esta problemática la interventoría ha efectuado manifestaciones y/o aclaraciones al contratista de obra a fin de que se adelanten las medidas o estrategias necesarias y suficientes para garantizar el suministro de materiales en obra.

- Durante el periodo se ha presentado dificultades en las excavaciones que se deben realizar en las conexiones intradomiciliarias, pues las viviendas han presentado gran material de relleno (Rocas o piedras), situación que ha generado reducción en los rendimientos de esta actividad y por ende ha generado que se usen mayores tiempos en las intervenciones en cada vivienda. Cabe señalar que esta situación ya se ha presentado en diferentes viviendas y desde el inicio de las obras.

- Se presentan lluvias de manera constante la cual generó atraso en el inicio y ejecución de las actividades programadas, situación que conlleva a reprogramar las actividades en diferentes oportunidades.

2.4 SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN Y CALIDAD

Las actividades desarrolladas del plan de calidad del proyecto para el periodo fueron las siguientes:

2.4.1 Responsabilidades

Se ha designado al Profesional de Calidad y/o HSEQ como responsable de formular, implementar, mantener y mejorar el Plan de Gestión de Calidad.

El Director de Interventoría del Proyecto tiene la responsabilidad total del éxito en la ejecución de este, incluyendo la conformidad con el Sistema y en el cumplimiento de los Objetivos. Igualmente es responsable de gestionar las relaciones contractuales, efectuar la planeación, organización de los trabajos de construcción y elaboración y presentación de informes y productos establecidos por la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A.

2.4.2 Control de documentos y datos

Los documentos de Gestión de Calidad son elaborados de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y están estructurados por niveles de tal forma que se ejerce un control sobre las actividades que afectan la calidad del producto y servicio.

Los procedimientos descritos son emitidos, controlados y de cumplimiento obligatorio por cada una de las personas en todos los procesos de la firma CIVIL AND ENVIRONMENTAL

ENGINEERING SAS y no deben alterarse ni omitir sin la aprobación directa del responsable del Sistema de gestión de calidad.

La creación y control de los documentos requeridos por el Plan de Gestión, necesarios para la eficaz planificación, operación y control de los procesos, están soportados por los responsables de cada proceso, quienes solicitan su elaboración, modificación y/o anulación.

Todas las copias del Plan de Gestión de Calidad y los documentos que hacen parte del mismo son editados, distribuidos y controlados por el responsable del Plan y Especialista de Calidad.

2.4.3 Plan de materiales sin certificado de conformidad

Para el periodo del 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024, se realizan en obra los especímenes de concreto elaborado en sitio de acuerdo al diseño de mezcla aportado por el contratista. Esta interventoría se encuentra a la espera de que se alleguen los resultados de laboratorio, los cuales han sido solicitados de manera oportuna al contratista de obra.

2.4.4 Plan de materiales con certificado de conformidad

El profesional de calidad de interventoría, hace una revisión de la documentación allegada por el contratista de obra en el cual se valida que los materiales que llegan a obra cuenten con los certificados de conformidad y/o sellos de calidad, y sean los adecuados para su uso. De igual manera se verifica que todos los materiales se encuentren almacenados de forma correcta.

Para el periodo del 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024 se cuenta con los siguientes materiales con certificado de conformidad y/o sellos de calidad.

No. de orden	No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
		Desde	Hasta		
1	CSC-0034-1	6/05/1992	16/08/2029	ICONTEC	TUBERIA PRESIÓN AGUA POTABLE
2	CSC-0034-5	17/12/1997	16/08/2029	ICONTEC	ACCESORIOS PRESION AGUA POTABLE

No. de orden	No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
		Desde	Hasta		
3	CSC - CER377459	18/03/2015	18/07/2029	ICONTEC	TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA DRENAJE
4	CSC-0034-3	28/07/1993	16/08/2029	ICONTEC	TUBO SANITARIO - TUBO VENTILACIÓN
5	CSC-0034-6	17/12/1997	16/08/2029	ICONTEC	ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA Y VENTILACIÓN
6	CSC -CER495354	23/09/2016	7/04/2028	ICONTEC	TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO ACAMPANADA - ACCESORIOS PARA

Tabla 16. Certificado de conformidad

Fuente: Autor

2.5 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El Proyecto conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico del municipio de Rio Iró -CHOCO, firma Acta de inicio el 24 de agosto de 2023, con el apoyo y/o acompañamiento de algunas entidades del Municipio involucradas en la ejecución del Proyecto; entre ellas, indispensable el apoyo y acompañamiento de la Alcaldía municipal de Rio Iró, con el fin de prevenir, mitigar y/o compensar los impactos directos potenciales derivados de la ejecución del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico PCI, las cuales deberán implementarse de manera articulada entre las entidades involucradas, Alcaldía municipal, Prestador de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Rio Iró, Contratista de Obra e Interventoría, según correspondan sus obligaciones.

El PCI, se convierte en un instrumento de planificación que promueve la participación activa de la comunidad en gestión integral de los procesos; a la vez fomenta el compromiso y corresponsabilidad de la comunidad para la sostenibilidad de las obras, con el fin de

establecer canales de participación ciudadana, de comunicación e información comunitaria antes, durante y después del desarrollo del Proyecto. Por lo tanto, se realizaron las actividades del plan de Gestión Social del Proyecto.

Las actividades realizadas a corte de este informe son las siguientes:

2.5.1 Línea de Comunicación

2.5.1.1 Socializaciones (Masivas y Sectorizadas) y reuniones de acercamiento con líderes:

2.5.1.2 Visita Casa a Casa

Con el objetivo de brindar información detallada sobre el Proyecto, el equipo social realizó visitas domiciliarias para responder preguntas y aclarar dudas sobre e inquietudes de los potenciales beneficiarios. Durante estas visitas, se explicaron a los residentes los criterios de selección del proyecto, así como los detalles de las actividades de diagnóstico llevadas a cabo en cada vivienda.

Durante estas visitas, el equipo social hizo hincapié en la importancia de concertar con el equipo técnico el espacio para la intervención, no dejar los menores de edad solos en las viviendas durante la ejecución de las obras, mantener los materiales recibidos bajo custodia, para poder intervenir la vivienda sin dificultades y no dejar los trabajadores solos en las viviendas durante la ejecución de las obras.

Durante este periodo se informa que se han realizado 17 visitas de socialización casa a casa para un total hasta la fecha de 625 visitas, en los 4 barrios priorizados del PCI, en barrio nuevo se han llevado a cabo 273 visitas de la cuales 225 son efectivas, 34 no efectivas y 14 renuncias; en el segundo barrio priorizado (barrio la real) se lleva un total 90 visitas casa a casa de las cuales 58 son efectivas, 18 no efectivas y 14 renuncias, el tercer barrio priorizado (barrio la unión) se llevan 112 visitas casa a casa, de las cuales 72 son efectivas, 24 no efectivas y 16 renuncias y por último, el cuarto barrio priorizado (barrio el rosario) se lleva un total de 150 visitas casa a casa a la fecha, siendo 101 efectivas, 32 no efectivas y 17 renuncias.

2.5.1.3 Socialización sectorizada

No Aplica, para este periodo

2.5.1.4 Acompañamiento al Área técnica

Durante la ejecución de las unidades sanitarias en los códigos en ejecución se han presentado situaciones particulares, para atender dichas situaciones se hace un acercamiento hasta la vivienda con los equipos técnico y social de obra e interventoría, con el fin de dar solución a estas situaciones y en caso tal, llegar a un acuerdo con los beneficiarios y seguir el curso de la intervención

2.5.1.5 Creación del link

Se realizó envió oficial a la Alcaldía Municipal de la información aprobada por la Entidad Contratante para la primera actualización del Link informativo.
https://www.rioiro-choco.gov.co/noticias/programa-conexiones-intradomiciliarias-de-agua-potable, A corte del presenté informe se evidencia que la Alcaldía municipal, no realizo la actualización del link, informativo del Proyecto. Cabe informar que se está a la espera de su actualización por parte de la Alcaldía municipal.

2.5.1.6 Diseño y distribución de material publicitario

Perifoneo

El día 28 de agosto se realizó perifoneo en los barrios La Real, La Unión y El Rosario invitando a los beneficiarios de estos barrios a la capacitación sectorizada en Educación Sanitaria

2.5.1.7 Línea de Participación Comunitaria

El Proyecto de Conexiones Intradomiciliaria de agua potable y saneamiento Básico en el municipio de Rio Iró - CHOCO, el contratista de obra instaló el punto de atención a la comunidad en el Barro la Unión diagonal a la cancha de futbol, como lugar estratégico, para mejor ubicación de la comunidad los horarios de atención 2:00pm a 4:00pm de lunes a viernes, con el fin de facilitarle a comunidad que trabaja en el campo por fuera del municipio y regresan días después a sus hogares.

2.5.1.8 Punto de atención

El contratista de obra realizó la atención a la comunidad en el punto de atención principal el cual se encuentra identificado mediante un pendón ilustrativo, la atención a la ciudadanía

se realiza de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5;00 p.m. al cual durante el periodo de este reporte se acercaron 6 a solicitar información del proyecto, las mismas fueron atendidas por las profesionales sociales de obra. Durante este periodo no se atendieron personas en el punto.

2.5.1.9 Actividades con la veeduría

Se realizó un recorrido de obra por los cuatro barrios priorizados con el acompañamiento de dos miembros del comité veedor y profesionales sociales de la empresa de servicios publico obra e interventoría. En donde se validaron situaciones particulares en cada barrio intervenido, se realizó una retroalimentación del avance del proyecto en cada barrio, se logró el objetivo planteado en el recorrido.

2.5.1.10 Recepción y trámite de las PQRS

Durante el periodo reportado en el presente informe se recepcionó cuatro (04) PQR por quejas. Cabe informar que, las 6 PQR que se encuentran abiertas a corte del presente informe son por quejas técnicas. Asimismo, se le recomendó al contratista de obra realizar la atención y cierre de las mismas en los tiempos establecidos en la normatividad vigente

No. de PQR Recepcionadas en el mes	No. de PQR totales	No. de PQR pendiente de respuesta	No. de PQR cerradas
04	234	6	228

Tabla 17. Relación de PQR recibidas y cerradas

Fuente: Autor

CONSECUTIVO	CODIGO	MOTIVO	ESTADO	FECHA PARA CERRAR O FECHA DE CIERRE
103	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	Mal manejo de residuos	CERRADA	30/01/24
104	CH-RI-BN-M2-IN-VE-007	Material que obstruía el paso	CERRADA	04/04/24
105	CH-RI-BN-M1-VE-037	Demora en las obras	CERRADA	18/03/24

106	CH-RI-BN-M10-VE-017	Demora en las obras	CERRADA	01/03/24
111	CH-RI-BN-M1-VE-131	Demolición del mesón	CERRADA	22/02/24
114	CH-RI-BN-M5-VE-148	Demora en las obras	CERRADA	12/03/24
119	CH-RI-BN-M1-VE-027	Demora en las obras	CERRADA	14/03/24
120	CH-RI-BN-M1-VE-029	Demora en las obras	CERRADA	05/03/24
121	CH- RI-BN-M1-VE-126	Por concertación con la señora, ya se definió que se va a realizar, falta de atención por el área técnica	CERRADA	05/05/2024
123	CH-RI-BN-M7-IN-VE-013	Solicitud de intervención	CERRADA	18/03/24
127	CH-RI-BN-M1-VE-138	Utilización de material	CERRADA	07/03/24
128	CH-RI-BN-M1-VE-059	Demora en las obras. Por falta de materiales como el pegante para el enchape.	CERRADA	07/0372024
157	CH-RI-BN-M8-VE-072	Demora en las obras. La vivienda no se ha podido entregar debido a que falta pintura en la adecuación, esto se debe a que no se podido ingresar a la vivienda, por el estado de salud de las hijas del beneficiario.	ABIERTA	
164	CH-RI-BN-M5-VE-148	Fuga en lavadero	CERRADA	09/04/24
165	FERRETERIA	Deuda	CERRADA	19/04/24
166	CH-RI-BN-M5-VE-148	Lavaplatos tapado	CERRADA	09/04/24
170	CH-RI-BN-M10-VE-086	Demora en las obras, la cual no se ha podido entregar porque no hay conexión de alcantarillado y la alcaldía quedo con el compromiso de realizar la conexión	CERRADA	31/05/24
171	CH-RI-BN-M10-VE-087	Demora en las obras	CERRADA	28/05/2024
172	CH-RI-BN-M7-IN-VE-034	Fuga en lavamanos. El equipo técnico realizo acercamiento a la vivienda y no evidencio fuga	CERRADA	28/05/2024

174	CH-RI-BN-M6-VE-158	Demora en las obras, la cual no se ha podido entregar debido a que falta la instalación del lavadero, el cual no hay disponibilidad del elemento	CERRADA	25/06/2024
175	CH-RI-BN-M7-VE-049	Agua resumida. No se ha cerrado la PQR. Falta de seguimiento técnico.	CERRADA	20/06/2024
176	CH-RI-BN-M8-VE-066	Fuga en lavaplatos	CERRADA	19/04/24
177	CH-RI-BN-M4-VE-179	Muro fisurado	CERRADA	22/05/2024
178	CH-RI-BN-M1-VE-140	Malos olores en la caja de inspección	CERRADA	18/04/24
179	CH-RI-BN-M10-VE-095	Agua salía por cimentación	CERRADA	23/04/2024
180	CH-RI-BN-M6-VE-116	Entrega de la unidad sanitaria, tiene múltiples observaciones.	CERRADA	19/04/2024
181	CH-RI-BN-M1-VE-130	Fuga en lavamanos	CERRADA	18/04/24
182	CH-RI-BN-M1-VE-034	Empozamiento en la ducha	CERRADA	26/06/24
183	CH-RI-BN-M8-VE-071	Intervención y entrega. No se ha entregado porque no hay lavadero	CERRADA	25/06/24
184	COLEGIO	Compromiso con la rectora, realizar una mesa de trabajo, para concertar la solución del cierre de la queja	CERRADA	03/06/24
185	CH-RI-BN-M7-IN-VE-004	Anulación tubo de desagüé	CERRADA	03/05/2024
186	MATADERO	Tubo de desagüe del matadero, falta de seguimiento y concertación, por parte del contratista de obra	CERRADA	24/06/2024
188	CH-RI-BN-M1-VE-037	Inodoro no llena	CERRADA	30/04/2024
189	CH-RI-BN-M1-IN-VE-024	Demora en las obras falta de materiales y priorización de las viviendas con casos particulares (adulto mayo)	CERRADA	29/05/2024

193	RESTAURANTE	Deuda Oscar Mendez	06/05/2024	CERRADA
194	CH-RI-BN-M5-VE-157	Perdida de un balde y 3 vasos metálicos	30/06/2024	CERRADA
195	CH-RI-BN-M6-IN-VE-047	Demora en las obras	20/06/2024	CERRADA
196	CASA LA RELY	Deuda alquiler	09/05/2024	CERRADA
197	CASA DE B. NUEVO	Deuda alquiler	CERRADA	05/05/2024
198	CH-RI-BN-M7-VE-028	Fuga en lavamanos	CARRADA	10/05/2024
199	CH-RI-BN-M5-IN-VE-006	Demora en las obras	CERRADA	20/06/2024
201	CH-RI-BN-M10-VE-085	Demora en las obras	CARRADA	15/06/2024
203	CH-RI-BN-M1-VE-128	Demora en las obras	CARRADA	30/07/2024
228	CH-RI-BN-M3-IN-VE-051	Perdida de cajas de cervezas	ABIERTA	
229	CONDUCTOR	Choque de camionetas	CERRADA	18/08/24
230	SERVICIO DE INTERNET	Alambres tumbados	ABIERTA	
232	LINO MOSQUERA	Tapa del manjol dañada por el contratista de obra	ABIERTA 16.8.24	
233	JAVIER TUIRAN	Pagos de corte	ABIERTA 16.8.24	
234	PEDRO ANGEL	La intervención afecta la casa vecina	ABIERTA 23.8.24	
235	JOSE MOSQUERA	Pago de incapacidad	ABIERTA 30.8.24	

Tabla 18. Relación de Estados de PQR por Quejas Técnicas

Fuente: Autor

2.5.1.11 Buzón de sugerencias

El equipo social de contratista de obra e interventoría, realizaron semanalmente revisión de los buzones de sugerencia en los cuatro barrios priorizados, la cual se llevó a cabo los días sábado.

2.5.1.12 Recorrido de barrio

Durante este periodo NO se realizaron recorridos por parte de los equipos técnicos y sociales de obra e interventoría.

2.5.2 Línea de Capacitación

2.5.2.1 Capacitación masiva en educación sanitaria

No aplica para el presente periodo.

2.5.2.2 Capacitación sectorizada:

El 28 de agosto del presente año se llevó a cabo la capacitación sectorizada en educación sanitaria, a la cual se convocó a los beneficiarios de los barrios La Real, La Unión y El Rosario, esta se desarrolló en las instalaciones del Centro de Vida Adulto Mayor, contando con una asistencia de 25 beneficiarios del proyecto y dentro los cuales asistieron dos integrantes del comité veedor. Durante la reunión se les capacito en temas relacionados a la salud e higiene, uso adecuado de los aparatos sanitarios, uso adecuado de las redes de acueducto y alcantarillado y uso eficiente del agua, se logró la participación activa de los deficitarios y la satisfacción de poder recibir las obras que nunca habían podido ejecutar con recursos propios según lo manifestaron los veedores del proyecto.

2.5.2.3 Capacitación casa a casa

En el transcurso del mes, se continuo con las entregas de unidades sanitarias y adecuaciones en las viviendas , una vez que la interventoría recibe las intervenciones, el equipo social de obra e interventoría procede a realizar la capacitación casa a casa en educación sanitaria y la instalación de acrílico, en la cual se le brindan recomendaciones a los beneficiarios para el uso y mantenimiento de la unidad sanitaria, durante este periodo se realizó capacitación casa a casa a 52 viviendas.

2.5.3 ACTIVIDADES SOCIALES COMPLEMENTARIAS

2.5.3.1 Comité Social

Durante este periodo, NO se realizó comité social

2.5.3.2 Capacitación a personal de mano de obra no calificada

Durante este periodo se realizó recomendaciones al personal de mano de obra No calificada con el fin de poder ejecutar los códigos de la mejor manera.

El 9 de agosto del presente año se llevó a cabo una reunión con el personal de mano de obra no calificada del proyecto En el Barrio La Unión, a la cual asistieron 43 trabajadores y se contó con la presencia del personero municipal, Residentes técnicos y sociales de obra e interventoría. Durante el desarrollo de esta reunión se tocaron temas como la falta de materiales en la obra, la demora en los pagos, acuerdos de fecha de pagos y el buen trato al personal de mano de obra no calificada.

2.5.3.3 Memoria Social

Durante este periodo se realizó selección del beneficiario del barrio El Rosario para la memoria social del proyecto, el cual aceptó participar libre y voluntariamente, así mismo, firmó el consentimiento informado y se diligenciaron los formatos del Antes de las memorias social.

Beneficiario del Barrio El Rosario: CH-RI-ER-M7-VE-027

Segundo María Perea Perea

CC: 4827946 De Condoto

dirección: 003-00001210

Diagnóstico: Unidad sanitaria tipo 2 con lavadero y lavaplatos

Cabe resaltar, que se logró realizar las actividades programadas desde el área social sin dificultades de igual forma, se contó con el apoyo de los miembros de la veeduría del proyecto.

2.6 PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST

2.6.1 Subprograma seguridad industrial

2.6.1.1 Actividades

Cumplir y hacer cumplir al Contratista en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos laborales), así como el cumplimiento de pago

de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

Cumplir y hacer cumplir al contratista los protocolos de bioseguridad.

2.6.1.2 Actividades realizadas enfocadas en prevención

Entrega de elementos de protección personal

A la hora de combatir los riesgos de accidentes y perjuicios para la salud, es necesario utilizar la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar riesgo en su origen o proteger a los empleados mediante las disposiciones de protección colectiva.

Cuando las medidas son insuficientes, se impone la utilización de equipos de protección personal (EEP), con el fin de prevenir los riesgos laborales. Desde el punto de vista técnico, los EPP actúan disminuyendo algunos de los componentes factoriales de riesgo.

Por lo anterior, el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL, durante el mes de agosto de 2024 ha suministrado a los trabajadores que hacen parte de la Actividad 3 en el momento de su vinculación laboral y/o antes de su ingreso al puesto de trabajo asignado los elementos de protección personal requeridos para la labor a efectuar en este caso la fase constructiva.

Cabe señalar que, esta interventoría ha solicitado al contratista de obra implementar medidas para garantizar que todo el personal de obra y administrativo cuente con todos los implementos de seguridad requeridos. Por tal motivo, es importante señalar que si bien la interventoría ha realizado los recorridos de validación de EPPs y su utilización, es importante establecer que la interventoría puede dar fe de su uso de los profesionales o trabajadores de mano de obra que han sido informados de manera oportuna y en debida forma, es por esta razón que se advierte que sin perjuicio a las validaciones efectuadas por la interventoría, es responsabilidad del contratista de obra garantizar que todo el personal en obra cuente con las condiciones de seguridad y protección; en tal sentido recae sobre el contratista de obra todas las responsabilidades que se tengan con el personal contratado a su nombre y aquel que no haya sido informado a la Interventoría.

2.6.1.3 Accidentalidad en obra

Durante el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2024, se presentó un accidente laboral dentro de sus actividades desarrolladas en el periodo descrito. Cabe señalar que el contratista de obra efectúa las labores de reporte a la ARL.

2.6.1.4 Inspecciones realizadas.

En el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2024, se realizó inspecciones en obra por parte de la Interventoría. Cabe señalar que, la interventoría realiza recorridos de validación de actividades en obra referente al componente PGIO.

ÍTEM	INSPECCIÓN	FECHA
1	Inspección de elementos de protección personal (Epp)	02/08/2024 15/08/2024 29/08/2024
2	Inspección de Extintores	30/08/2024
3	Inspección de Botiquín	30/08/2024
4	Inspección Locativa	30/08/2024

Tabla 19. Inspecciones

Fuente: Autor

2.6.1.5 Identificación y factores de riesgo

La interventoría verificó que dentro de la matriz de riesgos suministrada dentro del plan de calidad y durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2024, no ha sido modificada ni se ha incluido valor o dato alguno por el contratista y por ende esta interventoría continua con el seguimiento y revisión de acuerdo a los factores señalados por el contratista.

2.6.1.6 Índice de accidentalidad

Durante el periodo se presenta un accidente en obra del personal a cargo del CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL.

2.6.1.7 Afiliaciones y pagos de seguridad social

El contratista ha presentado las planillas de aportes al sistema de seguridad social, los cuales han sido revisados y verificados por esta interventoría; cabe señalar que, aunque el contratista no ha aportado las planillas de manera oportuna dentro de los plazos establecidos, se ha podido validar que el personal que es aportado por el contratista en la relación de personal o listado de obra, cuenta con las afiliaciones al sistema de seguridad social y ARL.

Es importante señalar que, si bien la interventoría ha realizado la validación de planillas aportadas por el contratista de obra, se advierte que la misma es revisada y/o aprobada bajo el principio de la buena fe del contratista. Ahora bien, se advierte que, sin perjuicio a las validaciones efectuadas por la interventoría, es responsabilidad del contratista de obra garantizar a todo el personal en obra las condiciones de seguridad y protección; en tal sentido recae sobre el contratista de obra todas las responsabilidades que se tengan con el personal contratado a su nombre y aquel que no haya sido informado a la Interventoría.

El pago de aportes parafiscales correspondiente al mes de agosto es efectivo antes de la fecha de vencimiento de la planilla.

2.6.1.8 Relación de personal en obra (contratista de obra)

En el periodo del presente informe, la Interventoría reporta que el contratista de obra cuenta con el siguiente personal en obra profesional y adicional para la actividad No. 3:

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
JAIR ALFREDO	HERNANDEZ ANTONIO	1111199851	RESIDENTE DE OBRA
SADDY SOFIA	BELTRÁN GARCÍA	1100693213	PROFESIONAL SOCIAL
MARIA LIRIS	MOSQUERA MOSQUERA	1049373887	PROFESIONAL SOCIAL
LAURA CARELIS	ALVARES TAUTIVA	1110593683	ALMACENISTA
JUAN DAVID	TORRES DÁVILA	1076335432	INSPECTOR DE OBRA
VERÓNICA LIZBETH	ESCANDÓN POLANCO	1075222484	INSPECTOR DE OBRA
ALBERT STEVEN	FAJALOZANO	1110579517	INSPECTOR DE OBRA
NEURO RAFAEL	URDANETA ORTIZ	1235241152	INSPECTOR DE OBRA
MELISA	GONZALEZ SERNA	1077477808	INSPECTOR DE OBRA
LEIDIS MARGARITA	MONTERO POLONIA	1052089311	INSPECTORA PGIO
CAMILO	MOSQUERA MOSQUERA	1076331723	CONDUCTOR MOTO CARRO
JOSE ELSIA	MOSQUERA MOSQUERA	1030422170	AYUDANTE MOTO CARRO
JOSÉ ERMES	MOSQUERA RAMIREZ	71377421	AYUDANTE MOTO CARRO
JOSE ISAÍAS	BENÍTEZ QUINTO	9728682	AUXILAR DE ALMACÉN
ROBINSON	PEREA MOSQUERA	1193063956	AYUDANTE MOTO CARRO
JOSE EDIER	MOSQUERA MOSQUERA	1128084832	AUXILAR DE ALMACÉN

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
JORGE ANTONIO	MOSQUERA MOSQUERA	94060764	AUXILIAR MOTO CARRO
SEGUNDO MIGUEL	BARLIZA	1147943253	OFICIAL DE OBRA
ALDEMAR ANTONIO	DE LA HOZ PRENTH	8795213	OFICIAL DE OBRA
LUIS EDUARDO	CAMPO GUTIERREZ	1044624736	AYUDANTE DE OBRA
ALFREDO EDUARDO	MORENO AVILA	72209723	OFICIAL DE OBRA
DANIEL SEGUNDO	RODRIGUEZ RAMIREZ	5984930	OFICIAL DE OBRA
MIGUEL ALBERTO	ROMERO RAMIREZ	840044258	OFICIAL DE OBRA
JULIO	CONTRERAS MENDOZA	18880150	AYUDANTE DE OBRA
YSMARIS	PEREA BENITEZ	71686667	AUXILIAR DE ALMACEN
MANUEL	VASQUEZ DE LA HOZ	72300779	OFICIAL DE OBRA
JESUS NOLBERTO	IRIARTE URDANETA	1124362017	OFICIAL DE OBRA

Tabla 20. Personal Administrativo Contratista de Obra
Fuente: Autor

Durante este periodo, la interventoría cuenta con el siguiente personal Administrativo y operativo:

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Oscar Mauricio	Almario Fernández	1.077.862.072	Director De Interventoría Y Profesional De Costos Y Presupuestos
Víctor Luis	Murillo Ramírez	1.076.385.068	Residente Interventoría
Duvan Felipe	Mosquera Mosquera	1.007.448.719	Técnico PGIO
Cristian Alejandro	Otalora	1.051.240.481	Técnico PGIO
Candelaria	Gonzales Medina	26.883.989	Profesional Social
David Leonardo	Rozo Gasca	1.121.199.334	Especialista Estructural
Jorge Luis	Salaiman Lamadrid	79.214.426	Especialista Hidrosanitario
Cristian David	Galvis Najar	1.049.630.656	Especialista HSEQ
Luisa Fernanda	Herrera Jiménez	1.102.876.070	Inspector Interventoría

Tabla 21. Personal administrativo y operativo de Interventoría

Fuente: C&E Engineering SAS

2.6.1.9 Manejo de maquinaria y/o herramienta menor y/o papelería

Durante este periodo no se contó con maquinaria y/o equipos. Se aclara que únicamente se cuenta con herramienta menor como: pulidoras de diferentes pulgadas, cintas métricas, taladros, codales, palas, palustres, barras, cinceles, y picas; sin embargo, los mismos no hacen parte de equipos a ser relacionados en el presente proyecto.

De acuerdo al alcance contractual y tipología del proyecto no se cuenta con equipo y/o maquinaria propia y/o alquilada.

2.7 Plan de Gestión Ambiental

La interventoría revisa el cumplimiento de los programas ambientales incluidos en el plan de acción socio - ambiental - PASAO y cada uno de los aspectos mínimos de la Legislación Ambiental aplicables a la etapa inicial del proyecto conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Rio Iró realizando actividades y gestiones en el mes de agosto del 2024, con el fin de dar cumplimiento al plan de manejo ambiental.

2.7.1 Medidas de Manejo

El contratista ha entregado el certificado realizado por parte de la empresa prestadora de servicios públicos de la población donde se indica el permiso y el espacio otorgado en el centro de recolección de residuos sólidos de la comunidad, La interventoría seguirá supervisando el cumplimiento de este requisito para la actividad No. 3.

2.7.2 Gestión de residuos:

Los residuos ordinarios deben permanecer el menor tiempo posible dentro de la obra. Todos los residuos no reciclables, tales como empaques de mecato, papel carbón, servilletas, equipo de protección personal usado y residuos orgánicos como restos de comida, serán entregados al carro recolector de residuos del municipio. Cabe señalar que tanto el contratista de obra como interventoría se encuentran implementando la disposición de residuos en las oficinas.



Figura 2. Punto Ecológico
Autor: Autor

La interventoría verificó que el contratista lleve a las personas o empresas que están interesadas en recibir materiales reciclables, resultantes de las actividades del proyecto para que éstas se encarguen de su recolección semanal, transporte y gestión.

La interventoría verificó que el contratista cuente con una cuadrilla de limpieza del proyecto dotada de utensilios como palas escobas, y tendrán bajo su responsabilidad mantener los sitios de la obra en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de materiales de desecho. Cabe señalar que la interventoría ha efectuado las observaciones de limpieza al contratista de obra durante el periodo y ha validado que se encuentren adelantando las actividades correspondientes.

2.7.3 Medidas de Manejo Para Demarcación y aislamiento

La interventoría ha verificado, que el contratista esté cumpliendo con las medidas descritas a continuación

- Los materiales que están utilizando en la ejecución de la obra se estén almacenando en la bodega, en forma separada, identificándose y conservándolos con las recomendaciones de los proveedores, con el fin de conservar sus propiedades físicas hasta el momento de su utilización.
- El material se esté acopiando de tal manera que no se contamine o mezcle y que a cada frente de trabajo sea transportado con los materiales necesarios durante la jornada diaria, evitando así la acumulación de materiales.

- Los materiales permanecen tanto en su sitio de almacenamiento, como en el frente de trabajo, debidamente cubiertos con el fin de evitar la emisión de partículas y derrame hacia fuentes hídricas.
- Mantenimiento adecuado de los vehículos y así disminuir el proceso de combustión incompleta de los motores, para evitar emisiones de gases.

2.7.4 Actividades de capacitación y divulgación

La interventoría realiza acompañamiento al contratista una vez se dio inicio a la actividad No. 3, donde se efectuaron capacitaciones a su personal de trabajo con el fin de divulgar y dar a conocer cómo se implementará el plan de manejo ambiental tanto en obra como en las instalaciones de la oficina.

2.7.5 Manejo de residuos sólidos diferentes a RCD

La limpieza general del área administrativa se deberá realizar cada 3 días de la semana, Para realizar la recolección de los residuos, se utilizan los elementos de protección personal necesarios y las herramientas adecuadas.

Los residuos sólidos generados en la oficina, deberán ser depositados en las canecas ubicadas para tal fin, como se detalla en la Figura 2. Punto Ecológico.

2.7.6 Manejo de residuos sólidos RCD

Debido a que en la jurisdicción del municipio de Rio Iro no hay escombrera certificada para efectos de los materiales sobrantes provenientes del proyecto estos son donados a miembros de la comunidad que los requieran o depositados en zonas degradadas por la minería, el contratista obtuvo una certificación expedida por el secretario de planeación y obras públicas del municipio de Rio Iro, donde manifiestan la inexistencia de la misma y la alternativa para cumplir con este apartado de gestión ambiental.

ANEXOS

CONTRATO	2230219
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
LINEA DE NEGOCIO	ORDEN DE SERVICIO No. 2230219 (INTERVENTORÍA), DEL INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO No. ICM-009-2023. LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE RIO IRÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ALCANCE	El alcance de LA INTERVENTORÍA para la orden de servicio es el seguimiento, control y la vigilancia de la ejecución a las acciones realizadas por el contratista de obra en el Municipio de Rio Iró, en el Departamento de Chocó, según lo que se detalla en el contrato de obra y sus anexos, los cuales se resumen a continuación: 1. ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10. 2. ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 3. ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. 4. ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3.
VALOR:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 396.843,968,13)
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio
CONTRATISTA:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S
PLAZO:	SIETE (7) MESES Y MEDIO

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías: 21-45-101415928 Y 21-40-101214825 (Seguros del Estado)

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
21-45-101415928	14/07/2023	CUMPLIMIENTO	Desde 14/07/2023 hasta 01/11/2024	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio	$ 119.053.191,00
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	Desde 14/07/2023 hasta 01/03/2027			$ 39.684.397,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	Desde 01/03/2024 hasta 01/03/2027			$ 119.053.191,00
21-40-101214825	14/07/2023	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Desde 14/07/2023 hasta 01/03/2024	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio	$ 290.000.000,00
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES				$ 290.000.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL				$ 290.000.000,00
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS				$ 290.000.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS				$ 290.000.000,00
		RESPONSABILIDA CIVIL CRUZADA				$ 290.000.000,00

En consecuencia, se procede a la iniciación de la ORDEN DE SERVICIO el día 24 del mes agosto del año 2023, el cual debe concluir el día 08 de Abril del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	**Firma**
NOMBRE: MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO **SUPERVISOR** **ENTerritorio**	**NOMBRE: OSCAR MAURICIO ALMARIO F.** **REPRESENTANTE LEGAL** **CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS** **INTERVENTORIA**

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por el Supervisor	2023220033351 del 24 de agosto de 2023
2	Aprobación de Personal	Radicado por el Supervisor	0232200118801 del 01 de agosto de 2023
3	Permisos y licencias: • Construcción • Ambientales • Disponibilidad servicios públicos • Otros que apliquen: _____		

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

eterritorio	**ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS**	CÓDIGO:	**F-GG-56**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-26**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO	2230223
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LINEA DE NEGOCIO	QUINTA ORDEN DE TRABAJO (ORDEN DE TRABAJO No. 2230223 - OBRA), DEL INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO No. ICM-005-2023. LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE RIO IRÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ALCANCE	En el marco de la Quinta Orden de Trabajo se desarrollarán en el Municipio de Rio Iró, en el Departamento de Chocó las siguientes actividades: 1. ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10. 2. ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 3. ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. 4. ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3. El alcance contempla los componentes señalados en el DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA NECESIDAD del proceso de selección ICM-005-2023.
VALOR:	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($4.164.944.717,87) M/CTE
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
PLAZO:	SIETE (7) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías: 96-45-1010-81330 Y 96-40-101064649 (Seguros del Estado)

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
96-45-1010-81330	10/08/2023	CUMPLIMIENTO	Desde 27/07/2023 hasta 27/10/2024	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio	$ 1.249.483.415,36
		BUEN MANEJO DE ANTICIPO				$ 805.225.665,88
		PRESTACIONES SOCIALES	Desde 27/07/2023 hasta 27/02/2027			$ 208.247.235,89
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	Desde 27/02/2024 hasta 27/02/2025			$ 416.494.471,79
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Desde 27/02/2024 hasta 27/02/2027			$ 1.249.483.415,36
96-40-101064649	11/08/2023	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Desde 27/07/2023 hasta 27/02/2024	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio	$ 832.988.943,57
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES				$ 832.988.943,57
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL				$ 416.494.471,79
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS				$ 416.494.471,79
		RESPONSABILIDA CIVIL CRUZADA				$ 416.494.471,79
		GASTOS MEDICOS				$ 416.494.471,79
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	Desde 09/08/2023 hasta 27/02/2024			$ 416.494.471,79

En consecuencia, se procede a la iniciación de la ORDEN DE TRABAJO el día 24 del mes agosto del año 2023, el cual debe concluir el día 24 del mes Marzo del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	**Firma**
NOMBRE: OSCAR MAURICIO ALMARIO F. **REPRESENTANTE LEGAL** **CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS** **INTERVENTORIA**	**NOMBRE: JOSE LUIS RADA RAYO** **REPRESENTANTE LEGAL** **CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL** **CONTRATISTA**

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por interventoría	20234300278022 del 24 del agosto de 2023
2	Aprobación de Personal	Radicado Por Interventoría	20234300278152 del 24 de agosto de 2023.
3	Permisos y licencias: • Construcción • Ambientales • Disponibilidad servicios públicos • Otros que apliquen: _____		

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

SALVEDAD DEL CONTRATISTA AL ACTA DE OBRA:
Se firma el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 2230223 para iniciar las actividades 1 y 2 correspondientes a:
••Actividad 1: Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
••Actividad 2: Diagnóstico, concertación y plan de intervención.
Si a los treinta (30) días de iniciado el Contrato de Obra No. 2230223, el puente del Corregimiento de La Encharcazon que atraviesa el Rio Iro no se encuentra en operación; el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL manifiesta que de ser así, se imposibilita el suministro de materiales para el inicio de la Actividad 3 "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias acta de entrega y recibo de las obras", por lo cual, se deberá proceder a dar la suspensión del Contrato de Obra No. 2230223.

JOSE LUIS RADA RAYO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL

OBSERVACIONES Y SALVEDADES DE LA INTERVENTORÍA:
La Interventoría se regirá de acuerdo a a las disposiciones y/o acuerdos y/o condiciones establecidas en la Orden de Trabajo No. 2230223 y/o documento de caracterización y/o Análisis o Matriz de Riesgos, Especificaciones Técnicas, y demás requisitos establecidos en el Proceso de selección No. ICM-005-2023 y demás documentos que hagan parte de la Orden de trabajo o proceso de selección y /o normatividad vigente aplicable al proyecto. Así mismo efectuará el respectivo seguimiento y control a la orden de trabajo de acuerdo a lo establecido en la Orden de Servicio No. 2230219 y/o Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio y/o normatividad vigente aplicable.

OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C&E ENGINEERING SAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Rubis Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420.762 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00001350, identificado con el código No. CH-RI-~~ER~~-M7 -VE-013, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria el desvio de la tubería de desagüe de la vivienda de 3 pulgada que sale en dirección a la ubicación de la unidad sanitaria a construir. Dicha actividad será realizada por la misma beneficiaria. De igual manera, se concerta la perforación de un muro con el fin de instalar la tubería intradomiciliaria de la unidad a construir; es de recalcar que dicha actividad la realizará la misma beneficiaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 30 mes Agosto del año 2024.

María Rubis M
NOMBRE BENEFICIARIO: María Rubis Mosquera Mosquera
C.C. 1030420762

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Jurga Herrera
Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA,
NOMBRE: Arnedo Hernandez

Victor Murillo R
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Crispin Masquera Masquera identificado con cédula de ciudadanía No 18.508.666 de Dosquebrada con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-00000460, identificado con el código No. CH-RI-ER -M4 -VE-066, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el cambio de ubicación de la unidad Sanitaria, dado a que las niveles necesario para la instalación de tubería intradomiciliaria Sanitaria no cumple. Por lo tanto, se traslada a un punto donde cumpla. y así garantizar el correcto funcionamiento de la red. De igual manera, se realiza el cambio de ubicación del lavaplato el cual quedará perpendicular a la unidad Sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoría.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Agosto del año 2024.

Crispin

NOMBRE BENEFICIARIO: Crispin Masquera Masquera
C.C. 18.508.666.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz.

Luisa Herrera
Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Victor Murillo R
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Nimio Mosquera Copete identificado con cédula de ciudadanía No 1190511 de Tado con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección D02-00000530, identificado con el código No. CH-RI-ER-M4-VE-061, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario la demolición de dos elemento de concreto necesario para la instalación de la tubería de 4 pulgada para la construcción de la unidad Sanitaria. El beneficiario se compromete a realizar dicha actividad.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Agosto del año 2024.

Nimio

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Nimio Mosquera Copete.
C.C. 1190511

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Bianney Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11637.005 de Istmina con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000013810, identificado con el código No. CH-RI-~~ER~~ -M4 -VE-068, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario romper la viga posterior de la vivienda, dado a que esta interfiere el paso de la tubería Sanitaria, la wal debe llegar hasta la caja de la domiciliaria. El propietario se compromete hacer la respectiva demolición.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 28 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Bianney Mosquera Perea.
C.C. 11637.005.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Francisco Gabriel Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 4.826.277 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-00000490, identificado con el código No. CH-RI-ER-M4-VE-063, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario la demolición de dos elementos de concreto necesario para la instalación de la tubería de 4 pulgada para la construcción de la Unidad Sanitaria. El beneficiario se compromete a realizar dicha actividad.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 28 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Francisco Gabriel Mosquera
C.C. 4.826.277.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Fernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Francisco Gabriel Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 4.826.277 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-00000490, identificado con el código No. CH-RI-ER -M 4 -VE- 063 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO.

Se concerta con el beneficiario la realización de una canal en el techo preexistente para desviar las aguas lluvias a una bajante donde no caiga el agua directamente a los muros del baño.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Francisco Gabriel Mosquera
C.C. 4.826.277.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Ana Rosa Mosquera de Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No 26.320.023 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo., en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-83000011024, identificado con el código No. CH-RI-BN-M1 -VE-008, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria el desmonte del techo donde está ubicada la unidad sanitaria existente. Así mismo, la demolición del piso y el despeje del área para la intervención de la nueva unidad sanitaria. De igual manera debe quitar el fogon de leña para la construcción del lavaplato y el lavadero.

La presente acta se firma en presencia de la interventoría.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 21 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Ana Rosa Mosquera de Sanchez
C.C. 26.320.023.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Albeiro Mosquera Perea identificado con cédula de ciudadanía No 71.318.702 de Medellin con domicilio en la ciudad de Río Inó en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000111022, identificado con el código No. CH-RI-BN-M1-VE-005, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se Concerta con el beneficiario el desmonte y despeje del area de intervención de la nueva unidad sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 21 mes Agosto del año 2024.

Jose Albeiro Mosquera

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Albeiro Mosquera Perea
C.C. 71368702

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Aureliano Sanchez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420.574 de Istmina con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830 00011030, identificado con el código No. CH-RI-BN-M1-IN-VE-084, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario el desmonte y despeje del área de intervención de la unidad Sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 21 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Aureliano Sanchez Mosquera.
C.C. 1030.420.574.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Fanny Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1128.084.174 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002119, identificado con el código No. CH-RI-BN-M1-VE-018, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria la demolición y despeje del área de intervención de la nueva unidad Sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Fanny Mosquera Mosquera
C.C. 1128.084.174.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Ruby Valdez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1133699006 de Río Ito con domicilio en la ciudad de Río Ito en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000110028, identificado con el código No. CH-RI-BN -M1 -VE-011, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria la demolición de la pared del frente izquierdo. Asi mismo, debe realizar el desmonte del baño existente.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Ruby Valdez Mosquera
C.C. 1.133.699.006

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Victor Murillo R

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Yeisa Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420.187 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000109174, identificado con el código No. CH-RI-BN-M7-VE-002, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria el cambio de tipologia de Tipo 1 a tipo 2. Asi mismo, realizar el despeje del area de intervención de la Unidad Sanitaria Por otro lado, se le indica al beneficiario el desvio de las agua lluvia exteriores para poder realizar la construcción del lavadero.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto del año 2024.

María Yeisa Perea Mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: María Yeisa Perea Mosquera
C.C. 1030.420.187.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Lisa Herrera
Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Victor Murillo R
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Juileo Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 1.030.420.215 de Quibdó con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000010978, identificado con el código No. CH-RI-BN-M7-VE-001, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario el cambio de tipología de T1 a tipo 2. También se solicita el despeje del área del lugar de construcción de la unidad sanitaria Así mismo se le informa al beneficiario que el desague del agua del lavadero queda anulado para el fin de la construcción.

La presente acta se firma en presencia de la interventoría.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Juileo Mosquera Mosquera
C.C. 1.030.420.215

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Genis Perea Perea identificado con cédula de ciudadanía No 1128.088.812 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000109158, identificado con el código No. CH-RI-BN-M7-VE-012, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria el desmonte del techo y del área para la intervención.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Genis Perea Perea
C.C. 1128.088.812.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Fernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Muñoz R

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Cruz Yarleni Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 1030.421.299 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002154, identificado con el código No. CH-RI-BN -M7 -VE-013, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria el desmonte del techo existente para la intervención de la unidad Sanitaria Así mismo, el fogon de leña.

La presente acta se firma en presencia de la interventoría.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto del año 2024.

Cruz Yarleni Mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: Cruz Yarleni Mosquera Mosquera
C.C. 1030421299

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Alicia Hurtado Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1128.084.798 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002156, identificado con el código No. CH-RI-BN-M7-VE-014, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria el desmonte del techo existente donde se va a realizar la intervención de la unidad Sanitaria. Así mismo, quitar el fogon de leña para dicha construcción.

La presente acta se firma en presencia de la interventoría.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto del año 2024.

María Alicia H M
NOMBRE BENEFICIARIO: María Alicia Hurtado Mosquera
C.C. 1128 084 798

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: VICTOR Murillo R

VICTOR Murillo R

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Cirleny Perea Perea identificado con cédula de ciudadanía No 1128. 084. 836 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004 - 00002158, identificado con el código No. CH-RI-BN -M7 -VE-015, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria la demolicion, despeje y adecuación del área para la intervención de la nueva unidad sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto. del año 2024.

maria sirlenis Perea
NOMBRE BENEFICIARIO: María Cirleny Perea Perea.
C.C. 1128.084.836.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Fernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Israel Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11937.787. de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo., en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002160, identificado con el código No. CH-RI-BN-M7-VE-016, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario el despeje y desmonte del área de intervención de la unidad Sanitaria. Asi mismo, debe quitar el fogon de leña.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Israel Perea Mosquera
C.C. 11.937.787

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Rosa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto. del año 2024.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Bensasnive Mosquera Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No 1133699038 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000011026, identificado con el código No. CH-RI-BN-M1-VE-009 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concarta con la beneficiaria el despeje del techo para la construcción de la unidad Sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto del año 2024.

Bensasnivemosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: Bensasnive Mosquera Sanchez
C.C. 1133.699.038

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Victor Murillo R
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Clinson Benitez Martinez identificado con cédula de ciudadanía No 1128.084.766 de Tadó con domicilio en la ciudad de Rio Pto en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-83000011240, identificado con el código No. CH-RI-BN -M1 -VE-198, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. El beneficiario se compromete a cubrir la tubería de 4 pulgada al momento de la construcción de la unidad sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Agosto del año 2024.

Clinson Benitez
NOMBRE BENEFICIARIO: Clinson Benitez Martinez
C.C. 1128.084.766.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Arggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Silveria Perea Perea. identificado con cédula de ciudadanía No 26.317.013 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00000880, identificado con el código No. CH-RI-ER-M3-VE-069, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria la demolición y despeje del área de intervención de la unidad Sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 14 mes Agosto. del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Silveria Perea Perea
C.C. 26.317.013

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luis Arley Hurtado Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420.355 de Tadó con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000006800, identificado con el código No. CH-RI-ER -M1 -VE-119., recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario la demolición y despeje del área de intervención de la unidad Sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 14 mes Agosto del año 2024.

Luis ARLEY H.M.
NOMBRE BENEFICIARIO: Luis Arley Hurtado Mosquera
C.C. 1030420355

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Teresa Herrera
Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Victor Murillo R
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jesus Eril Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11.708.978. de Istmina con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Real, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000 14210, identificado con el código No. CH-RI-LR -M3 -VE- 027 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO.

Se concerta con el beneficiario la no realizacion de la actividad de pintura.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 13 mes Agosto del año 2024..

Jesus Eril M. M.
NOMBRE BENEFICIARIO: Jesus Eril Mosquera Mosquera.
C.C. 11 708 978

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Munoz R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María de los Santos Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26.320.265 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003450, identificado con el código No. CH-RI-ER -M2 -VE-103, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria la ubicación de la unidad sanitaria pegada a la pared derecha del lugar designado, dando a que en la pared izquierda donde estaba contemplado no cumple con los niveles ni altura del techo de acuerdo a las especificaciones técnicas. del proyecto.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 12 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: María de los Santos Mosquera M.
C.C. 26.320.265.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jousa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: VICTOR Murillo R

VICTOR Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Romulo Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 4.827.867 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00001110, identificado con el código No. CH-RI-ER -M3 -VE-079 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario la reubicación de la unidad sanitaria proyectada en el diagnóstico inicial y sera trasladada en la parte del frente donde se encuentra ubicado el fogon de leña y la chimenea. por lo cual, se le solicita al beneficiario el despeje del área.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 09 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Romulo Mosquera
C.C. 4.827.867.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jenny Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Isaias Quinto Beritez identificado con cédula de ciudadanía No 9.728.682. de Armenia con domicilio en la ciudad de Río Inó en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003500, identificado con el código No. CH-RIER-MZ-IN-VE-020, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario la demolición de dos (2) vigas que obstaculizan el paso de la tubería de 4 pulgada, donde el beneficiario se hace responsable de cualquier falla estructural que provogue esta demolición.

La presente acta se firma en presencia de interventoría.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 08 mes Agosto del año 2024.

Jose Isaias Quinto
NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Isaias Quinto B.
C.C. 9728682

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Luisa Herrera
Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Víctor Murillo R
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Víctor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Tsleardo Sanchez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11.936.784 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000007390, identificado con el código No. CH-RI-ER-MZ-INVE-022, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario despejar el área de intervención de la unidad Sanitaria Así mismo, debe cortar la viga de amarre para obtener la altura de la Unidad.

La presente acta se firma en presencia de la interventoría

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 08 mes Agosto del año 2024.

.Esleardo
NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Tsleardo Sanchez M.
C.C. 11 936.784.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Wilder Alirio Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1.000.535.063 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003140, identificado con el código No. CH-RI-W -M -VE-012, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario no realizar el muro posterior del lavaplato teniendo presente que con el muro existente, el lavaplato va quedar en diagonal siguiendo la linea del muro existente.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 08 mes Agosto del año 2024.

wilder alirio mosquera

NOMBRE BENEFICIARIO: Wilder Alirio Mosquera M.
C.C. 1000535063

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose del Carmen Hurtado Asprilla identificado con cédula de ciudadanía No 1.590.383. de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003610, identificado con el código No. CH-RI-ER -M1 -VE-116, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario el cambio de tipología de tipo 2 a adecuación debido a que al beneficiario no cuenta con los recursos para realizar la demolición del las paredes del baño existente, además, la nueva unidad le ocupaba espacio que el beneficiario no esta dispuesto a ceder.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 08 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose del Carmen Hurtado Asprilla
C.C. 1590383

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Francisca Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030.421.707 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00003601, identificado con el código No. CH-RI-ER-M1-VE-115, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria la demolición de los muros de la unidad existente y el realce de la cubierta para obtener la altura de la Unidad Sanitaria. Así mismo, adecuar completamente el área para dicha intervención.

La presente acta se firma en presencia de la interventoría

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 08 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Francisca Mosquera
C.C. 1030.421.707.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Nubia Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26.320.234 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000017310, identificado con el código No. CH-RI-LU -M4 -VE-043. recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. La beneficiaria manifiesta que no desea que se le instale el elemento del lavaplato porque el de ella se encuentra en buen estado y es más grande, por tal motivo, no desea que el proyecto le realice la instalación del misma

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 01 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Nubia Mosquera M.
C.C. 26.320.234.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Luisa Herrera
Vo.Bo. INSPECTOR DE ~~INTERVENTORÍA~~
NOMBRE:

Vo.Bo. ~~RESIDENTE~~ DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Víctor Murillo R
Vo.Bo. RESIDENTE DE ~~INTERVENTORIA~~
NOMBRE: Víctor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luz Ayda Lemuz Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1128.084.287 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Unión., en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00004029, identificado con el código No. CH-RI-LU -M4 -VE- 041, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO.

La beneficiaria manifiesta que al momento de la construcción del lavaplatos y lavadero, ella solicitó que se le dejará el lavaplatos con una altura de 80 cm y el lavadero con altura de 60 cm (mocheta), por lo que ella va a hacer remodelación de su piso.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 01 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Luz Ayda Lemuz Mosquera
C.C. 1128.084.287

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Fernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Melfina Sanchez de Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26.319.845. de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3360, identificado con el código No. CH-RI-ER-M9-VE-096, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria el cambio de tipología de tipo 2 a adecuación debido a que no cuenta con más espacio al interior de la vivienda. conforme a lo estipulado a la especificaciones del proyecto.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 31 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Melfina Sanchez M.
C.C. 26.319.845.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Ximia Perea. Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 39.799.451 de Bogotá con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000007760, identificado con el código No. CH-RI-ER -M9 -VE-098, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria la instalación de la viga de amarre de la unidad Sanitaria existente. para la intervención de la adecuación.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 31 mes Julio del año 2024.

Ma Ximia Perea
NOMBRE BENEFICIARIO: María Ximia Perea M.
C.C. 39799451

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernando.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Munllo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Leonor Sara Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 35.587.735. de Tadó con domicilio en la ciudad de Río Ind en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00001130, identificado con el código No. CH-RI-~~ER~~ -M3 -VE- 075 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiarga el despeje y demolición del área del baño existente, tambien se concerta con la beneficiana correr la puerta con el fin de tener las medidas y especificaciones del proyecto.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 30 mes Julio del año 2024.

Leonor P.
NOMBRE BENEFICIARIO: Leonor Sara Perea Mosquera
C.C. 35.587.735.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jesus Domingo Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 1199 5053 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830 0009170, identificado con el código No. CH-RI-~~ER~~-M8 -VE-002, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario la nueva ubicación de la unidad Sanitaria la cual se va a realizar en el área donde esta ubicada la casina existente. ya que donde inicialmente se habia diagnosticado la tuberia quedaria encontrapendiente. al punto de llegada a la caja domiciliaria lo que les generaba subir más el techo de la vivienda. y no se puede porque es a dos vuelva el agua lo cual generaría que al momento de lluvia se le devuelva el agua y sufriría inundaciones (afectaciones).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 30 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jesus Domingo Mosquera M.
C.C. 1199 5053.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Gildardo Antonio Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 4.827.940 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3530., identificado con el código No. CH-RI-ER-M2-VE-111, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario la adecuación de la unidad Sanitaria existente, construyendo la viga aerea de amarre y la manposteria para la instalación de la puerta.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio del año 2024.

Gildardo A.P.M
NOMBRE BENEFICIARIO: Gildardo Antonio Perea M.
C.C. 4827940

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jorge Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Carlino Benitez Hurtado identificado con cédula de ciudadanía No 4.827.967. de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3640, identificado con el código No. CH-RI-ER -M1 -VE-118, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario el despeje del área para la construcción de la unidad sanitaria que incluye la demolición de la mampostería de la habitación.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Carlino Benitez H
C.C. 4.827.967

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Leonor Sara Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26.320.209 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00001100, identificado con el código No. CH-RI-~~ER~~-M3 -VE-081, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria el cambio de tipologia de tipo 2 a adecuación, Asi mismo la construcción de la viga aerea de amarre de la unidad Sanitaria existente. Incluye mamposteria, lavantar muros en mamposteria existente, muro lateral para la instalación de la puerta. Tambien debe realizar el despeje del area para la construcción del lavaplato.

Del presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio del año 204.

NOMBRE BENEFICIARIO: Leonor Sara Mosquera M.
C.C. 26.320.209

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Ciris Mosquera Perea. identificado con cédula de ciudadanía No 26.320.207 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3400, identificado con el código No. CH-RI-ER -M2 -VE-093, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria el despeje del area para la construcción de la unidad Sanitaria y de la instalación del lavadero al igual que el lavaplato.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Ciris Mosquera Perea.
C.C. 26.320.207

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Tilson Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11995.101 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-630 00012940, identificado con el código No. CH-RI- ER -M3 -VE- 083 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario el despeje del área para la intervención de la Unidad Sanitaria Asi mismo se le indica al beneficiario que la puerta posterior va a quedar cellada por la construcción de la Unidad Sanitaria. También se le informa que al momento de la construcción del lavaplato debe desmontar y adecuar el área donde actualmente esta ubicada la unidad Sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Tilson Mosquera M.
C.C. 11995-101.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Munllo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Manuel Ovidio Mosquera Perea identificado con cédula de ciudadanía No 16.214.178 de Cartago con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002490, identificado con el código No. CH-RI-~~CR~~-M8-VE-006 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario el despeje y desmonte del área del baño existente para la construcción de la nueva unidad Sanitaria.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio del año 2024.

Manuel Ovidio M. P.
NOMBRE BENEFICIARIO: Manuel Ovidio Mosquera P.
C.C. 16214178

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Munllo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Audilia Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26.320.155. de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 001-00000146, identificado con el código No. CH-RI-~~ER~~ -M1 -VE-117, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria el cambio de tipología de tipo 2 a adecuación.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio del año 2024.

Audilia Perea.
NOMBRE BENEFICIARIO:. Audilia Perea. Mosquera
C.C.26.320.155.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jesus Domingo Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11995053 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-83000009170, identificado con el código No. CH-RI-ER-M8 -VE-002, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario el despeje del área de baño existente e incluye el meson de la cocina con el fin de la construcción de la unidad sanitaria nueva y cumpla con las medidas técnicas del proyecto.

La presente acta se firma en presencia de la interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio. del año 2024.

JESUS MOSQUERA
NOMBRE BENEFICIARIO: Jesus Domingo Mosquera M.
C.C. 11995.053.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Munllo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luis Arcadio Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 79.954.689 de Bogotá. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La unión, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-000037350., identificado con el código No. CH-RI- LU -MS-M-VE- 011, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO.

El beneficiario manifiesta que por temas de espacio no desea que se le realice la placa del lavadero completa, por lo cual quedó con una medida de 64cm. La presente acta se firma en presencia de la interventoria

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Luis Mosquera.
C.C. 79.954.689

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Munllo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Isaias Quinto Benitez identificado con cédula de ciudadanía No 9.728.682. de Armenia con domicilio en la ciudad de Río Iró. en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003500, identificado con el código No. CH-RI-ER-M2-INVE-020, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con el beneficiario la demolición y adecuación del area de intervención de la unidad Sanitaria

La presente acta se firma en presencia de la Interventoria.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio del año 2024.

Jose Isaias Quinto
NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Isaias Quinto B.
C.C. 9728682

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Munllo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Margarita Mosquera Perea identificado con cédula de ciudadanía No 26.320.086. de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003696., identificado con el código No. CH-RI-20 -M3-IN-VE-006, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO. Se concerta con la beneficiaria que para la construcción de la unidad Sanitaria las vigas en madera existente quedaran empotrada en la unidad Sanitaria con el fin de tener la altura de las especificaciones tecnicas del proyecto. Así mismo, se deja en constancia que se debe demoler el muro que divide la zona del baño con la cocina para la instalación del lavadero. De igual manera, se recalca el compromiso de la beneficiaria de colocar el punto eléctrico requerido para los trabajos. La presente acta se firma en presencia de la interventoria y de la trabajadora Social del Municipio.

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Margarita Mosquera Perea.
C.C. 26.320.086.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Hernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: VICTOR Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luis Eduardo Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11.937.068 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-0000 5117, identificado con el código No. CH-RI-BN-M10-IN-VE-072, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Junio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Luis Eduardo Mosquera Mosquera
C.C. 11.937.068

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luis Eduardo Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11.937.068 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Nuevo, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00005236, identificado con el código No. CH-RI-BN-M10-IN-VE-073 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes Junio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Luis Eduardo Mosquera Mosquera
C.C. 11 937 068

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jorge Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Martha Zulenny Hurtado Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030.421.790 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002136, identificado con el código No. CH-RI-BN-M1-IN-VE-074 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

Martha Hurtado
NOMBRE BENEFICIARIO: Martha Zulenny Hurtado Mosquera
C.C. 1030.421.790

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Arley Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030. 420. 067 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830 000 11036 identificado con el código No. CH-RI-BN-M1- IN -VE-075 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

Arley Mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: Arley Mosquera Mosquera
C.C. 1030. 420. 067

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Inocencia Mosquera Perea identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420.726 de Río Iró. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830001232, identificado con el código No. CH-RI-BN-M1-IN-VE-077 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

María Inocencia M

NOMBRE BENEFICIARIO: María Inocencia Mosquera Perea
C.C. 1030.420.726.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Martha Sanchez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420.254 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000010976, identificado con el código No. CH-RI-IBN-M7-1N-VE-078 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Martha Sanchez Mosquera.
C.C. 1030.420.254

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Hector Emiro Ramirez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 82.363.532 de Tadó con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002147, identificado con el código No. CH-RI-BN-M5-IN-VE-079, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Julio del año 2024.

Hector Ramirez
NOMBRE BENEFICIARIO: ~~Hector Emiro~~ Ramirez Mosquera
C.C. 82.363.532

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ~~Angy~~ Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Yuselly Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1128.084.465 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000010972 identificado con el código No. CH-RI-BN-M7-IN-VE-080 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

maria Yusselly Perea Mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: María Yuselly Perea Mosquera
C.C. 1128.084.465.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Elvia Mosquera Perea identificado con cédula de ciudadanía No 1128.084.723 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002144, identificado con el código No. CH-RI-BN-M1-IN-VE-081, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Elvia Mosquera Perea.
C.C. 1128084723

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Yuli Patricia Murillo Caicedo. identificado con cédula de ciudadanía No 1193.032.824 de Istmina con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (Y) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000 10967, identificado con el código No. CH-RI-BN-M7-IN-VE-082 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

Yuli Patricia Murillo
NOMBRE BENEFICIARIO: Yuli Patricia Murillo Caicedo
C.C. 1193.032.824

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Dilia Sanchez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1128084.721 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-83000010970, identificado con el código No. CH-RI-BN-M7-IN-VE-083 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Dilia Sanchez Mosquera
C.C. 1128084.721

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Aureliano Sanchez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420574 de Istmina con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000111030, identificado con el código No. CH-RI-BN-M1-IN-VE-084 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Aureliano Sanchez Mosquera
C.C. 1030.420.574.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Francisco Sanchez Perea identificado con cédula de ciudadanía No 1133699101 de Río Ird con domicilio en la ciudad de Río Ird en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002123, identificado con el código No. CH-RI-BN-M1-IN-VE-085 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Francisco Sanchez Perea.
C.C. 1133.699.101

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Carmen Leonilda Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1133699020 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000010008, identificado con el código No. CH-RI-BN-M8-IN-VE-086, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 15 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Carmen Leonilda Mosquera Mosquera
C.C. 1.133.699.020

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angey Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Kety Lorena Perea Hurtado identificado con cédula de ciudadanía No 1128.084.028 de Cali con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio Nuevo, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-0000 1756, identificado con el código No. CH-RI-BN-MS-IN-VE-087, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Julio del año 2024.

Kety Perea
NOMBRE BENEFICIARIO: Kety Lorena Perea Hurtado
C.C. 1128.084.028

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose David Natigay Pipicay identificado con cédula de ciudadanía No 11.937.157 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Real, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 001-00000016, identificado con el código No. CH-RI-LR-M1-IN-VE-002, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 12 mes Julio del año 2024.

Josedavidnatigay
NOMBRE BENEFICIARIO: Jose David Natigay Pipicay
C.C. 11.937.157.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luis Angel Natigay Uragama identificado con cédula de ciudadanía No 11.935.362 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Real, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 001-00000021, identificado con el código No. CH-RI-LR-M1 -VE-027 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 13 mes Julio del año 2024.

Luis ANGel N. U
NOMBRE BENEFICIARIO: Luis Angel Natigay Uragama.
C.C. 11.935.362

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Francisco Uragama Pipicay identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420717 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio La Real, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 001-0000083, identificado con el código No. CH-RI-UR-M3-IN-VE-028 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 17 mes Julio del año 2024.

Francisco Uragama Pipicay
NOMBRE BENEFICIARIO: Francisco Uragama Pipicay
C.C. 1030.420.717

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jose Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Munllo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Cruz Daris Ramirez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420.673 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Real, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000085 65, identificado con el código No. CH-RI-LR-M8-IN-VE-029 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Cruz Daris Ramirez Mosquera
C.C. 1030.420.673

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Suslenis Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1147.951.425 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio la Real, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 001-00000005, identificado con el código No. CH-RI-LR-M1-IN-VE-030 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 17 mes Julio del año 2024.

suslenis mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: María Suslenis Mosquera Mosquera
C.C. 1147.951.425

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Jairo Herrera
Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Víctor Murillo R
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Víctor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Ascencion Sanchez Perea identificado con cédula de ciudadanía No 3.673.058 de Zaragoza con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Real, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003035, identificado con el código No. CH-RI-LR-M9-IN-VE-031, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 12 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Ascencion Sanchez Perea
C.C. 3.673.058

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Marli Natigay Uragama identificado con cédula de ciudadanía No 1076.820.577 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio Barrio la Real, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 001-00000147, identificado con el código No. CH-RI-LR-M3-IN-VE-033 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Julio del año 2024.

Marli Natigay Uragama
NOMBRE BENEFICIARIO: Marli Natigay Uragama.
C.C. 1076.820.577

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luisa Perea Perea identificado con cédula de ciudadanía No 1030.421.468 de Río Ird con domicilio en la ciudad de Río Ird en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00004304, identificado con el código No. CH-RI-LU-M 4 -VE- 036 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 12 mes Julio del año 2024.

Luisa Perea Perea
NOMBRE BENEFICIARIO: Luisa Perea Perea
C.C. 1030.421.468.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Alfredo Fernandez

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: VICTOR MUNOZ

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Nilsa Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1133699023 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003790, identificado con el código No. CH-RI-U-M5 -VE-068 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 12 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Nilsa Mosquera Mosquera
C.C. 1133699023.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María de los Santos Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420.757 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003913, identificado con el código No. CH-RI-LU-M6-IN-VE-018, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 13 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: María de los Santos Mosquera Mosquera
C.C. 1030.420.757

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Erenio Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11936.097 de Cordoto con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00002890, identificado con el código No. CH-RI-LU-M 3 -VE-022 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 13 mes Julio del año 2024.

Joseerenio M
NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Erenio Mosquera Mosquera
C.C. 11 936.097

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jhon Fredys Mosquera Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No 82.362.946 de Tadó con domicilio en la ciudad de Río Ito en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-8300000 8090, identificado con el código No. CH-RI-W -MZ -VE-005 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 06 mes Agosto del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jhon Fredys Mosquera Sanchez
C.C.82. 362. 946.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo R

Victor Murillo R

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Ecelsi Cossio Perea identificado con cédula de ciudadanía No 1030.420.330 de Río Ind con domicilio en la ciudad de Río Ind en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00004010, identificado con el código No. CH-RI-U-M3 -VE-029 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 13 mes Julio del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Ecelsi Cossio Perea
C.C. 1030.420.330

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Luisa Herrera

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Francisco Evelio Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 82.363.074 de Tadó con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000378 5, identificado con el código No. CH-RI-W -MS- IN -VE-031, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes Julio del año 2024.

Francisco Evelio M.
NOMBRE BENEFICIARIO: Francisco Evelio Mosquera Mosquera
C.C. 82.363.074

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anggy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Munllo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Marta Cecilia Ramirez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 32.352.812 de Itagui con domicilio en la ciudad de Río Ird en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-0000600, identificado con el código No. CH-RI-ER-M4 -VE-046, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 19 mes Julio del año 2024.

Marta cecilia Ramirez M

NOMBRE BENEFICIARIO: Marta Cecilia Ramirez Mosquera
C.C. 32.352.812

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Juan Clemente Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 15.362.696 de Puerto Berrio con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000 3598, identificado con el código No. CH-RI-~~ER~~-M 1-IN-VE-026 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 16 mes 07 del año 2024.

NOMBRE BENEFICIARIO: Juan Clemente Mosquera Mosquera
C.C. 15.362.696.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Angy Ortiz

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Victor Murillo

Se anexa registro fotográfico.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	24 06 29	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luis Eduardo Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	004-00005236		
TELÉFONO	320 411 6711	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en lámina de zinc y ladrillo, con puerta en zinc en mal estado, piso en tierra, cubierta en lámina se zinc en buen estado.

Firma
Nombre: Luis Eduardo Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 11937.068

Firma
Nombre: Arnulfo Hernandez
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: VICTOR Munllo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA


Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	24 06 29	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

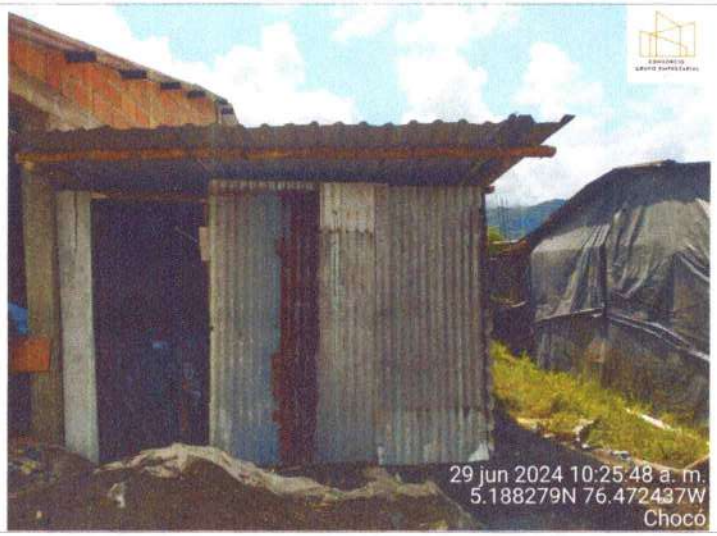

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luis Eduardo Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	004-00005117		
TELÉFONO	3204116712	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SIN USO	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	N	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en lámina de zinc, con puerta en zinc en mal estado, piso en tierra, cubierta en lámina se zinc en buen estado.

Firma
Nombre: Luis Eduardo Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 11937.068

Firma
Nombre: Arnold Fernandez
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: VICTOR Murillo R
VICTOR Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 15	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Martha Zulenny Hurtado Mosquera		
DIRECCIÓN	CC4-00002136		
TELÉFONO	3219511673	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5-00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en ladrillo, con puerta y ventana en madera en mal estado, piso en tierra, cubierta en lámina se zinc en buen estado.

Firma: Martha Hurtado
Nombre: Martha Zulenny Hurtado Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030.421.790.

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: Victor Munoz R
Nombre: Victor Munoz Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223							
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL							
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS							
REGISTRO No.		FECHA	24 07 15	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Arley Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	830 830000 11036		
TELÉFONO	3206700571	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en bloque de concreto sin pañete, con puerta metalica en regular estado, ventana en madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta en lámina de zinc en buen estado.

Firma: Arley Mosquera
Nombre: Arley Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030.420.067.

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: VICTOR Munoz R
VICTOR Munoz Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	24 07 15	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Inocencia Mosquera Perea		
DIRECCIÓN	830-830000111232		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en bloque de concreto sin pañete, con puerta y ventana en madera en mal estado, piso en concreto sin esmaltar en regular estado, cubierta en lámina de zinc en buen estado.

Firma mariainocencia
Nombre: María Inocencia Mosquera Perea
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030.420.726.

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma Victor Munllo R
Nombre: Victor Munllo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	24 07 15	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Martha Sanchez Mosquera		
DIRECCIÓN	830 - 830000 10976		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÀL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en bloque de concreto sin pañete, con puerta y ventana en madera en mal estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta en lámina de zinc en regular estado.

Firma
Nombre: María Martha Sanchez Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030. 420. 254

Firma
Nombre: Alfredo Hernandez
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Victor Munoz R
Victor Munoz Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 16	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Hector Emiro Ramirez Mosquera		
DIRECCIÓN	004-0000 2147		
TELÉFONO	314 807 3973	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en ladrillo sin pañete en regular estado, puerta y ventana metalicas en buen estado, piso en concreto sin esmaltar en regular estado, cubierta en laminas de zinc en buen estado.

Firma: Hector Ramirez
Nombre: Hector Emiro Ramirez Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 82.363.532

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: Victor Murillo R
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 25	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Yusselly Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	830-830000140972		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en bloque de concreto sin pañete, con puerta y ventana en madera en mal estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta en lámina de zinc en regular estado.

Firma: maria yusselly perea Mosqueta
Nombre: María Yusselly Perea Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1128.084.465.

Firma:
Nombre: Angelo Hernandez
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: Victor Murillo R
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 15	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Elvia Mosquera Perea		
DIRECCIÓN	004- 00002144		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 196 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en madera sin pulir en regurlar estado, con puerta y ventana en madera en regular, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta en lámina de zinc en regular estado.

Firma

Nombre: María Elvia Mosquera Perea.
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1128084723

Firma

Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: VICTOR Murillo R
VICTOR Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 15	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Yuli Patricia Murillo Caicedo		
DIRECCIÓN	830- 8300010967		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	NN	
GAS	NN	
TELEVISIÓN - CABLE	NN	
OTRO - ¿CUAL ?	NN	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en madera sin pulir en regurlar estado, con puerta en madera en regular, piso en concreto sin esmaltar en regular estado, cubierta en lámina de zinc en buen estado.

Firma: Yuli Murillo
Nombre: Yuli Patricia Murillo Caicedo
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1193.032.824

Firma:
Nombre: Alfredo Hernandez
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: Victor Murillo R.
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 15	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Dilia Sanchez Mosquera		
DIRECCIÓN	830-830000010970		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en madera sin pulir en regurlar estado, con puerta en madera en regular, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta en lámina de zinc en buen estado.

Firma

Nombre: María Dilia Sanchez Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1128084721

Firma

Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: VICTOR Murillo R
VICTOR Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		**FECHA**	24 07 15	**ELABORÓ**	Juan David Torres	**REVISÓ**				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Aureliano Sanchez Mosquera		
DIRECCIÓN	830 - 830 00011030		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 106 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en bloque de concreto sin pañete en regurlar estado, con puerta y ventana en madera en regular, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta en lámina de zinc en regular estado.

Firma

Nombre: Aureliano Sanchez Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1030.420.574

Firma

Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Victor Munoz Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	24 07 15	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Francisco Sanchez Perea		
DIRECCIÓN	004-00002123		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida en bloque de concreto sin pañete en regurlar estado, con puerta y ventana en madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta en lámina de zinc en regular estado.

Firma

Nombre: Francisco Sanchez Perea
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1133.699.101

Firma

Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Victor Munoz Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	24 07 15	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Carmen Leonilda Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	830- 8300001000 8		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.00.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa con pañete en regurlar estado, con puerta y ventana en madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta en lámina de zinc en buen estado.

Firma

Nombre: Carmen Leonilda Mosquera Mosquera

PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1133699020

Firma

Nombre:

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma Victor Murillo R.

Nombre: Victor Murillo Ramirez

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	24	07	16	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Kety Lorena Perea Hurtado		
DIRECCIÓN	004-0000756.		
TELÉFONO	3115136460.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 196 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Casa construida con bloque de concreto sin pañete en regurlar estado, con puerta en lamina de zinc en mal estado, ventana en madera en mal estado, piso en tierra, cubierta placa entre piso en buen estado.

Firma Kety Perea
Nombre: Kety Perea Hurtado
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1128.084.028

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma Victor Murillo R
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 12	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose David Natigay Pipicay		
DIRECCIÓN	001-00000016		
TELÉFONO	3137272497	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en madera sin pulir en regular estado, puerta y ventanas en madera en regulas estado, piso en madera en mal estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma: Josedavidnatigay
Nombre: Jose David Natigay Pipicay
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 11937.157

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: Victor Munoz R
Nombre: Victor Munoz Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	24 07 13	**ELABORÓ**	Juan David Torres	**REVISÓ**					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luis Angel Natigay Uragama		
DIRECCIÓN	001-00000021		
TELÉFONO	3136118393	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2000.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en madera sin pulir en mal estado, puerta y ventana en madera en mal estado, piso en madera sin pulir en regular estado, cubierta en laminas de zinc en regular estado.

Firma Luis Angel Natigay U
Nombre: Luis Angel Natigay Uragama.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 11935.362

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma Victor Murillo R
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	24 07 17	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Francisco Uragama Pipicay		
DIRECCIÓN	001-00000083		
TELÉFONO	3107214673	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en madera sin pulir en regular estado, puerta en madera en regular estado, piso en madera sin pulir en regular estado, cubierta en lamina de zinc en mal estado.

Firma: Francisco Uragama Pipicay
Nombre: Francisco Uragama Pipicay
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030.420.717

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: Victor Murillo R
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA


Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	24 07 16	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

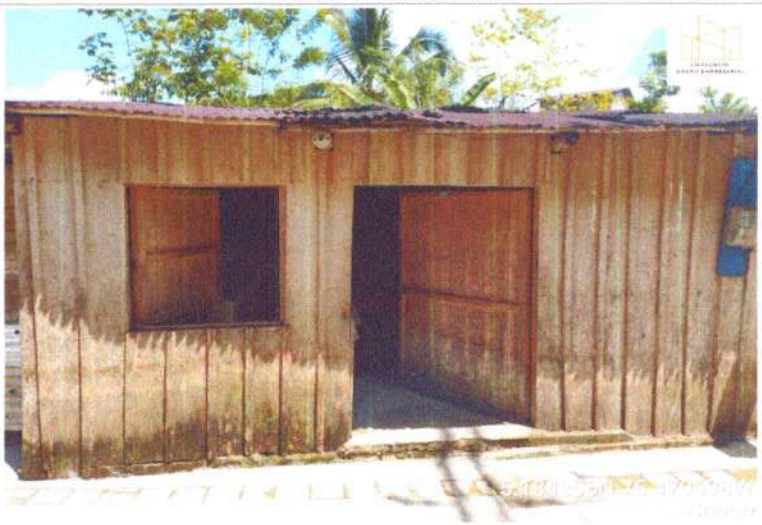

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Cruz Daris Ramirez Mosquera		
DIRECCIÓN	530- 830 0000 8565		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en madera sin pulir en mal estado, puerta y ventana en madera en mal estado, piso en concreto sin esmaltar en mal estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma
Nombre: Cruz Ramirez Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030.420.673

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 17	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Suslenis Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	001 - 00000005		
TELÉFONO	3206130248	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en madera sin pulir en mal estado, puerta y ventana en madera en mal estado, piso en madera sin pulir, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma Suslenis mosquera
Nombre: María Suslenis Mosquera Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1147.951.425.

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma Victor Murillo R
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 12	ELABORÓ	Juan David Torrez	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ascención Sanchez Perea		
DIRECCIÓN	005-00003035		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en manpostería en mal estado, puerta en madera en mal estado, piso en concreto sin esmaltar en regular estado, cubierta en placa de concreto en regular estado.

Firma
Nombre: Ascención Sanchez Perea.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.673.058

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma VICTOR Murillo R
Nombre: VICTOR Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de				
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	24 07 16	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Marli Natigay Uragama		
DIRECCIÓN	001-00000147		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en madera sin pulir en regular estado, puerta y ventana en madera en regular estado, piso en madera sin pulir, cubierta en laminas de zinc en buen estado.

Firma Marli Natigay Uragama
Nombre: Marli Natigay Uragama.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1076.820.577

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma Victor Murillo R.
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	24 07 12	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luisa Perea Perea		
DIRECCIÓN	005-00004304		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en manpostería en regular estado, puerta metalica en buen estado, ventana en lamina se zinc en regular estado, piso en concreto sin esmaltar en regular estado, cubierta en lamina se zinc en buen estado.

Firma Luisa Perea Perea
Nombre: Luisa Perea Perea
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030.421.468.

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma Victor Munoz R.
Nombre: Victor Munoz Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA


Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.	FECHA	24 07 12	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

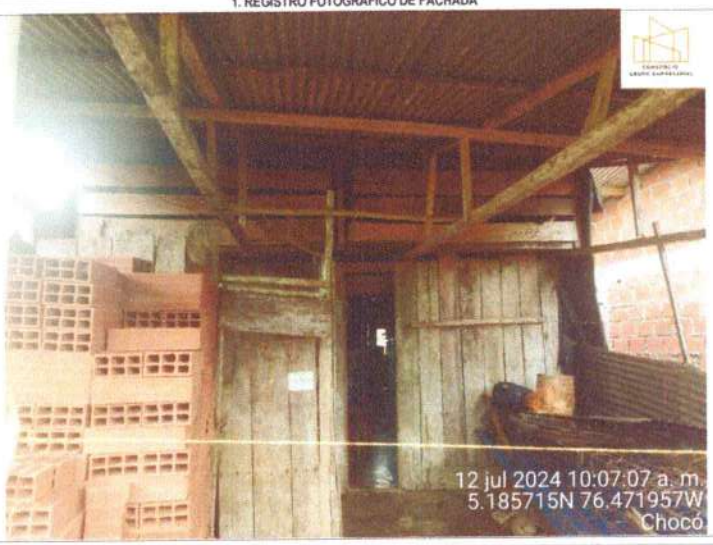

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Nilsa Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	005-00003790		
TELÉFONO	3115110047	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SIN SERVICIO	
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en madera en regular estado, puerta en madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta en lamina de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: María Nilsa Mosquera Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1133699023.

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: HECTOR Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223							
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL							
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS							
REGISTRO No.		FECHA	24 07 13	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María de los Santos Mosquera M.		
DIRECCIÓN	005-00003913		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en madera sin pulir en regular estado, puerta en madera en regular estado, piso en tierra, cubierta en laminas de zinc en regular estado.

Firma
Nombre: María de los Santos Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030.420.757

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: VICTOR Murillo R
VICTOR Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	24 07 13	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Erenio Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0000 2890		
TELÉFONO	5.00	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en bloque de concreto con pañete en regular estado, puerta y ventana metalica en buen estado estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta en laminas de zinc en regular estado.

Firma Joseerenio M
Nombre: Jose Erenio Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 11.936.097

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA


Firma Victor Murillo R
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	24 08 06	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

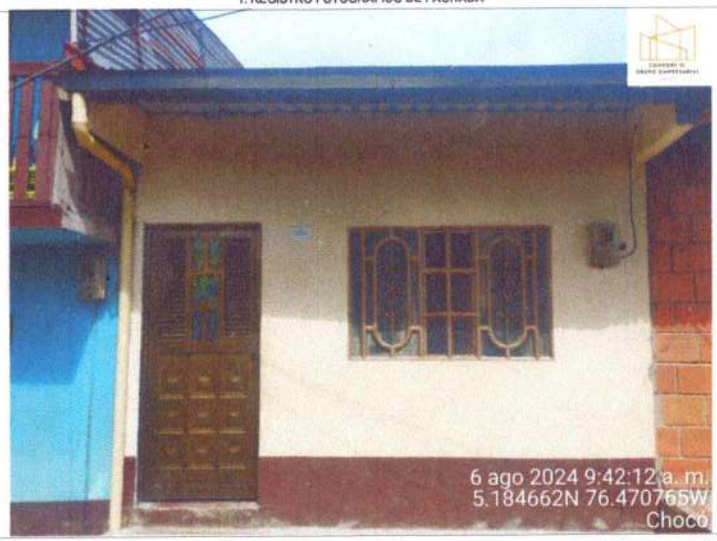

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jhon Fredys Mosquera Sanchez		
DIRECCIÓN	830-830000080470		
TELÉFONO	3136174265	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en manpostería pañetada en buen estado, puerta y ventana metálica en buen estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta en lamina de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: Jhon Fredys Mosquera Sanchez.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 82.362.946.

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: VICTOR Murillo R
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 13	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Ecelsi Cossio Perea		
DIRECCIÓN	005-00004010		
TELÉFONO	5.00	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con pañete en buen estado, puerta y ventana metalica en buen estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta en laminas de zinc en regular estado.

Firma
Nombre: María Ecelsi Cossio Perea.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030.420.330

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: VICTOR MUÑOZ R
VICTOR MUÑOZ Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	24 07 16	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Francisco Evelio Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	005 - 0000 3785		
TELÉFONO	3102158431	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en ladrillo sin pañete en buen estado, puerta metalica en buen estado, ventana en lamina de zinc en mal estado, piso en tirra, cubierta en lamina de zinc en buen estado.

Firma Francisco Evelio Mosquera
Nombre: Francisco Evelio Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 82.363.074

Firma
Nombre: Alfredo Hernandez
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma Victor Murillo R
Nombre: Victor Murillo Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 19	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Marta Cecilia Ramirez Mosquera		
DIRECCIÓN	002-0000600		
TELÉFONO	3205195875	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en manpostería en buen estado, puerta metalica en buen estado, ventana en madera en buen estado, piso en conreto esmaltar en buen estado, cubierta en lamina se zinc en buen estado.

Firma: Marta Cecilia Ramirez M
Nombre: Marta Cecilia Ramirez Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 32.352.812

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: Victor Munoz R
Nombre: Victor Munoz Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA


Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	24 07 16	ELABORÓ	Juan David Torres	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

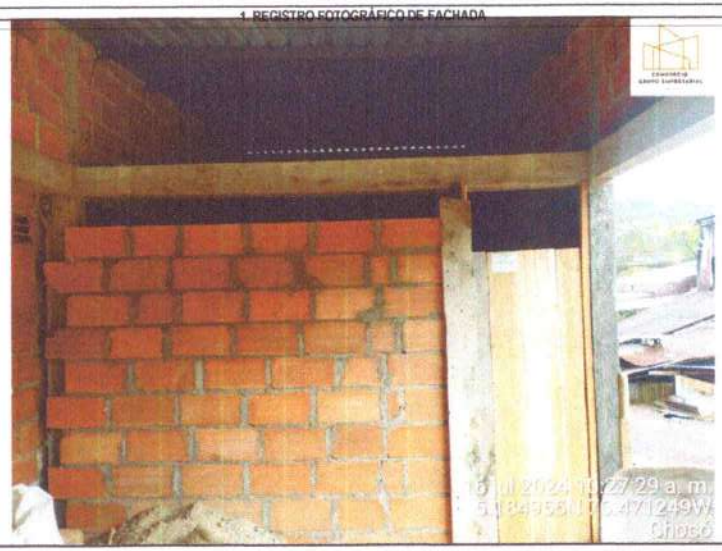

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Juan Clemente Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	003-00003598		
TELÉFONO	4.00	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en ladrillo sin pañetar, puerta en madera sin pulir en regulas estado, piso en concreto sin esmaltar en regular estado, cubierta en laminas de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: Juan clemente Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 15.362.696

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Victor Munoz Ramirez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

C&E ENGINEERING SAS

PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
INFORME MENSUAL NÚMERO 12
DESDE EL 01 DE AGOSTO DEL 2024 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2024

Actividades Realizadas

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDAD No. 1

El contratista de obra remitió los diseños arquitectónicos y estructurales los cuales fueron aprobados por la Interventoría y los mismos cuentan con VoBo del ministerio desde el día 14 de noviembre del 2023.

ACTIVIDAD No. 2

Durante este periodo correspondiente al informe mensual No 12, el contratista de obra No realiza diagnósticos en ninguno de los cuatro barrios priorizados. A la fecha se han visitado un total de 634 viviendas, se han diagnosticado 459 viviendas efectivas de las cuales se han aprobado 458 diagnósticos y se han presentado 68 renuncias. De igual manera del total de viviendas visitadas se han identificado 107 como no efectivas. Cabe señalar que a la fecha ya se ha culminado y se ha efectuado cierre a la etapa de inclusión.

ACTIVIDAD No. 3

Durante este periodo correspondiente al informe mensual No 12, se cuenta con 414 viviendas iniciadas las cuales están localizadas en Barrio Nuevo, en el Barrio La Real, el Barrio La Unión y el Barrio El Rosario en las manzanas 1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,7, 8,9 y 10 en las cuales se han realizado actividades significativas correspondientes a fundición de vigas de cimentación, construcción de muros en mampostería estructural, pañetado, enchape de pisos y paredes en cerámica, instalación de combos sanitarios, construcción de lavaderos y lavaplatos, Excavación . Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 414 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 121 viviendas en ejecución, 293 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoría y al beneficiario 279 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución con porcentajes estimados de avance es de 70,91% (Ejecutado Estimado de acuerdo al resumen anexo al presente informe), con respecto al 60,83% que se tiene programado, es decir, presenta un avance del 10,08% respecto a viviendas programadas y terminadas (Con porcentaje estimado). Cabe señalar que, si bien el contratista presenta en las 414 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 414 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 279 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoría. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo (Plan de Contingencia) y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoría el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 273 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 6 viviendas en avance.

C&E ENGINEERING SAS

PROYECTA, DISEÑA Y CONSTRUYE

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	##
Acumulado Anterior	94,73%	68,97%	-25,76%	
Durante el Periodo	-33,91%	1,94%	35,84%	
Acumulado a la Fecha	**60,83%**	**70,91%**	**10,08%**	

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

Semaforo ###

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.945.656.682,50	94,73%	$ 2.872.700.524,99	68,97%	-$ 1.072.956.157,51	-25,76%
Durante el Periodo	-$ 1.412.214.947,79	-33,91%	$ 80.669.058,07	1,94%	$ 1.492.884.005,86	35,84%
Acumulado a la Fecha	**$ 2.533.441.734,71**	**60,83%**	**$ 2.953.369.583,06**	**70,91%**	**$ 419.927.848,35**	**10,08%**

Desviación en dias

44,1 Dias

Fecha de Corte	18/10/2024 - 31/10/2024	PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS RIO RIO CHOCO																										
Priorización		MATRIZ BASE								INCLUSIONES										TOTALES (MATRIZ + INCLUSIONES)					EJECUCION DE OBRA (ACTIVIDAD No. 3)				
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusion	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP	Viviendas No Avaladas por Alcaldí	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	Viviendas Recibidas a Satisfacción por Interventoría y beneficiario	Viviendas Programadas actividad No.3 según plan de trabajo Vigente (DESDIAMENTE TERMINADAS)	VIVIENDAS EN ATRASO POR FALTA DE TERMINACION DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO
Rio Iro Chocó	Barrio Nuevo	190	455	170	17	168	11	9	90	73	76	3	0	39	17	87	3	274	229	34	235	14	221	190	31	189	273	-6
	La Real	58		39	8	36	12	9	33	19	25	6	0	22	10	19	2	93	61	18	55	14	47	45	2	46		
	La unión	75		66	14	48	16	9	18	27	30	3	0	26	8	26	0	110	74	22	74	18	69	57	11	66		
	El Rosario	123		76	20	77	21	9	38	25	26	1	0	16	9	17	3	154	66	32	94	24	78	1	77	3		
	TOTAL	458	459	186	62	329	60	7	184	144	157	13	0	123	45	179	8	634	459	107	458	68	414	293	121	279	273	-6

	CONTRACTUAL			PROGRAMADO			EJECUTADO		
	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
ACTIVIDAD 1	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%
ACTIVIDAD 2	459	$ 131.342.174,45	3,15%	459	$ 131.342.174,45	3,15%	422	$ 120.734.876,91	2,90%
ACTIVIDAD 3	459	$ 4.029.128.529,40	96,67%	273	$ 2.394.625.346,24	57,49%	414	$ 2.825.140.990,13	67,83%
		$ 4.164.944.717,87	100,00%		$ 2.533.441.734,71	60,81%		$ 2.953.349.583,06	70,91%

ANEXO 1
INVENTARIO DE DOCUMENTOS

N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° VERSIÓN	N° TOMO	FECHA DE DOCUMENTO	APROBADO POR	ORIGINAL	N° COPIAS	MEDIO MAGNETICO	OBSERVACIONES
1	MATRIZ DE EVALUACION DE ENCUETAS PCI, RIO IROCHOCO	1	1		OSCAR ALMARIO		X	X	
2	CARTA DE PRESENTACION PCI, MUNICIPIO DE RIO IROCHOCO	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
3	CERTIFICACION ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS BARRIOS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
4	CERTIFICADO NO ZONA DE RIESGO	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
5	CERTIFICADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
6	PLAN DE GESTION SOCIAL	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
7	ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	Especificaciones técnicas generales, Capítulo I, Capitulo II, Capitulo III, Capitulo IV
8	PLANOS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	• Ubicación de barrios y alcantarillado Rio iro • Prototipos arquitectónicos y estructurales
9	FORMATOS PCI				OSCAR ALMARIO			X	PCI-001 hasta PCI-024

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C a los 08 días del mes Agosto del año 2023.


ENTREGA		**RECIBE**	
Firma		Firma	
NOMBRE	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	**NOMBRE**	JOSE LUIS RADA RAYO
Fecha:	Martes, 08 de agosto de 2023	Fecha:	Martes, 08 de agosto de 2023


enterritorio	**RELACIÓN DE PLANOS**	CÓDIGO	**F-GG-20**
		VERSIÓN	**02**
		VIGENCIA	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONVENIO MARCO No. :	222006
CONTRATO No. :	2230223
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
SUPERVISOR:	MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA

N°	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1	10/04/2023	TIPOLOGIA I-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
2	CASETA	1		TIPOLOGIA II-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
3	CASETA	1		TIPOLOGIA III-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
4	CASETA	1		TIPOLOGIA IV-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
5	CASETA	1		TIPOLOGIA V-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
6	CASETA	1		TIPOLOGIA VI-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C a los 08 días del mes Agosto del año 2023

ENTREGA
Firma 
OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
Fecha:08/08/2023

RECIBE
Firma 
JOSÉ LUIS RADA RAYO
Fecha:08/08/2023

Original: ENTerritorio
Copia: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	2023-07-21
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONVENIO MARCO No. :	222006 (Convenio)
CONTRATO No. :	2230223
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	C&E ENGINEERING SAS
SUPERVISOR:	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA

N°	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	A001	1	SEPTIEMBRE, 2023	PLANO ARQUITECTONICO UNIDAD SANITARIA TIPO 1	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
2	A002	1	SEPTIEMBRE, 2023	PLANO ARQUITECTONICO UNIDAD SANITARIA TIPO 2	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
3	A003	1	SEPTIEMBRE, 2023	PLANO ARQUITECTONICO UNIDAD SANITARIA TIPO 3	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
4	A004	1	SEPTIEMBRE, 2023	PLANO ARQUITECTONICO UNIDAD SANITARIA TIPO 4	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
5	A005	1	SEPTIEMBRE, 2023	PLANO ARQUITECTONICO UNIDAD SANITARIA TIPO 5	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
6	A006	1	SEPTIEMBRE, 2023	PLANO ARQUITECTONICO UNIDAD SANITARIA TIPO 6	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
7	A007	1	SEPTIEMBRE, 2023	PLANO ARQUITECTONICO UNIDAD SANITARIA TIPO PALAFITO	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
8	P.E 002	1	5/08/2023	UNIDAD SANITARIA TIPO 1: PLANTA DE CIMENTACION, PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL+2.28, PLANTA DE LOCALIZACION DE REFUERZO DE MUROS, DESPIECE DE VIGAS, CORTE ESTRUCTURAL, DETALLE DE PLANTILLA DE PISO	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
9	P.E 003	1	5/08/2023	UNIDAD SANITARIA TIPO 2: PLANTA DE CIMENTACION, PLANTA ESTRUCTURAL, PLANTA DE LOCALIZACION DE REFUERZO DE MUROS, CORTE ESTRUCTURAL, DETALLE DE PLANTILLA DE PISO	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005

10	P.E 004	1	5/08/2023	UNIDAD SANITARIA TIPO 3: PLANTA DE CIMENTACION, PLANTA ESTRUCTURAL, PLANTA DE LOCALIZACION DE REFUERZO DE MUROS, DESPIECE DE COLUMNAS, DETALLE DE LOSA MACIZA, CORTE ESTRUCTURAL, DETALLE DE PLANTILLA DE PISO	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
11	P.E 005	1	5/08/2023	UNIDAD SANITARIA TIPO 4: PLANTA DE CIMENTACION, PLANTA ESTRUCTURAL, PLANTA DE LOCALIZACION DE REFUERZO DE MUROS, CORTE ESTRUCTURAL, DETALLE DE PLANTILLA DE PISO	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	
12	P.E 006-5	1	5/08/2023	UNIDAD SANITARIA TIPO 5: PLANTA DE CIMENTACION, PLANTA ESTRUCTURAL, PLANTA DE LOCALIZACION DE REFUERZO DE MUROS, DESPIECE DE VIGAS, DESPIECE DE COLUMNAS, DETALLE DE LOSA MACIZA, CORTE ESTRUCTURAL, DETALLE DE PLANTILLA DE PISO	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
13	P.E 006-6	1	5/08/2023	UNIDAD SANITARIA TIPO 6: PLANTA DE CIMENTACION, PLANTA ESTRUCTURAL, PLANTA DE LOCALIZACION DE REFUERZO DE MUROS, CORTE ESTRUCTURAL, DETALLE DE PLANTILLA DE PISO	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005
14	P.E 006-6	1	5/08/2023	UNIDAD SANITARIA TIPO 6: PLANTA DE CIMENTACION, PLANTA ESTRUCTURAL, PLANTA DE LOCALIZACION DE REFUERZO DE MUROS, CORTE ESTRUCTURAL, DETALLE DE PLANTILLA DE PISO	N/A	N/A	INTERVENTORÍA	PLANOS PROCESO ICM-005

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTÁ D.C a los 03 días de abril de 2024.

ENTREGA
Firma
NOMBRE: OSCAR MAURICIO ALMARIO HERNANDEZ
Fecha:03/04/2024

RECIBE
Firma
NOMBRE: DANIEL HEREDIA USECHE
Fecha:

Original: ENTerritorio
Original: ENTerritorio

ANEXO 1
INVENTARIO DE DOCUMENTOS

N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° VERSIÓN	N° TOMO	FECHA DE DOCUMENTO	APROBADO POR	ORIGINAL	N° COPIAS	MEDIO MAGNETICO	OBSERVACIONES
1	MATRIZ DE EVALUACION DE ENCUETAS PCI, RIO IROCHOCO	1	1		OSCAR ALMARIO		X	X	
2	CARTA DE PRESENTACION PCI, MUNICIPIO DE RIO IROCHOCO	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
3	CERTIFICACION ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS BARRIOS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
4	CERTIFICADO NO ZONA DE RIESGO	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
5	CERTIFICADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
6	PLAN DE GESTION SOCIAL	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
7	ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	Especificaciones técnicas generales, Capítulo I, Capitulo II, Capitulo III, Capitulo IV
8	PLANOS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	• Ubicación de barrios y alcantarillado Rio iro • Prototipos arquitectónicos y estructurales
9	FORMATOS PCI				OSCAR ALMARIO			X	PCI-001 hasta PCI-024

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C a los 08 días del mes Agosto del año 2023.


ENTREGA		**RECIBE**	
Firma		Firma	
NOMBRE	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	**NOMBRE**	JOSE LUIS RADA RAYO
Fecha:	Martes, 08 de agosto de 2023	Fecha:	Martes, 08 de agosto de 2023


enterritorio	**RELACIÓN DE PLANOS**	CÓDIGO	**F-GG-20**
		VERSIÓN	**02**
		VIGENCIA	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONVENIO MARCO No. :	222006
CONTRATO No. :	2230223
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
SUPERVISOR:	MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA

N°	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1	10/04/2023	TIPOLOGIA I-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
2	CASETA	1		TIPOLOGIA II-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
3	CASETA	1		TIPOLOGIA III-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
4	CASETA	1		TIPOLOGIA IV-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
5	CASETA	1		TIPOLOGIA V-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
6	CASETA	1		TIPOLOGIA VI-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C a los 08 días del mes Agosto del año 2023

ENTREGA
Firma 
OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
Fecha:08/08/2023

RECIBE
Firma 
JOSÉ LUIS RADA RAYO
Fecha:08/08/2023

Original: ENTerritorio
Copia: Contratista, Interventoría

enterritorio	**LISTA DE CHEQUEO PARA INICIACIÓN DEL CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-GG-02**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**


NÚMERO DE CONTRATO:	2230223
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 DE JULIO DE 2023
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 4.164.944.717,87
PLAZO DE EJECUCION:	Siete (7.0) Meses
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

DOCUMENTO	**CASILLA DE VERIFICACIÓN**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**NA**	
MATRIZ DE EVALUACION DE ENCUETAS PCI, RIO IRO-CHOCO	X			
CARTA DE PRESENTACION PCI, MUNICIPIO DE RIO IRO-CHOCO	X			
CERTIFICACION ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS BARRIOS.	X			
CERTIFICADO NO ZONA DE RIESGO	X			
CERTIFICADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	X			
PLAN DE GESTION SOCIAL	X			
ESPECIFICACIONES TECNICAS	X			Especificaciones técnicas generales, Capítulo I, Capitulo II, Capitulo III, Capitulo IV
PLANOS	X			• Ubicación de barrios y alcantarillado Rio iro • Prototipos arquitectónicos y estructurales
FORMATOS PCI	X			PCI-001 hasta PCI-024

NOTA:

1. Incluya los ítems que apliquen de acuerdo con el tipo de contrato.

FIRMA:



OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C&E ENGINEERING SAS
INTERVENTOR

ORIGINAL: ENTerritorio
COPIAS: CONTRATISTA, INTERVENTORÍA

rNOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01/08/2024

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	02/08/2024

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	02/08/2024

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	02/08/2024

FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	02/08/2024

FOTOGRAFÍA (5)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	02/08/2024

FOTOGRAFÍA (6)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	03/08/2024

FOTOGRAFÍA (7)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	03/08/2024

FOTOGRAFÍA (8)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	03/08/2024

FOTOGRAFÍA (9)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	03/08/2024

FOTOGRAFÍA (10)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	03/08/2024

FOTOGRAFÍA (11)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	04/08/2024

FOTOGRAFÍA (12)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	04/08/2024

FOTOGRAFÍA (13)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	04/08/2024

FOTOGRAFÍA (14)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	04/08/2024

FOTOGRAFÍA (15)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	04/08/2024

FOTOGRAFÍA (16)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	05/08/2024

FOTOGRAFÍA (17)




Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	05/08/2024

FOTOGRAFÍA (18)

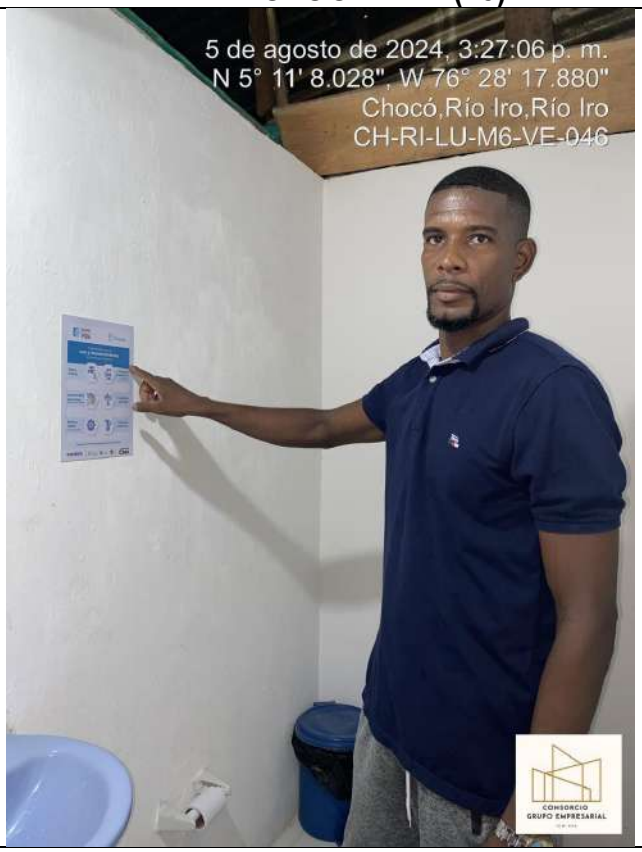

Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	05/08/2024

FOTOGRAFÍA (19)




Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	05/08/2024

FOTOGRAFÍA (20)

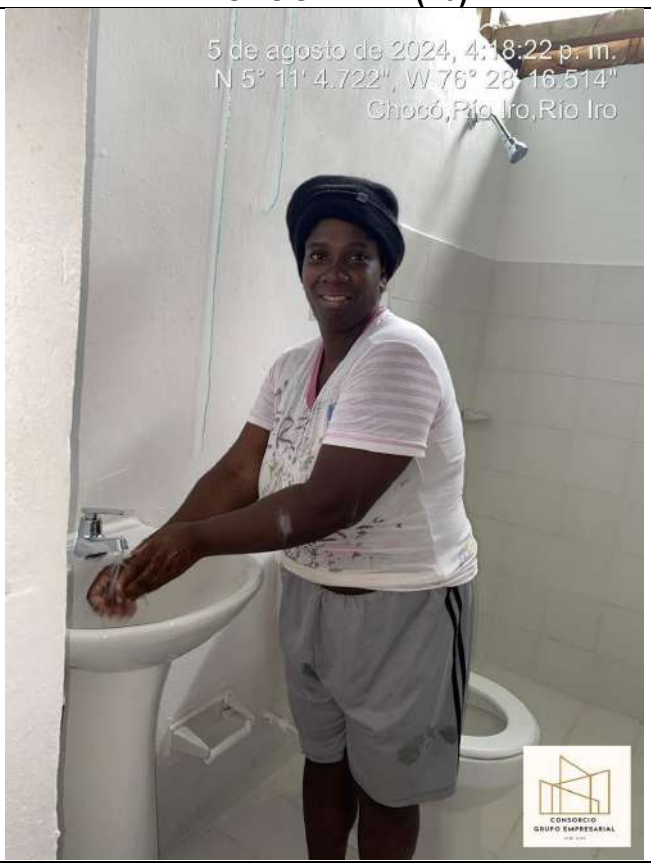

Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09/08/2024

FOTOGRAFÍA (21)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09/08/2024

FOTOGRAFÍA (22)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/08/2024

FOTOGRAFÍA (23)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/08/2024

FOTOGRAFÍA (24)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/08/2024

FOTOGRAFÍA (25)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/08/2024

FOTOGRAFÍA (26)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/08/2024

FOTOGRAFÍA (27)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/08/2024

FOTOGRAFÍA (28)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	26/08/2024

FOTOGRAFÍA (29)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	27/08/2024

FOTOGRAFÍA (30)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	27/08/2024

FOTOGRAFÍA (31)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	27/08/2024

FOTOGRAFÍA (32)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	30/08/2024

FOTOGRAFÍA (33)




Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	30/08/2024

FOTOGRAFÍA (34)

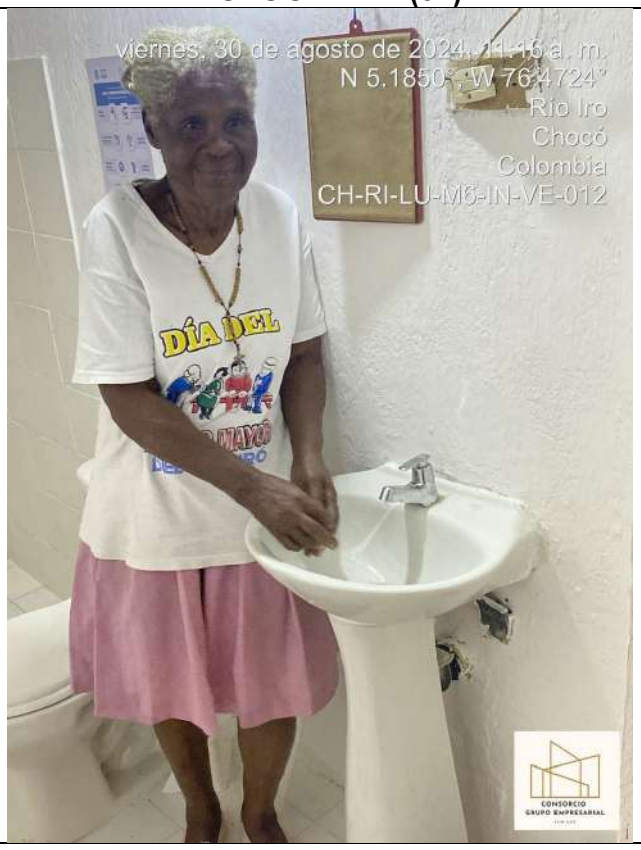

Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas a satisfacción.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

rNOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/08/2024

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo una capacitación sectorizada en educación sanitaria, donde se convoco a los beneficiarios de los barrios La Real, La Unión y El Rosario, contamos con la asistencia de dos integrantes del comité veedor.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/08/2024

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo una capacitación sectorizada en educación sanitaria, donde se convocó a los beneficiarios de los barrios La Real, La Unión y El Rosario, contamos con la asistencia de dos integrantes del comité veedor.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/08/2024

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo una capacitación sectorizada en educación sanitaria, donde se convocó a los beneficiarios de los barrios La Real, La Unión y El Rosario, contamos con la asistencia de dos integrantes del comité veedor.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/08/2024

FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo una capacitación sectorizada en educación sanitaria, donde se convocó a los beneficiarios de los barrios La Real, La Unión y El Rosario, contamos con la asistencia de dos integrantes del comité veedor.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

rNOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/08/2024

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo perifoneo en el Barrio La Unión invitando a los beneficiarios del proyecto a la capacitación en educación Sanitaria.

enterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/08/2024

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo perifoneo en el Barrio La Unión invitando a los beneficiarios del proyecto a la capacitación en educación Sanitaria.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

rNOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/08/2024

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo perifoneo en el Barrio La Real invitando a los beneficiarios del proyecto a la capacitación en educación Sanitaria.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

rNOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/08/2024

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo perifoneo en el Barrio La Unión invitando a los beneficiarios del proyecto a la capacitación en educación Sanitaria.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/08/2024

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo perifoneo en el Barrio La Unión invitando a los beneficiarios del proyecto a la capacitación en educación Sanitaria.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

rNOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/08/2024

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo un recorrido por los cuatro barrios priorizados el día 15 de agosto de 2024, donde contamos con la participación de dos integrantes del comité veedor y la profesional social de la empresa prestadora de servicios públicos, donde se les socializo los avances del proyecto.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/08/2024

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo un recorrido por los cuatro barrios priorizados el día 15 de agosto de 2024, donde contamos con la participación de dos integrantes del comité veedor y la profesional social de la empresa prestadora de servicios públicos, donde se les socializo los avances del proyecto.

enterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/08/2024

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo un recorrido por los cuatro barrios priorizados el día 15 de agosto de 2024, donde contamos con la participación de dos integrantes del comité veedor y la profesional social de la empresa prestadora de servicios públicos, donde se les socializo los avances del proyecto.

enterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/08/2024

FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, realizo un recorrido por los cuatro barrios priorizados el día 15 de agosto de 2024, donde contamos con la participación de dos integrantes del comité veedor y la profesional social de la empresa prestadora de servicios públicos, donde se les socializo los avances del proyecto.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	06/08/2024

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra realizo socialización casa a casa en el Barrio La Union, explicándole a los potenciales beneficiarios acerca del proyecto

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	12/08/2024

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra realizo socialización casa a casa en el Barrio El Rosario, explicándole a los potenciales beneficiarios acerca del proyecto.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09/08/2024

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M6-VE-028 – Realización de Caja de Inspección 40x40

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	10/08/2024

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M2-VE-018 – Realización de Mampostería en Bloque Estructural

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	10/08/2024

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M2-VE - 095, Realización de Viga de Cimentación

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	13/08/2024

FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M2-VE-084 – Realización de Viga de Cimentación

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14/08/2024

FOTOGRAFÍA (5)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M7-IN-VE-004 –MRealización de Mampostería en Bloque Estructural

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14/08/2024

FOTOGRAFÍA (6)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M3-VE-052 – Realización de Losa para Lavadero y Lavaplatos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/08/2024

FOTOGRAFÍA (7)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M6 -VE-006 – Realización de Muros para Lavaplatos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22/08/2024

FOTOGRAFÍA (8)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M4-IN-VE-012 – Realización de Revoque Externo en Unidad Tipo 1

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/08/2024

FOTOGRAFÍA (9)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M2-VE-107 – Realización de Revoque Externo en Unidad Tipo 2

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/08/2024

FOTOGRAFÍA (10)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M6 -VE-006 - Realización de Caja de Inspección Domiciliaria.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/08/2024

FOTOGRAFÍA (11)



Texto explicativo de la fotografía: CH-RI-ER-M2-VE-093 – Instalación de Lavaplatos.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE EQUIPOS**	CODIGO	**F-GG-22**
		VERSION	**02**
		VIGENCIA	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS	CLASIFICACION	**IP**

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/08/2024 **Y EL** 31/08/2024 **FECHA INICIO** 24/08/2023 **CONVENIO MARCO** 222006

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL **CONTRATO No.** 2230223

INTERVENTOR: CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS **CONTRATO No.** 2230219

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Durante este periodo no se contó con maquinaria y/o equipos. Se aclara que unicamente se cuenta con herramienta menor como: pulidoras de diferentes pulgadas, cintas metricas, taladros, codales, palas, palustres, barras, sinceles, y picas; sin embargo los mismos no hacen paret de equipos a ser relacionados en el presente proyecto. De acuerdo al alcance contractual y tipología del proyecto no se cuenta con equipo y/o maquinaria propia y/o alquilada.							

Firma:

Nombre: Oscar Mauricio Almario Fernandez

INTERVENTORÍA

Martes, 30 de Julio de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizo aperturas de los proximos Codigos a intervenir, asimismo, realizó capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalacion de acrilico.

Sabdy Beltrán G.
Prof social
cont. de obra

Miercoles, 31 de Julio de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizó aperturas de los proximos Codigos a intervenir, asimismo, realizó (capac) acompañamiento al area tecnica en los codigos listos para entrega.

Sabdy Beltrán G.
Prof. social
cont. de obra

Jueves, 01 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoira realizo capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrilico a las viviendas entregadas y recibidas a Satisfacción

Sabdy Beltran
Prof social
cont. de obra.

Viernes, 02 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoría realizó capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas entregadas y recibidas a Satisfacción.

Sabdy Beltrán G.
Prof Social.
Cont. de obra

Sábado, 03 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoría realizo capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas entregadas y recibidas a Satisfacción.

Sabdy Beltrán G.
Prof Social.
Cont. de obra.

Lunes, 05 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoría realizó capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas entregadas y recibidas a Satisfacción.

Sabdy Beltrán G.
Prof Social
cont. de obra.

Powered by CamScanner

Martes, 06 de Agosto de 2024.

Rio Iró-Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizó Socialización casa a casa en el Barrio la unión, realizando un diagnostico efectivo.

Soddy Beltrán G.
Prof Social.
Cont. de obra.

Jueves, 08 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoría realizó apertura de los proximos codigos a intervenir en el Barrio El Rosario.

Soddy Beltrán G.
Prof Social.
Cont. de obra.

Viernes, 09 de Agosto de 2024.

Rio Iró-Chocó.

El contratista de obra e interventoria realizaron capacitacion casa a casa en Educación Sanitaria e Instalación de gasilico. a una vivienda en La Unión.

Soddy Beltran G.
prof. Social.
Cont. de obra.

Sabado, 10 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó Socialización casa a casa en el Barrio El Rosario realizando un diagnostico efectivo.

Saddy Beltrán G.
Prof Social
Cont. de obra.

Lunes, 12 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó Socialización casa a casa en el Barrio La unión realizando un diagnostico efectivo. Asimismo, realizó la evidencia de antes de la memoria Social del Barrio El Rosario, Se tomó registro Fotografico y audiovisual de está.

Saddy Beltrán G.
Prof social
Cont. de obra.

Martes, 13 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó Capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrilico en las viviendas entregadas y recibidas a Satisfacción.

Saddy Beltran
Prof Social

Miercoles, 14 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó capacitación casa a casa en. Educación Sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas entregadas y recibidas a Satisfacción.

Saddy Beltrán G.
Prof social.
Cont. de obra.

Jueves, 15 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó un recorrido de obra en los cuatro barrios priorizados donde se contó con la participación de la profesional social de la empresa prestadora de servicios publicos y dos integrantes del comite veedor, donde se socializó el avance del proyecto y novedades acerca del mismo. Asimismo se realizó la capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrilico en las viviendas entregadas y recibidas a Satisfacción.

Saddy Beltrán G.
Prof Social.
Cont. de obra

Viernes, 16 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.
El contratista de obra en acompañamiento de la

Interventoría realizó capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas entregadas y recibidas a Satisfacción. De la misma manera se realizó apertura de 26 viviendas próximas a intervenir en Barrio Nuevo.

Saddy Beltrán G.
Prof. Social
Cont. de obra.

Sábado, 17 de Agosto de 2024.

Río Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoría realizó capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas entregadas y recibidas a Satisfacción.

Saddy Beltrán G.
Prof Social.
Cont. de obra.

Martes, 20 de Agosto de 2024.

Río Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoría realizó acompañamiento al área técnica en las viviendas programadas para entrega.

Saddy Beltrán G.
Prof Social.
Cont. de obra.

Miercoles, 21 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoría realizó apertura de las viviendas proximas a intervenir en Barrio Nuevo.

Soddy Beltrán G.
Prof Social
Cont. de obra.

Jueves, 22 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra e interventoría realizaron actividades administrativas.

Soddy Beltrán G.
Prof Social
Cont. de obra.

Viernes, 23 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra e interventoría realizaron actividades administrativas.

Soddy Beltrán G.
Prof Social
Cont. de obra

Powered by CamScanner

Sabado, 24 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó acompañamiento al area tecnica en las viviendas que están programadas para entrega.

Saddy Beltrán G.
Prof Social.
Cont. de obra.

Lunes, 26 de agosto de 2024

Rio Iró - Choco.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrilico en las viviendas entregadas y recibidas a satisfacción.

Saddy Beltrán G.
Prof Social.
Cont. de obra

Martes, 27 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó (acompañamiento al a) capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrilico en las viviendas entregadas y recibidas a Satisfacción.

Saddy Beltrán G.
Prof Social
Cont. de obra.

Powered by CamScanner

Miercoles, 28 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

En horas de la mañana el contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó perforeo en los barrios la Real, la unión y El Rosario invitando a los beneficiarios a la capacitación Sectorizada en Educación Sanitaria. Asimismo, en horas de la tarde se realizó la capacitacion Sectorizada en Educación Sanitaria, se contó con la participación activa de los beneficiarios y miembros de la veeduria.

Soddy Beltrán
Prof Social
Cont. de obra.

Jueves, 29 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó acompañamiento al area teorica. en las viviendas que estan programadas para entrega.

Soddy Beltrán G.
Prof Social
Cont de obra.

Vieines, 30 de Agosto de 2024

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoria realizó capacitación casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de acrilico en las viviendas entregadas y recibidas a satisfacción. (1)

Soddy Beltrán
Prof Social
Cont de obra

Sabado, 31 de Agosto de 2024.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra e interventoria realizaron actividades administrativas.

Saddy Bertrán B.
Prof Facultad
Con de Ingeniería.

Powered by CamScanner

2 Comisionados de estacas
: Humanidad menor

Actividades

Durante la jornada se presento actividades de obra, entrega de materiales a los codigos en ejecución, durante la mañana por otro lado el Comisión que trae materiales como concreto Continuo enterrado en la via lo que ha retrasado la obra significativamente debido a la ola invernal. y al mal estado de la via por falta de mantenimiento, la misma no hubo Suministro de energia el igual que en el dia del dia miercoles, y hubo falta de suministro de agua. al municipio de no ire.

NOTA; se le recomienda al contratista de obra atender las observaciones realizadas por esta interventoria

Arq. Residente Obra.

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interv

jueves 01 de Agosto 2024

Personal de obra

1: Residente Tecnico de Obra
1. Residente social de obra
1. Profesional social de apoyo de obra
1 Inspector plo de obra
4 Inspectores de tecnicos de obra
1. Residente tecnico de interventoria
1. Residente social de interventoria
1 Inspector plo de interventoria
2 Inspectores tecnicos de interventoria
1 Almacenista
1 Conductor
43 oficiales
20 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentaron lluvias durante el dia de 12:00 PM A 3:00 PM.

Herramienta y Equipos

3 Motocarros
2 Camionetas de Estacas
Herramienta menor.

Actividades

Durante la jornada el contratista continuo con todas las actividades de obra, como tambien se continuo con las entregas de materiales a los codigos ya en ejecución cabe resalte que para este dia la lluvias retrasaron todas las actividades, la via se encuentra en pésimas condiciones para el ingreso de materiales, el transporte en ingreso al municipio de demasiado intermitente, asi mismo se realizaron entrega de materiales a codigos aperturados, y entrega de codigos ya finalizados, por otro lado se hizo apertura a codigos del barrio el rosario.

Ing. Residente Obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interventoria

Viernes 02 de Agosto 2024

Personal de obra
1. Residente tecnico de obra
1 Residente social de obra
1. profesional social de apoyo de obra
1 Inspector pgio de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Residente tecnico de interventoria
1. Residente social de interventoria
1 Inspector pgio de interventoria
2 Inspectores tecnicos de interventoria
1 Almacenista
1 Conductor
4 Ayudantes

20 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentaron lluvias en horas de la tarde de 2:30 pm a 6:00 pm

Actividades

Durante la jornada se presentaron lluvias horas que retrasaron todas las actividades de obra. de que genera poco suministro de materiales a los codigos asi mismo empeora la via que comunica al municipio de rio ro para el ingreso de materiales aun asi se continuo con las entregas de codigos ya finalizados y la apertura de nuevos codigos, como tambien en la medida de lo posible se continuaron con las actividades de obra en todos los frentes en ejecución, cabe resaltar que. el invierno en el municipio de rio ro las vias empeora.

Arq. Residente Obra

VICTOR MURILLO R
Ing. Residente de Interventoria

Sabado 03 de Agosto 2024

Personal obra

1. Residente tecnico de obra
1 Residente social de obra
1. profesional social apoyo de obra
1. Inspector ppal de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Residente tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1. Inspector ppal de interventoria
2. Inspectores tecnicos de interventoria
1 almacenista
1 Conductor
13 oficiales
20 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentaron lluvias pronunciadas de 1:00 pm a 4:30 pm.

Herramienta y Equipos

3 Motocares
2 Camionetas de Estacas
Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada el contratista continuó con las actividades de obra, ejecución de cadenas aporticadas y suministro de materiales o cadenas en ejecución. Así mismo cabe resaltar que no hubo suministro de energía durante la jornada y tampoco agua, retrasando la obra como las actividades administrativas, sin embargo se hizo entrega de cadenas ya finalizadas se continuó en horas de la tarde con la obra prometiendo cumplir en el plan de contingencia, por otra lado se continuo con una vía en mal condiciones para el acceso de materiales, por otra parte llego el suministro de aceros de refuerzo de la obra.

NOTA: Durante esta semana se realizo por esta interventoría los siguientes actividades:
- Realización de aperturas y replanteos
- Recorrido para la Validación de los procesos construc tivos
- Recibo y entrega a satisfacción de algunos Viviendas finalizadas

Ing. Residente Obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de interventoría

Domingo 04 de Agosto de 2024

Personal obra
1 Residente técnico de obra
1 Residente social de obra
1 Profesional social apoyo de obra

1. Inspector ppio de obra
4. Inspectores técnicos de obra
1. Residente técnico de interventoría
1. Residente social de interventoría
1. Inspector ppio de interventoría
2 Inspectores técnicos de interventoría
1 almacenista
1 conductor.
43 oficiales
20 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentan vientos secos y soleados.

Herramienta y equipos

3 Motocarros
2 Camionetas de Estacas
. Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se realizo actividades normales de obra, excavaciones, fundición, pintura etc por debido de contrato con todas las actividades de elaboración de cargos para se entregadas a satisfacción de la interventoría, con el fin de dar cumplimiento al plan de contingencia

Arq. Residente Obra

Victor Murillo R.
Ing. Residente de Interventoría

Sonsón 05 Agosto de 2024

Personal obra

5 Residente técnico obra
1 Residente social obra
1 Profesional social apoyo obra
1 - Inspector ppio obra
4 Inspectores técnicos obra

1 Residente Tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector pico de interventoria
2 Inspectores Tecnicos de interventoria
1 Almacenista
1 Conductor
49 Oficiales
22 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentó un clima soleado y seco

Herramienta y Equipos

3 Motocarro
2 Carretillas de Obreros
- Herramienta menor

Actividades.

Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra desde excavaciones hasta acabados por ello se realizaron entregas de materiales a los cadejos en ejecución, y por ejecutar de manera normal, durante este día se realizo visita al sector el sasaima con el fin de mirar las condiciones de almacenamiento junto con la interventoria y de ejecución, las malas condiciones de la vía no han permitido el ingreso de materiales al municipio de sasaima, también se hizo arreglos de cadejos para entregas a la interventoria.

NOTA: se le recomienda al contratista de obra, entregar dotación de EPPs al personal de mano de obra no calificada.

Aux. Residente Obra

Victor Munoz R
Ing. Residente de Interventoria

Viernes 06 de Agosto de 2024.

Personal Obra
1 Residente Tecnico de Obra

1 Residente social de obra
1. Profesional social apoyo obra
1 Inspector plio de obra
1. almacenista
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Conductores
49 oficiales
22 ayudantes
1. Residente tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1. Inspector plio de interventoria
2 Inspectores tecnicos de interventoria

Descripción climática

Durante la jornada se presento ondas secas

Herramienta y Equipos

3 Motocarros
2 Camionetas de ritaras
. Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra, en las cuales se realizaron procesos de enchape, pintura, excavaciones etc. Por otra lado el contratista reporta que no es facil el ingreso de materiales al municipio de rio iró debido a las condiciones de la vía que se encuentra en muy mal estado debido a las fuertes lluvias en horas de la noche, sin embargo se hacen los mejores esfuerzos por continuar con la ejecución de las actividades en el proyecto, la Comisión no desean ingresar por el estado de la vía.

NOTA: Desde esta interventoría, realiza un llamado de atención por la no entrega de materiales algunos codigos que se encuentran en ejecución.

Arq. Residente Obra

Victor Murillo R.
Ing. Residente de Interve

Viernes 07 de Agosto de 2024

Prisand Obra
1 Residente tecnico obra
1 Residente social obra
1 Profesional social apoyo obra
1. Inspector pcio obra
4. Inspectores tecnicos obra
1 Residente tecnico interventoria
1 Residente social interventoria
1 Inspector pcio interventoria
2 Inspectores tecnicos interventoria
1 Almacenista
1 Conductor
49 Operarios
22 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presento un dia seco

Herramienta y Equipos

2 motocares
2 Camionetas de estacas
Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se realizó actividades de obra de forma normal, por otra el camión que iba suministro de bloque se encontro con dificultades para ingresar por falta de arreglar de la via, se quedo pegado en varios tramos de esta forma se evidencia que se debe arreglar la via de forma urgente.

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Ayu Residente Obra

Jueves 08 de agosto de 2024

Prisand Obra.

1 Residente técnico obra
1. Residente social de obra
1. profesional social de obra
1 Inspector pcio de obra
4 Inspectores técnicos de obra
1 Residente técnico interventoría
1 Residente social de interventoría
1. Inspector pcio de interventoría
2 Inspectores técnicos de interventoría
1 Almacenista
1 Conductor
49 Oficiales
22 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentó un día seco

Herramienta y Equipos

3 Motocarros
2 Compactadores de Ranas
Herramienta menor

Actividades.

Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra, también la entrega de materiales a los cadejos en ejecución, por otro lado se entrego todo el hogar disponible a los cadejos ya en ejecución, también se hizo la recolección de escombros como todas las semanas, por otro lado. se hizo arreglos a los cadejos para entrega a satisfacción. a la interventoría.

NOTA: Se le recomienda al contratista de obra, entregar los materiales a las intervenciones de forma oportuna y organizada.

Ing. Residente obra

VICTOR Murillo R
Ingo. Residente de Interventoria

Viernes 09 de Agosto de 2024

Personal obra

01 Residente Tecnico de obra
1 Residente social de obra
1 Profesional apoyo de social obra
1. Inspector PGIO de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Residente Tecnico de interventoria
1 Residente Social de interventoria
1. Inspector PGIO de interventoria
2. Inspectores tecnicos de interventoria
1 Almacenista
1. Conductor
49 Oficiales
22 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presento un dia Nuboso durante todo el dia con de 12:PM a 6:PM

Herramienta y Equipos

3 motocarros
2 Camionetas de Enlace
. Herramienta menor.

Actividades

Durante la jornada se realizo actividades de obra de forma normal por los Oficiales, Ayudantes se hizo entrega de materiales y suministro de herramientas o maquinaria que asi lo requerian, por otro lado con el animo de continuar con la obra se reunio al personal con el animo de dar paso de tranquilidad sobre el estado de la obra y avance, como tambien se continuo con apoyo a todos los frentes.

Arq. Residente obra

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoria

Sabado 10 de Agosto de 2024

Personal obra

1 Residente Tecnico interventoria
1 Residente Social interventoria
1. Inspector Pbio de interventoria
2 Inspectores Tecnicos de interventoria
1 Residente Tecnico de Obra
1 Residente Social de obra
1 Profesional Social apoyo obra
1. Inspector Pbio de obra
4 Inspectores Tecnicos de obra
1 Almacenista
1. Conductor
49 Oficiales
22 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presento un dia Seco

Herramienta y Equipos

3 Volquetas
2 Camionetas de Estacas
Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se prende actividades con normalidad hasta el medio dia, se entregaron materiales a obras en ejecución Tambien se realizo el recorrido de porcentajes con el animo de mirar el estado de obra, avance y demás aspectos, asi mismo la obra se encuentra afectada por el estado Tercia el cual no puede ingresar materiales con facilidad y es de suma importancia para el fin termino del plan de contingencia

NOTA: ésta interventoría deja constancia que durante esta semana solo se recibió y entregó a satisfaccion al beneficiario 1 Vivienda terminada, por la falta de

organización del contratista de obra.

Arq. Residente Obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Domingo 11 de Agosto de 2024

Personal de obra
1 Residente Técnico de interventoría.
1 Residente social de interventoría
1 Inspector Plás de interventoría
2 Inspectores técnicos de interventoría
1 Residente técnico de obra
1 Residente social de obra
1 Inspector plás de obra
4 Inspectores técnicos de obra
1 Almacenista
1 Conductor
49 oficiales
12 Ayudantes

Descripción Climática.

Durante la jornada se presento ambo seco
Nublamiento y tigipus

3 motocarros
2 Camionetas de enlaces
Herramienta menor
Actividades

Durante lo planeado se continuaron con las actividades de obra en algunos codigos, asi mismo se hizo entrega de oficios a los codigos que se encuentran en ejecución con el animo de continuar con las actividades programadas del proyecto.

Arq. Residente Obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Jueves 12 de agosto 2024

Personal de obra

1 Residente de temas de interventoria
1 Residente social de interventoria
1. Inspector plcio de interventoria
2 Inspector temico de interventoria
1. Residente temicos de obra
1. Residente social de obra
1. Inspector plcio de obra
1. Profesional social apoyo obra
4 Inspectores temicos de obra
1 Almacenista
1. Conductor
33 oficiales
15 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentó unica seca y calida

Herramienta may Equipos

3 volqueteros
2 Camionetas de estacas
. Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presentó bolivados normales de obra, se repartieron materiales a codigos en ejecución como tambien se asignaron codigos a maestros con el animo de continuar con la obra. por otro lado se realizó subexcavación de codigos ya finalizados, comprendido desde excavaciones hasta la postura de cada una de las casetas, tambien se realizo la validación de medidas junto ala interventoria para pasar a obra.

NOTA: Se le recomienda al contratista de obra, entregar los materiales necesarios para la ejecución de las intervenciones de manera oportuna.

Anthy

Victor Murillo

Viotá 13 Agosto de 2024

Personal obra

1. Residente Tecnico de interventoria.
1 Residente Social de interventoria
1. Inspector Pcio de interventoria
2. Inspector Tecnicos de interventoria
1. Residente Tecnico de obra
1. Residente Social de obra
1. profesional Social de obra
1. Inspector Pcio de obra
4 Inspectores Tecnicos de obra
1. Almacenista
1. Conductor.
33 oficiales
15 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentaron un dia cubierto sereno

Herramienta y Equipos

2 camionetas de Estacas
3 carros vareperos

Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se realizaron actividades normales de obra, entrega de materiales a cadejos en ejecución como tambien se continuo en obra con excavaciones fundición, mamposteria, pintura, tambien se realizó validación de medidas para acta 3. junto con la interventoria, asimismo se realizó la disposición de cadejos para ejecutar alos maestros. por otro lado se recuerda que la via se encuentra en malas condiciones para el ingreso de materiales al municipio de viotá.

NOTA: Se le recomienda al contratista de obra, atender las observaciones realizados por esta interventoría, con el fin de que sean subsanadas.

VICTOR Murillo R
Ing Residente de interventoría

Viernes 4 de agosto de 2024

Personal obra

1 Residente Tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector plio de interventoria
2 Inspectores Tecnicos de interventoria
1. Residente Tecnico de obra
1. Residente social de obra
1 Profesional social de apoyo obra
1. Inspector plio de obra
4 Inspectores Tecnico de obra.
1 Almacenista
1. Conductor
33 oficiales.
15 Ayudantes

Descripción climatica

Durante la jornada se presentó nublado todo el dia
, Temperatura y Equipos

2 Camionetas de Estacas
3 Motocarros
. Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presento actividades normales de obra, entrega de materiales se trabajo ya en ejecución, como tambien, tambien se socializaron trabajos para ser entregados de la interventoria, por otra lado. la via se encuentra en malas condiciones por el ingreso de materiales al municipio de rio iró, cabe resaltar que las lluvias se presento en horas de la noche sin embargo el contratista intenta por todos los medios sostener en pie la obra

Arq. Residente Obra

Ing. Residente de interventoria

Jueves 15 de Agosto de 2024

Personal de obra

1. Residente Tecnico de interventoria
1. Residente Social de interventoria
4 Inspector Pcio de interventoria
2 Inspectores Tecnico de interventoria
1 Residente Tecnico de obra
1 Residente Social de obra
1. Profesional Social apoyo de obra
1 Inspector Pcio de obra
4 Inspectores Tecnicos de obra
1. Almacenista
1 Conductor
33 oficiales
15 Ayudantes

Descripción Climática

Durante la jornada se presento un dia calido y seco.

Herramienta y Equipos

2 Camioneta de Estacas
3 Volcanes

Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra. Como tambien se entregaron materiales a los codigos en ejecución, tambien se socializaron entrega de codigos ya finalizados ala interventoria, durante toda jornada del dia jueves, Por otra parte se recuerda que dia viernes este no habra condiciones de las vias no permiten el paso seguro ademas materiales al municipio de rio iró, Sin embargo el contratista hace todo lo necesario por solucionar temas de obra y entregas ya finalizadas para cosechar la obra.

NOTA: Se le solicita al contratista de obra, la entrega de dotación a la mano de obra no calificada.

Hector Murillo
Jefe Residente de Interventoria

Viernes 16 Agosto de 2024

Personal obra

1. Residente de interventoria
1 Residente social de interventoria
1. Inspector pgis de interventoria
2 Inspectores tecnicos de interventoria
1 Residente tecnico interventoria
1 Residente social de obra
1. Profesional social de apoyo obra
1. Inspector pgis de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Almacenista
1 Conductor
33 oficiales
25 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presento un dia soleado y seco

Herramienta y equipo

2 camionetas de estacas
3. motosierras
. Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presentó actividades de obra excavaciones, fundición, mamposteria, pañetes, tambien se continuo con la entrega de materiales a los codigos ya en ejecución, cabe resaltar que durante la semana llego el suministro de bloque, cemento y se tiene proyectado el ingreso de mas material, al mismo se dio por el fin de semana, tambien se hizo entrego de codigos ya finalizados a interventoria

Victor Murillo R
Ing. Residente de interventoria

Ing. Residente obra.

Sábado 17 de agosto de 2024

Personal obra

1. Residente de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector ppio de interventoria
2 Inspectores tecnicos de interventoria
1. Residente tecnico de obra
1. Residente social de obra
1 profesional social apoyo obra
1 Inspector ppio de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Almacenista
1 Conductor
3.3 operarios
15 oyudantes

Descripción climático

Durante la jornada se presentó un dia seco y caluroso.

Herramienta y Equipos

2 camionetas de Estacas
3 motocarros
Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra en el barrio el rosario y la union como tambien se entregaron codigos y finalizados, por otra parte, se entregaron materiales de codigos en ejecución, y se comenzo a realizar la socializacion de carpetas para cobro del acta 3 tres, cabe resalta que el dia sabado llego bloque para abastecer 10 los codigos en ejecución los cuales tienen un buen ritmo de avance de obra.

NOTA: se deja constancia por parte de la interventoria que se aperturaron 29 codigos nuevos el cual el contratista de obra puede iniciar las actividades constructivas y

se recibieron y entregaron a los beneficiarios 17 intervenciones

Arq. Residente obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de interventoría

Domingo 18 de Agosto de 2019

Personal obra
2 Residente técnico de interventoría
1 Residente social de interventoría
1 Inspector ppio de interventoría
2. Inspectores técnicos de interventoría
1 Residente técnico de obra
1 Residente social de obra
1 Inspector. ppio de interventoría
2 Inspectores técnic de obra
1 Almacenista
1 Conductor.
33 oficiales
15 Ayudantes

Descripción climática
Durante la jornada se presento un clima seco y cal

Herramienta y equipos
2 Camionetas de estacas
3 motocarros
.. Herramienta menor

Actividades
Durante la jornada realizó actividades administrativas de la acta Nº 3 para cobro y cus 86 carpetas Fondos para ser entregadas a los interventores

Arq. Residente obra.

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de interventoría

Lunes 19. de agosto de 2024.

Personal de obra

1. Residente Tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector PGIO de interventoria
2 Inspectores Tecnicos de interventoria
1. Residente Tecnico de obra
1 Residente social de obra
1. Inspector PGIO de obra
4 Inspectores Tecnico de obra
1. Almacenista
1 Conductor
33 operarios
15. Ayudantes.

Descripcion climática

Durante la jornada se presento. un clima seco y calido.

Herramienta y Equipos

2 Comisetas de Estacas
3. Motocarros
Herramientas menor

Actividades

Durante la jornada. el contratista continuo con las actividades de obra, entregas de materiales a los codegos. en ejecución, como tambien se continuo con la ejecución de subsanaciones de codigos para entregar ala interventoria, por otra lado, la via se encuentra en malos condiciones para el ingreso de materiales al municipio de rio iró. por lo que ha retrasado las actividades de obra.

NOTA: se le recomienda al contratista de obra, atender las observaciones realizadas por la interventoría para sus respectivas subsanaciones

Ing. Residente obra.

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Martes 20 de agosto de 2024

Personal obra

1. Residente técnico de obra
1 Residente social de obra
1. profesional social apoyo de obra
1. Inspector pólo de obra
2 Inspectores técnicos de obra
1. Almacenista
1 conductor
1. Residente técnico de interventoría
1. Residente social de interventoría
1. Inspector pólo de interventoría
2 Inspector técnicos de interventoría
33 oficiales
15 ayudantes

Descripción climatico

Durante la jornada se presentaron un día seco y soleado.

Herramienta y Equipos

2 camionetas de estacas
3 motocarros
Herramiento menor-

Actividades

Durante la jornada el contratista continuo con las actividades de obra, entrego los materiales a los codigos en ejecución cabe resaltar que el contratista busca por todos los medios necesarios la terminación a feliz termino el contrato en el municipio de norte. Durante la jornada todo transcurrió con normal en cada una de las viviendas en ejecución, sin embargo las condiciones climaticas de la zona no han permitido continuidad continua.

NOTA: se le solicita al contratista ~~al~~ co de obra entregar la dotación de elementos de protección personal de manera inmediata al personal de mano

de obra no calificada.

Ing. Residente de obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Miercoles 21 Agosto de 2024.

Personal obra
1. Residente Tecnico de obra
1. Residente Social de obra
1. Profesional social de apoyo a obra.
1. Inspector PGIO de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1. Almacenista.
1 Conductor
1. Residente Tecnico de interventoria
1. Residente Social de interventoria.
1. Inspector PGIO de interventoria
2 Inspector tecnico de interventoria
33 Oficiales
15 Ayudantes

Descripción climática
Durante la jornada se presentó: actividades normales de obra, entrega de materiales de codigos en ejecución, para esta jornada se presentaron lluvias en las horas de la tarde de 2:30 PM a 4:30 PM

Herramienta y Equipos
2 camionetas de estacas
3 motocarros.
Herramienta menor.

Actividades
Durante la jornada el contratista continuo con las actividades de obra, entrega de materiales a los codigos en ejecucion para esta jornada se realizaron aperturas del patio nuevo, cabe resaltar que las lluvias no permitieron realizar actividades con normalidad.

Scanned with CamScanner

en horas de la tarde. Sin embargo se continuó con la ejecución de cadigos tipo 2. cabe resaltar que no hubo suministro de energía ni agua potable durante la jornada.

Arq. Residente obra — Ing. Residente de Interventoría

Jueves 22 de Agosto de 2019

Personal obra
01 Residente técnico de obra
01 Residente social de obra
01 Inspector pcio de obra
02 Inspector técnicos de obra
01 Almacenista
01 Conductor
01 profesional social apoyo de obra
01 Residente técnico de interventoría
01 Residente social de interventoría
01 Inspector pcio de interventoría
02 inspector técnicos de interventoría
33 oficiales
25 Ayudantes

Descripción climática:
Durante la jornada se presentaron lluvias de 11:am. a 3:00pm.

Herramientas y Equipos
3 Motocarros
2 Camionetas de Estacas
Herramienta menor

Actividades
Durante las jornada se presentaron actividades de obra con restricciones por las lluvias que se presentaron como también por la falta de energía que limitaban los avances de obra en interiores que eran oscuras

para realizar las actividades de obra, por otro lado la falta de suministro de agua en el municipio no permitió un avance continuo en cadenas en ejecución son 03. Se realizaron operativos a codigos del barrio arrecife, la unión, por otro lado, la vía hacia el municipio. ha estado en malas condiciones.

NOTA: se le recomienda al contratista de obra. entregar los materiales a las intervenciones de forma oportuna y organizado.

Ing. Residente obra

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Viernes 23 Agosto de 2024

Personal de obra
✓ Residente de obra
✓ Residente social de obra
✓ Inspector pgio de obra
✓ Inspectores tecnico de obra
✓ Almacenista
✓ Conductor
✓ profesional social apoyo de obra
✓ Residente Tecnico de interventoria
✓ Residente social interventoria
✓ Inspector pgio de interventoria
2 Inspectores tecnico de interventoria
33 operarios
15 Ayudantes

Descripción Climatica
Durante la jornada se presentaron lluvias de 1:30 pm a 6:00 pm.

Herramientas y Equipos.
3 Motocomsierra
2 camioneta de estacas
Herramienta de obras.

Actividades

Durante la jornada se continuo con las actividades de obra sin dificultad en horas de la mañana, tambien se realizo la entrega de materiales a cadigos en ejecución, por otro lado se hizo la recolección de escombros en el barrio el rosario, en la vias de mayor flujo y transito peatonal,

Arq. Residente obra

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interv

Sabado 24 agosto de 2024

Personal obra

1. Res: Tecnico de obra
1 Res. social de obra
1 Insp. p&c de obra
1 Insp tec. de obra
1 Almacenista
1. Conductor

1. Res. tec. interventoria
1 Res. social interventoria
1 Insp. P&C interventoria
1 Insp. tec. interventoria

Descripcion climatica

Durante la jornada se presentaron lluvias en horas de 9: 9.12pm

Herramienta y Equipos

2 Motocarros — 3 camionetas de obras - Herramienta menor

Actividades.

Durante la jornada se realizo actividades de obra entregas de materiales a cadigos, recolección de obra, tambien se realizaron entrega de cadigos ya finalizados, y. socialización de cadigos para se entregadas a la interventoria.

NOTA: se deja constancia por parte de esta interv que solo se aperturaron 4 viviendas y se recibe a satisfacción.

Arq. Residente obra

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interv

Domingo 25 de agosto de 2024 no se realizaron actividades de obra y administrativas.

Victor Murillo R

26 Agosto de 2024.

Personal obra
1 Residente tecnico obra
1 Residente social obra
1. Inspector plio de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Almacenista
1 Conductor
44 trabajadores
32 oficiales
12 Ayudantes
1 Residente tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector plio de interventoria
2 Inspectores tecnicos de interventoria

Descripcion climatica
Durante la jornada se presento un dia soleado.

Herramienta y Equipos
3 Motocomas
1 Camioneta de Estacas
. Herramienta menor.

Actividades
Durante la jornada el contratista continuo con las actividades de obras, entrega de materiales a los codigos a ejecucion, por otro lado, el contratista realiza Subcanaleta de codigos ya finalizados para entrega a la interventoria de forma exitosa, cabe resaltar que se realizaron actividades de mamposteria Fundida de riegos, excavaciones en lo que son demoliciones demarcados por los subcontratistas de los rocas en cada uno de los codigos, Asimismo se hara llamados a la comunidad junto con las entidades del municipio para evitar la perdidas de materiales en los codigos en ejecucion.
NOTA: se le recomienda al contratista de obra aumentar el personal de mano de obra no calificada, con el fin de cumplir con el plan de trabajo aviado por esta interventoria.

Victor Murillo F
Ing. Residente de Interven

Martes 27 agosto 2024

Personal de obra
1. Residente tecnico de obra
1. Residente social de obra
1. Profesional social apoyo obra
1. Inspector PGIO de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1. Residente tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector PGIO de interventoria
2 Inspectores tecnicos interventoria
1. Almacenista
32 oficiales
12 ayudantes

Descripcion climatica
Durante la jornada el se presento un dia seco

Herramienta y Equipos
3 camioneta, motocarros
1 Camioneta de estacas
Herramienta menor.

Actividades
Durante la jornada el contratista continuo con las actividades de obra, entrega de materiales a los codigos en ejecucion, durante el dia los maestros de obra realizaron excavaciones, Fundicion, instalacion de tuberias (redes sanitarias, hidraulicas) Por otro lado, durante la jornada, el contratista avano esfuerzos en la interventoria para la entrega de codigos ya finalizados para dar cumplimiento al plan de contingencia propuesto

NOTA: se le solicita al contratista de obra, entregar la dotacion de Proteccion Personal a la mano de obra no calificada de manera inmediata ya que se les ha reiterado en varias ocasiones.

Arq Residente obra

Victor Murillo F
Ing. Residente de Interventoria

Viernes 28 agosto 2020

Personal de obra
1. Residente Técnico de obra
1. Residente social de obra
1. Profesional social Apoyo de obra
1. Inspector físico de obra
4 Inspector Técnico de obra
1 Almacenista
32 oficiales
12. Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentó un día seco

Herramienta y Equipos

3 Motosierras
2 Camionetas de Estacas
Herramienta menor.

Actividades

Durante la jornada se presentó un día seco por lo cual se se entregaron materiales a los codigos en ejecución, tambien se continuaron todas las actividades de obra, Fundición excavación, Instalación de redes, como tambien se realizaron reuniones para entregas de codigos ya finalizados, sin embargo para este día no hubo Suministro de (agua) agua en el municipio de rio iró los que retraso durante la jornada mañana, Por otro lado se reunió al personal de mano de obra con el fin de hacerles un llamado por la perdidas de materiales en los codigos en ejecución., Asi mismo se trabajo en la subsanaciones de la PAR.S. de la area Social que corresponde en la reparación de codigos finalizados

NOTA: se le recomienda al contratista de obra, atender las observaciones realizadas por esta interventoría con el fin de realizar las respectivas subsanaciones

Ing. Residente obra.

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Jueves 29 Agosto 2024

Personal obra
1 Residente técnico de obra
1. Residente social de obra
1. Inspector pgio de obra
4 Inspectores técnicos de obra
1. Almacenista
1 Conductor
1. Residente técnico de interventoria
1. Residente social de interventoria
1. Profesional social de apoyo obra
1. Inspector pgio de interventoria
2. Inspectores técnicos interventoria

Descripción climática

Durante la jornada se presento un dia de lluvias de horas 1:pd. A. 6:pd.

Herramientas y Equipos

3 Motocarros
2 camionetas de Estacas

Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada el contratista continuo con las actividades de obra, entregas de materiales dias ejecución, para ello se llego al barrio el rosario, por otro lado se realizaron entregas de cobijas y a familiares de interventoria, como también para esta jornada no hubo energia electrica lo que ha generado retrasos frente administrativos con de obra, debido a que las viviendas son muy oscuras y no permiten observar las actividades de obra por falta de energia electrica

NOTA: se le recomienda al contratista de obra, entregar los materiales necesarios para ejecucion de las intervenciones de forma oportuna.

Aux Res obra.

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoria

Viernes 30 agosto 2024

Personal obra
1. Residente Tecnico de obra
1. Residente social de obra
1. Inspector pgco de obra
1. Profesional social apoyo de obra
4 Inspectores Tecnicos de obra
1. Residente Tecnicos de interventoria
1. Residente social de interventoria
1 Inspector pgo de el interventoria
2 Inspectores Tecnico de interventoria
1. Almacenista
1. Conductors
32 Oficiales
12 Ayudantes

Descripción climáticas
Durante la jornada se presentó lluvias de 9.AM a 2.PM

Herramientas y equipos
3 Volqueteros
1 Camioneta de estacas
Herramienta menor.

Actividades
Durante la jornada se continuaron con las actividades de obra, entregas de materiales a cadigos en ejecución, la energía electrica no hubo en el municipio de rio iró, tambien la lluvias retrasaron la ejecución de cadigos por la oscuridad, en la viviendas como tambien se hace saber que no fue facil el transporte de materiales por las lluvias dificultaron proviliar. a todos los cadigos, por otra lado se recolectaron asistentes en el bario el rosario con el animo de despejar las vias en ejecución y las vias peatonales del area Pilaro de rio iró

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Arq. Residente obra

Sábado 31 de agosto 2024

Personal obra
1 Residente técnico obra
1 Residente social obra
1 profesional social apoyo obra
1 Inspector PGIO de obra
4 Inspectores técnicos de obra
1 Almacenista
1 Conductor.
1 Residente técnico de interventoría
1 Residente social de interventoría
1 Inspector PGIO de interventoría
2 Inspectores técnicos de interventoría

Descripción Climatica
Durante la jornada se presentó un clima seco

Herramienta y Equipos
1 Herramienta menor.
3 motocarros
2 Cortadoras de Estacas

Actividades
Durante la jornada se presentaron actividades de obra y entregas de materiales a cadigos en ejecución, entregando agregados, Block, cemento, pesos de refuerzo, como también se continuo con las actividades administrativas entrega de carpetas para cobro de acta y y radicación de entregas de cadigos o muestras para en ejecución, por otro lado para este día se continuó con la actividades de recolección de escombros en el barrio el rosario, ubicación de cadigos para ser entregados a la interventoría.

NOTA: (NOTA) se deja constancia desde esta interventoría que solo se recibe y se entrega a satisfacción 1 sola vivienda terminada.

Arq. Residente obra

Victor Murillo R
Ing. Residente de interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 44

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **29/07/2024** al **4/08/2024** Fecha **4/08/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2230223	**NOMBRE DEL PROYECTO**	INTRADOMICILIARIAS RIO IRÓ
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCÓ	**MUNICIPIO**	RIO IRÓ
GERENCIA A CARGO	GERENCIA DE UNIDAD 1	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2230223
Contratista		CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Valor inicial	$	4.164.944.717,87
Valor actual	$	4.164.944.717,87
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		24/08/2023
Plazo inicial (Días)		213 Días
Plazo actual (Días)	373 Días	100,00%
Variación en plazo		160 Días
Fecha Contractual de terminación		31/08/2024
Tiempo Transcurrido (días)	346	92,76%
Días remanentes del Contrato	27	7,24%
Acumulado a última acta pagada	$	1.197.537.320,36
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	$	2.230.219,00
Interventor		CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
Valor inicial	$	396.843.968,13
Valor actual	$	396.843.968,13
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		24/08/2023
Plazo inicial		228 Días
Plazo actual	373 Días	100,00%
Variación en plazo		145 Días
Fecha Contractual de terminación		31/08/2024
Ejecución del Contrato	346	92,76%
Días remanentes del Contrato	27	7,24%
Acumulado a última acta pagada	$	126.990.069,80
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 2.849.216.505,65	68,41%	$ 2.443.484.492,52	58,67%	-$ 405.732.013,13	-9,74%
Durante el Periodo	$ 359.632.378,01	8,63%	$ 172.453.244,65	4,14%	-$ 187.179.133,35	-4,49%
Acumulado a la Fecha	**$ 3.208.848.883,66**	**77,04%**	**$ 2.615.937.737,18**	**62,81%**	**-$ 592.911.146,48**	**-14,24%**

Semaforo

Desviación en días

-53,1 Días

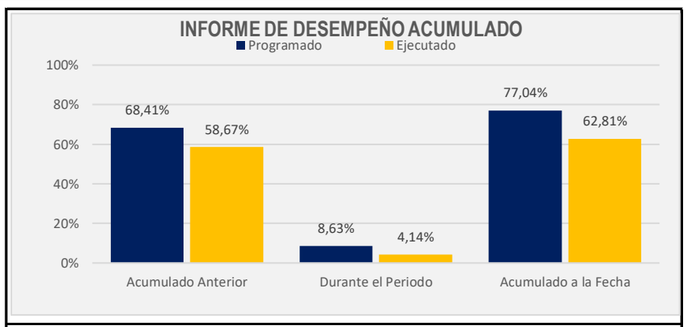

Observaciones al desempeño del proyecto

ACTIVIDAD No. 1
El contratista de obra remitió los diseños arquitectónicos y estructurales los cuales fueron aprobados por la Interventoría y los mismos cuentan con VoBo del munisiterio desde el día 14 de noviembre del 2023.

ACTIVIDAD No. 2


Durante esta semana, el contratista de obra realiza No realiza diagnósticos en ninguno de los cuatro barrios priorizados. A la fecha se han visitado un total de 625 viviendas, se han diagnosticado 457 viviendas efectivas de las cuales se han aprobado 442 diagnosticos y se han presentado 61 renuncias. De igual manera del total de viviendas visitadas se han identificado 108 como no efectivas. Cabe señalar que de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría, el contratista de obra a corte del presente informe debe contar con un total de 459 diagnósticos realizados y avalados, por lo anterior se cuenta con un atraso en esta actividad. Cabe señalar que si bien no se han adelantado la totalidad de aprobaciones de diagnósticos, esta situación obedece a que ya se diagnosticó la totalidad de viviendas de la matriz inicial, por tal motivo a la fecha se están realizado visitas, diagnósticos y aprobacion de inclusiones. Se es espera seguir adelantando actividades de diagnósticos y cumplir en lo posible con el potencial de viviendas inicialmente viabilizado por el Ministerio de Vivienda.


ACTIVIDAD No. 3

A corte del presente informe, se cuenta con 376 viviendas iniciadas las cuales están localizadas en Barrio Nuevo, en el Barrio La Real, el Barrio La Unión y el Barrio El Rosario en las manzanas 1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,7, 8,9 y 10 en las cuales se han realizado actividades significativas correspondientes a fundición de vigas de cimentación, construcción de muros en mampostería estructural, pañetado, enchape de pisos y paredes en cerámica, instalación de combos sanitarios, construcción de lavaderos y lavaplatos, Excavación . Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 376 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 101 viviendas en ejecución, 275 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoría y al beneficiario 256 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución con porcentajes estimados de avance es de 62,81% (Ejecutado Estimado de acuerdo al resumen anexo al presente informe), con respecto al 77,04% que se tiene programado, es decir, presenta un atraso del 14,24% respecto a viviendas programadas y terminadas (Con porcentaje estimado). Cabe señalar que si bien el contratista presenta en las 376 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 376 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 256 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoría. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo (Plan de Contingencia) y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoría el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 350 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 94 viviendas en atraso, pues esta no se encuentran terminadas en su totalidad y no cuenta con acta de recibo a satisfacción.

NOTA ACLARATORIA: El seguimiento a la ejecución de las obras se realiza a partir del ultimo plan de trabajo (Plan de contingencia) avalado por la interventoría el día 21/06/2024. Es importante señalar y aclarar que la diferencia o reducción de intervenciones entre la semana No. 34 y 35 obedece al reajuste y repogramación realizada por el contratista, de acuerdo a los compromisos establecido con la Entidad Contratante de reasignar interveciones producto del atraso y son redistribuidas a partir de la semana 36 en adelante, por tal motivo, la intervenotría realiza el debido seguimiento a partir de acuerdo a las cantidades y valores establecidas por el contratista como accion para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y plan de contingencia.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

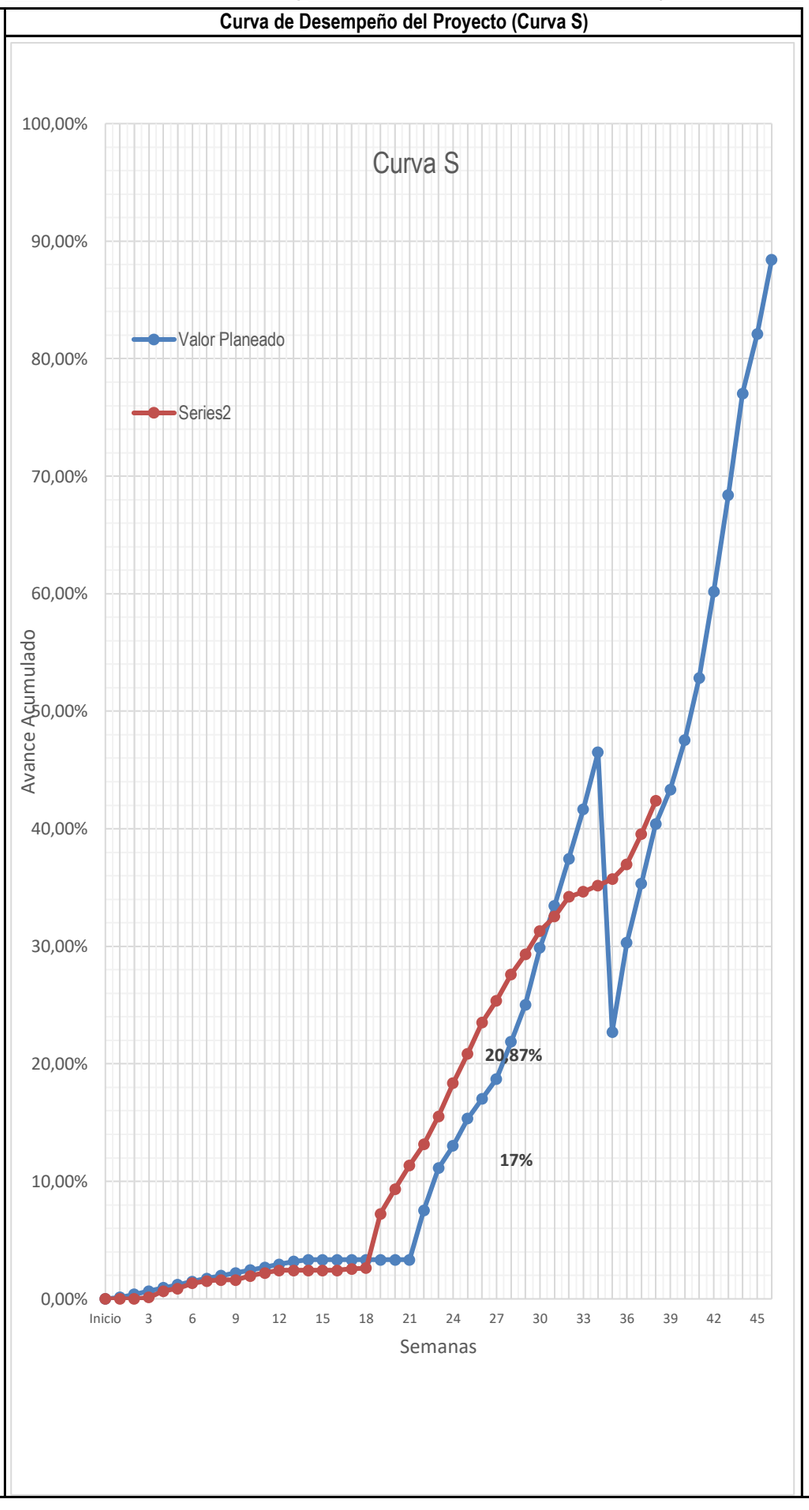

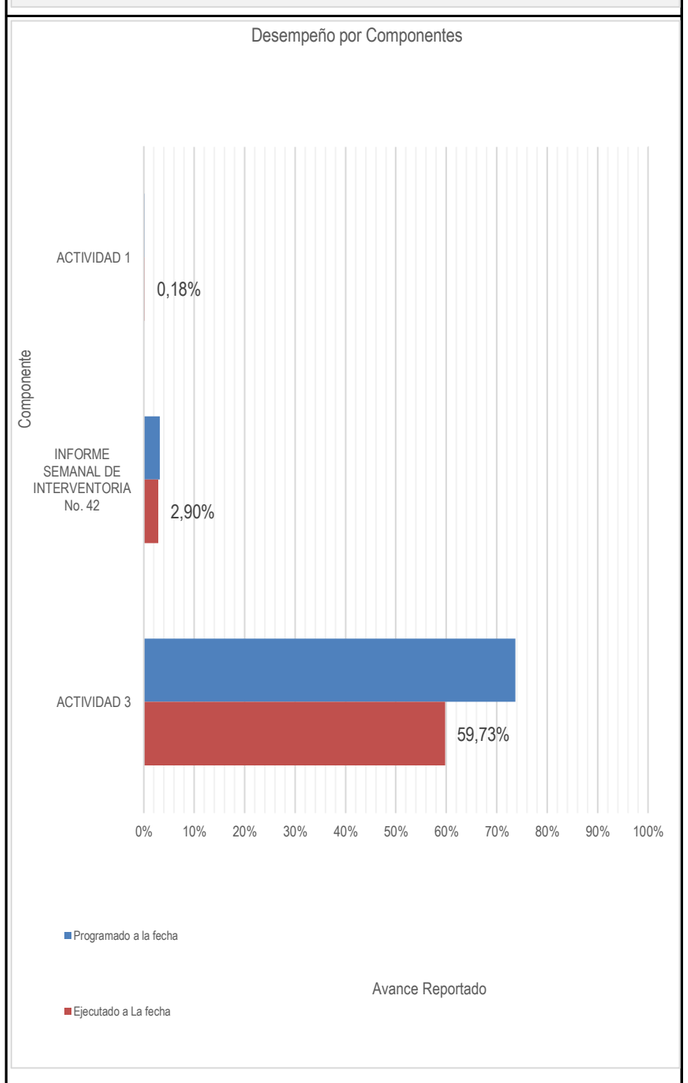

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 44

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **29/07/2024** al **4/08/2024** Fecha **4/08/2024**


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

De acuerdo a los atrasos evidenciados por parte del contratista de obra, fue necesario desde la interventoría y ENTerritorio S.A solicitar un plan de contingencia al contratista con el fin de mitigar estos atrasos, por tal motivo, se procede a realizar el seguimiento al contrato de obra de acuerdo al plan de trabajdo vigente (plan de contingencia) avalado el 21/06/2024, plan de contingencia que refleja el compromiso del contratista de intervenciones semanales y mensuales hasta el 31 de agosto de 2024.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	68,41%	58,67%	-9,74%	
Durante el Periodo	8,63%	4,14%	-4,49%	
Acumulado a la Fecha	**77,04%**	**62,81%**	**-14,24%**	

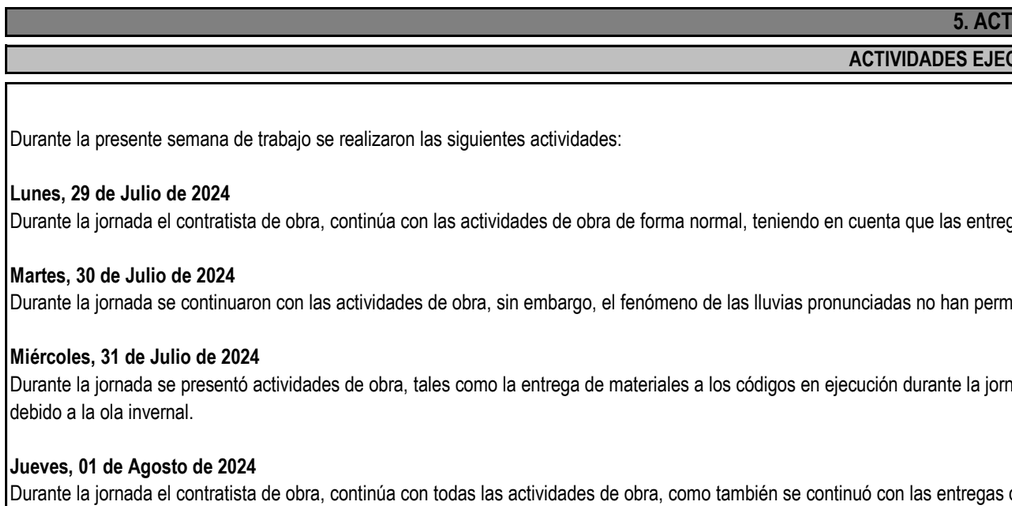



AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 4.164.944.717,87	$ 4.164.944.717,87	$ -	$ 805.225.665,88	$ 220.146.445,74	$ 585.079.220,14

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 1.836.090.842,11	44,08%	3	$ 1.836.090.842,11	44,08%	9/05/2024	$ 638.553.521,75







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 396.843.968,13	$ 496.054.960,16	$ 99.210.992,03	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
4	$ 239.594.545,75	48,30%	4	$ 239.594.545,75	48,30%	30/07/2024	$ 51.583.101,79

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra continuó desarrollando la actividad numero 3 con procesos de excavación manual, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de lavaderos, instalación lavaplatos, acabados y pintura, hasta la fecha del presente informe se cuenta con 275 viviendas terminadas, de las cuales 256 han sido entregadas a la interventoría y a los beneficiarios. Cabe señalar que a la fecha el contratista de obra adelanta 376 intervenciones de 389 que se tienen programadas en el plan de trabajo, así mismo, se tiene un porcentaje aproximado ejecutado de viviendas terminadas y en ejecución de 62,81%, y un 77,04% programado, es decir, presenta un atraso del 14,24% respecto a viviendas programada, terminadas y/o recibidas a satisfacción con porcentaje estimado de intervención de cada vivienda (Segun cuadro anexo al presente informe). Es importante resaltar que si bien el contratista de obra cuenta en 275 viviendas terminadas, solo se cuenta con 256 viviendas recibidas a satisfacción, por tal motivo se presenta un atraso del 26,86% referente a la cantidad de intervenciones programadas como viviendas recibidas a satisfacción las cuales corresponden a 350 viviendas.

Durante la semana, se realiza comité de seguimiento de manera virtual con el fin de dar a conocerlas las actividades y los avances realizados durante la semana.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Durante la presente semana de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

Lunes, 29 de Julio de 2024
Durante la jornada el contratista de obra, continúa con las actividades de obra de forma normal, teniendo en cuenta que las entregas de materiales a códigos aperturados y en ejecución se han hecho de forma oportuna.

Martes, 30 de Julio de 2024
Durante la jornada se continuaron con las actividades de obra, sin embargo, el fenómeno de las lluvias pronunciadas no han permito que se realicen las actividades con normalidad.

Miércoles, 31 de Julio de 2024
Durante la jornada se presentó actividades de obra, tales como la entrega de materiales a los códigos en ejecución durante la jornada de la mañana, por otro lado, el camión que transporta los materiales se encuentra enterrado en la vía lo que retrasa la obra significativamente debido a la ola invernal.

Jueves, 01 de Agosto de 2024
Durante la jornada el contratista de obra, continúa con todas las actividades de obra, como también se continuó con las entregas de materiales a los códigos ya en ejecución, cabe resaltar que para este día la lluvia retrasó todas las actividades.

Viernes, 02 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentaron lluvias fuertes que retrasaron todas las actividades de obra que generó poco suministro de materiales a los códigos aperturados. Por otro lado, se continúa con las actividades de obras en los barrios se encuentran en ejecución.

Sábado, 03 de Agosto de 2024
Durante la jornada el contratista, continúa con actividades de obra, ejecutando actividades constructivas en los códigos aperturados, de igual manera, se realiza suministro de materiales a los códigos en ejecución. Por otro lado, se realizó la entrega a satisfacción de códigos ya finalizados.
Durante esta semana se realiza por esta interventoría las siguientes actividades: realización de aperturas y replanteos, recorrido para la validación de los procesos constructivos, recibo y entrega a satisfacción de algunas viviendas finalizadas.

Domingo, 04 de Agosto de 2024
Durante esta jornada, se realizó actividades normales de obra, tales como excavaciones, fundición, pintura, etc. Por otro lado, se continúa con todas las actividades de subsanación de códigos para ser entregados a satisfacción a la interventoría, con el fin de dar cumplimiento al plan de contingencia.

NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, atender las observaciones y requerimientos realizados por esta interventoría.
NOTA 2: Se le recomienda al contratista de obra, entregar la dotación de los elementos de protección personal al personal de mano

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 44

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **29/07/2024** al **4/08/2024** Fecha **4/08/2024**

Durante el periodo la interventoría remite los siguientes comunicados al Contratista de obra y/o ENTerritorio y/o Municipio de Rio Iró y/o Empresa de Servicios Publicos:

CAEE-RI-2024-372 ENTREGA INFORME SEMANAL SOCIAL # 41
CAEE-RI-2024-373 Entrega Informe semanal No. 43
CAEE-RI-2024-374 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-235 Obs. Diagnosticos


Se tiene previsto que para la semana siguiente el contratista y/o interventoría realice las siguientes actividades:

1. Contratista de obra continue elaborando diagnosticos de inclusion.
2. El contratista de obra siga desarrollando la Actividad No.3, consintente en la realización de aperturas, replanteos y ejecución de obra. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo y cronograma de entregables avalado por la interventoría.
3. Entrega de intervenciones a la interventoría y al beneficiario.
4. Realización de comité de seguiemito virtual
5. Recorrido de validacion de personal en obra
7. Capacitación sobre Manipulación manual de carga.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

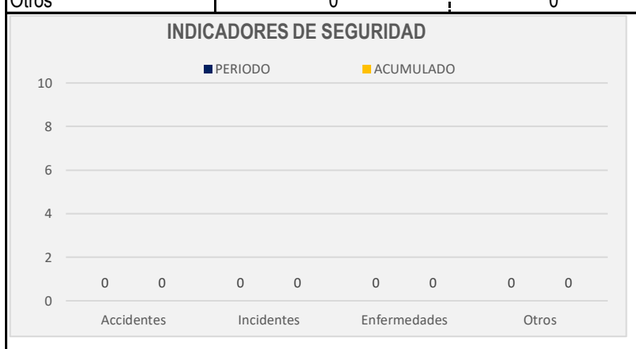

Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	222,75	8	230,75	61,4%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	145	0	145	38,6%
	Total	**367,75**	**8**	**375,75**	**100,00%**

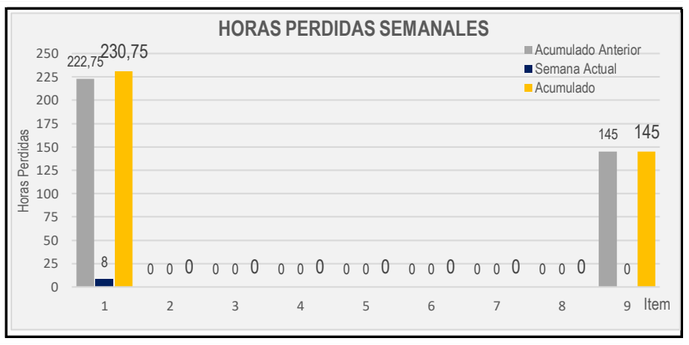

OBSERVACIONES:
1. Durante el periodo se presentan lluvias en la zona, ocasionando una perdida de tiempo de 8 horas.
2. Durante el periodo no se presentan, accidentes, incidentes o enfermedades que hayan ocasionado perdida de tiempos y/o cese de actividades.
3. Durante el periodo la interventoría realiza revisión de documentación entregada por el Contratista de obra, sin embargo la interventoría efectua una serie de observaciones y requerimientos los cuales se pusieron en conocimiento del contratista a traves de comunicados.
4. se realizó acompañamiento al área técnica en actividades de campos como: recorrido de porcentajes, recorrido de observaciones.
5. se realizó recorrido punto a punto de intervencion por el PGIO de interventoria e inspector sst del contratista sobre validacion de personal en campo.
6. Capacitacion de las consecuencias de la contaminación.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A	29/07/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	el contratista de obra acompañamiento de Interventoria realizó aperturas de las viviendas próximas a intervenir en el barrio el rosario.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	30/07/2024	Barrio nuevo y la union	N/A	el contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó apertura de la vivienda próximas a intervenir en el barrio el rosario.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	31/07/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	el contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó aperturas de las viviendas próximas a intervenir en el barrio el rosario.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	1/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	el contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizó capacitación casa a casa e instalación de acrílico en las viviendas entregadas y recibidas satisfacción.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	02//08/2024	Barrio la real y la Union	N/A	el contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizó capacitación casa a casa e instalación de acrílico en las viviendas entregadas y recibidas satisfacción	Obra e Interventoría	N/A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 44

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **29/07/2024** al **4/08/2024** Fecha **4/08/2024**

N/A	3/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	Se realizan actividades administrativas y revisión de informes	Obra e Interventoría	N/A
N/A	4/08/2024	Barrio nuevo	N/A	Se realizan actividades administrativas	Interventoría	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A	N/A		N/A	N/A

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Se ha evidenciado problemas con el fulido electrico y el flujo de agua con el fin de realizar las pruebas necesarias, y poder validar la funcionalidad de las obras ejecutadas. Adicionalmente se presenta problemas de flujo electrico y de internet y conexion de redes moviles	Se ha efectuado acercamientos con la Empresa prestadora de servicios publicos con el fin de que se garantice el flujo suficiente para poder validar cada intervención, sin embargo ha sido compleja esta situacion pues a pesar de los acercamientos el flujo de agua en el Municipio es muy compleja. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA PROBLEMATICA ES REITERADA SEMANA A SEMANA DEBIDO A QUE ES UNA SITUACIÓN QUE OCURRE DE MANERA NORMAL Y SEGUIDA EN EL MUNICIPIO.	Se realiza validacion de flujo de agua toda la semana para poder adelantar actividades de validacion y recibo de obras. Esta situación se deja documentada en Bitacora.	Contratista de obra Interventoría Empresa Prestadora de Servicios	Bitácora	Se realiza constantemente
Se presenta falencias en el estado de las vias que impiden el ingreso de vehiculos y de materiales a obra	El Alcalde Municipal de Rio Iró se compromete a reparar de manera provisional estos 2 sectores con el fin de que el contratista durante el din de semana del presente periodo ingrese materiales a obra. Cabe señalar que el Municipio manifiesta que se cuenta con un proceso de seleción que se encuentra en proceso adjudicacion y contratacion con el cual se pretende mejorar estos sectores criticos. Lo anterior como una acción de mejora y el contratista cuente con las garantizas de acceso al Municipio. A CORTE DEL PRESENTE INFORME SE ESTÁ A LA ESPERA QUE EL MUNICIPIO INFORME LAS GESTIONES REALIZADAS Y SOBRE EL INICIO DE LAS OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS. CABE SEÑALAR QUE LAS VIAS A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN ESTADO MUY DETERIORADO Y EL MUNICIPIO NO HA EFECTUADO ACTIVIDAD ALGUNA	Mejoramiento de vias por parte del Municipio	Alcaldía de Rio Iro	Acta de comité e informes semanales	Se realiza constantemente
Tal y como se habia manifestado con anterioridad, a la fecha se sigue presentando problemática en la excavaciones que se vienen realizando en las conexiones intradomiciliarias, pues se ha evidenciado presencia de rocas en las excavaciones conllevando a requerir mayores tiempos en la ejucción de esta actividad.	El contratista ha señalado e informado a la interventoría sobre esta situación, la cual ya se habia presentado con anterioridad.	Se validará la necesidad de contemplar una actividad no prevista, toda vez que el contratista no cuenta con esta actividad de manera contractual. A la fecha está en proceso de validación por parte del contratista de obra y remision a la interventoría.	Contratista de obra	N/A	5/08/2024

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





Fotografia 1.Acompañamiento a entraga a satisfacción



Fotografia 2. Capacitación casa a casa en temas de educación sanitaria



Fotografia 3. Socialización casa a casa en aperturas



Fotografía 4. CH-RI-LR-M1-IN-VE-012 - Pintura en Unidad Tipo 1



Fotografia 5. CH-RI-LU-M4-VE-028 - Instalación de Enchape (Proceso de ejecución)



Fotografia 6. CH-RI-LU-M5-VE-070 - Realización de Revoque

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 44

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **29/07/2024** al **4/08/2024** Fecha **4/08/2024**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 376 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 101 viviendas en ejecución, 275 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoría y al beneficiario 256 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución es 62,81% (Ejecutado), con respecto al 77,04% que se tiene programado, es decir, presenta un atraso del 14,24% respecto a viviendas programada, terminadas y recibidas a satisfcación. Cabe señalar que si bien el contartista presenta un avance en las 376 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 376 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 256 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoría. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoría el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 350 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 94 viviendas sin contarse sin la respectiva terminación y acta de recibo a satisfacción.

A la fecha el contratista de obra presenta un atraso del 14,24% de acuerdo al nuevo plan de trabajo avalado por la interventoría y según el avance estimado del total de viviendas iniciadas, terminadas, en ejecución y recibidas a satisfacción. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 77,04%, sin embargo, de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados, y la ejecución de obras el contratista contó con un 62,81% de ejecución; cabe señalar que, este porcentaje es calculado a partir del avance estimado y aproximado de cada vivienda iniciada y/o terminada y/o recibida a satisfacción. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se encuentra en un atraso en la cantidad de viviendas terminadas y recibidas a satisfacción de 94 intervenciones, es decir de las 350 viviendas programadas para el periodo, unicamente se cuenta con 256 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría y beneficiario. ES importante señalar que si bien se viene presentando un atraso en obra, esta situacion obecede al mal estado de la via, el cual ha impedido ingresar materiales al Municipio y por ende presentar reducción de rendimiento. Cabe señalar que esta situación ya habia sido advertida por la interventoría, pues a pesar de que el contratista de obra se encuentra aadelantando acciones necesarias y pertinentes para garantizar el personal y material en obra, el Municipio de Rio Iró no ha cumplido con los compromisos establecidos a la fecha; por lo anterior se establece que si bien se presenta un atraso en obra, este no es imputable al contratista de obra, sino a un tercero el cual corresponde al Municipio de Rio Iró. De acuerdo a lo anterior, se ha solicitado a la Entidad contratante poner en conocimiento al Ministerio de Vivienda sobre esta problematica a fin de que se brinde una colaboración con el Municipio de Iró y se permita una accesibilidad adecuada al municipio. Es importante referir y advertir una vez más que si esta situación sigue persistiendo y no se toman acciones por parte del Municipio, se generará un mayor atraso en obra y será necesario que la Entidad prorrogue los contratos a fin de recuperar los tiempos perdidos o agotados.

Durante el periodo, se presentan 8 horas de lluvia que afectan la correcta ejecución de actividades de diagnóstico. ejecución de obras y validación. Durante el periodo no se cuenta con flujo de energia, ni red de telefonia movil, wifi y agua de manera constante para poder ejecutar actividades en obra y/o realizar las pruebas de presion o necesarias para recibir las intervenciones terminadas o adelantar actividades administrativas (casi siempre se cuenta con flujo de agua y energia en horas de la noche cuando ya no se adelantan obras).

Es importante señalar que la presente interventoría ha venido desarrollando sus actividades de acuerdo a sus obligaciones contractuales, así mismo ha venido efectuando el debido seguimiento y control sobre las obras que se vienen ejecutando en la zona y se ha reportado de manera oportuna las situaciones presentadas al momento de ejecutar las obras o de recibir las mismas.


Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	Nombre: LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,12%	$ 4.938.639,00	0,00%	$ -
2	0,39%	$ 16.243.284,40	0,00%	$ -
3	0,66%	$ 27.574.064,98	0,13%	$ 5.443.779,94
4	0,93%	$ 38.891.777,97	0,66%	$ 27.521.331,92
5	1,21%	$ 50.209.490,96	0,88%	$ 36.594.298,49
6	1,48%	$ 61.527.203,95	1,32%	$ 55.042.663,84
7	1,73%	$ 72.050.781,95	1,52%	$ 63.208.333,75
8	1,97%	$ 82.083.864,94	1,62%	$ 67.279.256,42
9	2,21%	$ 92.116.947,93	1,62%	$ 67.279.256,42
10	2,45%	$ 102.150.030,92	1,95%	$ 81.014.385,77
11	2,69%	$ 112.183.113,92	2,22%	$ 92.460.326,90
12	2,93%	$ 122.216.196,91	2,42%	$ 100.758.634,22
13	3,18%	$ 132.249.279,90	2,42%	$ 100.758.634,22
14	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
15	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
16	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
17	3,33%	$ 138.816.388,90	2,56%	$ 106.622.584,78
18	3,33%	$ 138.816.388,90	2,63%	$ 109.343.090,06
19	3,33%	$ 138.816.388,90	7,25%	$ 301.776.635,45
20	3,33%	$ 138.816.388,90	9,35%	$ 389.477.173,25
21	3,33%	$ 138.816.388,90	11,36%	$ 472.975.221,08
22	7,55%	$ 314.246.816,77	13,15%	$ 547.572.387,73
23	11,13%	$ 463.362.680,82	15,55%	$ 647.483.129,45
24	13,02%	$ 542.306.373,55	18,35%	$ 764.267.355,73
25	15,34%	$ 638.793.109,11	20,87%	$ 869.263.504,67
26	17,02%	$ 708.965.280,43	23,52%	$ 979.450.922,72
27	18,71%	$ 779.137.451,75	25,37%	$ 1.056.639.793,61
28	21,87%	$ 910.710.272,97	27,61%	$ 1.150.105.690,79
29	25,03%	$ 1.042.283.094,20	29,31%	$ 1.220.884.792,07
30	29,87%	$ 1.244.028.086,74	31,30%	$ 1.303.743.280,93
31	33,45%	$ 1.393.143.950,79	32,53%	$ 1.354.895.363,67
32	37,45%	$ 1.559.802.857,67	34,22%	$ 1.425.098.894,41
33	41,66%	$ 1.735.233.285,97	34,64%	$ 1.442.621.538,75
34	46,51%	$ 1.936.978.278,51	35,18%	$ 1.465.102.486,35
35	22,71%	$ 945.796.358,63	35,73%	$ 1.487.963.904,84
36	30,29%	$ 1.261.571.129,57	36,98%	$ 1.540.191.613,62
37	35,34%	$ 1.472.087.643,52	39,57%	$ 1.648.199.031,55
38	40,40%	$ 1.682.604.157,48	42,39%	$ 1.765.517.074,31
39	43,35%	$ 1.805.405.457,28	46,02%	$ 1.916.565.608,18
40	47,56%	$ 1.980.835.885,58	47,53%	$ 1.979.748.531,17
41	52,82%	$ 2.200.123.920,95	51,60%	$ 2.149.010.562,57
42	60,20%	$ 2.507.127.170,47	54,44%	$ 2.267.424.733,85
43	68,41%	$ 2.849.216.505,65	58,67%	$ 2.443.484.492,52
44	77,04%	$ 3.208.848.883,66	62,81%	$ 2.615.937.737,18
45	82,10%	$ 3.419.365.397,61		$ -
46	88,42%	$ 3.682.511.040,06		$ -
47	94,73%	$ 3.945.656.682,50		
48	100,00%	$ 4.164.944.717,87		
	100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**62,81%**	**$ 2.615.937.737,18**

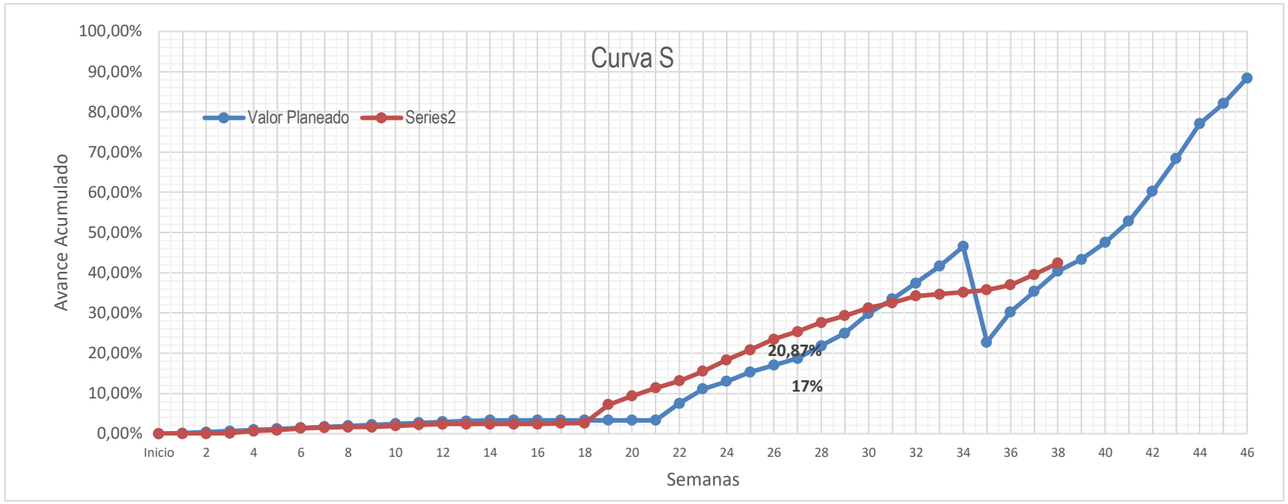

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC)	$	4.164.944.717,87

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACTIVIDAD 1	0,18%	$ 7.474.214,02	0,18%	$ 7.474.214,02	**0,18%**	$ 7.474.214,02
2	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 42	3,15%	$ 131.342.174,45	3,15%	$ 131.342.174,45	**2,90%**	$ 120.754.678,91
3	ACTIVIDAD 3	96,67%	$ 4.026.128.329,40	73,71%	$ 3.070.032.495,19	**59,73%**	$ 2.487.708.844,25
		100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**77,04%**	**$ 3.208.848.883,66**	**62,81%**	**$ 2.615.937.737,18**

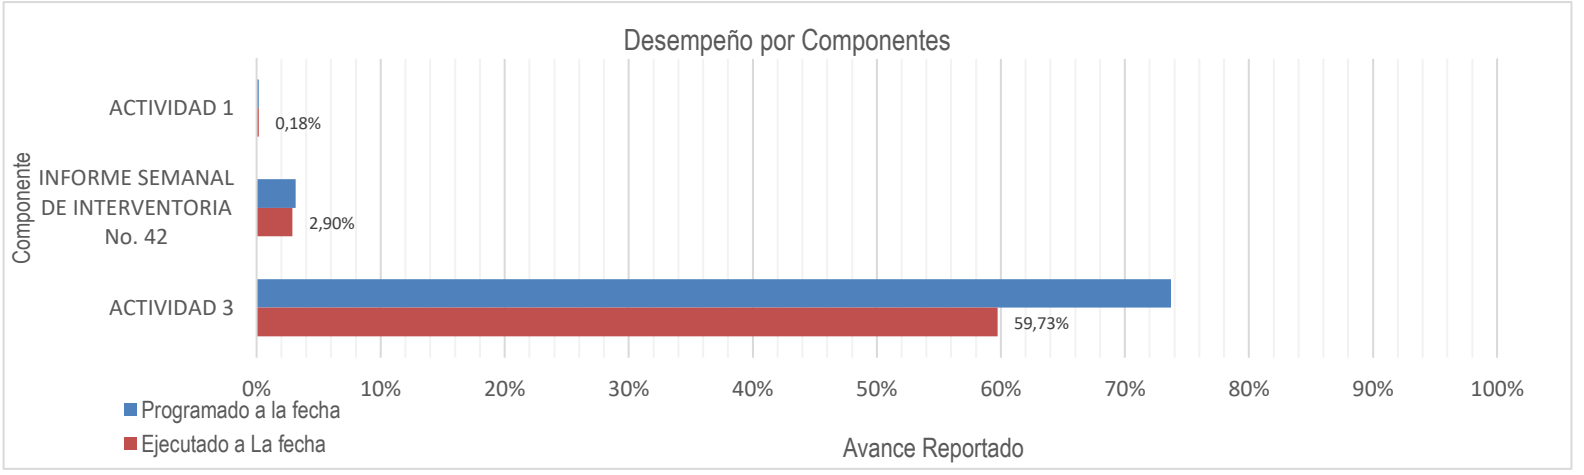

Fecha de Corte	18/01/2024 - 04/08/2024	PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS RIO IRÓ CHOCO																									
	Priorización	MATRIZ BASE								INCLUSIONES										TOTALES (MATRIZ + INCLUSIONES)					EJECUCION DE OBRA (ACTIVIDAD No. 3)				
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusion	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP	Viviendas No Avaladas por Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	Viviendas Recibidas a Satisfacción por Interventoria y beneficiario	Viviendas Programadas actividad No.3 segun plan de trabajo Vigente (DEBIDAMENTE TERMINADAS)	VIVIENDAS EN ATRASO POR FALTA DE TERMINACION DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO
Rio Iró Chocó	Barrio Nuevo	198	459	170	17	169	11	1	90	73	76	3	0	55	17	54	3	273	225	34	223	14	193	190	3	186	350	94
	La Real	59		39	8	37	12	1	33	19	25	6	0	20	10	14	2	91	59	18	51	14	46	44	2	38		
	La unión	78		47	15	45	16	0	35	27	30	3	0	25	9	24	0	112	72	24	69	16	67	40	27	32		
	El Rosario	123		85	23	82	15	0	26	25	26	1	0	16	9	17	2	150	101	32	99	17	70	1	69	0		
	TOTAL	458	459	341	63	333	54	2	184	144	157	13	0	116	45	109	7	626	457	108	442	61	376	275	101	256	350	94

	CONTRACTUAL			PROGRAMADO			EJECUTADO		
	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
ACTIVIDAD 1	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%
ACTIVIDAD 2	459	$ 131.342.174,45	3,15%	459	$ 131.342.174,45	3,15%	422	$ 120.754.678,91	2,90%
ACTIVIDAD 3	459	$ 4.026.128.329,40	96,67%	350	$ 3.070.032.495,19	73,71%	376	$ 2.487.708.844,25	59,73%
		$ 4.164.944.717,87	100,00%		$ 3.208.848.883,66	77,04%		$ 2.615.937.737,18	62,81%

necesidad, también se vienen interviniendo la conexiones domiciliarias en las viviendas y conexiones de aqueducto.

Arq. Residente Obra.

Víctor Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Jones 29 de julio de 2024.

Personal de obra
1. Residente técnico de obra
1 Residente social de obra
1 profesional social apoyo obra
1. Inspector ppio de obra.
4 Inspectores técnicos de obra
1. Residente técnico de interventoría
1 Residente social de interventoría
1. Inspector ppio de interventoría
2 Inspectores técnicos de interventoría
1 Almacenista
1 Conductor
43 oficiales
20 Ayudantes

Descripción climática
Durante la jornada se presentó condición seco y soleado.

Herramienta y Equipos
3 motocarros
2 Carretas de Estacas

Herramienta menor

Actividades
Durante la jornada el contratista continuo con las actividades de obra de forma normal. teniendo en cuenta que las entregas a codigos apertrados, y en ejecución se han hecho de forma oportuna aunque las malas condiciones de la vía han hecho, que no sea posible hacer llega el material al municipio de río iró con facilidad, el invierno

inclemente. muestra que el difícil acceso promueva. retrazos. en la obra, es de resaltar que el retrazo se debe ala ubicación geografica en que se encuentra (obra) el proyecto aun asi el contratista hace esfuerzos por sostener en pie con el fin de dar feliz termino al proyecto, por otra lado hubo falta de suministro de agua al municipio como tampoco de energía.

Arq. Residente Obra

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoria

Viernes 09 de julio de 2021

Personal de obra
1 Residente tecnico de obra
1 Residente Social de obra
1 Profesional social apoyo de obra
2 Inspector pcio de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Residente tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector pcio de interventoria
2 Inspectores tecnicos de interventoria
1 Almacenista
1 Conductor
43 operarios
20 Ayudantes

Descripción climática
Durante la jornada se presentaron lluvias de 3:30 pm a 6:00 pm.

Herramientas y Equipos
3 Motocarros
2 Camionetas de Estacas
Herramienta menor

Actividades
Durante la jornada se continuaron con las

actividades de obra, Sin embargo el fenomeno de lluvias pronunciadas no han permitido que se realice las actividades con normalidad, las lluvias siempre se encuentran fuertes durante la tarde, retrasando la entrega de materiales a los equipos en ejecución, Hoy mismo la vía de acceso se encuentra en pesimas condiciones para el ingreso, en este día el camión de carga seguedo entrampado en la vía sin poder continuar su ingreso al municipio de Pió nó.

NOTA: se le recomienda al contratista de obra entregar la dotación de los elementos de protección personal al personal de mano de obra no calificada nuevos.

Ing. Residente Obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Pueblo: 31 de julio de 2024

Personal Obra
1. Residente tecnico de Obra
1 Residente Social Obra
1 Profesional social apoyo obra
1 Inspector p&o de obra
4 Inspectores tecnicos obra
1. Residente tecnico de interventoria
1. Residente Social de interventoria
1. Inspector p&o de interventoria
1. Almacenista
1 Conductor
4 oficiales
20 Ayudantes

Descripción climático
Durante la jornada se presento lluvias de 3:30 p.
a 5:30 p.m.

Herramienta y Equipos
3 Motocarros

Powered by CamScanner

2 Comisionado de Estacas
Jornada menor

Actividades

Durante la jornada se presento actividades de obra, entrega de materiales a los codigos en ejecución, durante la mañana por otro lado el Comisión que fue materiales como comunidad Construido enterrado en la via lo que la retrasa la obra significativamente debido a la ola invernal. y al mal estado de la via por falta de mantenimiento, asimismo no hubo Suministro de energía el igual que el dia del dia miercoles, y hubo falta de suministro de agua en el municipio de nóvita.

NOTA; Se le recomienda al contratista de obra atender las observaciones realizadas por esta interventoria

Arq. Residente Obra.

Ing. Residente de Inter

jueves 01 de Agosto 2024

Personal de obra

1: Residente tecnico de Obra
1. Residente social de obra
1. Profesional social de apoyo de obra
1 Inspector pgio de obra
4 Inspectores de tecnicos de obra
1. Residente tecnico de interventoria
1. Residente social de interventoria
1 Inspector pgio de interventoria
2 Inspectores tecnicos de interventoria
1 Almacenista
1 Conductor
43 oficiales
20 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentaron lluvias durante el dia de 12:00 PM A 3:40 PM.

Herramienta y Equipos

3 Motocarros
2 Camionetas de Estacas
Herramienta menor.

Actividades

Durante la jornada el contratista continuo con todas las actividades de obra, como tambien se continuo con las entregas de materiales a los codigos ya en ejecución cabe resaltar que para este dia la lluvias retrasaron todas las actividades, la via se encuentra en pésimas condiciones para el ingreso de materiales, el transporte en ingreso al municipio de demasiado intermitente, asi mismo se realizaron entrega de materiales a codigos apertirados, y entrega de codigos ya Finalizados, por otro lado se hizo apertura a codigos del barrio el rosario.

Ing. Residente Obra

VICTOR Murillo R
Ingo Residente de Interventoria

Viernes 02 de Agosto 2024

Personal de obra
1. Residente tecnico de obra
1 Residente social de obra
1. profesional social de apoyo de obra
1 Inspector PGIO de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Residente tecnico de interventoria
1. Residente social de interventoria
1 Inspector PGIO de interventoria
2 Inspectores tecnicos de interventoria
1 Almacenista
1 Conductor
4 Operadores

Powered by CamScanner

20 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentaron lluvias en horas de la tarde de 2:30 pm a 6: pm

Actividades

Durante la jornada se presentaron lluvias que retrasaron todas las actividades de obra de la cual generó poco suministro de materiales a los codigos asi mismo esperó la vía que comunica al municipio de rio ró para el ingreso de materiales aun asi se continuo con las entregas de codigos ya grabados y la apertura de nuevos codigos, como también en la medida de lo posible se continuaron con las actividades de obra en todos los frentes en ejecución, cabe resaltar que el invierno en el municipio de rio ró ha sido inmenso

Arq. Residente Obra

VICTOR Murillo R.
Ing. Residente de Interventoría

Sabado 03 de Agosto 2024

Personal obra

1. Residente tecnico de obra
1 Residente social de obra
1 profesional social apoyo de obra
1. Inspector pgio de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Residente tecnico de interventoría
1 Residente social de interventoría
1. Inspector pgio de interventoría
2. Inspectores tecnicos de interventoría
1 Almacenista
1 Conductor
13 oficiales
20 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentaron lluvias pronunciadas de 1:00 pm a 4:30 pm.

Herramienta y Equipos

3 Motocaros

2 Camionetas de Estacas

Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada el contratista continuo con las actividades de obra, ejecución de cadenas apartado y suministro de materiales a cadenas en ejecución asi mismo cabe resaltar que no hubo suministro de energía durante la jornada y tampoco agua, retrasando la obra como las actividades administrativas, sin embargo se hizo entrega de cadenas ya finalizadas se continuo en horas de la tarde con la obra prometiendo cumplir en el plan de contingencia, por otra lado se continuo con una via en mal condiciones para su acceso de materiales, por otra parte llego el suministro de acero de refuerzo de la obra.

NOTA: Durante esta semana se realiza por esta interventoría las siguientes actividades:

- Realización de aperturas y replanteos
- Recorrido para la Validación de los procesos constructivos
- Recibo y entrega a satisfacción de algunas Viviendas finalizadas

Ing. Residente Obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de interventoría

Domingo 04 de Agosto de 2024

Personal obra

1 Residente técnico de obra

1 Residente social de obra

1 Profesional social apoyo de obra

Powered by CamScanner

1. Inspector. Pbio de obra
4. Inspectores técnicos de obra
1. Residente Técnico de interventoría
1. Residente social de interventoría
1. Inspector Pbio de interventoría
2 Inspectores técnicos de interventoría
1 almacenista
1 conductor.
03 oficiales
20 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentan vientos secos y soleados.

Herramienta y equipos

3 Motocarros
2 Camionetas de Obras
Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se realizo actividades normales de obra, excavaciones, fundición, pintura etc. por debido de continuo con todas las actividades de Subsanación de Cargos para se entregadas a satisfacción de la interventoría, con el fin de dar cumplimiento al plan de contingencia

Arq. Residente Obra

Victor Murillo R.
Ing. Residente de interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 45

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **5/08/2024** al **11/08/2024** Fecha **11/08/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2230223	**NOMBRE DEL PROYECTO**	INTRADOMICILIARIAS RIO IRO
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCO	**MUNICIPIO**	RIO IRO
GERENCIA A CARGO	GERENCIA DE UNIDAD 1	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2230223
Contratista		CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Valor inicial	$	4.164.944.717,87
Valor actual	$	4.164.944.717,87
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		24/08/2023
Plazo inicial (Días)		213 Días
Plazo actual (Días)	373 Días	100,00%
Variación en plazo		160 Días
Fecha Contractual de terminación		31/08/2024
Tiempo Transcurrido (días)	353	94,64%
Días remanentes del Contrato	20	5,36%
Acumulado a última acta pagada	$	1.197.537.320,36
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	$	2.230.219,00
Interventor		CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
Valor inicial	$	396.843.968,13
Valor actual	$	396.843.968,13
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		24/08/2023
Plazo inicial		228 Días
Plazo actual	373 Días	100,00%
Variación en plazo		145 Días
Fecha Contractual de terminación		31/08/2024
Ejecución del Contrato	353	94,64%
Días remanentes del Contrato	20	5,36%
Acumulado a última acta pagada	$	126.990.069,80
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

Semaforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.208.848.883,66	77,04%	$ 2.615.937.737,18	62,81%	-$ 592.911.146,48	-14,24%
Durante el Periodo	$ 210.516.513,96	5,05%	$ 127.081.598,17	3,05%	-$ 83.434.915,78	-2,00%
Acumulado a la Fecha	**$ 3.419.365.397,61**	**82,10%**	**$ 2.743.019.335,35**	**65,86%**	**-$ 676.346.062,26**	**-16,24%**

Desviación en días: -60,6 Días



Observaciones al desempeño del proyecto

ACTIVIDAD No. 1

El contratista de obra remitió los diseños arquitectónicos y estructurales los cuales fueron aprobados por la Interventoria y los mismos cuentan con VoBo del munisiterio desde el día 14 de noviembre del 2023.

ACTIVIDAD No. 2


Durante esta semana, el contratista de obra realiza 2 diagnósticos en ninguno de los cuatro barrios priorizados. A la fecha se han visitado un total de 628 viviendas, se han diagnosticado 460 viviendas efectivas de las cuales se han aprobado 442 diagnosticos y se han presentado 61 renuncias. De igual manera del total de viviendas visitadas se han identificado 107 como no efectivas. Cabe señalar que de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoria, el contratista de obra a corte del presente informe debe contar con un total de 459 diagnósticos realizados y avalados, por lo anterior se cuenta con un atraso en esta actividad. Cabe señalar que si bien no se han adelantado la totalidad de aprobaciones de diagnósticos, esta situación obedece a que ya se diagnosticó la totalidad de viviendas de la matriz inicial, por tal motivo a la fecha se están realizado visitas, diagnósticos y aprobacion de inclusiones. Se es espera seguir adelantando actividades de diagnósticos y cumplir en lo posible con el potencial de viviendas inicialmente viabilizado por el Ministerio de Vivienda.


ACTIVIDAD No. 3

A corte del presente informe, se cuenta con 384 viviendas iniciadas las cuales están localizadas en Barrio Nuevo, en el Barrio La Real, el Barrio La Unión y el Barrio El Rosario en las manzanas 1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,7, 8,9 y 10 en las cuales se han realizado actividades significativas correspondientes a fundición de vigas de cimentación, construcción de muros en mamposteria estructural, pañetado, enchape de pisos y paredes en cerámica, instalación de combos sanitarios, construcción de lavaderos y lavaplatos, Excavación . Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 384 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 100 viviendas en ejecución, 284 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoria y al beneficiario 257 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución con porcentajes estimados de avance es de 65,86% (Ejecutado Estimado de acuerdo al resumen anexo al presente informe), con respecto al 82,10% que se tiene programado, es decir, presenta un atraso del 16,24% respecto a viviendas programadas y terminadas (Con porcentaje estimado). Cabe señalar que si bien el contratista presenta en las 384 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 384 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 257 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoria. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo (Plan de Contingencia) y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoria el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 374 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 117 viviendas en atraso, pues esta no se encuentran terminadas en su totalidad y no cuenta con acta de recibo a satisfacción.

NOTA ACLARATORIA: El seguimiento a la ejecución de las obras se realiza a partir del ultimo plan de trabajo (Plan de contingencia) avalado por la interventoria el día 21/06/2024. Es importante señalar y aclarar que la diferencia o reducción de intervenciones entre la semana No. 34 y 35 obedece al reajuste y repogramación realizada por el contratista, de acuerdo a los compromisos establecido con la Entidad Contratante de reasignar intervenciones producto del atraso y son redistribuidas a partir de la semana 36 en adelante, por tal motivo, la intervenotria realiza el debido seguimiento a partir de acuerdo a las cantidades y valores establecidas por el contratista como accion para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y plan de contingencia.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

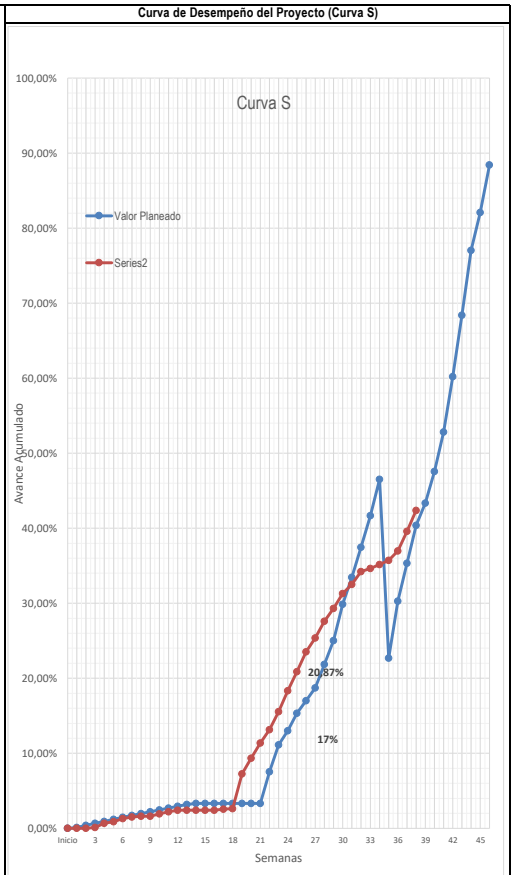

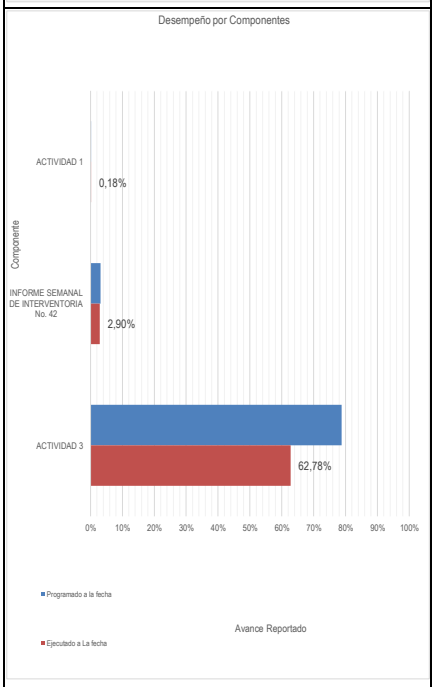

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 45

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **5/08/2024** al **11/08/2024** Fecha **11/08/2024**


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

De acuerdo a los atrasos evidenciados por parte del contratista de obra, fue necesario desde la interventoría y ENTerritorio S.A solicitar un plan de contingencia al contratista con el fin de mitigar estos atrasos, por tal motivo, se procede a realizar el seguimiento al contrato de obra de acuerdo al plan de trabajdo vigente (plan de contingencia) avalado el 21/06/2024, plan de contingencia que refleja el compromiso del contratista de intervenciones semanales y mensuales hasta el 31 de agosto de 2024.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	77,04%	62,81%	-14,24%	
Durante el Periodo	5,05%	3,05%	-2,00%	
Acumulado a la Fecha	**82,10%**	**65,86%**	**-16,24%**	

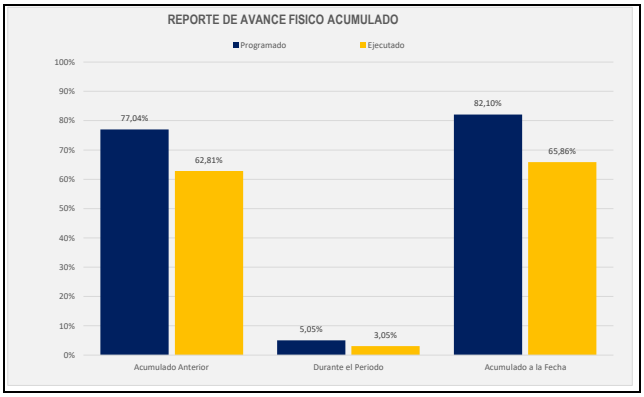


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 4.164.944.717,87	$ 4.164.944.717,87	$ -	$ 805.225.665,88	$ 220.146.445,74	$ 585.079.220,14

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 1.836.090.842,11	44,08%	3	$ 1.836.090.842,11	44,08%	9/05/2024	$ 638.553.521,75








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 396.843.968,13	$ 496.054.960,16	$ 99.210.992,03	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
4	$ 239.594.545,75	48,30%	4	$ 239.594.545,75	48,30%	30/07/2024	$ 51.583.101,79







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra continuó desarrollando la actividad numero 3 con procesos de excavación manual, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de lavaderos, instalación lavaplatos, acabados y pintura, hasta la fecha del presente informe se cuenta con 284 viviendas terminadas, de las cuales 257 han sido entregadas a la interventoría y a los beneficiarios. Cabe señalar que a la fecha el contratista de obra adelanta 384 intervenciones de 419 que se tienen programadas en el plan de trabajo, así mismo, se tiene un porcentaje aproximado ejecutado de viviendas terminadas y en ejecución de 65,86%, y un 82,10% programado, es decir, presenta un atraso del 16,24% respecto a viviendas programada, terminadas y/o recibidas a satisfacción con porcentaje estimado de intervención de cada vivienda (Segun cuadro anexo al presente informe). Es importante resaltar que si bien el contratista de obra cuenta en 284 viviendas terminadas, solo se cuenta con 257 viviendas recibidas a satisfacción, por tal motivo se presenta un atraso del 31,28% referente a la cantidad de intervenciones programadas como viviendas recibidas a satisfacción las cuales corresponden a 374 viviendas.

Durante la semana, se realiza comité de seguimiento de manera virtual con el fin de dar a conocerlas las actividades y los avances realizados durante la semana.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Durante la presente semana de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

Lunes, 05 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra desde excavaciones hasta acabados, por otro lado, se realizaron entregas de materiales a los códigos en ejecución y por ejecutar. Por otra parte, se realizó visita al sector el rosario con el fin de validar las conexiones de alcantarillado junto con la interventoría y la alcaldía municipal.

Martes, 06 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra en las cuales se realizaron procesos de instalación de enchapes, pintura, excavaciones, etc.

Miércoles, 07 de Agosto de 2024
Durante la jornada se realizó actividades de obra de forma normal.

Jueves, 08 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra, también la entrega de materiales a los códigos en ejecución, por otro lado, se entregaron todos los bloques estructurales a los códigos en ejecución, también se realizó la recolección de escombro.

Viernes, 09 de Agosto de 2024
Durante la jornada se realizó actividades de obra de forma parcial por las lluvias, también se realizó entregas de materiales y suministro de herramientas a cuadrillas que lo requieran.

Sábado, 10 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentaron actividades con normalidad hasta el mediodía, se entregaron materiales a códigos en ejecución como también se realiza el recorrido de porcentajes, con el animo de revisar el estado de la obra.
Esta interventoría deja constancia que durante esta semana solo se recibió y se entregó a satisfacción al beneficiario 1 vivienda terminada, por la falta de organización del contratista de obra.

Domingo, 04 de Agosto de 2024
Durante esta jornada se continuaron con las actividades de obra en algunos códigos, así mismo, se realizó la entrega de bloques a los códigos que se encuentran en ejecución con el animo de continuar con las actividades.

NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, entregar los materiales a las intervenciones de forma oportuna y organizada.
NOTA 2: Se le recomienda al contratista de obra, entregar la dotación de los elementos de protección personal al personal de mano de obra no calificados nuevos.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 45

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **5/08/2024** al **11/08/2024** Fecha **11/08/2024**

Durante el periodo la interventoría remite los siguientes comunicados al Contratista de obra y/o ENTerritorio y/o Municipio de Río Iró y/o Empresa de Servicios Públicos:

CAEE-RI-2024-375 Traslado de comunicado No, PPDI-OF-CGE-23-400 y concepto de interventoria
CAEE-RI-2024-376 ENTREGA INFORME SEMANAL SOCIAL # 42
CAEE-RI-2024-377 ENTREGA INFORME MENSUAL SOCIAL # 11
CAEE-RI-2024-378 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-242
CAEE-RI-2024-379 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-244 Obs. Diagnosticos
CAEE-RI-2024-380 NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - NO ENTREGA INFORME
CAEE-RI-2024-381 NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - CALIDAD
CAEE-RI-2024-382 SOLICITUD RETIRO DE PERSONAL DE OBRA - SST
CAEE-RI-2024-383 SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FRENTE A ACCIDENTE LABORAL
CAEE-RI-2024-385 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OF-CGE-23-403 Devolucion Items NP
CAEE-RI-2024-386 Entrega Informe semanal No. 44
CAEE-RI-2024-387 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OF-CGE-23-404 Calidad
CAEE-RI-2024-389 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OF-CGE-23-405 Obs. inf. semanal 42 y 43
CAEE-RI-2024-390 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-248 aprob. Diagnosticos


Se tiene previsto que para la semana siguiente el contratista y/o interventoría realice las siguientes actividades:

1. Contratista de obra continue elaborando diagnosticos de inclusion.
2. El contratista de obra siga desarrollando la Actividad No.3, consintente en la realización de aperturas, replanteos y ejecución de obra. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo y cronograma de entregables avalado por la interventoría.
3. Entrega de intervenciones a la interventoría y al beneficiario.
4. Realización de comité de seguiemito virtual
5. Recorrido de validacion de personal en obra
7. Capacitación sobre Riesgos mecánicos.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	230,75	5	235,75	61,9%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cual?	145	0	145	38,1%
	Total	375,75	5	380,75	100,00%



OBSERVACIONES:
1. Durante el periodo se presentan lluvias en la zona, ocasionando una perdida de tiempo de 5 horas.
2. Durante el periodo no se presentan, accidentes, incidentes o enfermedades que hayan ocasionado perdida de tiempos y/o cese de actividades.
3. Durante el periodo la interventoría realiza revisión de documentación entregada por el Contratista de obra, sin embargo la interventoría efectua una serie de observaciones y requerimientos los cuales se pusieron en conocimiento del contratista a traves de comunicados.
4. se realizó acompañamiento al área técnica en actividades de campos como: recorrido de porcentajes, recorrido de observaciones.
5. se realizó recorrido punto a punto de intervencion por el PGIO de interventoria e inspector sst del contratista sobre validacion de personal en campo.
6. Capacitacion sobre manipulación de cargas
7. Charla sobre Capacitacion sobre Orden y Aseo

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A	5/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	El contratista de obra acompañamiento de Interventoria realizó capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico a 10 beneficiarios	Obra e Interventoría	N/A
N/A	06/8//2024	Barrio nuevo y la union	N/A	El contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó socialización casa a casa en el barrio La Unión realizando un diagnóstico efectivo. Se realizó reunión extraordinaria con los beneficiarios de un sector del barrio el Rosario, se contó con el acompañamiento del secretario de planeación, personero municipal, Gerente de la Empresa prestadora, para definir temas de conexión en donde se logró concertar con los beneficiarios para poder realizar las actividades de ejecución sin ningún inconveniente.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	7/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	Día festivo	Obra e Interventoría	N/A
N/A	8/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizó socialización casa a casa a 8 beneficiarios en las aperturas de los próximos códigos e intervenir en el barrio El Rosario.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	09//08/2024	Barrio la real y la Union	N/A	El Contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó capacitación casa a casa en educación sanitaria instalación de acrílico a 7 beneficiarios en las viviendas entregadas y recibidas a satisfacción	Obra e Interventoría	N/A
N/A	10/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizó Socialización casa a casa a un beneficiario en el barrio del Rosario para un diagnóstico afectivo.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	11/08/2024	Barrio nuevo	N/A	Se realizan actividades administrativas	Interventoría	

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 45

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **5/08/2024** al **11/08/2024** Fecha **11/08/2024**

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A	N/A		N/A	N/A

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Se ha evidenciado problemas con el fulido electrico y el flujo de agua con el fin de realizar las pruebas necesarias, y poder validar la funcionalidad de las obras ejecutadas. Adicionalmente se presenta problemas de flujo electrico y de internet y conexion de redes moviles	Se ha efectuado acercamientos con la Empresa prestadora de servicios publicos con el fin de que se garantice el flujo suficiente para poder validar cada intervención, sin embargo ha sido compleja esta situacion pues a pesar de los acercamientos el flujo de agua en el Municipio es muy compleja. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA PROBLEMATICA ES REITERADA SEMANA A SEMANA DEBIDO A QUE ES UNA SITUACIÓN QUE OCURRE DE MANERA NORMAL Y SEGUIDA EN EL MUNICIPIO.	Se realiza validacion de flujo de agua toda la semana para poder adelantar actividades de validacion y recibo de obras. Esta situación se deja documentada en Bitacora.	Contratista de obra Interventoría Empresa Prestadora de Servicios	Bitácora	Se realiza constantemente
Se presenta falencias en el estado de las vias que impiden el ingreso de vehiculos y de materiales a obra. El Municipio no ha otorgado respuesta alguna sobre las precisiones que se han elevado.	El Alcalde Municipal de Rio Iró se compromete a reparar de manera provisional estos 2 sectores con el fin de que el contratista durante el din de semana del presente periodo ingrese materiales a obra. Cabe señalar que el Municipio manifiesta que se cuenta con un proceso de seleción que se encuentra en proceso adjudicacion y contratacion con el cual se pretende mejorar estos sectores criticos. Lo anterior como una acción de mejora y el contratista cuente con las garantizas de acceso al Municipio. A CORTE DEL PRESENTE INFORME SE ESTÁ A LA ESPERA QUE EL MUNICIPIO INFORME LAS GESTIONES REALIZADAS Y SOBRE EL INICIO DE LAS OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS. CABE SEÑALAR QUE LAS VIAS A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN ESTADO MUY DETERIORADO Y EL MUNICIPIO NO HA EFECTUADO ACTIVIDAD ALGUNA	Mejoramiento de vias por parte del Municipio	Alcaldía de Rio Iro	Informe semanal	Se realiza constantemente
Tal y como se habia manifestado con anterioridad, a la fecha se sigue presentando problemática en la excavaciones que se vienen realizando en las conexiones intradomiciliarias, pues se ha evidenciado presencia de rocas en las excavaciones conllevando a requerir mayores tiempos en la ejucción de esta actividad.	El contratista ha señalado e informado a la interventoría sobre esta situación, la cual ya se habia presentado con anterioridad.	Se validará la necesidad de contemplar una actividad no prevista, toda vez que el contratista no cuenta con esta actividad de manera contractual. A la fecha está en proceso de validación por parte del contratista de obra y remision a la interventoría.	Contratista de obra	N/A	5/08/2024

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





Fotografia 1.Capacitacion casa a casa en temas de educacion sanitaria



Fotografia 2. Reunion extraordinaria con beneficiarios de un sector del barrio el Rosario, se conto con la participacion de actores del PCI



Fotografia 3. Socialización casa a casa



Fotografía 4. CH-RI-ER-M2-VE-095 - Realización de Viga de Cimentación



Fotografia 5. CH-RI-ER-M2-VE-018 - Realización de Mampostería en Bloque Estructural



Fotografia 6. CH-RI-ER-M6-VE-028 - Realización de Caja de Inspección 40x40

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 45

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **5/08/2024** al **11/08/2024** Fecha **11/08/2024**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.


Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 384intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 100 viviendas en ejecución, 284 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoría y al beneficiario 257 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución es 65,86% (Ejecutado), con respecto al 82,10% que se tiene programado, es decir, presenta un atraso del 16,24% respecto a viviendas programada, terminadas y recibidas a satisfcación. Cabe señalar que si bien el contratista presenta un avance en las 384 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 384 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 257 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoría. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoría el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 374 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 117 viviendas sin contarse sin la respectiva terminación y acta de recibo a satisfacción.

A la fecha el contratista de obra presenta un atraso del 16,24% de acuerdo al nuevo plan de trabajo avalado por la interventoría y según el avance estimado del total de viviendas iniciadas, terminadas, en ejecución y recibidas a satisfacción. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 82,16%, sin embargo, de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados, y la ejecución de obras el contratista contó con un 65,86% de ejecución; cabe señalar que, este porcentaje es calculado a partir del avance estimado y aproximado de cada vivienda iniciada y/o terminada y/o recibida a satisfacción. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se encuentra en un atraso en la cantidad de viviendas terminadas y recibidas a satisfacción de 117 intervenciones, es decir de las 374 viviendas programadas para el periodo, unicamente se cuenta con 257 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría y beneficiario. Es importante señalar que si bien se viene presentando un atraso en obra, esta situacion obecede al mal estado de la via, el cual ha impedido ingresar materiales al Municipio y por ende presentar reducción de rendimiento. Cabe señalar que esta situación ya habia sido advertida por la interventoría, pues a pesar de que el contratista de obra se encuentra aadelantando acciones necesarias y pertinentes para garantizar el personal y material en obra, el Municipio de Rio Iró no ha cumplido con los compromisos establecidos a la fecha; por lo anterior se establece que si bien se presenta un atraso en obra, este no es imputable al contratista de obra, sino a un tercero el cual corresponde al Municipio de Rio Iró. De acuerdo a lo anterior, se ha solicitado a la Entidad contratante poner en conocimiento al Ministerio de Vivienda sobre esta problematica a fin de que se brinde una colaboración con el Municipio de Iró y se permita una accesibilidad adecuada al municipio. Es importante referir y advertir una vez más que si esta situación sigue persistiendo y no se toman acciones por parte del Municipio, se generará un mayor atraso en obra y será necesario que la Entidad prorrogue los contratos a fin de recuperar los tiempos perdidos o agotados.

Durante el periodo, se presentan 5 horas de lluvia que afectan la correcta ejecución de actividades de diagnóstico. ejecución de obras y validación. Durante el periodo no se cuenta con flujo de energia, ni red de telefonia movil, wifi y agua de manera constante para poder ejecutar actividades en obra y/o realizar las pruebas de presion o necesarias para recibir las intervenciones terminadas o adelantar actividades administrativas (casi siempre se cuenta con flujo de agua y energia en horas de la noche cuando ya no se adelantan obras).

Es importante señalar que la presente interventoría ha venido desarrollando sus actividades de acuerdo a sus obligaciones contractuales, así mismo ha venido efectuando el debido seguimiento y control sobre las obras que se vienen ejecutando en la zona y se ha reportado de manera oportuna las situaciones presentadas al momento de ejecutar las obras o de recibir las mismas.


Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

	
Firma	**Firma**
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	Nombre: LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,12%	$ 4.938.639,00	0,00%	$ -
2	0,39%	$ 16.243.284,40	0,00%	$ -
3	0,66%	$ 27.574.064,98	0,13%	$ 5.443.779,94
4	0,93%	$ 38.891.777,97	0,66%	$ 27.521.331,92
5	1,21%	$ 50.209.490,96	0,88%	$ 36.594.298,49
6	1,48%	$ 61.527.203,95	1,32%	$ 55.042.663,84
7	1,73%	$ 72.050.781,95	1,52%	$ 63.208.333,75
8	1,97%	$ 82.083.864,94	1,62%	$ 67.279.256,42
9	2,21%	$ 92.116.947,93	1,62%	$ 67.279.256,42
10	2,45%	$ 102.150.030,92	1,95%	$ 81.014.385,77
11	2,69%	$ 112.183.113,92	2,22%	$ 92.460.326,90
12	2,93%	$ 122.216.196,91	2,42%	$ 100.758.634,22
13	3,18%	$ 132.249.279,90	2,42%	$ 100.758.634,22
14	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
15	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
16	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
17	3,33%	$ 138.816.388,90	2,56%	$ 106.622.584,78
18	3,33%	$ 138.816.388,90	2,63%	$ 109.343.090,06
19	3,33%	$ 138.816.388,90	7,25%	$ 301.776.635,45
20	3,33%	$ 138.816.388,90	9,35%	$ 389.477.173,25
21	3,33%	$ 138.816.388,90	11,36%	$ 472.975.221,08
22	7,55%	$ 314.246.816,77	13,15%	$ 547.572.387,73
23	11,13%	$ 463.362.680,82	15,55%	$ 647.483.129,45
24	13,02%	$ 542.306.373,55	18,35%	$ 764.267.355,73
25	15,34%	$ 638.793.109,11	20,87%	$ 869.263.504,67
26	17,02%	$ 708.965.280,43	23,52%	$ 979.450.922,72
27	18,71%	$ 779.137.451,75	25,37%	$ 1.056.639.793,61
28	21,87%	$ 910.710.272,97	27,61%	$ 1.150.105.690,79
29	25,03%	$ 1.042.283.094,20	29,31%	$ 1.220.884.792,07
30	29,87%	$ 1.244.028.086,74	31,30%	$ 1.303.743.280,93
31	33,45%	$ 1.393.143.950,79	32,53%	$ 1.354.895.363,67
32	37,45%	$ 1.559.802.857,67	34,22%	$ 1.425.098.894,41
33	41,66%	$ 1.735.233.285,97	34,64%	$ 1.442.621.538,75
34	46,51%	$ 1.936.978.278,51	35,18%	$ 1.465.102.486,35
35	22,71%	$ 945.796.358,63	35,73%	$ 1.487.963.904,84
36	30,29%	$ 1.261.571.129,57	36,98%	$ 1.540.191.613,62
37	35,34%	$ 1.472.087.643,52	39,57%	$ 1.648.199.031,55
38	40,40%	$ 1.682.604.157,48	42,39%	$ 1.765.517.074,31
39	43,35%	$ 1.805.405.457,28	46,02%	$ 1.916.565.608,18
40	47,56%	$ 1.980.835.885,58	47,53%	$ 1.979.748.531,17
41	52,82%	$ 2.200.123.920,95	51,60%	$ 2.149.010.562,57
42	60,20%	$ 2.507.127.170,47	54,44%	$ 2.267.424.733,85
43	68,41%	$ 2.849.216.505,65	58,67%	$ 2.443.484.492,52
44	77,04%	$ 3.208.848.883,66	62,81%	$ 2.615.937.737,18
45	82,10%	$ 3.419.365.397,61	65,86%	$ 2.743.019.335,35
46	88,42%	$ 3.682.511.040,06		$ -
47	94,73%	$ 3.945.656.682,50		
48	100,00%	$ 4.164.944.717,87		
	100,00%	$ 4.164.944.717,87	65,86%	$ 2.743.019.335,35

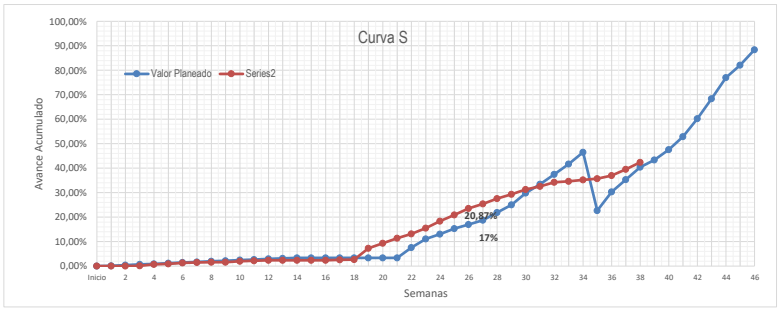

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC)	$ 4.164.944.717,87

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACTIVIDAD 1	0,18%	$ 7.474.214,02	0,18%	$ 7.474.214,02	**0,18%**	$ 7.474.214,02
2	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 42	3,15%	$ 131.342.174,45	3,15%	$ 131.342.174,45	**2,90%**	$ 120.754.678,91
3	ACTIVIDAD 3	96,67%	$ 4.026.128.329,40	78,77%	$ 3.280.549.009,14	**62,78%**	$ 2.614.790.442,42
		100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**82,10%**	**$ 3.419.365.397,61**	**65,86%**	**$ 2.743.019.335,35**

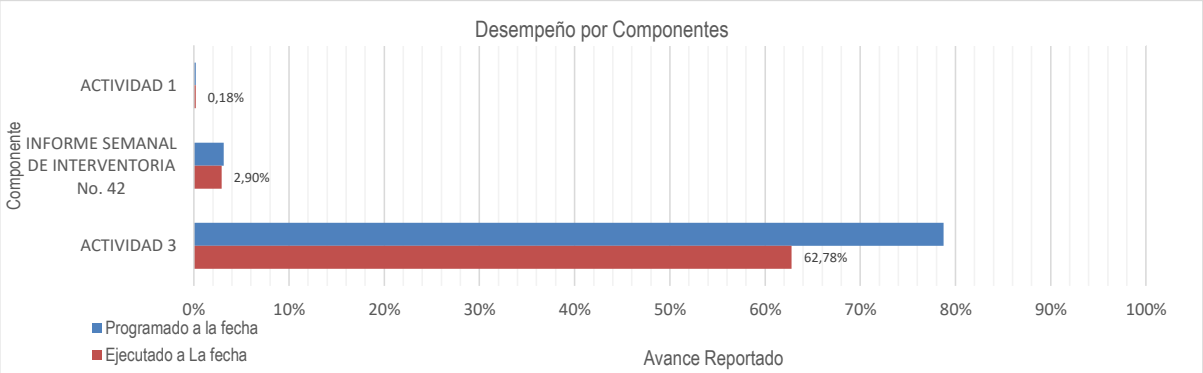

Fecha de Corte	18/01/2024 - 11/08/2024	PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS RIO IRO CHOCÓ																										
Priorización		MATRIZ BASE								INCLUSIONES									TOTALES (MATRIZ + INCLUSIONES)					EJECUCION DE OBRA (ACTIVIDAD No. 3)				
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusion	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP	Viviendas No Avaladas por Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	Viviendas Recibidas a Satisfacción por Interventoría y beneficiario	Viviendas Programadas actividad No.3 según plan de trabajo Vigente (DEBIDAMENTE TERMINADAS)	VIVIENDAS EN ATRASO POR FALTA DE TERMINACION DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO
Rio Iró Chocó	Barrio Nuevo	198	459	170	17	169	11	1	90	73	76	3	0	55	17	54	3	273	225	34	223	14	193	190	3	186	374	117
	La Real	99		39	8	37	12	1	33	19	25	6	0	20	10	14	2	91	59	18	51	14	47	44	3	38		
	La unión	78		48	14	45	16	0	35	27	30	3	0	25	9	24	0	112	73	23	69	16	67	49	18	33		
	El Rosario	123		86	23	82	15	0	26	25	26	1	0	18	9	17	2	152	103	32	99	17	77	1	76	0		
	TOTAL	458	459	342	62	333	54	2	184	144	157	13	0	118	45	109	7	628	460	107	442	61	384	284	100	257	374	117

	CONTRACTUAL			PROGRAMADO			EJECUTADO		
	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
ACTIVIDAD 1	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%
ACTIVIDAD 2	459	$ 131.342.174,45	3,15%	459	$ 131.342.174,45	3,15%	422	$ 120.754.678,91	2,90%
ACTIVIDAD 3	459	$ 4.026.128.329,40	96,67%	374	$ 3.280.549.009,14	78,77%	384	$ 2.614.790.442,42	62,78%
		$ 4.164.944.717,87	100,00%		$ 3.419.365.397,61	82,10%		$ 2.743.019.335,35	65,86%

1. Inspector ppio de obra
4. Inspectores técnicos de obra
1. Residente técnico de interventoría
1. Residente social de interventoría
1. Inspector ppio de interventoría
2 Inspectores técnicos de interventoría
1 almacenista
1 conductor.
43 oficiales
20 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentaron cielo y soleado.

Herramienta y equipos

3 Motocarros
2 Camionetas de Enlaces
Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se realizo actividades normales de obra, excavaciones, fundición, pintura etc. por otro lado se continuo con todas las actividades de Estabilización de taludes para se entregadas a satisfacción de la interventoría, con el fin de dar cumplimiento al plan de contingencia

Arq. Residente Obra

Ing. Residente de interventoría

Jonés 05 Agosto de 2024

Personal obra

1 Residente técnico obra
1 Residente social obra
1 Profesional social apoyo obra
1 - Inspector ppio obra
4 Inspectores técnicos obra

1 Residente Técnico de interventoría
1 Residente Social de interventoría
1 Inspector Pcio de interventoría
2 Inspectores Técnicos de interventoría
1 Almacenista
1 Conductor
49 Oficiales
22 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentó un clima soleado y seco

Herramienta y Equipos

3 Motocomb
2 Comisiones de trabajo
- Herramienta menor

Actividades.

Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra desde excavaciones hasta acabados por ello todo se realizaron cruces de materiales a los codigos en ejecución, y por ejecutar de manera normal, durante este día se realizo visita al Sector el casanio con el Fin de mirar las conexiones de alcantarillado junto con la interventoria y de ciudad, las malas condiciones de la vía no han permitido el ingreso de materiales al municipio de Sincé, también se hizo arreglos de codigos para entrega a la interventoría.

NOTA: se le recomienda al contratista de obra, entregar dotación de EPPs al personal de mano de obra no calificada.

Ing. Residente Obra

Víctor Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Valles 06 de Agosto de 2024.

Personal obra
1 Residente Técnico de obra

1 Residente social de obra
1. Profesional social apoyo obra
1 Inspector plio de obra
1. Ambientista
4 Inspectores Tecnicos de obra
1 Conductores
49 oficiales
22 Ayudantes
1. Residente Tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1. Inspector plio de interventoria
2 Inspectores Tecnicos de interventoria

Descripción climática

Durante la jornada se presento ondas sin

Herramienta y Equipos

3 Motocarros
2 Camionetas de vitaus
. Herramienta menor.

Actividades

Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra, en las cuales se realizaron procesos de enchape, pintura, excavaciones etc. Por otra lado el contratista resalta que no es facil el ingreso de materiales al municipio de rio viejo debido a los condiciones de la via que se encuentra en muy mal estado debido a las fuertes lluvias en horas de la noche, Sin embargo se hacen los mejores esfuerzos por continuar con la ejecución de las actividades en el proyecto, los Camioneros no desean ingresar por el estado de la via.

NOTA: Desde esta interventoria, realizo un llamado de atención por la no entrega de materiales algunos codigos que se encuentran en ejecución.

Arq. Residente Obra

VICTOR MUNOZ P.
Ingo Residente de Interve

Viernes 07 de agosto de 2024

Personal Obra
1 Residente tecnico obra
1 Residente social obra
1 Profesional social apoyo obra
1. Inspector PCio obra
4. Inspectores tecnicos obra
1 Residente tecnico interventoria
1 Residente social interventoria
1 Inspector PCio interventoria
2 Inspectores tecnicos interventoria
1 Almacenista
1 Conductor
49 Operarios
22 Ayudantes

Descripción climática
Durante la jornada se presento un dia soleado

Herramienta y Equipos
2 motocarros
2 Camioneta de Estacas
Herramienta menor

Actividades
Durante la jornada se realizó actividades de obra de forma normal, por otro el camión que traia suministro de bloque se encontro con dificultades para ingresar por falta de arreglar de la via, se quedo pegado en varios tramos de esta forma se evidencia que se debe arreglar la via de forma urgente.

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Ayu Residente Obra

Jueves 08 de agosto de 2024
Personal Obra.

1 Residente técnico obra
1. Residente social de obra
1. Profesional social de obra
1 Inspector pleo de obra
4 Inspectores tenis de obra
1 Residente técnico interventoría
1 Residente social de interventoría
1. Inspector pleo de interventoría
2 Inspectores tenis de interventoría
1 Almacenista
1 Conductor
19 Oficiales
22 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentó en la sem
Humedad y lluvias

3 Obstáculos
2 Comodidades de Estilos
Herramienta menor

Dificultades.

Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra, también la entrega de materiales a los cadejos en ejecución, por otro lado se entrega todo el hogar disponible a los cadejos ya en ejecución, también se hizo la recolección de escombros como todas las semanas, por otro lado. se hizo arreglos a los cadejos para entrega a satisfacción. a la intervención.

Nota: se le recomienda al contratista de obra, entregar los materiales a las intervenciones de forma oportuna y organizada.

Arq Residente obra

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Viernes 09 de Agosto de 2024

Personal obra

01 Residente Ingeniero de obra
1 Residente social de obra
1 Profesional apoyo de social obra
1. Inspector Pclo de obra
4 Inspectores Ingenieros de obra
1 Residente Ingeniero de interventoria
1 Residente Social de interventoria
1. Inspector Pclo de interventoria
2. Inspectores Ingenieros de interventoria
1 Almacenista
1. Conductor
49 Oficiales
22 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presento un dia Nuboso durante todo el dia en de 12:PM a 6:PM

Herramienta y Equipos

3 motocarros
2 Camionetas de Carga
Herramienta menor.

Actividades

Durante la jornada se realizo actividades de obra de forma normal por los Oficiales, Ayudantes se hizo entrega de materiales y suministro de herramientas a cuadrillas que asi lo requerian, por otro lado tocal animo de continuar con la obra se reunio al personal con el animo de dar pauta de tranquilidad sobre el estado de la obra y avance, como tambien se continuo con apoyar a todos yo Ingenieros.

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoria

Arq. Residente Obra

Sabado 10 de Agosto de 2024

Personal obra
1. Residente Tecnico interventoria
1 Residente Social interventoria
1. Inspector Pbio de interventoria
2 Inspectores Tecnicos de interventoria
1 Residente Tecnico de Obra
1 Residente Social de obra
1 Profesional Social apoyo obra
1. Inspector Pbio de obra
4 Inspectores Tecnicos de obra
1 Almacenista
1. Conductor
49 Operarios
22 Ayudantes

Descripción climática
Durante la jornada se presento en dia seco

Herramienta y Equipos
3 Volqueteros
2 Camionetas de apoyo
Herramienta menor

Actividades
Durante la jornada se prento actividades con normalidad hasta el medio dia, se entregaron materiales a obreros en ejecución Dano tambien se realizo el recorrido de porcentajes con el animo de mirar el estado de obra, avance y demás aspectos, asi mismo el obra se encuentra afectado por el estado de via el cual no puede ingresar materiales con facilidad y es de suma importancia para el fin primario del plan de contingencia

NOTA: ésta interventoría deja constancia que durante esta semana solo se recibió y entregó a satisfacción al beneficiario 1 Vivienda terminada, por la falta de

organización del contratista de obra.

Arq. Residente Obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Domingo 11 de Agosto de 2024.

Personal de obra
1 Residente Técnico de interventoría.
1 Residente social de interventoría
1 Inspector físico de interventoría
2 Inspectores técnicos de interventoría
1 Residente técnico de obra
1 Residente social de obra
1 Inspector físico de obra
4 Inspectores técnicos de obra
1 Almacenista
1 Conductor
4 Oficiales
12 Ayudantes

Descripción Climática.

Durante la jornada se presentó un día seco
Nublado y frío

3 motocarros
2 Camionetas de enlaces
Herramienta menor
Actividades

Durante la jornada se continuaron con las actividades de obra en algunos codigos, así mismo se hizo entrega de áreas a los codigos que se encuentran en ejecución con el animo de continuar con las actividades programadas del proyecto.

Arq. Residente Obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 46

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **12/08/2024** al **18/08/2024** Fecha **18/08/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2230223	**NOMBRE DEL PROYECTO**	INTRADOMICILIARIAS RIO IRO
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCO	**MUNICIPIO**	RIO IRO
GERENCIA A CARGO	GERENCIA DE UNIDAD 1	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2230223
Contratista		CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Valor inicial	$	4.164.944.717,87
Valor actual	$	4.164.944.717,87
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		24/08/2023
Plazo inicial (Días)		213 Días
Plazo actual (Días)	373 Días	100,00%
Variación en plazo		160 Días
Fecha Contractual de terminación		31/08/2024
Tiempo Transcurrido (días)	360	96,51%
Días remanentes del Contrato	13	3,49%
Acumulado a última acta pagada	$	1.197.537.320,36
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	$	2.230.219,00
Interventor		CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
Valor inicial	$	396.843.968,13
Valor actual	$	396.843.968,13
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		24/08/2023
Plazo inicial		228 Días
Plazo actual	373 Días	100,00%
Variación en plazo		145 Días
Fecha Contractual de terminación		31/08/2024
Ejecución del Contrato	360	96,51%
Días remanentes del Contrato	13	3,49%
Acumulado a última acta pagada	$	126.990.069,80
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

Semaforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.419.365.397,61	82,10%	$ 2.743.019.335,35	65,86%	-$ 676.346.062,26	-16,24%
Durante el Periodo	$ 263.145.642,44	6,32%	$ 64.902.105,90	1,56%	-$ 198.243.536,55	-4,76%
Acumulado a la Fecha	**$ 3.682.511.040,06**	**88,42%**	**$ 2.807.921.441,25**	**67,42%**	**-$ 874.589.598,81**	**-21,00%**

Desviación en días: -78,3 Días



Observaciones al desempeño del proyecto

ACTIVIDAD No. 1

El contratista de obra remitió los diseños arquitectónicos y estructurales los cuales fueron aprobados por la Interventoria y los mismos cuentan con VoBo del munisiterio desde el día 14 de noviembre del 2023.

ACTIVIDAD No. 2


Durante esta semana, el contratista de obra No realiza diagnósticos en ninguno de los cuatro barrios priorizados. A la fecha se han visitado un total de 634 viviendas, se han diagnosticado 459 viviendas efectivas de las cuales se han aprobado 458 diagnosticos y se han presentado 68 renuncias. De igual manera del total de viviendas visitadas se han identificado 107 como no efectivas. Cabe señalar que de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoria, el contratista de obra a corte del presente informe debe contar con un total de 459 diagnósticos realizados y avalados, por lo anterior se cuenta con un atraso en esta actividad. Cabe señalar que si bien no se han adelantado la totalidad de aprobaciones de diagnósticos, esta situación obedece a que ya se diagnosticó la totalidad de viviendas de la matriz inicial, por tal motivo a la fecha se están realizado visitas, diagnósticos y aprobacion de inclusiones. Se es espera seguir adelantando actividades de diagnósticos y cumplir en lo posible con el potencial de viviendas inicialmente viabilizado por el Ministerio de Vivienda.


ACTIVIDAD No. 3

A corte del presente informe, se cuenta con 408 viviendas iniciadas las cuales están localizadas en Barrio Nuevo, en el Barrio La Real, el Barrio La Unión y el Barrio El Rosario en las manzanas 1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,7, 8,9 y 10 en las cuales se han realizado actividades significativas correspondientes a fundición de vigas de cimentación, construcción de muros en mampostería estructural, pañetado, enchape de pisos y paredes en cerámica, instalación de combos sanitarios, construcción de lavaderos y lavaplatos, Excavación . Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 408 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 116 viviendas en ejecución, 292 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoria y al beneficiario 273 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución con porcentajes estimados de avance es de 67,42% (Ejecutado Estimado de acuerdo al resumen anexo al presente informe), con respecto al 88,42% que se tiene programado, es decir, presenta un atraso del 21,00% respecto a viviendas programadas y terminadas (Con porcentaje estimado). Cabe señalar que si bien el contratista presenta en las 408 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 408 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 273 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoria. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo (Plan de Contingencia) y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoria el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 404 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 131 viviendas en atraso, pues esta no se encuentran terminadas en su totalidad y no cuenta con acta de recibo a satisfacción.

NOTA ACLARATORIA: El seguimiento a la ejecución de las obras se realiza a partir del ultimo plan de trabajo (Plan de contingencia) avalado por la interventoria el día 21/06/2024. Es importante señalar y aclarar que la diferencia o reducción de intervenciones entre la semana No. 34 y 35 obedece al reajuste y repogramación realizada por el contratista, de acuerdo a los compromisos establecido con la Entidad Contratante de reasignar intervenciones producto del atraso y son redistribuidas a partir de la semana 36 en adelante, por tal motivo, la intervenotria realiza el debido seguimiento a partir de acuerdo a las cantidades y valores establecidas por el contratista como accion para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y plan de contingencia.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

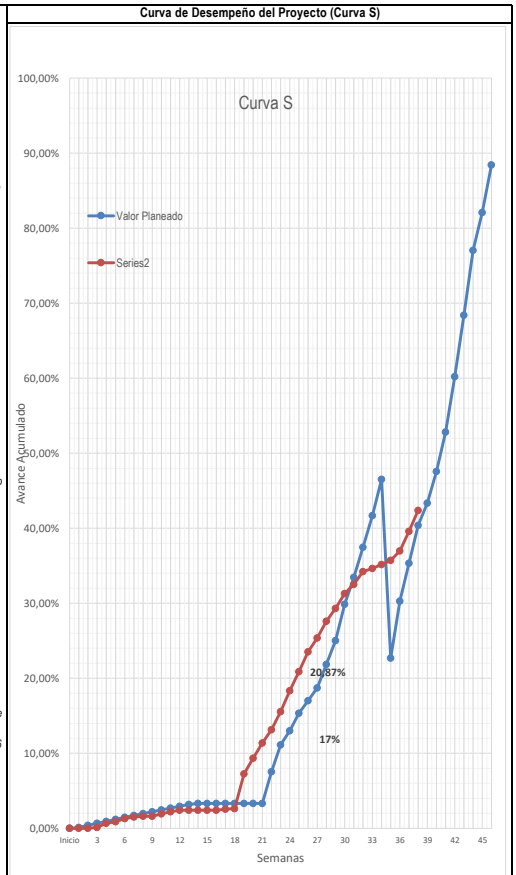

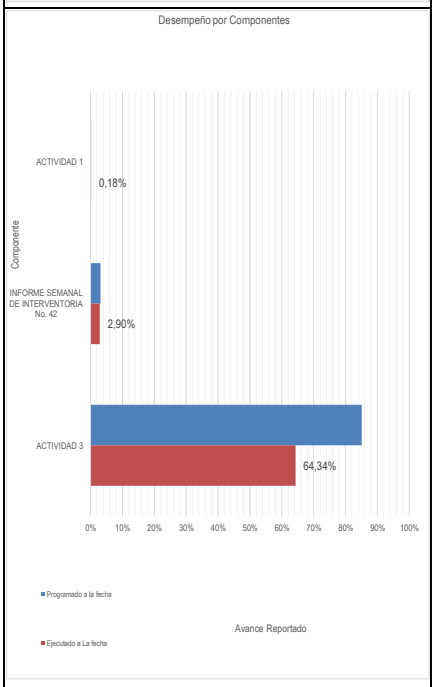

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 46

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **12/08/2024** al **18/08/2024** Fecha **18/08/2024**


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

De acuerdo a los atrasos evidenciados por parte del contratista de obra, fue necesario desde la interventoría y ENTerritorio S.A solicitar un plan de contingencia al contratista con el fin de mitigar estos atrasos, por tal motivo, se procede a realizar el seguimiento al contrato de obra de acuerdo al plan de trabajdo vigente (plan de contingencia) avalado el 21/06/2024, plan de contingencia que refleja el compromiso del contratista de intervenciones semanales y mensuales hasta el 31 de agosto de 2024.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	82,10%	65,86%	-16,24%	
Durante el Periodo	6,32%	1,56%	-4,76%	
Acumulado a la Fecha	**88,42%**	**67,42%**	**-21,00%**	

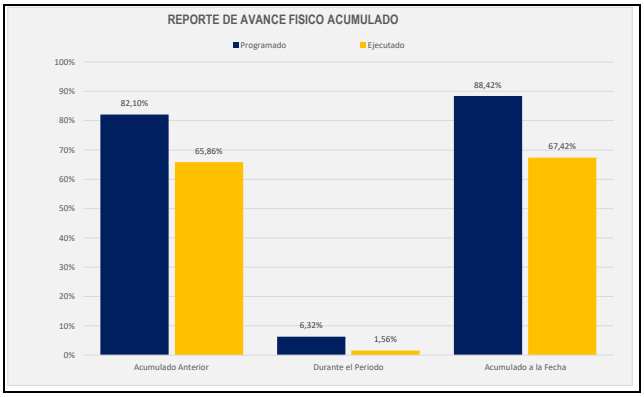


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 4.164.944.717,87	$ 4.164.944.717,87	$ -	$ 805.225.665,88	$ 220.146.445,74	$ 585.079.220,14

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 1.836.090.842,11	44,08%	3	$ 1.836.090.842,11	44,08%	9/05/2024	$ 638.553.521,75








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 396.843.968,13	$ 496.054.960,16	$ 99.210.992,03	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
4	$ 239.594.545,75	48,30%	4	$ 239.594.545,75	48,30%	30/07/2024	$ 51.583.101,79







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra continuó desarrollando la actividad numero 3 con procesos de excavación manual, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de lavaderos, instalación lavaplatos, acabados y pintura, hasta la fecha del presente informe se cuenta con 292 viviendas terminadas, de las cuales 273 han sido entregadas a la interventoría y a los beneficiarios. Cabe señalar que a la fecha el contratista de obra adelanta 408 intervenciones de 439 que se tienen programadas en el plan de trabajo, así mismo, se tiene un porcentaje aproximado ejecutado de viviendas terminadas y en ejecución de 67,42%, y un 88,42% programado, es decir, presenta un atraso del 21,00% respecto a viviendas programada, terminadas y/o recibidas a satisfacción con porcentaje estimado de intervención de cada vivienda (Segun cuadro anexo al presente informe). Es importante resaltar que si bien el contratista de obra cuenta en 292 viviendas terminadas, solo se cuenta con 273 viviendas recibidas a satisfacción, por tal motivo se presenta un atraso del 32,43% referente a la cantidad de intervenciones programadas como viviendas recibidas a satisfacción las cuales corresponden a 404 viviendas.

Durante la semana, se realiza comité de seguimiento de manera virtual con el fin de dar a conocerlas las actividades y los avances realizados durante la semana.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Durante la presente semana de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

Lunes, 12 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentó actividades normales de obra, se repartieron materiales a los códigos en ejecución como también se asignaron códigos a maestros con el animo de continuar con la obra. Por otro lado, se realizó subsanación de códigos ya finalizados, comenzando desde excavaciones hasta pinturas de cada una de las casetas, de igual manera, se realizó validación de medidas junto a la interventoría.

Martes, 13 de Agosto de 2024
Durante la jornada se realizaron actividades normales de obra, entrega de materiales a códigos en ejecución como también con obra, realizando excavaciones, fundición, mampostería, pañete. De igual manera, se realizó validación de medidas para el acta 3 junto con la interventoría. Así mismo, se realizó la asignación de códigos para ejecutar a los maestros.

Miércoles, 14 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentó actividades normales de obra, entrega de materiales a códigos ya en ejecución, como también se subsanaron códigos para ser entregados a la interventoría. Por otro lado, se deja constancia que la vía de acceso al municipio de rio iró se encuentra en malas condiciones para le ingreso de materiales al municipio.

Jueves, 15 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra, como también se entregaron materiales a los códigos en ejecución, también se realizaron entrega de códigos ya finalizados. Por otro lado, se deja constancia que la vía de acceso al municipio de rio iró se encuentra en malas condiciones para el ingreso de materiales al municipio.

Viernes, 16 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentó actividades de obra, tales como excavaciones, fundición, mampostería, pañetes. De igual manera, se continúa con la entrega de materiales a los códigos ya en ejecución. Cabe resaltar, que durante esta jornada llego suministro de bloque y cemento.

Sábado, 17 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra en el barrio el rosario y la unión, como también se entregaron códigos ya finalizados. Por otro lado, se entregaron materiales a códigos en ejecución y se inició a realizar subsanaciones de carpetas para cobro del acta 3.
Se deja constancia por parte de la interventoría que se aperturaron 24 códigos nuevos el cual el contratista de obra puede iniciar las actividades constructivas y se recibieron y entregaron a los beneficiarios 17 intervenciones.

Domingo, 18 de Agosto de 2024
Durante esta jornada se realiza actividades administrativas.

NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, entregar los materiales a las intervenciones de forma oportuna y organizada.
NOTA 2: Se le recomienda al contratista de obra, entregar la dotación de los elementos de protección personal al personal de mano de obra no calificados nuevos.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 46

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **12/08/2024** al **18/08/2024** Fecha **18/08/2024**

Durante el periodo la interventoría remite los siguientes comunicados al Contratista de obra y/o ENTerritorio y/o Municipio de Rio Iró y/o Empresa de Servicios Publicos:

CAEE-RI-2024-392 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-247 Obs. Carpetas finales
CAEE-RI-2024-393 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-254 Obs. Diagnosticos
CAEE-RI-2024-394 ENTREGA INFORME SEMANAL SOCIAL # 43
CAEE-RI-2024-395 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-247 Obs. Carp. Finales
CAEE-RI-2024-396 Entrega Informe semanal No. 45
CAEE-RI-2024-397 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-250 Obs carp. finales


Se tiene previsto que para la semana siguiente el contratista y/o interventoría realice las siguientes actividades:

1. Contratista de obra continue elaborando diagnosticos de inclusion.
2. El contratista de obra siga desarrollando la Actividad No.3, consintente en la realización de aperturas, replanteos y ejecución de obra. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo y cronograma de entregables avalado por la interventoría.
3. Entrega de intervenciones a la interventoría y al beneficiario.
4. Realización de comité de seguiemito virtual
5. Recorrido de validacion de personal en obra
7. Capacitación sobre Hábitos y estilos de vida saludables.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	1
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	235,75	0	235,75	61,9%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cual?	145	0	145	38,1%
	Total	**380,75**	**0**	**380,75**	**100,00%**



OBSERVACIONES:
1. Durante el periodo no se presentan lluvias en la zona, ocasionando una perdida de tiempo de 0 horas.
2. Durante el periodo no se presentan, accidentes, incidentes o enfermedades que hayan ocasionado perdida de tiempos y/o cese de actividades.
3. Durante el periodo la interventoría realiza revisión de documentación entregada por el Contratista de obra, sin embargo la interventoría efectua una serie de observaciones y requerimientos los cuales se pusieron en conocimiento del contratista a traves de comunicados.
4. se realizó acompañamiento al área técnica en actividades de campos como: recorrido de porcentajes, recorrido de observaciones.
5. se realizó recorrido punto a punto de intervencion por el PGIO de interventoria e inspector sst del contratista sobre validacion de personal en campo.
6. Capacitacion sobre Orden y aseo.
7. Riesgos mecánicos.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A	12/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	El contratista de obra acompañamiento de Interventoria realizó socialización casa a casa en las aperturas de nuevos códigos a 7 beneficiarios.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	13/8//2024	Barrio nuevo y la union	N/A	El contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó socialización casa a casa en el barrio nuevo, para la apertura de 15 códigos a intervenir.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	14/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	Se realizo acompañamiento al área técnica para validación de las viviendas terminadas en donde el equipo social realizaron recomendaciones a los beneficiarios sobre temas de educación sanitaria y el buen uso de los elementos instalados.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	15/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizó socialización casa a casa a 7 beneficiarios en las aperturas de los próximos códigos e intervenir en barrio nuevo, también se realizaron 8 capacitaciones casa a casa en temas de educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas por los beneficiarios. Asimismo, se realizó un recorrido de obra por los cuatro barrios priorizados con el acompañamiento de dos miembros del comité veedor y profesionales sociales de la empresa de servicios publico obra e interventoria.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	16//08/2024	Barrio la real y la Union	N/A	El Contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó capacitación casa a casa en educación sanitaria instalación de acrílico a 9 beneficiarios en las viviendas entregadas y recibidas a satisfacción	Obra e Interventoría	N/A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 46

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **12/08/2024** al **18/08/2024** Fecha **18/08/2024**

N/A	17/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	El Contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó capacitación casa a casa en educación sanitaria instalación de acrílico a 3 beneficiarios en las viviendas entregadas y recibidas a satisfacción	Obra e Interventoría	N/A
N/A	18/08/2024	Barrio nuevo	N/A	Se realizan actividades administrativas	Interventoría	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
Quejas	habitante del barrio la union y un maestro de obra	16/08/2024	falta de pago y ruptura de la tapa de un manjol	Contratista de obra

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Se ha evidenciado problemas con el fulido electrico y el flujo de agua con el fin de realizar las pruebas necesarias, y poder validar la funcionalidad de las obras ejecutadas. Adicionalmente se presenta problemas de flujo electrico y de internet y conexion de redes moviles	Se ha efectuado acercamientos con la Empresa prestadora de servicios publicos con el fin de que se garantice el flujo suficiente para poder validar cada intervención, sin embargo ha sido compleja esta situacion pues a pesar de los acercamientos el flujo de agua en el Municipio es muy compleja. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA PROBLEMATICA ES REITERADA SEMANA A SEMANA DEBIDO A QUE ES UNA SITUACIÓN QUE OCURRE DE MANERA NORMAL Y SEGUIDA EN EL MUNICIPIO.	Se realiza validacion de flujo de agua toda la semana para poder adelantar actividades de validacion y recibo de obras. Esta situación se deja documentada en Bitacora.	Contratista de obra Interventoría Empresa Prestadora de Servicios	Bitácora	Se realiza constantemente
Se presenta falencias en el estado de las vias que impiden el ingreso de vehiculos y de materiales a obra	El Alcalde Municipal de Rio Iró se compromete a reparar de manera provisional estos 2 sectores con el fin de que el contratista durante el din de semana del presente periodo ingrese materiales a obra. Cabe señalar que el Municipio manifiesta que se cuenta con un proceso de seleción que se encuentra en proceso adjudicacion y contratacion con el cual se pretende mejorar estos sectores criticos. Lo anterior como una acción de mejora y el contratista cuente con las garantizas de acceso al Municipio. A CORTE DEL PRESENTE INFORME SE ESTÁ A LA ESPERA QUE EL MUNICIPIO INFORME LAS GESTIONES REALIZADAS Y SOBRE EL INICIO DE LAS OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS. CABE SEÑALAR QUE LAS VIAS A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN ESTADO MUY DETERIORADO Y EL MUNICIPIO NO HA EFECTUADO ACTIVIDAD ALGUNA	Mejoramiento de vias por parte del Municipio	Alcaldía de Rio Iro	Acta de comité e informes semanales	Se realiza constantemente
Tal y como se habia manifestado con anterioridad, a la fecha se sigue presentando problemática en la excavaciones que se vienen realizando en las conexiones intradomiciliarias, pues se ha evidenciado presencia de rocas en las excavaciones conllevando a requerir mayores tiempos en la ejucción de esta actividad.	El contratista ha señalado e informado a la interventoría sobre esta situación, la cual ya se habia presentado con anterioridad.	Se validará la necesidad de contemplar una actividad no prevista, toda vez que el contratista no cuenta con esta actividad de manera contractual. A la fecha está en proceso de validación por parte del contratista de obra y remision a la interventoría.	Contratista de obra	N/A	5/08/2024
Paro Armado en Chocó	Se presenta bloqueos en las vias que impide el paso de vehiculos y personal al Municipio desd eel 11 de agosto de 2024. se ha optado por adelantar y ejecutar las actividad que estan al alcande del contratista y de acuerdo a los materiales presentes en obra.	Duramte el periodo se obtuvo un bajo rendimiento en obra por la escaces de materiales presentes en bodega del contratista, de acuerdo a las situaciones o problematicas ya señaladas.	Gobierno Nacional	N/A	Se espera se levante el paro armado el día 19 de agosto de 2024

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







Fotografia 1.Capacitacion casa a casa en temas de educacion sanitaria



Fotografia 2. Recorrido de obra con veedores y actores del PCI



Fotografia 3. Socialización casa a casa

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 46

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **12/08/2024** al **18/08/2024** Fecha **18/08/2024**



Fotografía 4. CH-RI-ER-M2-VE-084 - Realización de Viga de Cimentación



Fotografia 5. CH-RI-ER-M7-IN-VE-004 - Realización de Mampostería en Bloque Estructural



Fotografia 6. CH-RI-LU-M3-VE-032 - Realización de Losa de Concreto para Lavadero y Lavaplatos

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 408 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 116 viviendas en ejecución, 292 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoría y al beneficiario 273 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución es 67,42% (Ejecutado), con respecto al 88,42% que se tiene programado, es decir, presenta un atraso del 21,00% respecto a viviendas programada, terminadas y recibidas a satisfcación. Cabe señalar que si bien el contartista presenta un avance en las 408 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 408 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 273 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoría. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoría el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 404 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 131 viviendas sin contarse sin la respectiva terminación y acta de recibo a satisfacción.

A la fecha el contratista de obra presenta un atraso del 21,00% de acuerdo al nuevo plan de trabajo avalado por la interventoría y según el avance estimado del total de viviendas iniciadas, terminadas, en ejecución y recibidas a satisfacción. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 88,42%, sin embargo, de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados, y la ejecución de obras el contratista contó con un 67,42% de ejecución; cabe señalar que, este porcentaje es calculado a partir del avance estimado y aproximado de cada vivienda iniciada y/o terminada y/o recibida a satisfacción. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se encuentra en un atraso en la cantidad de viviendas terminadas y recibidas a satisfacción de 131 intervenciones, es decir de las 404 viviendas programadas para el periodo, unicamente se cuenta con 273 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría y beneficiario. Es importante señalar que si bien se viene presentando un atraso en obra, esta situacion obecede al mal estado de la via, el cual ha impedido ingresar materiales al Municipio y por ende presentar reducción de rendimiento. Cabe señalar que esta situación ya habia sido advertida por la interventoría, pues a pesar de que el contratista de obra se encuentra aadelantando acciones necesarias y pertinentes para garantizar el personal y material en obra, el Municipio de Rio Iró no ha cumplido con los compromisos establecidos a la fecha; por lo anterior se establece que si bien se presenta un atraso en obra, este no es imputable al contratista de obra, sino a un tercero el cual corresponde al Municipio de Rio Iró. Aunado a lo anterior, durante el periodo se presentan bloqueos viales a causa del paro armado presentado en el Departamento de Chocó, situación que ha impedido ingresas materiales y se puedan ejecutar labores en debida forma y con el rendimeinto esperado.Es importante referir y advertir una vez más que si esta situación sigue persistiendo y no se toman acciones por parte del Municipio, se generará un mayor atraso en obra y será necesario que la Entidad prorrogue los contratos a fin de recuperar los tiempos perdidos o agotados.

Durante el periodo, se presentan 0 horas de lluvia que afectan la correcta ejecución de actividades de diagnóstico. ejecución de obras y validación. Durante el periodo no se cuenta con flujo de energia, ni red de telefonia movil, wifi y agua de manera constante para poder ejecutar actividades en obra y/o realizar las pruebas de presion o necesarias para recibir las intervenciones terminadas o adelantar actividades administrativas (casi siempre se cuenta con flujo de agua y energia en horas de la noche cuando ya no se adelantan obras).

Es importante señalar que la presente interventoría ha venido desarrollando sus actividades de acuerdo a sus obligaciones contractuales, así mismo ha venido efectuando el debido seguimiento y control sobre las obras que se vienen ejecutando en la zona y se ha reportado de manera oportuna las situaciones presentadas al momento de ejecutar las obras o de recibir las mismas.


Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	Nombre: LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,12%	$ 4.938.639,00	0,00%	$ -
2	0,39%	$ 16.243.284,40	0,00%	$ -
3	0,66%	$ 27.574.064,98	0,13%	$ 5.443.779,94
4	0,93%	$ 38.891.777,97	0,66%	$ 27.521.331,92
5	1,21%	$ 50.209.490,96	0,88%	$ 36.594.298,49
6	1,48%	$ 61.527.203,95	1,32%	$ 55.042.663,84
7	1,73%	$ 72.050.781,95	1,52%	$ 63.208.333,75
8	1,97%	$ 82.083.864,94	1,62%	$ 67.279.256,42
9	2,21%	$ 92.116.947,93	1,62%	$ 67.279.256,42
10	2,45%	$ 102.150.030,92	1,95%	$ 81.014.385,77
11	2,69%	$ 112.183.113,92	2,22%	$ 92.460.326,90
12	2,93%	$ 122.216.196,91	2,42%	$ 100.758.634,22
13	3,18%	$ 132.249.279,90	2,42%	$ 100.758.634,22
14	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
15	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
16	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
17	3,33%	$ 138.816.388,90	2,56%	$ 106.622.584,78
18	3,33%	$ 138.816.388,90	2,63%	$ 109.343.090,06
19	3,33%	$ 138.816.388,90	7,25%	$ 301.776.635,45
20	3,33%	$ 138.816.388,90	9,35%	$ 389.477.173,25
21	3,33%	$ 138.816.388,90	11,36%	$ 472.975.221,08
22	7,55%	$ 314.246.816,77	13,15%	$ 547.572.387,73
23	11,13%	$ 463.362.680,82	15,55%	$ 647.483.129,45
24	13,02%	$ 542.306.373,55	18,35%	$ 764.267.355,73
25	15,34%	$ 638.793.109,11	20,87%	$ 869.263.504,67
26	17,02%	$ 708.965.280,43	23,52%	$ 979.450.922,72
27	18,71%	$ 779.137.451,75	25,37%	$ 1.056.639.793,61
28	21,87%	$ 910.710.272,97	27,61%	$ 1.150.105.690,79
29	25,03%	$ 1.042.283.094,20	29,31%	$ 1.220.884.792,07
30	29,87%	$ 1.244.028.086,74	31,30%	$ 1.303.743.280,93
31	33,45%	$ 1.393.143.950,79	32,53%	$ 1.354.895.363,67
32	37,45%	$ 1.559.802.857,67	34,22%	$ 1.425.098.894,41
33	41,66%	$ 1.735.233.285,97	34,64%	$ 1.442.621.538,75
34	46,51%	$ 1.936.978.278,51	35,18%	$ 1.465.102.486,35
35	22,71%	$ 945.796.358,63	35,73%	$ 1.487.963.904,84
36	30,29%	$ 1.261.571.129,57	36,98%	$ 1.540.191.613,62
37	35,34%	$ 1.472.087.643,52	39,57%	$ 1.648.199.031,55
38	40,40%	$ 1.682.604.157,48	42,39%	$ 1.765.517.074,31
39	43,35%	$ 1.805.405.457,28	46,02%	$ 1.916.565.608,18
40	47,56%	$ 1.980.835.885,58	47,53%	$ 1.979.748.531,17
41	52,82%	$ 2.200.123.920,95	51,60%	$ 2.149.010.562,57
42	60,20%	$ 2.507.127.170,47	54,44%	$ 2.267.424.733,85
43	68,41%	$ 2.849.216.505,65	58,67%	$ 2.443.484.492,52
44	77,04%	$ 3.208.848.883,66	62,81%	$ 2.615.937.737,18
45	82,10%	$ 3.419.365.397,61	65,86%	$ 2.743.019.335,35
46	88,42%	$ 3.682.511.040,06	67,42%	$ 2.807.921.441,25
47	94,73%	$ 3.945.656.682,50		
48	100,00%	$ 4.164.944.717,87		
	100,00%	$ 4.164.944.717,87	67,42%	$ 2.807.921.441,25

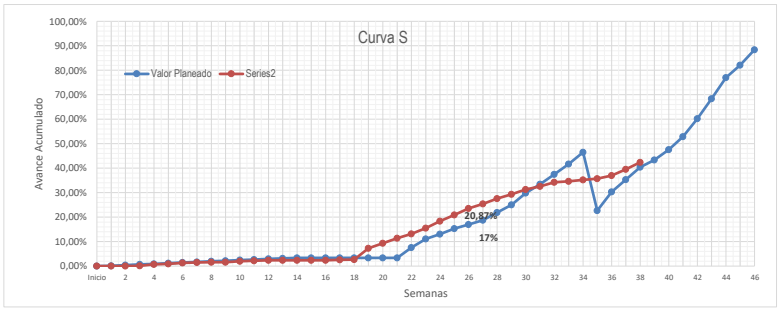

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC)	$	4.164.944.717,87

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACTIVIDAD 1	0,18%	$ 7.474.214,02	0,18%	$ 7.474.214,02	**0,18%**	$ 7.474.214,02
2	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 42	3,15%	$ 131.342.174,45	3,15%	$ 131.342.174,45	**2,90%**	$ 120.754.678,91
3	ACTIVIDAD 3	96,67%	$ 4.026.128.329,40	85,08%	$ 3.543.694.651,59	**64,34%**	$ 2.679.692.548,32
		100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**88,42%**	**$ 3.682.511.040,06**	**67,42%**	**$ 2.807.921.441,25**

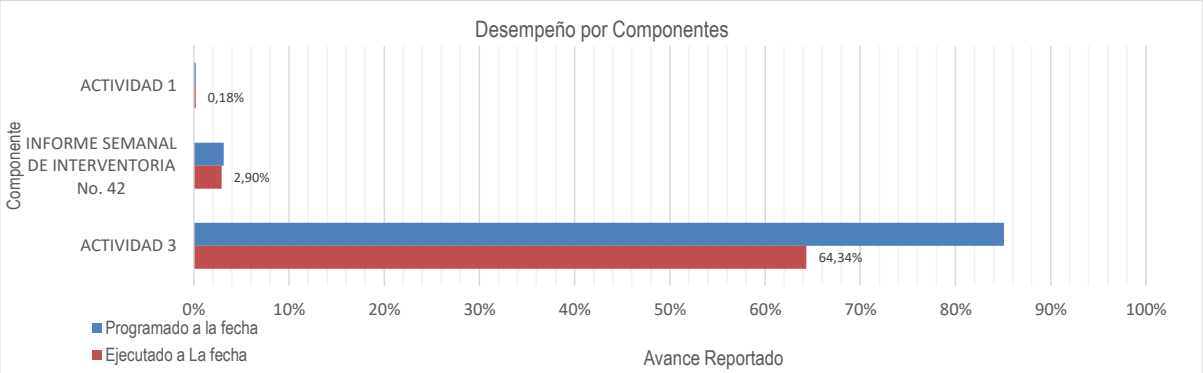

Fecha de Corte	18/01/2024 - 18/08/2024	PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS RIO IRO CHOCÓ																										
Priorización		MATRIZ BASE								INCLUSIONES									TOTALES (MATRIZ + INCLUSIONES)					EJECUCION DE OBRA (ACTIVIDAD No. 3)				
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusion	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldia	Viviendas No Avaladas por el ESP	Viviendas No Avaladas por Alcaldia	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	Viviendas Recibidas a Satisfacción por Interventoría y beneficiario	Viviendas Programadas actividad No.3 según plan de trabajo Vigente (DEBIDAMENTE TERMINADAS)	VIVIENDAS EN ATRASO POR FALTA DE TERMINACION DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO
Rio Iró Chocó	Barrio Nuevo	198	459	170	17	168	11	1	90	73	76	3	0	56	17	67	3	274	226	34	235	14	216	190	26	186	404	131
	La Real	99		39	8	36	12	1	33	19	25	6	0	22	10	19	2	93	61	18	55	14	47	44	3	39		
	La unión	78		48	14	48	16	0	35	27	30	3	0	26	9	26	0	113	74	23	74	16	68	57	11	48		
	El Rosario	123		79	23	77	21	0	26	25	26	1	0	19	9	17	3	154	98	32	94	24	77	1	76	0		
	TOTAL	458	459	336	62	329	60	2	184	144	157	13	0	123	45	129	8	634	459	107	458	68	408	292	116	273	404	131

	CONTRACTUAL			PROGRAMADO			EJECUTADO		
	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
ACTIVIDAD 1	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%
ACTIVIDAD 2	459	$ 131.342.174,45	3,15%	459	$ 131.342.174,45	3,15%	422	$ 120.754.678,91	2,90%
ACTIVIDAD 3	459	$ 4.026.128.329,40	96,67%	404	$ 3.543.694.651,59	85,08%	384	$ 2.679.692.548,32	64,34%
		$ 4.164.944.717,87	100,00%		$ 3.682.511.040,06	88,42%		$ 2.807.921.441,25	67,42%

Jueves 12 de agosto 2024

Personal de obra

1 Residente de temas de interventoría
1 Residente social de interventoría
1. Inspector pgio de interventoría
2 Inspector. temas de interventoría
1. Residente temas de obra
1. Residente social de obra
1. Inspector pgio de obra
1. Profesional social apoyo obra
4 Inspectores temas de obra
1 Almacenista
1. Conductor
33 oficiales
15 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentó entre seco y calido

Herramienta y Equipos

3 volquetas
2 Camionetas de obras
. Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presentó actividades normales de obra, se repartieron materiales en codigos en ejecución como también se asignaron codigos de maestros con el animo de continuar con la obra. por otro lado se realizó socavación de codigos ya finalizados, comenzando desde excavaciones hasta la postura de cada una de las casetas, también se realizo la validación de medidas junto ala interventoría para pasar a obra.

NOTA: Se le recomienda al contratista de obra, entregar los materiales necesarios para la ejecución de los intervenciones de manera oportuna.

Arq. Residente obra.

Victor Murillo
Ing. Residente de interventoría

Usaquén 13 Agosto de 2024.

Personal obra

1. Residente Tecnico de interventoria.
1 Residente Social de interventoria
1. Inspector pcio de interventoria
1. Inspector Tecnicos de interventoria
1. Residente Tecnico de obra
1. Residente Social de obra
1. profesional Social de obra
1- Inspector pcio de obra
4 Inspectores Tecnicos de obra
1. Almacenista
1. Conductor.
33 oficiales
15 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentaron un dia cubierto
seco

Herramienta y Equipos

2 camionetas de Estacas
3 carros vareajeros

Herramienta menor

Actividades

Durante La jornada se realizaron actividades normales de obra, entrega de materiales a cadejos en ejecución como también se continuo con obra con excavaciones fundición, mamposteria, pintura, tambien se realizó validación de medidas para acta 3. junto con la interventoria, asimismo se realizó la asignación de cadejos para ejecutar a los maestros. por otro lado se recuerda que la via se encuentra en malas condiciones para el ingreso de materiales al municipio de nio rió.

NOTA: Se le recomienda al contratista de obra, atender las observaciones realizados por esta interventoría, con el fin de que sean subsanadas.

VICTOR Murillo R
Ing Residente de interventoría

Viernes 04 de Agosto de 2023

Personal obra

1 Residente Tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector Pcio de interventoria
2 Inspectores Tecnicos de interventoria
1. Residente Tecnico de obra
1. Residente social de obra
4 Profesional social de apoyo obra
1. Inspector Pcio de obra
4 Inspectores Tecnico de obra.
4 Almacenista
1. Conductor
33 oficiales
15 Ayudantes

Descripción climatica

Durante la jornada se presentó medio cubierto y seco

, Herramienta y Equipos

2 camionetas de Estacas
3 motosierras
1 Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presento actividades normales de obra, entrega de materiales a cadejos ya en ejecución, como tambien, tambien se socavaron cadejos para ser entregados a la interventoria, por otro lado la via se encuentra en malas condiciones por el ingreso de materiales al municipio de rio iró, cabe resaltar que las lluvias se presento en horas de la noche sin embargo el contratista intenta por todos los medios sostener en pie la obra

Arq. Residente Obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interven

Jueves 15 de Agosto de 2024

Personal de obra

1. Residente Tecnico de interventoria
1. Residente Social de interventoria
4 Inspector pcio de interventoria
2 Inspectores tecnico de interventoria
1 Residente Tecnico de Obra
1 Residente Social de obra
1. Profesional Social apoyo de obra
1 Inspector pcio de obra
4 Inspectores Tecnicos de obra
1. Almacenista
1 Conductor
33 oficiales
15 Ayudantes

Descripcion Climatica

Durante la jornada se presento un dia calido y seco.

Herramienta y Equipos

2 Camionetas de Estacas
3 Volcarros

Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra. Como tambien se entregaron materiales a los codigos en ejecucion, tambien se realizaron entrega de codigos ya finalizados ala interventoria, durante toda jornada del dia jueves, Por otra parte se recuerda que de via esto en malas condiciones de las vias no permiten el paso de carro. altos materiales al municipio de rio iró, Sin embargo el contratista hace todo lo posible necesario por solucionar temas de obra y entregas ya finalizadas para continuar con la obra.

NOTA: Se le solicita al contratista de obra, la entrega de dotación a la mano de obra no calificada.

Victor Murillo F
Ing Residente de Interventoria

Viernes 16 Agosto de 2024

Personal obra

1. Residente de interventoria
1 Residente Social de interventoria
1. Inspector Plás de interventoria
2 Inspectores Tecnicos de interventoria
1 Residente Tecnico interventoria
1 Residente Social de Obra
1. Profesional Social de apoyo obra
1. Inspector Plás de obra
4 Inspectores Tecnicos de obra
1 Almacenista
1 Conductor
33 Oficiales
25 Ayudantes

Descripción Climática

Durante la jornada se presento condiciones secas y soleadas

Herramienta y Equipo

2 carretillas de llantas
3. motosierras
. Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presentó actividades de obra excavaciones, fundición, mamposteria, pañetes, tambien se continuo con la entrega de materiales a los codigos ya en ejecución, cabe resaltar ya durante la semana llego el suministro de bloque, como tambien de cemento y se tiene proyectado el ingreso de mas material, al momento de sio no el fin de semana, tambien se hizo entrego de codigos ya finalizados a la interventoria

Ing. Residente Obra.

Victor Murillo R
Ing. Residente de interventoria

Sábado 17 de agosto de 2024

Personal obra

1 Residente de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector pdio de interventoria
2 Inspectores tecnicos de interventoria
1. Residente tecnico de obra
1. Residente social de obra
1 profesional social apoyo obra
1 Inspector pdio de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1 Almacenista
1 Conductor
3.3 oficiales
15 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentó un dia seco y soleado.

Herramienta y Equipos

2 camionetas de Estacas
3 motocarros
Herramienta menor

Actividades

Durante la jornada se presentaron actividades normales de obra en el barrio el rosario y la union como tambien se entregaron codigos y finalizados, por otra parte, se entregaron materiales a codigos en ejecución, y se comenzo a realizar la socialización de carpetas para cobro del corte 3 tres, cabe resalta que el dia sabado llego bloque para abastecer a los codigos en ejecución los cuales fueron un buen ritmo de avance de obra.

NOTA: se deja constancia por parte de la interventoria que se aperturaron 24 codigos nuevos el cual el contratista de obra puede iniciar las actividades constructivas y

se recibieron y entregaron a los beneficiarios 17 intervenciones

Arq. Residente obra. Ing. Residente de interventoría

Domingo 18 de Agosto de 2019

Personal obra
1 Residente técnico de interventoría
1 Residente social de interventoría
1 Inspector pcio de interventoría
2 Inspectores técnicos de interventoría
1 Residente técnico de obra
1 Residente social de obra
1 Inspector pcio de interventoría
2 Inspectores técnicos de obra
1 Almacenista
1 Conductor.
33 oficiales
15 Ayudantes

Descripción climática
Durante la jornada se presento condiciones secas y cálidas

Herramienta y equipos
2 Camionetas de estacas
3 motocarros
.. Herramienta menor

Actividades
Durante la jornada realizó actividades administrativas de la acta N° 3 para cobro y cus 88 carpetas finales para ser entregadas a los interventores

Arq. Residente obra. Ing. Residente de Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 47

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **19/08/2024** al **25/08/2024** Fecha **25/08/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2230223	**NOMBRE DEL PROYECTO**	INTRADOMICILIARIAS RIO IRÓ
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCÓ	**MUNICIPIO**	RIO IRÓ
GERENCIA A CARGO	GERENCIA DE UNIDAD 1	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2230223
Contratista		CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Valor inicial	$	4.164.944.717,87
Valor actual	$	4.164.944.717,87
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		24/08/2023
Plazo inicial (Días)		213 Días
Plazo actual (Días)	373 Días	100,00%
Variación en plazo		160 Días
Fecha Contractual de terminación		31/08/2024
Tiempo Transcurrido (días)	367	98,39%
Días remanentes del Contrato	6	1,61%
Acumulado a última acta pagada	$	1.197.537.320,36
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	$	2.230.219,00
Interventor		CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
Valor inicial	$	396.843.968,13
Valor actual	$	396.843.968,13
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		24/08/2023
Plazo inicial		228 Días
Plazo actual	373 Días	100,00%
Variación en plazo		145 Días
Fecha Contractual de terminación		31/08/2024
Ejecución del Contrato	367	98,39%
Días remanentes del Contrato	6	1,61%
Acumulado a última acta pagada	$	126.990.069,80
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.682.511.040,06	88,42%	$ 2.807.921.441,25	67,42%	-$ 874.589.598,81	-21,00%
Durante el Periodo	$ 263.145.642,44	6,32%	$ 64.779.083,74	1,56%	-$ 198.366.558,70	-4,76%
Acumulado a la Fecha	**$ 3.945.656.682,50**	**94,73%**	**$ 2.872.700.524,99**	**68,97%**	**-$ 1.072.956.157,51**	**-25,76%**

Semaforo

Desviación en días

-96,1 Días

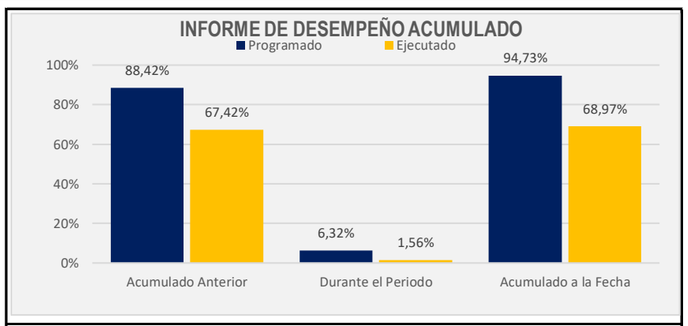

Observaciones al desempeño del proyecto

ACTIVIDAD No. 1
El contratista de obra remitió los diseños arquitectónicos y estructurales los cuales fueron aprobados por la Interventoría y los mismos cuentan con VoBo del munisiterio desde el día 14 de noviembre del 2023.

ACTIVIDAD No. 2


Durante esta semana, el contratista de obra No realiza diagnósticos en ninguno de los cuatro barrios priorizados. A la fecha se han visitado un total de 634 viviendas, se han diagnosticado 459 viviendas efectivas de las cuales se han aprobado 458 diagnosticos y se han presentado 68 renuncias. De igual manera del total de viviendas visitadas se han identificado 107 como no efectivas. Cabe señalar que a la fceha ya se ha culminado y se ha efectuado cierre a la etapa de inclusión.


ACTIVIDAD No. 3

A corte del presente informe, se cuenta con 414 viviendas iniciadas las cuales están localizadas en Barrio Nuevo, en el Barrio La Real, el Barrio La Unión y el Barrio El Rosario en las manzanas 1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,7, 8,9 y 10 en las cuales se han realizado actividades significativas correspondientes a fundición de vigas de cimentación, construcción de muros en mampostería estructural, pañetado, enchape de pisos y paredes en cerámica, instalación de combos sanitarios, construcción de lavaderos y lavaplatos, Excavación . Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 414 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 122 viviendas en ejecución, 292 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoría y al beneficiario 278 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución con porcentajes estimados de avance es de 68,97% (Ejecutado Estimado de acuerdo al resumen anexo al presente informe), con respecto al 94,73% que se tiene programado, es decir, presenta un atraso del 25,76% respecto a viviendas programadas y terminadas (Con porcentaje estimado). Cabe señalar que si bien el contratista presenta en las 414 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 414 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 278 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoría. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo (Plan de Contingencia) y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoría el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 434 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 156 viviendas en atraso, pues esta no se encuentran terminadas en su totalidad y no cuenta con acta de recibo a satisfacción.

NOTA ACLARATORIA: El seguimiento a la ejecución de las obras se realiza a partir del ultimo plan de trabajo (Plan de contingencia) avalado por la interventoría el día 21/06/2024. Es importante señalar y aclarar que la diferencia o reducción de intervenciones entre la semana No. 34 y 35 obedece al reajuste y repogramación realizada por el contratista, de acuerdo a los compromisos establecido con la Entidad Contratante de reasignar interveciones producto del atraso y son redistribuidas a partir de la semana 36 en adelante, por tal motivo, la intervenotría realiza el debido seguimiento a partir de acuerdo a las cantidades y valores establecidas por el contratista como accion para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y plan de contingencia.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

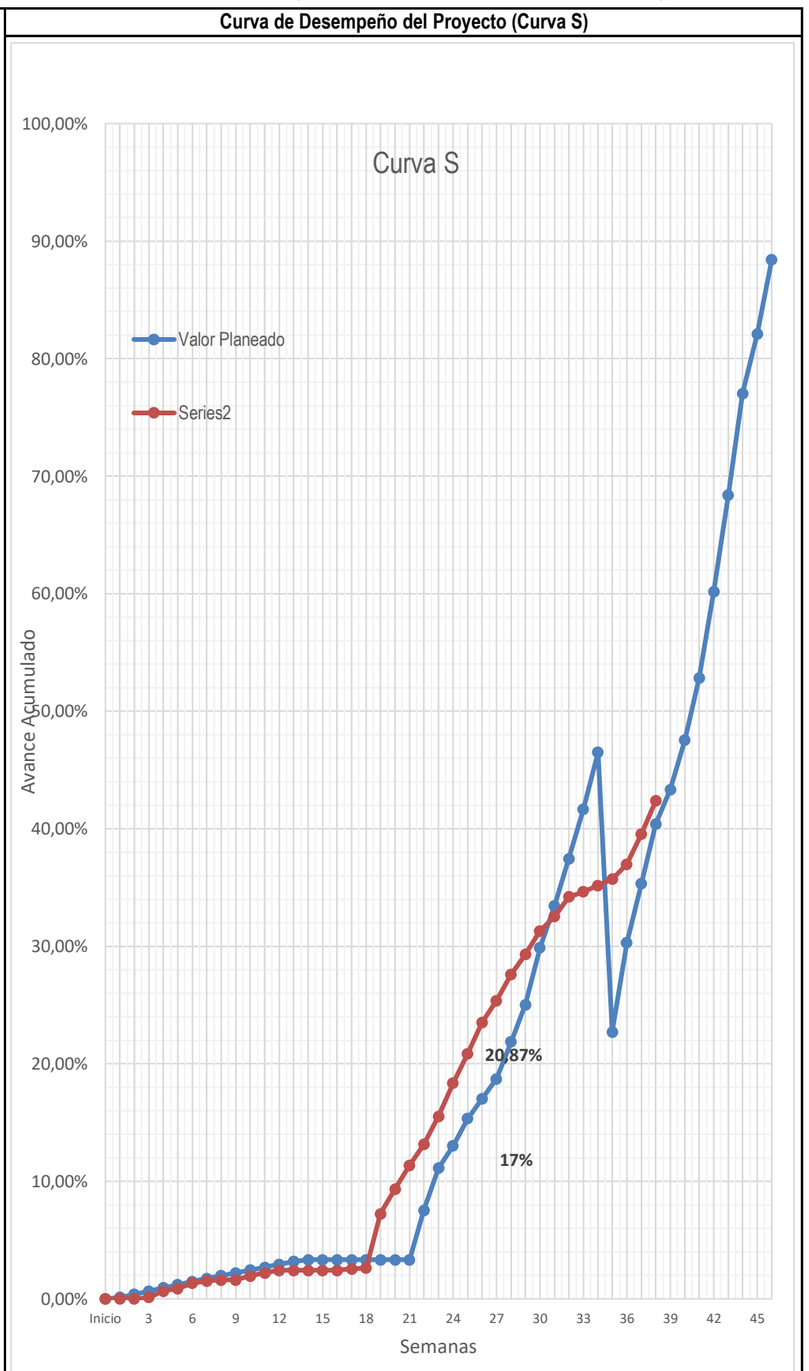

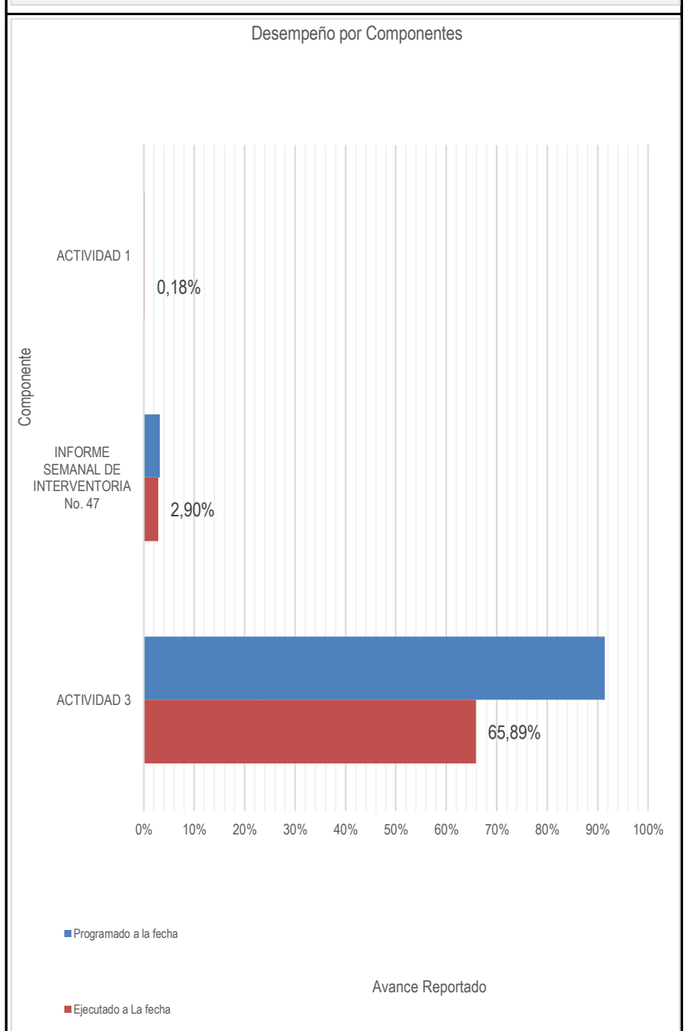

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 47

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **19/08/2024** al **25/08/2024** Fecha **25/08/2024**


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

De acuerdo a los atrasos evidenciados por parte del contratista de obra, fue necesario desde la interventoría y ENTerritorio S.A solicitar un plan de contingencia al contratista con el fin de mitigar estos atrasos, por tal motivo, se procede a realizar el seguimiento al contrato de obra de acuerdo al plan de trabajdo vigente (plan de contingencia) avalado el 21/06/2024, plan de contingencia que refleja el compromiso del contratista de intervenciones semanales y mensuales hasta el 31 de agosto de 2024.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	88,42%	67,42%	-21,00%	
Durante el Periodo	6,32%	1,56%	-4,76%	
Acumulado a la Fecha	**94,73%**	**68,97%**	**-25,76%**	

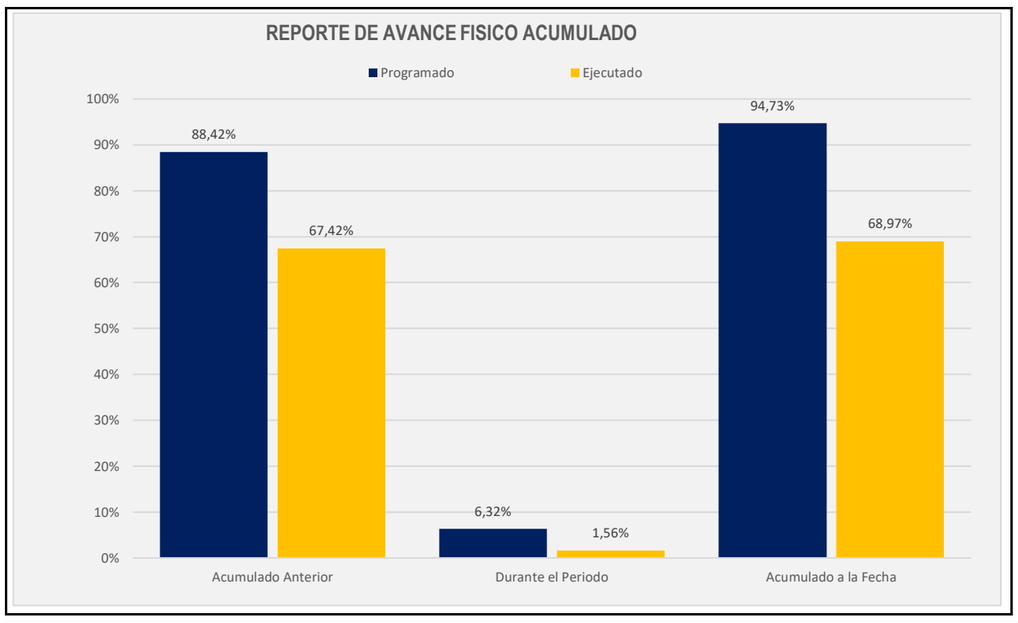


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 4.164.944.717,87	$ 4.164.944.717,87	$ -	$ 805.225.665,88	$ 220.146.445,74	$ 585.079.220,14


No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
4	$ 2.169.446.489,05	52,09%	3	$ 1.836.090.842,11	44,08%	9/05/2024	$ 638.553.521,75



AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 396.843.968,13	$ 496.054.960,16	$ 99.210.992,03	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
5	$ 276.633.316,11	55,77%	4	$ 239.594.545,75	48,30%	30/07/2024	$ 51.583.101,79



OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra continuó desarrollando la actividad numero 3 con procesos de excavación manual, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de lavaderos, instalación lavaplatos, acabados y pintura, hasta la fecha del presente informe se cuenta con 292 viviendas terminadas, de las cuales 278 han sido entregadas a la interventoría y a los beneficiarios. Cabe señalar que a la fecha el contratista de obra adelanta 414 intervenciones de 459 que se tienen programadas en el plan de trabajo, así mismo, se tiene un porcentaje aproximado ejecutado de viviendas terminadas y en ejecución de 68,97%, y un 94,37% programado, es decir, presenta un atraso del 25,76% respecto a viviendas programada, terminadas y/o recibidas a satisfacción con porcentaje estimado de intervención de cada vivienda (Segun cuadro anexo al presente informe). Es importante resaltar que si bien el contratista de obra cuenta en 292 viviendas terminadas, solo se cuenta con 278 viviendas recibidas a satisfacción, por tal motivo se presenta un atraso del 35,94% referente a la cantidad de intervenciones programadas como viviendas recibidas a satisfacción las cuales corresponden a 434 viviendas.

Durante la semana, se realiza comité de seguimiento de manera virtual con el fin de dar a conocerlas las actividades y los avances realizados durante la semana.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Durante la presente semana de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

Lunes, 19 de Agosto de 2024
Durante la jornada el contratista continuó, con las actividades de obra, entregas de materiales a los códigos en ejecución, como también se continua con la ejecución de subsanaciones de códigos para entregar a interventoría, por otro lado, la vía se encuentra en malas condiciones para el ingreso de materiales al municipio de rio iro, por lo que ha retrasados las actividades de obra.

Martes, 20 de Agosto de 2024
Durante la jornada el contratista de obra continúa con las actividades de obra, entrega de materiales a los códigos en ejecución, cabe resaltar que el contratista busca por todos los medios necesarios la terminación a feliz termino el contrato en el municipio de rio iró. Durante la jornada todo transcurrió en cada una de las viviendas en ejecución, sin embargo las condiciones climáticas de la zona no han permitido continuar con la ejecución de la obra de manera normal.

Miércoles, 21 de Agosto de 2024
Durante la jornada el contratista de obra continuó con las actividades de obra, entrega de materiales a los códigos en ejecución. Para esta jornada se realizaron aperturas en barrio nuevo, cabe resaltar que las lluvias no permitieron actividades con normalidad en horas de la tarde, sin embargo, se continuó con la ejecución de códigos. Por otra parte, se deja constancia que no hubo suministro de fluido eléctrico, ni agua potable durante la jornada.

Jueves, 22 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentaron actividades de obra con restricciones por las lluvias que se presentaron como también por la falta de energía que limitan los avances de obra en viviendas que eran oscura para realizar las actividades de obra, por otro lado, la falta de suministro de agua en el municipio no permitió con el avance continuo en códigos en ejecución. De igual manera, se realizaron aperturas a códigos en barrio nuevo y la unión.

Viernes, 23 de Agosto de 2024
Durante la jornada se continua con las actividades de obra sin dificultad en horas de la mañana, también se realizó la entrega de materiales a códigos en ejecución, por otro lado, se realizó la recolección de escombros en el barrio el rosario en las vías de mayor flujo y andenes peatonales.

Sábado, 24 de Agosto de 2024
Durante la jornada se realizaron actividades de obra, entrega de materiales a códigos, se realizaron entrega de códigos ya finalizados y subsanación de códigos para ser entregados a la interventoría.
Se deja constancia por parte de esta interventoría que solo se aperturaron 4 viviendas y se recibe a satisfacción 1 viviendas finalizada.

Domingo, 25 de Agosto de 2024
Durante esta jornada se realiza actividades administrativas.

NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, entregar los materiales a las intervenciones de forma oportuna y organizada.
NOTA 2: Se le recomienda al contratista de obra, entregar la dotación de los elementos de protección personal al personal de mano de obra no calificados nuevos.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 47

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **19/08/2024** al **25/08/2024** Fecha **25/08/2024**

Durante el periodo la interventoría remite los siguientes comunicados al Contratista de obra y/o ENTerritorio y/o Municipio de Rio Iró y/o Empresa de Servicios Publicos:

CAEE-RI-2024-397 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-250 Obs carp. Finales
CAEE-RI-2024-398 ENTREGA INFORME SEMANAL SOCIAL No. 44
CAEE-RI-2024-399 NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - SST
CAEE-RI-2024-400 Aprobacion Informe Mensual Obra - Junio 2024
CAEE-RI-2024-401 Entrega Acta Parcial de Obra No. 3
CAEE-RI-2024-402 ENTREGA ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 5
CAEE-RI-2024-403 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OF-CGE-23-409 Sol. Prorroga
CAEE-RI-2024-404 Traslado de comunicado No, PPDI-OF-CGE-23-406 y concepto de interv
CAEE-RI-2024-405 Entrega Informe semanal No. 46
CAEE-RI-2024-406 Recomendacion Prorroga de la Orden de trabajo 2230223


Se tiene previsto que para la semana siguiente el contratista y/o interventoría realice las siguientes actividades:

1. Contratista de obra continue elaborando diagnosticos de inclusion.
2. El contratista de obra siga desarrollando la Actividad No.3, consintente en la realización de aperturas, replanteos y ejecución de obra. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo y cronograma de entregables avalado por la interventoría.
3. Entrega de intervenciones a la interventoría y al beneficiario.
4. Realización de comité de seguiemito virtual
5. Recorrido de validacion de personal en obra
7. Capacitación sobre Buenas prácticas ambientales..


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	1
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

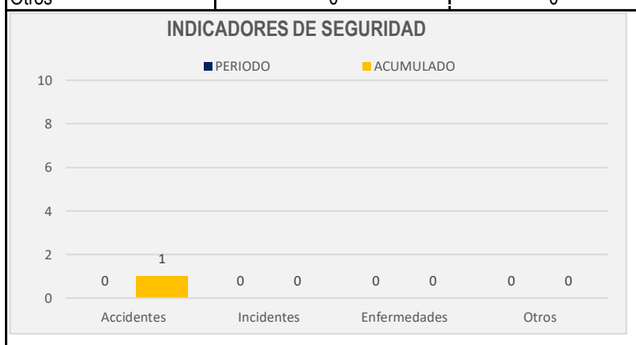

Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	235,75	10,5	246,25	62,9%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	145	0	145	37,1%
	Total	**380,75**	**10,5**	**391,25**	**100,00%**

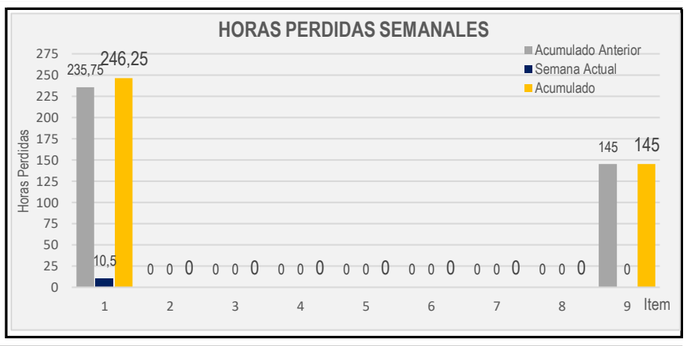

OBSERVACIONES:
1. Durante el periodo no se presentan lluvias en la zona, ocasionando una perdida de tiempo de 10,5 horas.
2. Durante el periodo no se presentan, accidentes, incidentes o enfermedades que hayan ocasionado perdida de tiempos y/o cese de actividades.
3. Durante el periodo la interventoría realiza revisión de documentación entregada por el Contratista de obra, sin embargo la interventoría efectua una serie de observaciones y requerimientos los cuales se pusieron en conocimiento del contratista a traves de comunicados.
4. se realizó acompañamiento al área técnica en actividades de campos como: recorrido de porcentajes, recorrido de observaciones.
5. se realizó recorrido punto a punto de intervencion por el PGIO de interventoria e inspector sst del contratista sobre validacion de personal en campo.
6. Capacitacion sobre Hábitos y estilos de vida saludables..
7. Riesgos Accidente, casi accidentes y enfermedades laborales.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A	19/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	Dia festivo no se realizaron actividades	Obra e Interventoría	N/A
N/A	20/8//2024	Barrio nuevo y la union	N/A	El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 10 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	21/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 10 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	22/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	El contratista de obra e interventoria realizaron actividades abministrativas, para organización de carpetas	Obra e Interventoría	N/A
N/A	23//08/2024	Barrio la real y la Union	N/A	El contratista de obra e interventoria realizaron actividades administrativas, para la organización de carpetas de entregas.	Obra e Interventoría	N/A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 47

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **19/08/2024** al **25/08/2024** Fecha **25/08/2024**

N/A	24/08/2024	Barrio nuevo, la real y la union	N/A	El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizo validación de 16 viviendas que estaban programas para entregar a satisfacción a la interventoria, con el fin de poder realizar la entrega a los beneficiarios, también se realizó revisión de los buzones de sugerencias.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	25/08/2024	Barrio nuevo	N/A	Se realizan actividades administrativas	Interventoría	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
Quejas	habitante del barrio la union	23/08/2024	ffiltraciones de una cja de registro	Contratista de obra

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Se ha evidenciado problemas con el fulido electrico y el flujo de agua con el fin de realizar las pruebas necesarias, y poder validar la funcionalidad de las obras ejecutadas. Adicionalmente se presenta problemas de flujo electrico y de internet y conexion de redes moviles	Se ha efectuado acercamientos con la Empresa prestadora de servicios publicos con el fin de que se garantice el flujo suficiente para poder validar cada intervención, sin embargo ha sido compleja esta situacion pues a pesar de los acercamientos el flujo de agua en el Municipio es muy compleja. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA PROBLEMATICA ES REITERADA SEMANA A SEMANA DEBIDO A QUE ES UNA SITUACIÓN QUE OCURRE DE MANERA NORMAL Y SEGUIDA EN EL MUNICIPIO.	Se realiza validacion de flujo de agua toda la semana para poder adelantar actividades de validacion y recibo de obras. Esta situación se deja documentada en Bitacora.	Contratista de obra Interventoría Empresa Prestadora de Servicios	Bitácora	Se realiza constantemente
Se presenta falencias en el estado de las vias que impiden el ingreso de vehiculos y de materiales a obra	El Alcalde Municipal de Rio Iró se compromete a reparar de manera provisional estos 2 sectores con el fin de que el contratista durante el din de semana del presente periodo ingrese materiales a obra. Cabe señalar que el Municipio manifiesta que se cuenta con un proceso de seleción que se encuentra en proceso adjudicacion y contratacion con el cual se pretende mejorar estos sectores criticos. Lo anterior como una acción de mejora y el contratista cuente con las garantizas de acceso al Municipio. A CORTE DEL PRESENTE INFORME SE ESTÁ A LA ESPERA QUE EL MUNICIPIO INFORME LAS GESTIONES REALIZADAS Y SOBRE EL INICIO DE LAS OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS. CABE SEÑALAR QUE LAS VIAS A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN ESTADO MUY DETERIORADO Y EL MUNICIPIO NO HA EFECTUADO ACTIVIDAD ALGUNA	Mejoramiento de vias por parte del Municipio	Alcaldía de Rio Iro	Acta de comité e informes semanales	Se realiza constantemente
Tal y como se habia manifestado con anterioridad, a la fecha se sigue presentando problemática en la excavaciones que se vienen realizando en las conexiones intradomiciliarias, pues se ha evidenciado presencia de rocas en las excavaciones conllevando a requerir mayores tiempos en la ejucción de esta actividad.	El contratista ha señalado e informado a la interventoría sobre esta situación, la cual ya se habia presentado con anterioridad.	Se validará la necesidad de contemplar una actividad no prevista, toda vez que el contratista no cuenta con esta actividad de manera contractual. A la fecha está en proceso de validación por parte del contratista de obra y remision a la interventoría.	Contratista de obra	N/A	5/08/2024

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografia 1.validacion de viviendas para recibido a satisfacion por parte de la interventoria



Fotografia 2. Socializacion casa a casa en aperturas de viviendas



Fotografia 3. Revision de buzones de sugerencias

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 47

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **19/08/2024** al **25/08/2024** Fecha **25/08/2024**



Fotografía 4. CH-RI-ER-M4-IN-VE-012 - Realización de Pañete



Fotografia 5. CH-RI-ER-M6-IN-VE-006 - Realización de Mampostería en Bloque Estructural para Lavaderos



Fotografia 6. CH-RI-ER-M3-VE-070 - Realización de Losa de Concreto para Lavadero y Lavaplatos

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 414 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 122 viviendas en ejecución, 292 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoría y al beneficiario 278 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución es 68,97% (Ejecutado), con respecto al 94,73% que se tiene programado, es decir, presenta un atraso del 25,76% respecto a viviendas programada, terminadas y recibidas a satisfcación. Cabe señalar que si bien el contartista presenta un avance en las 414 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 414 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 278 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoría. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoría el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 434 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 156 viviendas sin contarse sin la respectiva terminación y acta de recibo a satisfacción.

A la fecha el contratista de obra presenta un atraso del 25,76% de acuerdo al nuevo plan de trabajo avalado por la interventoría y según el avance estimado del total de viviendas iniciadas, terminadas, en ejecución y recibidas a satisfacción. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 94,73%, sin embargo, de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados, y la ejecución de obras el contratista contó con un 68,97% de ejecución; cabe señalar que, este porcentaje es calculado a partir del avance estimado y aproximado de cada vivienda iniciada y/o terminada y/o recibida a satisfacción. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se encuentra en un atraso en la cantidad de viviendas terminadas y recibidas a satisfacción de 156 intervenciones, es decir de las 434 viviendas programadas para el periodo, unicamente se cuenta con 278 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría y beneficiario. Es importante señalar que si bien se viene presentando un atraso en obra, esta situacion obecede al mal estado de la via, el cual ha impedido ingresar materiales al Municipio y por ende presentar reducción de rendimiento. Cabe señalar que esta situación ya habia sido advertida por la interventoría, pues a pesar de que el contratista de obra se encuentra aadelantando acciones necesarias y pertinentes para garantizar el personal y material en obra, el Municipio de Rio Iró no ha cumplido con los compromisos establecidos a la fecha; por lo anterior se establece que si bien se presenta un atraso en obra, este no es imputable al contratista de obra, sino a un tercero el cual corresponde al Municipio de Rio Iró.

Durante el periodo, se presentan 0 horas de lluvia que afectan la correcta ejecución de actividades de diagnóstico. ejecución de obras y validación. Durante el periodo no se cuenta con flujo de energia, ni red de telefonia movil, wifi y agua de manera constante para poder ejecutar actividades en obra y/o realizar las pruebas de presion o necesarias para recibir las intervenciones terminadas o adelantar actividades administrativas (casi siempre se cuenta con flujo de agua y energia en horas de la noche cuando ya no se adelantan obras).

Es importante señalar que la presente interventoría ha venido desarrollando sus actividades de acuerdo a sus obligaciones contractuales, así mismo ha venido efectuando el debido seguimiento y control sobre las obras que se vienen ejecutando en la zona y se ha reportado de manera oportuna las situaciones presentadas al momento de ejecutar las obras o de recibir las mismas.


Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	Nombre: DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
Director de Interventoría	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,12%	$ 4.938.639,00	0,00%	$ -
2	0,39%	$ 16.243.284,40	0,00%	$ -
3	0,66%	$ 27.574.064,98	0,13%	$ 5.443.779,94
4	0,93%	$ 38.891.777,97	0,66%	$ 27.521.331,92
5	1,21%	$ 50.209.490,96	0,88%	$ 36.594.298,49
6	1,48%	$ 61.527.203,95	1,32%	$ 55.042.663,84
7	1,73%	$ 72.050.781,95	1,52%	$ 63.208.333,75
8	1,97%	$ 82.083.864,94	1,62%	$ 67.279.256,42
9	2,21%	$ 92.116.947,93	1,62%	$ 67.279.256,42
10	2,45%	$ 102.150.030,92	1,95%	$ 81.014.385,77
11	2,69%	$ 112.183.113,92	2,22%	$ 92.460.326,90
12	2,93%	$ 122.216.196,91	2,42%	$ 100.758.634,22
13	3,18%	$ 132.249.279,90	2,42%	$ 100.758.634,22
14	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
15	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
16	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
17	3,33%	$ 138.816.388,90	2,56%	$ 106.622.584,78
18	3,33%	$ 138.816.388,90	2,63%	$ 109.343.090,06
19	3,33%	$ 138.816.388,90	7,25%	$ 301.776.635,45
20	3,33%	$ 138.816.388,90	9,35%	$ 389.477.173,25
21	3,33%	$ 138.816.388,90	11,36%	$ 472.975.221,08
22	7,55%	$ 314.246.816,77	13,15%	$ 547.572.387,73
23	11,13%	$ 463.362.680,82	15,55%	$ 647.483.129,45
24	13,02%	$ 542.306.373,55	18,35%	$ 764.267.355,73
25	15,34%	$ 638.793.109,11	20,87%	$ 869.263.504,67
26	17,02%	$ 708.965.280,43	23,52%	$ 979.450.922,72
27	18,71%	$ 779.137.451,75	25,37%	$ 1.056.639.793,61
28	21,87%	$ 910.710.272,97	27,61%	$ 1.150.105.690,79
29	25,03%	$ 1.042.283.094,20	29,31%	$ 1.220.884.792,07
30	29,87%	$ 1.244.028.086,74	31,30%	$ 1.303.743.280,93
31	33,45%	$ 1.393.143.950,79	32,53%	$ 1.354.895.363,67
32	37,45%	$ 1.559.802.857,67	34,22%	$ 1.425.098.894,41
33	41,66%	$ 1.735.233.285,97	34,64%	$ 1.442.621.538,75
34	46,51%	$ 1.936.978.278,51	35,18%	$ 1.465.102.486,35
35	22,71%	$ 945.796.358,63	35,73%	$ 1.487.963.904,84
36	30,29%	$ 1.261.571.129,57	36,98%	$ 1.540.191.613,62
37	35,34%	$ 1.472.087.643,52	39,57%	$ 1.648.199.031,55
38	40,40%	$ 1.682.604.157,48	42,39%	$ 1.765.517.074,31
39	43,35%	$ 1.805.405.457,28	46,02%	$ 1.916.565.608,18
40	47,56%	$ 1.980.835.885,58	47,53%	$ 1.979.748.531,17
41	52,82%	$ 2.200.123.920,95	51,60%	$ 2.149.010.562,57
42	60,20%	$ 2.507.127.170,47	54,44%	$ 2.267.424.733,85
43	68,41%	$ 2.849.216.505,65	58,67%	$ 2.443.484.492,52
44	77,04%	$ 3.208.848.883,66	62,81%	$ 2.615.937.737,18
45	82,10%	$ 3.419.365.397,61	65,86%	$ 2.743.019.335,35
46	88,42%	$ 3.682.511.040,06	67,42%	$ 2.807.921.441,25
47	94,73%	$ 3.945.656.682,50	68,97%	$ 2.872.700.524,99
48	100,00%	$ 4.164.944.717,87		
	100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**67,42%**	**$ 2.807.921.441,25**

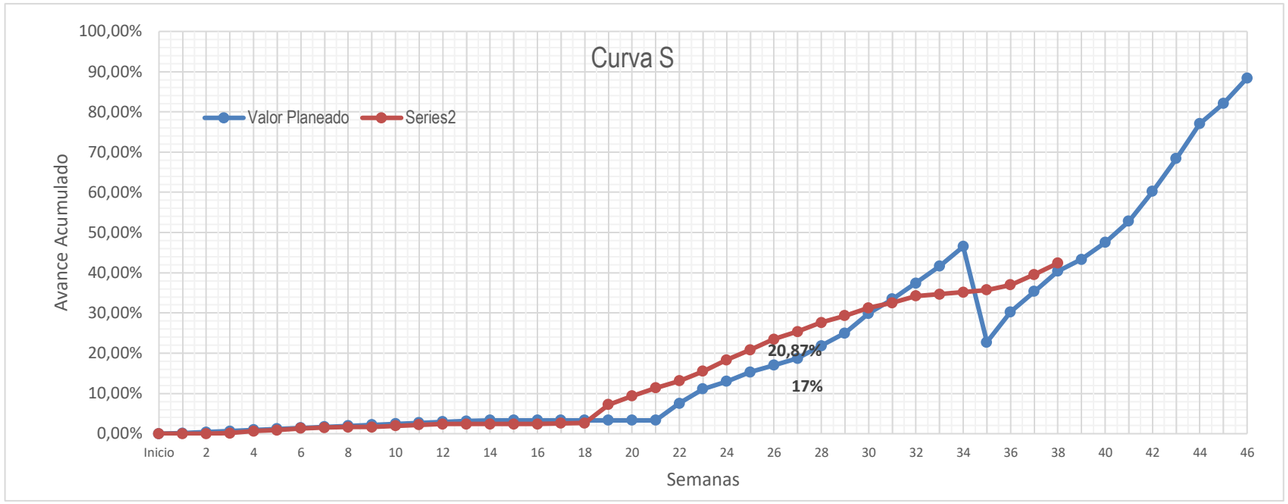

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC)	$	4.164.944.717,87

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACTIVIDAD 1	0,18%	$ 7.474.214,02	0,18%	$ 7.474.214,02	**0,18%**	$ 7.474.214,02
2	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 47	3,15%	$ 131.342.174,45	3,15%	$ 131.342.174,45	**2,90%**	$ 120.754.678,91
3	ACTIVIDAD 3	96,67%	$ 4.026.128.329,40	91,40%	$ 3.806.840.294,03	**65,89%**	$ 2.744.471.632,06
		100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**94,73%**	**$ 3.945.656.682,50**	**68,97%**	**$ 2.872.700.524,99**

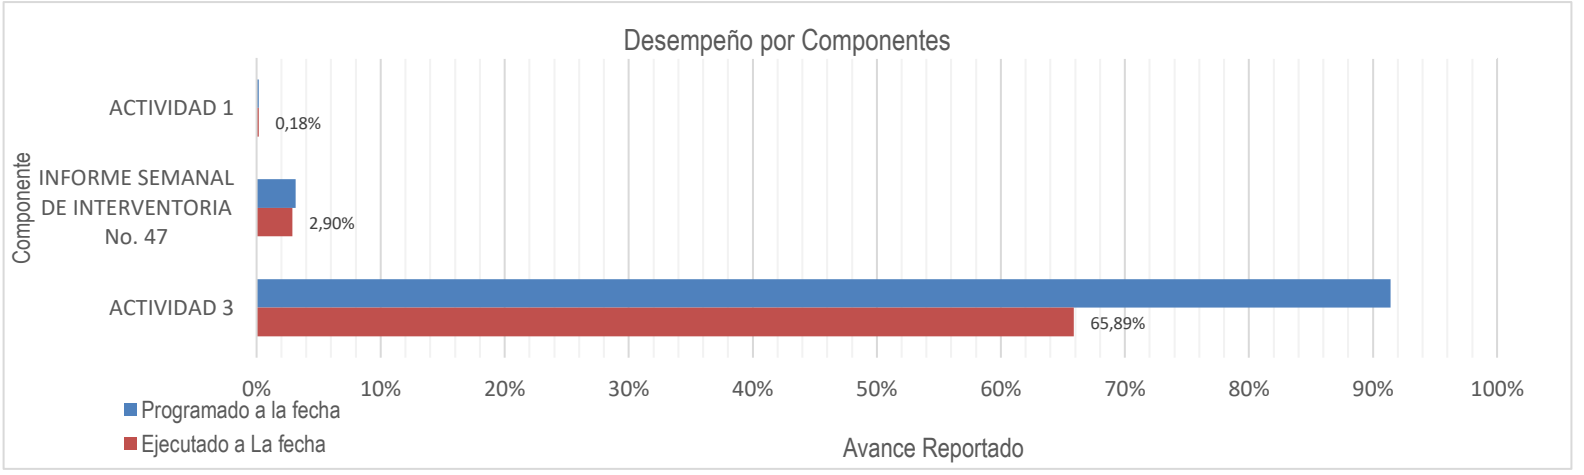

Fecha de Corte	18/01/2024 - 25/08/2024	PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS RIO IRÓ CHOCO																									
	Priorización	MATRIZ BASE								INCLUSIONES										TOTALES (MATRIZ + INCLUSIONES)					EJECUCION DE OBRA (ACTIVIDAD No. 3)				
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusion	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP	Viviendas No Avaladas por Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	Viviendas Recibidas a Satisfacción por Interventoria y beneficiario	Viviendas Programadas actividad No.3 segun plan de trabajo Vigente (DEBIDAMENTE TERMINADAS)	VIVIENDAS EN ATRASO POR FALTA DE TERMINACION DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO
Rio Iró Chocó	Barrio Nuevo	198	459	170	17	168	11	1	90	73	76	3	0	56	17	67	3	274	226	34	235	14	221	190	31	189	434	156
	La Real	59		39	8	36	12	1	33	19	25	6	0	22	10	19	2	93	61	18	55	14	47	45	2	40		
	La unión	78		48	14	48	16	0	35	27	30	3	0	26	9	26	0	113	74	23	74	16	68	57	11	49		
	El Rosario	123		79	23	77	21	0	26	25	26	1	0	19	9	17	3	154	98	32	94	24	78	0	78	0		
	TOTAL	458	459	336	62	329	60	2	184	144	157	13	0	123	45	129	8	634	459	107	458	68	414	292	122	278	434	156

	CONTRACTUAL			PROGRAMADO			EJECUTADO		
	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
ACTIVIDAD 1	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%
ACTIVIDAD 2	459	$ 131.342.174,45	3,15%	459	$ 131.342.174,45	3,15%	422	$ 120.754.678,91	2,90%
ACTIVIDAD 3	459	$ 4.026.128.329,40	96,67%	434	$ 3.806.840.294,03	91,40%	414	$ 2.744.471.632,06	65,89%
		$ 4.164.944.717,87	100,00%		$ 3.945.656.682,50	94,73%		$ 2.872.700.524,99	68,97%

Jueves 19. de agosto de 2024.

Personal de obra

1. Residente Técnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector pcto de interventoria
2 Inspectores técnicos de interventoria
1. Residente técnico de obra
1 Residente social de obra
1. Inspector pcto de obra
4 Inspectores técnico de obra
1. Almacenista
1 conductor
33 oficiales
15 Ayudantes.

Descripción climática

Durante la jornada se presento un clima seco y cálido.

Herramienta y Equipos

2 Camionetas de Estacas
3. Motocaros

Herramientas menor

Actividades

Durante la jornada. el contratista continuo con las actividades de obra, entregas de materiales obs codegos. en ejecución, como tambien se continuo con la ejecución de sobsanaciones de codegos para entregar ala interventoria, por otra lado, la via se encuentra en malos condiciones para el ingreso de materiales al municipio de rio iró. por lo que ha retrasado las actividades de obra.

Obs: se le recomienda al contratista de obra. atender los observaciones realizadas por la interventoria para sus respectivas subsanaciones

Ing. Residente obra.

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoria

Martes 20 de agosto de 2024

Personal obra

1. Residente tecnico de obra
1 Residente social de obra
1. profesional social apoyo de obra
1. Inspector pgio de obra
2 Inspectores tecnicos de obra
1. Almacenista
1 conductor
1. Residente tecnico de interventoria
1. Residente social de interventoria
1. Inspector pgio de interventoria
2 Inspector tecnicos de interventoria
33 oficiales
15 ayudantes

Descripción climatica

Durante la jornada se presentaron un dia seco y soleado.

Herramienta y Equipos

2 camionetas de estacas
3 motocarros
Herramienta menor-

Actividades

Durante la jornada el contratista continuo con las actividades de obra, entrega un materiales a los codigos en ejecución cabe resaltar que el contratista busca por todos los medios necesarios la terminación a feha, termino el contrato en el municipio de rovira.
Durante la jornada todo transcurrió con normal en cada una de las viviendas en ejecución, sin embargo las condiciones climaticas de la zona no han permitido continuo

NOTA: se le solicita al contratista ~~el~~ co de obra entregar la dotación de elementos de protección personal de manera inmediata al personal de mano

de obra (no) calificada.

Arq. Residente de obra

VICTOR Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Miercoles 21 Agosto de 2024.

Personal obra

1. Residente tecnico de obra
1. Residente Social de obra
1. Profesional social de apoyo a obra.
1. Inspector PGio de obra
4 Inspectores tecnicos de obra
1. Almacenista.
1 Conductor
1. Residente tecnico de interventoria
1. Residente social de interventoria.
1. Inspector PGio de interventoria
2 Inspector tecnico de interventoria
33 Oficiales
15 Ayudantes

Descripción climática

Durante la jornada se presentó: actividades normales de obra, entrega de materiales de codigos en ejecución, para esta jornada se presentaron lluvias en las horas de la tarde de 2:30 PM a 4:30 PM

Herramienta y Equipos.

2 camionetas de estacas.
3 motosierras.
Herramienta menor.

Actividades

Durante la jornada el contratista continuo con las actividades de obra, entrega de materiales a los codigos en ejecucion para esta jornada se realizaron aperturas del bosque nuevo, cabe resaltar que las lluvias no permitieron realizar actividades con normalidad.

en horas de la tarde. Sin embargo se continuó con la ejecución de codigos tipo 2. debe resaltar que no hubo suministro de energia ni agua potable durante la jornada.

Arq. Residente obra — VICTOR MUÑOZ R. Ing. Residente de Interventoría

jueves 22 de agosto de 2024

Personal obra
4. Residente tecnico de obra
1 Residente social de obra
1. Inspector ppio de obra
2 Inspector tecnicos de obra
1 Almacenista
1 conductor
1. profesional social apoyo de obra
1. Residente tecnico de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Inspector ppio de interventoria
2 inspector tecnicos de interventoria
33 oficiales
25 Ayudantes

Descripción Climatica:
Durante la jornada se presentaron lluvias de 11:am. a 3:00 pm.

Herramientas y Equipos
3 Motocarros
2 Camionetas de estacas
. Herramienta menor

Actividades
Durante los jornada se presentaron actividades de obra con restricciones por las lluvias que se presentaron como tambien por la falta de energia que limitaban los avances de obra en viviendas que eran. oscuras

para realizar las actividades de obra, por otro lado la falta de suministro de agua en el municipio no permitió un avance continuo en cadenas en ejecución son: se realizaron aperturas a codigos del barrio nuevo, la unión, por otro lado, la vía hacia el municipio. La estado en malas condiciones.

NOTA: se le recomienda al contratista de obra. entregar los materiales a las intervenciones de forma oportuna y organizada.

Arq. Residente obra

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interventoría

Viernes 23 Agosto de 2024

Personal de obra
✓ Residente de obra
✓ Residente social de obra
✓ Inspector pcio de obra
✓ Inspectores tecnic. de obra
✓ Almacenista
✓ Conductor
✓ profesional social apoyo de obra
✓ Residente Tecnico de interventoria
✓ Residente social interventoria
✓ Inspector pcio de interventoria
2 Inspectores tecnic de interventoria
33 oficiales
15 Ayudantes

Durante la jornada se presentaron lluvias de 1:30 pm a 6:00 pm.

Herramientas y Equipos.
3 Motocompresor
2 camioneta de estacas
Herramient de obras.

Actividades

Durante la jornada se continuo con las actividades de obra sin dificultad en horas de la mañana, tambien se realizo la entrega de materiales a codigos en ejecución, por otro lado se hizo la recolección de escombros en el barrio el rosario, en la vias de mayor flujo y transito peatonal.

Arq. Residente obra

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interv

Sabado 24 agosto de 2024

Personal obra

1. Res: tecnico de obra
1 Res. social de obra
1 Insp. pgio de obra
1 Insp tec. de obra
1 Almacenista
1. Conductor

1. Res. tec. interventoria
1 Res. social interventoria
1 Insp. PGIO interventoria
2 Insp. tec. interventoria

Descripción climatica

Durante la jornada se presentaron lluvias en horas de 9:00 a 12:00 m

Herramienta y equipos

2 Motosierras – 3 camionetas de obras - Herramienta menor

Actividades.

Durante la jornada se realizo actividades de obra entregas de materiales a codigos recolección de obra, tambien se realizaron entregas de codigos ya finalizados, y socialización de codigos para ser entregados a la interventoria.

NOTA: se deja constancia por parte de esta interv que solo se aperturaron 4 viviendas y se recibe a satisfacción 1.

Arq. Residente obra

Victor Murillo R
Ing. Residente de Interve

Domingo 25 de agosto de 2024 no se realizaron actividades de obra y administrativas.

Victor Murillo R

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 48

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A** Semana del **26/8/2024** al **1/9/2024** Fecha **1/9/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2230223	**NOMBRE DEL PROYECTO**	INTRADOMICILIARIAS RIO IRO
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
LOCALIZACION DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCO	**MUNICIPIO**	RIO IRO
GERENCIA A CARGO	GERENCIA DE UNIDAD 1	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2230223
Contratista		CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Valor inicial	$	4.164.944.717,87
Valor actual	$	4.164.944.717,87
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		24/8/2023
Plazo inicial (Días)		213 Días
Plazo actual (Días)	437 Días	100,00%
Variación en plazo		224 Días
Fecha Contractual de terminación		3/11/2024
Tiempo Transcurrido (días)	374	85,58%
Días remanentes del Contrato	63	14,42%
Acumulado a última acta pagada	$	1.197.537.320,36
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	$	2.230.219,00
Interventor		CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
Valor inicial	$	396.843.968,13
Valor actual	$	519.336.472,94
Variación del valor	$	122.492.504,81
Fecha de Inicio		24/8/2023
Plazo inicial		228 Días
Plazo actual	437 Días	100,00%
Variación en plazo		209 Días
Fecha Contractual de terminación		3/11/2024
Ejecución del Contrato	374	85,58%
Días remanentes del Contrato	63	14,42%
Acumulado a última acta pagada	$	126.990.069,80
Estimado ejecutado por llevar a acta		


3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.945.656.682,50	94,73%	$ 2.872.700.524,99	68,97%	-$ 1.072.956.157,51	-25,76%
Durante el Periodo	-$ 1.412.214.947,79	-33,91%	$ 80.669.058,07	1,94%	$ 1.492.884.005,86	35,84%
Acumulado a la Fecha	**$ 2.533.441.734,71**	**60,83%**	**$ 2.953.369.583,06**	**70,91%**	**$ 419.927.848,35**	**10,08%**

Semaforo ### Desviación en días 44,1 Días



Observaciones al desempeño del proyecto

ACTIVIDAD No. 1

El contratista de obra remitió los diseños arquitectónicos y estructurales los cuales fueron aprobados por la Interventoría y los mismos cuentan con VoBo del munisiterio desde el día 14 de noviembre del 2023.

ACTIVIDAD No. 2


Durante esta semana, el contratista de obra No realiza diagnósticos en ninguno de los cuatro barrios priorizados. A la fecha se han visitado un total de 634 viviendas, se han diagnosticado 459 viviendas efectivas de las cuales se han aprobado 458 diagnosticos y se han presentado 68 renuncias. De igual manera del total de viviendas visitadas se han identificado 107 como no efectivas. Cabe señalar que a la fecha ya se ha culminado y se ha efectuado cierre a la etapa de inclusión.


ACTIVIDAD No. 3

A corte del presente informe, se cuenta con 414 viviendas iniciadas las cuales están localizadas en Barrio Nuevo, en el Barrio La Real, el Barrio La Unión y el Barrio El Rosario en las manzanas 1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,7, 8,9 y 10 en las cuales se han realizado actividades significativas correspondientes a fundición de vigas de cimentación, construcción de muros en mampostería estructural, pañetado, enchape de pisos y paredes en cerámica, instalación de combos sanitarios, construcción de lavaderos y lavaplatos, Excavación . Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 414 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 121 viviendas en ejecución, 293 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoria y al beneficiario 279 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución con porcentajes estimados de avance es de 70,91% (Ejecutado Estimado de acuerdo al resumen anexo al presente informe), con respecto al 60,83% que se tiene programado, es decir, presenta un avance del 10,08% respecto a viviendas programadas y terminadas (Con porcentaje estimado). Cabe señalar que si bien el contratista presenta en las 414 viviendas en ejecución un porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 414 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 279 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoria. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo (Plan de Contingencia) y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoria el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 273 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con 6 viviendas en avance.

NOTA ACLARATORIA: El seguimiento a la ejecución de las obras se realiza a partir del ultimo plan de trabajo avalado por la interventoría (30 de agosto de 2024). Es importante señalar y aclarar que la diferencia o reducción de intervenciones entre la semana No. 47 y 48 obedece al reajuste y reprogramación realizada por el contratista, de acuerdo al plan de trabajo elaborado con la prorroga de contrato de obra.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

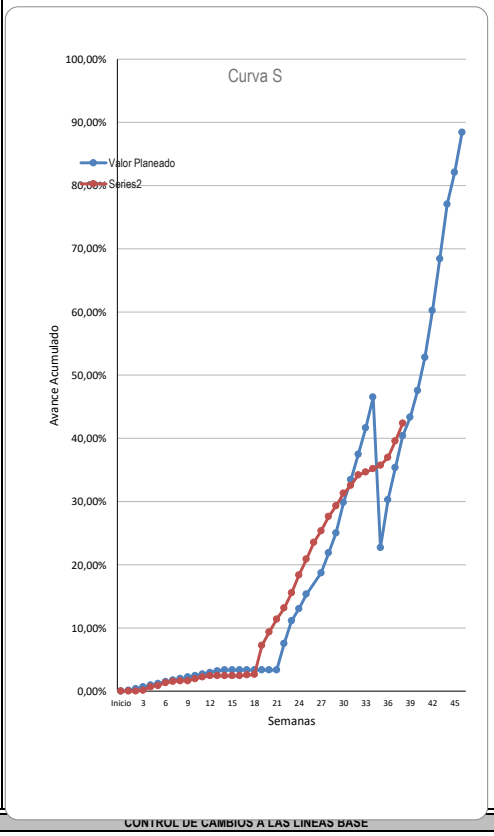

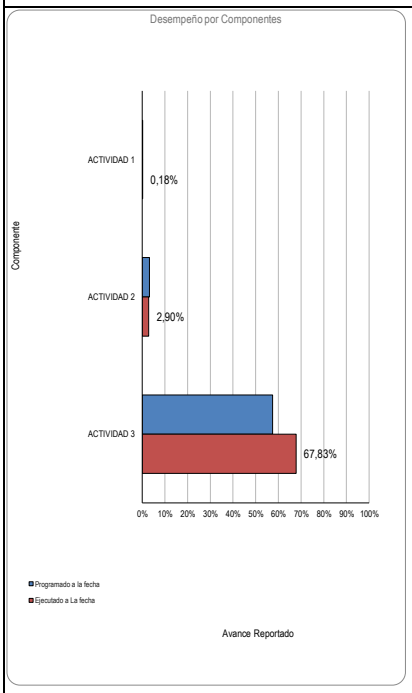


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

Se otorga una prórroga al contratista de obra por un termino de 2 meses y 3 días, teniendo como nueva fecha de terminación el 03 de noviembre de 2024. De acuerdo a lo anterior, la interventoría procede a realizar seguimiento al contrato de obra de acuerdo al plan de trabajo vigente avalado el cual contempla actividades constructivas desde el 01 de septiembre de 2024 y hasta el 03 de noviembre de 2024; lo anterior de acuerdo al cronograma de obra y entregables avalado por parte de la Interventoría.
De igual manera, se otorga prórroga a esta interventoría por un termino de 2 meses y 3 días, teniendo como nueva fecha de terminación el 03 de noviembre de 2024.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	94,73%	68,97%	-25,76%	###
Durante el Periodo	-33,91%	1,94%	35,84%	
Acumulado a la Fecha	**60,83%**	**70,91%**	**10,08%**	

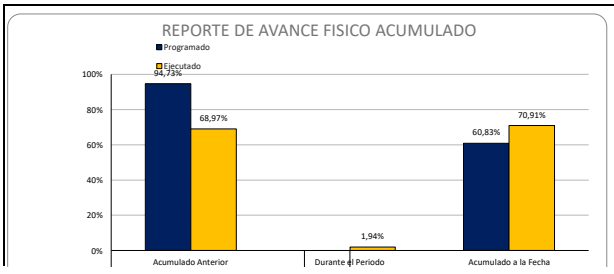


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 4.164.944.717,87	$ 4.164.944.717,87	$ -	$ 805.225.665,88	$ 291.821.830,75	$ 513.403.835,13

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
4	$ 2.169.446.489,05	52,09%	3	$ 1.364.220.823,17	32,75%	30/8/2024	$ 333.355.646,94








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 396.843.968,13	$ 496.054.960,16	$ 99.210.992,03	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
5	$ 276.633.316,11	55,77%	5	$ 276.633.316,11	55,77%	30/8/2024	$ 37.038.770,36









OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra continuó desarrollando la actividad numero 3 con procesos de excavación manual, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de lavaderos, instalación lavaplatos, acabados y pintura, hasta la fecha del presente informe se cuenta con 293 viviendas terminadas, de las cuales 279 han sido entregadas a la interventoría y a los beneficiarios. Cabe señalar que a la fecha el contratista de obra adelanta 414 intervenciones de 459 que se tienen programadas en el plan de trabajo, así mismo, se tiene un porcentaje aproximado ejecutado de viviendas terminadas y en ejecución de 70,91%, y un 60,83% programado, es decir, presenta un avance del 10,08% respecto a viviendas programada, terminadas y/o recibidas a satisfacción con porcentaje estimado de intervención de cada vivienda (Segun cuadro anexo al presente informe). Es importante resaltar que si bien el contratista de obra cuenta en 293 viviendas terminadas, se cuenta con 279 viviendas recibidas a satisfacción, por tal motivo se presenta un avance del 2,20% referente a la cantidad de intervenciones programadas como viviendas recibidas a satisfacción las cuales corresponden a 273 viviendas.

Durante la semana, NO se realiza comité de seguimiento de acuerdo a la solicitud efectuada por la Supervisión toda vez que se adelantaban actividades al interior de la Entidad para efectuar la prorroga a los contratos de obra e interventoría.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Durante la presente semana de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

Lunes, 26 de Agosto de 2024
Durante la jornada el contratista continuó con las actividades de obra, entrega de materiales a los códigos en ejecución, por otro lado, el contratista realiza subsanaciones de códigos ya finalizados para entrega a la interventoría de forma exitosa. Cabe resaltar que se realizaron actividades de mamposteria, fundición de vigas y excavaciones.

Martes, 27 de Agosto de 2024
Durante la jornada el contratista de obra continúa con las actividades de obra, entrega de materiales a los códigos en ejecución. Se realizan actividades de excavaciones, fundición de vigas, instalación de tuberías de redes sanitarias e hidráulicas. Por otro lado, durante la jornada el contratista de obra anua esfuerzos en la interventoría para la entrega de códigos ya finalizado para dar cumplimiento al plan de contingencia.

Miércoles, 28 de Agosto de 2024
Durante la jornada el contratista de obra continuó con las actividades de obra, entrega de materiales a los códigos en ejecución. de igual manera, se continuaron todas las actividades de fundición, excavaciones, instalación de redes hidrosanitarias. Por otro lado, se realizaron acciones para entregas de códigos ya finalizados, sin embargo, durante la jornada no hubo suministro de agua en el municipio de rio iró.

Jueves, 29 de Agosto de 2024
Durante la jornada el contratista continúa con las actividades de obra, entrega de materiales a los códigos en ejecución, por otro lado, se realizaron entregas de códigos ya finalizados a la interventoría, cabe resaltar que durante la jornada no hubo energía eléctrica lo que generó atrasos administrativos y de obra.

Viernes, 30 de Agosto de 2024
Durante la jornada se continuaron con las actividades de obra, entrega de materiales a códigos en ejecución, se deja constancia que durante la jornada no se contó con el servicio del fluido eléctrico en el municipio, esto hace que se dificulte la realización de las actividades de obra y por ende se presente atraso en el desarrollo de esta.

Sábado, 31 de Agosto de 2024
Durante la jornada se presentaron actividades de obra y entregas de materiales a códigos en ejecución, por otro lado, se continúa con las actividades administrativas como entrega de carpetas finales.
Se deja constancia desde esta interventoría que solo se recibe y se entrega a satisfacción 1 sola vivienda terminada.

Domingo, 01 de Septiembre de 2024
Durante la jornada se continuó con las actividades de obra en el barrio el rosario como excavaciones, fundición de viga, instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias, de igual manera, se realizó subsanaciones de códigos que se encuentran relacionados para ser entregados a la interventoría.

NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, entregar los materiales a las intervenciones de forma oportuna y organizada.
NOTA 2: Se le solicita al contratista de obra, entregar la dotación de los elementos de protección personal al personal de mano de obra no calificados nuevos.
NOTA 3: Se le recomienda la contratista de obra aumentar el personal de mano de obra no calificada, con el fin de cumplir con el plan de trabajo avalado por esta interventoría.

Durante el periodo la interventoría remite los siguientes comunicados al Contratista de obra y/o ENTerritorio y/o Municipio de Rio Iró y/o Empresa de Servicios Publicos:

CAEE-RI-2024-408 Recomendacion Prorroga de la Orden de trabajo 2230223
CAEE-RI-2024-409 Solicitud Prórroga y adición a la Orden de Servicio 2230219
CAEE-RI-2024-410 ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-252
CAEE-RI-2024-411 ENTREGA INFORME SEMANAL SOCIAL # 46


Se tiene previsto que para la semana siguiente el contratista y/o interventoría realice las siguientes actividades:

1. Contratista de obra continue elaborando diagnosticos de inclusion.
2. El contratista de obra siga desarrollando la Actividad No.3, consintente en la realización de aperturas, replanteos y ejecución de obra. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo y cronograma de entregables avalado por la interventoría.
3. Entrega de intervenciones a la interventoría y al beneficiario.
4. Realización de comité de seguiemito virtual
5. Capacitación sobre Riesgos mecanicos.
6. Capacitación sobre Como ahorrar respetando el medio ambiente.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	1
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

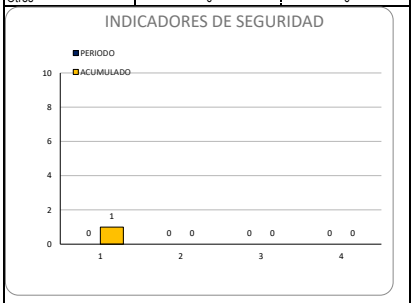

Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	246,25	5	251,25	63,4%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	145	0	145	36,6%
	Total	**391,25**	**5**	**396,25**	**100,00%**



OBSERVACIONES:
1. Durante el periodo no se presentan lluvias en la zona, ocasionando una perdida de tiempo de 5 horas.
2. Durante el periodo no se presentan, accidentes, incidentes o enfermedades que hayan ocasionado perdida de tiempos y/o cese de actividades.
3. Durante el periodo la interventoría realiza revisión de documentación entregada por el Contratista de obra, sin embargo la interventoría efectua una serie de observaciones y requerimientos los cuales se pusieron en conocimiento del contratista a traves de comunicados.
4. se realizó acompañamiento al área técnica en actividades de campos como: recorrido de porcentajes, recorrido de observaciones.
5. se realizó recorrido punto a punto de intervencion por el PGIO de interventoria e inspector sst del contratista sobre validacion de personal en campo.
6. Recorrido de validacion de personal en obra
7. Capacitación sobre Buenas prácticas ambientales.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant.	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A	26/8/2024	Barrio nuevo, la real, la union y el Rosario	N/A	El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 6 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda en donde se evidencio que están contentos con la intervención realizada en su casa	Obra e Interventoría	N/A
N/A	27/8//2024	En los cuatro barrios priorizados	N/A	El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 3 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda. Asimismo, en horas de la tarde se realizó una capacitación sectorizada en educación sanitaria con los beneficiarios de los barrios la Real, la unión y el Rosario, la reunión se realizó en las instalaciones de la casa del adulto mayor, se contó con la participación activa de los beneficiarios de asistentes y dos miembros de la veeduría del proyecto.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	28/8/2024	En los cuatro barrios priorizados	N/A	El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 6 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda en donde se evidencio que están contentos con la intervención realizada en su casa	Obra e Interventoría	N/A
N/A	29/8/2024	En los cuatro barrios priorizados	N/A	El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 6 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda en donde se evidencio que están contentos con la intervención realizada en su casa. Se logró capacitar a tres beneficiarios en temas de educación sanitaria e instalación y socialización de acrílicos	Obra e Interventoría	N/A
N/A	30//08/2024	En los cuatro barrios priorizados	N/A	El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 6 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda en donde se evidencio que están contentos con la intervención realizada en su casa. Se logró capacitar a una beneficiaria en temas de educación sanitaria e instalación y socialización de acrílicos. También se participó en la capacitación al personal de mano de obra no califica en donde se les realizaron recomendaciones para la correcta ejecución de las viviendas, el respeto a los beneficiarios y el trabajo en equipo con el área social y técnica de obra e interventoria.	Obra e Interventoría	N/A
N/A	31/8/2024	En los cuatro barrios priorizados	N/A	El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizo validación de viviendas que estaban programas para entregar a satisfacción a la interventoria, con el fin de poder realizar la entrega a los beneficiarios	Obra e Interventoría	N/A
N/A	1/9/2024	Barrio nuevo	N/A	Se realizan actividades administrativas	Interventoría	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
Quejas	habitante del barrio la union	28/8/2024	Pago de incapcidad	Contratista de obra

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Se ha evidenciado problemas con el fulido electrico y el flujo de agua con el fin de realizar las pruebas necesarias, y poder validar la funcionalidad de las obras ejecutadas. Adicionalmente se presenta problemas de flujo electrico y de internet y conexion de redes moviles	Se ha efectuado acercamientos con la Empresa prestadora de servicios publicos con el fin de que se garantice el flujo suficiente para poder validar cada intervención, sin embargo ha sido compleja esta situacion pues a pesar de los acercamientos el flujo de agua en el Municipio es muy compleja. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA PROBLEMATICA ES REITERADA SEMANA A SEMANA DEBIDO A QUE ES UNA SITUACIÓN QUE OCURRE DE MANERA NORMAL Y SEGUIDA EN EL MUNICIPIO.	Se realiza validacion de flujo de agua toda la semana para poder adelantar actividades de validacion y recibo de obras. Esta situación se deja documentada en Bitacora.	Contratista de obra Interventoría Empresa Prestadora de Servicios	Bitácora	Se realiza constantemente
Tal y como se habia manifestado con anterioridad, a la fecha se sigue presentando problemática en la excavaciones que se vienen realizando en las conexiones intradomiciliarias, pues se ha evidenciado presencia de rocas en las excavaciones conllevando a requerir mayores tiempos en la ejucción de esta actividad.	El contratista ha señalado e informado a la interventoría sobre esta situación, la cual ya se habia presentado con anterioridad.	Se validará la necesidad de contemplar una actividad no prevista, toda vez que el contratista no cuenta con esta actividad de manera contractual. A la fecha está en proceso de validación por parte del contratista de obra y remision a la interventoría y en proceso de radicación a la Entidad contratante los items no previstos, esperando que sean radicados en la siguiente semana	Contratista de obra	N/A	5/8/2024

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





Fotografia 1.Capacitacion en educacion sanitaria casa a casa



Fotografia 2. Recomendaciones al personal de mano de obra no calificada



Fotografia 3. Capacitacion sectorizada en temas de educacion sanitaria



Fotografia 4. CH-RI-ER-M2-VE-107 - Realización de Pañete



Fotografia 5. CH-RI-ER-M4-VE-045 - Realización de Mampostería en Bloque Estructural



Fotografia 6. CH-RI-ER-M7-IN-VE-011 - Realización de Caja de Inspección de 40x40

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de

Cabe señalar que, si bien se cuenta con un total de 414 intervenciones, a corte del presente informe, el contratista cuenta con 121 viviendas en ejecución, 293 viviendas terminadas, las cuales se han entregado a la interventoría y al beneficiario 279 viviendas, por tal motivo el porcentaje de viviendas terminadas y en ejecución es 70,91% (Ejecutado), con respecto al 60,83% que se tiene programado, es decir, presenta un avance del 10,08% respecto a viviendas programada, terminadas y recibidas a satisfcación. Cabe señalar que si bien el contartista presenta un avance en las 414 viviendas en ejecución de acuerdo al porcentaje estimado y aproximado de avance de cada vivienda, es importante señalar que de estas 414 viviendas que se encuentran iniciadas y/o ejecución o terminación SOLO se cuenta con un total de 279 viviendas recibidas a satisfacción por parte del Beneficiario e interventoría. De acuerdo a lo anterior, se establece que de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de entregables aprobado por parte de esta interventoría el contratista a corte del presente informe debe contar con un total de 273 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción, por tal motivo se establece que el contratista cuenta con un avance de 6 viviendas recibidas a satisfacción.

A la fecha el contratista de obra presenta un avance del 10,08% de acuerdo al nuevo plan de trabajo avalado por la interventoría y según el avance estimado del total de viviendas iniciadas, terminadas, en ejecución y recibidas a satisfacción. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 60,83%, sin embargo, de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados, y la ejecución de obras el contratista contó con un 70,91% de ejecución; cabe señalar que, este porcentaje es calculado a partir del avance estimado y aproximado de cada vivienda iniciada y/o terminada y/o recibida a satisfacción. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se encuentra en un avance en la cantidad de viviendas terminadas y recibidas a satisfacción de 6 intervenciones, es decir de las 273 viviendas programadas para el periodo, unicamente se cuenta con 279 viviendas terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría y beneficiario.

Durante el periodo, se presentan 5 horas de lluvia que afectan la correcta ejecución de actividades de diagnóstico. ejecución de obras y validación. Durante el periodo no se cuenta con flujo de energia, ni red de telefonia movil, wifi y agua de manera constante para poder ejecutar actividades en obra y/o realizar las pruebas de presion o necesarias para recibir las intervenciones terminadas o adelantar actividades administrativas (casi siempre se cuenta con flujo de agua y energia en horas de la noche cuando ya no se adelantan obras).

Es importante señalar que la presente interventoría ha venido desarrollando sus actividades de acuerdo a sus obligaciones contractuales, así mismo ha venido efectuando el debido seguimiento y control sobre las obras que se vienen ejecutando en la zona y se ha reportado de manera oportuna las situaciones presentadas al momento de ejecutar las obras o de recibir las mismas.


Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	**Firma** Nombre: DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
Director de Interventoría	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,12%	$ 4.938.639,00	0,00%	$ -
2	0,39%	$ 16.243.284,40	0,00%	$ -
3	0,66%	$ 27.574.064,98	0,13%	$ 5.443.779,94
4	0,93%	$ 38.891.777,97	0,66%	$ 27.521.331,92
5	1,21%	$ 50.209.490,96	0,88%	$ 36.594.298,49
6	1,48%	$ 61.527.203,95	1,32%	$ 55.042.663,84
7	1,73%	$ 72.050.781,95	1,52%	$ 63.208.333,75
8	1,97%	$ 82.083.864,94	1,62%	$ 67.279.256,42
9	2,21%	$ 92.116.947,93	1,62%	$ 67.279.256,42
10	2,45%	$ 102.150.030,92	1,95%	$ 81.014.385,77
11	2,69%	$ 112.183.113,92	2,22%	$ 92.460.326,90
12	2,93%	$ 122.216.196,91	2,42%	$ 100.758.634,22
13	3,18%	$ 132.249.279,90	2,42%	$ 100.758.634,22
14	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
15	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
16	3,33%	$ 138.816.388,90	2,42%	$ 100.758.634,22
17	3,33%	$ 138.816.388,90	2,56%	$ 106.622.584,78
18	3,33%	$ 138.816.388,90	2,63%	$ 109.343.090,06
19	3,33%	$ 138.816.388,90	7,25%	$ 301.776.635,45
20	3,33%	$ 138.816.388,90	9,35%	$ 389.477.173,25
21	3,33%	$ 138.816.388,90	11,36%	$ 472.975.221,08
22	7,55%	$ 314.246.816,77	13,15%	$ 547.572.387,73
23	11,13%	$ 463.362.680,82	15,55%	$ 647.483.129,45
24	13,02%	$ 542.306.373,55	18,35%	$ 764.267.355,73
25	15,34%	$ 638.793.109,11	20,87%	$ 869.263.504,67
26	17,02%	$ 708.965.280,43	23,52%	$ 979.450.922,72
27	18,71%	$ 779.137.451,75	25,37%	$ 1.056.639.793,61
28	21,87%	$ 910.710.272,97	27,61%	$ 1.150.105.690,79
29	25,03%	$ 1.042.283.094,20	29,31%	$ 1.220.884.792,07
30	29,87%	$ 1.244.028.086,74	31,30%	$ 1.303.743.280,93
31	33,45%	$ 1.393.143.950,79	32,53%	$ 1.354.895.363,67
32	37,45%	$ 1.559.802.857,67	34,22%	$ 1.425.098.894,41
33	41,66%	$ 1.735.233.285,97	34,64%	$ 1.442.621.538,75
34	46,51%	$ 1.936.978.278,51	35,18%	$ 1.465.102.486,35
35	22,71%	$ 945.796.358,63	35,73%	$ 1.487.963.904,84
36	30,29%	$ 1.261.571.129,57	36,98%	$ 1.540.191.613,62
37	35,34%	$ 1.472.087.643,52	39,57%	$ 1.648.199.031,55
38	40,40%	$ 1.682.604.157,48	42,39%	$ 1.765.517.074,31
39	43,35%	$ 1.805.405.457,28	46,02%	$ 1.916.565.608,18
40	47,56%	$ 1.980.835.885,58	47,53%	$ 1.979.748.531,17
41	52,82%	$ 2.200.123.920,95	51,60%	$ 2.149.010.562,57
42	60,20%	$ 2.507.127.170,47	54,44%	$ 2.267.424.733,85
43	68,41%	$ 2.849.216.505,65	58,67%	$ 2.443.484.492,52
44	77,04%	$ 3.208.848.883,66	62,81%	$ 2.615.937.737,18
45	82,10%	$ 3.419.365.397,61	65,86%	$ 2.743.019.335,35
46	88,42%	$ 3.682.511.040,06	67,42%	$ 2.807.921.441,25
47	94,73%	$ 3.945.656.682,50	68,97%	$ 2.872.700.524,99
48	60,83%	$ 2.533.441.734,71	70,91%	$ 2.953.369.583,06
49	61,88%	$ 2.577.299.341,79		$ -
50	63,99%	$ 2.665.014.555,94		$ -
51	67,15%	$ 2.796.587.377,16		$ -
52	71,36%	$ 2.972.017.805,46		$ -
53	76,62%	$ 3.191.305.840,83		$ -
54	81,89%	$ 3.410.593.876,20		$ -
55	87,15%	$ 3.629.881.911,57		$ -
56	92,42%	$ 3.849.169.946,94		$ -
57	97,68%	$ 4.068.457.982,31		$ -
58	100,00%	$ 4.164.944.717,87		$ -
	100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**70,91%**	**$ 2.953.369.583,06**

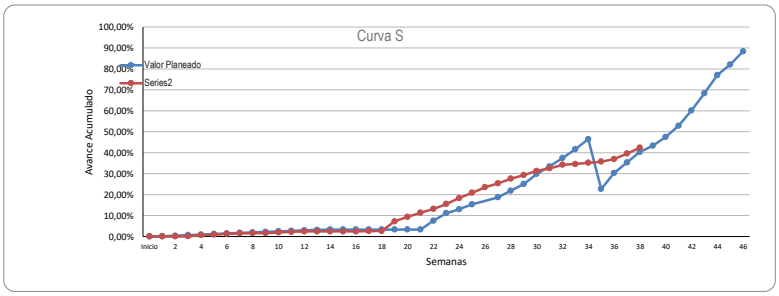

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACTIVIDAD 1	0,18%	$ 7.474.214,02	0,18%	$ 7.474.214,02	**0,18%**	$ 7.474.214,02
2	ACTIVIDAD 2	3,15%	$ 131.342.174,45	3,15%	$ 131.342.174,45	**2,90%**	$ 120.754.678,91
3	ACTIVIDAD 3	96,67%	$ 4.026.128.329,40	57,49%	$ 2.394.625.346,24	**67,83%**	$ 2.825.140.690,13
		100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**60,83%**	**$ 2.533.441.734,71**	**70,91%**	**$ 2.953.369.583,06**

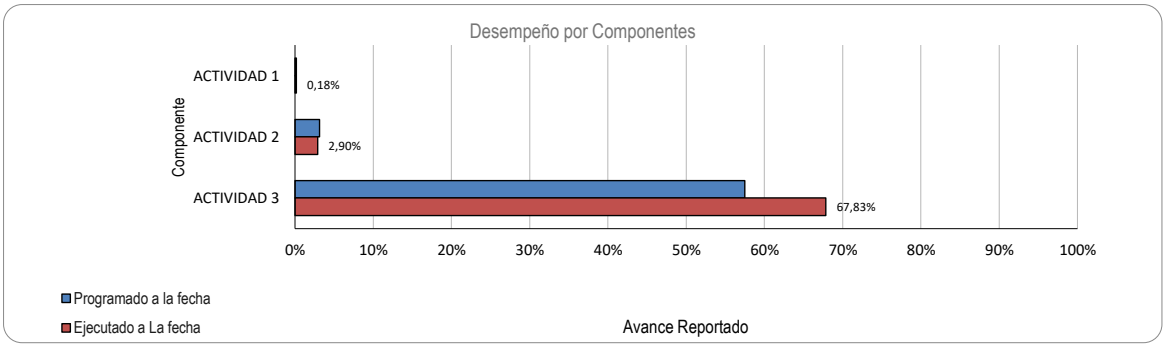

Fecha de Corte: 13/01/2025 -01/02/2025

PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS RIO IRO CHOCO

Priorización		MATRIZ BASE								INCLUSIONES								TOTALES (MATRIZ + INCLUSIONES):					EJECUCION DE OBRA (ACTIVIDAD No. 3)				
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusion	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldia	Viviendas No Avaladas por el ESP	Viviendas No Avaladas por Alcaldia	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	Viviendas Recibidas a Satisfacción por Interventoria y beneficiario	Viviendas Programadas actividad No.3 según plan de trabajo Vigente (DEBIDAMENTE TERMINADAS)	VIVIENDAS EN ATRASO POR FALTA DE TERMINACION DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO
Rio Iró Choco	Barrio Nuevo	198	459	170	17	168	11	1	90	73	76	3	0	56	17	67	3	274	226	34	235	14	221	190	31	189	273	-6
	La Real	99		39	8	36	12	1	33	19	25	6	0	22	10	19	2	93	61	18	55	14	47	45	2	40		
	La unión	78		48	14	48	16	0	35	27	30	3	0	26	9	26	0	113	74	23	74	16	68	57	11	50		
	El Rosario	123		79	23	77	21	0	26	25	25	1	0	19	9	17	3	154	88	32	94	24	78	1	77	0		
	TOTAL	458	459	336	62	329	60	2	184	144	157	13	0	123	45	129	8	634	459	107	458	68	414	293	121	279	273	-6

	CONTRACTUAL			PROGRAMADO			EJECUTADO		
	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
ACTIVIDAD 1	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%	1	$ 7.474.214,02	0,18%
ACTIVIDAD 2	459	$ 131.342.174,45	3,15%	459	$ 131.342.174,45	3,15%	422	$ 120.754.678,91	2,90%
ACTIVIDAD 3	459	$ 4.026.128.329,40	96,67%	273	$ 2.394.625.346,24	57,49%	414	$ 2.825.140.690,13	67,83%
		$ 4.164.944.717,87	100,00%		$ 2.533.441.734,71	60,83%		$ 2.953.369.583,06	70,91%

Fecha de Corte	30/01/2024 - 01/03/2024	PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS RIO IKO CHOCO																														
Priorización		MATRIZ BASE													INCLUSIONES							TOTAL EL (MATRIZ + INCLUSIONES)						EJECUCION DE OBRA (ACTAVIDAD No. 3)			
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusion	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP	Viviendas No Avaladas por Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	Viviendas Recibidas a Satisfacción por Interventoria y beneficiario	Viviendas Programadas actividad No.3 según plan de trabajo Vigente (DESBLOQUEADAS E TERMINADAS	VIVIENDAS EN ATRASO POR FALTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCION DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO
Rio Iró Chocó	Barrio Nuevo	156	459	170	17	588	11	1	90	73	76	3	0	66	17	67	3	274	226	34	235	14	221	190	31	159	1		
	La Raal	60		39	8	36	12	1	33	19	25	8	0	22	10	15	2	33	31	18	50	14	47	40	2	42	273	-6	
	La unión	78		48	14	48	16	0	35	27	30	3	0	26	9	26	0	113	74	23	74	16	68	57	11	50			
	El Rosario	123		79	23	77	21	0	26	25	26	1	0	13	9	17	1	154	98	32	94	24	78	1	77	0			
	TOTAL	459	459	336	62	329	60	2	184	144	157	13	0	123	45	129	6	634	459	107	458	68	414	293	121	279	273	-6	

No. De Intervención	CODIGO DE VIVIENDA	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	BARRIO	TIPO DE INTERVENCION (UNIDAD SANITARIA TIPO XX, ADECUACIÓN, ETC)	ESTADO DE INTERVENCION (INICIADA, TERMINADA Y/O RECIBIDA)	FECHA DE INICIO DE INTERVENCION EN SITIO*	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN	FECHA DE ENTREGA	VALOR TOTAL DIAGNÓSTICOS APROBADOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE INTERVENCION (%)	VALOR ECONOMICO POR DIAGNOSTICO ACTIVIDAD 3	VALOR DE EJECUCIÓN DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE INTERVENCION	OBSERVACIONES
										$ 3.899.743.885,90		$ 3.877.650.970,70	$ 2.825.140.690,13	
1	CH-RI-BN-M7-VE-024	ESTHER JULIA MOSQUERA PEREA	1128084710	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	30/3/2024	15/5/2024	$ 3.500.514,85	100%	$ 3.198.082,83	$ 3.198.082,83	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
2	CH-RI-BN-M1-VE-025	BETSA BELAYDA SANCHEZ BENITEZ	1030420680	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	31/1/2024	11/2/2024	13/3/2024	$ 10.673.701,54	100%	$ 9.692.456,66	$ 9.692.456,66	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
3	CH-RI-BN-M1-VE-026	MARTHA YANETH SANCHEZ MOSQUERA	1030420259	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	31/1/2024	11/2/2024	13/3/2024	$ 9.994.888,88	100%	$ 9.692.456,66	$ 9.692.456,66	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
4	CH-RI-BN-M1-VE-027	CRUZ ARMINDA MOSQUERA MOSQUERA	1133699093	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	27/1/2024	7/2/2024	13/3/2024	$ 10.684.289,91	100%	$ 10.381.857,89	$ 10.381.857,89	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
5	CH-RI-BN-M7-VE-028	JOSE ALEY URBANO MOSQUERA	11938290	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/2/2024	20/2/2024	11/3/2024	$ 10.016.429,91	100%	$ 9.713.997,89	$ 9.713.997,89	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
6	CH-RI-BN-M1-VE-029	MARIA MARLENIS MOSQUERA MOSQUERA	1030420257	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	27/1/2024	7/2/2024	9/3/2024	$ 9.492.581,00	100%	$ 9.190.148,78	$ 9.190.148,78	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
7	CH-RI-BN-M1-VE-030	JUAN CARLOS PEREA MOSQUERA	11995123	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	7/3/2024	18/3/2024	6/6/2024	$ 7.098.763,21	100%	$ 6.796.330,99	$ 6.796.330,99	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
8	CH-RI-BN-M7-VE-031	LADY LUZ MOSQUERA MOSQUERA	1076821036	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	9/2/2024	20/2/2024	11/3/2024	$ 10.356.209,00	100%	$ 10.053.776,78	$ 10.053.776,78	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
9	CH-RI-BN-M1-VE-032	JOSE EUECER MOSQUERA MOSQUERA	1030420877	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	27/1/2024	7/2/2024	13/3/2024	$ 11.476.203,39	100%	$ 9.644.044,80	$ 9.644.044,80	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
10	CH-RI-BN-M7-VE-033	JOSE ASUNCION PEREA MOSQUERA	1133699084	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/2/2024	20/2/2024	11/3/2024	$ 10.220.950,22	100%	$ 9.918.518,01	$ 9.918.518,01	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
11	CH-RI-BN-M1-VE-034	MARIA OBEIRA MOSQUERA MOSQUERA	1030420139	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	27/1/2024	7/2/2024	13/3/2024	$ 10.041.190,08	100%	$ 9.738.757,86	$ 9.738.757,86	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
12	CH-RI-BN-M1-VE-035	BERNABÉ MOSQUERA MOSQUERA	82384041	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	29/1/2024	9/2/2024	13/3/2024	$ 9.809.119,68	100%	$ 9.506.687,47	$ 9.506.687,47	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
13	CH-RI-BN-M7-VE-036	MARIA REGINA MOSQUERA MOSQUERA	35880120	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/2/2024	20/2/2024	12/3/2024	$ 8.806.317,06	100%	$ 8.503.884,84	$ 8.503.884,84	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
14	CH-RI-BN-M1-VE-037	PATROCINIO URBANO MOSQUERA	6236759	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	27/1/2024	7/2/2024	18/3/2024	$ 10.756.401,71	100%	$ 10.453.971,50	$ 10.453.971,50	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
15	CH-RI-BN-M7-VE-038	LUZ VELINA MOSUERA MOSQUERA	67020805	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	9/2/2024	20/2/2024	30/3/2024	$ 11.076.221,61	100%	$ 10.773.791,40	$ 10.773.791,40	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
16	CH-RI-BN-M1-VE-039	CRUZ ELENA MOSQUERA MOSQUERA	43255396	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	27/1/2024	7/2/2024	23/4/2024	$ 10.639.928,74	100%	$ 10.337.496,52	$ 10.337.496,52	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
17	CH-RI-BN-M1-VE-042	ANA RUSMILDA MOSQUERA PEREA	1030420448	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/3/2024	18/3/2024	4/6/2024	$ 5.998.521,05	100%	$ 5.696.088,84	$ 5.696.088,84	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
18	CH-RI-BN-M7-VE-043	CRUZ EVELA HURTADO MOSQUERA	66785777	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	30/3/2024	15/5/2024	$ 5.931.729,79	100%	$ 5.629.297,57	$ 5.629.297,57	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
19	CH-RI-BN-M7-VE-045	KENNEDY ANTONIO HURTADO MOSQUERA	11937638	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	3/4/2024	12/4/2024	26/4/2024	$ 5.800.379,31	100%	$ 5.497.947,09	$ 5.497.947,09	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
20	CH-RI-BN-M1-VE-046	EMELINO BENITEZ MOSQUERA	11937788	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/3/2024	18/3/2024	6/6/2024	$ 6.601.378,28	100%	$ 6.298.946,06	$ 6.298.946,06	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
21	CH-RI-BN-M1-VE-047	NURI YESENIA MOSQUERA MOSQUERA	35696572	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	29/1/2024	9/2/2024	1/3/2024	$ 9.161.931,82	100%	$ 8.859.499,60	$ 8.859.499,60	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
22	CH-RI-BN-M7-VE-048	RAMONA URINA MOSQUERA MOSQUERA	1193114661	BARRIO NUEVO	TIPO 2	RECIBIDA	12/2/2024	23/2/2024	30/3/2024	$ 9.995.868,73	100%	$ 9.419.980,32	$ 9.419.980,32	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
23	CH-RI-BN-M7-VE-049	LILIANA PATRICIA BENITEZ HURTADO	1037580604	BARRIO NUEVO	TIPO 2	RECIBIDA	9/2/2024	20/2/2024	20/3/2024	$ 8.220.216,63	100%	$ 7.917.784,41	$ 7.917.784,41	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
24	CH-RI-BN-M7-VE-050	MARIA LUCIA MOSQUERA MOSQUERA	1030420200	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	9/2/2024	20/2/2024	30/3/2024	$ 10.274.596,55	100%	$ 9.972.164,33	$ 9.972.164,33	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
25	CH-RI-BN-M7-VE-051	LUZ MARIELA PEREA MOSQUERA	35820769	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	9/2/2024	20/2/2024	11/3/2024	$ 8.649.916,69	100%	$ 8.347.484,48	$ 8.347.484,48	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
26	CH-RI-BN-M7-VE-052	JOSE MARIA MOSQUERA MOSQUERA	4827921	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/2/2024	20/2/2024	6/6/2024	$ 9.722.412,54	100%	$ 9.419.980,32	$ 9.419.980,32	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
27	CH-RI-BN-M7-VE-058	RUT BOLIVIA PEREA MOSQUERA	52501318	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	4/4/2024	13/4/2024	6/6/2024	$ 6.598.682,53	100%	$ 6.296.250,31	$ 6.296.250,31	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
28	CH-RI-BN-M7-VE-059	JUAN AGUSTIN PEREA SANCHEZ	18607080	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	19/2/2024	1/3/2024	15/5/2024	$ 11.070.543,69	100%	$ 10.768.111,47	$ 10.768.111,47	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
29	CH-RI-BN-M7-VE-060	MILTON ANTONIO HURTADO MOSQUERA	1128084317	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	3/4/2024	12/4/2024	21/6/2024	$ 7.509.840,94	100%	$ 7.207.408,72	$ 7.207.408,72	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
30	CH-RI-BN-M8-VE-061	EVERNY MOSQUERA PEREA	1030421571	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	26/2/2024	10/3/2024	24/4/2024	$ 10.160.812,48	100%	$ 9.858.380,26	$ 9.858.380,26	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
31	CH-RI-BN-M8-VE-062	JOSE ALBEIRO PEREA MOSQUERA	1030421573	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	19/2/2024	1/3/2024	11/3/2024	$ 9.140.052,68	100%	$ 8.837.620,46	$ 8.837.620,46	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
32	CH-RI-BN-M8-VE-063	MARIA ENIL BENITEZ MOSQUERA	1030420392	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	30/3/2024	4/6/2024	$ 5.862.094,02	100%	$ 5.559.661,80	$ 5.559.661,80	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
33	CH-RI-BN-M8-VE-064	MARIA FIDELINA HURTADO MOSQUERA	1030420394	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	19/2/2024	1/3/2024	1/4/2024	$ 10.633.338,58	100%	$ 10.330.906,36	$ 10.330.906,36	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
34	CH-RI-BN-M8-VE-065	MARIA EVANGELINA MOSQUERA PEREA	1030420691	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/2/2024	2/3/2024	30/3/2024	$ 10.874.129,67	100%	$ 10.571.697,45	$ 10.571.697,45	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
35	CH-RI-BN-M8-VE-066	CRUZ ADIELA SANCHEZ HURTADO	1030420276	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	19/2/2024	1/3/2024	20/3/2024	$ 11.327.148,18	100%	$ 11.024.715,96	$ 11.024.715,96	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
36	CH-RI-BN-M8-VE-067	MARICEL HURTADO MOSQUERA	1030420393	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	19/2/2024	1/3/2024	20/3/2024	$ 10.863.743,48	100%	$ 10.561.311,27	$ 10.561.311,27	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
37	CH-RI-BN-M8-VE-069	LUZ BELIDIA MINA MOSQUERA	35851728	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	24/2/2024	6/3/2024	5/6/2024	$ 9.030.226,14	100%	$ 8.727.793,92	$ 8.727.793,92	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
38	CH-RI-BN-M8-VE-070	MARIA I DELSA MOSQUERA	1133699087	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	19/2/2024	1/3/2024	20/3/2024	$ 10.946.431,27	100%	$ 10.643.999,05	$ 10.643.999,05	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
39	CH-RI-BN-M8-VE-071	FATIMA YERIDY MOSQUERA MOSQUERA	1076386863	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	21/3/2024	30/3/2024	14/6/2024	$ 3.623.723,89	100%	$ 3.321.291,68	$ 3.321.291,68	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
40	CH-RI-BN-M8-VE-072	DANINSON MOSQUERA MOSQUERA	1133644311	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/3/2024	18/3/2024	6/6/2024	$ 8.460.995,82	100%	$ 8.158.563,60	$ 8.158.563,60	RECIBIDA A SATISFACCIÓN

41	CH-RI-BN-MB-VE-073	NERBA LUZ VALENCIA CORDOBA	35820023	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	19/2/2024	1/3/2024	11/3/2024	$ 9.825.865,42	100%	$ 9.523.433,21	$ 9.523.433,21	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
42	CH-RI-BN-MB-VE-075	RITA ELENA PEREA MOQUERA	1133699015	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	19/2/2024	1/3/2024	22/5/2024	$ 10.903.767,61	100%	$ 10.601.335,39	$ 10.601.335,39	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
43	CH-RI-BN-MB-VE-077	AURELINA PEREA QUINTO	1094885261	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	4/4/2024	13/4/2024	26/4/2024	$ 1.465.044,39	100%	$ 1.162.612,18	$ 1.162.612,18	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
44	CH-RI-BN-MB-VE-079	MARY SORELYS HURTADO MOSQUERA	1128084801	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	19/2/2024	1/3/2024	6/6/2024	$ 11.749.974,12	100%	$ 11.447.541,91	$ 11.447.541,91	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
45	CH-RI-BN-M10-VE-084	YOLEIMA MOSQUERA MOSQUERA	1128084402	BARRIO NUEVO	TIPO 2	RECIBIDA	9/3/2024	20/3/2024	6/6/2024	$ 9.219.381,54	100%	$ 8.916.949,32	$ 8.916.949,32	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
46	CH-RI-BN-M10-VE-086	MARIA DELFA PEREA PEREA	1030421723	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	4/6/2024	$ 9.938.350,68	100%	$ 9.635.918,46	$ 9.635.918,46	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
47	CH-RI-BN-M10-VE-090	GLADYS SANCHEZ PEREA	1193601399	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	6/3/2024	17/3/2024	4/6/2024	$ 9.680.833,95	100%	$ 9.378.401,74	$ 9.378.401,74	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
48	CH-RI-BN-M10-VE-091	NORA ALMINDA MOSQUERA BENITEZ	1030422049	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	23/4/2024	$ 9.794.766,09	100%	$ 9.492.333,87	$ 9.492.333,87	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
49	CH-RI-BN-M10-VE-094	YSMARIS PEREA BENITEZ	71686667	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	30/4/2024	$ 8.998.478,43	100%	$ 8.696.046,22	$ 8.696.046,22	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
50	CH-RI-BN-M10-VE-095	BILA MARIA MOSQUERA MOSQUERA	35852367	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024		$ 9.917.530,01	100%	$ 9.615.097,79	$ 9.615.097,79	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
51	CH-RI-BN-M6-VE-100	YAMILA MOSQUERA MOSQUERA	1030420667	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	23/4/2024	$ 10.806.097,55	100%	$ 10.503.605,33	$ 10.503.605,33	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
52	CH-RI-BN-M10-VE-101	GLORIA HOLARTE LOZANO MOSQUERA	26320222	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	17/4/2024	$ 10.290.188,10	100%	$ 9.987.755,88	$ 9.987.755,88	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
53	CH-RI-BN-M10-VE-102	EVER ANTONIO PEREA MOSQUERA	11937447	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	30/3/2024	22/6/2024	$ 4.679.035,68	100%	$ 4.376.603,46	$ 4.376.603,46	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
54	CH-RI-BN-M10-VE-103	JOSE CLEISON MOSQUERA PEREA	82361608	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/4/2024	17/4/2024	22/6/2024	$ 4.306.097,56	100%	$ 4.003.665,34	$ 4.003.665,34	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
55	CH-RI-BN-M10-VE-104	FRANCISCO NEREO HURTADO PEREA	11793256	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	16/5/2024	$ 10.630.120,22	100%	$ 10.327.688,00	$ 10.327.688,00	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
56	CH-RI-BN-MB-VE-105	FERNANDO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA	10190057	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	16/5/2024	$ 9.224.140,89	100%	$ 8.921.708,67	$ 8.921.708,67	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
57	CH-RI-BN-MB-VE-107	CARMEN LUZ ASPIRILLA MOSQUERA	1193054593	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	22/5/2024	$ 9.660.722,84	100%	$ 9.358.290,62	$ 9.358.290,62	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
58	CH-RI-BN-M6-VE-109	DEIBY MOSQUERA MOSQUERA	1010081461	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	27/4/2024	$ 4.804.715,68	100%	$ 4.502.283,46	$ 4.502.283,46	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
59	CH-RI-BN-M1-VE-114	CLARA INES MOSQUERA MOSQUERA	1030423092	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/3/2024	18/3/2024	30/4/2024	$ 6.293.290,26	100%	$ 5.990.858,05	$ 5.990.858,05	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
60	CH-RI-BN-M6-VE-115	EVANGELINA PEREA MOSQUERA	35851909	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	17/4/2024	$ 1.086.972,32	100%	$ 784.540,10	$ 784.540,10	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
61	CH-RI-BN-M6-VE-116	ELIZA BLAIR MOSQUERA MOSQUERA	35880097	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	6/6/2024	$ 9.414.451,08	100%	$ 9.112.018,87	$ 9.112.018,87	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
62	CH-RI-BN-M1-VE-117	PEDRO TIBERINO MOSQUERA PEREA	82362961	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	27/1/2024	7/2/2024	1/3/2024	$ 8.981.285,85	100%	$ 8.678.853,63	$ 8.678.853,63	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
63	CH-RI-BN-M6-VE-118	JOSE ISAIAS QUINTO BENTEZ	9728682	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	18/4/2024	$ 1.308.065,36	100%	$ 1.005.633,14	$ 1.005.633,14	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
64	CH-RI-BN-M1-VE-119	YECENIA BENITEZ PEREA	1030420082	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	31/1/2024	11/2/2024	1/3/2024	$ 9.843.578,37	100%	$ 9.541.146,15	$ 9.541.146,15	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
65	CH-RI-BN-M6-VE-120	CRUZ TERESA PEREA MOSQUERA	1147951439	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	24/4/2024	$ 11.285.141,72	100%	$ 10.982.709,50	$ 10.982.709,50	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
66	CH-RI-BN-M6-VE-121	JUAN CARLOS HURTADO PEREA	79792103	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	14/3/2024	25/3/2024	26/4/2024	$ 4.264.925,52	100%	$ 3.962.493,31	$ 3.962.493,31	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
67	CH-RI-BN-M1-VE-122	CLARIBEL COPETE MOSQUERA	26320315	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	22/4/2024	3/5/2024		$ 2.654.507,54	100%	$ 2.352.075,33	$ 2.352.075,33	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
68	CH-RI-BN-M1-VE-123	CARLOS GREGORIO MOSQUERA MOSQUERA	6281102	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	29/5/2024	6/6/2024	8/7/2024	$ 4.810.334,84	100%	$ 4.507.902,63	$ 4.507.902,63	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
69	CH-RI-BN-M1-VE-126	MARIA ROSALINA PEREA DE MOSQUERA	26396262	BARRIO NUEVO	TIPO 2	RECIBIDA	26/1/2024	6/2/2024	1/3/2024	$ 8.018.201,97	100%	$ 7.715.769,76	$ 7.715.769,76	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
70	CH-RI-BN-M1-VE-128	PAULO EMILIO PEREA MOSQUERA	4827986	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	29/5/2024	6/6/2024	9/7/2024	$ 6.159.143,07	100%	$ 5.856.710,86	$ 5.856.710,86	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
71	CH-RI-BN-M1-VE-129	JOSE WILMAN MOSQUERA RODRIGUEZ	1030420408	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	26/1/2024	6/2/2024	1/3/2024	$ 10.179.241,57	100%	$ 9.559.882,96	$ 9.559.882,96	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
72	CH-RI-BN-M1-VE-130	MARIA ELENA MOSQUERA PEREA	35852636	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	7/3/2024	18/3/2024	22/4/2024	$ 2.675.492,74	100%	$ 2.373.060,52	$ 2.373.060,52	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
73	CH-RI-BN-M1-VE-131	CLARA NELLY MOSQUERA RAMIREZ	1133699001	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	26/1/2024	6/2/2024	1/3/2024	$ 9.649.802,02	100%	$ 9.347.369,80	$ 9.347.369,80	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
74	CH-RI-BN-M1-VE-132	DOMINGA MOSQUERA MOSQUERA	1128084752	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	26/1/2024	6/2/2024	1/3/2024	$ 10.400.269,09	100%	$ 10.097.836,88	$ 10.097.836,88	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
75	CH-RI-BN-M1-VE-133	JESUS ANTONIO MOSQUERA BENITEZ	11709111	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	26/1/2024	6/2/2024	1/3/2024	$ 9.643.170,32	100%	$ 9.340.738,11	$ 9.340.738,11	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
76	CH-RI-BN-M1-VE-134	YALARY PEREA PEREA	1030422217	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	8/3/2024	19/3/2024	24/5/2024	$ 1.998.163,22	100%	$ 1.695.731,00	$ 1.695.731,00	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
77	CH-RI-BN-M1-VE-135	WILMAN PEREA MOSQUERA	11937363	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/4/2024	18/4/2024	28/6/2024	$ 10.728.763,68	100%	$ 10.426.331,46	$ 10.426.331,46	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
78	CH-RI-BN-M1-VE-137	JOSE GRAVIELINO MOSQUERA PEREA	82384017	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	26/1/2024	6/2/2024	1/3/2024	$ 10.019.045,28	100%	$ 9.716.613,06	$ 9.716.613,06	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
79	CH-RI-BN-M1-VE-138	MARIA CRECENCIA MOSQUERA MOSQUERA	1133699073	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	4/2/2024	15/2/2024	1/3/2024	$ 11.231.878,29	100%	$ 10.929.446,08	$ 10.929.446,08	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
80	CH-RI-BN-M1-VE-139	JOSE ELIECER MOSQUERA MOSQUERA	1030420796	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	9/4/2024	18/4/2024	26/6/2024	$ 6.162.546,51	100%	$ 5.860.114,30	$ 5.860.114,30	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
81	CH-RI-BN-M1-VE-140	MARIA FILOMENA MOSQUERA BENITEZ	1030421426	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	26/1/2024	6/2/2024	1/3/2024	$ 9.598.790,55	100%	$ 9.296.367,34	$ 9.296.367,34	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
82	CH-RI-BN-M2-VE-141	LUIS ANULO MOSQUERA MOSQUERA	4827870	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	30/1/2024	10/2/2024	1/3/2024	$ 10.028.434,38	100%	$ 9.726.002,16	$ 9.726.002,16	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
83	CH-RI-BN-M2-VE-142	MARIA NELLIS MOSQUERA HURTADO	35893604	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECHAZO					0%	$ -	$ -	RECHAZO
84	CH-RI-BN-MS-VE-143	MARIA ANA DIGNA PEREA RAMIREZ	26320022	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	6/3/2024	17/2/2024	1/3/2024	$ 9.520.434,08	100%	$ 9.218.001,87	$ 9.218.001,87	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
85	CH-RI-BN-MS-VE-144	CENORBINA MOSQUERA MOSQUERA	26320095	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/2/2024	19/2/2024	1/3/2024	$ 10.256.472,50	100%	$ 9.954.040,29	$ 9.954.040,29	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
86	CH-RI-BN-MS-VE-145	ARLEY MOSQUERA MOSQUERA	11938384	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	21/5/2024	$ 3.074.369,19	100%	$ 2.771.936,97	$ 2.771.936,97	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
87	CH-RI-BN-MS-VE-146	YUSLEISA PEREA PEREA	1030421578	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	3/4/2024	12/4/2024		$ 7.240.990,60	100%	$ 6.938.558,39	$ 6.938.558,39	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
88	CH-RI-BN-MS-VE-147	DIOSELIAS HURTADO MOSQUERA	26320318	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	3/4/2024	12/4/2024	21/6/2024	$ 6.428.464,18	100%	$ 6.126.031,96	$ 6.126.031,96	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
89	CH-RI-BN-MS-VE-148	MARIA ELISA SANCHEZ SANCHEZ	35851481	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/2/2024	16/2/2024	11/3/2024	$ 10.406.707,98	100%	$ 10.104.275,77	$ 10.104.275,77	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
90	CH-RI-BN-MS-VE-150	MARIA RAFAELINA MOSQUERA PEREA	1133699000	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	6/2/2024	17/2/2024	5/3/2024	$ 10.207.964,31	100%	$ 9.905.532,10	$ 9.905.532,10	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
91	CH-RI-BN-MS-VE-151	MARTHA AMPARO MOSQUERA SANCHEZ	1030421621	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	6/2/2024	17/2/2024	5/3/2024	$ 10.646.141,74	100%	$ 10.343.709,52	$ 10.343.709,52	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
92	CH-RI-BN-MS-VE-152	DARLEY YAIANNI MOSQUERA MOSQUERA	1128089236	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	21/6/2024	$ 4.993.574,73	100%	$ 4.691.142,51	$ 4.691.142,51	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
93	CH-RI-BN-MS-VE-153	CARMEN LORENA HURTADO BENITEZ	1133664314	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	6/2/2024	17/2/2024	1/3/2024	$ 9.466.333,04	100%	$ 9.163.900,83	$ 9.163.900,83	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
94	CH-RI-BN-MS-VE-154	LUZ MOSQUERA HURTADO	1030420396	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	8/7/2024	$ 3.709.090,01	100%	$ 3.408.657,79	$ 3.408.657,79	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
95	CH-RI-BN-MS-VE-155	LUZ YANI VER MOSQUERA HURTADO	1030420396	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	15/7/2024	$ 3.415.270,48	100%	$ 3.112.838,27	$ 3.112.838,27	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
96	CH-RI-BN-MS-VE-157	CARLOS MOSUERA MOSQUERA	11995124	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/3/2024	18/3/2024	10/7/2024	$ 10.225.737,14	100%	$ 9.923.304,92	$ 9.923.304,92	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
97	CH-RI-BN-MS-VE-158	CRUZ ENILDO MOSQUERA SANCHEZ	1193063862	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	1/6/2024	$ 4.443.868,14	100%	$ 4.141.435,92	$ 4.141.435,92	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
98	CH-RI-BN-M3-VE-160	JHON FREDY PEREA MOSQUERA	1128084009	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024	15/5/2024	$ 8.663.945,45	100%	$ 8.361.513,24	$ 8.361.513,24	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
99	CH-RI-BN-M2-VE-161	JORGE ELIECER PEREA MOSQUERA	1076182253	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/3/2024	18/3/2024	15/5/2024	$ 10.955.166,17	100%	$ 10.652.733,95	$ 10.652.733,95	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
100	CH-RI-BN-M3-VE-163	JOSE HURTADO PEREA	19472911	BARRIO NUEVO	TIPO 2	RECIBIDA	3/4/2024	12/4/2024	11/6/2024	$ 7.350.577,39	100%	$ 7.048.145,18	$ 7.048.145,18	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
101	CH-RI-BN-M3-VE-166	MARIA LETA MOSQUERA IBARGUEN	1030420558	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	21/6/2024	$ 10.961.648,40	100%	$ 10.659.216,19	$ 10.659.216,19	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
102	CH-RI-BN-M3-VE-168	MANUEL CELESTINO MOSQUERA MOSQUERA	82360816	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	13/7/2024	$ 10.548.043,05	100%	$ 10.245.610,84	$ 10.245.610,84	RECIBIDA A SATISFACCIÓN

103	CH-RI-BN-M4-VE-169	CARMEN NELIA MOSQUERA PEREA	1113699010	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	24/6/2024	$ 7.064.899,65	100%	$ 6.762.467,43	$ 6.762.467,43	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
104	CH-RI-BN-M3-VE-171	LUZ NATALIA PEREA PEREA	26329011	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	3/4/2024	12/4/2024	31/5/2024	$ 1.196.345,61	100%	$ 893.913,40	$ 893.913,40	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
105	CH-RI-BN-M4-VE-173	ADRIANNY MOSQUERA MOSQUERA	1030420308	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	8/6/2024	$ 10.737.689,79	100%	$ 10.435.257,58	$ 10.435.257,58	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
106	CH-RI-BN-M3-VE-174	BENICIO MOSQUERA PEREA	4827934	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	11/7/2024	$ 10.221.148,50	100%	$ 9.918.716,28	$ 9.918.716,28	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
107	CH-RI-BN-M3-VE-175	LUZ MERY MOSQUERA PEREA	1076381269	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024	21/5/2024	$ 9.764.362,93	100%	$ 9.461.930,71	$ 9.461.930,71	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
108	CH-RI-BN-M3-VE-176	JOSE FLORIANO MOSQUERA PEREA	11937831	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024	21/5/2024	$ 11.168.040,63	100%	$ 10.865.608,42	$ 10.865.608,42	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
109	CH-RI-BN-M3-VE-177	HECTOR RAMIREZ MOSQUERA	82363532	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024	21/6/2024	$ 9.508.750,12	100%	$ 9.206.317,90	$ 9.206.317,90	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
110	CH-RI-BN-M4-VE-179	CARLOS ALBERTO MOSQUERA SANCHEZ	1030421413	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	21/5/2024	$ 8.344.761,83	100%	$ 8.042.329,62	$ 8.042.329,62	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
111	CH-RI-BN-M4-VE-182	ENELICIA MOSQUERA MOSQUERA	1030420079	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	3/4/2024	12/4/2024	8/6/2024	$ 10.882.345,28	100%	$ 10.579.913,06	$ 10.579.913,06	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
112	CH-RI-BN-M4-VE-183	MARIA ESTERCILIA PEREA BENITEZ	26320273	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024		$ 10.118.033,55	100%	$ 9.206.317,90	$ 9.206.317,90	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
113	CH-RI-BN-M4-VE-184	NUMIN ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA	4861807	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	21/6/2024	$ 9.900.163,44	100%	$ 9.597.731,23	$ 9.597.731,23	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
114	CH-RI-BN-M4-VE-185	SANDRA MILENA PEREA MOSQUERA	1128088697	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024	21/5/2024	$ 9.496.562,51	100%	$ 9.194.130,29	$ 9.194.130,29	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
115	CH-RI-BN-M4-VE-186	MARIA GLORIA MOSQUERA MOSQUERA	1030420685	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024	21/5/2024	$ 10.033.886,72	100%	$ 9.731.454,50	$ 9.731.454,50	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
116	CH-RI-BN-M4-VE-188	MARIA MOSQUERA PEREA	1076384154	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	3/4/2024	12/4/2024	8/6/2024	$ 8.968.327,96	100%	$ 8.606.614,12	$ 8.606.614,12	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
117	CH-RI-BN-M4-VE-189	MARIA MOSQUERA SANCHEZ	1113699037	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024	11/6/2024	$ 10.274.576,32	100%	$ 9.972.144,11	$ 9.972.144,11	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
118	CH-RI-BN-MB-VE-195	JOSE MOSQUERA BENITEZ	1076331467	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	30/3/2024	27/4/2024	$ 5.497.471,77	100%	$ 5.195.039,56	$ 5.195.039,56	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
119	CH-RI-BN-M7-VE-055	OLGELINA PEREA MOSQUERA	1113699057	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	9/2/2024	20/2/2024	5/3/2024	$ 9.497.163,63	100%	$ 9.194.731,42	$ 9.194.731,42	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
120	CH-RI-BN-MB-VE-074	ELIZABETH PEREA MOSQUERA	1076820020	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	30/3/2024	15/7/2024	$ 4.792.135,74	90%	$ 4.489.703,52	$ 4.040.733,17	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
121	CH-RI-BN-MB-VE-078	JESUS DOMINGO PEREA MOSQUERA	1030422003	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/2/2024	2/3/2024	14/6/2024	$ 11.035.847,49	100%	$ 10.733.415,28	$ 10.733.415,28	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
122	CH-RI-BN-M1G-VE-087	LUIS GUSTAVO HURTADO	7245317	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	4/6/2024	$ 11.766.855,31	100%	$ 11.464.423,09	$ 11.464.423,09	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
123	CH-RI-BN-M9-VE-106	FELISA MOSQUERA DE ASPRILLA	26320217	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/3/2024	16/3/2024	28/6/2024	$ 10.750.804,62	100%	$ 10.448.372,40	$ 10.448.372,40	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
124	CH-RI-BN-M6-VE-110	DAVID MOSQUERA SANCHEZ	1054991771	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	8/4/2024	17/4/2024	6/6/2024	$ 1.573.458,11	100%	$ 1.101.560,54	$ 1.101.560,54	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
125	CH-RI-BN-M6-VE-113	CARLOS AUGUSTO MOSQUERA MOSQUERA	82362939	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	3/4/2024	12/4/2024	4/6/2024	$ 4.615.504,76	100%	$ 4.313.072,55	$ 4.313.072,55	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
126	CH-RI-BN-M6-VE-124	MARIA TERECILIA MOSQUERA SANCHEZ	1128084288	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	26/1/2024	6/2/2024	1/3/2024	$ 9.733.555,48	100%	$ 9.431.123,26	$ 9.431.123,26	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
127	CH-RI-BN-M1-VE-127	JUAN HERMINIO MOSQUERA MOSQUERA	4827735	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	6/2/2024	17/2/2024	1/3/2024	$ 10.900.681,11	100%	$ 10.598.248,90	$ 10.598.248,90	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
128	CH-RI-BN-M1-VE-136	DELFARIL MOSQUERA SACHEZ	1010080485	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/4/2024	18/4/2024	15/7/2024	$ 10.718.759,92	100%	$ 10.416.327,70	$ 10.416.327,70	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
129	CH-RI-BN-M5-VE-149	GLORIA BENITEZ MOSQUERA	1113699089	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/2/2024	16/2/2024	13/3/2024	$ 10.235.515,34	100%	$ 9.933.083,12	$ 9.933.083,12	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
130	CH-RI-BN-M3-VE-162	MARIA BRIGIDA MOSQUERA MOSQUERA	31831986	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024	4/6/2024	$ 10.603.964,58	100%	$ 10.301.532,36	$ 10.301.532,36	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
131	CH-RI-BN-M3-VE-170	FELIX ANTONIO MOSQUERA HURTADO	7247210	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	21/3/2024	1/4/2024	5/6/2024	$ 11.827.698,64	100%	$ 11.525.266,43	$ 11.525.266,43	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
132	CH-RI-BN-M3-VE-172	ROSA AULIA MOSUERA HURTADO	1030420687	BARRIO NUEVO	TIPO 2	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024	5/6/2024	$ 7.537.199,35	100%	$ 7.234.767,14	$ 7.234.767,14	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
133	CH-RI-BN-M4-VE-187	MARIA LUCY PEREA MOSQUERA	1030420422	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	3/4/2024	12/4/2024	8/7/2024	$ 11.833.091,57	100%	$ 11.530.659,35	$ 11.530.659,35	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
134	CH-RI-BN-M4-VE-190	MARIA LUCERO BENITEZ PEREA	53089556	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	22/3/2024	31/3/2024	6/6/2024	$ 10.109.280,87	100%	$ 9.806.857,65	$ 9.806.857,65	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
135	CH-RI-BN-M4-VE-191	LUIS ALVEIRO MOSQUERA MOSQUERA	82384038	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	11/4/2024	20/4/2024	8/6/2024	$ 4.481.011,94	100%	$ 4.178.579,72	$ 4.178.579,72	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
136	CH-RI-LR-M6-VE-001	MARIANA MOSQUERA MOSQUERA	26320295	BARRIO REAL	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	9/7/2024	$ 10.307.785,03	100%	$ 11.803.874,26	$ 11.803.874,26	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
137	CH-RI-LR-M6-VE-002	MARIA EDNA MOSQUERA MOSQUERA	26320213	BARRIO REAL	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	12/7/2024	$ 5.429.593,63	100%	$ 5.127.161,42	$ 5.127.161,42	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
138	CH-RI-LR-M6-VE-004	MARIA DANIELA PEREA HURTADO	1030420219	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	12/7/2024	$ 10.915.787,67	100%	$ 10.613.355,46	$ 10.613.355,46	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
139	CH-RI-LR-M6-VE-005	LUIS EDUARDO MOSQUERA MOSQUERA	11937068	BARRIO REAL	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	17/8/2024	$ 10.736.884,91	100%	$ 10.434.452,69	$ 10.434.452,69	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
140	CH-RI-LR-M6-VE-006	MANUEL MARIA MOSQUERA MOSQUERA	82384034	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	9/7/2024	$ 11.259.961,85	100%	$ 8.353.687,30	$ 8.353.687,30	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
141	CH-RI-LR-M6-VE-008	EFREN PEREA MOSQUERA	4827952	BARRIO REAL	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS									
142	CH-RI-LR-M6-VE-009	VANNESA PEREA PEREA	1030421470	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	15/7/2024	$ 10.657.020,82	100%	$ 10.354.588,60	$ 10.354.588,60	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
143	CH-RI-LR-M6-VE-010	EMILIANA SANCHEZ MOSQUERA	1030420704	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	18/6/2024	27/6/2024	12/7/2024	$ 9.996.389,52	100%	$ 9.693.957,30	$ 9.693.957,30	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
144	CH-RI-LR-M1-VE-019	ARIS PATRICIA SANCHEZ MOSQUERA	1076821426	BARRIO REAL	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	TERMINADA	7/6/2024	19/6/2024		$ 12.553.679,71	95%	$ 12.251.247,49	$ 11.638.685,12	EN EJECUCION, APERTURADO EL 07/06/2024
145	CH-RI-LR-M1-VE-020	MARTA LUZ MOSQUERA MOSQUERA	1030420807	BARRIO REAL	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/6/2024	16/6/2024	15/7/2024	$ 11.977.174,89	100%	$ 11.674.742,67	$ 11.674.742,67	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
146	CH-RI-LR-M1-VE-022	MARIA NIVIR BENITEZ MOSQUERA	1030420291	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	18/6/2024	27/6/2024	15/7/2024	$ 11.695.459,21	100%	$ 11.393.027,00	$ 11.393.027,00	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
147	CH-RI-LR-M1-VE-023	JOSE LEMER NATIGAY DUAVE	1030420789	BARRIO REAL	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	TERMINADA	7/6/2024	19/6/2024		$ 12.623.606,28	95%	$ 12.321.174,06	$ 11.705.115,36	EN EJECUCION, APERTURADO EL 07/06/2024
148	CH-RI-LR-M3-VE-025	ELISEO NATIGAY	11775032	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	15/7/2024	$ 10.258.247,23	100%	$ 9.955.815,02	$ 9.955.815,02	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
149	CH-RI-LR-M3-VE-027	JESUS ERIL MOSQUERA MOSQUERA	11708978	BARRIO REAL	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	15/7/2024	$ 5.262.987,97	100%	$ 4.960.555,75	$ 4.960.555,75	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
150	CH-RI-LR-M2-VE-028	YENCY PAOLA MOSQUERA SANCHEZ	1128084418	BARRIO REAL	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	15/7/2024	$ 9.601.846,04	100%	$ 9.299.413,83	$ 9.299.413,83	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
151	CH-RI-LR-M2-VE-029	SERBANDO ANTONIO PEREA MOSQUERA	71708449	BARRIO REAL	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	5/4/2024	$ 9.264.009,75	100%	$ 8.961.577,53	$ 8.961.577,53	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
152	CH-RI-LR-M2-VE-030	MARIA FATIMA PEREA PEREA	26391599	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO	RECHAZO								rechazo
153	CH-RI-LR-M5-VE-031	CRUZ MARIA PEREA PEREA	26320198	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	15/7/2024	$ 8.127.839,10	100%	$ 7.825.406,89	$ 7.825.406,89	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
154	CH-RI-LR-M5-VE-032	JESUS DONAR MOSQUERA PEREA	11801727	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	15/7/2024	$ 12.394.791,54	100%	$ 12.092.359,33	$ 12.092.359,33	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
155	CH-RI-LR-M7-VE-034	JHON EDUAR MOSQUERA AGUALIMPIA	11937842	BARRIO REAL	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	10/7/2024	$ 3.198.063,69	100%	$ 2.895.631,48	$ 2.895.631,48	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
156	CH-RI-LR-M7-VE-035	JOSE MARCIAL MOSQUERA SANCHEZ	6243846	BARRIO REAL	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	18/6/2024	27/6/2024	15/7/2024	$ 8.154.998,40	100%	$ 7.852.568,19	$ 7.852.568,19	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
157	CH-RI-LR-M8-VE-036	MARIA FELISA MOSQUERA PEREA	20332892	BARRIO REAL	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	11/7/2024	$ 4.499.035,61	100%	$ 4.196.603,40	$ 4.196.603,40	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
158	CH-RI-LR-M7-VE-037	BEATRIZ HELENA PEREA MOSQUERA	1030421991	BARRIO REAL	TIPO 2	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	12/7/2024	$ 7.232.440,29	100%	$ 12.092.359,33	$ 12.092.359,33	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
159	CH-RI-LR-M8-VE-038	CRUZ ELENA MOSQUERA AGUALIMPIA	26318887	BARRIO REAL	TIPO 2	RECIBIDA	18/6/2024	27/6/2024	15/7/2024	$ 9.493.504,52	100%	$ 9.191.072,30	$ 9.191.072,30	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
160	CH-RI-LR-M7-VE-039	JORGE ELIECER MOSQUERA MOSQUERA	11936943	BARRIO REAL	TIPO 2	TERMINADA	12/6/2024	21/6/2024		$ 7.207.833,24	95%	$ 12.092.359,33	$ 11.487.741,36	EN EJECUCION, APERTURADO EL 12/06/2024
161	CH-RI-LR-M7-VE-041	ANGELA PATRICIA AGUALIMPIA COPETE	1076818650	BARRIO REAL	ADECUACION Y LAVAPLATOS					$ 909.409,59			$ -	
162	CH-RI-LR-M7-VE-042	NEIFA MARIA PEREA MOSQUERA	31840057	BARRIO REAL	TIPO 2 Y LAVAPLATOS					$ 8.766.673,76			$ -	

163	CH-RI-LR-MB-VE-044	MARIA TELECILA MOSQUERA RAMIREZ	35850211	BARRIO REAL	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECHAZO									
164	CH-RI-LR-MB-VE-045	ESMAYLIN MOSQUERA PEREA	1076817562	BARRIO REAL	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	11/7/2024	$ 4.790.423,53	100%	$ 4.487.991,31	$ 4.487.991,31		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
165	CH-RI-LR-MB-VE-046	JOSE ELEAZAR MOSQUERA RODRIGUEZ	71334973	BARRIO REAL	TIPO 2	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	9/7/2024	$ 8.104.451,62	100%	$ 7.802.019,41	$ 7.802.019,41		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
166	CH-RI-LR-MB-VE-047	SULLY MOSQUERA MOSQUERA	35850996	BARRIO REAL	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	18/6/2024	27/6/2024	12/7/2024	$ 10.749.751,32	100%	$ 10.447.319,11	$ 10.447.319,11		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
167	CH-RI-LR-MB-VE-048	MARIA YAMILE MOSQUERA HURTADO	35851595	BARRIO REAL	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	12/7/2024	$ 1.534.369,84	100%	$ 1.231.937,62	$ 1.231.937,62		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
168	CH-RI-LR-MB-VE-050	JOSE GABINO MOSQUERA AGUAJIMPIA	1128084319	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	15/7/2024	$ 10.290.102,78	100%	$ 9.987.670,57	$ 9.987.670,57		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
169	CH-RI-LR-MB-VE-051	LUIS MARDONIO MOSQUERA PEREA	4827686	BARRIO REAL	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECHAZO									
170	CH-RI-LR-MB-VE-052	JOSE ELEAZAR MOSQUERA RODRIGUEZ	71334973	BARRIO REAL	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	12/7/2024	$ 6.372.218,85	100%	$ 6.069.786,63	$ 6.069.786,63		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
171	CH-RI-LR-M9-VE-054	MARIA LEUDINA MOSQUERA SANCHEZ	1030420596	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	3/8/2024	$ 10.573.376,43	100%	$ 10.270.946,22	$ 10.270.946,22		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
172	CH-RI-LR-M9-VE-055	JOSE ANGELINO RODRIGUEZ MOSQUERA	11937712	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	3/8/2024	$ 10.858.998,62	100%	$ 10.556.566,40	$ 10.556.566,40		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
173	CH-RI-LR-M9-VE-056	ANA TERECILA SANCHEZ MOSQUERA	35880078	BARRIO REAL	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	12/7/2024	$ 8.935.705,95	100%	$ 8.633.273,74	$ 8.633.273,74		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
174	CH-RI-LR-M9-VE-057	SUL MARIA MOSQUERA MOSQUERA	1030420744	BARRIO REAL	ADECUACION	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	12/7/2024	$ 1.989.569,54	100%	$ 1.687.137,32	$ 1.687.137,32		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
175	CH-RI-LR-M9-VE-059	MARTHA LUCIA GOMEZ MOSQUERA	1030420806	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	15/7/2024	$ 10.830.203,33	100%	$ 10.527.771,11	$ 10.527.771,11		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
176	CH-RI-LU-M2-VE-006	MARIA DUERLEY BENITEZ PEREA	1030421637	BARRIO LA UNIÓN	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	5/7/2024	16/7/2024		$ 6.198.783,98	100%	$ 5.896.351,77	$ 5.896.351,77		APERTURADA EL DÍA 05/07/2024
177	CH-RI-LU-M2-VE-007	SARLIN ANDREA SANCHEZ PEREA	35852624	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	RECHAZO									
178	CH-RI-LU-M2-VE-012	WILDER AURIO MOSQUERA MOSQUERA	1000535063	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	5/7/2024	16/7/2024		$ 7.951.149,10	80%	$ 7.648.716,98	$ 6.118.973,51		APERTURADA EL DÍA 05/07/2024
179	CH-RI-LU-M2-VE-013	CRUZ YALIDA MOSQUERA MOSQUERA	43054797	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	9/7/2024	18/7/2024		$ 9.755.223,69	80%	$ 9.452.791,47	$ 7.562.233,18		APERTURADA EL DÍA 09/07/2024
180	CH-RI-LU-M2-VE-015	CRUZ YALIDA SANCHEZ PEREA	26320306	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/7/2024	16/7/2024	17/8/2024	$ 10.368.666,87	100%	$ 10.066.234,66	$ 10.066.234,66		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
181	CH-RI-LU-M2-VE-016	CRUZ DALY MOSQUERA MOSQUERA	43015776	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	3/8/2024	$ 9.137.863,35	100%	$ 8.835.431,13	$ 8.835.431,13		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
182	CH-RI-LU-M3-VE-017	ELBA PEREA MOSQUERA	26320156	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2	Iniciada	9/7/2024	18/7/2024		$ 8.919.026,76	50%	$ 8.616.596,55	$ 4.308.298,27		APERTURADA EL DÍA 09/07/2024
183	CH-RI-LU-M3-VE-023	ESNOBILIO MOSQUERA MOSQUERA	82360971	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	15/8/2024	$ 9.340.237,10	100%	$ 9.037.805,09	$ 9.037.805,09		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
184	CH-RI-LU-M3-VE-025	MARCELO CLAUDIO MOSQUERA MOSQUERA	71721078	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/7/2024	16/7/2024	16/8/2024	$ 10.305.477,85	100%	$ 10.003.045,63	$ 10.003.045,63		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
185	CH-RI-LU-M4-VE-028	LUIS MARINO MOSQUERA MOSQUERA	1030422020	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	TERMINADA	2/7/2024	11/7/2024		$ 8.273.778,45	95%	$ 7.971.346,24	$ 7.572.778,92		APERTURADA EL DÍA 02/07/2024
186	CH-RI-LU-M3-VE-032	MARIA SUNILDA MOSQUERA MOSQUERA	26320143	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	2/7/2024	11/7/2024		$ 11.446.367,19	90%	$ 11.143.954,97	$ 10.029.559,48	APERTURADA EL DÍA 2/07/2024	
187	CH-RI-LU-M3-VE-034	MARIA YOLANDA PEREA MOSQUERA	1030420738	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	TERMINADA	2/7/2024	11/7/2024		$ 8.016.753,99	95%	$ 7.714.321,77	$ 7.328.605,68	APERTURADA EL DÍA 02/07/2024	
188	CH-RI-LU-M3-VE-035	JOSE ORTELIO MOSQUERA MOSQUERA	11938163	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	TERMINADA	2/7/2024	11/7/2024		$ 10.821.921,24	95%	$ 10.519.489,02	$ 9.993.514,57	APERTURADA EL DÍA 02/07/2024	
189	CH-RI-LU-M4-VE-037	DEVINSON ANDRES HURTADO PEREA	1073628513	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	1/8/2024	$ 8.762.545,68	100%	$ 8.460.113,46	$ 8.460.113,46		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
190	CH-RI-LU-M3-VE-038	BERENICE QUINTO PEREA	35587697	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/7/2024	18/7/2024	16/8/2024	$ 9.652.279,64	100%	$ 9.349.847,42	$ 9.349.847,42		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
191	CH-RI-LU-M3-VE-040	CARLOS PEREA MOSQUERA	8826788	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	2/7/2024	11/7/2024	16/8/2024	$ 10.068.489,47	100%	$ 9.766.057,25	$ 9.766.057,25		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
192	CH-RI-LU-M4-VE-041	LUZ AYDA LEMUS MOSQUERA	1128084287	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	2/7/2024	2/7/2024	2/8/2024	$ 8.979.644,91	100%	$ 8.677.212,70	$ 8.677.212,70		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
193	CH-RI-LU-M4-VE-043	NUBIA MOSQUERA MOSQUERA	26320234	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	5/7/2024	16/7/2024	3/8/2024	$ 10.666.041,67	100%	$ 10.363.609,45	$ 10.363.609,45		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
194	CH-RI-LU-M6-VE-046	ARISTIZABAL PEREA HURTADO	11995109	BARRIO LA UNIÓN	ADECUACION	RECIBIDA	19/6/2024	26/6/2024	3/8/2024	$ 8.451.255,92	100%	$ 8.148.823,71	$ 8.148.823,71		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
195	CH-RI-LU-M6-VE-047	MARTHA ELENIS MOSQUERA MOSQUERA	1030420760	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	19/6/2024	28/6/2024	3/8/2024	$ 9.465.262,49	100%	$ 9.162.830,27	$ 9.162.830,27		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
196	CH-RI-LU-M6-VE-048	MARIA AURA PEREA PEREA	1030420616	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	19/6/2024	26/6/2024	1/8/2024	$ 9.438.441,16	100%	$ 9.136.008,94	$ 9.136.008,94		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
197	CH-RI-LU-M6-VE-049	MARIA DAMARIS PEREA PEREA	35880101	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS										
198	CH-RI-LU-M3-VE-050	CARMEN LEONILDA MOSQUERA MOSQUERA	1133699020	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	26/7/2024	$ 7.508.674,41	100%	$ 7.204.242,20	$ 7.204.242,20		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
199	CH-RI-LU-M6-VE-051	JESUS EMIRO MOSQUERA MOSQUERA	11937944	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	19/6/2024	26/6/2024	26/7/2024	$ 10.445.415,10	100%	$ 10.142.982,88	$ 10.142.982,88		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
200	CH-RI-LU-M6-VE-052	JOSE DE JESUS PEREA MOSQUERA	4860607	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	21/6/2024	3/7/2024	26/7/2024	$ 9.583.752,47	100%	$ 9.281.320,25	$ 9.281.320,25		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
201	CH-RI-LU-M6-VE-053	VIRGELINA MOSQUERA MOSQUERA	26320067	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	3/8/2024	$ 10.691.355,17	100%	$ 9.281.320,25	$ 9.281.320,25		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
202	CH-RI-LU-M6-VE-054	FERMINA MOSQUERA SACHEZ	26320116	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	16/8/2024	$ 10.355.596,86	100%	$ 10.053.164,64	$ 10.053.164,64		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
203	CH-RI-LU-M6-VE-056	ENSA BOLIVAR PEREA HURTADO	43103496	BARRIO LA UNIÓN	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	26/7/2024	$ 6.927.259,94	100%	$ 6.624.827,72	$ 6.624.827,72		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
204	CH-RI-LU-M6-VE-057	FABIO IGNACIO MOSQUERA PEREA	7246464	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	15/7/2024	$ 6.620.872,75	100%	$ 6.318.440,54	$ 6.318.440,54		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
205	CH-RI-LU-M7-VE-059	ANA JULIA BENITEZ RAMIREZ	1030420282	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1	Iniciada	20/6/2024	2/7/2024		$ 9.665.924,59	65%	$ 9.362.492,36	$ 6.085.270,05	APERTURADA EL 20/06/2024	
206	CH-RI-LU-M7-VE-060	JESUS MARIA SACHEZ MOSQUERA	6235524	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	3/8/2024	$ 12.128.394,25	100%	$ 11.825.962,03	$ 11.825.962,03		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
207	CH-RI-LU-M7-VE-061	JOSE PASTOR SANCHEZ MOSQUERA	82363765	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	2/8/2024	$ 12.117.050,09	100%	$ 11.814.617,87	$ 11.814.617,87		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
208	CH-RI-LU-M7-VE-062	SULLY PEREA MOSQUERA	41963168	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	26/7/2024	$ 9.507.180,12	100%	$ 9.204.747,90	$ 9.204.747,90		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
209	CH-RI-LU-M7-VE-063	JHON ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA	12021777	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	2/8/2024	$ 13.138.950,28	100%	$ 12.836.518,06	$ 12.836.518,06		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
210	CH-RI-LU-M7-VE-064	LENES CATERINE HURTADO BENTEZ	1030421418	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	26/7/2024	$ 8.954.302,63	100%	$ 8.651.870,42	$ 8.651.870,42		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
211	CH-RI-LU-M7-VE-066	ARMANDO HURTADO MOSQUERA	1590262	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	3/8/2024	$ 8.622.327,81	100%	$ 8.319.895,59	$ 8.319.895,59		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
212	CH-RI-LU-M7-VE-067	BERTO MORENO HURTADO MOSQUERA	11936936	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/7/2024	18/7/2024	24/8/2024	$ 9.261.908,87	100%	$ 8.959.476,66	$ 8.959.476,66		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
213	CH-RI-LU-M5-VE-069	MARILENA MOSQUERA MOSQUERA	1030420476	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2	RECIBIDA	20/7/2024	2/7/2024	16/8/2024	$ 9.248.045,18	100%	$ 8.945.612,96	$ 8.945.612,96		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
214	CH-RI-LU-M5-VE-070	ANA DOLORES MOSQUERA MOSQUERA	1030420764	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	26/7/2024	$ 10.644.208,32	100%	$ 10.341.776,10	$ 10.341.776,10		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
215	CH-RI-LU-M5-VE-072	ANDREINA PEREA PEREA	1030420697	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	3/8/2024	$ 11.008.423,53	100%	$ 10.705.989,31	$ 10.705.989,31		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
216	CH-RI-LU-M5-VE-074	MARIA NORMA MOSQUERA MOSQUERA	26320047	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2					$ 8.394.138,65			$ -		
217	CH-RI-LU-M3-VE-075	ANA PATRICIA HURTADO MOSQUERA	32142279	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2	Iniciada	8/7/2024	17/7/2024		$ 7.591.458,03	80%	$ 7.289.025,82	$ 5.831.220,65		APERTURADA EL DÍA 08/07/2024
218	CH-RI-LU-M3-VE-076	MARIA NALIS MOSQUERA HURTADO	43520261	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	TERMINADA	8/7/2024	17/7/2024		$ 10.352.951,24	95%	$ 10.050.519,02	$ 9.547.993,07		APERTURADA EL DÍA 08/07/2024
219	CH-RI-LU-M3-VE-077	MARIA DORALINA MOSQUERA HURTADO	1030420002	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	17/8/2024	$ 10.592.658,93	100%	$ 10.290.226,71	$ 10.290.226,71		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
220	CH-RI-BN-M1-IN-VE-001	ELISABETH MOSQUERA MOSQUERA	1030420955	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	13/8/2024	24/8/2024	24/5/2024	$ 12.750.420,83	100%	$ 12.447.988,61	$ 12.447.988,61		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
221	CH-RI-BN-M1-IN-VE-002	MARIA DOMITILA HURTADO MOSQUERA	1030420376	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS					$ 909.409,59					
222	CH-RI-BN-M7-IN-VE-004	YUNILDA MURILLO PEREA	1128844695	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	$ 45.457,60	$ 9.941.710,60	100%	$ 9.639.278,38	$ 9.639.278,38		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
223	CH-RI-BN-M1-IN-VE-005	DELINSON SANCHEZ BENTEZ	1128084774	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	15/05/2024	$ 10.817.947,39	100%	$ 10.515.515,18	$ 10.515.515,18		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
224	CH-RI-BN-M5-IN-VE-006	YERLYINSON MOSQUERA MOSQUERA	1076819874	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	4/4/2024	13/4/2024	$ 45.464,00	$ 4.099.518,70	100%	$ 3.797.086,48	$ 3.797.086,48		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
225	CH-RI-BN-M2-IN-VE-007	MARY LUZ MOSQUERA MOSQUERA	35680081	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	8/06/2024	$ 9.561.285,20	100%	$ 9.258.852,98	$ 9.258.852,98		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
226	CH-RI-BN-M5-IN-VE-010	ANA FARLEY PEREA MOSQUERA	1128084548	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/3/2024	23/3/2024	6/06/2024	$ 8.516.068,33	100%	$ 8.213.636,11	$ 8.213.636,11		RECIBIDA A SATISFACCIÓN

227	CH-RI-BN-M3-IN-VE-011	SULAY NALLIVE MOSQUERA PEREA	1030421599	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	10/4/2024	19/4/2024	21/06/2024	$ 9.356.572,51	100%	$ 9.054.140,29	$ 9.054.140,29	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
228	CH-RI-BN-M7-IN-VE-012	HENRRY ANTONIO MOSQUERA BENITEZ	71332164	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	6/06/2024	$ 10.597.761,49	100%	$ 10.295.329,28	$ 10.295.329,28	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
229	CH-RI-BN-M9-IN-VE-013	CARMEN LUZ ASPRILLA MOSQUERA	1193054593	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	18/03/2024	$ 2.644.194,62	100%	$ 2.341.762,40	$ 2.341.762,40	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
230	CH-RI-BN-M10-IN-VE-015	LUZ MARY MOSQUERA MOSQUERA	1030420258	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	$ 45.471,00	$ 10.474.949,46	100%	$ 7.755.216,32	$ 7.755.216,32	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
231	CH-RI-BN-M6-IN-VE-016	JAIRO ANTONIO MOSQUERA BENITEZ	1030420795	BARRIO NUEVO	ADECUACION					$ 6.361.912,20			$ -	
232	CH-RI-BN-M6-IN-VE-017	CARMEN LUCIA MOSQUERA MOSQUERA	1113699028	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	$ 45.465,00	$ 8.482.761,46	100%	$ 8.180.329,24	$ 8.180.329,24	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
233	CH-RI-BN-M4-IN-VE-021	ANA FARLEY PEREA MOSQUERA	1128084548	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	10/4/2024	19/4/2024	$ 45.457,00	$ 5.137.526,39	100%	$ 4.835.094,18	$ 4.835.094,18	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
234	CH-RI-BN-M10-IN-VE-022	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREA	1030420430	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	28/05/2024	$ 4.973.226,97	100%	$ 4.670.794,75	$ 4.670.794,75	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
235	CH-RI-BN-M1-IN-VE-023	MARICET MOSQUERA MOSQUERA	26320340	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO					$ 9.704.566,52			$ -	
236	CH-RI-BN-M1-IN-VE-024	JOSE ELISEO MOSQUERA PEREA	1113699055	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/3/2024	23/3/2024	4/6/2024	$ 9.952.359,19	100%	$ 9.649.926,97	$ 9.649.926,97	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
237	CH-RI-BN-M10-IN-VE-026	ELIECER MOSQUERA MOSQUERA	1128846631	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	5/6/2024	$ 10.782.857,19	100%	$ 10.480.424,97	$ 10.480.424,97	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
238	CH-RI-BN-M7-IN-VE-027	BETSA BELAYDA SANCHEZ BENITEZ	1030420680	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/3/2024	23/3/2024	15/6/2024	$ 9.829.406,46	100%	$ 9.526.974,24	$ 9.526.974,24	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
239	CH-RI-BN-M2-IN-VE-028	EULOGIA MOSQUERA MOSQUERA	35586252	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	6/6/2024	$ 9.928.415,89	100%	$ 9.625.983,67	$ 9.625.983,67	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
240	CH-RI-BN-M6-IN-VE-029	JUAN CARLOS HURTADO PEREA	79792103	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	14/3/2024	25/3/2024	26/4/2024	$ 3.517.567,71	100%	$ 3.215.135,49	$ 3.215.135,49	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
241	CH-RI-BN-M3-IN-VE-031	YANIER ESTEBAN MOSQUERA MOSQUERA	1030421131	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/4/2024	18/4/2024	28/6/2024	$ 10.445.491,90	100%	$ 10.143.059,68	$ 10.143.059,68	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
242	CH-RI-BN-M7-IN-VE-034	SILVIA MARIA MOSQUERA COPETE	43026133	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	18/3/2024	$ 4.459.993,91	100%	$ 4.157.561,70	$ 4.157.561,70	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
243	CH-RI-BN-M3-IN-VE-035	ANA CRUZ PEREA MOSQUERA	35880082	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	10/4/2024	19/4/2024	21/6/2024	$ 6.467.068,19	100%	$ 6.164.635,97	$ 6.164.635,97	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
244	CH-RI-LR-M1-IN-VE-001	EFRAINSON MOSQUERA SANCHEZ	1030421821	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	11/7/2024	$ 12.106.306,48	100%	$ 11.803.874,26	$ 11.803.874,26	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
245	CH-RI-LR-M8-IN-VE-003	MARIA CLEOFE BORRERO PEREA	35880038	BARRIO REAL	ADECUACION	TERMINADA	27/6/2024			$ 2.103.738,68	95%	$ 1.801.306,47	$ 1.711.241,14	APERTURADA EL 18/06/2024
246	CH-RI-LR-M8-IN-VE-006	JOSE FRANCISCO MOSQUERA MOSQUERA	4827919	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	18/6/2024	27/6/2024	9/7/2024	$ 10.401.637,11	100%	$ 10.099.204,89	$ 10.099.204,89	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
247	CH-RI-LR-M5-IN-VE-008	YENIER ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA	1076821606	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	2/7/2024	13/7/2024	12/7/2024	$ 8.814.626,73	100%	$ 8.512.194,51	$ 8.512.194,51	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
248	CH-RI-LR-M8-IN-VE-009	JHON FREDY MOSQUERA PEREA	4827170	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	18/6/2024	27/6/2024	17/8/2024	$ 9.034.672,80	100%	$ 8.732.240,58	$ 8.732.240,58	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
249	CH-RI-LR-M8-IN-VE-011	LUZ NATALIA PEREA PEREA	26329011	BARRIO REAL	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	3/8/2024	$ 2.954.550,97	100%	$ 2.652.118,75	$ 2.652.118,75	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
250	CH-RI-LR-M1-IN-VE-012	MARIA YURLEY BENITEZ SANCHEZ	1076382170	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	19/6/2024	15?07/2024	$ 12.271.941,92	100%	$ 11.969.509,70	$ 11.969.509,70	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
251	CH-RI-LR-M6-IN-VE-015	ANGY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA	1128084159	BARRIO REAL	ADECUACION					$ 4.896.329,87			$ -	
252	CH-RI-BN-M8-VE-076	JORGE ELIECER PEREA MOSQUERA	1076382253	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	11/4/2024	20/4/2024	12/7/2024	$ 9.745.622,80	100%	$ 9.443.190,59	$ 9.443.190,59	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
253	CH-RI-BN-M10-VE-081	YUSLEIDY OLIVA HURTADO MORELO	1077445034	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	RECIBIDA	11/4/2024	20/4/2024	28/6/2024	$ 11.223.476,76	100%	$ 10.921.044,54	$ 10.921.044,54	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
254	CH-RI-BN-M10-VE-085	LUIS ENESIES MOSQUERA MOSQUERA	89004754	BARRIO NUEVO	TIPO 2	RECIBIDA	16/4/2024	27/4/2024	17/6/2024	$ 8.186.823,89	100%	$ 7.884.391,68	$ 7.884.391,68	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
255	CH-RI-BN-M10-VE-089	FERNEU QUINTO BENITEZ	10197475	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	27/4/2024	27/6/2024	$ 10.380.450,04	100%	$ 10.078.017,83	$ 10.078.017,83	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
256	CH-RI-BN-M6-VE-125	PASCUALINA MOSQUERA PEREA	1128084244	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	21/6/2024	$ 13.218.333,39	100%	$ 12.915.901,17	$ 12.915.901,17	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
257	CH-RI-BN-M5-VE-159	ARISLEYDA MOSQUERA MOSQUERA	1128848811	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	26/6/2024	$ 13.138.717,35	100%	$ 12.836.285,13	$ 12.836.285,13	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
258	CH-RI-BN-M2-VE-164	MARIA NEYLA MOSQUERA RAMIREZ	43617087	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	28/6/2024	$ 9.041.134,31	100%	$ 8.738.702,10	$ 8.738.702,10	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
259	CH-RI-ER-M8-VE-002	JESUS DOMINGO MOSQUERA MOSQUERA	11995053	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 11.046.285,24	70%	$ 10.743.853,03	$ 7.520.697,12	APERTURA EL DÍA 29/07/2024
260	CH-RI-ER-M8-VE-003	MARIA GLORIA MOSQUERA MOSQUERA	1030420685	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO					$ 3.848.811,30			$ -	
261	CH-RI-ER-M8-VE-004	MARIA BAUDILIA SANCHEZ MOSQUERA	35851049	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 11.149.475,63	65%	$ 10.847.043,42	$ 7.050.578,22	
262	CH-RI-ER-M7-VE-005	DEYSI RODRIGUEZ CORDOBA	43901796	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 1.943.147,90	0%	$ 1.640.715,68	$ -	APERTURADA EL DIA 18/07/2024
263	CH-RI-ER-M8-VE-006	MANUEL OVIDIO MOSQUERA PEREA	16214178	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 11.021.574,05	70%	$ 10.719.141,83	$ 7.503.399,28	
264	CH-RI-ER-M7-VE-007	PETRONIO PANFILO PEREA MOSQUERA	1113699066	BARRIO ROSARIO	ADECUACION	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 4.385.160,23	0%	$ 4.082.928,01	$ -	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
265	CH-RI-ER-M8-VE-008	DIGNO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA	14451028	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 11.324.783,00	70%	$ 11.022.350,78	$ 7.715.645,55	
266	CH-RI-ER-M7-VE-009	EULOGIA MOSQUERA MOSQUERA	35586252	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	TERMINADA	23/7/2024	1/8/2024		$ 10.376.042,38	95%	$ 10.073.610,16	$ 9.569.929,65	APERTURADA EL DÍA 23/07/2024
267	CH-RI-ER-M7-VE-013	MARIA RUBIS MOSQUERA MOSQUERA	1030420762	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 3.837.433,73	0%	$ 3.535.001,51	$ -	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
268	CH-RI-ER-M2-VE-018	LUIS ONER MOSQUERA MOSQUERA	82384093	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	Iniciada	22/7/2024	31/7/2024		$ 10.873.838,88	60%	$ 10.571.406,66	$ 6.342.844,00	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
269	CH-RI-ER-M7-VE-019	TARCY ESTELA MOSQUERA MOSQUERA	26318857	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 10.461.789,23			$ -	
270	CH-RI-ER-M7-VE-020	JESUS YELDISON MOSQUERA MOSQUERA	1030421564	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	22/7/2024	31/7/2024		$ 10.528.207,42	75%	$ 10.225.775,21	$ 7.669.331,40	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
271	CH-RI-ER-M7-VE-022	JOSE HERIBERTO PEREA PEREA	10160338	BARRIO ROSARIO	TIPO 2	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 7.687.590,30	70%	$ 7.385.158,08	$ 5.169.610,66	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
272	CH-RI-ER-M7-VE-023	CARMEN GLORIA PEREA MOSQUERA	1030421017	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECHAZO								
273	CH-RI-ER-M7-VE-027	SEGUNDO MARIA PEREA PEREA	4827946	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	23/7/2024	1/8/2024		$ 10.197.625,74	75%	$ 9.895.193,52	$ 7.421.545,14	APERTURADA EL DÍA 23/07/2024
274	CH-RI-ER-M6-VE-028	EBILIA PEREA RAMIREZ	26320251	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 11.098.481,83	60%	$ 10.796.049,61	$ 6.477.629,77	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
275	CH-RI-ER-M6-VE-030	MARIA NERCILINA PEREA MOSQUERA	1030421281	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 4.363.584,49	85%	$ 4.061.152,27	$ 3.451.979,43	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
276	CH-RI-ER-M5-VE-031	NEI MELINA PEREA MOSQUERA	26320240	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 10.863.764,50	0%	$ 10.561.332,28	$ -	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
277	CH-RI-ER-M6-VE-032	VALERIO MOSQUERA MOSQUERA	4827949	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 10.232.089,60			$ -	
278	CH-RI-ER-M6-VE-033	MARIA YASIRIS MOSQUERA PEREA	35820952	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 10.245.821,63			$ -	
279	CH-RI-ER-M6-VE-035	LUZ MARIA MOSQUERA SANCHEZ	1030421110	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS					$ 11.797.924,65			$ -	
280	CH-RI-ER-M5-VE-036	MARIA ERMELINA MOSQUERA MOSQUERA	35880075	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 10.110.825,03	0%	$ 9.808.392,90	$ -	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
281	CH-RI-ER-M5-VE-037	TERECILA MOSQUERA MOSQUERA	1030421744	BARRIO ROSARIO	TIPO 2					$ 8.537.138,56			$ -	
282	CH-RI-ER-M5-VE-038	FLOR MARY MOSQUERA RAMIREZ	1030420775	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS					$ 10.850.535,27			$ -	
283	CH-RI-ER-M5-VE-039	AULIO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA	4827723	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 11.853.318,37			$ -	
284	CH-RI-ER-M5-VE-040	MARIA CLEMENTINA MOSQUERA IBARGUEN	54230009	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 11.176.450,38			$ -	
285	CH-RI-ER-M5-VE-041	JOSE ALEYSON MOSQUERA MOSQUERA	1030420817	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 12.534.698,10			$ -	
286	CH-RI-ER-M5-VE-042	ANA MARTINA MOSQUERA MOSQUERA	26391729	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 11.257.820,22	0%	$ 10.955.388,00	$ -	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
287	CH-RI-ER-M5-VE-043	JOSE BALBINO MOSQUERA IBARGUEN	11905607	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 9.424.558,13	0%	$ 9.122.125,91	$ -	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
288	CH-RI-ER-M4-VE-044	ALINA MOSQUERA PEREA	26320115	BARRIO ROSARIO	TIPO 2	RECHAZO							$ -	
289	CH-RI-ER-M4-VE-045	MAILYN PATRICIA MOSQUERA MOSQUERA	1076816694	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 10.411.471,50	45%	$ 10.109.039,28	$ 4.549.067,68	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
290	CH-RI-ER-M4-VE-047	JUAN SOCORRO PEREA MOSQUERA	4865081	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 10.167.690,15	50%	$ 9.865.257,84	$ 4.942.928,97	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
291	CH-RI-ER-M4-VE-058	MARIA ANTONIA MOSQUERA MOSQUERA	26319702	BARRIO ROSARIO	TIPO 2	Iniciada	19/7/2024	30/7/2024		$ 8.497.083,97	70%	$ 8.194.651,75	$ 5.736.256,22	APERTURADA EL DÍA 19/07/2024

292	CH-RI-ER-M4-VE-060	MARÍA YASIRIS MOSQUERA PEREA	35820952	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	23/7/2024	1/8/2024		$ 10.908.394,75	30%	$ 10.605.962,53	$ 3.181.788,76	APERTURADA EL DÍA 23/07/2024
293	CH-RI-ER-M4-VE-061	JOSE NIMIO MOSQUERA COPETE	11905011	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 11.116.010,75	40%	$ 10.813.578,54	$ 4.325.431,42	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
294	CH-RI-ER-M4-VE-063	FRANCISCO GABRIEL MOSQUERA	4826277	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 11.382.474,42	40%	$ 11.080.042,21	$ 4.432.016,88	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
295	CH-RI-ER-M4-VE-064	MARIA SAUR MOSQUERA	26320312	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	22/7/2024	1/8/2024		$ 10.117.015,18	25%	$ 9.814.582,96	$ 2.453.645,74	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
296	CH-RI-ER-M4-VE-065	MIGUELINA PEREA PEREA	26320246	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 12.465.907,47	30%	$ 12.164.475,26	$ 3.649.342,58	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
297	CH-RI-ER-M4-VE-066	CRISPIN MOSQUERA MOSQUERA	18508666	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 11.265.084,92	25%	$ 10.945.459,53	$ 2.736.364,88	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
298	CH-RI-ER-M4-VE-067	MARIA ERNIS PEREA MOSQUERA	26320294	BARRIO ROSARIO	TIPO 1	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 11.247.891,75	20%	$ 10.945.459,53	$ 2.189.091,91	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
299	CH-RI-ER-M4-VE-068	JOSE BIANNEY MOSQUERA PEREA	11637005	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 10.960.663,63	70%	$ 10.659.231,41	$ 7.460.761,99	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
300	CH-RI-ER-M3-VE-069	MARIA SILVERIA PEREA PEREA	26317013	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada				$ 10.402.112,26	40%		$ -	
301	CH-RI-ER-M3-VE-070	SARA MARIA MOSQUERA MOSQUERA	26320162	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	31/7/2024	9/8/2024		$ 10.237.845,10	70%	$ 9.935.412,90	$ 6.954.789,02	
302	CH-RI-ER-M3-VE-071	ROBINSON RAMIREZ HURTADO	1017123028	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS					$ 9.073.194,07			$ -	
303	CH-RI-ER-M2-VE-073	VALENTINA MOSQUERA MOSQUERA	26320228	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	23/7/2024	1/8/2024		$ 10.324.527,75	70%	$ 10.022.095,53	$ 7.015.466,87	APERTURADA EL DÍA 23/07/2024
304	CH-RI-ER-M3-VE-074	ALILA ANTONIA MOSQUERA IBARGUEN	1030420765	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 10.773.802,50			$ -	
305	CH-RI-ER-M3-VE-075	LEONOR SARA PEREA MOSQUERA	35587735	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada				$ 9.268.486,19	25%	$ 8.906.053,98	$ 2.226.513,49	
306	CH-RI-ER-M3-VE-077	JUAN ANTONIO PEREA PEREA	7133068	BARRIO ROSARIO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 2.792.553,08	70%	$ 2.490.120,87	$ 1.743.084,61	
307	CH-RI-ER-M2-VE-078	JOSE NILSON MOSQUERA MOSQUERA	82362469	BARRIO ROSARIO	TIPO 6 CON LAVADERO					$ 11.582.648,79			$ -	
308	CH-RI-ER-M3-VE-079	JOSE ROMULO MOSQUERA	4827867	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	31/7/2024	9/8/2024		$ 9.922.697,95	55%	$ 9.620.265,73	$ 5.291.146,15	
309	CH-RI-ER-M2-VE-080	MARIA ABELINA MOSQUERA MOSQUERA	26320229	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	22/7/2027	31/7/2024		$ 9.317.657,20	70%	$ 9.015.224,98	$ 6.310.657,49	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
310	CH-RI-ER-M3-VE-081	LEONOR SARA MOSQUERA MOSQUERA	26320209	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 10.163.792,24	60%	$ 9.861.360,02	$ 5.916.816,01	
311	CH-RI-ER-M2-VE-082	JOSE ERIS SANCHEZ MOSQUERA	82360317	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	22/7/2024	31/7/2024		$ 11.360.913,91	70%	$ 11.058.479,70	$ 7.740.935,79	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
312	CH-RI-ER-M3-VE-083	JOSE TILSON MOSQUERA MOSQUERA	11995101	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 9.260.940,08	0%	$ 8.958.507,86	$ -	
313	CH-RI-ER-M2-VE-084	JAISON HURTADO MOSQUERA	11995116	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 CON LAVADERO	Iniciada	22/7/2024	31/7/2024		$ 11.272.912,43	65%	$ 10.970.480,21	$ 7.130.812,14	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
314	CH-RI-ER-M3-VE-085	MARIA LUCILA MOSQUERA DE MOSQUERA	26319553	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO	Iniciada	8/8/2024	20/8/2024		$ 1.442.045,70	0%	$ 1.139.613,49	$ -	APERTURADA EL DÍA 08/08/2024
315	CH-RI-ER-M2-VE-086	MARIA MARINA MOSQUERA MOSQUERA	26320143	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	22/7/2024	31/7/2024		$ 9.438.994,70	65%	$ 9.136.562,48	$ 5.938.765,61	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
316	CH-RI-ER-M3-VE-089	JOSE MONARES PEREA PEREA	4827672	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	8/8/2024	20/8/2024		$ 9.501.163,43	0%	$ 9.198.731,21	$ -	APERTURADA EL DÍA 08/08/2024
317	CH-RI-ER-M9-VE-090	OMNY MARIA PEREA MOSQUERA	35850149	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECHAZO								
318	CH-RI-ER-M2-VE-091	MARIA CIRIS PEREA MOSQUERA	26320207	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	29/7/2027	8/8/2024		$ 11.068.036,87	70%	$ 10.765.604,66	$ 7.535.923,26	
319	CH-RI-ER-M9-VE-094	OMNY MARIA PEREA MOSQUERA	35850149	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO					$ 2.376.626,44			$ -	
320	CH-RI-ER-M9-VE-096	MELITINA SANCHEZ DE MOSQUERA	26319845	BARRIO ROSARIO	TIPO 2	Iniciada	31/7/2024	8/8/2024		$ 8.220.200,94	0%	$ 7.917.768,72	$ -	
321	CH-RI-ER-M2-VE-099	MARIA YOMAIRA MOSQUERA MOSQUERA	1133699009	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	23/7/2024	1/8/2024		$ 10.901.541,88	70%	$ 10.599.109,66	$ 7.419.376,76	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
322	CH-RI-ER-M9-VE-100	MARTHA ISABEL MOSQUERA MOSQUERA	1030420768	BARRIO ROSARIO	TIPO 2	Iniciada	31/7/2024	9/8/2024		$ 8.342.494,48	0%	$ 8.040.062,26	$ -	
323	CH-RI-ER-M9-VE-102	RUBEN DARIO MOSQUERA MOSQUERA	11930726	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	31/7/2024	9/8/2024		$ 10.909.361,99	65%	$ 10.606.929,76	$ 6.894.504,36	
324	CH-RI-ER-M2-VE-103	MARIA DE LOS SANTOS MOSQUERA MOSQUERA	26320265	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	23/7/2024	1/8/2024		$ 9.370.041,51	70%	$ 9.067.609,30	$ 6.347.326,51	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
325	CH-RI-ER-M9-VE-104	GLADYS PEREA MOSQUERA	26320271	BARRIO ROSARIO	TIPO 2	RECHAZO							$ -	
326	CH-RI-ER-M9-VE-105	MARIA EFANIA PEREA MOSQUERA	26319809	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO	Iniciada	8/8/2024	20/8/2024		$ 1.813.919,72	0%	$ 1.511.487,51	$ -	APERTURADA EL DÍA 08/08/2024
327	CH-RI-ER-M2-VE-106	LUIS EDIER MOSQUERA SANCHEZ	1030420431	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	23/7/2024	1/8/2024		$ 8.953.001,45	0%	$ 8.650.569,24	$ -	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
328	CH-RI-ER-M2-VE-107	MAGNO ANTONIO MOSQUERA PEREA	4827803	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	22/7/2024	31/7/2024		$ 10.132.148,95	55%	$ 9.829.716,73	$ 5.406.344,20	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
329	CH-RI-ER-M1-VE-108	FRANK PEREA AGUALIMPIA	1076820297	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 9.197.238,99	0%	$ 8.894.806,78	$ -	
330	CH-RI-ER-M2-VE-109	JORGE ELIAS MOSQUERA MOSQUERA	11938382	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	23/7/2024	1/8/2024		$ 9.617.673,19	70%	$ 9.315.240,97	$ 6.520.668,68	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
331	CH-RI-ER-M2-VE-110	MARCELINO HURTADO ASPRILLA	4827692	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	24/7/2024	2/8/2024		$ 11.076.033,50	0%	$ 10.773.601,28	$ -	APERTURADA EL DÍA 24/07/2024
332	CH-RI-ER-M2-VE-111	GILDARDO ANTONIO PEREA MOSQUERA	4827940	BARRIO ROSARIO	TIPO 2	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 6.924.543,76	0%	$ 6.622.111,55	$ -	
333	CH-RI-ER-M1-VE-113	MARIA DIOSELINA PEREA MOSQUERA	29091865	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	29/8/2024	8/8/2024		$ 9.411.098,43	0%	$ 9.108.666,21	$ -	
334	CH-RI-ER-M1-VE-114	LUIS EURIPIDES MOSQUERA SANCHEZ	4827926	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 4.134.323,46			$ -	
335	CH-RI-ER-M1-VE-115	MARIA FRANCISCA MOSQUERA MOSQUERA	1030421707	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	8/8/2024	20/8/2024		$ 11.080.091,78	10%	$ 10.757.859,56	$ 1.075.765,96	APERTURADA EL DÍA 08/08/2024
336	CH-RI-ER-M1-VE-116	JOSE DEL CARMEN HURTADO ASPRILLA	1590383	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	8/8/2024	20/8/2024		$ 10.187.521,34	0%	$ 9.885.089,10	$ -	APERTURADA EL DÍA 08/08/2024
337	CH-RI-ER-M1-VE-117	AUDILIA PEREA MOSQUERA	26320155	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	29/8/2024	8/8/2024		$ 11.139.535,75	0%	$ 10.837.103,54	$ -	
338	CH-RI-ER-M1-VE-118	JOSE CARLINO BENITEZ HURTADO	4827967	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 7.532.910,70	0%	$ 7.230.478,49	$ -	
339	CH-RI-ER-M1-VE-119	LUIS ARLEY HURTADO MOSQUERA	1030420355	BARRIO ROSARIO	TIPO 2					$ 8.889.096,42			$ -	
340	CH-RI-ER-M2-VE-122	YAIR HENRRY PEREA PEREA	82384063	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	23/7/2024	1/8/2024		$ 9.853.015,38	0%	$ 9.550.583,17	$ -	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
341	CH-RI-ER-M2-VE-123	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREA	1030420430	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	23/7/2024	1/7/2024		$ 11.022.350,86	75%	$ 10.719.918,65	$ 8.039.938,99	APERTURADA EL DÍA 22/07/2024
342	CH-RI-LU-M2-VE-004	EMELINDA MOSQUERA DE MOSQUERA	26320149	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	9/8/2024	$ 8.211.047,00	100%	$ 7.908.614,79	$ 7.908.614,79	RECIBIDA SATISFACCIÓN
343	CH-RI-LU-M2-VE-010	YOIMER ANDRES MOSQUERA PEREA	1030421360	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2	RECIBIDA	5/7/2024	16/7/2024	17/8/2024	$ 9.933.125,81	100%	$ 9.630.693,59	$ 9.630.693,59	RECIBIDA
344	CH-RI-LU-M2-VE-011	IRENE SANCHEZ MOSQUERA	26320134	BARRIO LA UNIÓN	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECHAZO								
345	CH-RI-LU-M1-VE-030	CARMEN JULIA MOSQUERA MOSQUERA	1030420618	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	16/8/2024	$ 9.693.115,51	100%	$ 9.390.683,30	$ 9.390.683,29	RECIBIDA SATISFACCIÓN
346	CH-RI-BN-M7-IN-VE-019	MARIA EVANGELINA MOSQUERA PEREA	1030420691	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	13/3/2024	24/3/2024	24/8/2024	$ 11.046.280,26	100%	$ 10.743.848,04	$ 10.743.848,04	RECIBIDA SATISFACCIÓN
347	CH-RI-LU-M7-IN-VE-001	SENDRIA SANCHEZ PEREA	1147951411	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	25/6/2024	2/7/2024	1/8/2024	$ 12.816.935,56	100%	$ 12.514.503,35	$ 12.514.503,35	RECIBIDA SATISFACCIÓN
348	CH-RI-LU-M6-IN-VE-002	DAIBER MOSQUERA HURTADO	1128084492	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2	RECIBIDA	21/6/2024	3/7/2024	2/8/2024	$ 8.277.133,31	100%	$ 7.975.301,09	$ 7.975.301,09	RECIBIDA SATISFACCIÓN
349	CH-RI-LU-M3-IN-VE-003	CARLOS MARINO QUINTO MOSQUERA	4860555	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 CON LAVADERO	Iniciada	9/7/2024	18/7/2024		$ 11.065.249,72	80%	$ 10.762.817,51	$ 8.610.254,00	APERTURADA EL DÍA 09/07/2024
350	CH-RI-LU-M7-IN-VE-004	MARIA RAQUEL MOSQUERA DE PEREZ	26318914	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	16/8/2024	$ 12.387.083,65	100%	$ 12.084.651,44	$ 12.084.651,44	RECIBIDA SATISFACCIÓN
351	CH-RI-LU-M3-IN-VE-006	MARCELO CLAUDIO MOSQUERA MOSQUERA	4827857	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	TERMINADA	8/7/2024	17/7/2024		$ 10.210.007,94	95%	$ 9.907.575,73	$ 9.412.196,94	APERTURADA EL DÍA 08/07/2024
352	CH-RI-LU-M4-IN-VE-008	FULVIO ANTONIO PEREA PEREA	4827773	BARRIO LA UNIÓN	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	17/8/2024	$ 4.141.196,46	100%	$ 3.838.764,24	$ 3.838.764,24	RECIBIDA SATISFACCIÓN
353	CH-RI-LU-M6-IN-VE-010	ANA DEL CARMEN HURTADO MOSQUERA	35880112	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	2/8/2024	$ 11.595.714,27	100%	$ 11.293.282,05	$ 11.293.282,05	RECIBIDA SATISFACCIÓN
354	CH-RI-LU-M5-IN-VE-011	LUIS ARCADIO MOSQUERA MOSQUERA	79954689	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	29/7/2024	$ 9.229.261,47	100%	$ 8.926.829,26	$ 8.926.829,26	RECIBIDA SATISFACCIÓN
355	CH-RI-LU-M6-IN-VE-012	ROSA ALBA PEREA MOSQUERA	26320098	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2	RECIBIDA	21/06/2024	3/7/2024	15/7/2024	$ 8.356.327,46	100%	$ 8.053.895,24	$ 8.053.895,24	RECIBIDA SATISFACCIÓN
356	CH-RI-LU-M6-IN-VE-013	ROBINSON PEREA MOSQUERA	1193063956	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	21/6/2024	3/7/2024		$ 9.415.116,96	85%	$ 9.112.684,74	$ 7.745.782,03	APERTURADA EL 21/06/2024

357	CH-RI-ER-M4-IN-VE-013	JOSE ALEYSON MOSQUERA MOSQUERA	1030420617	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 9.635.231,76	70%	$ 9.332.790,54	$ 6.532.959,64	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
358	CH-RI-ER-M6-IN-VE-014	LEIDY YOHANA MOSQUERA MOSQUERA	1147951408	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	19/7/2024	30/7/2024		$ 11.587.734,54	0%	$ 11.168.484,88	$ -	APERTURADA EL DÍA 19/07/2024
359	CH-RI-ER-M4-IN-VE-012	EDUARD HURTADO MOSQUERA	11995117	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 CON LAVADERO	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 11.406.440,40	50%	$ 11.194.008,19	$ 5.597.004,09	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
360	CH-RI-ER-M7-IN-VE-011	LUIS CARLOS MOSQUERA PEREA	11905003	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 9.846.591,25	70%	$ 9.544.150,04	$ 6.680.911,53	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
361	CH-RI-ER-M6-IN-VE-009	JOSE FERNANDO MOSQUERA MOSQUERA	4827943	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	19/7/2024	30/7/2024		$ 11.411.923,85	40%	$ 10.992.873,99	$ 4.397.069,60	APERTURADA EL DÍA 19/07/2024
362	CH-RI-ER-M7-IN-VE-004	ZUNILDA PEREA RAMIREZ	26320120	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 9.114.801,69	70%	$ 8.812.369,48	$ 6.168.658,63	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
363	CH-RI-ER-M2-IN-VE-008	TEODOMIRO MOSQUERA	7248227	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO	Iniciada	8/8/2024	20/8/2024		$ 1.518.721,39	0%	$ 1.216.289,17	$ -	APERTURADA EL DIA 08/08/2024
364	CH-RI-ER-M8-IN-VE-006	ANNE MARIA BECERRA CORDOBA	39758280	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO					$ 2.069.460,88			$ -	
365	CH-RI-LU-M3-IN-VE-016	FRELLA MARIA MOSQUERA MOSQUERA	43874182	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 CON LAVADERO	TERMINADA	2/7/2024	11/7/2024		$ 11.183.915,81	95%	$ 10.881.483,59	$ 10.337.409,41	APERTURADA EL DÍA 02/07/2024
366	CH-RI-LU-M2-IN-VE-015	YEYNER DARIO MOSQUERA MOSQUERA	1076821765	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	16/8/2024	$ 10.635.512,22	100%	$ 10.216.262,36	$ 10.216.262,36	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
367	CH-RI-LU-M3-IN-VE-014	NILSON EVELIO PEREA MOSQUERA	12023323	BARRIO LA UNIÓN	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	5/7/2024	16/7/2024	03/08/20245	$ 1.475.877,33	100%	$ 1.173.445,11	$ 1.173.445,11	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
368	CH-RI-ER-M1-IN-VE-001	MONICA MOSQUERA BORRERO	35697640	BARRIO ROSARIO	ADECUACION	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 1.444.486,12	0%	$ 1.142.053,90	$ -	
369	CH-RI-18-M1-IN-VE-019	ORGUIN NATIGAY OQUI	11937476	BARRIO REAL	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	7/6/2024	18/6/2024	15/7/2024	$ 12.896.092,52	100%	$ 12.593.660,31	$ 12.593.660,31	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
370	CH-RI-ER-M7-IN-VE-017	FRANCISCA ANTONIA MOSQUERA MOSQUERA	1030420786	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECHAZO								
371	CH-RI-ER-M5-IN-VE-018	MARÍA ESNEIDA MOSQUERA PEREA	1030420750	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 8.963.032,19	0%	$ 8.660.599,98	$ -	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
372	CH-RI-LU-M2-IN-VE-020	MARISOL MOSQUERA PEREA	43679328	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/7/2024	18/7/2024	3/8/2024	$ 10.240.926,23	100%	$ 9.938.494,02	$ 9.938.494,02	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
373	CH-RI-BN-M1-IN-VE-041	YAILSON SANCHEZ MOSQUERA	1030420087	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/4/2024	18/4/2024	6/6/2024	$ 9.930.357,25	100%	$ 9.627.925,04	$ 9.627.925,04	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
374	CH-RI-BN-M1-IN-VE-042	CRISTIAN SANCHEZ MOSQUERA	1030420077	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/4/2024	18/4/2024	6/6/2024	$ 11.568.153,47	100%	$ 11.265.721,25	$ 11.265.721,25	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
375	CH-RI-BN-M7-IN-VE-045	JOSE ALEY URBANO MOSQUERA	11938290	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	9/4/2024	18/4/2024	15/5/2024	$ 10.750.246,27	100%	$ 10.447.814,05	$ 10.447.814,05	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
376	CH-RI-LU-M4-IN-VE-019	MARÍA MARINA MOSQUERA MOSQUERA	43279067	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	TERMINADA	8/7/2024	17/7/2024		$ 10.118.049,39	95%	$ 9.698.799,53	$ 9.213.859,56	APERTURADA EL DÍA 08/07/2024
377	CH-RI-BN-M6-IN-VE-033	LUIS EDUARDO MOSQUERA MOSQUERA	11937068	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	11/6/2024	$ 11.927.144,61	100%	$ 11.624.712,40	$ 11.624.712,40	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
378	CH-RI-BN-M7-IN-VE-040	DORALINA SANCHEZ MOSQUERA	1030421811	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	14/6/2024	$ 10.297.135,79	100%	$ 9.994.703,58	$ 9.994.703,58	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
379	CH-RI-BN-M10-VE-092	MARÍA LUCIA MOSQUERA PEREA	35891410	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	27/4/2024	27/6/2024	$ 10.818.141,46	100%	$ 10.515.709,24	$ 10.515.709,24	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
380	CH-RI-BN-M8-IN-VE-043	CARMEN LEONILDA MOSQUERA MOSQUERA	1133699020	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	31/5/2024	11/6/2024	3/7/2024	$ 5.520.798,26	100%	$ 5.218.366,04	$ 5.218.366,04	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
381	CH-RI-18-M3-IN-VE-018	ELISEO NATIGAY	11775032	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO	TERMINADA	7/6/2024	19/4/2024		$ 11.683.545,36	95%	$ 11.264.295,50	$ 10.701.080,72	EN EJECUCIÓN, INICIADA EL 01 DE JUNIO DE 2024
382	CH-RI-BN-M6-IN-VE-046	LUIS EDUARDO MOSQUERA MOSQUERA	11937068	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	21/6/2024	$ 6.458.528,23	100%	$ 6.156.096,02	$ 6.156.096,02	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
383	CH-RI-BN-M6-IN-VE-047	JORGE ELIECER MOSQUERA MOSQUERA	11936943	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	8/7/2024	$ 6.392.624,68	100%	$ 6.090.192,46	$ 6.090.192,46	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
384	CH-RI-BN-M10-IN-VE-049	FELICIANA MOSQUERA PEREA	21500718	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/4/2024	27/4/2024		$ 5.986.850,55	0%	$ 5.684.424,33	$ -	INTERVENCIÓN CON MAS DE 8 DÍAS HABILES
385	CH-RI-BN-M10-IN-VE-050	JORGE ANDRES SANCHEZ MOSQUERA	1076816821	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	27/4/2024	27/6/2024	$ 6.907.377,55	100%	$ 6.604.945,33	$ 6.604.945,33	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
386	CH-RI-BN-M6-IN-VE-051	AURELINA PEREA QUINTO	1094885261	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	15/7/2024	$ 9.372.884,52	100%	$ 9.070.452,30	$ 9.070.452,30	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
387	CH-RI-BN-M8-IN-VE-054	CRUZ ALINA MOSQUERA PEREA	35851513	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	Iniciada	17/4/2024	28/4/2024		$ 8.391.967,58	0%	$ 8.089.535,36	$ -	INTERVENCIÓN CON MAS DE 8 DÍAS HABILES
388	CH-RI-BN-M8-IN-VE-055	DEYSON MOSQUERA MOSQUERA	1076820472	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	16/4/2024	27/4/2024	6/6/2024	$ 1.971.284,41	100%	$ 1.668.852,19	$ 1.668.852,19	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
389	CH-RI-BN-M3-IN-VE-057	MARIA MARCELINA GOMEZ MOSQUERA	26320349	BARRIO NUEVO	ADECUACION	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	11/6/2024	$ 1.607.163,05	100%	$ 1.304.730,83	$ 1.304.730,83	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
390	CH-RI-BN-M4-IN-VE-058	EMILIO CELINO MOSQUERA BENITEZ	4827881	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	16/4/2024	25/4/2024	14/6/2024	$ 11.277.675,29	100%	$ 10.975.243,07	$ 10.975.243,07	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
391	CH-RI-LU-M6-IN-VE-021	YIRLEYDIS SANCHEZ PERA	1076817012	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	20/6/2024	2/7/2024	2/8/2024	$ 11.288.912,12	100%	$ 10.869.662,27	$ 10.869.662,27	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
392	CH-RI-ER-M6-IN-VE-019	GLORIA YOHANA MOSQUERA MOSQUERA	1128084663	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECHAZO								
393	CH-RI-ER-M2-IN-VE-020	JOSE ISAIAS QUINTO BENITEZ	9728682	BARRIO ROSARIO	TIPO 1 CON LAVADERO	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 10.489.908,68	70%	$ 10.187.476,64	$ 7.131.233,65	
394	CH-RI-ER-M6-IN-VE-021	YUSLEISA PEREA PEREA	1030421578	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 10.302.003,60	50%	$ 9.999.571,39	$ 4.999.785,69	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
395	CH-RI-BN-M10-VE-080	YOIMER ANDRES PEREA PEREA	1076819505	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	RECIBIDA	5/6/2024	16/6/2024	12/7/2024	$ 4.997.070,11	100%	$ 4.997.070,11	$ 4.997.070,11	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
396	CH-RI-LU-M2-VE-002	JESUS DOMINGO PEREA MOSQUERA	1030422003	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECHAZO								
397	CH-RI-BN-M8-IN-VE-048	JOSE DIOMER MOSQUERA BENITEZ	1076331467	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	1/6/2024	12/6/2024	3/7/2024	$ 5.107.339,47	100%	$ 7.333.734,22	$ 7.333.734,22	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
398	CH-RI-BN-M5-IN-VE-056	YEILY SILENA MOSQUERA MOSQUERA	1128084813	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	30/5/2024	10/6/2024	3/7/2024	$ 10.915.739,44	100%	$ 10.915.739,44	$ 10.915.739,44	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
399	CH-RI-BN-M10-IN-VE-044	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREA	1030420430	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	30/5/2024	10/6/2024	15/7/2024	$ 10.833.219,02	100%	$ 10.833.219,02	$ 10.833.219,02	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
400	CH-RI-BN-M4-IN-VE-060	LUIS JOSE MOSQUERA MOSQUERA	8236692	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	31/5/2024	11/6/2024	10/7/2024	$ 9.940.650,35	100%	$ 10.833.219,02	$ 10.833.219,02	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
401	CH-RI-BN-M4-IN-VE-061	MARCELO CLAUDIO MOSQUERA MOSQUERA	6280974	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	31/5/2024	11/6/2024	9/7/2024	$ 9.717.420,10	100%	$ 9.717.420,10	$ 9.717.420,10	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
402	CH-RI-BN-M5-IN-VE-062	BI FRANCIS BENITEZ MOSQUERA	1030421845	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	30/5/2024	10/6/2024	8/7/2024	$ 10.295.339,01	100%	$ 10.295.339,01	$ 10.295.339,01	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
403	CH-RI-BN-M5-IN-VE-069	MARIA ROSIBEL MOSQUERA BENITEZ	1073710103	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	7/6/2024	19/6/2024		$ 4.655.860,47	0%	$ 4.655.860,47	$ -	EN EJECUCIÓN, INICIADA EL 07 DE JUNIO DE 2024
404	CH-RI-LR-M8-IN-VE-023	DIGNA MARGARITA MOSQUERA	26320109	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	12/6/2024	21/6/2024	11/7/2024	$ 9.882.877,41	100%	$ 9.882.877,41	$ 9.882.877,41	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
405	CH-RI-LU-M2-IN-VE-022	JULIO CESAR MOSQUERA MOSQUERA	10159764	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	8/7/2024	17/7/2024		$ 10.433.864,34	90%	$ 10.433.864,34		APERTURADA EL DÍA 08/07/2024
406	CH-RI-LU-M6-IN-VE-027	NILSON EVELIO PEREA MOSQUERA	12023323	BARRIO LA UNIÓN	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	20/6/2024	2/7/2024		$ 6.172.352,07	45%	$ 6.172.352,07		APERTURADA EL 20/06/2024
407	CH-RI-ER-M2-IN-VE-022	JOSE ESLEARDO SANCHEZ MOSQUERA	11936784	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	8/8/2024	20/8/2024		$ 10.512.713,93	0%	$ 10.512.713,93	$ -	APERTURADA EL DÍA 08/08/2024
408	CH-RI-ER-M7-IN-VE-025	JUAN DOLORES PEREA PEREA	82290025	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 10.112.779,75	75%	$ 10.112.779,75	$ 7.584.584,81	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
409	CH-RI-BN-M2-IN-VE-059	YOBEYDA HURTADO MOSQUERA	26320342	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	TERMINADA	4/7/2024	15/7/2024		$ 5.010.225,83	95%	$ 4.707.793,61	$ 4.472.403,93	
410	CH-RI-BN-M10-IN-VE-064	JOSE ELSIA MOSQUERA MOSQUERA	1030422176	BARRIO NUEVO	TIPO 3 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	30/5/2024	10/6/2024	4/7/2024	$ 10.721.426,13	100%	$ 10.721.426,13	$ 10.721.426,13	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
411	CH-RI-BN-M2-IN-VE-067	ESMAVLIN MOSQUERA PEREA	1076817562	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	RECIBIDA	1/6/2024	12/6/2024	5/7/2024	$ 9.619.659,18	100%	$ 9.619.659,18	$ 9.619.659,18	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
412	CH-RI-BN-M8-IN-VE-068	JOSE FARNE HURTADO MOSQUERA	1030420560	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	30/5/2024	10/6/2024	9/7/2024	$ 9.997.987,11	100%	$ 9.997.987,11	$ 9.997.987,11	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
413	CH-RI-LU-M3-IN-VE-025	EMELINO BENITEZ MOSQUERA	11937788	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	16/8/2024	$ 10.969.521,20	100%	$ 10.969.521,20		RECIBIDA A SATISFACCIÓN
414	CH-RI-LU-M3-IN-VE-026	LUIS HERNANDO MOSQUERA PEREA	6283522	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	16/8/2024	$ 10.165.893,90	100%	$ 10.165.893,90	$ 10.165.893,90	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
415	CH-RI-LU-M6-IN-VE-029	WILSON ANTONIO MARTINEZ MOSQUERA	1003851174	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	19/6/2024	28/6/2024	3/8/2024	$ 10.897.101,32	100%	$ 10.897.101,32	$ 10.897.101,32	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
416	CH-RI-ER-M6-IN-VE-098	MARÍA NIMIA PEREA MOSQUERA	39799451	BARRIO ROSARIO	ADECUACION Y LAVAPLATOS	Iniciada	1/8/2024	13/8/2024		$ 4.866.639,26	0%	$ 4.866.639,26	$ -	
417	CH-RI-LU-M4-IN-VE-028	JOSE EMILIANO MOSQUERA BENITEZ	11937141	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2	RECIBIDA	9/7/2024	18/7/2024	3/8/2024	$ 6.751.094,66	100%	$ 6.448.662,44	$ 6.448.662,44	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
418	CH-RI-BN-M6-IN-VE-070	MARÍA CARMELINA MOSQUERA MOSQUERA	1148451556	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	18/6/2024	27/6/2024	15/7/2024	$ 10.962.468,49	100%	$ 10.660.036,27	$ 10.660.036,27	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
419	CH-RI-BN-M8-IN-VE-071	EVERNY MOSQUERA PEREA	1030421571	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	18/6/2024	27/6/2024	15/7/2024	$ 10.782.189,69	100%	$ 10.479.757,47	$ 10.479.757,47	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
420	CH-RI-LR-M8-IN-VE-026	MARIA YUBERNIS RUIZ GOMEZ	1030420780	BARRIO REAL	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	18/6/2024	27/6/2024	3/8/2024	$ 10.224.060,55	100%	$ 9.921.628,34	$ 9.921.628,34	RECIBIDA A SATISFACCIÓN
421	CH-RI-LU-M7-IN-VE-024	JESUS MARÍA SANCHEZ MOSQUERA	6235524	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	RECIBIDA	8/7/2024	17/7/2024	3/8/2024	$ 12.059.264,02	100%	$ 11.756.831,81	$ 11.756.831,81	RECIBIDA A SATISFACCIÓN

422	CH-RI-ER-M6-IN-VE-023	ERICA YOHANA PEREA MOSQUERA	1076331248	BARRIO ROSARIO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	18/7/2024	29/7/2024		$ 6.056.218,17	0%	$ 9.753.786,15	$ -	APERTURADA EL DÍA 18/07/2024
423	CH-RI-BN-M7-VE-001	JULIEO MOSQUERA MOSQUERA	1030420215	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.742.789,29		$ 10.440.357,07	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
424	CH-RI-BN-M7-VE-002	MARIA YEISA PEREA MOSQUERA	1030420187	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 11.074.946,10		$ 10.772.513,88	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
425	CH-RI-BN-M7-VE-003	MARIA DAMARIS PEREA PEREA	35880101	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.081.813,64		$ 9.779.381,42	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
426	CH-RI-BN-M7-VE-004	MARIA LUZ DARI MOSQUERA MOSQUERA	1030420938	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO	Iniciada	21/8/2024	30/8/2024		$ 5.450.996,75		$ 5.148.564,93	$ -	APERTURADA EL DÍA 21/08/2024
427	CH-RI-BN-M1-VE-005	JOSE ALBEIRO MOSQUERA PEREA	71318702	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	21/8/2024	30/8/2024		$ 9.509.359,87		$ 9.206.927,66	$ -	APERTURADA EL DÍA 21/08/2024
428	CH-RI-BN-M7-VE-006	ROSA EMILIA MOSQUERA PEREA	26327964	BARRIO NUEVO	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.614.510,13		$ 10.312.077,92	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
429	CH-RI-BN-M7-VE-007	YORELIS PEREA PEREA	1128088987	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 9.905.113,54		$ 9.602.681,32	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
430	CH-RI-BN-M1-VE-008	ANA ROSA MOSQUERA SANCHEZ	26320023	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	21/8/2024	30/0/2024		$ 10.431.207,06		$ 10.128.774,85	$ -	APERTURADA EL DÍA 21/08/2024
431	CH-RI-BN-M1-VE-009	BENSAINVE MOSQUERA SANCHEZ	1133699018	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 11.051.400,69		$ 10.748.968,47	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
432	CH-RI-BN-M7-VE-010	JOSE DANILSON PEREA MOSQUERA	1076384233	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.746.762,95		$ 10.444.330,74	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
433	CH-RI-BN-M1-VE-011	RUBY VALDEZ MOSQUERA	1133699006	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 9.826.649,68		$ 9.524.216,97	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
434	CH-RI-BN-M7-VE-012	GENIS PEREA PEREA	1128088812	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.402.505,90		$ 10.100.073,68	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
435	CH-RI-BN-M7-VE-013	CRUZ YARLENIS MOSQUERA MOSQUERA	1030421299	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.484.580,99		$ 10.182.148,77	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
436	CH-RI-BN-M7-VE-014	MARIA ALICIA HURTADO MOSQUERA	1128084798	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.119.391,63		$ 9.815.959,41	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
437	CH-RI-BN-M7-VE-015	MARLA CIRLENY PEREA PEREA	1128084836	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.305.880,38		$ 10.003.448,17	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
438	CH-RI-BN-M7-VE-016	JOSE ISRAEL PEREA MOSQUERA	11937787	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 9.963.066,80		$ 9.660.634,59	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
439	CH-RI-BN-M1-VE-017	MARLENIS PEREA MOSQUERA	1030422125	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.948.518,52		$ 10.646.086,31	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
440	CH-RI-BN-M1-VE-018	FANNY MOSQUERA MOSQUERA	1128084174	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 9.087.856,10		$ 8.785.423,88	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
441	CH-RI-BN-M1-VE-019	JOSE ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA	1030420559	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.947.353,35		$ 10.644.919,13	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
442	CH-RI-BN-M1-VE-020	NOEMI PEREA PEREA	1128084434	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.414.470,72		$ 10.112.038,50	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
443	CH-RI-BN-M1-VE-023	MARIA INES PEREA MOSQUERA	35450632	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 8.719.276,32		$ 8.416.844,10	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
444	CH-RI-BN-M10-VE-083	MARIA YURLEY RODRIGUEZ PEREA	1128084553	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.062.343,49	40%	$ 9.759.911,27	$ 3.903.964,51	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
445	CH-RI-BN-M1-VE-196	LUZ BELINA MOSQUERA MOSQUERA	1030420322	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 11.070.110,46		$ 10.767.678,25	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
446	CH-RI-BN-M1-VE-197	LUZ BELINA MOSQUERA MOSQUERA	1030420233	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.341.260,95		$ 10.038.828,73	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
447	CH-RI-BN-M1-VE-198	CLINSON BENITEZ MARTINEZ	1128084766	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.492.954,88		$ 10.190.522,66	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
448	CH-RI-ER-M2-VE-005	MARIA NIGILA PEREA PEREA	35851436	BARRIO ROSARIO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	29/7/2024	8/8/2024		$ 10.888.686,68	60%	$ 10.586.254,46		
449	CH-RI-LR-M4-IN-VE-022	LUIS ALDEMAR MOSQUERA DOMINGUEZ	1030420152	BARRIO REAL	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	1/8/2024	15/8/2024		$ 3.913.471,33	0%	$ 3.611.039,11	$ -	
450	CH-RI-LR-ML-IN-VE-025	MARTA LUZ MOSQUERA MOSQUERA	1030420807	BARRIO REAL	TIPO 1 Y LAVAPLATOS	Iniciada	5/8/2024	15/8/2024		$ 11.834.340,29	0%	$ 11.531.908,07	$ -	
451	CH-RI-BN-M10-IN-VE-063	MARIA ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ	1193035529	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 8.985.617,16		$ 8.683.184,94	$ -	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
452	CH-RI-LU-M7-IN-VE-030	MARIA CRUZCELINA SANCHEZ MOSQUERA	1133699053	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	16/8/2024	28/8/2024		$ 10.606.689,74	70%	$ 10.304.257,52	$ 7.212.980,27	APERTURADA EL DÍA 16/08/2024
453	CH-RI-BN-M10-IN-VE-072	LUIS EDUARDO MOSQUERA MOSQUERA	11937068	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 10.911.295,73		$ 10.608.863,51	$ -	
454	CH-RI-BN-M10-IN-VE-073	LUIS EDUARDO MOSQUERA MOSQUERA	11937068	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 6.881.268,24		$ 6.578.836,02	$ -	
455	CH-RI-BN-ML-IN-VE-074	MARTHA ZULENNY HURTADO MOSQUERA	1030421790	BARRIO NUEVO	ADECUACION Y LAVAPLATOS					$ 7.116.021,43		$ 6.813.589,21	$ -	
456	CH-RI-BN-ML-IN-VE-075	ARLEY MOSQUERA MOSQUERA	1030420067	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO					$ 8.702.715,53		$ 8.400.283,31	$ -	
457	CH-RI-BN-M1-IN-VE-077	MARÍA INOCENCIA MOSQUERA PEREA	1030420726	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 10.910.690,77		$ 10.608.258,56	$ -	
458	CH-RI-BN-M7-VE-078	MARÍA MARTHA SANCHEZ MOSQUERA	1030420254	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 10.233.448,65		$ 9.931.016,43	$ -	
459	CH-RI-BN-M7-IN-VE-079	HECTOR EMIRO RAMIREZ MOSQUERA	82363532	BARRIO NUEVO	TIPO 2 Y LAVAPLATOS					$ 8.920.400,72		$ 8.617.968,51	$ -	
460	CH-RI-BN-M7-IN-VE-080	MARÍA YUSELLY PEREA MOSQUERA	1128084465	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 10.712.056,23		$ 10.409.624,01	$ -	
461	CH-RI-BN-M7-IN-VE-081	MARÍA ELVIA MOSQUERA PEREA	1128084723	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	21/8/2024	30/8/2024		$ 11.050.081,85		$ 10.747.649,64	$ -	APERTURADA EL DÍA 21/08/2024
462	CH-RI-BN-M7-IN-VE-082	YULI PATRICIA MURILLO CAICEDO	1193032824	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 10.201.775,36		$ 9.899.343,14	$ -	
463	CH-RI-BN-M7-IN-VE-083	MARÍA DILIA SANCHEZ MOSQUERA	1128084721	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 11.291.985,11		$ 10.989.552,89	$ -	
464	CH-RI-BN-ML-IN-VE-084	AURELIANO SANCHEZ MOSQUEA	1030420574	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 11.523.782,30		$ 11.221.350,09	$ -	
465	CH-RI-BN-M1-IN-VE-085	FRANCISCO SANCHEZ PEREA	1133699101	BARRIO NUEVO	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS	Iniciada	21/8/2024	30/8/2024		$ 11.205.855,91		$ 10.904.423,69	$ -	APERTURADA EL DÍA 21/08/2024
466	CH-RI-BN-M8-IN-VE-086	CARMEN LEONILDA MOSQUERA MOSQUERA	1133699020	BARRIO NUEVO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 6.507.207,39		$ 6.204.775,17	$ -	
467	CH-RI-BN-M6-IN-VE-087	KETY LORENA PEREA HURTADO	1128084028	BARRIO NUEVO	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 12.798.670,30		$ 12.496.238,08	$ -	
468	CH-RI-LR-ML-IN-VE-002	JOSE DAVID NATIGAY PIPICAY	11937157	BARRIO REAL	TIPO 1					$ 10.180.998,52		$ 9.878.566,30	$ -	
469	CH-RI-LR-M1-VE-027	LUIS ANGEL NATIGAY URAGAMA	11935362	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO					$ 10.966.511,37		$ 10.664.079,16	$ -	
470	CH-RI-LR-M8-IN-VE-028	FRANCISCO URAGAMA PIPICAY	1030420717	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 11.011.832,79		$ 10.709.400,57	$ -	
471	CH-RI-LR-M8-IN-VE-029	CRUZ DARIS RAMIIREZ MOSQUERA	1030420673	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 11.185.983,61		$ 10.883.551,40	$ -	
472	CH-RI-LR-ML-IN-VE-030	MARÍA MOSQUERA MOSQUERA	1147951425	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO					$ 11.546.884,15		$ 11.244.451,93	$ -	
473	CH-RI-LR-M8-IN-VE-031	ASCENCIÓN SANCHEZ PEREA	3673058	BARRIO REAL	TIPO 1					$ 9.671.618,32		$ 9.369.186,10	$ -	
474	CH-RI-LR-M3-IN-VE-033	MARLI NATIGAY URAGAMA	1076820577	BARRIO REAL	TIPO 1 CON LAVADERO					$ 11.596.537,24		$ 11.294.105,02	$ -	
475	CH-RI-LU-M4-VE-036	LUISA PEREA PEREA	1030421468	BARRIO LA UNIÓN	ADECUACION					$ 2.275.498,44		$ 1.973.066,22	$ -	
476	CH-RI-LU-M5-VE-068	MARÍA NILSA MOSQUERA MOSQUERA	1133699023	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 12.286.815,05		$ 11.984.382,83	$ -	
477	CH-RI-LU-M6-IN-VE-018	MARÍA DE LOS SANTOS MOSQUERA MOSQUERA	1030420757	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 Y LAVAPLATOS					$ 11.378.391,35		$ 11.075.959,13	$ -	
478	CH-RI-LU-M3-VE-022	JOSE ERENIO MOSQUERA MOSQUERA	11936097	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2					$ 7.367.116,30		$ 7.064.684,09	$ -	
479	CH-RI-LU-M2-VE-005	JHON FREDY MOSQUERA SANCHEZ	82362946	BARRIO LA UNIÓN	ADECUACION Y LAVAPLATOS					$ 3.412.756,59		$ 3.110.324,37	$ -	
480	CH-RI-LU-M3-VE-029	MARÍA ECELSI COSSIO PEREA	1030420030	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 2 CON LAVADERO Y LAVAPLATOS					$ 9.886.952,08		$ 9.584.519,86	$ -	
481	CH-RI-LU-M6-IN-VE-031	FRANCISCO EVELIO MOSQUERA MOSQUERA	82363074	BARRIO LA UNIÓN	TIPO 1 CON LAVADERO					$ 12.706.004,84		$ 12.403.572,63	$ -	
482	CH-RI-ER-M4-VE-046	MARTA CECILIA RAMIREZ MOSQUERA	32352812	BARRIO ROSARIO	ADECUACION Y LAVAPLATOS					$ 9.609.558,62		$ 9.307.126,40	$ -	
483	CH-RI-ER-M1-IN-VE-026	JUAN CLEMENTE MOSQUERA MOSQUERA	15362696	BARRIO ROSARIO	TIPO 2					$ 9.783.490,59		$ 9.481.058,37	$ -	

INFORME SEMANAL SOCIAL # 43 COMPRENDIDO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2024

Durante este periodo se dio continuidad a las actividades del Plan de Gestión, social del Proyecto, realizando el acompañamiento al área técnica.

LUNES 05 DE AGOSTO:

El contratista de obra acompañamiento de Interventoria realizó capacitación casa a casa en educación sanitaria e instalación de acrílico a 10 beneficiarios.

MARTES 06 DE AGOSTO:

El contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó socialización casa a casa en el barrio La Unión realizando un diagnóstico efectivo. Se realizó reunión extraordinaria con los beneficiarios de un sector del barrio el Rosario, se contó con el acompañamiento del secretario de planeación, personero municipal, Gerente de la Empresa prestadora, para definir temas de conexión en donde se logró concertar con los beneficiarios para poder realizar las actividades de ejecución sin ningún inconveniente.

MIERCOLES 07 DE AGOSTO;

Día festivo

JUEVES 08 DE AGOSTO:

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizó socialización casa a casa a 8 beneficiarios en las aperturas de los próximos códigos e intervenir en el barrio El Rosario.

VERNES 09 DE AGOSTO:

El Contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó capacitación casa a casa en educación sanitaria instalación de acrílico a 7 beneficiarios en las viviendas entregadas y recibidas a satisfacción

SABADO 10 DE AGOSTO:

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizó Socialización casa a casa a un beneficiario en el barrio del Rosario para un diagnóstico afectivo.

DOMINGO 11 DE AGOSTO:

Se realizan actividades administrativas.

Capacitación casa a casa e instalación de acrílicos







Socialización y concertación casa a casa con beneficiarios del barro el Rosario







Reunión extraordinaria barrio el Rosario





Total: PQRS 230

Inclusiones Totales: 183

Quejas: 47

TOTAL, DE PQRS	230
Barrio Nuevo	90
BARRIO LA REAL	32
Barrio la Unión	34
Barrio el Rosario	26
TOTAL, DE PQRS APROBADAS POR LA ALCALDIA	183
TOTAL DE PQRS SIN RESPUESTA POR LA ALCALDIA	0
TPTAL DE PQRS CON RESPUESTA DEL OPERADOR	183
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X INCLUSIÓN	0
TOTAL DE PQRS CERRADAS X INCLUSIÓN	183
TOTAL DE PQRS POR QUEJAS	47
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X QUEJAS	2

Candelaria González Medina

Profesional Social de Interventoria

INFORME SEMANAL SOCIAL # 44 COMPRENDIDO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2024

Durante este periodo se dio continuidad a las actividades del Plan de Gestión, social del Proyecto, realizando el acompañamiento al área técnica.

LUNES 12 DE AGOSTO:

El contratista de obra acompañamiento de Interventoria realizó socialización casa a casa en las aperturas de nuevos códigos a 7 beneficiarios.

ARTES 13 DE AGOSTO:

El contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó socialización casa a casa en el barrio nuevo, para la apertura de 15 códigos a intervenir.

MIERCOLES 14 DE AGOSTO;

Se realizo acompañamiento al área técnica para validación de las viviendas terminadas en donde el equipo social realizaron recomendaciones a los beneficiarios sobre temas de educación sanitaria y el buen uso de los elementos instalados.

JUEVES 15 DE AGOSTO:

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizó socialización casa a casa a 7 beneficiarios en las aperturas de los próximos códigos e intervenir en barrio nuevo, también se realizaron 8 capacitaciones casa a casa en temas de educación sanitaria e instalación de acrílico en las viviendas recibidas por los beneficiarios. Asimismo, se realizó un recorrido de obra por los cuatro barrios priorizados con el acompañamiento de dos miembros del comité veedor y profesionales sociales de la empresa de servicios publico obra e interventoria.

VERNES 16 DE AGOSTO:

El Contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó capacitación casa a casa en educación sanitaria instalación de acrílico a 9 beneficiarios en las viviendas entregadas y recibidas a satisfacción

SABADO 17 DE AGOSTO:

El Contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó capacitación casa a casa en educación sanitaria instalación de acrílico a 3 beneficiarios en las viviendas entregadas y recibidas a satisfacción

DOMINGO 18 DE AGOSTO:

Se realizan actividades administrativas.

Capacitación casa a casa e instalación de acrílicos







Socialización y concertación casa a casa con beneficiarios del barro nuevo





Recorrido de obra con veeduría y actores del PCI


15/08/2024 10:01:35 a. m.
CH-RI-LR M3- VE-025


15/08/2024 11:38:07 a. m.
CH-RI-LR M3- VE-025

Total: PQRS 232

Inclusiones Totales: 183

Quejas: 49

TOTAL, DE PQRS	232
Barrio Nuevo	90
BARRIO LA REAL	32
Barrio la Unión	34
Barrio el Rosario	26
TOTAL, DE PQRS APROBADAS POR LA ALCALDIA	183
TOTAL DE PQRS SIN RESPUESTA POR LA ALCALDIA	0
TPTAL DE PQRS CON RESPUESTA DEL OPERADOR	183
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X INCLUSIÓN	0
TOTAL DE PQRS CERRADAS X INCLUSIÓN	183
TOTAL DE PQRS POR QUEJAS	49
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X QUEJAS	3

Candelaria González Medina

Profesional Social de Interventoria

INFORME SEMANAL SOCIAL # 45 COMPRENDIDO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2024

Durante este periodo se dio continuidad a las actividades del Plan de Gestión, social del Proyecto, realizando el acompañamiento al área técnica.

LUNES 19 DE AGOSTO:

Día festivo, no se realizaron actividades

ARTES 20 DE AGOSTO:

El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 10 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda.

MIERCOLES 21 DE AGOSTO;

El contratista de obra en acompañamiento de Interventoria realizó apertura seis viviendas próximas a intervenir en barrio Nuevo

JUEVES 22 DE AGOSTO:

El contratista de obra e interventoria realizaron actividades administrativas, para organización de carpetas de entregas.

VERNES 23 DE AGOSTO:

El contratista de obra e interventoria realizaron actividades administrativas, para la organización de carpetas de entregas.

SABADO 24 DE AGOSTO:

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizo validación de 16 viviendas que estaban programas para entregar a satisfacción a la

interventoria, con el fin de poder realizar la entrega a los beneficiarios, también se realizó revisión de los buzones de sugerencias.

DOMINGO 25 DE AGOSTO:

Se realizan actividades administrativas.

Socialización y concertación casa a casa con beneficiarios del barro nuevo



Validación en viviendas programadas para entregar a la interventoria



Revisión de buzones de sugerencias



Total: PQRS 233

Inclusiones Totales: 183

Quejas: 50

TOTAL, DE PQRS	233
Barrio Nuevo	90
BARRIO LA REAL	32
Barrio la Unión	34
Barrio el Rosario	26
TOTAL, DE PQRS APROBADAS POR LA ALCALDIA	183
TOTAL DE PQRS SIN RESPUESTA POR LA ALCALDIA	0
TPTAL DE PQRS CON RESPUESTA DEL OPERADOR	183
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X INCLUSIÓN	0
TOTAL DE PQRS CERRADAS X INCLUSIÓN	183
TOTAL DE PQRS POR QUEJAS	50
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X QUEJAS	3

Candelaria González Medina

Profesional Social de Interventoria

INFORME SEMANAL SOCIAL # 46 COMPRENDIDO DEL 26 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Durante este periodo se dio continuidad a las actividades del Plan de Gestión, social del Proyecto, realizando el acompañamiento al área técnica.

LUNES 26 DE AGOSTO:

El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 6 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda en donde se evidencio que están contentos con la intervención realizada en su casa.

MARTES 27 DE AGOSTO:

El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 3 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda. Asimismo, en horas de la tarde se realizó una capacitación sectorizada en educación sanitaria con los beneficiarios de los barrios la Real, la unión y el Rosario, la reunión se realizó en las instalaciones de la casa del adulto mayor, se contó con la participación activa de los beneficiarios de asistentes y dos miembros de la veeduría del proyecto.

MIERCOLES 28 DE AGOSTO;

El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 6 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda en donde se evidencio que están contentos con la intervención realizada en su casa.

JUEVES 29 DE AGOSTO:

El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 6 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda en donde se evidencio que están contentos con la intervención realizada en su casa. Se logró capacitar a tres beneficiarios en temas de educación sanitaria e instalación y socialización de acrílicos.

VERNES 30 DE AGOSTO:

El contratista de obra acompañamiento de la Interventoria realizó acompañamiento área técnica en 6 viviendas que están programadas para entrega en donde se validó la percepción social de los beneficiarios referente la intervención de su vivienda en donde se evidencio que están contentos con la intervención realizada en su casa. Se logró capacitar a una beneficiaria en temas de educación sanitaria e instalación y socialización de acrílicos. También se participó en la capacitación al personal de mano de obra no califica en donde se les realizaron recomendaciones para la correcta ejecución de las viviendas, el respeto a los beneficiarios y el trabajo en equipo con el área social y técnica de obra e interventoria.

SABADO 31 DE AGOSTO:

El contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria realizo validación de viviendas que estaban programas para entregar a satisfacción a la interventoria, con el fin de poder realizar la entrega a los beneficiarios.

DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE:

Se realizan actividades administrativas.

Capacitación casa a casa en temas de educación sanitaria









Capacitación sectorizada en educación sanitaria







Capacitacion al personal de mano de obra no calificada en temas de intres



Total: PQRS 234

Inclusiones Totales: 183

Quejas: 51

TOTAL, DE PQRS	234
Barrio Nuevo	90
BARRIO LA REAL	32
Barrio la Unión	34
Barrio el Rosario	26
TOTAL, DE PQRS APROBADAS POR LA ALCALDIA	183
TOTAL DE PQRS SIN RESPUESTA POR LA ALCALDIA	0
TPTAL DE PQRS CON RESPUESTA DEL OPERADOR	183
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X INCLUSIÓN	0
TOTAL DE PQRS CERRADAS X INCLUSIÓN	183
TOTAL DE PQRS POR QUEJAS	51
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X QUEJAS	5

Candelaria González Medina

Profesional Social de Interventoria

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST

Subprograma seguridad industrial

- **Actividades**

Cumplir y hacer cumplir al Contratista en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos laborales), así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

Cumplir y hacer cumplir al contratista los protocolos de bioseguridad.

Actividades realizadas enfocadas en prevención

- **Entrega de elementos de protección personal**

A la hora de combatir los riesgos de accidentes y perjuicios para la salud, es necesario utilizar la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar riesgo en su origen o proteger a los empleados mediante las disposiciones de protección colectiva.

Cuando las medidas son insuficientes, se impone la utilización de equipos de protección personal (EEP), con el fin de prevenir los riesgos laborales. Desde el punto de vista técnico, los EPP actúan disminuyendo algunos de los componentes factoriales de riesgo.

Por lo anterior, el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL, durante el mes de agosto de 2024 se le ha solicitado al contratista de obra, entregar de manera oportuna la dotación de los elementos de protección personal al personal de mano de obra no calificado, el cual ha hecho caso omiso a las solicitudes realizadas por esta interventoría.

Cabe señalar que, esta interventoría ha solicitado al contratista de obra implementar medidas para garantizar que todo el personal de obra y administrativo cuente con todos los implementos de seguridad requeridos. Por tal motivo, es importante señalar que si bien la interventoría ha realizado los recorridos de validación de EPPs y su utilización, es importante establecer que la interventoría puede dar fe de su uso de los

profesionales o trabajadores de mano de obra que han sido informados de manera oportuna y en debida forma, es por esta razón que se advierte que sin perjuicio a las validaciones efectuadas por la interventoría, es responsabilidad del contratista de obra garantizar que todo el personal en obra cuente con las condiciones de seguridad y protección; en tal sentido recae sobre el contratista de obra todas las responsabilidades que se tengan con el personal contratado a su nombre y aquel que no haya sido informado a la Interventoría.

- **Inspecciones realizadas.**

En el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2024, se realizó inspecciones en obra por parte de la Interventoría. Cabe señalar que, la interventoría realiza recorridos de validación de actividades en obra referente al componente PGIO.

ÍTEM	INSPECCIÓN	FECHA
1	Inspección de elementos de protección personal (Epp)	02/08/2024 15/08/2024 29/08/2024
2	Inspección de Extintores	30/08/2024
3	Inspección de Botiquín	30/08/2024
4	Inspección Locativa	30/08/2024

Tabla 19. Inspecciones

Fuente: Autor

- **Identificación y factores de riesgo**

La interventoría verificó que dentro de la matriz de riesgos suministrada dentro del plan de calidad y durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2024, no ha sido modificada ni se ha incluido valor o dato alguno por el contratista y por ende esta interventoría continua con el seguimiento y revisión de acuerdo a los factores señalados por el contratista.

- **Afiliaciones y pagos de seguridad social**

El contratista ha presentado las planillas de aportes al sistema de seguridad social, los cuales han sido revisados y verificados por esta interventoría; cabe señalar que, aunque el contratista no ha aportado las planillas de manera oportuna dentro de los plazos establecidos, se ha podido validar que el personal que es aportado por el contratista en la relación de personal o listado de obra, cuenta con las afiliaciones al sistema de seguridad social y ARL.

Es importante señalar que, si bien la interventoría ha realizado la validación de planillas aportadas por el contratista de obra, se advierte que la misma es revisada y/o aprobada bajo el principio de la buena fe del contratista. Ahora bien, se advierte que, sin perjuicio a las validaciones efectuadas por la interventoría, es responsabilidad del contratista de obra garantizar a todo el personal en obra las condiciones de seguridad y protección; en tal sentido recae sobre el contratista de obra todas las responsabilidades que se tengan con el personal contratado a su nombre y aquel que no haya sido informado a la Interventoría.

El pago de aportes parafiscales correspondiente al mes de agosto es efectivo antes de la fecha de vencimiento de la planilla.

- **Relación de personal en obra (contratista de obra)**

En el periodo del presente informe, la Interventoría reporta que el contratista de obra cuenta con el siguiente personal en obra profesional y adicional para la actividad No. 3:

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
JAIR ALFREDO	HERNANDEZ ANTONIO	1111199851	RESIDENTE DE OBRA
SADDY SOFIA	BELTRÁN GARCÍA	1100693213	PROFESIONAL SOCIAL
MARIA LIRIS	MOSQUERA MOSQUERA	1049373887	PROFESIONAL SOCIAL
LAURA CARELIS	ALVARES TAUTIVA	1110593683	ALMACENISTA
JUAN DAVID	TORRES DÁVILA	1076335432	INSPECTOR DE OBRA
VERÓNICA LIZBETH	ESCANDÓN POLANCO	1075222484	INSPECTOR DE OBRA
ALBERT STEVEN	FAJALOZANO	1110579517	INSPECTOR DE OBRA
NEURO RAFAEL	URDANETA ORTIZ	1235241152	INSPECTOR DE OBRA
MELISA	GONZALEZ SERNA	1077477808	INSPECTOR DE OBRA
LEIDIS MARGARITA	MONTERO POLONIA	1052089311	INSPECTORA PGIO
CAMILO	MOSQUERA MOSQUERA	1076331723	CONDUCTOR MOTO CARRO
JOSE ELSIA	MOSQUERA MOSQUERA	1030422170	AYUDANTE MOTO CARRO
JOSÉ ERMES	MOSQUERA RAMIREZ	71377421	AYUDANTE MOTO CARRO
JOSE ISAÍAS	BENÍTEZ QUINTO	9728682	AUXILAR DE ALMACÉN

Tabla 20. Personal Administrativo Contratista de Obra

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
ROBINSON	PEREA MOSQUERA	1193063956	AYUDANTE MOTO CARRO
JOSE EDIER	MOSQUERA MOSQUERA	1128084832	AUXILAR DE ALMACÉN
JORGE ANTONIO	MOSQUERA MOSQUERA	94060764	AUXILIAR MOTO CARRO
SEGUNDO MIGUEL	BARLIZA	1147943253	OFICIAL DE OBRA
ALDEMAR ANTONIO	DE LA HOZ PRENTH	8795213	OFICIAL DE OBRA
LUIS EDUARDO	CAMPO GUTIERREZ	1044624736	AYUDANTE DE OBRA
ALFREDO EDUARDO	MORENO AVILA	72209723	OFICIAL DE OBRA
DANIEL SEGUNDO	RODRIGUEZ RAMIREZ	5984930	OFICIAL DE OBRA
MIGUEL ALBERTO	ROMERO RAMIREZ	840044258	OFICIAL DE OBRA
JULIO	CONTRERAS MENDOZA	18880150	AYUDANTE DE OBRA
YSMARIS	PEREA BENITEZ	71686667	AUXILIAR DE ALMACEN
MANUEL	VASQUEZ DE LA HOZ	72300779	OFICIAL DE OBRA
JESUS NOLBERTO	IRIARTE URDANETA	1124362017	OFICIAL DE OBRA

Fuente: Autor

Durante este periodo, la interventoría cuenta con el siguiente personal Administrativo y operativo:

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Oscar Mauricio	Almario Fernández	1.077.862.072	Director De Interventoría Y Profesional De Costos Y Presupuestos
Víctor Luis	Murillo Ramírez	1.076.385.068	Residente Interventoría
Duvan Felipe	Mosquera Mosquera	1.007.448.719	Técnico PGIO
Cristian Alejandro	Otalora	1.051.240.481	Técnico PGIO
Candelaria	Gonzales Medina	26.883.989	Profesional Social
David Leonardo	Rozo Gasca	1.121.199.334	Especialista Estructural
Jorge Luis	Salaiman Lamadrid	79.214.426	Especialista Hidrosanitario
Cristian David	Galvis Najar	1.049.630.656	Especialista HSEQ
Luisa Fernanda	Herrera Jiménez	1.102.876.070	Inspector Interventoría

Tabla 21. Personal administrativo y operativo de Interventoría

Fuente: C&E Engineering SAS

- **Manejo de maquinaria y/o herramienta menor y/o papelería**

Durante este periodo no se contó con maquinaria y/o equipos. Se aclara que únicamente se cuenta con herramienta menor como: pulidoras de diferentes pulgadas, cintas métricas, taladros, codales, palas, palustres, barras, cinceles, y picas; sin embargo, los mismos no hacen parte de equipos a ser relacionados en el presente proyecto. De acuerdo al alcance contractual y tipología del proyecto no se cuenta con equipo y/o maquinaria propia y/o alquilada.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

Durante este periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, las actividades desarrolladas por la interventoría son las siguientes:

1. Revisión de documentación:

- Se revisó la documentación entregada por el contratista de obra, incluyendo:
    - Programas de trabajo.
    - Informes mensuales.
    - Informes semanales.

2. Acompañamiento a jornadas de capacitación y charlas:

- Durante el periodo en cuestión, se realizaron charlas informativas dirigidas a todo el personal de mano de obra calificada y no calificada. Estas charlas tuvieron lugar en la cancha central del municipio, en un horario de 7:00 a.m., tres días a la semana. se contó con asistencia masiva del personal, quienes asistieron se mostraron receptivos a los temas tratados y se comprometieron a poner en práctica las recomendaciones impartidas por los profesionales PGIO de Obra e Interventoría.

Sin embargo, posteriormente se logró mantener esta participación masiva sin experimentar una deserción significativa de personal durante el periodo.

- ❖ Los temas tratados son los siguientes:

- Estrés laboral, prevención.
- Riesgos mecánicos.

- Accidente, casi accidentes y enfermedades laborales.
- Manipulación manual de carga.

3. Validación y verificación del personal con los elementos de protección personal (epp)

- Tras llevar a cabo una inspección al personal de mano de obra, se descubrió que tanto los trabajadores calificados como los no calificados carecían de los equipos de protección necesarios y en condiciones adecuadas. Como consecuencia de esta inspección, se emitieron una serie de recomendaciones al contratista con el propósito de garantizar el uso constante y correcto de los equipos de protección por parte de todo el personal.

Las observaciones realizadas al contratista enfatizan la importancia de que todos los trabajadores utilicen los elementos de protección personal de manera constante y correcta durante sus labores. Esto es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los empleados en el sitio de trabajo.

4. Acompañamiento al área técnica:

- Se acompañó al área técnica en la realización de diferentes actividades, como:
  - Inspección de materiales.
  - Control de calidad de obra.
  - Recorrido de porcentajes.

5. Verificación de entrega de materiales:

- Se verificó que los materiales entregados en cada vivienda a intervenir según el formato PCI 010, el cual lo remite el contratista y es validada por esta interventoría para el inicio de las obras en el segundo y tercer barrio priorizado por el Ministerio de vivienda ciudad y Territorio (LA REAL, LA UNION, EL ROSALRIO) cumplieran con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas.

6. toma de muestras para ensayos de laboratorio.

❖ La toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizada en conjunto con el contratista de obra, es esencial para:

- **Control de Calidad**: Verifica que los materiales cumplen con los estándares y especificaciones técnicas requeridas.
- **Garantía de Seguridad**: Asegura la integridad estructural identificando y corrigiendo posibles defectos en los materiales.
- **Cumplimiento Normativo**: Asegura que los materiales y técnicas de construcción cumplen con las regulaciones y códigos de construcción, evitando sanciones y garantizando la conformidad con los estándares establecidos.

ANEXO
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Charlas y capacitaciones





Capacitación masiva con personal de obra y personal administrativo





Actividad de toma de muestras de laboratorio - especimenes de concreto







C&E ENGINEERING SAS
PROYECTA, DISEÑA Y CONSTRUYE



DUVAN FELIPE MOSQUERA
TECNICO PGIO INTERVENTOR

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Plan de Gestión Ambiental

La interventoría revisa el cumplimiento de los programas ambientales incluidos en el plan de acción socio - ambiental - PASAO y cada uno de los aspectos mínimos de la Legislación Ambiental aplicables a la etapa inicial del proyecto conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Rio Iró realizado actividades y gestiones en el mes de agosto del 2024 con el fin de dar cumplimiento al plan de manejo ambiental.

Medidas de Manejo

El contratista ha entregado el certificado realizado por parte de la empresa prestadora de servicios públicos de la población donde se indica el permiso y el espacio otorgado en el centro de recolección de residuos sólidos de la comunidad, La interventoría seguirá supervisando el cumplimiento de este requisito para la actividad No. 3.

Gestión de residuos:

Los residuos ordinarios deben permanecer el menor tiempo posible dentro de la obra. Todos los residuos no reciclables, tales como empaques de mecato, papel carbón, servilletas, equipo de protección personal usado y residuos orgánicos como restos de comida, serán entregados al carro recolector de residuos del municipio. Cabe señalar que tanto el contratista de obra como la interventoría se encuentran implementando la disposición de residuos en las oficinas.



Figura 2. Punto Ecológico
Autor: Autor

La interventoría verificó que el contratista lleve a las personas o empresas que están interesadas en recibir materiales reciclables, resultantes de las actividades del proyecto para que éstas se encarguen de su recolección semanal, transporte y gestión.

La interventoría verifico que el contratista cuenta con una cuadrilla de limpieza del proyecto dotada de utensilios como palas escobas, y tendrán bajo su responsabilidad mantener los sitios de la obra en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de materiales de desecho. Cabe señalar que la interventoría ha efectuado las observaciones de limpieza al contratista de obra durante el periodo y ha validado que se encuentren adelantando las actividades correspondientes.

2.2.1 Medidas de Manejo Para Demarcación y aislamiento

La interventoría verificó una vez se dio inicio a la actividad N°3, que el contratista esté cumpliendo con las medidas descritas a continuación

- Los materiales que están utilizando en la ejecución de la obra se estén almacenando en la bodega, en forma separada, identificándose y conservándolos con las recomendaciones de los proveedores, con el fin de conservar sus propiedades físicas hasta el momento de su utilización.
- El material se esté acopiando de tal manera que no se contamine o mezcle y que a cada frente de trabajo sea transportado con los materiales necesarios durante la jornada diaria, evitando así la acumulación de materiales.
- Los materiales permanecen tanto en su sitio de almacenamiento, como en el frente de trabajo, debidamente cubiertos con el fin de evitar la emisión de partículas y derrame hacia fuentes hídricas.

- Mantenimiento adecuado de los vehículos y así disminuir el proceso de combustión incompleta de los motores, para evitar emisiones de gases.

Actividades de capacitación y divulgación

La interventoría realiza acompañamiento al contratista una vez se dio inicio a la actividad N°3, donde se efectuaron capacitaciones a su personal de trabajo con el fin de divulgar y dar a conocer cómo se implementará el plan de manejo ambiental tanto en obra como en las instalaciones de la oficina.

Manejo de residuos sólidos diferentes a RCD

La limpieza general del área administrativa se deberá realizar cada 3 días de la semana, Para realizar la recolección de los residuos, se utilizan los elementos de protección personal necesarios y las herramientas adecuadas.
Los residuos sólidos generados en la oficina, deberán ser depositados en las canecas ubicadas para tal fin, como se detalla en la Figura 2. Punto Ecológico.

Manejo de residuos sólidos RCD

Debido a que en la jurisdicción del municipio de Rio Iro no hay escombrera certificada para efectos de los materiales sobrantes provenientes del proyecto estos son donados a miembros de la comunidad que los requieran o depositados en zonas degradadas por la minería, el contratista obtuvo una certificación expedida por el secretario de planeación y obras públicas del municipio de Rio Iro, donde manifiestan la inexistencia de la misma y la alternativa para cumplir con este apartado de gestión ambiental.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

durante este periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto del 2024, las actividades realizadas por la interventoría son las siguientes:

1. **Acompañamiento a jornadas de capacitación:**
   Durante el periodo en cuestión, se realizaron charlas informativas dirigidas a todo el personal de mano de obra calificada y no calificada. Estas charlas tuvieron lugar en la cancha central del municipio, en un horario de 7:00 a.m., tres días a la semana. se contó con asistencia masiva del personal, quienes asistieron se mostraron receptivos a los temas tratados y se comprometieron a poner en práctica las recomendaciones impartidas por los profesionales PGIO de Obra e Interventoría.

C&E ENGINEERING SAS
PROYECTA, DISEÑA Y CONSTRUYE

2. **Temas tratados en las charlas y capacitaciones**

- Medio ambiente, residuos peligrosos.
- Que se puede hacer para prevenir el paludismo.
  Cuidado del agua.

3. **Acompañamiento al área técnica**

Se realizó el acompañamiento al área técnica en la ejecución de diferentes actividades tales como:

- Inspección de materiales.
- Control de calidad de obra.

4. **Manejo y control de RCD provenientes de la obra balances por m^3**

el municipio Río lró no cuenta con una escombrera certificada para efecto de los materiales sobrantes provenientes de las obras, estos son donados a miembros de la comunidad que los requieran o depositados en zonas degradadas por la minería; es de aclarar que el secretario de planeación y obras públicas del municipio de Rio Iró en cumplimiento de las funciones que lo asisten como secretario de planeación y obras públicas del municipio de Rio iró, de departamento del chocó y actuando en representación de la administración municipal de Río lró, certifico lo anteriormente expuesto, esta interventoría está realizando un riguroso cumplimiento a esta actividad para dar cumplimiento al plan de manejo ambiental.

C&E ENGINEERING SAS
PROYECTA, DISEÑA Y CONSTRUYE

ANEXO
REGISTRO FOTOGRAFICO

Charlas y capacitaciones	
	
Capacitación masiva con personal de obra y personal administrativo	
	

DUVAN FELIPE MOSQUERA
TECNICO PGIO INTERVENTORIA

PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO BASICO

INFORME MENSUAL NUMERO 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024

1. Línea de comunicación

Visitas casa a casa

Con el objetivo de brindar información detallada sobre el Proyecto, el equipo social realizó visitas domiciliarias para responder preguntas y aclarar dudas sobre e inquietudes de los potenciales beneficiarios. Durante estas visitas, se explicaron a los residentes los criterios de selección del proyecto, así como los detalles de las actividades de diagnóstico llevadas a cabo en cada vivienda. Además,

Durante estas visitas, el equipo social hizo hincapié en la importancia de concertar con el equipo técnico el espacio para la intervención, no dejar losmenore de edad solos en las viviendas durante la ejecución de las obras, mantener los materiales recibidos bajo custodia, para poder intervenir la vivienda sin dificultades y no dejar los trabajadores solos en las viviendas durante la ejecución de las obras.

La comunidad manifestó sus dudas referentes al Proyecto, las cuales fueron el proceso de inclusión, tiempo de inicio de las obras, falta de red de alcantarillado, las cuales fueron resueltas por el equipo social y entendidas por los potenciales beneficiarios.

Durante este periodo se informa que se han realizado 17 visitas de socialización casa a casa para un total hasta la fecha de 638 visitas, en los 4 barrios priorizados del PCI, en barrio nuevo se han llevado a cabo 302 visitas de la cuales 233 son efectivas 54 no efectivas y 12 renuncias; en el segundo barrio priorizado (barrio la real) se lleva un total de 83 visitas casa a casa de las cuales 61 son efectivas, 14 no efectivas y 8 renuncias, el tercer barrio priorizado (barrio la unión) se llevan 108 visitas casa a casa, de las cuales 78 son efectivas, 24 no efectivas y 7 renuncias y por último, el cuarto barrio priorizado (barrio el rosario) se lleva un total de 144 visitas casa a casa a la fecha, siendo 101 efectivas, 29 no efectivas y 17 renuncias.

Avanzada social

en el transcurso del mes se realizaron 36 visitas de avanzada social, esto con el fin de informarle a los beneficiarios los motivos de las visitas de los equipos de obra e interventoría y de esta manera contar con ellos al momento de la visita.

Acompañamiento al área técnica

Durante la ejecución de las unidades sanitarias en los códigos en ejecución se han presentado situaciones particulares, para atender dichas situaciones se hace un acercamiento hasta la vivienda con los equipos técnico y social de obra e interventoría, con el fin de dar solución a estas situaciones y en caso tal, llegar a un acuerdo con los beneficiarios y seguir el curso de la intervención.

Material de divulgación (Perifoneo)

El día 28 de agosto se realizó perifoneo en los barrios La Real, La Unión y El Rosario invitando a los beneficiarios de estos barrios a la capacitación sectorizada en Educación Sanitaria.

2 Línea de participación comunitaria:

PQR

Durante el periodo reportado en el presente informe se recepciono cuatro (04) PQR por quejas. Cabe informar que, las 6 PQR que se encuentran abiertas a corte del presente informe son por quejas técnicas. Asimismo, se le recomendó al contratista de obra realizar la atención y cierre de las mismas en los tiempos establecidos en la normatividad vigente.

No. de PQR recepcionadas en el mes	No. de PQR Totales	No. de PQR pendiente de respuesta	No. de PQR cerradas
04	234	06	228

PQR POR QUEJAS

CONSECUTIVO	CODIGO	MOTIVO	FECHA DE RECEPCION	ESTADO	O FECHA DE CIERRE	FECHA ESTIMADA PARA CERRAR
103	EMPRESA DE SERVIVCIOS PUBLICOS	Mal manejo de residuos	29/01/2024	CERRADA	30/01/24	
104		Material que obstruía el paso	29/01/2024	CERRADA	04/04/24	
105	CH-RI-BN-M1-VE-037	Demora en las obras	01/02/2024	CERRADA	18/03/24	
106	CH-RI-BN-M10-VE-017	Demora en las obras	01/02/2024	CERRADA	01/03/24	
111	CH-RI-BN-M1-VE-131	Demolición del mesón	08/02/2024	CERRADA	22/02/24	
114	CH-RI-BN-M5-VE-148	Demora en las obras	15/02/2024	CERRADA	12/03/24	
119	CH-RI-BN-M1-VE-027	Demora en las obras	21/02/2024	CERRADA	14/03/24	
120	CH-RI-BN-M1-VE-029	Demora en las obras	21/02/2024	CERRADA	05/03/24	
121	CH- RI-BN-M1-VE-126	Por concertación con la señora, ya se definió que se va a realizar	26/02/2024	CERRADA	07/05/2024	
123	CH-RI-BN-M7-IN-VE-013	Solicitud de intervención	27/02/2024	CERRADA	18/03/24	
127	CH-RI-BN-M1-VE-138	Utilización de material	01/03/2024	CERRADA	07/03/24	
128	CH-RI-BN-M1-VE-059	Demora en las obras. No se ha podido culminar porque la vivienda está siendo utilizada como bodega	12/03/2024	CERRADA	05/05/2024	

157	CH-RI-BN-M8-VE-072	Demora en las obras. La vivienda no se ha podido entregar debido a que falta pintura en la adecuación, esto se debe a que no se podido ingresar a la vivienda, por el estado de salud de las hijas del beneficiario.	20/03/2024	CERRADA	06/06/2024	
164	CH-RI-BN-M5-VE-148	Fuga en lavadero	05/04/2024	CERRADA	09/04/24	
165	FERRETERIA	Deuda	05/04/2024	CERRADA	19/04/24	
166	CH-RI-BN-M5-VE-148	Lavaplatos tapado	08/04/2024	CERRADA	09/04/24	
170	CH-RI-BN-M10-VE-086	Demora en las obras, la cual no se ha podido entregar porque no hay conexión de alcantarillado y la alcaldía quedo con el compromiso de realizar la conexión	11/04/2024	CERRADA	31/05/24	
171	CH-RI-BN-M10-VE-087	Demora en las obras	11/04/2024	CERRADA	28/05/2024	
172	CH-RI-BN-M7-IN-VE-034	Fuga en lavamanos. El equipo técnico realizo acercamiento a la vivienda y no evidencio fuga	11/04/2024	CERRADA	07/05/24	

174	CH-RI-BN-M6-VE-158	Demora en las obras, la cual no se ha podido entregar debido a que falta la instalación del lavadero, el cual no hay disponibilidad del elemento	13/04/2024	CERRADA	01/06/24	
175	CH-RI-BN-M7-VE-049	Agua resumida. No se ha cerrado la PQR debido a que hay que identificar la procedencia de las aguas.	15/04/2024	CERRADA		06/04/2024
176	CH-RI-BN-M8-VE-066	Fuga en lavaplatos	15/04/2024	CERRADA	29/04/24	
177	CH-RI-BN-M4-VE-179	Muro fisurado	13/04/2024	CERRADA		
178	CH-RI-BN-M1-VE-140	Malos olores en la caja de inspección	13/04/2024	CERRADA	19/04/24	
179	CH-RI-BN-M10-VE-095	Agua salía por cimentación	13/04/2024	CERRADA	23/04/24	
180	CH-RI-BN-M6-VE-116	Entrega de la unidad sanitaria	13/04/2024	CERRADA	29/05/2024	
181	CH-RI-BN-M1-VE-130	Fuga en lavamanos	15/04/2024	CERRADA	18/04/24	
182	CH-RI-BN-M1-VE-034	Empozamiento en la ducha	17/04/2024	ABIERTA		06/05/2024
183	CH-RI-BN-M8-VE-071	Intervención y entrega. No se ha entregado porque no hay lavadero	17/04/2024	CERRADA	14/06/24	

184	COLEGIO	Compromiso con la rectora, se procederá a llegar a un acuerdo donde6ingún de las partes se vea afectada	18/04/2024	CERRADA	15/08/24	
185	CH-RI-BN-M7-IN-VE-004	Anulación tubo de desagüé	18/04/2024	CERRADA	03/05/2024	
186	MATADERO	Tubo de desagüe del matadero	18/04/2024	CERRADA	30/05/24	
188	CH-RI-BN-M1-VE-037	Inodoro no llena	23/04/2024	CERRADA	30/04/2024	
189	CH-RI-BN-M1-IN-VE-024	Demora en las obras	24/04/2024	CERRADA	29/05/24	
193	RESTAURANTE	Deuda Oscar Méndez	06/05/2024	ABIERTA		
194	CH-RI-BN-M5-VE-157	Perdida de un balde y 3 vasos metálicos	08/05/2024	CERRADA	14/07/24	
195	CH-RI-BN-M6-IN-VE-047	Demora en las obras	08/05/2024	CERRADA	22/06/24	
196	CASA LA REAL	Deuda alquiler	09/05/2024	CERRADA	13/05/2024	
197	CASA DE B. NUEVO	Deuda alquiler	11/05/2024	CERRADA	11/05/2024	
198	CH-RI-BN-M7-VE-028	Fuga en lavamanos	09/05/2024	CERRADA	10/05/2024	
199	CH-RI-BN-M5-IN-VE-006	Demora en las obras	20/05/2024	CERRADA	11/06/24	
201	CH-RI-BN-M10-VE-085	Demora en las obras	05/06/24	CERRADA	15/06/24	
203	CH-RI-BN-M1-VE-128	Demora en las obras	05/06/24	CERRADA	30/07/24	
228	CH-RI-BN-M3-IN-VE-051	Perdida de cajas de cervezas	21/06/2024	ABIERTA		
229	CONDUCTOR	Choque de camionetas	21/06/2024	CERRADA	10/08/24	
230	SERVICIO DE INTERNET	Alambres tumbados	24/07/2024	ABIERTA		
232	LINO MOSQUERA	Reponer Tapa de	16/08/224	ABIERTA		

		Manjol en el barrio La Union				
233	JAVIER TUIRAN	Pago	16/08/2024	ABIERTA		
234	PEDRO ANGEL	Intervención vecina afecta su vivienda	23/08/224	ABIERTA		
235	JOSE MOSQUERA	Pago de incapacidad	30/08/2024	ABIERTA		

3. LINEA DE CAPACITACION

CAPACITACION CASA A CASA

En el transcurso del mes, se continuo con las entregas de unidades sanitarias y adecuaciones en las viviendas , una vez que la interventoría recibe las intervenciones, el equipo social de obra e interventoría procede a realizar la capacitación casa a casa en educación sanitaria y la instalación de acrílico, en la cual se le brindan recomendaciones a los beneficiarios para el uso y mantenimiento de la unidad sanitaria, durante este periodo se realizó capacitación casa a casa a 52 viviendas.

CAPACITACION SECTORIZADA EN EDUCACION SANITARIA

El 28 de agosto del presente año se llevó a cabo la capacitación sectorizada en educación sanitaria, a la cual se convocó a los beneficiarios de los barrios La Real, La Unión y El Rosario, esta se desarrolló en las instalaciones del Centro de Vida Adulto Mayor, contando con una asistencia de 25 beneficiarios del proyecto y dentro los cuales asistieron dos integrantes del comité veedor. Durante la reunión se les capacito en temas relacionados a la salud e higiene, uso adecuado de los aparatos sanitarios, uso adecuado de las redes de acueducto y alcantarillado y uso eficiente del agua, se logró la participación activa de los deficitarios y la satisfacción de poder recibir las obras que nunca habían podido ejecutar con recursos propios según lo manifestaron los veedores del proyecto.

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MEMORIA SOCIAL

Durante este periodo se realizó selección del beneficiario del barrio El Rosario para la memoria social del proyecto, el cual aceptó participar libre y voluntariamente, así mismo, firmó el consentimiento informado y se diligenciaron los formatos del Antes de las memorias social.

Beneficiario del Barrio El Rosario: CH-RI-ER-M7-VE-027
Segundo María Perea Perea
CC: 4827946 De Condoto
dirección: 003-00001210
Diagnóstico: Unidad sanitaria tipo 2 con lavadero y lavaplatos

REUNION CON EL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

El 9 de agosto del presente año se llevó a cabo una reunión con el personal de mano de obra no calificada del proyecto En el Barrio La Unión, a la cual asistieron 43 trabajadores y se contó con la presencia del personero municipal, Residentes técnicos y sociales de obra e interventoría. Durante el desarrollo de esta reunión se tocaron temas como la falta de materiales en la obra, la demora en los pagos, acuerdos de fecha de pagos y el buen trato al personal de mano de obra no calificada.

Cabe resaltar, que se logró realizar las actividades programadas desde el área social sin dificultades de igual forma, se contó con el apoyo de los miembros de la veeduría del proyecto.

Por otra parte, se informa que las respectivas evidencias de las actividades realizadas en cada una de las líneas de intervención del Plan de gestión social del proyecto. Se encuentran en el Drive de la entidad, según lineamientos de la supervisión social.



Candelaria González Medina
Residente social de Interventoría

RECOMENDACIONES GENERALES, CONCLUSIONES Y DIFICULTADES DEL PROYECTO (INFORME No. 12 – AGOSTO- 2024)

CONCLUSIONES

- Se concluye que para este periodo se ha cumplido por parte de la interventoría el debido seguimiento a las actividades técnicas, PGIO y sociales programadas por el contratista de obra en los barrios priorizados por Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y se han realizado las actividades programadas en la línea de Comunicación, para la implementación del Plan de Gestión Social del Proyecto, lo cual ha permitido la articulación entre la comunidad y los contratistas de obra e Interventoría.

- Durante el periodo del 01 al 31 de agosto del año 2024, se evidenció la satisfacción de la comunidad, al tener conocimiento del alcance del proyecto y de la ejecución de las obras. Cabe señalar que, aunque el contratista culmina y se realizar entrega a satisfacción de 52 intervenciones, las mismas se han realizado de acuerdo a la disponibilidad de servicios de agua potable, servicio de energía, clima en la zona y disponibilidad de los beneficiarios en la zona. Cabe señalar que, aunque se han realizado actividades en obra, terminación y recibo a satisfacción, no se han podido ejecutar las viviendas programadas en el plan de trabajo, pues como ya se ha manifestado en diferentes oportunidades por esta interventoría a la Entidad Contratante, las situaciones de orden público, puente desplomado, amenazas, servicio de agua, entre otros; han ocasionado una pérdida de tiempos no imputables al contratista de obra e interventoría.

RECOMENDACIONES

- La interventoría ha realizado diferentes requerimientos al contratista de obra a fin de que se garantice la salud y seguridad de todos los trabajadores y permitan dar cumplimiento a cada una de sus obligaciones contractuales, como:

  - Entregar a tiempo la información solicitada por la Interventoria, para la elaboración de informes, para poder cumplir con la entrega oportuna a la Entidad Contratante
  - Entrega oportuna de los informes semanales y mensuales con sus respectivos anexos.

  - Se le recomienda al contratista de obra realizar una avanzada técnico social en las viviendas que se van a apertura y entregar de manera oportuna la documentación requerida en el formato PCI-010.
  - Se recomienda al contratista de obra, atender a las inquietudes de los beneficiarios y dar cierre a las PQR, por quejas técnicas en los plazos establecidos por la norma.
  - Se recomienda al contratista de obra, realizar la entrega de las viviendas terminadas a esta Interventoria con el fin de poder entregar a satisfacción a los beneficiarios y evitar reprocesos y perdida de tiempos.
  - Se le recomienda al contratista de obra, más inspección técnica en las viviendas en ejecución, con el fin de garantizar la calidad de las obras, según las especificaciones técnicas establecidas a fin de evitar reprocesos al momento de recibir las mismas.
  - Se le recomienda al contratista de obra, suministrar y exigir a su personal el uso de los implementos de protección personal, tanto el personal de mano de obra calificada, como la no calificada

DIFICULTADES O PROBLEMÁTICAS

- Uno de los principales inconvenientes y dificultades presentadas en el periodo fue la falta del fluido eléctrico, fallas en la cobertura del internet y la falta de señal en la gran mayoría de los días, pues al no contarse con servicio de agua no fue posible realizar las pruebas necesarias para validar la funcionalidad de las obras realizadas, por tal motivo, fue necesario en diferentes oportunidades reprogramar visitas para recibo a satisfacción de viviendas.

- Se presentan lluvias de manera constante la cual generó atraso en el inicio y ejecución de las actividades programadas, situación que conlleva a reprogramar las actividades en diferentes oportunidades.

- Falta de personal de mano de obra no calificada en el proyecto a causa de renuncia del mismo. Por falta de pago oportuno a los cortes de obra.

- Durante el periodo se ha presentado dificultades en las excavaciones que se deben realizar en las conexiones intradomiciliarias, pues las viviendas han presentado gran material de relleno (Rocas o piedras), situación que ha generado reducción en los rendimientos de esta actividad y por ende a generado que se usen mayores tiempos en las intervenciones en cada vivienda. Cabe señalar que esta situación ya se ha presentado en diferentes viviendas y desde el inicio de las obras.

- Durante este periodo, se evidencia mal estado de la vía para acceso al municipio de Rio Iró. De acuerdo a lo señalado por el contratista de obra esta situación ha dificultado el correcto suministro de materiales necesario para la ejecución normal de la obra, pues por las condiciones de la vía, varios proveedores se han abstenido de cruzar por la misma, situación que afecta directamente sobre la ejecución de las obras, pues este tipo de situaciones ocasionan una reducción del rendimiento por falta de insumos necesarios para actividades que se encuentran adelantando y que no se cuenta con los materiales que no pudieron ser ingresados de manera oportuna por esta situación presentada. Es importante señalar que durante el periodo se efectuaron reuniones con el Municipio de Rio Iró a fin de que se atendiera a esta problemática presentada, de la cual a corte del 31 de mayo de 2024 no se encontraba subsanado en su totalidad, pues el Municipio ha manifestado que no se ha sido posible contar con el proceso licitatorio para poder realizar los mejoramientos correspondientes. Sin

embargo, los contratistas de obra e interventoria con el apoyo de la comunidad y conductores del sector, realizaron una jornada de mantenimiento en algunos puntos críticos de la vía, de igual forma, el contratista encargado de hacer los mantenimientos en la vía inicio sus trabajos la semana siguiente en donde se ha evidenciado el avance y mejora en toda la trocha el cual permite el ingreso de camiones con materiales.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

Informe Interventoría N° **12** **Fecha Informe** **2/08/2024** **Periodo comprendido entre** **1/08/2024** **y** **31/08/2024**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2230219 N° CONVENIO
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
SUPERVISOR:	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA - DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE

N°	FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO
1	2/08/2024	CAEE-RI-2024-374	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-235 Obs. Diagnosticos	Interventoria	contratista de Obra
2	6/08/2024	CAEE-RI-2024-375	Traslado de comunicado No, PPDI-OF-CGE-23-400 y concepto de interventoria	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
3	6/08/2024	CAEE-RI-2024-376	ENTREGA INFORME SEMANAL SOCIAL # 42	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
4	6/08/2024	CAEE-RI-2024-377	ENTREGA INFORME MENSUAL SOCIAL # 11	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
5	6/08/2024	CAEE-RI-2024-378	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-242	Interventoria	contratista de Obra
6	6/08/2024	CAEE-RI-2024-379	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-244 Obs. Diagnosticos	Interventoria	contratista de Obra
7	6/08/2024	CAEE-RI-2024-380	NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - NO ENTREGA INFORME	Interventoria	contratista de Obra
8	6/08/2024	CAEE-RI-2024-381	NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - CALIDAD	Interventoria	contratista de Obra
9	6/08/2024	CAEE-RI-2024-382	SOLICITUD RETIRO DE PERSONAL DE OBRA - SST	Interventoria	contratista de Obra
10	6/08/2024	CAEE-RI-2024-383	SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FRENTE A ACCIDENTE LABORAL	Interventoria	contratista de Obra
11	6/08/2024	CAEE-RI-2024-384	SOLICITUD DE DOTACION (EPPS) DEL PERSONAL EN OBRA	Interventoria	contratista de Obra
12	7/08/2024	CAEE-RI-2024-385	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OF-CGE-23-403 Devolucion Items NP	Interventoria	contratista de Obra
13	6/08/2024	CAEE-RI-2024-386	Entrega Informe semanal No. 44	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
14	8/08/2024	CAEE-RI-2024-387	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OF-CGE-23-404 Calidad	Interventoria	contratista de Obra
15	9/08/2024	CAEE-RI-2024-388	ATENCIÓN A MATRIZ 3 MOMENTOS (08-08-2024) Matriz para cobro	Interventoria	contratista de Obra
16	10/08/2024	CAEE-RI-2024-389	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OF-CGE-23-405 Obs. inf. semanal 42 y 43	Interventoria	contratista de Obra
17	10/08/2024	CAEE-RI-2024-390	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-248 aprob. Diagnosticos	Interventoria	contratista de Obra
18	10/08/2024	CAEE-RI-2024-391	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OF-CGE-23-406 Solic. Prorroga	Interventoria	contratista de Obra
19	13/08/2024	CAEE-RI-2024-392	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-247 Obs. Carpetas finales	Interventoria	contratista de Obra
20	13/08/2024	CAEE-RI-2024-393	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-254 Obs. Diagnosticos	Interventoria	contratista de Obra
21	13/08/2024	CAEE-RI-2024-394	ENTREGA INFORME SEMANAL SOCIAL # 43	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
22	14/08/2024	CAEE-RI-2024-395	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-247 Obs. Carp. Finales	Interventoria	contratista de Obra
23	16/08/2024	CAEE-RI-2024-396	Entrega Informe semanal No. 45	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
24	16/08/2024	CAEE-RI-2024-397	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-250 Obs carp. Finales	Interventoria	contratista de Obra

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

Informe Interventoría N° **12** **Fecha Informe** **2/08/2024** **Periodo comprendido entre** **1/08/2024** **y** **31/08/2024**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2230219 N° CONVENIO
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
SUPERVISOR:	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA - DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE

N°	FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO
25	20/08/2024	CAEE-RI-2024-398	ENTREGA INFORME SEMANAL SOCIAL No. 44	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
26	20/08/2024	CAEE-RI-2024-399	NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - SST	Interventoria	contratista de Obra
27	20/08/2024	CAEE-RI-2024-400	Aprobacion Informe Mensual Obra - Junio 2024	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
28	21/08/2024	CAEE-RI-2024-401	Entrega Acta Parcial de Obra No. 3	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
29	21/08/2024	CAEE-RI-2024-402	ENTREGA ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 5	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
30	21/08/2024	CAEE-RI-2024-403	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OF-CGE-23-409 Sol. Prorroga	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
31	22/08/2024	CAEE-RI-2024-404	Traslado de comunicado No, PPDI-OF-CGE-23-406 y concepto de interv	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
32	22/08/2024	CAEE-RI-2024-405	Entrega Informe semanal No. 46	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
33	22/08/2024	CAEE-RI-2024-406	Recomendacion Prorroga de la Orden de trabajo 2230223	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
34	23/08/2024	CAEE-RI-2024-407	CAEE-RI-2024-407 Solicitud Prórroga a la Orden de Servicio 2230219	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
35	27/08/2024	CAEE-RI-2024-407	Recomendacion Prorroga de la Orden de trabajo 2230223	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
36	27/08/2024	CAEE-RI-2024-408	Recomendacion Prorroga de la Orden de trabajo 2230223	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
37	27/08/2024	CAEE-RI-2024-409	Solicitud Prórroga y adición a la Orden de Servicio 2230219	Interventoria	Supervisión - Enterritorio
38	28/08/2024	CAEE-RI-2024-410	ATENCIÓN A COMUNICADO PPDI-OBR-CGE-23-252	Interventoria	contratista de Obra

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	CÓDIGO:	F-GG-31
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 2 de septiembre de 2024			**Informe correspondiente al mes de : Agosto**		**del año: 2024**	
CONTRATO No. :	2220223			**CONVENIO**			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						
VALOR DE CONTRATO:	$ 4.164.944.717,87						
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL						
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS						
PLAZO:	11 meses y 7 dias						
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$ 805.225.665,88			Como % del valor del Contrato	20%		
ADICIÓN #1 ANTICIPO:	$ 0,00			Como % del valor del Contrato	0%		
ADICIÓN #2 ANTICIPO:	$ 0,00			Como % del valor del Contrato	0%		
TOTAL ANTICIPO:	$ 805.225.665,88			Como % del valor del Contrato	20%		
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA** X	% AVANCE FISICO OBRA:	70,91%	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	51,10%
POLIZA No.	96-45-101081330			FECHA VENCIMIENTO POLIZA :	3/07/2025	VALOR ASEGURADO	$ 805.225.665,88
VALOR AMORTIZADO:	$ 291.821.830,75			PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ 513.403.835,13		

SALDO DE ANTICIPO AL PERIODO ANTERIOR	**$ 513.403.835,13**

LOS SIGUIENTES SON LOS PAGOS REALIZADOS CON CARGO AL ANTICIPO DEL CONTRATO, TODOS ELLOS EXCLUSIVAMENTE PARA COSTOS Y GASTOS DEL CONTRATO.

PAGO DE SALARIOS Y JORNALES (Con cargo al anticipo)						**VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN**	
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior						$ 0,00	$ 0,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$ 0,00	
Nuevo acumulado por este concepto						$ 0,00	

COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS - Exclusivamente del proyecto						**VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN**	
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior						$ 0,00	$ 0,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$ 0,00	
Nuevo acumulado por este concepto						$ 0,00	

TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA - Exclusivamente del proyecto						**VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN**	
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior						$ 0,00	$ 0,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$ 0,00	
Nuevo acumulado por este concepto						$ 0,00	

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS - Exclusivamente del proyecto						**VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN**	
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior						$ 764.964.382,59	$ 764.964.382,59
8/07/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 18 Reembolso por pago de salarios	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	901.727.278-1	N/A	$ 40.261.283,29	$ 764.964.382,59
28/06/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 17 Reembolso por pago de materialesDistribuidora Fermetal de Colombia SAS	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	901.727.278-1	N/A	$ 8.162.293,86	$ 724.703.099,30
11/04/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 16. Puertas	JUAN PABLO GIRALDO CABALLOS	70.907.076-8	N/A	$ 31.389.651,43	$ 716.540.805,44
9/04/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 15. Cemento Cemex	Gerardo Castaño Lopez	82.270.164-5	N/A	$ 21.586.766,47	$ 685.151.154,01
15/04/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 14 Reembolso por compra de tuberias, accesorios y otros en GERARDO CASTAÑO LOPEZ	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	901.727.278-1	N/A	$ 55.788.993,85	$ 663.564.387,54
1/04/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 13. Cemento Cemex	Gerardo Castaño Lopez	82.270.164-5	N/A	$ 21.586.766,47	$ 607.775.393,69
20/03/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 12. Cemento Cemex	Gerardo Castaño Lopez	82.270.164-5	N/A	$ 21.586.766,47	$ 586.188.627,22
20/03/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 11 Prefabricados Codinsa SAS	PREFABRICADOS CODINSA SAS	901.785.604-5	N/A	$ 36.562.500,00	$ 564.601.860,75
20/03/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 10 Reembolso por compra de tuberias, accesorios y otros en FERRETERIA FORERO S.A	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	901.727.278-1	N/A	$ 6.850.230,24	$ 528.039.360,75
1/03/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 9 Reembolso por compra de tuberias, accesorios y otros en GERARDO CASTAÑO LOPEZ	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	901.727.278-1	N/A	$ 35.135.600,99	$ 521.189.130,51
22/02/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 8 Reembolso por compra de tuberias, accesorios y otros en COVAL COMERCIAL SAS	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	901.727.278-1	N/A	$ 59.879.517,16	$ 486.053.529,52
22/02/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 7 Reembolso por compra de Combos sanitarios y otros, realizadas en Alfragres S.A	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	901.727.278-1	N/A	$ 122.850.331,00	$ 426.174.012,36
22/02/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 6 Reembolso por compra de Alambre, acero, malla electrosoldada, otros en G&J FERRETERIA SA	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	901.727.278-1	N/A	$ 49.055.425,00	$ 303.323.681,36
17/02/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 5 Reembolso por compra de Puertas y Chapas, realizada a JUAN PABLO GIRALDO	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	901.727.278-1	N/A	$ 32.875.543,00	$ 254.268.256,36

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		**INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO**				CÓDIGO:	**F-GG-31**
						VERSIÓN:	**03**
						VIGENCIA:	**2024-05-17**
		GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS				CLASIFICACIÓN:	**IP**
16/02/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 4. Combos sanitarios y otros	ALFRAGRES S.A - EN REORGANIZACION	860.032.550-7	N/A	$ 54.640.059,00	$ 221.392.713,36
16/02/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 3. Acero de Refuerzo	G&J FERRETERIA SAS	800.130.426-3	N/A	$ 81.919.166,00	$ 166.752.654,36
16/02/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 2. Tuberias y Accesorios	COVAL COMERCIAL SAS	830.063.800-7	N/A	$ 62.561.433,00	$ 84.833.488,36
16/02/2024	N/A	Solicitud Orden de Giro No. 1. Cemento Cemex	Gerardo Castaño Lopez	82.270.164-5	N/A	$ 22.272.055,36	$ 22.272.055,36
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$ 8.162.293,86	
Nuevo acumulado por este concepto						$ 764.964.382,59	

OTROS - Exclusivamente del Proyecto						**VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN**	
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior						$ 40.261.283,00	$ 40.261.283,00
27/11/2023	COMPROBANTE DE EGRESO No. 16327	CONTRIBUCION IMPUESTO DE GUERRA	N/A	N/A	N/A	$ 40.261.283,00	
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período y exclusivamente para costos y gastos de proyecto						$ 0,00	
Nuevo acumulado por este concepto						$ 40.261.283,00	

TOTAL GIRADO EN EL PERIODO CON CARGO AL ANTICIPO DURANTE EL PERÍODO INFORMADO:	$ 130.352.178,22
NUEVO TOTAL DE ANTICIPO INVERTIDO EXCLUSIVAMENTE EN EL PROYECTO POR EL CONTRATISTA CON AVAL DEL INTERVENTOR:	$ 805.225.665,59
NUEVO SALDO DE ANTICIPO A CARGO DEL CONTRATISTA Y DISPONIBLE EN CUENTA QUE AUN NO HA SIDO INVERTIDO EN EL PROYECTO:	$ 0,00
Nuevo saldo de anticipo en numero:	**$ 0,00**
Nuevo saldo de anticipo en letras:	**CERO PESOS M/CTE**

El saldo de anticipo indicado, se encuentra disponible en las siguientes cuentas abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a nombre de :

Entidad financiera	**Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)**	**Saldo disponible a la fecha:**	**AAAA/MM/DD**
ALIANZA FIDUCIARIA	FIDUCIA	$ 0,29	31/08/2024
	TOTAL DISPONIBLE	$ 0,00	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

ELABORÓ

Firma

Nombre JOSE LUIS RADA RAYO
Cargo Representante Legal de obra

APROBÓ

Firma

Nombre OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
Cargo Representante Legal de Interventoría

APROBÓ

Firma

Nombre NO APLICA
Cargo Designado Ente Territorial (si aplica)

Nota 1: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe aprobar ir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

ORDEN DE TRABAJO No. 2230223

OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTRATISTA

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Juan C. Guevara	Nombre: José Luis Rada Rayo	Nombre: José Luis Rada Rayo
Cargo:	Cargo: Representante Legal	Cargo: Representante Legal
Fecha: 23/06/2024	Fecha: 23/06/2024	Fecha: 23/06/2024

INTERVENTORÍA

APROBÓ:
Firma:
Nombre: Oscar Mauricio Almario
Cargo: director de Interventoría
Fecha:

Control de versiones		
Versión	**Fecha**	**Cambio**
1	27/07/2023	Entrega inicial
2	14/08/2023	Subsanación PPDI-OF-CGE-23-012
3	22/08/2023	Subsanación PPDI-OF-CGE-23-017
4	5/09/2023	Actualización con fecha acta de inicio
5	20/09/2023	Plan de Contingencia
6	2/11/2023	Plan de Contingencia No.2
7	17/01/2024	Reinicio de la orden de Trabajo
8	08/04/2024	Propuesta Prorroga plazo de ejecucion.
9	23/06/2024	Plan de Contingencia

Id	Item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Holgura	Nombres de los recursos
1		**CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN,INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**			**$4.164.944.719**	**367,38 días**	**jue 24/08/23**	**sáb 31/08/24**		**0 días**	
2	**1**	**ACTIVIDAD 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR–10.**			**$7.474.214**	**40 días**	**jue 24/08/23**	**mar 3/10/23**		**277,38 días**	
3	1.1	Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR–10.	GL	1	$7.474.214	40 días	jue 24/08/23	mar 3/10/23		33,13 días	
4	**3**	**Actividad 2: Diagnóstico, validación preliminar, concertación y planeación de la intervención:**			**$131.342.175**	**90 días**	**jue 24/08/23**	**jue 23/11/23**		**277,38 días**	
5	4	Diagnóstico, validación preliminar, concertación y planeación de la intervención:	GL	1	$131.342.175	90 días	jue 24/08/23	jue 23/11/23	3CC	150,63 días	
6	**5**	**ACTIVIDAD 3. Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras**			**$4.026.128.330**	**223,25 días**	**jue 18/01/24**	**sáb 31/08/24**		**0 días**	
7		PERIODO REPARACION PUENTE			$0	67,75 días?	jue 24/08/23	mar 31/10/23		73,38 días?	
8		Espera Aprobacion Mamposteria Estructural			$0	23,63 días?	mié 18/10/23	vie 10/11/23		132,5 días?	
9		Problematicas de vias de acceso - Orden Publico en el Departamento del Choco Ajenas a la firma Contratista			$0	35,38 días?	lun 13/11/23	lun 18/12/23		95,25 días?	
10		Periodo de Suspension Orden De Trabajo.			$0	30,5 días	lun 18/12/23	mié 17/01/24		0,1 días	
11	5.1	INTERVENCION No. 1	UN	1	$10.371.269	10 días	jue 18/01/24	dom 28/01/24	10	0,1 días	
12		INTERVENCION No. 2	UN	1	$9.692.457	10 días	jue 18/01/24	dom 28/01/24	10	0,1 días	
13		INTERVENCION No. 3	UN	1	$10.381.858	6 días	lun 29/01/24	dom 4/02/24	11FC+1 día	0,1 días	
14		INTERVENCION No. 4	UN	1	$9.190.149	6 días	lun 29/01/24	dom 4/02/24	12FC+1 día	0,1 días	
15		INTERVENCION No. 5	UN	1	$11.173.771	6 días	lun 5/02/24	dom 11/02/24	13FC+1 día	0,1 días	
16		INTERVENCION No. 6	UN	1	$9.738.758	6 días	lun 5/02/24	dom 11/02/24	14FC+1 día	0,1 días	
17		INTERVENCION No. 7	UN	1	$9.506.688	7 días	lun 5/02/24	lun 12/02/24	16CC	0,1 días	
18		INTERVENCION No. 8	UN	1	$10.453.972	6 días	lun 12/02/24	dom 18/02/24	15FC+1 día	0,1 días	
19		INTERVENCION No. 9	UN	1	$10.337.497	6 días	lun 12/02/24	dom 18/02/24	16FC+1 día	0,1 días	
20		INTERVENCION No. 10	UN	1	$8.859.500	6 días	mar 13/02/24	lun 19/02/24	17FC+1 día	0,1 días	
21		INTERVENCION No. 11	UN	1	$8.678.854	6 días	lun 19/02/24	dom 25/02/24	18FC+1 día	0,1 días	
22		INTERVENCION No. 12	UN	1	$9.541.146	6 días	lun 19/02/24	dom 25/02/24	19FC+1 día	0,1 días	
23		INTERVENCION No. 13	UN	1	$9.431.123	5 días	mar 20/02/24	dom 25/02/24	20FC+1 día	0,1 días	
24		INTERVENCION No. 14	UN	1	$7.715.770	6 días	lun 26/02/24	dom 3/03/24	21FC+1 día	0,1 días	
25		INTERVENCION No. 15	UN	1	$10.598.249	6 días	lun 26/02/24	dom 3/03/24	22FC+1 día	0,1 días	
26		INTERVENCION No. 16	UN	1	$9.876.809	6 días	lun 26/02/24	dom 3/03/24	23FC+1 día	0,1 días	
27		INTERVENCION No. 17	UN	1	$9.347.370	6 días	lun 4/03/24	dom 10/03/24	24FC+1 día	0,1 días	
28		INTERVENCION No. 18	UN	1	$10.097.837	6 días	lun 4/03/24	dom 10/03/24	25FC+1 día	0,1 días	
29		INTERVENCION No. 19	UN	1	$9.340.738	6 días	lun 4/03/24	dom 10/03/24	26FC+1 día	0,1 días	
30		INTERVENCION No. 20	UN	1	$10.426.332	6 días	lun 4/03/24	dom 10/03/24	29CC	0,1 días	
31		INTERVENCION No. 21	UN	1	$10.416.328	6 días	lun 4/03/24	dom 10/03/24	29CC	0,1 días	
32		INTERVENCION No. 22	UN	1	$9.716.613	5,8 días	mar 12/03/24	dom 17/03/24	27FC+1 día	0,1 días	
33		INTERVENCION No. 23	UN	1	$10.929.446	5,8 días	mar 12/03/24	dom 17/03/24	28FC+1 día	0,1 días	
34		INTERVENCION No. 24	UN	1	$9.296.367	5,8 días	mar 12/03/24	dom 17/03/24	29FC+1 día	0,1 días	
35		INTERVENCION No. 25	UN	1	$9.726.002	5,8 días	mar 12/03/24	dom 17/03/24	30FC+1 día	0,1 días	
36		INTERVENCION No. 26	UN	1	$6.796.331	5,8 días	mar 12/03/24	dom 17/03/24	31FC+1 día	0,1 días	
37		INTERVENCION No. 27	UN	1	$5.696.089	5,8 días	lun 18/03/24	dom 24/03/24	32FC+1 día	0,1 días	
38		INTERVENCION No. 28	UN	1	$6.298.946	5,8 días	lun 18/03/24	dom 24/03/24	33FC+1 día	0,1 días	
39		INTERVENCION No. 29	UN	1	$5.990.858	5,8 días	lun 18/03/24	dom 24/03/24	34FC+1 día	0,1 días	
40		INTERVENCION No. 30	UN	1	$2.352.075	5,8 días	lun 18/03/24	dom 24/03/24	35FC+1 día	0,1 días	
41		INTERVENCION No. 31	UN	1	$4.507.903	5,8 días	lun 18/03/24	dom 24/03/24	36FC+1 día	0,1 días	
42		INTERVENCION No. 32	UN	1	$5.856.711	6 días	lun 25/03/24	dom 31/03/24	37FC+1 día	0,1 días	
43		INTERVENCION No. 33	UN	1	$2.373.061	6 días	lun 25/03/24	dom 31/03/24	38FC+1 día	0,1 días	
44		INTERVENCION No. 34	UN	1	$1.695.731	6 días	lun 25/03/24	dom 31/03/24	39FC+1 día	0,1 días	
45		INTERVENCION No. 35	UN	1	$5.860.114	6 días	lun 25/03/24	dom 31/03/24	40FC+1 día	0,1 días	
46		INTERVENCION No. 36	UN	1	$8.894.807	6 días	lun 25/03/24	dom 31/03/24	41FC+1 día	0,1 días	
47		INTERVENCION No. 37	UN	1	$9.108.666	5,8 días	lun 1/04/24	dom 7/04/24	42FC+1 día	0,1 días	
48		INTERVENCION No. 38	UN	1	$3.831.891	5,8 días	lun 1/04/24	dom 7/04/24	43FC+1 día	0,1 días	
49		INTERVENCION No. 39	UN	1	$10.757.660	5,8 días	lun 1/04/24	dom 7/04/24	44FC+1 día	0,1 días	
50		INTERVENCION No. 40	UN	1	$9.885.089	5,8 días	lun 1/04/24	dom 7/04/24	45FC+1 día	0,1 días	
51		INTERVENCION No. 41	UN	1	$10.837.104	5,8 días	lun 1/04/24	dom 7/04/24	46FC+1 día	0,1 días	
52		INTERVENCION No. 42	UN	1	$7.230.479	5,8 días	lun 8/04/24	dom 14/04/24	47FC+1 día	0,1 días	
53		INTERVENCION No. 43	UN	1	$8.586.664	5,8 días	lun 8/04/24	dom 14/04/24	48FC+1 día	0,1 días	
54		INTERVENCION No. 44	UN	1	$12.251.248	5,8 días	lun 8/04/24	dom 14/04/24	49FC+1 día	0,1 días	
55		INTERVENCION No. 45	UN	1	$11.674.743	5,8 días	lun 8/04/24	dom 14/04/24	50FC+1 día	0,1 días	
56		INTERVENCION No. 46	UN	1	$11.393.027	5,8 días	lun 8/04/24	dom 14/04/24	51FC+1 día	0,1 días	
57		INTERVENCION No. 47	UN	1	$12.321.174	6 días	lun 15/04/24	dom 21/04/24	52FC+1 día	0,1 días	
58		INTERVENCION No. 48	UN	1	$12.447.989	6 días	lun 15/04/24	dom 21/04/24	53FC+1 día	0,1 días	
59		INTERVENCION No. 49	UN	1	$606.977	6 días	lun 15/04/24	dom 21/04/24	54FC+1 día	0,1 días	
60		INTERVENCION No. 50	UN	1	$10.515.515	6 días	lun 15/04/24	dom 21/04/24	55FC+1 día	0,1 días	
61		INTERVENCION No. 51	UN	1	$9.402.134	6 días	lun 15/04/24	dom 21/04/24	56FC+1 día	0,1 días	
62		INTERVENCION No. 52	UN	1	$9.649.927	5 días	lun 22/04/24	sáb 27/04/24	57FC+1 día	0,1 días	
63		INTERVENCION No. 53	UN	1	$11.803.874	5 días	lun 22/04/24	sáb 27/04/24	58FC+1 día	0,1 días	
64		INTERVENCION No. 54	UN	1	$11.969.510	5 días	lun 22/04/24	sáb 27/04/24	59FC+1 día	0,1 días	
65		INTERVENCION No. 55	UN	1	$3.501.768	5 días	lun 22/04/24	sáb 27/04/24	60FC+1 día	0,1 días	
66		INTERVENCION No. 56	UN	1	$10.652.734	5 días	lun 22/04/24	sáb 27/04/24	61FC+1 día	0,1 días	
67		INTERVENCION No. 57	UN	1	$10.571.407	5,8 días	lun 29/04/24	sáb 4/05/24	62FC+1 día	0,1 días	
68		INTERVENCION No. 58	UN	1	$10.022.096	5,8 días	lun 29/04/24	sáb 4/05/24	63FC+1 día	0,1 días	
69		INTERVENCION No. 59	UN	1	$11.280.217	5,8 días	lun 29/04/24	sáb 4/05/24	64FC+1 día	0,1 días	
70		INTERVENCION No. 60	UN	1	$9.015.225	5,8 días	lun 29/04/24	sáb 4/05/24	65FC+1 día	0,1 días	
71		INTERVENCION No. 61	UN	1	$11.058.480	5,8 días	lun 29/04/24	sáb 4/05/24	66FC+1 día	0,1 días	
72		INTERVENCION No. 62	UN	1	$10.970.480	6 días	lun 6/05/24	sáb 11/05/24	67FC+1 día	0,1 días	
73		INTERVENCION No. 63	UN	1	$9.136.563	6 días	lun 6/05/24	sáb 11/05/24	68FC+1 día	0,1 días	
74		INTERVENCION No. 64	UN	1	$10.765.605	6 días	lun 6/05/24	sáb 11/05/24	69FC+1 día	0,1 días	
75		INTERVENCION No. 65	UN	1	$10.599.110	6 días	lun 6/05/24	sáb 11/05/24	70FC+1 día	0,1 días	
76		INTERVENCION No. 66	UN	1	$9.067.609	6 días	lun 6/05/24	sáb 11/05/24	71FC+1 día	0,1 días	
77		INTERVENCION No. 67	UN	1	$8.650.569	5,8 días	lun 13/05/24	sáb 18/05/24	72FC+1 día	0,1 días	
78		INTERVENCION No. 68	UN	1	$9.829.717	5,8 días	lun 13/05/24	sáb 18/05/24	73FC+1 día	0,1 días	
79		INTERVENCION No. 69	UN	1	$9.315.241	5,8 días	lun 13/05/24	sáb 18/05/24	74FC+1 día	0,1 días	
80		INTERVENCION No. 70	UN	1	$10.773.601	5,8 días	lun 13/05/24	sáb 18/05/24	75FC+1 día	0,1 días	
81		INTERVENCION No. 71	UN	1	$6.622.112	5,8 días	lun 13/05/24	sáb 18/05/24	76FC+1 día	0,1 días	
82		INTERVENCION No. 72	UN	1	$10.719.919	6 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	77FC+1 día	0,1 días	
83		INTERVENCION No. 73	UN	1	$9.299.414	6 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	78FC+1 día	0,1 días	
84		INTERVENCION No. 74	UN	1	$8.961.578	6 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	79FC+1 día	0,1 días	
85		INTERVENCION No. 75	UN	1	$8.717.316	6 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	80FC+1 día	0,1 días	
86		INTERVENCION No. 76	UN	1	$5.896.352	6 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	81FC+1 día	0,1 días	
87		INTERVENCION No. 77	UN	1	$8.558.313	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	82FC+1 día	0,1 días	
88		INTERVENCION No. 78	UN	1	$9.630.694	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	83FC+1 día	0,1 días	
89		INTERVENCION No. 79	UN	1	$7.648.717	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	84FC+1 día	0,1 días	
90		INTERVENCION No. 80	UN	1	$9.452.792	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	85FC+1 día	0,1 días	
91		INTER VENCION No. 81	UN	1	$10.066.235	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	86FC+1 día	0,1 días	
92		INTERVENCION No. 82	UN	1	$8.835.431	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	0,1 días	
93		INTERVENCION No. 83	UN	1	$9.258.853	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	0,1 días	
94		INTERVENCION No. 84	UN	1	$9.625.984	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	0,1 días	
95		INTERVENCION No. 85	UN	1	$8.361.513	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	0,1 días	
96		INTERVENCION No. 86	UN	1	$10.301.532	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	0,1 días	
97		INTERVENCION No. 87	UN	1	$7.048.145	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	0,1 días	
98		INTERVENCION No. 88	UN	1	$10.659.216	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	0,1 días	
99		INTERVENCION No. 89	UN	1	$10.245.611	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	0,1 días	
100		INTERVENCION No. 90	UN	1	$11.525.266	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	0,1 días	
101		INTERVENCION No. 91	UN	1	$893.913	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	68,2 días	
102		INTERVENCION No. 92	UN	1	$7.234.767	6 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24	91CC	68,2 días	
103		INTERVENCION No. 93	UN	1	$9.918.716	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	87FC+1 día	0,1 días	
104		INTERVENCION No. 94	UN	1	$9.461.931	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	88FC+1 día	0,1 días	
105		INTERVENCION No. 95	UN	1	$10.865.608	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	89FC+1 día	0,1 días	
106		INTERVENCION No. 96	UN	1	$9.206.318	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	90FC+1 día	0,1 días	
107		INTERVENCION No. 97	UN	1	$10.099.680	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	91FC+1 día	0,1 días	
108		INTERVENCION No. 98	UN	1	$9.935.413	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	92FC+1 día	0,1 días	
109		INTERVENCION No. 99	UN	1	$8.770.762	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	93FC+1 día	0,1 días	
110		INTERVENCION No. 100	UN	1	$10.471.370	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	94FC+1 día	0,1 días	
111		INTERVENCION No. 101	UN	1	$8.906.054	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	95FC+1 día	0,1 días	
112		INTERVENCION No. 102	UN	1	$2.490.121	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	96FC+1 día	0,1 días	
113		INTERVENCION No. 103	UN	1	$9.620.266	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	97FC+1 día	0,1 días	
114		INTERVENCION No. 104	UN	1	$9.861.360	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	98FC+1 día	0,1 días	
115		INTERVENCION No. 105	UN	1	$8.958.508	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	99FC+1 día	0,1 días	
116		INTERVENCION No. 106	UN	1	$1.139.614	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	100FC+1 día	0,1 días	
117		INTERVENCION No. 107	UN	1	$9.198.731	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	101FC+1 día	68,2 días	
118		INTERVENCION No. 108	UN	1	$9.955.815	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	102FC+1 día	68,2 días	
119		INTERVENCION No. 109	UN	1	$4.960.556	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	68,2 días	
120		INTERVENCION No. 110	UN	1	$8.616.597	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	68,2 días	
121		INTERVENCION No. 111	UN	1	$9.037.805	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	68,2 días	
122		INTERVENCION No. 112	UN	1	$10.003.046	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	68,2 días	
123		INTERVENCION No. 113	UN	1	$9.390.683	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	68,2 días	
124		INTERVENCION No. 114	UN	1	$11.143.955	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	68,2 días	
125		INTERVENCION No. 115	UN	1	$7.714.322	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	68,2 días	
126		INTERVENCION No. 116	UN	1	$10.519.489	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	68,2 días	
127		INTERVENCION No. 117	UN	1	$9.349.847	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
128		INTERVENCION No. 118	UN	1	$9.766.057	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
129		INTERVENCION No. 119	UN	1	$7.204.242	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
130		INTERVENCION No. 120	UN	1	$8.959.477	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
131		INTERVENCION No. 121	UN	1	$7.289.026	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
132		INTERVENCION No. 122	UN	1	$10.050.519	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
133		INTERVENCION No. 123	UN	1	$10.290.227	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
134		INTERVENCION No. 124	UN	1	$9.054.140	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
135		INTERVENCION No. 125	UN	1	$10.143.060	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
136		INTERVENCION No. 126	UN	1	$6.164.636	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
137		INTERVENCION No. 127	UN	1	$9.907.576	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
138		INTERVENCION No. 128	UN	1	$6.762.467	6 días	lun 3/06/24	dom 9/06/24	118CC	82,2 días	
139		INTERVENCION No. 129	UN	1	$10.435.258	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	103FC+1 día	0,1 días	
140		INTERVENCION No. 130	UN	1	$8.042.330	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	104FC+1 día	0,1 días	
141		INTERVENCION No. 131	UN	1	$2.213.271	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	105FC+1 día	0,1 días	
142		INTERVENCION No. 132	UN	1	$10.579.913	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	106FC+1 día	0,1 días	
143		INTERVENCION No. 133	UN	1	$9.815.601	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	107FC+1 día	0,1 días	
144		INTERVENCION No. 134	UN	1	$9.597.731	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	108FC+1 día	0,1 días	
145		INTERVENCION No. 135	UN	1	$9.194.130	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	109FC+1 día	0,1 días	
146		INTERVENCION No. 136	UN	1	$9.731.455	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	110FC+1 día	0,1 días	
147		INTERVENCION No. 137	UN	1	$11.530.659	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	111FC+1 día	0,1 días	
148		INTERVENCION No. 138	UN	1	$8.665.896	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	112FC+1 día	0,1 días	
149		INTERVENCION No. 139	UN	1	$9.972.144	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	113FC+1 día	0,1 días	
150		INTERVENCION No. 140	UN	1	$9.806.858	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	114FC+1 día	0,1 días	
151		INTERVENCION No. 141	UN	1	$4.178.580	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	115FC+1 día	0,1 días	
152		INTERVENCION No. 142	UN	1	$219.703	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	116FC+1 día	0,1 días	
153		INTERVENCION No. 143	UN	1	$8.845.003	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	117FC+1 día	68,2 días	
154		INTERVENCION No. 144	UN	1	$10.109.039	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	118FC+1 día	68,2 días	
155		INTERVENCION No. 145	UN	1	$9.885.258	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	119FC+1 día	68,2 días	
156		INTERVENCION No. 146	UN	1	$8.194.652	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	120FC+1 día	68,2 días	
157		INTERVENCION No. 147	UN	1	$10.813.579	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	121FC+1 día	68,2 días	
158		INTERVENCION No. 148	UN	1	$11.080.042	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	122FC+1 día	68,2 días	
159		INTERVENCION No. 149	UN	1	$9.814.583	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	123FC+1 día	68,2 días	
160		INTERVENCION No. 150	UN	1	$12.164.475	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	124FC+1 día	68,2 días	
161		INTERVENCION No. 151	UN	1	$10.962.657	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	125FC+1 día	68,2 días	
162		INTERVENCION No. 152	UN	1	$10.945.460	6 días	lun 10/06/24	dom 16/06/24	126FC+1 día	68,2 días	
163		INTERVENCION No. 153	UN	1	$10.658.231	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	139FC+1 día	0,1 días	
164		INTERVENCION No. 154	UN	1	$7.971.346	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	140FC+1 día	0,1 días	
165		INTERVENCION No. 155	UN	1	$8.460.114	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	141FC+1 día	0,1 días	
166		INTERVENCION No. 156	UN	1	$8.677.213	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	142FC+1 día	0,1 días	
167		INTERVENCION No. 157	UN	1	$10.363.610	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	143FC+1 día	0,1 días	
168		INTERVENCION No. 158	UN	1	$4.835.094	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	144FC+1 día	0,1 días	
169		INTERVENCION No. 159	UN	1	$3.838.764	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	145FC+1 día	0,1 días	
170		INTERVENCION No. 160	UN	1	$9.218.002	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	146FC+1 día	0,1 días	
171		INTERVENCION No. 161	UN	1	$9.954.040	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	147FC+1 día	0,1 días	
172		INTERVENCION No. 162	UN	1	$2.771.937	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	148FC+1 día	0,1 días	
173		INTERVENCION No. 163	UN	1	$6.938.558	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	149FC+1 día	0,1 días	
174		INTERVENCION No. 164	UN	1	$6.126.032	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	150FC+1 día	0,1 días	
175		INTERVENCION No. 165	UN	1	$10.104.276	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	151FC+1 día	0,1 días	
176		INTERVENCION No. 166	UN	1	$9.933.083	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	152FC+1 día	0,1 días	
177		INTERVENCION No. 167	UN	1	$9.905.532	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	153FC+1 día	68,2 días	
178		INTERVENCION No. 168	UN	1	$10.343.710	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	154FC+1 día	68,2 días	
179		INTERVENCION No. 169	UN	1	$4.691.143	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	155FC+1 día	68,2 días	
180		INTERVENCION No. 170	UN	1	$9.163.901	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	156FC+1 día	68,2 días	
181		INTERVENCION No. 171	UN	1	$3.406.658	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	157FC+1 día	68,2 días	
182		INTERVENCION No. 172	UN	1	$3.112.838	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	158FC+1 día	68,2 días	
183		INTERVENCION No. 173	UN	1	$9.923.305	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	159FC+1 día	68,2 días	
184		INTERVENCION No. 174	UN	1	$4.141.436	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	160FC+1 día	68,2 días	
185		INTERVENCION No. 175	UN	1	$9.808.393	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	161FC+1 día	68,2 días	
186		INTERVENCION No. 176	UN	1	$10.548.103	6 días	lun 17/06/24	dom 23/06/24	162FC+1 día	68,2 días	
187		INTERVENCION No. 177	UN	1	$11.550.886	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	163FC+1 día	0,1 días	
188		INTERVENCION No. 178	UN	1	$10.874.018	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	164FC+1 día	0,1 días	
189		INTERVENCION No. 179	UN	1	$10.955.388	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	165FC+1 día	0,1 días	
190		INTERVENCION No. 180	UN	1	$9.122.126	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	166FC+1 día	0,1 días	
191		INTERVENCION No. 181	UN	1	$7.825.407	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	167FC+1 día	0,1 días	
192		INTERVENCION No. 182	UN	1	$12.092.359	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	168FC+1 día	0,1 días	
193		INTERVENCION No. 183	UN	1	$8.945.613	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	169FC+1 día	0,1 días	
194		INTERVENCION No. 184	UN	1	$10.341.776	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	170FC+1 día	0,1 días	
195		INTERVENCION No. 185	UN	1	$10.705.989	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	171FC+1 día	0,1 días	
196		INTERVENCION No. 186	UN	1	$8.091.706	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	172FC+1 día	0,1 días	
197		INTERVENCION No. 187	UN	1	$3.797.087	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	173FC+1 día	0,1 días	
198		INTERVENCION No. 188	UN	1	$8.213.636	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	174FC+1 día	0,1 días	
199		INTERVENCION No. 189	UN	1	$8.512.195	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	175FC+1 día	0,1 días	
200		INTERVENCION No. 190	UN	1	$10.503.605	6 días	lun 24/06/24	dom 30/06/24	176FC+1 día	0,1 días	
201		INTERVENCION No. 191	UN	1	$7.389.391	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	187FC+1 día	0,1 días	
202		INTERVENCION No. 192	UN	1	$4.502.284	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	188FC+1 día	0,1 días	
203		INTERVENCION No. 193	UN	1	$1.271.026	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	189FC+1 día	0,1 días	
204		INTERVENCION No. 194	UN	1	$4.313.073	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	190FC+1 día	0,1 días	
205		INTERVENCION No. 195	UN	1	$784.540	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	191FC+1 día	0,1 días	
206		INTERVENCION No. 196	UN	1	$9.112.019	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	192FC+1 día	0,1 días	
207		INTERVENCION No. 197	UN	1	$1.005.633	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	193FC+1 día	0,1 días	
208		INTERVENCION No. 198	UN	1	$10.982.710	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	194FC+1 día	0,1 días	
209		INTERVENCION No. 199	UN	1	$3.962.493	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	195FC+1 día	0,1 días	
210		INTERVENCION No. 200	UN	1	$10.796.050	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	196FC+1 día	0,1 días	
211		INTERVENCION No. 201	UN	1	$4.061.152	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	197FC+1 día	0,1 días	
212		INTERVENCION No. 202	UN	1	$10.561.332	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	198FC+1 día	0,1 días	
213		INTERVENCION No. 203	UN	1	$9.929.657	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	199FC+1 día	0,1 días	
214		INTERVENCION No. 204	UN	1	$9.943.389	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	200FC+1 día	0,1 días	
215		INTERVENCION No. 205	UN	1	$11.495.492	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	214CC	0,1 días	
216		INTERVENCION No. 206	UN	1	$10.005.353	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	214CC	0,1 días	
217		INTERVENCION No. 207	UN	1	$5.127.161	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	214CC	0,1 días	
218		INTERVENCION No. 208	UN	1	$10.613.356	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	214CC	0,1 días	
219		INTERVENCION No. 209	UN	1	$10.434.453	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	214CC	0,1 días	
220		INTERVENCION No. 210	UN	1	$10.957.532	6 días	lun 1/07/24	dom 7/07/24	214CC	0,1 días	
221		INTERVENCION No. 211	UN	1	$2.472.615	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	201FC+1 día	0,1 días	
222		INTERVENCION No. 212	UN	1	$10.354.589	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	202FC+1 día	0,1 días	
223		INTERVENCION No. 213	UN	1	$9.693.957	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	203FC+1 día	0,1 días	
224		INTERVENCION No. 214	UN	1	$8.148.824	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	204FC+1 día	0,1 días	
225		INTERVENCION No. 215	UN	1	$9.162.830	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	205FC+1 día	0,1 días	
226		INTERVENCION No. 216	UN	1	$9.136.009	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	206FC+1 día	0,1 días	
227		INTERVENCION No. 217	UN	1	$10.756.271	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	207FC+1 día	0,1 días	
228		INTERVENCION No. 218	UN	1	$10.142.983	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	208FC+1 día	0,1 días	
229		INTERVENCION No. 219	UN	1	$9.281.320	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	209FC+1 día	0,1 días	
230		INTERVENCION No. 220	UN	1	$10.388.923	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	210FC+1 día	0,1 días	
231		INTERVENCION No. 221	UN	1	$10.053.165	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	211FC+1 día	0,1 días	
232		INTERVENCION No. 222	UN	1	$6.624.828	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	212FC+1 día	0,1 días	
233		INTERVENCION No. 223	UN	1	$6.318.441	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	213FC+1 día	0,1 días	
234		INTERVENCION No. 224	UN	1	$6.059.480	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	214FC+1 día	0,1 días	
235		INTERVENCION No. 225	UN	1	$8.180.329	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	215FC+1 día	0,1 días	
236		INTERVENCION No. 226	UN	1	$3.215.136	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	216FC+1 día	0,1 días	
237		INTERVENCION No. 227	UN	1	$4.593.898	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	217FC+1 día	0,1 días	
238		INTERVENCION No. 228	UN	1	$7.975.301	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	218FC+1 día	0,1 días	
239		INTERVENCION No. 229	UN	1	$11.293.282	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	219FC+1 día	0,1 días	
240		INTERVENCION No. 230	UN	1	$8.053.895	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	220FC+1 día	0,1 días	
241		INTERVENCION No. 231	UN	1	$9.112.685	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	240CC	0,1 días	
242		INTERVENCION No. 232	UN	1	$3.198.083	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	240CC	0,1 días	
243		INTERVENCION No. 233	UN	1	$9.713.998	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	240CC	0,1 días	
244		INTERVENCION No. 234	UN	1	$10.053.777	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	240CC	0,1 días	
245		INTERVENCION No. 235	UN	1	$9.918.518	5,6 días	lun 8/07/24	dom 14/07/24	240CC	40,6 días	
246		INTERVENCION No. 236	UN	1	$8.503.885	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	221FC+1 día	0,1 días	
247		INTERVENCION No. 237	UN	1	$10.773.791	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	222FC+1 día	0,1 días	
248		INTERVENCION No. 238	UN	1	$5.629.298	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	223FC+1 día	0,1 días	
249		INTERVENCION No. 239	UN	1	$5.497.947	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	224FC+1 día	0,1 días	
250		INTERVENCION No. 240	UN	1	$9.693.437	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	225FC+1 día	0,1 días	
251		INTERVENCION No. 241	UN	1	$7.917.784	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	226FC+1 día	0,1 días	
252		INTERVENCION No. 242	UN	1	$9.972.164	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	227FC+1 día	0,1 días	
253		INTERVENCION No. 243	UN	1	$8.347.485	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	228FC+1 día	0,1 días	
254		INTERVENCION No. 244	UN	1	$9.419.980	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	229FC+1 día	0,1 días	
255		INTERVENCION No. 245	UN	1	$9.194.731	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	230FC+1 día	0,1 días	
256		INTERVENCION No. 246	UN	1	$219.703	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	231FC+1 día	0,1 días	
257		INTERVENCION No. 247	UN	1	$6.296.250	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	232FC+1 día	0,1 días	
258		INTERVENCION No. 248	UN	1	$10.768.112	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	233FC+1 día	0,1 días	
259		INTERVENCION No. 249	UN	1	$7.207.409	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	234FC+1 día	0,1 días	
260		INTERVENCION No. 250	UN	1	$1.640.716	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	235FC+1 día	0,1 días	
261		INTERVENCION No. 251	UN	1	$4.082.928	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	236FC+1 día	0,1 días	
262		INTERVENCION No. 252	UN	1	$10.073.610	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	237FC+1 día	0,1 días	
263		INTERVENCION No. 253	UN	1	$3.535.002	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	238FC+1 día	0,1 días	
264		INTERVENCION No. 254	UN	1	$10.159.357	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	239FC+1 día	0,1 días	
265		INTERVENCION No. 255	UN	1	$10.225.775	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	240FC+1 día	0,1 días	
266		INTERVENCION No. 256	UN	1	$7.385.158	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	241FC+1 día	0,1 días	
267		INTERVENCION No. 257	UN	1	$9.820.009	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	242FC+1 día	0,1 días	
268		INTERVENCION No. 258	UN	1	$9.895.394	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	243FC+1 día	0,1 días	
269		INTERVENCION No. 259	UN	1	$2.895.632	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	244FC+1 día	0,1 días	
270		INTERVENCION No. 260	UN	1	$7.852.566	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	245FC+1 día	40,6 días	
271		INTERVENCION No. 261	UN	1	$6.930.008	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	270CC	40,6 días	
272		INTERVENCION No. 262	UN	1	$6.905.401	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	270CC	40,6 días	
273		INTERVENCION No. 263	UN	1	$606.977	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	270CC	40,6 días	
274		INTERVENCION No. 264	UN	1	$8.464.242	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	270CC	40,6 días	
275		INTERVENCION No. 265	UN	1	$9.363.492	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	270CC	40,6 días	
276		INTERVENCION No. 266	UN	1	$11.825.962	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	270CC	40,6 días	
277		INTERVENCION No. 267	UN	1	$11.814.618	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	270CC	40,6 días	
278		INTERVENCION No. 268	UN	1	$9.204.748	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	270CC	40,6 días	
279		INTERVENCION No. 269	UN	1	$12.836.518	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	270CC	40,6 días	
280		INTERVENCION No. 270	UN	1	$8.651.870	6 días	lun 15/07/24	dom 21/07/24	270CC	40,6 días	
281		INTERVENCION No. 271	UN	1	$8.319.896	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	246FC+1 día	0,1 días	
282		INTERVENCION No. 272	UN	1	$9.639.278	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	247FC+1 día	0,1 días	
283		INTERVENCION No. 273	UN	1	$10.295.329	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	248FC+1 día	0,1 días	
284		INTERVENCION No. 274	UN	1	$10.743.848	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	249FC+1 día	0,1 días	
285		INTERVENCION No. 275	UN	1	$9.526.974	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	250FC+1 día	0,1 días	
286		INTERVENCION No. 276	UN	1	$4.157.562	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	251FC+1 día	0,1 días	
287		INTERVENCION No. 277	UN	1	$12.514.503	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	252FC+1 día	0,1 días	
288		INTERVENCION No. 278	UN	1	$12.084.651	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	253FC+1 día	0,1 días	
289		INTERVENCION No. 279	UN	1	$9.858.380	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	254FC+1 día	0,1 días	
290		INTERVENCION No. 280	UN	1	$8.837.621	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	255FC+1 día	0,1 días	
291		INTERVENCION No. 281	UN	1	$5.559.662	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	256FC+1 día	0,1 días	
292		INTERVENCION No. 282	UN	1	$10.330.906	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	257FC+1 día	0,1 días	
293		INTERVENCION No. 283	UN	1	$10.571.698	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	258FC+1 día	0,1 días	
294		INTERVENCION No. 284	UN	1	$11.024.716	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	259FC+1 día	0,1 días	
295		INTERVENCION No. 285	UN	1	$10.561.311	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	260FC+1 día	0,1 días	
296		INTERVENCION No. 286	UN	1	$8.727.794	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	261FC+1 día	0,1 días	
297		INTERVENCION No. 287	UN	1	$10.643.999	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	262FC+1 día	0,1 días	
298		INTERVENCION No. 288	UN	1	$3.321.292	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	263FC+1 día	0,1 días	
299		INTERVENCION No. 289	UN	1	$8.158.564	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	264FC+1 día	0,1 días	
300		INTERVENCION No. 290	UN	1	$9.523.433	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	265FC+1 día	0,1 días	
301		INTERVENCION No. 291	UN	1	$4.489.704	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	266FC+1 día	0,1 días	
302		INTERVENCION No. 292	UN	1	$10.601.335	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	267FC+1 día	0,1 días	
303		INTERVENCION No. 293	UN	1	$10.733.415	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	268FC+1 día	0,1 días	
304		INTERVENCION No. 294	UN	1	$11.447.542	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	269FC+1 día	0,1 días	
305		INTERVENCION No. 295	UN	1	$5.195.040	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	270FC+1 día	26,8 días	
306		INTERVENCION No. 296	UN	1	$10.743.853	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	271FC+1 día	26,8 días	
307		INTERVENCION No. 297	UN	1	$3.546.379	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	272FC+1 día	26,8 días	
308		INTERVENCION No. 298	UN	1	$10.847.043	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	273FC+1 día	26,8 días	
309		INTERVENCION No. 299	UN	1	$10.719.142	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	274FC+1 día	26,8 días	
310		INTERVENCION No. 300	UN	1	$11.022.351	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	275FC+1 día	26,8 días	
311		INTERVENCION No. 301	UN	1	$4.196.603	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	276FC+1 día	26,8 días	
312		INTERVENCION No. 302	UN	1	$9.191.072	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	277FC+1 día	26,8 días	
313		INTERVENCION No. 303	UN	1	$10.108.109	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	278FC+1 día	26,8 días	
314		INTERVENCION No. 304	UN	1	$4.487.991	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	279FC+1 día	26,8 días	
315		INTERVENCION No. 305	UN	1	$7.802.019	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	280FC+1 día	26,6 días	
316		INTERVENCION No. 306	UN	1	$10.447.319	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	315CC	26,8 días	
317		INTERVENCION No. 307	UN	1	$1.231.938	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	315CC	26,8 días	
318		INTERVENCION No. 308	UN	1	$9.987.671	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	315CC	26,8 días	
319		INTERVENCION No. 309	UN	1	$8.649.636	6 días	lun 22/07/24	dom 28/07/24	315CC	26,6 días	
320		INTERVENCION No. 310	UN	1	$6.069.787	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	281FC+1 día	0,1 días	
321		INTERVENCION No. 311	UN	1	$1.801.307	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	282FC+1 día	0,1 días	
322		INTERVENCION No. 312	UN	1	$10.099.205	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	283FC+1 día	0,1 días	
323		INTERVENCION No. 313	UN	1	$8.732.241	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	284FC+1 día	0,1 días	
324		INTERVENCION No. 314	UN	1	$2.652.119	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	285FC+1 día	0,1 días	
325		INTERVENCION No. 315	UN	1	$1.101.561	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	286FC+1 día	0,1 días	
326		INTERVENCION No. 316	UN	1	$1.162.612	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	287FC+1 día	0,1 días	
327		INTERVENCION No. 317	UN	1	$8.921.709	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	288FC+1 día	0,1 días	
328		INTERVENCION No. 318	UN	1	$10.448.372	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	289FC+1 día	0,1 días	
329		INTERVENCION No. 319	UN	1	$9.358.291	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	290FC+1 día	0,1 días	
330		INTERVENCION No. 320	UN	1	$10.429.837	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	291FC+1 día	0,1 días	
331		INTERVENCION No. 321	UN	1	$2.074.194	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	292FC+1 día	0,1 días	
332		INTERVENCION No. 322	UN	1	$7.917.769	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	293FC+1 día	0,1 días	
333		INTERVENCION No. 323	UN	1	$8.040.062	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	294FC+1 día	0,1 días	
334		INTERVENCION No. 324	UN	1	$10.606.930	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	295FC+1 día	0,1 días	
335		INTERVENCION No. 325	UN	1	$7.334.812	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	296FC+1 día	0,1 días	
336		INTERVENCION No. 326	UN	1	$1.531.488	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	297FC+1 día	0,1 días	
337		INTERVENCION No. 327	UN	1	$10.270.946	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	298FC+1 día	0,1 días	
338		INTERVENCION No. 328	UN	1	$10.556.566	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	299FC+1 día	0,1 días	
339		INTERVENCION No. 329	UN	1	$8.633.274	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	300FC+1 día	0,1 días	
340		INTERVENCION No. 330	UN	1	$1.687.137	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	301FC+1 día	0,1 días	
341		INTERVENCION No. 331	UN	1	$10.527.771	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	302FC+1 día	0,1 días	
342		INTERVENCION No. 332	UN	1	$2.341.762	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	303FC+1 día	0,1 días	
343		INTERVENCION No. 333	UN	1	$8.616.138	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	304FC+1 día	0,1 días	
344		INTERVENCION No. 334	UN	1	$8.916.949	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	305FC+1 día	26,8 días	
345		INTERVENCION No. 335	UN	1	$9.635.919	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	306FC+1 día	26,8 días	
346		INTERVENCION No. 336	UN	1	$11.464.423	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	307FC+1 día	26,8 días	
347		INTERVENCION No. 337	UN	1	$9.378.402	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	308FC+1 día	26,8 días	
348		INTERVENCION No. 338	UN	1	$9.492.334	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	309FC+1 día	26,8 días	
349		INTERVENCION No. 339	UN	1	$8.696.046	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	310FC+1 día	26,8 días	
350		INTERVENCION No. 340	UN	1	$9.615.098	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	311FC+1 día	26,8 días	
351		INTERVENCION No. 341	UN	1	$9.987.756	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	312FC+1 día	26,8 días	
352		INTERVENCION No. 342	UN	1	$4.376.604	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	313FC+1 día	26,8 días	
353		INTERVENCION No. 343	UN	1	$4.003.665	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	314FC+1 día	26,8 días	
354		INTERVENCION No. 344	UN	1	$10.327.688	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	315FC+1 día	26,8 días	
355		INTERVENCION No. 345	UN	1	$10.172.517	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	316FC+1 día	26,8 días	
356		INTERVENCION No. 346	UN	1	$4.670.795	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	317FC+1 día	26,8 días	
357		INTERVENCION No. 347	UN	1	$10.480.425	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	318FC+1 día	26,8 días	
358		INTERVENCION No. 348	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 29/07/24	dom 4/08/24	319FC+1 día	26,6 días	
359		INTERVENCION No. 349	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 29/07/24	lun 5/08/24	358CC	26,6 días	
360		INTERVENCION No. 350	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 29/07/24	lun 5/08/24	358CC	26,6 días	
361		INTERVENCION No. 351	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	320FC+1 día	0,1 días	
362		INTERVENCION No. 352	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	321FC+1 día	0,1 días	
363		INTERVENCION No. 353	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	322FC+1 día	0,1 días	
364		INTERVENCION No. 354	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	323FC+1 día	0,1 días	
365		INTERVENCION No. 355	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	324FC+1 día	0,1 días	
366		INTERVENCION No. 356	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	325FC+1 día	0,1 días	
367		INTERVENCION No. 357	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	326FC+1 día	0,1 días	
368		INTERVENCION No. 358	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	327FC+1 día	0,1 días	
369		INTERVENCION No. 359	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	328FC+1 día	0,1 días	
370		INTERVENCION No. 360	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	329FC+1 día	0,1 días	
371		INTERVENCION No. 361	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	330FC+1 día	0,1 días	
372		INTERVENCION No. 362	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	331FC+1 día	0,1 días	
373		INTERVENCION No. 363	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	332FC+1 día	0,1 días	
374		INTERVENCION No. 364	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	333FC+1 día	0,1 días	
375		INTERVENCION No. 365	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	334FC+1 día	0,1 días	
376		INTERVENCION No. 366	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	335FC+1 día	0,1 días	
377		INTERVENCION No. 367	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	336FC+1 día	0,1 días	
378		INTERVENCION No. 368	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	337FC+1 día	0,1 días	
379		INTERVENCION No. 369	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	338FC+1 día	0,1 días	
380		INTERVENCION No. 370	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	339FC+1 día	0,1 días	
381		INTERVENCION No. 371	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	340FC+1 día	0,1 días	
382		INTERVENCION No. 372	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	341FC+1 día	0,1 días	
383		INTERVENCION No. 373	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	342FC+1 día	0,1 días	
384		INTERVENCION No. 374	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 5/08/24	dom 11/08/24	343FC+1 día	0,1 días	
385		INTERVENCION No. 375	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	361FC+1 día	0,1 días	
386		INTERVENCION No. 376	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	362FC+1 día	0,1 días	
387		INTERVENCION No. 377	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	363FC+1 día	0,1 días	
388		INTERVENCION No. 378	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	364FC+1 día	0,1 días	
389		INTERVENCION No. 379	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	365FC+1 día	0,1 días	
390		INTERVENCION No. 380	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	366FC+1 día	0,1 días	
391		INTERVENCION No. 381	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	367FC+1 día	0,1 días	
392		INTERVENCION No. 382	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	368FC+1 día	0,1 días	
393		INTERVENCION No. 383	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	369FC+1 día	0,1 días	
394		INTERVENCION No. 384	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	370FC+1 día	0,1 días	
395		INTERVENCION No. 385	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	371FC+1 día	0,1 días	
396		INTERVENCION No. 386	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	372FC+1 día	0,1 días	
397		INTERVENCION No. 387	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	373FC+1 día	0,1 días	
398		INTERVENCION No. 388	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	374FC+1 día	0,1 días	
399		INTERVENCION No. 389	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	375FC+1 día	0,1 días	
400		INTERVENCION No. 390	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	376FC+1 día	0,1 días	
401		INTERVENCION No. 391	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	377FC+1 día	0,1 días	
402		INTERVENCION No. 392	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	378FC+1 día	0,1 días	
403		INTERVENCION No. 393	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	379FC+1 día	0,1 días	
404		INTERVENCION No. 394	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	380FC+1 día	0,1 días	
405		INTERVENCION No. 395	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	381FC+1 día	0,1 días	
406		INTERVENCION No. 396	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	382FC+1 día	0,1 días	
407		INTERVENCION No. 397	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	383FC+1 día	0,1 días	
408		INTERVENCION No. 398	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	384FC+1 día	0,1 días	
409		INTERVENCION No. 399	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	408CC	0,1 días	
410		INTERVENCION No. 400	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	408CC	6 días	
411		INTERVENCION No. 401	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	408CC	6 días	
412		INTERVENCION No. 402	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	408CC	6 días	
413		INTERVENCION No. 403	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	408CC	6 días	
414		INTERVENCION No. 404	UN	1	$9.917.432	5,8 días	lun 12/08/24	dom 18/08/24	408CC	6 días	
415		INTERVENCION No. 405	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	385FC+1 día	0,1 días	
416		INTERVENCION No. 406	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	386FC+1 día	0,1 días	
417		INTERVENCION No. 407	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	387FC+1 día	0,1 días	
418		INTERVENCION No. 408	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	388FC+1 día	0,1 días	
419		INTERVENCION No. 409	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	389FC+1 día	0,1 días	
420		INTERVENCION No. 410	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	390FC+1 día	0,1 días	
421		INTERVENCION No. 411	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	391FC+1 día	0,1 días	
422		INTERVENCION No. 412	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	392FC+1 día	0,1 días	
423		INTERVENCION No. 413	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	393FC+1 día	0,1 días	
424		INTERVENCION No. 414	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	394FC+1 día	0,1 días	
425		INTERVENCION No. 415	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	395FC+1 día	0,1 días	
426		INTERVENCION No. 416	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	396FC+1 día	0,1 días	
427		INTERVENCION No. 417	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	397FC+1 día	0,1 días	
428		INTERVENCION No. 418	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	398FC+1 día	0,1 días	
429		INTERVENCION No. 419	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	399FC+1 día	0,1 días	
430		INTERVENCION No. 420	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	400FC+1 día	0,1 días	
431		INTERVENCION No. 421	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	401FC+1 día	0,1 días	
432		INTERVENCION No. 422	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	402FC+1 día	0,1 días	
433		INTERVENCION No. 423	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	403FC+1 día	0,1 días	
434		INTERVENCION No. 424	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	404FC+1 día	0,1 días	
435		INTERVENCION No. 425	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	405FC+1 día	0,1 días	
436		INTERVENCION No. 426	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	406FC+1 día	0,1 días	
437		INTERVENCION No. 427	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	407FC+1 día	0,1 días	
438		INTERVENCION No. 428	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	408FC+1 día	0,1 días	
439		INTERVENCION No. 429	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	409FC+1 día	0,1 días	
440		INTERVENCION No. 430	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	410FC+1 día	6 días	
441		INTERVENCION No. 431	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	411FC+1 día	6 días	
442		INTERVENCION No. 432	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	412FC+1 día	6 días	
443		INTERVENCION No. 433	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	413FC+1 día	6 días	
444		INTERVENCION No. 434	UN	1	$9.917.432	6 días	lun 19/08/24	dom 25/08/24	414FC+1 día	6 días	
445		INTERVENCION No. 435	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	415FC+1 día	0,1 días	
446		INTERVENCION No. 436	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	416FC+1 día	0,1 días	
447		INTERVENCION No. 437	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	417FC+1 día	0,1 días	
448		INTERVENCION No. 438	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	418FC+1 día	0,1 días	
449		INTERVENCION No. 439	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	419FC+1 día	0,1 días	
450		INTERVENCION No. 440	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	420FC+1 día	0,1 días	
451		INTERVENCION No. 441	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	421FC+1 día	0,1 días	
452		INTERVENCION No. 442	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	422FC+1 día	0,1 días	
453		INTERVENCION No. 443	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	423FC+1 día	0,1 días	
454		INTERVENCION No. 444	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	424FC+1 día	0,1 días	
455		INTERVENCION No. 445	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	425FC+1 día	0,1 días	
456		INTERVENCION No. 446	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	426FC+1 día	0,1 días	
457		INTERVENCION No. 447	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	427FC+1 día	0,1 días	
458		INTERVENCION No. 448	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	428FC+1 día	0,1 días	
459		INTERVENCION No. 449	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	429FC+1 día	0,1 días	
460		INTERVENCION No. 450	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	430FC+1 día	0,1 días	
461		INTERVENCION No. 451	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	431FC+1 día	0,1 días	
462		INTERVENCION No. 452	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	432FC+1 día	0,1 días	
463		INTERVENCION No. 453	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	433FC+1 día	0,1 días	
464		INTERVENCION No. 454	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	434FC+1 día	0,1 días	
465		INTERVENCION No. 455	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	435FC+1 día	0,1 días	
466		INTERVENCION No. 456	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	436FC+1 día	0,1 días	
467		INTERVENCION No. 457	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	437FC+1 día	0,1 días	
468		INTERVENCION No. 458	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	438FC+1 día	0,1 días	
469		INTERVENCION No. 459	UN	1	$9.917.432	4,9 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	439FC+1 día	0,1 días	
470		**ACTIVIDAD 4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3.**			**$0**	**367 días**	**jue 24/08/23**	**sáb 31/08/24**		**0,38 días**	
471		PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3.			$0	335,87 días	jue 24/08/23	sáb 31/08/24		0,01 días	





Proyecto: Programacion V0
Fecha: sáb 22/06/24

Tarea | Hito | Tarea resumida | Hito resumido | División | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Fecha límite
Tarea crítica | Resumen | Tarea crítica resumida | Progreso resumido | Tareas externas | Agrupar por síntesis | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Progreso

PROPUESTA DE PROGRAMACION PARA LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA TOMADAS POR EL CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL			
POTENCIAL INICIAL	459	**META ACTULIZADA**	459
VIVIENDAS INICIADAS ACUMULADAS	176	**VIVIENDAS TERMINADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION ACUMULADAS**	76

SEMANAS	INICIO	FIN	VIVIENDAS INICIADAS		%	VIVIENDAS TERMINADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION		%
			SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
35	27/05/2024	2/06/2024	0	176	38%	16	92	20%
36	3/06/2024	9/06/2024	5	181	39%	36	128	28%
37	10/06/2024	16/06/2024	8	189	41%	24	152	33%
38	17/06/2024	23/06/2024	15	204	44%	24	176	38%
39	24/06/2024	30/06/2024	15	219	48%	14	190	41%
40	1/07/2024	7/07/2024	28	247	54%	20	210	46%
41	8/07/2024	14/07/2024	35	282	61%	25	235	51%
42	15/07/2024	21/07/2024	35	317	69%	35	270	59%
43	22/07/2024	28/07/2024	36	353	77%	39	309	67%
44	29/07/2024	4/08/2024	36	389	85%	41	350	76%
45	5/08/2024	11/08/2024	30	419	91%	24	374	81%
46	12/08/2024	18/08/2024	20	439	96%	30	404	88%
47	19/08/2024	25/08/2024	20	459	100%	30	434	95%
48	26/08/2024	31/08/2024		459	100%	25	459	100%

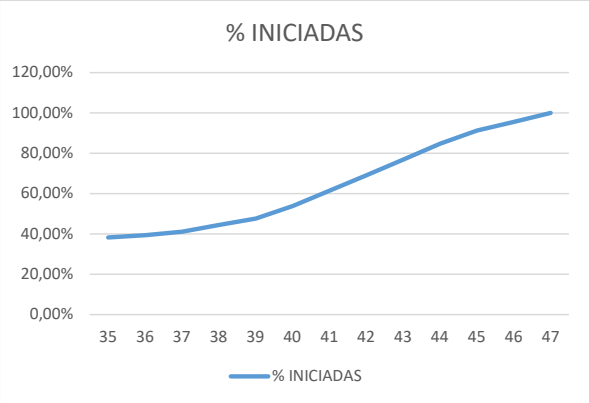

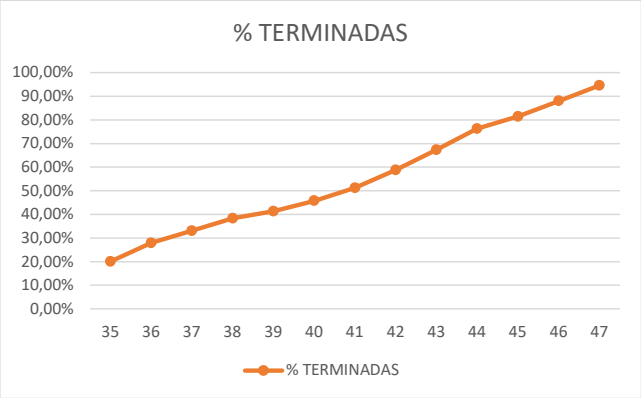

NOTAS: EL ESTADO DE AVANCE EFECTIVO DE LA PRESENTE PROGRAMACION SE PRESENTA TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES SALVEDADES:

1. Se debe contar con un buen estado de acceso de la via Condoto - Rio Iro. Este aspecto debe ser proporcionado por parte de la Admistracion de Municipio de Rio Iro.
2. Igualmente se debe contar con condiciones de seguridad optimas, sin eventos de orden publico que afecte la tranquilidad del personal administrativo como de mano de obra. Se debe observar el apoyo de la administracion Municipal del Municipio de Rio Iro. Lo anterior con el fin de brindar confianza al personal y lograr cumplir las metas de reincorporacion del personal de mano de obra.
3. Contar con buenas condiciones de clima; optima transitabilidad de vias principales que comunican al departamento de Choco con el departamento de Risaralda y Antioquia; Bajo nivel de enfermedad del personal por el paludismo. Estos factores han sido de gran dificultad para la firma Constatista de obra durante el desarrollo de la presente orden de Trabajo.
4. Que el nivel de Roca que se presente al momento de realizar las excavaciones no impida en normal desarrollo

Nota Interventoría: Tener presente aclaraciones salvedades, observaciones, recomendaciones, y requerimientos efectuados a través del comunicado No. CAEE- RI-2024-339, y CAEE-RI-2024-322

Ing. JOSE LUIS RADA RAYO
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
Representante Legal
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS.
INTERVENTORIA

C&E ENGINEERING SAS

GARANTÍAS APROBADAS
CONTRATO No 2230219 – INTERVENTORÍA

- **SEGÚN CONTRATO**

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 21-45-101415928			
CUMPLIMIENTO	14/07/2023	01/11/2024	$ 119.053.191,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/07/2023	01/03/2027	$ 39.684.397,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/03/2024	01/03/2027	$ 119.053.191,00
GARANTIA No. 21-40-101214825			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14/07/2023	01/03/2024	$ 290.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	14/07/2023	01/03/2024	$ 290.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/07/2023	01/03/2024	$ 290.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	14/07/2023	01/03/2024	$ 290.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/07/2023	01/03/2024	$ 290.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	14/07/2023	01/03/2024	$ 290.000.000,00

- **SEGÚN ACTA DE INICIO**

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 21-45-101415928			
CUMPLIMIENTO	24/08/2023	12/12/2024	$ 119.053.191,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	11/04/2027	$ 39.684.397,00
CALIDAD DEL SERVICIO	11/04/2024	11/04/2027	$ 119.053.191,00
GARANTIA No. 21-40-101214825			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00

- **SEGÚN SUSPENSIÓN No 1**

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 21-45-101415928			
CUMPLIMIENTO	24/08/2023	12/01/2025	$ 119.053.191,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	11/05/2027	$ 39.684.397,00
CALIDAD DEL SERVICIO	11/04/2024	11/04/2027	$ 119.053.191,00
GARANTIA No. 21-40-101214825			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00

- **SEGÚN ACTA DE REINICO No 1**

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 21-45-101415928			
CUMPLIMIENTO	24/08/2023	12/01/2025	$ 119.053.191,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	11/05/2027	$ 39.684.397,00
CALIDAD DEL SERVICIO	11/04/2024	11/04/2027	$ 119.053.191,00
GARANTIA No. 21-40-101214825			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/08/2023	11/05/2024	$ 325.000.000,00

- **SEGÚN PRÓRROGA**

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 21-45-101415928			
CUMPLIMIENTO	24/08/2023	12/01/2025	$ 148.816.489,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	11/05/2027	$ 49.605.497,00
CALIDAD DEL SERVICIO	11/04/2024	11/04/2027	$ 148.816.489,00
GARANTIA No. 21-40-101214825			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/08/2023	31/08/2024	$ 325.000.000,00

C&E ENGINEERING SAS

GARANTÍAS APROBADAS
CONTRATO No 2230223 OBRA

- **SEGÚN CONTRATO**

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 96-45-101081330			
CUMPLIMIENTO	27/07/2023	27/10/2024	$ 1.249.483.415.36
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	27/07/2023	27/10/2024	$ 805.225.665.88
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	27/02/2024	27/02/2025	$ 416.494.471.79
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27/07/2023	27/02/2027	$ 208.247.235.89
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/02/2024	27/02/2027	$ 1.249.483.415.36
GARANTIA No. 96-40-101064649			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/07/2023	27/02/2024	$ 832.988.943.57
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/07/2023	27/02/2024	$ 832.988.943.57
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/07/2023	27/02/2024	$ 416.494.471.79
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	27/07/2023	27/02/2024	$ 416.494.471.79
GASTOS MEDICOS	27/07/2023	27/02/2024	$ 416.494.471.79
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	27/07/2023	27/02/2024	$ 416.494.471.79
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	09/08/2023	27/02/2024	$ 416.494.471.79

- **SEGÚN ACTA DE INICIO**


CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 96-45-101081330			
CUMPLIMIENTO	24/08/2023	24/11/2024	$ 1.249.483.415.36
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	24/08/2023	24/11/2024	$ 805.225.665.88
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26/03/2024	27/03/2025	$ 416.494.471.79
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	27/03/2027	$ 208.247.235.89
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/03/2024	27/03/2027	$ 1.249.483.415.36
GARANTIA No. 96-40-101064649			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/08/2023	26/03/2024	$ 832.988.943.57
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2023	26/03/2024	$ 832.988.943.57
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2023	26/03/2024	$ 416.494.471.79
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2023	26/03/2024	$ 416.494.471.79
GASTOS MEDICOS	24/08/2023	26/03/2024	$ 416.494.471.79
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/08/2023	26/03/2024	$ 416.494.471.79
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/08/2023	26/03/2024	$ 416.494.471.79

- **SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 Y ACTA DE REINICIO No.1**

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 96-45-101081330			
CUMPLIMIENTO	24/08/2023	24/12/2024	$ 1.249.483.415.36
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	24/08/2023	24/12/2024	$ 805.225.665.88
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26/03/2024	27/03/2025	$ 416.494.471.79
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	24/04/2027	$ 208.247.235.89
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/03/2024	27/03/2027	$ 1.249.483.415.36
GARANTIA No. 96-40-101064649			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/08/2023	24/04/2024	$ 832.988.943.57
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2023	24/04/2024	$ 832.988.943.57
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2023	24/04/2024	$ 416.494.471.79
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2023	24/03/2024	$ 416.494.471.79
GASTOS MEDICOS	24/08/2023	24/03/2024	$ 416.494.471.79
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/08/2023	24/03/2024	$ 416.494.471.79
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/08/2023	24/03/2024	$ 416.494.471.79

- **SEGÚN PRÓRROGA**

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 96-45-101081330			
CUMPLIMIENTO	24/08/2023	30/04/2025	$ 1.249.483.415,36
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	24/08/2023	30/04/2025	$ 805.225.665,88
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26/03/2024	27/03/2025	$ 416.494.471,79
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	31/08/2027	$ 208.247.235,89
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/03/2024	27/03/2027	$ 1.249.483.415,36
GARANTIA No. 96-40-101064649			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/08/2023	31/08/2024	$ 832.988.943,57
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2023	31/08/2024	$ 832.988.943,57
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2023	31/08/2024	$ 416.494.471,79
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2023	31/08/2024	$ 416.494.471,79
GASTOS MEDICOS	24/08/2023	31/08/2024	$ 416.494.471,79
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/08/2023	31/08/2024	$ 416.494.471,79
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/08/2023	31/08/2024	$ 416.494.471,79

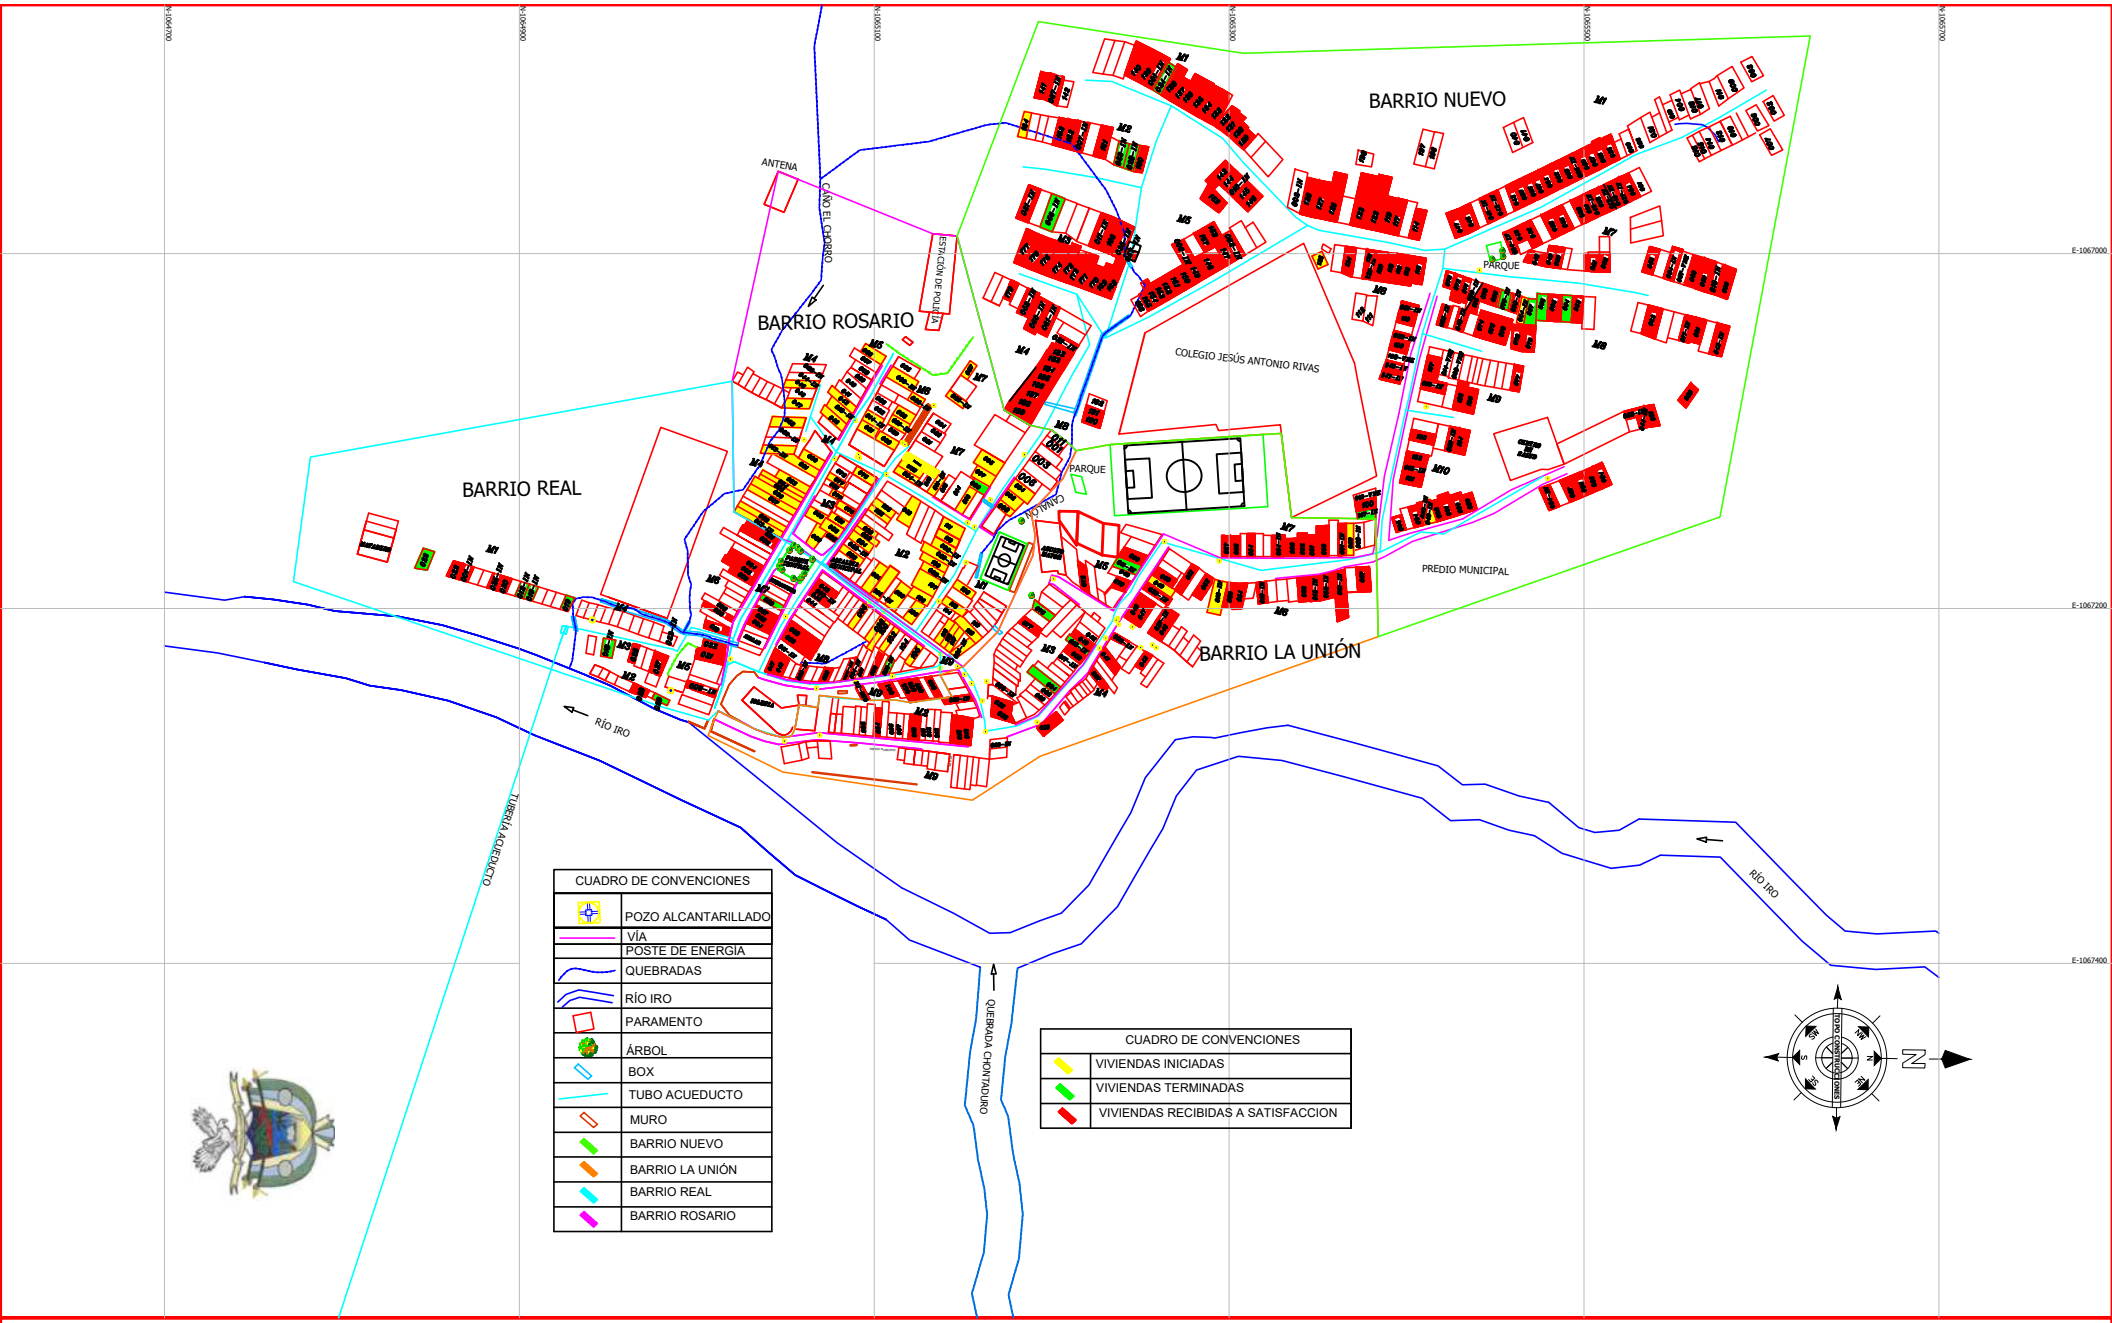

CUADRO DE CONVENCIONES	
	POZO ALCANTARILLADO
	VÍA
	POSTE DE ENERGIA
	QUEBRADAS
	RÍO IRO
	PARAMENTO
	ÁRBOL
	BOX
	TUBO ACUEDUCTO
	MURO
	BARRIO NUEVO
	BARRIO LA UNIÓN
	BARRIO REAL
	BARRIO ROSARIO

CUADRO DE CONVENCIONES	
	VIVIENDAS INICIADAS
	VIVIENDAS TERMINADAS
	VIVIENDAS RECIBIDAS A SATISFACCION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DE RÍO IRO
PERÍMETRO URBANO

Contiene: IDENTIFICACIÓN DE BARRIOS ZONA URBANA SANTA RITA DE IRO

Proyecto: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA URBANA

Propietario: MUNICIPIO DE RÍO IRO NIT. 818001203-0

Alcalde: RIGOBERTO MOSQUERA MOSQUERA C.C No. 11.706.360 de Istmina

Área: VEINTICUATRO HECTÁREAS (24 hect.)

Oficina de planeación y obras publicas: ANUARD ODAIR MORENO Arquitecto

Escala: 1 : 1250

Plano: 2 de 4

Fecha: 22 - 10 - 2016

Levanto y dibujo: ALIRIO MATEUS GÓMEZ T.P. No. 01-3153 C.P.N.T. Topógrafo Profesional

OBSERVACIONES:

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	CÓDIGO:	**F-GG-24**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

TIPO DE CONTRATO:	OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. EN EL MUNICIPIO DE RÍO IRÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.					
N° DE CONVENIO:	222006					
N° DE CONTRATO:	2230223	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/08/2024	**Y EL**	31/08/2024	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL					
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo			NO APLICA
- Regularidad del mantenimiento			NO APLICA
- Vibraciones /Ruidos			NO APLICA
- Protecciones / Guardas / Frenos			NO APLICA
- Idoneidad operarios			NO APLICA
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa		x	Se ha efectuado múltiples observaciones y se ha solicitado entregar la dotación de los elementos de protección al contratista de obra, con el objetivo de asegurar que todo el personal cuente con los Elementos de Protección Personal (EPPs) necesarios y que hagan uso correcto y constante de los mismos.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo			NO APLICA
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			No se cuenta con Vigilancia. Sin embargo, el contratista debe garantizar salvarguardar los elementos, materiales equipos de la obra
- Diurna			
- Nocturna			
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			NO APLICA
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		

Firma: _____

Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
