Código: 2BS-FR-0074		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-05-2021			
Versión: 0		RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

CONTRATO:	No 10-6-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

UNIDAD:	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	Valor total del Contrato:	$ 2.350.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	B.G. JOSE DANIEL GUALDRON MORENO	Valor inicial del Contrato:	$ 2.000.000.000,00
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:		Fecha de Inicio Contrato:	10/08/2024
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S " PROSOI S.A.S"	Valor Adición No. 1:	$ 350.000.000,00
SUPERVISOR TÉCNICO:	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA	Valor Adición No. 2:	$ -
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:		Valor total presente formato:	$ 29.636.014,31
RESIDENTE DE OBRA:	ING. Diego Fernando Gras Diaz	Fecha presenta formato:	07/10/2024
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING. Alvaro Rodriguez Rangel	Corte de mantenimiento:	CORTE 1
		Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	OCTUBRE 2024

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO
CONSECUTIVO NECESIDAD :	E2-01
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	GARITA DE SEGURIDAD # 3
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.02.	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m	ML	11,00	8,50	$ 24.365,00	$ 207.102,50	
	A1-1.06.	Excavación Manual	M3	2,00	1,53	$ 31.423,00	$ 48.077,19	
	A1-1.09.	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)	M3	1,20	1,03	$ 31.639,00	$ 32.588,17	
	A1-1.10.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	8,50	8,01	$ 19.973,00	$ 159.983,73	
	A1-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2	0,00	3,21	$ 81.288,00	$ 260.934,48	
	A1-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	0,00	2,35	$ 24.171,00	$ 56.801,85	
	A1-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	4,20	2,35	$ 13.677,00	$ 32.140,95	
	A1-1.16.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	0,00	5,34	$ 8.548,00	$ 45.646,32	
	A1-1.25.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	0,00	1,90	$ 5.129,00	$ 9.745,10	
	A1-1.40.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos	ML	2,40	2,40	$ 1.710,00	$ 4.104,00	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS						$ -	
	A1-2.33.	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	7,80	9,38	$ 70.173,00	$ 658.222,74	

Código: 2BS-FR-0074		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-05-2021			
Versión: 0		RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

CONTRATO:	No 10-8-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

	A1-2.35.	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.	M2	0,00	6,31	$ 68.638,00	$ 433.105,78	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS						$ -	
	A1-4.06.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	ML	65,00	4,00	$ 43.575,00	$ 174.300,00	
	A1-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	1,00	1,00	$ 24.055,00	$ 24.055,00	
	A1-4.27.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT	UN	2,00	1,00	$ 105.409,00	$ 105.409,00	
	A1-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	1,00	1,00	$ 20.246,00	$ 20.246,00	
	A1-4.36.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON	UN	4,00	3,00	$ 43.912,00	$ 131.736,00	
	A1-4.37.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa	UN	0,00	11,00	$ 103.352,00	$ 1.136.872,00	
	A1-4.39.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS	UN	0,00	1,00	$ 433.424,00	$ 433.424,00	
	A1-4.51.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	0,00	1,00	$ 51.890,00	$ 51.890,00	
	A1-4.54.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	0,00	1,00	$ 24.517,00	$ 24.517,00	
	A1-4.58.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios	UN	0,00	2,00	$ 145.007,00	$ 290.014,00	
	A1-4.67.	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	20,00	130,87	$ 69.403,00	$ 9.082.770,61	
	A1-4.70.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100	UN	0,00	1,00	$ 244.258,00	$ 244.258,00	
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA						$ -	
	A1-6.05.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada	ML	11,00	10,02	$ 67.162,00	$ 672.963,24	
	A1-6.11.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	8,50	6,13	$ 52.590,00	$ 322.376,70	
	A1-6.22.	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	15,00	24,04	$ 151.397,00	$ 3.639.583,88	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA						$ -	
	A1-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	10,80	12,84	$ 11.746,00	$ 150.818,64	
	A1-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	12,50	7,37	$ 27.756,00	$ 204.561,72	
	A1-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	0,00	10,68	$ 27.946,00	$ 298.463,28	

Código: 2BS-FR-0074	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

CONTRATO:	No 10-8-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

	A1-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	25,00	21,08	$ 24.305,00	$ 512.349,40	
	A1-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	5,00	19,76	$ 19.832,00	$ 391.880,32	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS						$ -	
	A1-8.02.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm	M2	4,20	7,82	$ 21.340,00	$ 166.878,80	
	A1-8.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	0,00	2,35	$ 73.643,00	$ 173.061,05	
	A1-8.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML	0,00	5,34	$ 13.618,00	$ 72.720,12	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS						$ -	
	A1-9.48.	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.	M2	0,00	1,90	$ 153.093,00	$ 290.876,70	
	A1-9.78.	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.	ML	0,00	12,84	$ 21.632,00	$ 277.754,88	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES						$ -	
	A1-12.05.	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	0,50	0,50	$ 1.002.525,00	$ 501.262,50	
	A1-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	7,50	26,71	$ 37.686,00	$ 1.006.593,06	
	A1-12.34.	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado	M2	0,00	3,21	$ 92.099,00	$ 295.637,79	
	A1-12.36.	Suministro e instalación de anclaje epóxica hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	12,00	12,00	$ 13.579,00	$ 162.948,00	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS						$ -	
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	15,50	15,00	$ 6.867,00	$ 103.005,00	
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	2,00	2,14	$ 73.924,00	$ 158.197,36	
18	OTROS						$ -	
	18.01.	Trasiego interno de materiales, incluye retiro de escombros e ingreso de suministros, desde acceso, hasta el sitio de acopio, esto debido, a que las volquetas y demas vehiculos de transporte no pueden ingresar al patio de las unidades policiales	M3	2,00	3,14	$ 31.247,00	$ 98.115,58	

Código: 2BS-FR-0074		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-05-2021			
Versión: 0		RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

CONTRATO:		No 10-8-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.					
	18.63.	Mantenimiento y/o reposición de película adhesiva sandblass frosted y logos institucionales en el mismo material	M2	0,00	1,90	$	44.768,00	$ 85.059,20

SUBTOTAL		$ 23.253.051,64
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 23.253.051,64
ADMINISTRACION	21,00%	$ 4.883.140,84
IMPREVISTOS	0,50%	$ 116.265,26
UTILIDAD	5,00%	$ 1.162.652,58
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 220.903,99
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 6.382.962,67
COSTO TOTAL		$ 29.636.014,31
SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR		
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR		

Elaboró:

ING. Alvaro Rodriguez Rangel
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:

ING. Diego Fernando Gras Diaz
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:

Alvaro Rodriguez Rangel
CONTRATISTA

Verificación Técnica:

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAÍCES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI_____ NO _____ Número de Comité _____ Fecha de Comité _____

OBSERVACIONES

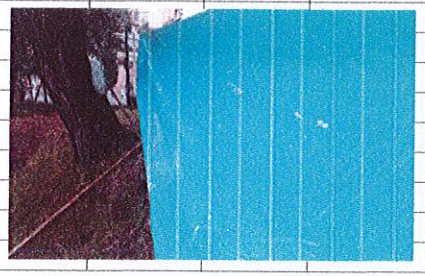
Revisó y Autorizó:

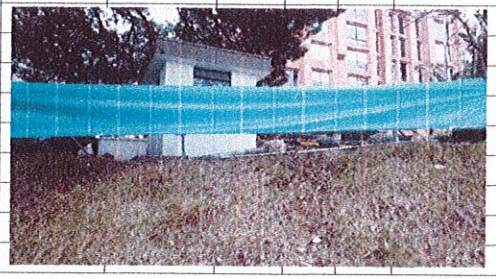
COMANDANTE O JEFE DE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO*
(Esta firma solo aplica para trámites de necesidades de la unidad sin delegación del gasto)

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES						REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.02.	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m			UNIDAD	ML		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Cerramiento de garita de segiridad # 3		6,07	1,40	1,00	8,50					8,50	
TOTAL										8,50	







Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES					REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.06.	Excavación Manual			UNIDAD	M3	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
excavacion manual de materas	0,30	5,23	0,70	1,00	1,10					1,10	
excavacion para cimientos de talanquera	0,60	0,60	0,60	2,00	0,43					0,43	
										-	
TOTAL										1,53	






Observaciones:

Contratista

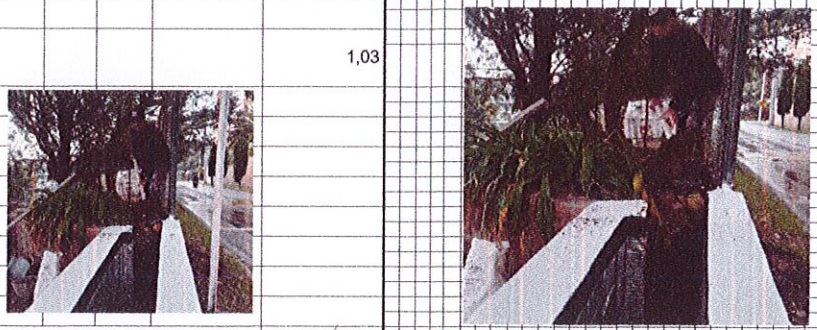
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES					REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.09.	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)			UNIDAD	M3	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
relleno de tierra de manera manual en materas de garita de seguridad	0,30	5,23	0,66	1,00	1,03					1,03	
TOTAL										1,03	

Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES						REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.10.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque			UNIDAD	M2		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE DE MUROS EXTERNOS		5,60	0,80	1,00	4,48					4,48	
DESMONTE DE MUROS INTERNOS		4,41	0,80	1,00	3,53					3,53	
TOTAL										8,01	







Observaciones:

Pag. ___ de ___

Contratista

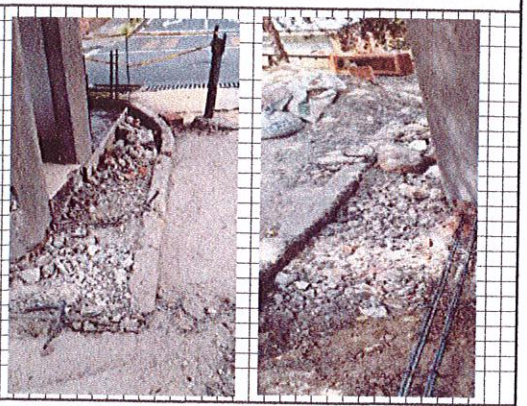
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES					REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.13.	Desmonte Placas Macizas			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE DE ANDEN EN CONCRETO DETERIORADO		0,66	4,87	1,00	3,2109					3,21	
TOTAL										3,21	

Observaciones:

Contratista

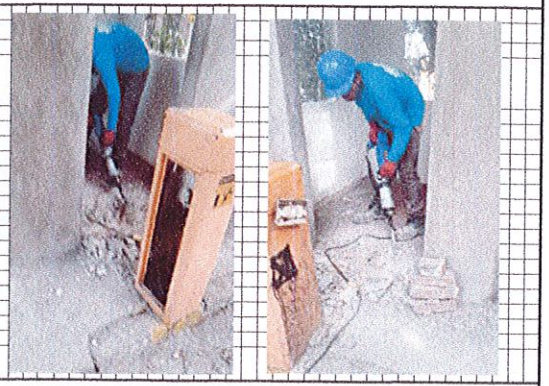
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES					REF.	CONTRACTUAL		
A1-1.14.	Desmonte Alistado de Piso			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE ALISTADO DE PISO INTERNO DE GARITA		1,53	1,54	1,00	2,35					2,35	
TOTAL										2,35	

Observaciones:

Contratista

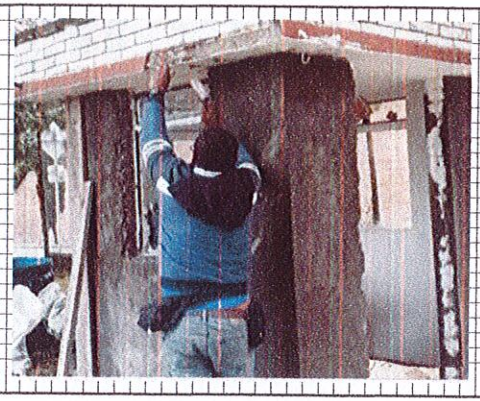
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES					REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE ENCHAPE DE PISO INTERNO DE GARITA		1,53	1,54	1,00	2,35					2,35	
TOTAL										2,35	

Observaciones:

Contratista

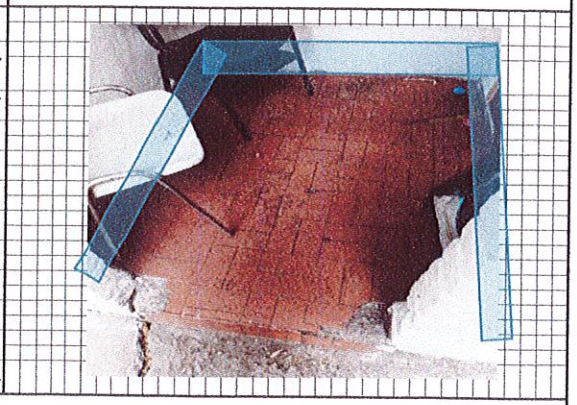
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA 7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3			
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES				REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.16.	Desmonte de Guarda Escoba			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE GUARDA ESCOBA DE PISO INTERNO DE GARITA		1,54		2,00	3,07					3,07	
		1,54		2,00	3,07					3,07	
VANO DE PUERTA							0,80			- 0,80	
TOTAL										5,34	

Observaciones:

Contratista

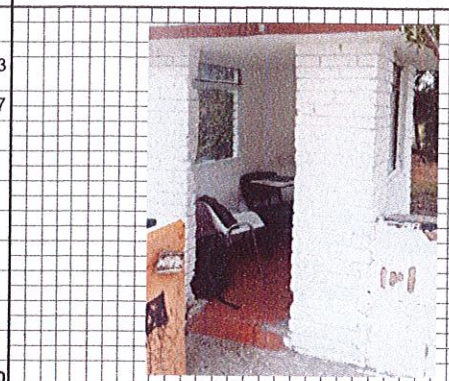
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"				FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ				CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO			NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3						
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES							REF.	CONTRACTUAL		
A1-1.25.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos				UNIDAD	M2		REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE DE VIDRIOS DE VENTANAS FIJAS		0,72	0,71	3,00	1,53					1,53	
DESMONTE DE VIDRIOS DE VENTANAS		0,72	0,17	3,00	0,37					0,37	
											
TOTAL										1,90	

Observaciones: Se desmontaron los vidrios de las ventanas debido al mantenimiento integral de la carpintería metálica "ornamentación" al igual el vidrio se encontraba deteriorado por su vetustez

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES						REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.40.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos			UNIDAD	ML		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
desmonte de cableado con tubería existente			2,40	1,00	2,40					2,40	
TOTAL										2,40	

Observaciones: Se realiza el retiro de la tuberia que no estaba funcionando no tenia anergía electrica.

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S


Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

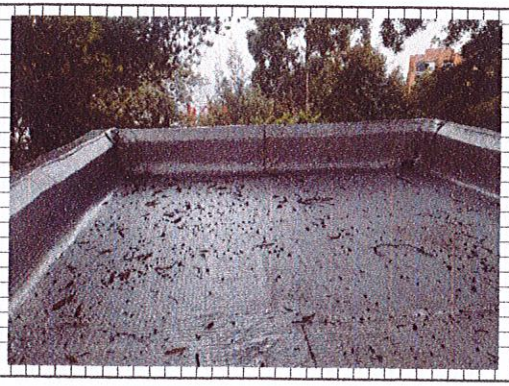
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-2.33.	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
Instalacion de manto sobre garita de seguridad		3,06	3,07	1,00	9,38					9,38	
TOTAL										9,38	







Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

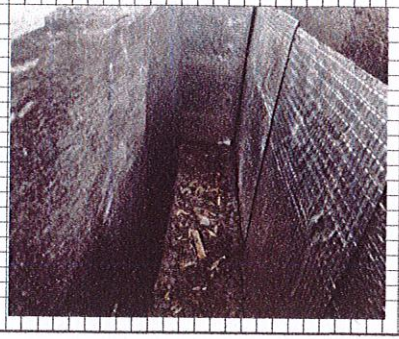
ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-2.35.	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.		UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Instalacion de manto en interior de materas		5,60	0,60	1,00	3,36					3,36	
Instalacion de manto en interior de materas		4,92	0,60	1,00	2,95					2,95	
TOTAL										6,31	





Observaciones:

Contratista

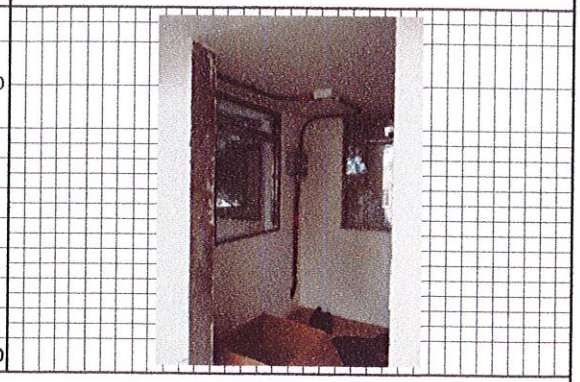
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					REF.	CONTRACTUAL		
A1-4.06.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
instalacion de red electrica libre de alojeno desde la caja de 12 circuitos hasta los puntos electricos			4,00	1,00	4,00					4,00	
TOTAL										4,00	

Observaciones:

Contratista

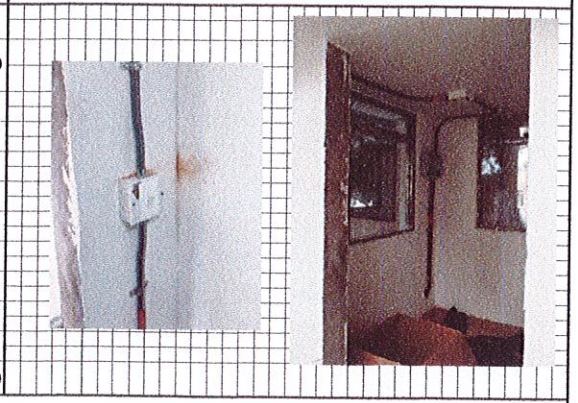
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS						REF.	CONTRACTUAL	
A1-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo			UNIDAD	UN		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Instalacion de interruptpr sencillo para garita de seguridad				1,00	1,00					1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones:

Pag. ___ de ___

Contratista

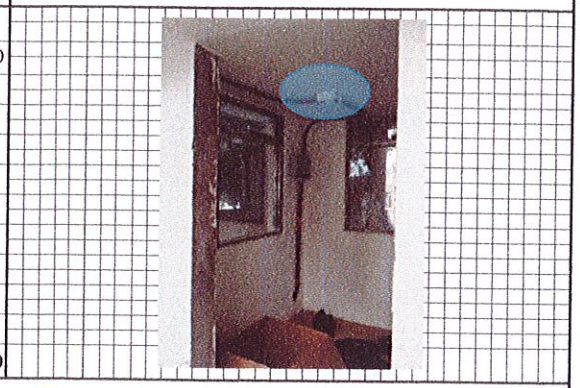
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024	
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24						
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3							
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS						REF.	CONTRACTUAL			
A1-4.27.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT			UNIDAD	UN		REF.	HOJA 1 DE 1			

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
instalacion de salida para luminaria				1,00	1,00					1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones:

Contratista


ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana			UNIDAD	UN	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
instalacion de toma amaricana de 110v				1,00	1,00					1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones:

Pag. ___ de ___

Contratista

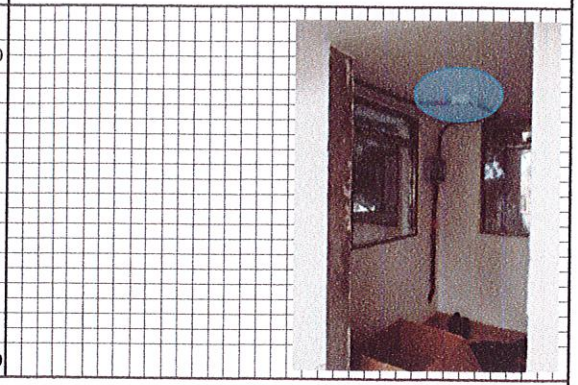
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					REF.	CONTRACTUAL		
A1-4.36.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON			UNIDAD	UN	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
istalacionnde caja dexon en garita de seguridad				3,00	3,00					3,00	
TOTAL										3,00	

Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor


ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS						REF.	CONTRACTUAL	
A1-4.37.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa			UNIDAD	UN		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
istalacionnde caja de paso para acometida electrica				11,00	11,00					11,00	
TOTAL										11,00	







Observaciones:

Pag. ___ de ___

Contratista

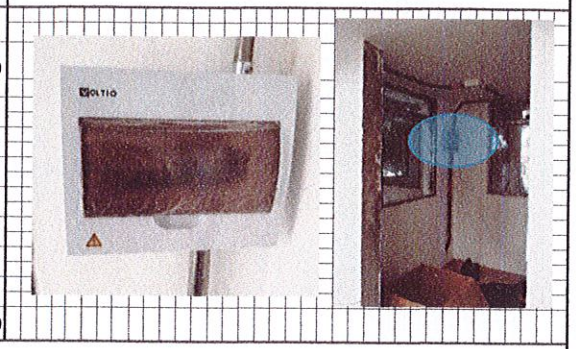
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					REF.	CONTRACTUAL		
A1-4.39.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS			UNIDAD	UN	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
instalacion de tablero parte interna de la garita de seguridad				1,00	1,00					1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones:

Contratista


ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-4.51.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w			UNIDAD	UN	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
instalacion de panel led parte interna de la garita de seguridad				1,00	1,00					1,00	  
TOTAL										1,00	

Observaciones:

Pag. ___ de ___

Contratista

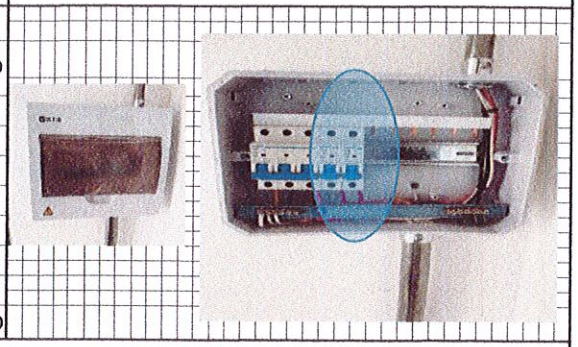
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"				FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ				CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO			NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS							REF.		CONTRACTUAL	
A1-4.54.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios				UNIDAD	UN		REF.		HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
instalacion de breakers en tablero parte interna de la garita de seguridad				1,00	1,00					1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones:

Contratista

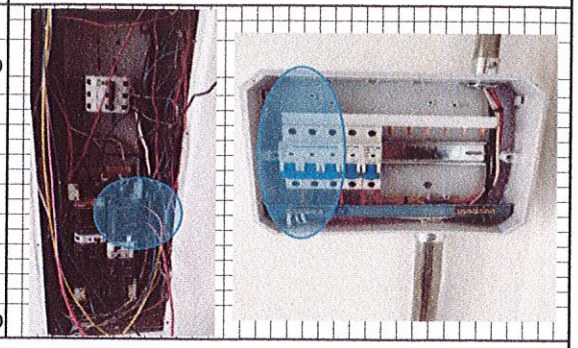
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA 7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS				REF.	CONTRACTUAL	
A1-4.58.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios		UNIDAD	UN	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
instalacion de breakers en tablero parte interna de la garita de seguridad				2,00	2,00					2,00	
TOTAL										2,00	

Observaciones: estos breakers estan instalados uno en la parte interna de la garirta de seguridad y en el casino de oficiales primer piso pared junto al baño de los hombres.

Contratista

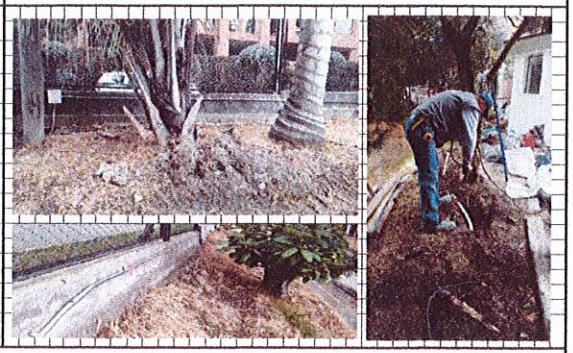
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-4.67.	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	largo	CANTIDAD		L	a	h			
acometida electrica			130,87	1,00	130,87					130,87	
TOTAL										130,87	

Observaciones:

Contratista

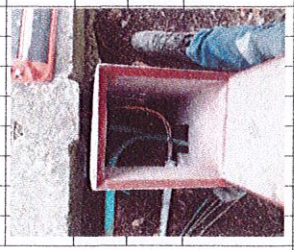
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					REF.	CONTRACTUAL		
A1-4.70. /	Mantenimiento y/o reposición e instalación de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100 /			UNIDAD	UN /	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	largo	CANTIDAD		L	a	h			
Caja premoldeads de acometida				1,00	1,00					1,00	  
TOTAL										/1,00	

Observaciones:

Pag. ___ de ___

Contratista

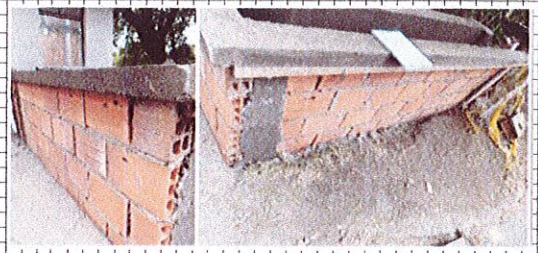
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					REF.	CONTRACTUAL	
A1-6.05.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
											
alfagia de muro de matera concreto de 3000 psi			5,72	1,00	5,72					5,72	
alfagia de muro de matera concreto de 3000 psi			4,30	1,00	4,30					4,30	
TOTAL										10,02	

Observaciones: fundida junto a viga de coronacion para obtener un elemento estructural que forma un diafragma el cual nos confina la mamposteria para que no se agriete.

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

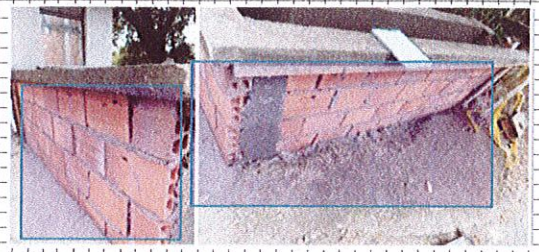
ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					REF.	CONTRACTUAL		
A1-6.11.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
instalación de muro intertno de matera		5,60	0,60	1,00	3,36					3,36	
instalación de muro externo de matera		4,62	0,60	1,00	2,77					2,77	
TOTAL										6,13	





Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA					REF.	CONTRACTUAL	
A1-6.22.	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
viga de amarre de confinamiento exterior		5,60		2,00	11,20					11,20	
viga de amarre de confinamiento inferior		4,62		2,00	9,23					9,23	
pedestales			0,60	6,00	3,61					3,61	
TOTAL										24,04	

Observaciones:

Contratista

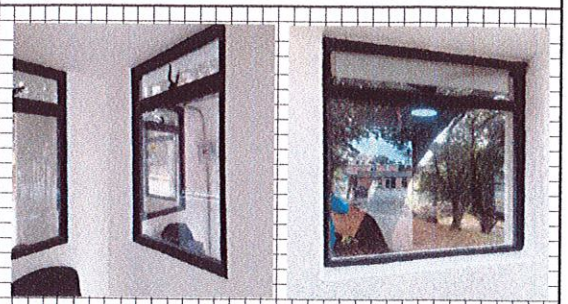
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"	FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ	CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA		REF.	CONTRACTUAL			
A1-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			cantidad	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ventanas		0,78		3,00	2,34				3,00	7,02	
		0,97		2,00	1,94				3,00	5,82	
TOTAL										12,84	

Observaciones: esmalte negro brillante para ornamentacion.

Pag. ___ de ___

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"	FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ	CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA		REF.	CONTRACTUAL			
A1-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	PERIMETRO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muros internos de garita		6,16	1,84	1,00	11,31					11,31	
Vano de ventana						0,78	1,00	3,00	- 2,34	- 2,34	
Vano de puerta						0,80	2,00		- 1,60	- 1,60	
TOTAL										7,37	

Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

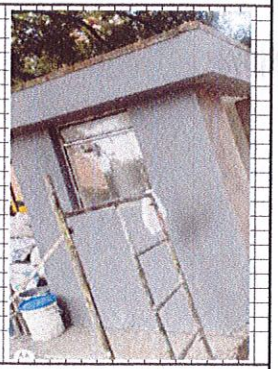
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA 7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA			REF.	CONTRACTUAL		
A1-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
areas externas de garita de seguridad	7,20		2,03	1,00	14,62					14,62
Vano de ventana						0,78	1,00	3,00	- 2,34	- 2,34
Vano de puerta						0,80	2,00		- 1,60	- 1,60
TOTAL										10,68

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS







Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA					REF.	CONTRACTUAL	
A1-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
areas externas de garita de seguridad	7,20		2,06	1,00	14,80					14,80	
Vano de ventana						0,78	1,00	3,00	- 2,34	- 2,34	
Vano de puerta						0,80	2,00		- 1,60	- 1,60	
Areas de materas externas	10,22		1,00	1,00	10,22					10,22	
TOTAL										21,08	

Observaciones:

Contratista

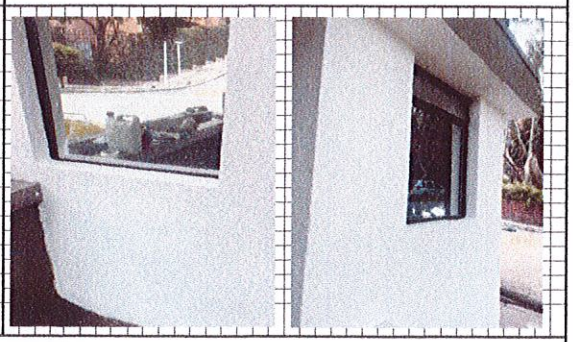
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA					REF.	CONTRACTUAL	
A1-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	PERIMETRO	CANTIDAD		L	a	h			
area de ventanas filos			2,80	3,00	8,40					8,40	
area de perimetro de antepecho			2,31	4,00	9,24					9,24	
filos de puerta			2,12	1,00	2,12					2,12	
TOTAL										19,76	

Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-8.02.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
alistado de piso		1,54	1,53	1,00	2,35					2,35	
ALISTADO DE TECHO DE GARITA		2,31	2,37	1,00	5,47					5,47	
TOTAL										7,82	





Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"					FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024	
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ					CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24					
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA												
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO				NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3							
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS								REF.		CONTRACTUAL		
A1-8.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado					UNIDAD	M2		REF.		HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
Piso de garita		1,54	1,53	1,00	2,35					2,35	
TOTAL										2,35	

Observaciones:

Contratista

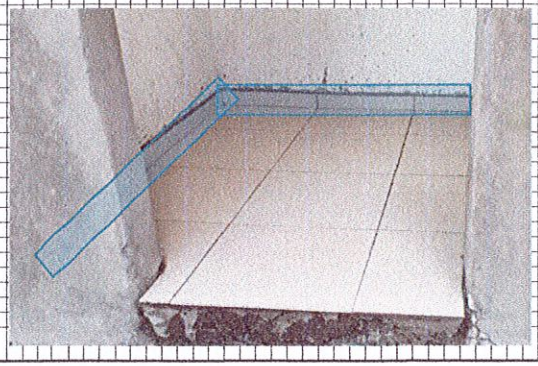
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-8.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
guarda escobas interior de garita de seguridad 3		1,54	1,54	2,00	4,73					4,73	
guarda escobas cerca del tablero general			0,61	1,00	0,61					0,61	
TOTAL										5,34	

Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-9.48.	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE VENTANAS FIJAS		0,72	0,71	3,00	1,53					1,53	
INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE VENTANAS		0,72	0,17	3,00	0,37					0,37	
TOTAL										1,90	

Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S


Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS					REF.	CONTRACTUAL		
A1-9.78.	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
ventanas		0,78		3,00	2,34				3,00	7,02	
		0,97		2,00	1,94				3,00	5,82	
TOTAL										12,84	





Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

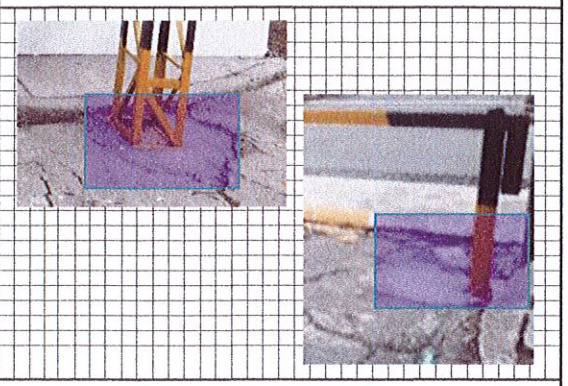
ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"		FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ		CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES				REF.	CONTRACTUAL	
A1-12.05.	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I		UNIDAD	M3	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
dados de concreto para talanquera	0,60	0,60	0,60	1,00	0,22					0,22
	0,60	0,60	0,80	1,00	0,29					0,29
TOTAL										0,50

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS



Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

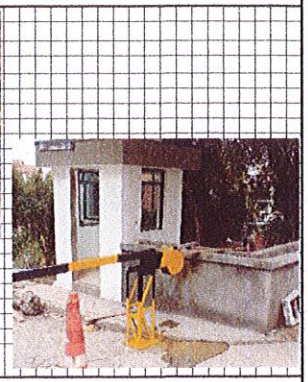
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA 7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA						
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES			REF.	CONTRACTUAL		
A1-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	LARGO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
pañete para materas		5,72	0,78	2,00	8,92					8,92
		4,56	0,78	2,00	7,11					7,11
areas externas de garita de seguridad	7,20		2,03	1,00	14,62					14,62
Vano de ventana						0,78	1,00	3,00	- 2,34	- 2,34
Vano de puerta						0,80	2,00		- 1,60	- 1,60
TOTAL										26,71

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS





Observaciones:

Contratista

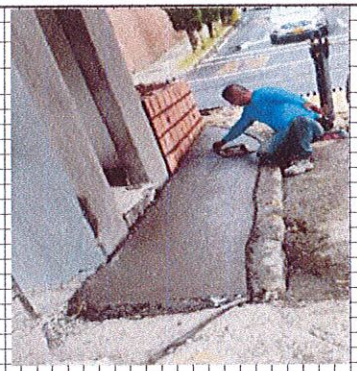
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24					
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3							
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES			REF.	CONTRACTUAL					
A1-12.34.	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1			

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE DE ANDEN EN CONCRETO DETERIORADO		0,66	4,87	1,00	3,21					3,21	
TOTAL										3,21	

Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024	
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.	No 10-6-30025-24						
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3							
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES						REF.	CONTRACTUAL			
A1-12.36.	Suministro e instalación de anclaje epóxica hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior			UNIDAD	UN		REF.	HOJA 1 DE 1			

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
anclajes epoxicos par amarre de la estructura				12,00	12,00					12,00	
TOTAL										12,00	

Observaciones:

Contratista

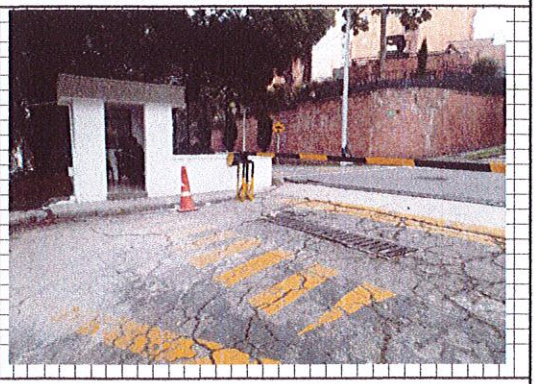
ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"				FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ				CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO			NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3						
CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							REF.	CONTRACTUAL		
A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento				UNIDAD	M2		REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
aseo permanente		3,00	5,00	1,00	15,00					15,00	
TOTAL										15,00	

Observaciones:

Pag. ___ de ___

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la Ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO		NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3				
CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales			UNIDAD	M3	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
retiro de escombros por dados de concreto para talanquera	0,60	0,60	0,60	1,00	0,22					0,22	
	0,60	0,60	0,80	1,00	0,29					0,29	
excavacion manual de materas	0,30	5,23	0,70	1,00	1,10					1,10	
demolicion de placas		0,66	4,87	1,00	3,21				0,12	0,39	
demolicion de enchape		1,54	1,54	0,07	0,15					0,15	
TOTAL										2,14	

Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

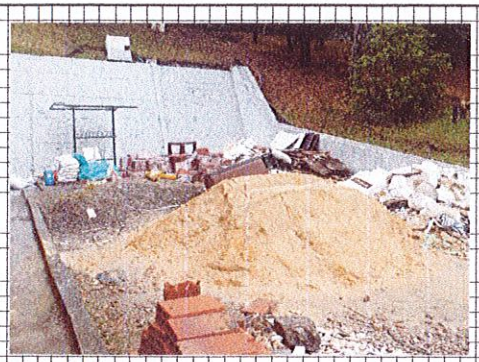
ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	OTROS					REF.	CONTRACTUAL	
18.01.	Trasiego interno de materiales, incluye retiro de escombros e ingreso de suministros, desde acceso, hasta el sitio de acopio, esto debido, a que las volquetas y demas vehiculos de transporte no pueden ingresar al patio de las unidades policiales		UNIDAD	M3	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
retiro de escombros por dados de concreto para talanquera	0,60	0,60	0,60	1,00	0,22					0,22
	0,60	0,60	0,80	1,00	0,29					0,29
excavacion manual de materas	0,30	5,23	0,70	1,00	1,10					1,10
demolicion de placas		0,66	4,87	1,00	3,21				0,12	0,39
demolicion de enchape		1,54	1,54	0,07	0,15					0,15
suministro de material desde la primera terraza hasta las tercera				1,00	1,00					1,00
cemento , bloque, arena, canecas de pintura , mixto										
TOTAL										3,14

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS



Observaciones:

Contratista

Ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

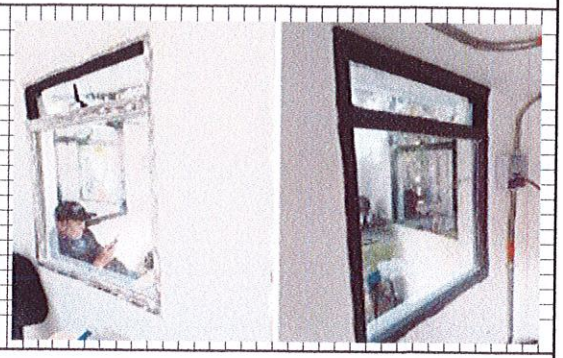
ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S "PROSOI S.A.S"			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ING. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ			CONTRATO OBRA No.		No 10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO	NECESIDAD:	E2-01: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES # 3					
CAPITULO	OTROS					REF.	CONTRACTUAL	
18.63.	Mantenimiento y/o reposición de película adhesiva sandblass frosted y logos institucionales en el mismo material			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
INSTALACION DE PELICULA DE VIDRIOS DE VENTANAS FIJAS		0,72	0,71	3,00	1,53					1,53
INSTALACION DE PELICULA DE VIDRIOS DE VENTANAS		0,72	0,17	3,00	0,37					0,37
TOTAL										1,90

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS



Observaciones:

Contratista

ing. DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra - PROSOI S.A.S

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
