	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3706-2023 **Contratista:** JAC VEREDA LAS CRUCES

Contrato de Interventoría No. 4498-2023 **Interventoría:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** JUNIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	0
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal		15
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra		15
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra		15
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		16
4.5	Estado General del Tiempo		16
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		16
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra		16
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		16
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		17
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité Operativo de Obra		17
5	**Conclusiones y recomendaciones**		18
6	**Anexos**		
6,1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		19
6,2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		20
6,3	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		26
6,4	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	52
6,5	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	65
6,6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	69
6,7	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	73
6,8	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	75
6,9	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	77
6,10	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	79
6,11	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
6,12	• Actas de Comité Operativo de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	89

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. de fecha 27/11/2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No. 2



CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3706 DE 2023

MUNICIPI O DE SAN JUAN DE URABÁ

PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROYECTO

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 1/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** JUNIO

CONVENIO No.: 3706-2023

OBJETO:
OBJETO:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 28/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 4,97 MESES

VALOR INICIAL : $ 199.290.132,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.290.132,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	139
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Limpieza de alcantarilla		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	0	
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento	Limpieza de alcantarilla			
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.667.400,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.520.022,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.102.710,00
APORTES JAC	$ 1.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.290.132,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 12.580.613	$ 12.580.613,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00
APORTES JAC		
VALOR EJECUTADO	$ 15.080.613,00	$ 17.580.613,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.290.132,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 17.580.613,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 8,82%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



tramo 1



tramo 1



tramo 1



tramo 1




tramo 1



tramo 1

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)



Firma

Nombre ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2024, por la Junta de Acción Comunal ejecutor del Convenio solidario 3706-2023 cuyo objeto es: " **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**", para el mejoramiento de la vía priorizada por la JAC de la vereda Las Cruces.

El objetivo principal de este informe, es presentar el avance técnico, administrativo y financiero ejecutado hasta la fecha en desarrollo del Convenio solidario e Interventoría, proyecto que hace parte del programa "Caminos comunitarios de la Paz Total" que busca ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en los corredores viales estratégicos de acuerdo a la problemática que se presenta frente al abandono de las vías rurales, las cuales se encuentran en mal estado, intransitables y sin mantenimiento.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización.

El municipio de San Juan de Urabá se encuentra localizado en la subregión de Urabá del Departamento de Antioquia, dista 441 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, pesca y producción agrícola de productos. Tiene una extensión total de 239 km cuadrados.

El tramo vial a intervenir se encuentra en la vereda Las Cruces perteneciente al Municipio de San Juan de Urabá en el Departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia las coordenadas inicial y final respectivamente N 8° 43' 16.165" O 76° 36' 3.337" - N 8°42' 50.357" O 76°35' 45.801" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda Los Naranjos del municipio de San Juan de Urabá Antioquia**,** conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS



Figura No 1. Ubicación General - Fuente Google Maps

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



Figura No 2. Ubicación – Fuente Google Maps

2.2 Municipios de la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Con el proyecto se pretende beneficiar la vereda las cruces y el corregimiento de Damaquiel, la ejecución traerá los siguientes beneficios a la vereda:

- ✓ Mejorar la competitividad y transitabilidad de los corredores productivos.
- ✓ Mayor integración y comunicación entre las localidades del ámbito de influencia.
- ✓ Brindar alternativas estables de ingresos, empleo y valorización patrimonial a las familias y comunidades campesinas del área de influencia del proyecto.
- ✓ Disminución de costos del producción, transporte y comercialización agrícola.
- ✓ Oportuno acceso a los servicio médicos y educativos.
- ✓ Mayor flujo de bienes y servicios que reduzcan la brecha entre la ciudad

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

y el campo y dignificar a los habitantes de las zonas rurales.

- ✓ Fortalecer la acción comunal y general organización en el campo colombiano.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

La vía actualmente se encuentra en afirmado en mal estado y con pocas obras de drenaje y subdrenaje que garantice su adecuada operatividad en todas las épocas del año. La importancia de esta vía es su comunicación con Damaquiel, logrando así mejorar la superficie de rodadura para beneficiar la mejor operación de vehículos para movilizar los productos agrícolas que esta importante zona genera.

Por lo tanto, es básico y necesario disponer de una estructura de pavimento que facilite el acceso a las veredas y centros poblados.



Figura No 3: Estado inicial de la vía.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



Figura No 4. Estado inicial de la Vía.

2.4 Características técnicas del proyecto.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.


El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias


Que dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.


A la fecha la JAC presento a la interventoría una modificación de las actividades del contrato debido a que los estudios y diseños arrojaron como resultado que no es recomendable la implementación de las obras que se cuentan en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, por lo tanto toco realizar un cambio a placa de concreto hidráulico de 4000 psi debido al alto flujo de vehículos de carga que transitan por la vía a intervenir lo cual la interventoría reviso y aprobó la modificación por ende se va a realizar un mejoramiento de 25cm a la rasante posteriormente s instala una carpeta de subbase granular de 15cm y una placa de concreto hidráulico de 20cm de espesor.



Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

REFUERZOS PARA LA LOZA DE CONCRETO

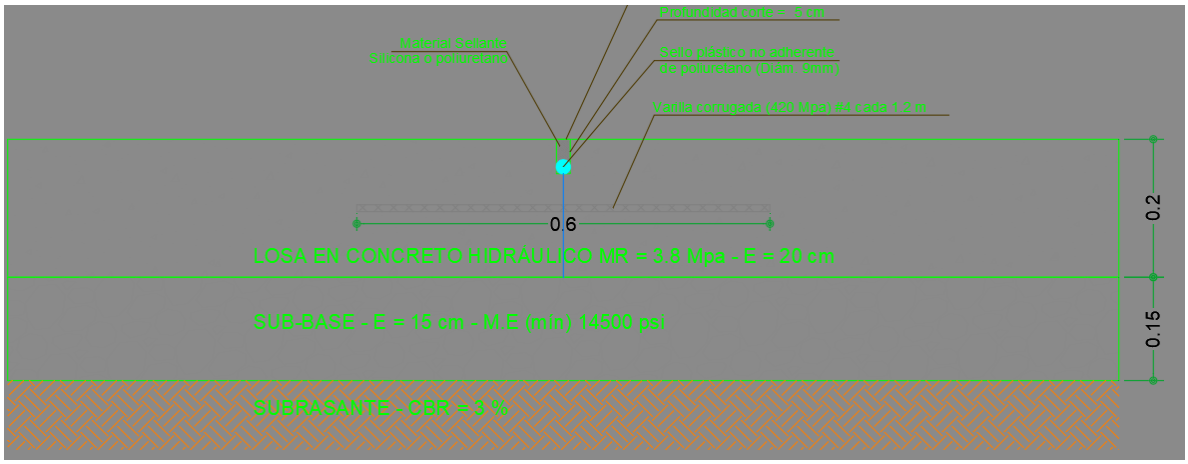

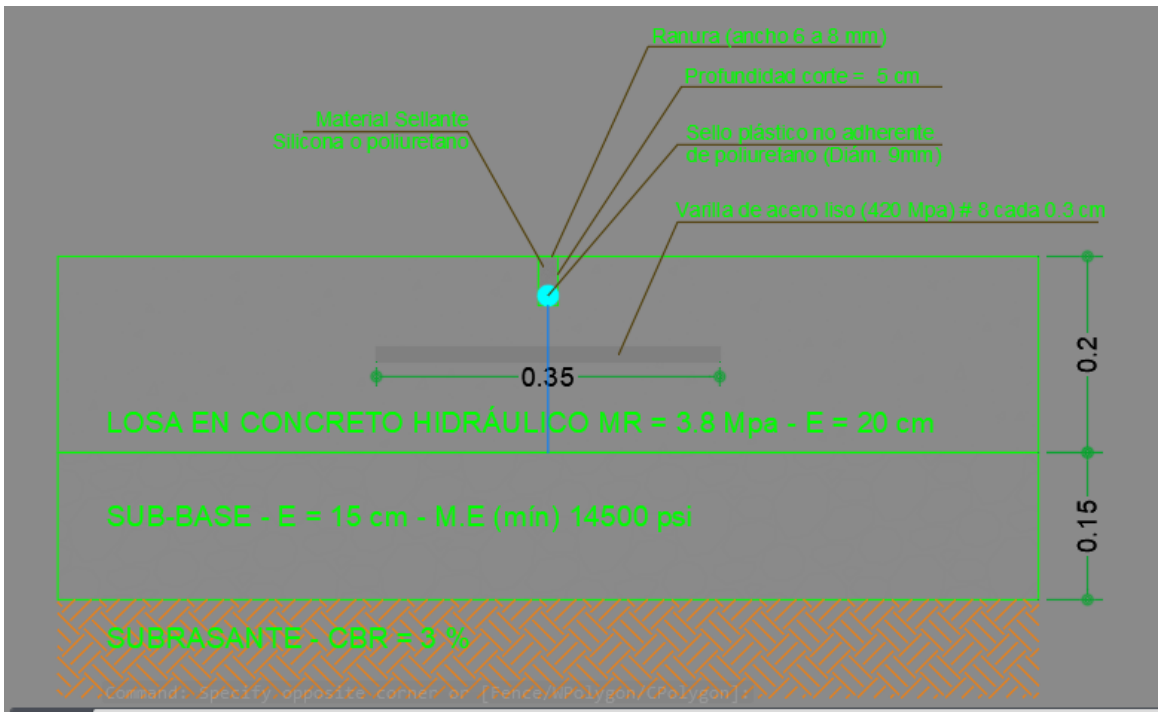

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

3. INFORMACION DEL CONVENIO SOLIDARIO.

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO No.	3706 DE 2023
PARTES	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 199.290.132,00
APORTE INVIAS	$198.290.132,00
APORTE JAC	$ 1.000.000,00
ORDEN DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCCIÓN HASTA	31 DE DICIEMBRE 2023
PRORROGA N° 1	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024
PRORROGA N°2	HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA N°3	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

3.2 Descripción de las actividades presentadas en el mes:

- El proyecto se realizó una segunda socialización donde se da a conocer las modificaciones que se realizaron al contrato.

- Se realizaron capacitaciones a la JAC en los temas referentes a la ejecucion del convenio.

- Se iniciaron las actividades de excavaciones varias y mejoramiento con afirmado para la construcción de la placa.

- Durante este mes, una de las actividades llevadas a cabo fue la recopilación alguna de información solicitada por parte de la interventoría del proyecto. En el marco de esta tarea, se entregaron los documentos para revisión por parte de la interventoría a través del correo electrónico, que se enlistan a continuación:

  - Documentos canteras.
  - Certificados de calidad de los materiales

3.3 Seguimiento de ítems no previstos:

Por el momento se presentan ítems no previsto para el contrato de obra debido a la modificación de las actividades del convenio.

ITEMS NO PREVISTOS	UND	CANTIDAD	VLR UNITA
SUELO			
Afirmado (Mejoramiento y Via Alterna)	M3	205,64	$ 145.041,24

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
Concreto hidráulico para pavimento MR-38 (3.8 MPa)	M3	92,16	$	880.661,54
Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	ML	144	$	58.981,00
ACERO DE TRANSFERENCIAS DE CARGAS Fy= 28 Mpa				
Acero de refuerzo 1" acero liso para dovelas	KG	877,2	$	8.976,60

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

Durante el periodo transcurrido de este informe, se inician con las actividades de:

- Excavaciones varias sin clasificar: Esta actividad se da inicio para el mejoramiento de las subrasantes en afirmado, debido a lo arrojado por los estudios y diseño realizados por la JAC.
- Afirmado (Mejoramiento y Vía Alterna): esta actividad se inicia para rellenar la excavación del mejoramiento de la subrasante y para una vía alterna que se arreglo y no perjudicar a los vehículos que circulan por la zona.

A la fecha se han iniciado con las actividades de obra, pero se adelantan compras de los materiales de ferretería y pétreos para iniciar las actividades de placa de concreto y a la fecha de cierre de este informe se tiene un avance de obra programado de 4.75% y un avance ejecutado de 8.82% y no se tendría atraso de obra hasta la fecha.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informes semanales

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo 6.4. Informes semanales.

	# SEMANAL	FECHAS SEMANAL
SEMANA	27	31/05/24 AL 6/06/25
SEMANA	28	7/06/24 AL 13/06/25
SEMANA	29	14/06/24 AL 20/06/25
SEMANA	30	21/06/24 AL 27/06/25

Tabla 1: Reporte informes semanales

4.2 Maquinaria y equipo

La información relacionada con maquinaria y equipo de contrato de obra se adjunta ver Anexo 6.5 Maquinaria y equipo contrato de obra.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

La información relacionada con el personal contratado de obra se relaciona y adjunta en el anexo 6.6 personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

La información financiera y presupuestal del contrato de obra se presenta a la fecha de cierre de este informe y se ve relacionada en el formato del anexo 6.7 informe financiero de obra.

4.5 Estado General del Tiempo

La información del estado general del tiempo se adjunta en el anexo 6.8 Estado general del tiempo.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

La información referente a ensayos de laboratorio ver anexo 6.9 Resumen de ensayos de laboratorio.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

La información sobre las garantías y seguros del contrato de obra se adjunta en el anexo 6.10. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. NO APLICA

La interventoria no cuenta con personal aprobado para esa función.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

Seguimiento a la inversión del anticipo: NO APLICA

El contrato de obra no presenta anticipo.

Seguimiento al programa de inversiones:

Se adjunta el seguimiento del programa de inversiones entregado por el contratista al corte de este informe ver anexo 6.11 Seguimiento programa de inversiones

Actas de comité operativo de obra:

En el periodo del presente informe se realizaron actas de comité operativo obra ver anexo 6.12 Actas de comité operativo de obra.

Actas de reunión de obra:

En el periodo del presente informe no se realizan actas de reunión de obra ver anexo 6.13 actas de reunión de obra.

Informe matriz de riesgo:

N/A

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza inicio de actividades de obra para la construcción de placa de concreto.
- Se realiza topografía y replanteo para excavaciones varias del mejoramiento de la subrasante.
- Se realiza compras de materiales pétreos y ferretería para iniciar con actividades
- Se realiza modificación de las actividades del contrato debido a los resultados que arrojó el estudio de tránsito y quedo aprobada por la interventoría para iniciar las actividades.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

6. ANEXOS

6.1 Relación de correspondencia

Se adjunta relación de correspondencia entre el contratista e interventor Relación de correspondencia al mes culminado.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

6.2 Registro fotográfico

Se adjunta registro fotográfico del avance del contrato de obra.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

CONTRATO No. 4498 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4498 DE 2023





Fotos 1 – 2. EXCAVACION MEJORAMIENTO





Fotos 3 – 4. EXCAVACION MEJORAMIENTO





Fotos 5 – 6. MEJORAMIENTO CON AFIRMADO





Fotos 7 – 8. MEJORAMIENTO CON AFIRMADO

6.3 Copia de bitácora del contrato de obra

Se adjunta bitácora del contrato de obra correspondiente al presente mes.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

BITACORA DE OBRA

FECHA:	1	6	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3706-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 199.290.132,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	3	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

FECHA:	4	6	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3706-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 199.290.132,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	5	6	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3706-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 199.290.132,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	6	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	7	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	8	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	10	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	11	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	12	6	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3706-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 199.290.132,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	13	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA: 14 (DIA) 6 (MES) 2024 (AÑO)

TRAMO Y/O SECTOR: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3706-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 199.290.132,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

SE SOLICITA PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADO

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA: 15 (DIA) 6 (MES) 2024 (AÑO)

TRAMO Y/O SECTOR: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3706-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 199.290.132,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

SE SOLICITA PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADO

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	0
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	3
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Equipo de topografia	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA: 17 (DIA) 6 (MES) 2024 (AÑO)

TRAMO Y/O SECTOR: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3706-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 199.290.132,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE INICIA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE INICIA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE INICIA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

SE SOLICITA PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADO

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA: 18 (DIA) 6 (MES) 2024 (AÑO)

TRAMO Y/O SECTOR: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3706-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 199.290.132,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

SE SOLICITA PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADO
SE SOLICITA LA DOCUMENTACION LEGAL DE LA CANTERA ENCARGADA DEL SUMINISTRO DE MATERIAL

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	19	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

SE SOLICITA PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADO
SE SOLICITA LA DOCUMENTACION LEGAL DE LA CANTERA ENCARGADA DEL SUMINISTRO DE MATERIAL

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	20	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

SE SOLICITA PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADO
SE SOLICITA LA DOCUMENTACION LEGAL DE LA CANTERA ENCARGADA DEL SUMINISTRO DE MATERIAL
SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR LLUVIAS MODERADAS EN EL DIA

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
10:15	14:45	X	

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	21	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

SE SOLICITA PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADO
SE SOLICITA LA DOCUMENTACION LEGAL DE LA CANTERA ENCARGADA DEL SUMINISTRO DE MATERIAL

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	24	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

SE SOLICITA PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADO
SE SOLICITA LA DOCUMENTACION LEGAL DE LA CANTERA ENCARGADA DEL SUMINISTRO DE MATERIAL

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

FECHA: 25 (DIA) 6 (MES) 2024 (AÑO)

TRAMO Y/O SECTOR: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3706-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 199.290.132,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

SE DETIENEN TRABAJOS POR LLUVIA FUERTE

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
9:25	11:10	X	

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	26	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	27	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

FECHA:	28	6	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3706-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 199.290.132,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

SE DETIENEN ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN EL DIA Y FUERTES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
8:05	13:15	X	

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	29	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	30	6	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**VRD LAS CRUCES DE SAN JUAN DE URABA**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3706-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA**				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 199.290.132,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	K0+000 A K0+072
SE CONTINUA CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	K0+072
SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	K0+072

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
NO SE INICIAN ACTIVIDADES	

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	1
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	1
Operadores de Equipos	2

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	1
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	2
Equipo de topografia	1
MINICARGADOR	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco

Presidenta JAC	Residente de Interventoria
Nombre. ELAUDITH BELLO BERTEL	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Elaudith Bello	Firma

6.4 Informes semanales

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

SEMANA 27

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PLACA HUELLA VREDA LAS CRUCES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 27 del 31/05/2024 al 6/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+139 139ml de placa huella de un ancho de 4.5 m,

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

CONVENIO No. CONVENIO 3706-2023 — VALOR INICIAL: $ 199.290.132,00

FECHA DE INICIO: 28/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.290.132,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4495-2023 — VALOR INICIAL: $ 57.730.002,00

FECHA DE INICIO: 27/11/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 57.730.002,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.290.132			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.290.132			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 57.730.002			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 57.730.002			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.290.132,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5.000.000,00	2,51%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.000.000,00	2,51%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.000.000,00	2,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	1,25%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22.203.847	38,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.108.847	38,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.440.769,38	7,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.340.769,38	7,52%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada % 2,51%

Avance o Atraso Físico % 2,51%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,90
Conformacion de calzada existente	M2	764,50
Subbase Granular Clase C	M3	127,60
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	81,90
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	3839,00
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA		
COMPACTADOR		
MINICARGADOR		
VOLQUETA 1		
VOLQUETA 2		
VIBRO DE CONCRET		
MEZCLADORA		
PULIDORA		
PLANTA ELECTRICA		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 0+139

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: :

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, SE CONTINUA CON LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, CONTINUAR CON ESTUDIOS Y DISEÑOS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

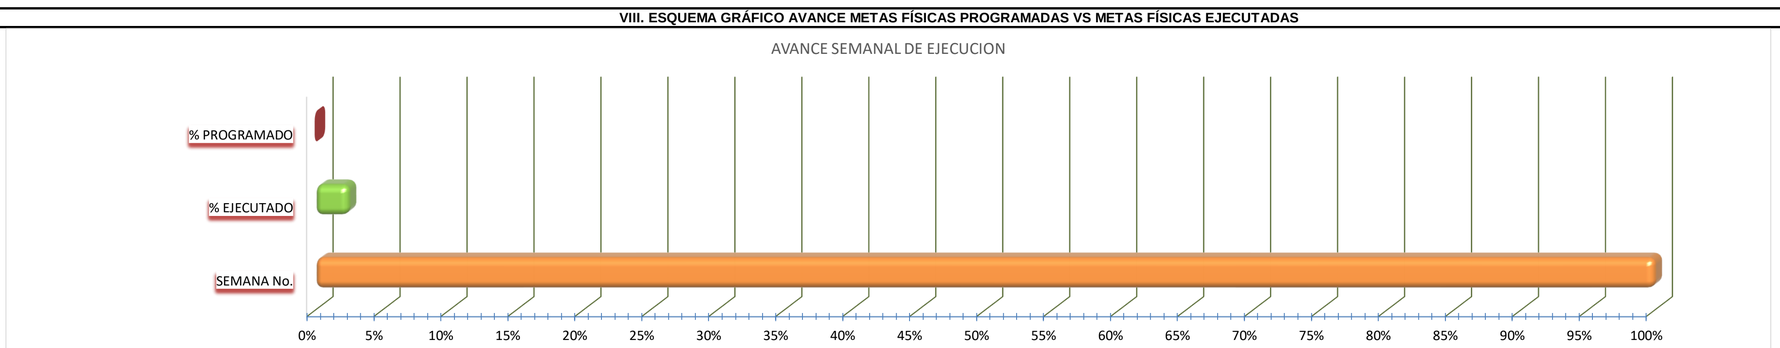

	SEMANA No.	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
AVANCE SEMANAL DE EJECUCION	27	2,51%	0,00%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. ACOMPAÑAMIENTO A LAS JAC SOBRE METODOLOGIA Y DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
2. SE REVIZA DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA JAC
3. SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEMANA 28

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PLACA HUELLA VREDA LAS CRUCES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 28 del 7/06/2024 al 13/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+139 139ml de placa huella de un ancho de 4.5 m,

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

CONVENIO No. CONVENIO 3706-2023 — VALOR INICIAL: $ 199.290.132,00

FECHA DE INICIO: 28/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.290.132,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4495-2023 — VALOR INICIAL: $ 57.730.002,00

FECHA DE INICIO: 27/11/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 57.730.002,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.290.132			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.290.132			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 57.730.002			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 57.730.002			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.290.132,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5.000.000,00	2,51%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.000.000,00	2,51%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.000.000,00	2,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.644.616	46,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.649.616	46,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.440.769,38	7,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.540.769,38	7,87%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada % 2,51%

Avance o Atraso Físico % 2,51%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,90
Conformacion de calzada existente	M2	764,50
Subbase Granular Clase C	M3	127,60
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	81,90
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	3839,00
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA		
COMPACTADOR		
MINICARGADOR		
VOLQUETA 1		
VOLQUETA 2		
VIBRO DE CONCRET		
MEZCLADORA		
PULIDORA		
PLANTA ELECTRICA		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 0+139

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI _____	NO _____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____	NO _____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI _____	NO _____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____	NO _____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI _____	NO _____	N/A	_____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____	NO _____	N/A	_____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____	NO _____	N/A	_____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____	NO _____	N/A	_____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____	NO _____	N/A	_____
VERTIMIENTOS:	SI _____	NO _____	N/A	_____
EMISIONES:	SI _____	NO _____	N/A	_____
OTROS (Especificar cual)	SI _____	NO _____	N/A	_____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: :

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, SE CULMINA CON LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, INICIAR CON TOPOGRAFIA PARA REPLANTEO Y TRAZADO DE LA VIA
2, INICIAR CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

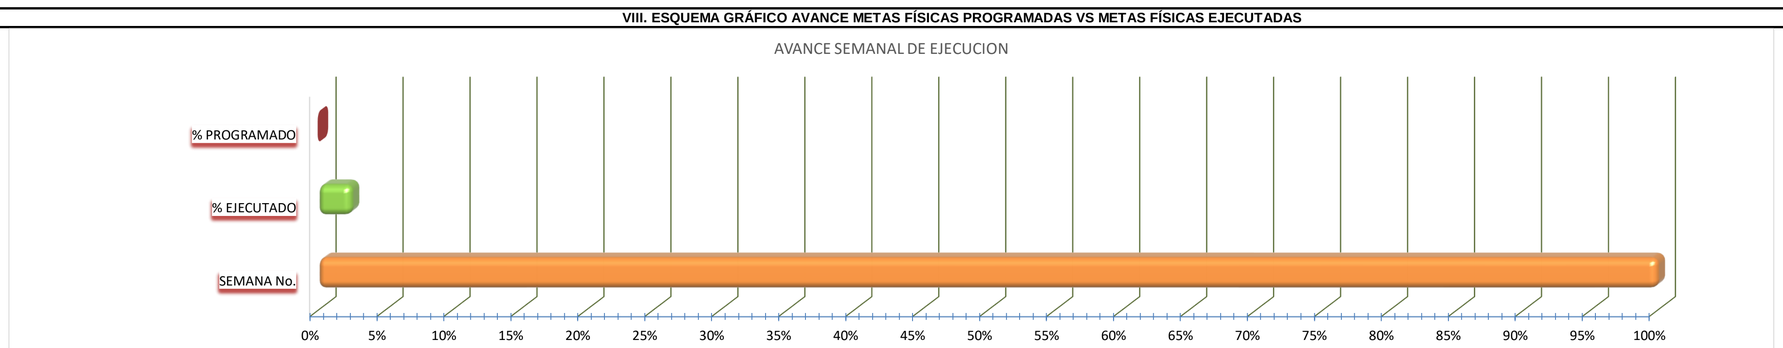

	SEMANA No.	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
AVANCE SEMANAL DE EJECUCION	28	2,51%	0,00%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. ACOMPAÑAMIENTO A LAS JAC SOBRE METODOLOGIA Y DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
2, SE REVIZA DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA JAC
3, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEMANA 29

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PLACA HUELLA VREDA LAS CRUCES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 29 del 14/06/2024 al 20/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+139 139ml de placa huella de un ancho de 4.5 m,

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

CONVENIO No. CONVENIO 3706-2023 — VALOR INICIAL: $ 199.290.132,00

FECHA DE INICIO: 28/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.290.132,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4495-2023 — VALOR INICIAL: $ 57.730.002,00

FECHA DE INICIO: 27/11/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 57.730.002,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.290.132			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.290.132			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 57.730.002			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 57.730.002			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.290.132,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5.000.000,00	2,51%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.000.000,00	2,51%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.000.000,00	2,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.085.386	53,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.210.386	54,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.440.769,38	7,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.560.769,38	7,90%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada % 2,51%

Avance o Atraso Físico % 2,51%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	108,00
Conformacion de calzada existente	M2	
Subbase Granular Clase C	M3	70,00
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	81,90
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	3839,00
* Mejoramiento en afirmado	M3	108

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	33,60			33,60	31,1%
Ejec	29,76			29,76	27,6%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog	33,6			33,6	
Ejec	28,8			28,8	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA		
COMPACTADOR		
MINICARGADOR		
VOLQUETA 1		
VOLQUETA 2		
VIBRO DE CONCRET		
MEZCLADORA		
PULIDORA		
PLANTA ELECTRICA		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 0+072

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: LA JAC SE ENCUENTRA REQUIRIENDO LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: EN LA ZONA NO SE CUENTA CON ZONAS DE DEPOSITO, RAZON POR LA CUAL UNA VEZ INICIEN LAS ACTIVIDADES SE LE RECOMENDARÁ AL CONTRATISTA QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES SEA DONADO A PREDOS CERCANOS A LA VÍA O A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA DE chonquira

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A LA ESPERA POR PARTE DE LA JAC

OBSERVACIONES: : : SE ESTA A LA ESPERA DE LOS LINEAMIENTOS POR PARTE DEL INSTITUTO PARA LA ELABORACION DE PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, INICIAR CON TOPOGRAFIA PARA REPLANTEO Y TRAZADO DE LA VIA
2, INICIAR CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
3, INICIAR CON RELLENO MEJORAMIENTO EN AFIRMADO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, CONTINUAR CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
2, CONTINUAR CON MEJORAMIENTO EN AFIRMADO
3, INICIAR INSTALACIONDE SUBBASE GRANULAR

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

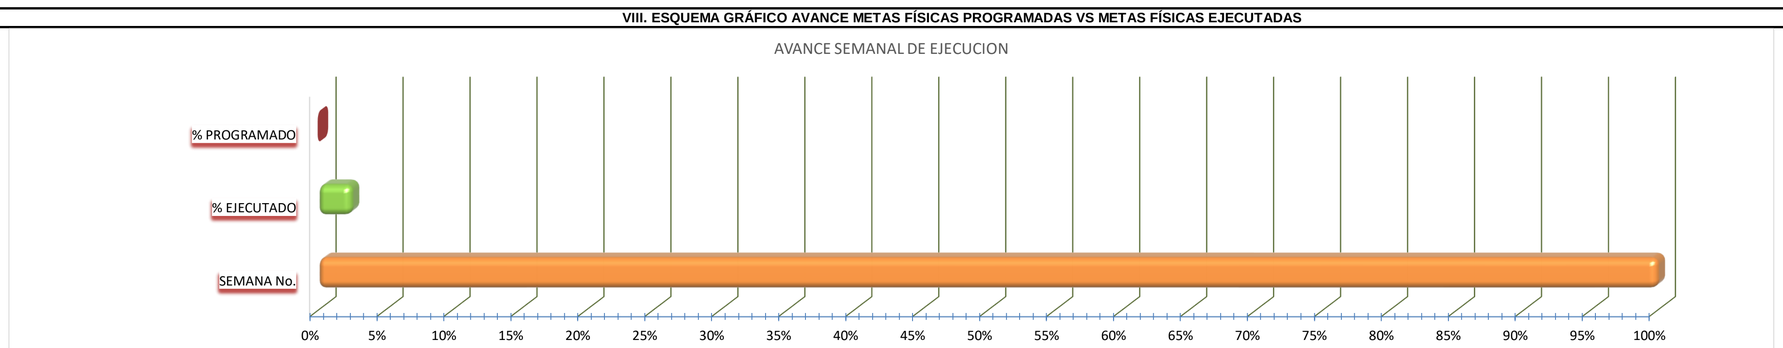

	SEMANA No.	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
AVANCE SEMANAL DE EJECUCION	29	2,51%	0,00%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. ACOMPAÑAMIENTO A LAS JAC SOBRE METODOLOGIA Y DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
2, SE REVIZA DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA JAC
3, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEMANA 30

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PLACA HUELLA VREDA LAS CRUCES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 30 del 21/06/2024 al 27/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+139 139ml de placa huella de un ancho de 4.5 m,

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

CONVENIO No. CONVENIO 3706-2023 — VALOR INICIAL: $ 199.290.132,00

FECHA DE INICIO: 28/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.290.132,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4495-2023 — VALOR INICIAL: $ 57.730.002,00

FECHA DE INICIO: 27/11/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 57.730.002,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024 — VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.290.132			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.290.132			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 57.730.002			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 57.730.002			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.290.132,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.475.949,69	4,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.580.613,16	6,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.104.663,47	2,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 5.000.000,00	2,51%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.475.949,69	4,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 17.580.613,16	8,82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.104.663,47	4,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.475.949,69	4,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.580.613,16	6,31%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 35.526.155	61,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 35.536.155	61,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.440.769,38	7,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.325.769,38	7,49%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 4,25% — Avance o Atraso Físico % 4,57%

Meta Física Ejecutada % 8,82%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	108,00
Conformacion de calzada existente	M2	
Subbase Granular Clase C	M3	70,00
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	81,90
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	3839,00
* Mejoramiento en afirmado	M3	108

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	33,60			33,60	31,1%
Ejec	29,76			29,76	27,6%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog	33,6			33,6	
Ejec	28,8			28,8	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA		
COMPACTADOR		
MINICARGADOR		
VOLQUETA 1		
VOLQUETA 2		
VIBRO DE CONCRET		
MEZCLADORA		
PULIDORA		
PLANTA ELECTRICA		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 0+072 — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: LA JAC SE ENCUENTRA REQUIRIENDO LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: EN LA ZONA NO SE CUENTA CON ZONAS DE DEPOSITO, RAZON POR LA CUAL UNA VEZ INICIEN LAS ACTIVIDADES SE LE RECOMENDARÁ AL CONTRATISTA QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES SEA DONADO A PREDOS CERCANOS A LA VÍA O A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA DE chonquira

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A LA ESPERA POR PARTE DE LA JAC

OBSERVACIONES: : : SE ESTA A LA ESPERA DE LOS LINEAMIENTOS POR PARTE DEL INSTITUTO PARA LA ELABORACION DE PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, INICIAR CON TOPOGRAFIA PARA REPLANTEO Y TRAZADO DE LA VIA
2, INICIAR CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
3, INICIAR CON RELLENO MEJORAMIENTO EN AFIRMADO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, CONTINUAR CON EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
2, CONTINUAR CON MEJORAMIENTO EN AFIRMADO
3, INICIAR INSTALACIONDE SUBBASE GRANULAR

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

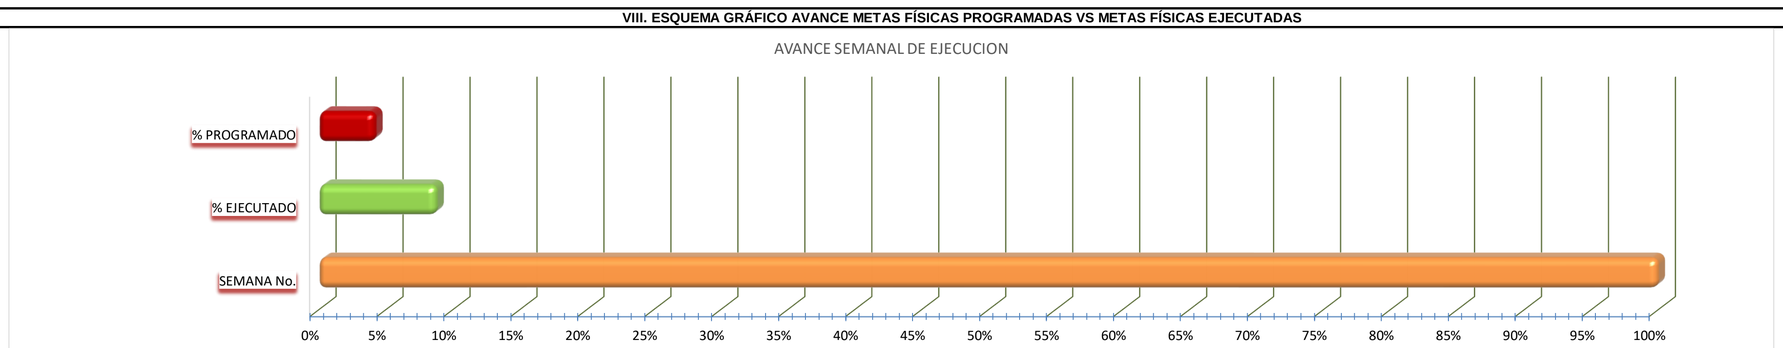

	SEMANA No.	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
AVANCE SEMANAL DE EJECUCION	30	8,82%	4,25%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. ACOMPAÑAMIENTO A LAS JAC SOBRE METODOLOGIA Y DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
2, SE REVIZA DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA JAC
3, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

6.5 Maquinaria y equipo

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 1/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3706-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4498-2023

INTERVENTORÍA: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MINICARGADOR	CASE-SR220																							I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	
RETROEXCAVADORA DE ORUGA																								I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA	PLACA JAC-636	7M3																						I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	20%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	8	53%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	13%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Elaudith Bello
Nombre: ELAUDITH BELLO BERTEL
Presidenta JAC
Cedula: 22.144.451 de San Juan de Urabá

Firma
Nombre: CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Auxiliar de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 081037-0702761 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026356672

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JAC636	REO	CA D 54	1963

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.700	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	10000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
34798752	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
1056M	N	BPM1698976	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MANCILLA ARIAS JOSE DANIEL

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1033373763



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
019	I	17/03/1976	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/04/1996	13/06/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INS MCPAL TTOYTTE SAN VICENTE CHUCURI

LT0700113726 5

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 70764

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC122499	CASE	SR200	2020

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	NKM474704

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	000505730	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3236 Kg	2000 mm	1755 mm	2700 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SANCHEZ ANAYA JOSE DAVID Y OTRO(S).	C.C. 10.768.048

Powered by CamScanner

6.6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO DE OBRA No: 3706-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	GONZALEZ ISAAC	1037468279	OBRERO	$ 1.300.000																							X	X	X	X	X	X	X	JAC	$ 346.666	$ 24.128	V	SAVIA SALUD	9470125483	$ 43.333	PORVENIR	9470125483	$ 55.467	$ 13.867	$ 17.500		
2	LOPEZ LUIS	1033367999	OBRERO	$ 1.300.000																							X	X	X	X	X	X	X		$ 346.666	$ 24.128	V	SALUD TOTAL	9470125483	$ 43.333	PORVENIR	9470125483	$ 55.467	$ 13.867	$ 17.500		
3	MARTINEZ CONCEPCION	70521066	OBRERO	$ 1.300.000																							X	X	X	X	X	X	X		$ 346.666	$ 24.128	V	EPS SURA	9470125483	$ 43.333	PORVENIR	9470125483	$ 55.467	$ 13.867	$ 17.500		
4	MORALES JAVIER	1033374486	OBRERO	$ 1.300.000																							X	X	X	X	X	X	X		$ 346.666	$ 24.128	V	SAVIA SALUD	9470125483	$ 43.333	PORVENIR	9470125483	$ 55.467	$ 13.867	$ 17.500		
5	VELASQUEZ RAFAEL	1038801153	OBRERO	$ 1.300.000																							X	X	X	X	X	X	X		$ 346.666	$ 24.128	V	SAVIA SALUD	9470125483	$ 43.333	PORVENIR	9470125483	$ 55.467	$ 13.867	$ 17.500		
6																																						$ -				$ -			$ -	$ -	$ -		
7																																						$ -				$ -			$ -	$ -	$ -		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Elaudith Bello
Nombre: ELAUDITH BELLO BERTEL
Presidenta JAC
Cedula: 22.144.451 de San Juan de Urabá

Firma
Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389841	2	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS CRUCES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	ARBOLETES BARRIO NUEVO ESTADIO	ARBOLETES-ANTIOQUIA	7898089	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	790086597	9470125483	E	2024/07/10	2024/07/22	BANCOLOMBIA		$723,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1037468279	GONZALEZ ISAAC	X	X																230301	8	$55,500	EPS040	8	$43,400	CCF04	8	$13,900	14-11	8	6.96	$24,200	8	$17,500	No	$154,500
2	CC	1033367999	LOPEZ LUIS		X																230301	8	$55,500	EPS002	8	$43,400	CCF04	8	$13,900	14-11	8	6.96	$24,200	8	$17,500	No	$154,500
3	CC	70521066	MARTINEZ CONCEPCION		X																	0	$0	EPS010	8	$43,400	CCF04	8	$13,900	14-11	8	6.96	$24,200	8	$17,500	No	$99,000
4	CC	1033374486	MORALES JAVIER		X																230301	8	$55,500	EPS040	8	$43,400	CCF04	8	$13,900	14-11	8	6.96	$24,200	8	$17,500	No	$154,500
5	CC	1038801153	VELASQUEZ RAFAEL		X																230301	8	$55,500	EPS040	8	$43,400	CCF04	8	$13,900	14-11	8	6.96	$24,200	8	$17,500	No	$154,500
Total	**Afiliados(5)**																						$222,000			$217,000			$69,500				$121,000		$87,500		$717,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389841	2	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS CRUCES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	ARBOLETES BARRIO NUEVO ESTADIO	ARBOLETES-ANTIOQUIA	7898089	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	790086597	9470125483	E	2024/07/10	2024/07/22	BANCOLOMBIA		$723,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$222,000	$0	$224,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$222,000	$0	$224,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$121,000	$0	$122,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$121,000	$0	$122,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$69,500	$0	$70,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$69,500	$0	$70,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$217,000	$0	$219,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$43,400	$0	$43,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$43,400	$0	$43,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$130,200	$0	$131,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$52,500	$0	$53,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$52,500	$0	$53,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$35,000	$0	$35,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$35,000	$0	$35,400
TOTAL				**5**	**$717,000**	**$0**	**$723,800**

6.7 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO DE OBRA No: 3706-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Contrato No 3706-2023	$ 198.290.132	
		APORTE DE JUTA DE ACCION COMUNAL		OAC VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	Contrato No 2832-2023	$ 1.000.000	
TOTAL						$ 199.290.132	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.290.132,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		MAYO	$ 2.500.000		$ 2.500.000				157523 DE 31/08/2023	$ 196.790.132	$ 196.790.132				
2		JUNIO	$ 15.080.613		$ 15.080.613				157523 DE 31/08/2023	$ 184.209.519	$ 184.209.519				
3															
4															
5															
6															
TOTALES			**$ 17.580.613**	**$ -**	**$ 17.580.613**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 184.209.519**	**$ 184.209.519**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL OBRAS	$ 12.580.613,00	$ -	**$ 12.580.613**
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	**$ -**
APORTE ORGANISMO DE ACCION COMUNAL	$ -	$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5.000.000,00	$ -	**$ 5.000.000**
		$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 17.580.613	$ -	**$ 17.580.613**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Elaudith Bello

Firma
Nombre: ELAUDITH BELLO BERTEL
Presidenta JAC
Cedula: 22.144.451 de San Juan de Urabá

Firma
Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.8 Estado General del Tiempo

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 1/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO DE OBRA No: 3706-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	23	24	24	22,5	24	24	20	24	24	0	707,5
Lluvias moderadas	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1,5	0	0	1	0	0	0	7,5
Lluvias intensas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	720

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Elaudith Bello
Nombre: ELAUDITH BELLO BERTEL
Presidenta JAC
Cedula: 22.144.451 de San Juan de Urabá

Firma
Nombre: CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Auxiliar de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 081037-0702761 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.9 Resumen Ensayos de Laboratorio

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 1/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO DE OBRA No.: 3706-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	15/03/2024	GRANULOMETRIA	INV 213	CANTERA MELLITO "AFIRMADO	No, 1				SE REALIZA ENSAYOS PARA CARACTERIZACION DE MATERIALES EN LA REGION
2	15/03/2024	LIMITES DE CONSISTENCIA Y GRADACION	INV E-125E-126	CANTERA MELLITO "AFIRMADO	No, 1		LL: 25,9%, LP:17,4%, IP:8,5%		
3	22/03/2024	GRANULOMETRIA	INV 213	CANTERA MELLITO "GRAVA	No, 1				
4	28/03/2024	GRANULOMETRIA	INV 213	CANTERA MELLITO "MIXTO	No, 1				
5	15/04/2024	LIMITES DE CONSISTENCIA Y GRADACION	INV E-125E-126	CANTERA MELLITO "SUBBASE	No, 1		LL: 21,6%, LP:12,3%, IP:9,3%		
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

SE REALIZA LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO YA QUE LAS CANTERAS NO CUENTA CON DICHA CARACTERIZACIÓN

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma: Elaudith Bello

Nombre: ELAUDITH BELLO BERTEL
Presidenta JAC
Cedula: 22.144.451 de San Juan de Urabá

Firma

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.10 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12 (Día) / 6 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3706 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES

OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 28/11/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.290.132,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.858.027,00	5	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.964.507,00	5	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.787.040,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291718

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071682 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.858.027,00	5	10	2023	01/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.964.507,00	5	10	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.787.040,00	31	12	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB- 100291718

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/03/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260.000.000,00	5	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071682 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/03/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.858.027,00	18	4	2024	15/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			0	0	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.964.507,00	18	4	2024	15	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.787.040,00	15	6	2024	15	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB- 100291718

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260.000.000,00	5	10	2023	15	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071682 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Directora de interventoria

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 068202-112219STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.18 15:32:32 -05:00

Código de Seguridad: CYaE6vBDumyy5a1o1UBhVA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100291718	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71998091	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	30/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CRUCES	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.389.841-2
DIRECCIÓN	VDA LAS CRUCES CORR DAMAQUIEL	**TELÉFONO**	3025768997
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30/07/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 03

DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3706 DE 2023 DEL 05/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE
URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/04/2024	24:00 Horas Del 30/05/2025	39.858.027,00	25.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/04/2024	24:00 Horas Del 30/07/2027	9.964.507,00	5.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/07/2024	24:00 Horas Del 30/07/2029	59.787.040,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.609.574,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	30.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	30.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.700,00
TOTAL A PAGAR	$	35.700,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Elaudith Bello
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100291718	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71998091	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	30/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES CON NIT 900.389.841-2

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 05/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100291718** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CRUCES** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS ,** expedida por la Compañía en **18/06/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **18** días del mes **JUNIO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

@ 90 230901 EMVCO

Redeban

JUN 22 2024 12:45:46 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PTM SAN JUAN DE URABA
CARRERA 22 21 40

C.UNICO: 3007063190 TER: NAOOT209
RECIBO: 024814 RRN: 036679
APRO: 462874

RECAUDO
CONVENIO: 76274
CREDICORP REC ESPECI
REF: 031594

VALOR $ 76.290

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

@ 90 230901 EMVCO

Redeban

JUN 21 2024 12:24:32 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL ALMACEN Y TA
CR 20 17 86

C.UNICO: 3007039367 TER: AA082459
RECIBO: 036300 RRN: 055364
APRO: 881465

RECAUDO
CONVENIO: 76274
CREDICORP REC ESPECI
REF: 031594

VALOR $ 35.700

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT. 860.037.013-6

CERTIFICA

Que **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CRUCES** identificado con **NIT 900389841** a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de recaudo de primas de la póliza de Cumplimiento **100291718**, certificado **71998091.**

La presente se expide a solicitud del interesado al día Veinticinco (25) del mes de Junio (06) de 2024.

Cordial saludo,

Valentina Carreño

GERENCIA NACIONAL DE CARTERA
CRÉDITO Y COMISIONES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



6.11 Seguimiento al programa de inversiones:

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

6.12 Actas de comité de obra:

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 6	Dirección Territorial INVIAS: ANTIOQUIA	Fecha: 6/06/2024

Vereda – Municipio - Departamento: LAS CRUCES – SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3706 DE 2023
Ejecutor(es): **LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES**

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	INTERVENTORIA	REP LEGAL
ELAUDITH BELLO BERTEL	JUNTA BUENOS AIRES	REP LEGAL
MARICELA PALACION	COMITÉ PARTICIPACION	REPRESENTANTE
LILIANA FARLEY MARTINEZ	JUNTA BUENOS AIRES	CONTADORA
SEBASTIAN SANCHEZ MARTINEZ	JUNTA BUENOS AIRES	RESIDENTE DE OBRA
JULIAN ANDRES SIERRA	INVIAS	ING APOYO SUPERVISION
JORGE RODRIGUEZ MORALES	INTERVENTORIA	REP LEGAL
CRISTIAN COGOLLO	INTERVENTORIA	INSPECTOR

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros del comité y la veeduría ciudadana.
2. Seguimiento de avance de ejecucion del convenio
3. Presentación y aprobación de pagos a aprobar

AGENDA DEL COMITÉ: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los asistentes al comité operativo #6
2- Seguimiento del avance de ejecucion del convenio
3- Aprobación de pagos

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron ocho (8) miembros, el cual lo cita la interventoria a solicitud de la JAC y se adelanta mediante la plataforma meet https://meet.google.com/ntb-mtfo-ffx
2.	Se solicita al ingeniero residente de la JAC informe el avance de ejecucion a la fecha El Ing. manifiesta al comité que se encuentra realizada la conformación y la subbase de todo un carril en una longitud de 100ml, de igual manera tiene el acero figurado para bordillos, Se esta solicitando acelerar el carril a construir toda vez que es la unica via de acceso y la comunidad ha manifestado no permitir el cierre total de la via, En cuanto al informe financiero,
3.	La JAC presenta al comité los siguientes pagos para revisión y aprobación, 1. Se solicita ABO 386 bulto de cemento a $33.320 para un total $12.861.52 y 3 canecas de 20Lt/cu de antisol para un total de $ 732.828 2. solicita compra de material de Arena 35 m3 por valor de 107.100 para un total de $3.748500 y grava 47 m3 a razón de 1060.650 para un total de $7.550.550 3. Maquinaria y equipos Construarb se presenta para pago el alquiler de 33 horas de la retroexcavadora y el alquiler de equipo por valor de $

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueba pago final para Industrias CG por valor de $ 3.900.000
2.	Se aprueba pago para Industrias CG por valor de $ 570.000 por concepto de ensayos de laboratorio realizados en el mes de abril
3.	Se aprueba pago a favor de Milton Correa Martínez por valor de $300.000 por concepto de alquiler de bodega de almacenamiento
4.	Se aprueba pago para elaboración de planes de gestión social y ambiental previa cotización la cual se basa en todos lo solicitado por el INVIAS por valor de $4.000.000 con un pago inicial del 40% equivalente $1.600.000
5.	Se aprueba trabajo de topografía por valor de hasta $1.500.000 el cual debe cubrir todas las etapas constructivas, se autoriza pago de anticipo por valor de $500.000 para iniciar los trabajos


	pero el o los pagos siguientes solo se realizaran previo a remisión de los entregables de los trabajos realizados.
6.	Se aprueba a discrecionalidad las compras a la ferretería ya aprobada para los implementos efectivamente necesarios para la implementación de las medidas ambientales, las cuales se pedirán a ABO dentro del desembolso ya realizado el cual deberá contabilizarse de acuerdo a los rubros aprobados

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI __ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI __X__ NO ____ No. Folios: ___10____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Inicio de Obras	JAC	25/05/2024
Tramite para Devolución de rendimientos financieros	JAC	30/5/2024
presentación plan de inversión, y demás formatos	Contador y Residente de obra	9/5/2024

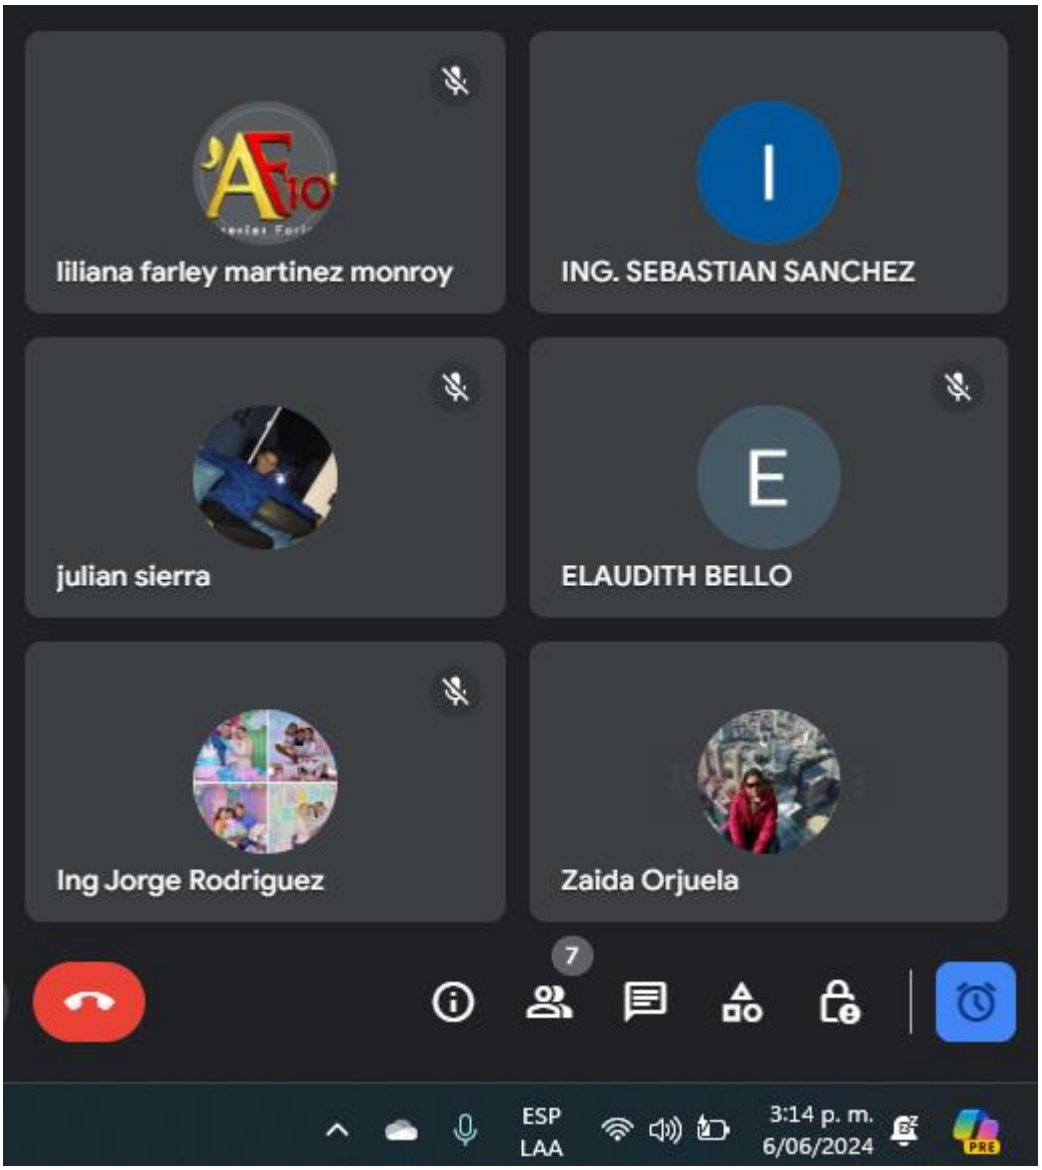
liliana farley martinez monroy
ING. SEBASTIAN SANCHEZ
julian sierra
E
ELAUDITH BELLO
Ing Jorge Rodriguez
Zaida Orjuela
7
ESP
LAA
3:14 p. m.
6/06/2024
