CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO 377- ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	05 DE JULIO 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASEI
NIT:	901.728.188-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 DE AGOSTO 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS, LAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y LAS UNIDADES FUNCIONALES ATENCIÓN PRIMARIA QUE COMPONEN LA REGIONAL NORTE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE ESTUDIO

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 3
DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COVEÑAS

	DESCRIPCIÓN (Actividad)	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CERÁMICA EN BAÑO/ PISOS DE GRANITO U OTRO INSTALADO, INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE SOBRE NIVEL EXISTENTE.	M²	82,06	$ 10.000,00	$ 820.600,00
1,2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA ETC).	M²	250	$ 10.000,00	$ 2.500.000,00
1,3	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS Y DOBLES EN MADERA Y/O METÁLICA (INCLUYE: EN MADERA, METÁLICAS, MARCOS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	UND	21	$ 20.000,00	$ 420.000,00
1,4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS, ORINALES, DUCHAS ENTRE OTROS (INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	36	$ 25.000,00	$ 900.000,00
2	**ACABADOS**				

2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE CERAMICA BLANCA 30X45 (INCLUYE CORTES, BRECHADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN) INCLUYE BOQUILLA EPOXICA ACUERDO A NORMATIVIDAD ASI MISMO MATERIALES DEBE CUMPLIR NORMA SANITARIA HOSPITALARIA	M²	385	$ 85.000,00	$ 32.725.000,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN EN ALUMINIO NATURAL ESQUINERO (INCLUYE CORTES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN)	ML	87	$ 12.000,00	$ 1.044.000,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS) INCLUYE BOQUILLA EPOXICA ACUERDO A NORMATIVIDAD ASI MISMO MATERIALES DEBE CUMPLIR NORMA SANITARIA HOSPITALARIA	M²	82,06	$ 95.000,00	$ 7.795.700,00
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DILATACION T EN ALUMINIO REFERENCIA EDA ESPESOR 14MM D=8MM ACABADO EN PLATEADO SATINADO (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	ML	19	$ 20.000,00	$ 380.000,00
2,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1, CON INCLUSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO, PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES-JUNTAS)	M²	82,06	$ 35.000,00	$ 2.872.100,00
3	**APARATOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL POWER ONE COLOR BLANCO CORONA O EQUIVALENTE MEJORES ESPECIFICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN A RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA EXISTENTE, INC, BOQUILLA, SILICONA, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOBRANTES EN SITIO ADECUADO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y OBRA CIVIL NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN DESMONTE Y RETIRO DEL APARATO SANITARIO Y ACCESORIOS EXISTENTES.CUMPLIENDO LA NORMATIVA HOSPITALIARIA	UND	13	$ 820.000,00	$ 10.660.000,00
3,2	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADO AQUAJET CF HG COLGAR, REF. O12911001 O SIMILAR, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN A RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA EXISTENTE, INC, BOQUILLA, SILICONA, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOBRANTES EN SITIO ADECUADO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y OBRA CIVIL NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN DESMONTE Y RETIRO DEL APARATO SANITARIO Y ACCESORIOS EXISTENTES.CUMPLIENDO LA NORMATIVA HOSPITALIARIA	UND	16	$ 800.000,00	$ 12.800.000,00

3,3	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL LAVAMANOS DE MESA PUSH 947120001 O SIMILAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	16	$ 350.000,00	$ 5.600.000,00
3,4	DUCHA MÁS TELEDUCHA NAHALA BALANCE PRESIÓN REFERENCIA NH4020001 O SIMILAR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. (DUCHA, TELEDUCHA, SOPORTE, CONTROL 02 UND) INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN A RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA EXISTENTE, INC, BOQUILLA, SILICONA, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOBRANTES EN SITIO ADECUADO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y OBRA CIVIL NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN DESMONTE Y RETIRO DEL APARATO SANITARIO Y ACCESORIOS EXISTENTES.CUMPLIENDO LA NORMATIVA HOSPITALIARIA	UND	7	$ 380.000,00	$ 2.660.000,00
3,5	SUMNISTRO E INTALACION DE DIVISION DE BAÑO ACRILICA EN ALUMNIO DIMENSIONES 2M DE ALTURA CON UN CUERPO FIJO Y UNA PUERTA CORREDIZA ASI MISMO ESTA DEBERA CUMPLIR NORMA E INCLUYE POLLO DE MONTAJE EN CASO SEA NECESARIO PARA SU INSTLACION, INCLUYE: RIELES, RODAJAS, HERRAJES, CERRADURAS, MANIJAS,ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	M²	6,20	$ 280.000,00	$ 1.736.000,00
3,6	SUMNISTRO E INSTALACION BARANDA O BARRAS DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FIJACION ASI CMO LOS CORTES Y CURVAS QUE NECESITE REALIZARSE CUMPLIENDO LA NORMATIVA TECNICA NTC 6047 Y HOSPITALARIA	ML	8	$ 320.000,00	$ 2.560.000,00
3,7	SUMNISTRO E INSTALACION BARANDA O BARRAS DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE CUMPLIENDO LA NORMATIVA TECNICA HOSPITALARIA	ML	5	$ 320.000,00	$ 1.600.000,00
3,8	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE MESON EN CONCRETO DE 2M X 0,8 MCUMPLIENDO CON NORMATIVA HOSPITALARIA ESTE MESON DEBE TENER LAS AVERTURA PARA LA INSTALACION DE LOS LAVAMANOS Y LA GRIFERIA .	UND	2	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00
3,9	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO PUSH COLOR BLANCO CORONA O EQUIVALENTE MEJORES ESPECIFICACIONES, INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN A RED SANITARIA Y RED HIDRAULICA EXISTENTE, INCLUYE, BOQUILLA, SILICONA, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOBRANTES EN SITIO AUTORIZADO, DESMONTE Y RETIRO DE ORINAL Y ACCESORIOS EXISTENTES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y OBRA CIVIL NECESARIAS PARA SU CORRECTO	UND	10	$ 950.000,00	$ 9.500.000,00

	FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN CUMPLIENDO LA NORMATIVA HOSPITALIARIA				
4	**CARPINTERIA**				
4,1	PUERTA HOSPITALARIA AUTO EXTINGUIBLE ATÓXICO CONFORME NORMA D.I.N. 21.3.73/2.6.82 Y 25.4.93, ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGUN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE/ALUMINIO Y BISAGRAS INOX. MANIJA EN ALUMINIO, MARCO CONFORMADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 1.2 MM CON ALOJAMIENTO PARA JUNTA DE HUMOS FRIOS. AGUJEROS PARA FIJACION MEDIANTE TORNILLOS, ACUSTICA.	UND	6	$ 6.000.000,00	$ 36.000.000,00
4,2	PUERTA EN PVC HOSPITALARIA AUTO EXTINGUIBLE ATÓXICO CONFORME NORMA D.I.N. 21.3.73/2.6.82 Y 25.4.93, ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGUN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE/ALUMINIO Y BISAGRAS INOX. MANIJA EN ALUMINIO, MARCO CONFORMADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 1.2 MM CON ALOJAMIENTO PARA JUNTA DE HUMOS FRIOS. AGUJEROS PARA FIJACION MEDIANTE TORNILLOS, ACUSTICA.	UND	10	$ 2.500.000,00	$ 25.000.000,00
5	**CIELORASO**				
5,1	SUMNISTRO E INTALACION DE CORNIZA O BOCEL EN MEDIA CAÑA DE ANCHO 6 CM CUMPLIENDO NORMATIVIDAD HOSPITALARIA	ML	191	$ 50.000,00	$ 9.550.000,00
5,2	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO CON ANCHO DE 30CM Y E=9MM CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, APERTURA PARA ILUMINACIÓN DONDE SEA NECESARIO. INCLUYE EL RETIRO DEL CIELORRASO INSTALADO.	M²	352	$ 80.000,00	$ 28.160.000,00
6	**REDES HIDROSANITARIAS**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE ALUMINIO CON SOSCO 3"X4"	UND	15	$ 45.000,00	$ 675.000,00
6,2	EMPALME CONEXIONES HIDROSANITARIA PVC RED EXISTENTE (ACCESORIO DE CONEXIÓN ADECUADO)	UND	13	$ 80.000,00	$ 1.040.000,00
6,3	EMPALME CONEXIONES SANITARIA PVC RED EXISTENTE (ACCESORIO DE CONEXIÓN ADECUADO)	UND	28	$ 80.000,00	$ 2.240.000,00
7	**LIMPIEZA DE TANQUE**				

7,1	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES, 01 TANQUE SUBTERRANEO (ALTO 2,10 METROS; ANCHO 4,50 METROS; LARGO 7,50 METROS) Y 03 TANQUES ELEVADOS (02 DE 2000 LITROS DE CAPACIDAD; 01 DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD), REALIZADO POR PERSONAL IDONEO CERTIFICADO PARA TAL FIN	UND	2	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00
	COSTOS DIRECTO				**$ 206.638.400,00**
	ADMINISTRACIÓN			**30,00%**	**$ 61.991.520,00**
	IMPREVISTO			**0,10%**	**$ 206.638,40**
	UTILIDAD			**7,00%**	**$ 14.464.688,00**
	TOTAL AIU			**37,10%**	**$ 76.662.846,40**
	IVA SOBRE UTILIDAD			**19%**	**$ 2.748.290,72**
	COSTO TOTAL				**$ 286.049.537,12**

2.1. OBSERVACIONES

PONDERABLE TECNICO

	LOTE 3
5.2	El contratista ofreció para la entidad, MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO CON ANCHO DE 30CM Y E=9MM CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, APERTURA PARA ILUMINACION DONDE SEA NECESARIO. INCLUYE EL RETIRO DEL CIELORRASO INSTALADO. **El oferente que en este ítem me aumente la cantidad E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO CON ANCHO DE 30CM Y E=9MM CON ESTRUCTURA METALICA Y TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, APERTURA PARA ILUMINACIÓN DONDE SEA NECESARIO. INCLUYE EL RETIRO DEL CIELORRASO INSTALADO de 352 m2 a 452 m2, sin ningún costo para la entidad**
5.1	El contratista ofreció para la entidad, SUMINISTRO E INTALACION DE CORNIZA O BOCEL EN MEDIA CANA DE ANCHO 6 CM CUMPLIENDO NORMATIVIDAD HOSPITALARIA, **El oferente que en este ítem me aumente la cantidad EN SUMINISTRO E INTALACION DE CORNIZA O BOCEL EN MEDIA CAÑA DE ANCHO 6 CM CUMPLIENDO NORMATIVIDAD HOSPITALARIA de 191 ML a 291 ML, sin ningún costo para la entidad.**

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO :	**LOTE 3: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS DE PESOS MCTE ($286.049.537,12)**
VALOR ADICIÓN CONTRATO :	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO :	**LOTE 3: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS DE PESOS MCTE ($286.049.537,12)**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
OBRA LOTE 3	$286.049.537,12

3.2. OBSERVACIONES

NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
ACTUAL	64524	15-03-2024	1.196.000.000,00	72124	09-07-2024	560.338.892,02

4.1. OBSERVACIONES

NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	0582-0023-4126

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	29 DE NOVIEMBRE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	04 MESES Y 26 DÍAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	29 DE NOVIEMBRE 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-44-101138565
FECHA EXPEDICIÓN:	10/07/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/07/2024	29/03/2025	$ 168.101.667,61
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/07/2024	29/11/2027	$ 28.016.944,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/07/2024	05/07/2029	$ 224.135.556,81
CALIDAD DEL SERVICIO	05/07/2024	29/11/2024	$ 168.101.667,11

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	75-40-101052021
FECHA EXPEDICIÓN:	10/07/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	05/07/2024	29/11/2024	$ 260.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	05/07/2024	29/11/2024	$ 260.000.000,00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05/07/2024	29/11/2024	$ 260.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
-	-	-	N/A	-
-	-	-	N/A	-
			VALOR TOTAL	-

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
			VALOR TOTAL	-

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

ÁREA DE CONTRATOS				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
			VALOR TOTAL	-

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$286.049.537,12**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$286.049.537,12**
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

BALANCE FINANCIERO PRESENTADO ES LO CORRESPONDIENTE AL LOTE 3 DEL PRESENTE CONTRATO.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

	DESCRIPCIÓN (Actividad)	UNIDAD	BAÑO 1 - 2 CONSULTA EXTERNA PISO 1	VR. UNIT	VR. TOTAL
	PRELIMINARES				
1,2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA ETC).	M²	25,78	$ 10.000,00	$ 257.800,00
1,3	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS Y DOBLES EN MADERA Y/O METÁLICA (INCLUYE: EN MADERA, METÁLICAS, MARCOS, ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	UND	2,00	$ 20.000,00	$ 40.000,00

1,4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS, ORINALES, DUCHAS ENTRE OTROS (INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	5,00	$ 25.000,00	$ 125.000,00
	DESCRIPCIÓN (Actividad)	**UNIDAD**	**BAÑO 4 RAYOS X**	**VR. UNIT**	
	PRELIMINARES				
1,2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA ETC).	M²	2,30	$ 10.000,00	$ 22.982,00
1,4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS, ORINALES, DUCHAS ENTRE OTROS (INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00
	DESCRIPCIÓN (Actividad)	**UNIDAD**	**CANTIDAD ACTUALIZADA BAÑO 8 DISCAPACITADOS**	**VR. UNIT**	
	PRELIMINARES				
1,2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA ETC).	M²	18,82	$ 10.000,00	$ 188.160,00
1,4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS, ORINALES, DUCHAS ENTRE OTROS (INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2,00	$ 25.000,00	$ 50.000,00

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se iniciaron los siguientes trabajos así:

ITEMS	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCE
BAÑO 1 - 2 CONSULTA EXTERNA PISO 1	SE INICIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) ADEMAS DE DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS Y ORINALES.	
BAÑO 4 RAYOS X	SE INICIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) ADEMAS DE DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS, ORINALES Y DUCHAS	

BAÑO 5 - 6 ATENCION PRIORITARIA	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS ACUERDO CONTRATO.	0,00%
BAÑO 8 DISCAPACITADOS	SE INICIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) ADEMAS DE DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS Y ORINALES.	
BAÑO 9 HOMBRES	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS ACUERDO CONTRATO.	0,00%
BAÑO 11 - 12 ODONTOLOGIA	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS ACUERDO CONTRATO.	0,00%
BAÑO AISLADOS	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS ACUERDO CONTRATO.	0,00%
BAÑO 21 HOSPITALIZACION MULTIPLE	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS ACUERDO CONTRATO.	0,00%
CIELO RASO PISO 2 HALL DE BALCON	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS ACUERDO CONTRATO.	0,00%

12. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA ADJUNTÓ LA PLANILLA DE PARAFISCALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CUMPLIO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

EN EL PRESENTE MES SE PRESENTÓ RETRASO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES COMO SE PLANEÓ EN EL CRONOGRAMA INICIAL DE EJECUCIÓN POR NOVEDADES LOGÍSTICAS DEL CONTRATISTA.

NOVEDADES DE ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES PARA VERIFICACIÓN ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

2%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

A LA FECHA SE LE INDICO AL CONTRATISTA QUE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SE DEBE AJUSTAR CON LAS CANTIDADES DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS


19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

LOTE 3:

DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I COVEÑAS


- BAÑO 1 - 2 CONSULTA EXTERNA PISO 1



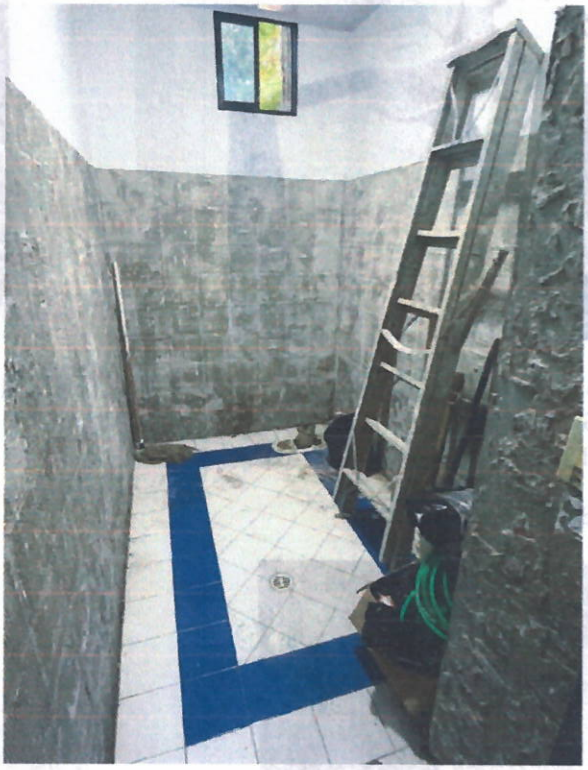

SE INICIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) ADEMAS DE DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS Y ORINALES




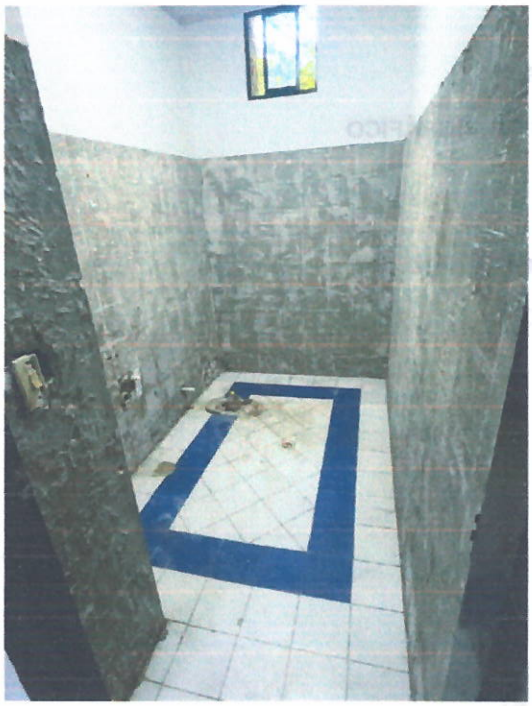

SE INICIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) ADEMAS DE DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS Y ORINALES


- **BAÑO 4 RAYOS X**



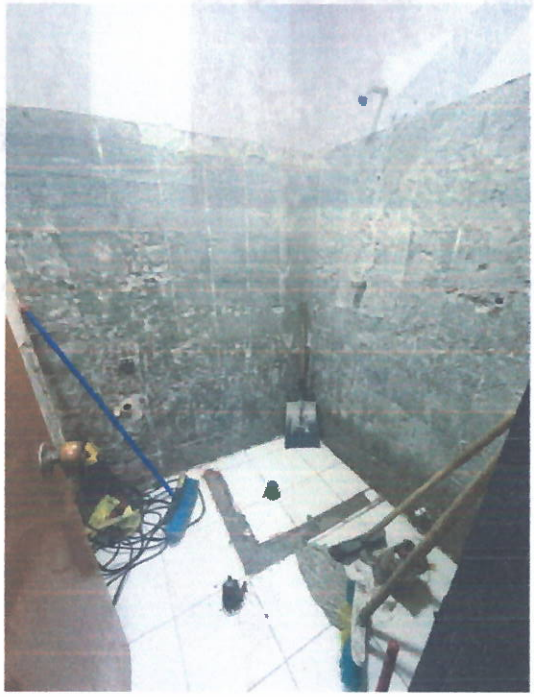

SE INICIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) ADEMAS DE DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS Y ORINALES

- **BAÑO 8 DISCAPACITADOS**

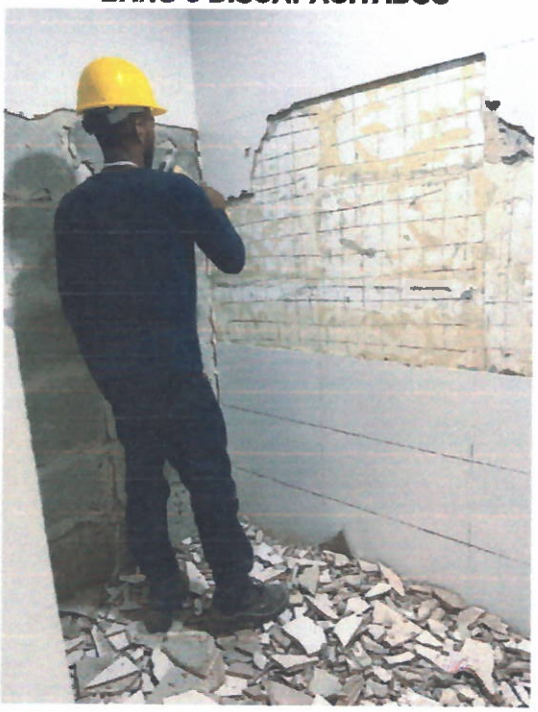



SE INICIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) ADEMAS DE DESMONTE APARATOS SANITARIOS SANITARIO, LAVAMANOS Y ORINALES

CFASOD SANDRA DEL PILAR VELANDIA VACA
SUPERVISOR LOTE 3 Contrato No. 377-ARC-DISAN-DHONAC-2024
CC. 52424955 de Cartagena-Bolívar
Dispensario Médico Nivel I Coveñas
sandra.velandia@armada.mil.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900267736	3	EQUIPOS E INGENERIA DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ASEI	BOSQUE TRANSV 44 # 21A-44	CARTAGENA-BOLIVAR	3107138609	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	927036144	9473571150	E	2024/09/10	2024/09/20	BANCOLOMBIA	10	$923,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1041976412	ARRIETA LEWIS	X	X																231001	8	$346,667	$55,500	CCFC55	8	$346,667	$13,900	CCF08	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0	Si	$107,500
2	CC	1002322337	CAMARGO KENRRI	X	X																230301	8	$346,667	$55,500	CCFC55	8	$346,667	$13,900	CCF08	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0	Si	$107,500
3	CC	73205659	CARDOSSIS ERNEL	X	X																230301	8	$346,667	$55,500	ESSC24	8	$346,667	$13,900	CCF08	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0	Si	$107,500
4	CC	8508007	DE HOYOS LUIS	X	X																230201	3	$130,000	$20,800	CCFC55	3	$130,000	$5,200	CCF08	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
5	CC	1128057954	MARTIN SAMUEL	X																	231001	8	$506,667	$81,100	EPS042	8	$506,667	$20,300	CCF08	8	$506,667	$20,300	14-11	8	$506,667	$35,300	8	$0	$0	Si	$157,000
6	CC	7921629	PEREZ ARIEL	X																	230201	8	$933,334	$149,400	CCFC55	8	$933,334	$37,400	CCF08	8	$933,334	$37,400	14-11	8	$933,334	$65,000	8	$0	$0	Si	$289,200
7	CC	1047504661	ROMERO RAFAEL	X	X																230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF08	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0	Si	$107,500
Total	**Afiliados(7)**																						$2,956,669	$473,300			$2,956,669	$118,500			$2,956,669	$118,500			$2,956,669	$206,200		$0	$0		$916,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900267736	3	EQUIPOS E INGENERIA DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ASEI	BOSQUE TRANSV 44 # 21A-44	CARTAGENA-BOLIVAR	3107138609	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	927036144	9473571150	E	2024/09/10	2024/09/20	BANCOLOMBIA	10	$923,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$473,300	$3,700	$0	$477,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$136,600	$1,100	$0	$137,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$166,500	$1,300	$0	$167,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$170,200	$1,300	$0	$171,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$206,200	$1,600	$0	$207,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$206,200	$1,600	$0	$207,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$118,500	$900	$0	$119,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$118,500	$900	$0	$119,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$118,500	$1,200	$0	$119,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$70,400	$600	$0	$71,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$20,300	$200	$0	$20,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$13,900	$200	$0	$14,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$13,900	$200	$0	$14,100
TOTAL				**7**	**$916,500**	**$7,400**	**$0**	**$923,900**
