

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**IDU-1727-2023-CONSTCORREDORVERDEL2-CLB**	**1896 días**	**19/02/24**	**5/09/30**
1	**CONTRATO 1727 -2023 "CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCION) Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**	**1896 días**	**19/02/24**	**5/09/30**
2	Inicio Proyecto	0 días	19/02/24	19/02/24
3	Suscripción acta de inicio	0 días	19/02/24	19/02/24
4	**PRECONSTRUCCION**	**311 días**	**19/02/24**	**14/03/25**
5	**COMPONENTE PRINCIPAL**	**246 días**	**19/02/24**	**26/12/24**
6	**Cronograma de la Etapa de Preconstrucción**	**21 días**	**19/02/24**	**13/03/24**
14	**Terminación del proceso de revisión por parte de la Interventoría de los Estudios y Diseños**	**246 días**	**19/02/24**	**26/12/24**
15	TOPOGRAFIA	81 días	19/02/24	30/05/24
26	**GEOTECNIA**	**161 días**	**13/03/24**	**3/10/24**
45	**DISEÑO GEOMETRICO**	**102 días**	**19/02/24**	**27/06/24**
55	**URBANISMO Y PAISAJISMO**	**170 días**	**19/02/24**	**20/09/24**
70	**ESTRUCTURAS**	**180 días**	**19/02/24**	**3/10/24**
71	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**	**180 días**	**19/02/24**	**3/10/24**
83	**ESTRUCTURAS METALICAS**	**180 días**	**19/02/24**	**3/10/24**
96	**PAVIMENTOS**	**152 días**	**19/02/24**	**30/08/24**
108	**SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN**	**175 días**	**20/05/24**	**26/12/24**
123	**Intersección Cl. 134 (Incluye Geotecnia, Estructuras, Pavimentos, Urbanismo, Transito, Redes Humedas, Redes Secas)**	**177 días**	**19/02/24**	**30/09/24**
124	**TOPOGRAFIA**	**127 días**	**19/02/24**	**29/07/24**
135	**GEOTECNIA**	**92 días**	**14/05/24**	**9/09/24**
145	**DISEÑO GEOMETRICO**	**50 días**	**23/07/24**	**24/09/24**
154	**URBANISMO Y PAISAJISMO**	**55 días**	**23/07/24**	**30/09/24**
163	**ESTRUCTURAS**	**55 días**	**19/07/24**	**25/09/24**
173	**PAVIMENTOS**	**42 días**	**23/07/24**	**13/09/24**
182	**Radicación para aprobaciones/trámites/permisos en Ministerio de Cultura, ICANH**	**145 días**	**19/02/24**	**22/08/24**
191	**Radicación para aprobaciones/trámites/permisos en las ESP con aprobación por parte del Interventor (EAAB, Enel /UAESP**	**182 días**	**19/02/24**	**4/10/24**
192	**REDES HIDROSANITARIAS**	**182 días**	**19/02/24**	**4/10/24**
262	REDES SECAS	152 días	19/02/24	30/08/24
313	**Firma Acta de Finalización de la Etapa de Preconstrucción e inicio de la Etapa de Construcción**	**1 día**	**3/10/24**	**3/10/24**
317	**Cierre y aprobaciones de productos finales de ESP**	**1 día**	**3/10/24**	**3/10/24**
321	**COMPONENTES TRANSVERSALES**	**182 días**	**19/02/24**	**4/10/24**
322	**TRANSITO Y TRANSPORTE**	**179 días**	**19/02/24**	**3/10/24**
357	**AMBIENTAL/SST/FORESTAL/FAUNA**	**182 días**	**19/02/24**	**4/10/24**
358	**AMBIENTAL**	**170 días**	**19/02/24**	**23/09/24**
390	**FORESTAL**	**157 días**	**28/02/24**	**17/09/24**
400	**FAUNA**	**173 días**	**28/02/24**	**4/10/24**
410	**PERMISOS y/o AUTORIZACIONES y/o TRAMITES**	**108 días**	**26/02/24**	**15/07/24**
420	**SST**	**159 días**	**19/02/24**	**9/09/24**
435	**COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO**	**116 días**	**19/02/24**	**16/07/24**
467	**FASE ADICIONAL PARA ESPECIALIDADES Y COMPONENTES POR PREDIOS Y DEFINICIONES DE TERCEROS**	**165 días**	**23/08/24**	**14/03/25**
468	Inicio Fase Adicional	0 días	15/10/24	15/10/24
469	**GESTIÓN PREDIAL**	**0 días**	**15/10/24**	**15/10/24**
470	Entrega de predios por parte del IDU	0 días	15/10/24	15/10/24
471	**COMPONENTE PRINCIPAL**	**114 días**	**15/10/24**	**5/03/25**
472	**Terminación del proceso de revisión por parte de la Interventoría de los Estudios y Diseños**	**113 días**	**15/10/24**	**4/03/25**
473	**GEOTECNIA**	**83 días**	**15/10/24**	**28/01/25**
474	Inicio Geotecnia	0 días	15/10/24	15/10/24
475	Trabajo de campo. Toma de muestras en predios entregados por el IDU	20 días	15/10/24	8/11/24
476	Análisis y generación de datos tomados en campo	30 días	8/11/24	17/12/24
477	Ajuste de Geotecnia y diseños	5 días	17/12/24	23/12/24
478	Revisión informe por parte de interventoria y remisión de observaciones	0 días	6/01/25	6/01/25
479	Atención a observaciones por parte del Consorcio y radicación ante interventoria	8 días	6/01/25	15/01/25
480	Revisión informe final ante interventoria y aprobación	0 días	28/01/25	28/01/25
481	Fin Geotecnia	0 días	28/01/25	28/01/25
482	**ESTRUCTURAS**	**113 días**	**15/10/24**	**4/03/25**
483	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**	**45 días**	**17/12/24**	**11/02/25**
484	Ajustes a los diseño a partir de las áreas entregadas por el IDU	20 días	17/12/24	11/01/25
485	Revisión del informe por parte de la interventoria	0 días	23/01/25	23/01/25
486	Atención a Observaciones emitidas por parte de Interventoria	5 días	23/01/25	29/01/25
487	Revisión y aprobación por parte de la interventoria	0 días	11/02/25	11/02/25
488	Fin Estructuras de Concreto	0 días	11/02/25	11/02/25
489	**ESTRUCTURAS METALICAS**	**113 días**	**15/10/24**	**4/03/25**
490	Definición y aprobación del diseño definitivo por parte de TRANSMILENIO, elaboración y radicación del nuevo diseño de ESTACIONES	50 días	15/10/24	17/12/24
491	Revisión del informe por parte de la interventoria	0 días	23/12/24	23/12/24
492	Atención a Observaciones emitidas por parte de Interventoria	53 días	23/12/24	26/02/25
493	Radicación informe final ante interventoria	0 días	4/03/25	4/03/25
494	Revisión y aprobación por parte de la interventoria	0 días	4/03/25	4/03/25
495	Fin Estructuras de Metalica	0 días	4/03/25	4/03/25
496	**DISEÑO GEOMETRICO**	**18 días**	**11/02/25**	**4/03/25**
497	Ajustes al diseño a partir de las áreas entregadas por el IDU	9 días	11/02/25	21/02/25
498	Revisión Informe por parte de la interventoria	0 días	4/03/25	4/03/25
499	Aprobación informe final por parte de interventoria	0 días	4/03/25	4/03/25
500	Fin Diseño Geometrico	0 días	4/03/25	4/03/25
501	**URBANISMO Y PAISAJISMO**	**18 días**	**11/02/25**	**4/03/25**
502	Ajustes al diseño a partir de las áreas entregadas por el IDU	9 días	11/02/25	21/02/25
503	Revisión Informe por parte de la interventoria	0 días	4/03/25	4/03/25
504	Revisión y aprobación del informe final por parte de interventoria	0 días	4/03/25	4/03/25
505	Fin Urbanismo y paisajismo	0 días	4/03/25	4/03/25
506	**Aprobaciones/trámites/permisos en Ministerio de Cultura**	**60 días**	**20/12/24**	**5/03/25**
507	Finalización de temas prediales en bienes de interes a cargo del IDU	0 días	20/12/24	20/12/24
508	Radicacióndе la totalidad de la documentación de los Bienes Inmuebles de Interes Cultural ante del IDPC	2 días	20/12/24	24/12/24
509	Revisión de documentación por parte del IDPC	43 días	24/12/24	14/02/25
510	Atención de observaciones por parte del contratista	5 días	14/02/25	21/02/25
511	Revisión y aprobación final por parte de interventoría	0 días	5/03/25	5/03/25
512	Radicación de versión final ante del IDPC	0 días	5/03/25	5/03/25
513	**Intersección Cl. 134 (Incluye Geotecnia, Estructuras, Pavimentos, Urbanismo, Transito, Redes Humedas, Redes Secas)**	**89 días**	**15/10/24**	**4/02/25**
514	**GEOTECNIA**	**78 días**	**15/10/24**	**21/01/25**
515	Inicio Geotecnia	0 días	15/10/24	15/10/24
516	Trabajo de campo. Toma de muestras en las áreas entregadas por el IDU	8 días	15/10/24	24/10/24
517	Análisis y generación de datos tomados en campo	30 días	24/10/24	2/12/24
518	Presentación informe	10 días	2/12/24	13/12/24
519	Revisión informe por parte de interventoria y remisión de observaciones al contratista.	0 días	26/12/24	26/12/24
520	Atención a observaciones por parte del Contratista y radicación a interventoría	10 días	27/12/24	9/01/25
521	Revisión del informe final por parte de la interventoria y aprobación	0 días	21/01/25	21/01/25
522	Fin Geotecnia	0 días	21/01/25	21/01/25
523	**ESTRUCTURAS**	**40 días**	**2/12/24**	**21/01/25**
524	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**	**40 días**	**2/12/24**	**21/01/25**
525	Ajustes a los diseños a partir de las áreas entregadas por el IDU	15 días	2/12/24	19/12/24
526	Revisión del informe por parte de la interventoria y remisión de observaciones al contratista	0 días	3/01/25	3/01/25
527	Atención a Observaciones emitidas por la Interventoria y radicación versión final por parte del contratista	5 días	3/01/25	9/01/25
528	Revisión y aprobación por parte de la interventoria	0 días	21/01/25	21/01/25
529	Fin Estructuras de Concreto	0 días	21/01/25	21/01/25
530	**DISEÑO GEOMETRICO**	**36 días**	**19/12/24**	**4/02/25**
531	Ajuste al diseño y radicación	9 días	19/12/24	2/01/25
532	Revisión informe por parte de interventoria y remisión de observaciones	0 días	13/01/25	13/01/25
533	Atención a Observaciones emitidas por parte de Inteventoria y radicación	9 días	13/01/25	23/01/25
534	Aprobación informe final por parte de interventoria	0 días	4/02/25	4/02/25
535	Fin Diseño Geometrico	0 días	4/02/25	4/02/25
536	**URBANISMO Y PAISAJISMO**	**36 días**	**19/12/24**	**4/02/25**
537	Ajustes a los diseños a partir de las áreas entregadas por el IDU	9 días	19/12/24	2/01/25
538	Revisión informe por parte de interventoria y remisión de observaciones al contratista	0 días	13/01/25	13/01/25
539	Atención a Observaciones emitidas por la Inteventoria y radicación versión final	9 días	13/01/25	23/01/25
540	Revisión y Aprobación informe final por parte de interventoria	0 días	4/02/25	4/02/25
541	Fin Urbanismo	0 días	4/02/25	4/02/25
542	**COMPONENTES TRANSVERSALES**	**165 días**	**23/08/24**	**14/03/25**
543	**AMBIENTAL/SST/FORESTAL/FAUNA**	**154 días**	**23/08/24**	**1/03/25**
544	**AMBIENTAL / FORESTAL / FAUNA / SST**	**154 días**	**23/08/24**	**1/03/25**
545	Incio	0 días	15/10/24	15/10/24
546	Elaboración y presentación de informes mensuales	111 días	15/10/24	1/03/25
547	Trámites y Permisos de Ocupación de Cause para Nuevos Cuerpos de Agua	51 días	23/08/24	24/10/24
548	Fin	0 días	1/03/25	1/03/25
549	**FORESTAL**	**111 días**	**8/10/24**	**24/02/25**
550	Inicio Forestal	0 días	8/10/24	8/10/24
551	Actualización del Inventario forestal en espacio privado	90 días	8/10/24	29/01/25
552	Actualización de las resoluciones a los tratamientos silviculturales; posterior a la entrega oficial de las áreas pendientes por parte del IDU	110 días	8/10/24	21/02/25
553	Actualización del informe de Inventario forestal	1 día	22/02/25	24/02/25
554	Fin Forestal	0 días	24/02/25	24/02/25
555	**COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO**	**111 días**	**15/10/24**	**1/03/25**
556	Inicio componente Dialogo Ciudadano	0 días	15/10/24	15/10/24
557	Elaboración actas de vecindad	111 días	15/10/24	1/03/25
558	Elaboración y presentación de informes mensuales	111 días	15/10/24	1/03/25
559	Fin componente Dialogo Ciudadano	0 días	1/03/25	1/03/25
560	**TRANSITO Y TRANSPORTE**	**142 días**	**19/09/24**	**14/03/25**

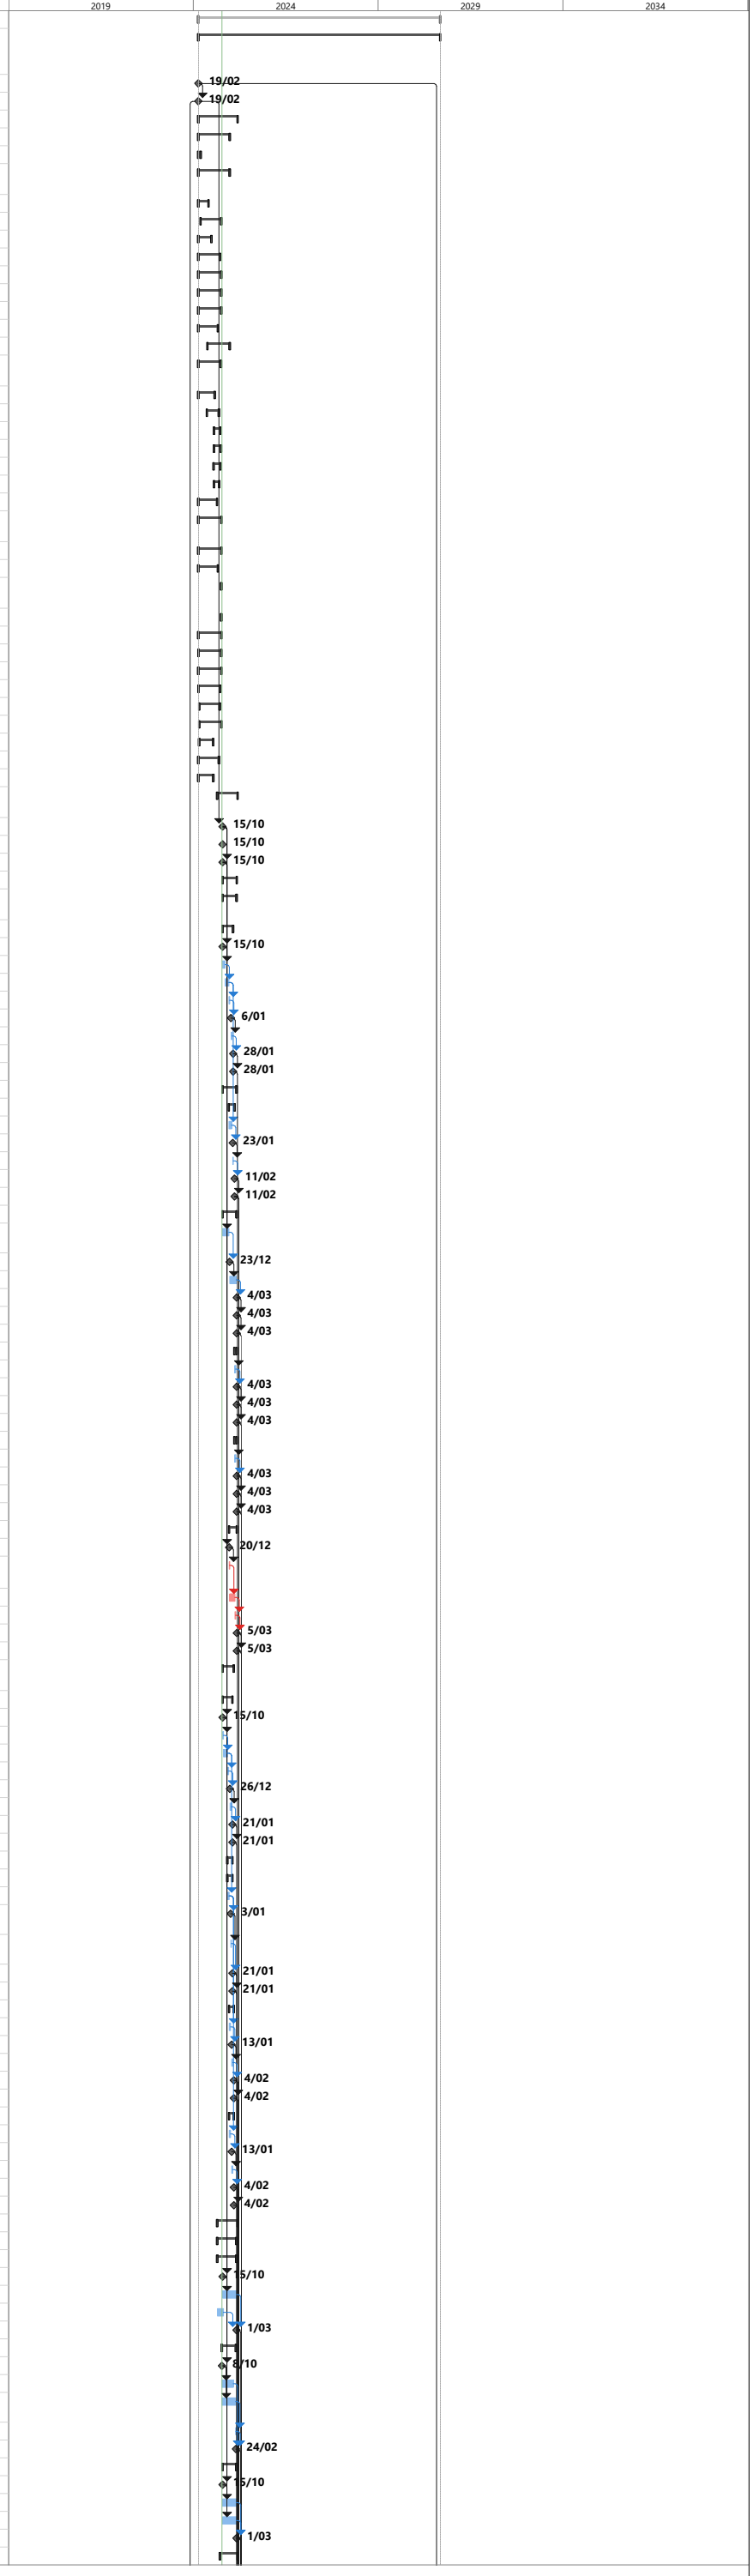

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
561	Inicio componente Tránsito y Señalización	0 días	3/10/24	3/10/24
562	**Linea Base**	**67 días**	**19/09/24**	**12/12/24**
563	Presentación Linea Base a interventoría	0 días	19/09/24	19/09/24
564	Presentación Linea Base a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	26/09/24	26/09/24
565	Revisión Linea Base a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	12/11/24	12/11/24
566	Aprobación de Linea Base por Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	12/12/24	12/12/24
567	Modelo PMT	0 días	7/10/24	7/10/24
568	**PMT Tramo 1**	**106 días**	**25/10/24**	**6/03/25**
569	Presentación PMT a interventoría	0 días	25/10/24	25/10/24
570	Presentación PMT a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	24/12/24	24/12/24
571	Revisión PMT a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	10/02/25	10/02/25
572	Aprobación de PMT por Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	24/02/25	24/02/25
573	Inicio de actividades de obra del tramo	0 días	6/03/25	6/03/25
574	**PMT Tramo 2**	**102 días**	**1/11/24**	**8/03/25**
575	Presentación PMT a interventoría	0 días	1/11/24	1/11/24
576	Presentación PMT a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	31/12/24	31/12/24
577	Revisión PMT a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	15/01/25	15/01/25
578	Aprobación de PMT por Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	1/03/25	1/03/25
579	Inicio de actividades de obra del tramo	0 días	8/03/25	8/03/25
580	**PMT Tramo 3**	**102 días**	**8/11/24**	**14/03/25**
581	Presentación PMT a interventoría	0 días	8/11/24	8/11/24
582	Presentación PMT a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	8/01/25	8/01/25
583	Revisión PMT a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	23/01/25	23/01/25
584	Aprobación de PMT por Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	8/03/25	8/03/25
585	Inicio de actividades de obra del tramo	0 días	14/03/25	14/03/25
586	**Diseño de Señalización**	**77 días**	**15/10/24**	**20/01/25**
587	Presentación diseño de sañalización a interventoría	0 días	15/10/24	15/10/24
588	Presentación diseño de sañalización a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	22/10/24	22/10/24
589	Revisión diseño de sañalización a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	6/12/24	6/12/24
590	Aprobación de diseño de sañalización por Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	20/01/25	20/01/25
591	**Diseño de Semaforización**	**54 días**	**15/10/24**	**20/12/24**
592	Presentación diseño de sañalización a interventoría	0 días	15/10/24	15/10/24
593	Presentación diseño de sañalización a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	22/10/24	22/10/24
594	Revisión diseño de sañalización a Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	21/11/24	21/11/24
595	Aprobación de diseño de sañalización por Secretaría Distrital de Movilidad SDM	0 días	20/12/24	20/12/24
596	Fin componente Tránsito y Señalización	0 días	14/03/25	14/03/25
597	Fin fase adicional	0 días	5/03/25	5/03/25
598	**ACTIVIDADES DE CIERRE DE ETAPA DE PRECONSTRUCCION**	**110 días**	**19/10/24**	**5/03/25**
599	Inicio de Actividades de Cierre de Etapa de Preconstrucción	0 días	19/10/24	19/10/24
600	Terminación del proceso de revisión de Estudios y Diseños por parte de la interventoría.	0 días	19/12/24	19/12/24
601	Cierre y aprobaciones de productos finales por parte de las ESP.	0 días	28/01/25	28/01/25
602	Firma del Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de Etapa de Construcción.	0 días	5/03/25	5/03/25
603	Fin de Actividades de Cierre de Etapa de Preconstrucción	0 días	5/03/25	5/03/25
604	**ETAPA CONSTRUCCIÓN**	**716 días**	**6/03/25**	**3/09/27**
605	Inicio Etapa de Construcción	0 días	6/03/25	6/03/25
606	Construcción Obra Lote 2	716 días	6/03/25	3/09/27
607	Fin Etapa de Construcción	0 días	3/09/27	3/09/27
608	**ETAPA MANTENIMIENTO**	**875 días**	**6/09/27**	**5/09/30**
609	Inicio Etapa Mantenimeinto	0 días	6/09/27	6/09/27
610	Mantenimiento	875 días	6/09/27	5/09/30
611	Fin Etapa Mantenimeinto	0 días	5/09/30	5/09/30
612	FIN PROYECTO	0 días	5/09/30	5/09/30

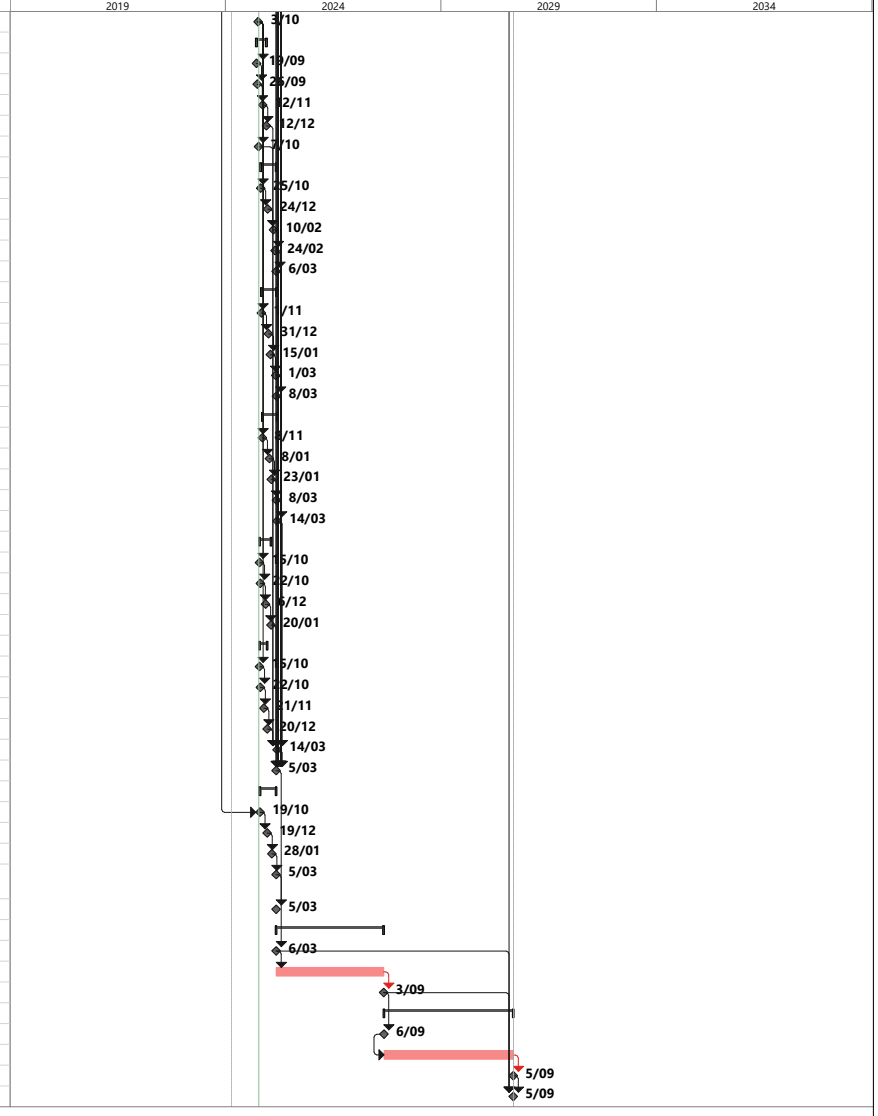

FLAVIO ALEJANDRO ARAUJO LOZANO
DIRECTOR DE OBRA

JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Firmado digitalmente por JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Fecha: 2024.10.17 10:27:15 -05'00'

JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
