Cali, septiembre 26 del 2024.

INFORME TÉCNICO DE INSPECCION GENERAL DE EQUIPOS EJECUTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL EDIFICIO BULEVAR LA SEXTA, CAM, EDIFICIO FUENTE VERSALLES Y CENTRO DE SERVICIOS DE LADERA CONTRATO No. 4181.010.26.1.209-2024.

COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S identificada con NIT 900.950.719, dando cumplimiento a las actividades del contrato de prestación de servicios No. 4181.010.26.1.209-2024 con objeto de "REALIZAR INSPECCION GENERAL DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL EDIFICIO BULEVAR LA SEXTA, CAM, EDIFICIO FUENTE VERSALLES Y CENTRO DE SERVICIOS DE LADERA" personal técnico de la empresa se desplazó para realizar la inspección general de las plantas eléctricas existentes en dichas sedes.

En la tabla 1 se especifican los hallazgos encontrados al momento de la visita (estado inicial y final) de los grupos electrógenos y adicionalmente se añaden las observaciones pertinentes.

UBICACIÓN	ESTADO INICIAL	PROCEDIMIENTO, ESTADO FINAL Y RECOMENDACIONES
EDIFICIO BOULEVAR LA SEXTA	Planta eléctrica con motor Cummins NTA-855, GENERADOR DE 375KVA y control ComAp InteliLite 9. Estado operativo. **REFERENCIA DE FILTROS, ACEITE Y REFRIGERANTE.** **ACEITE** - LF3000 ACEITE: VALVODIESEL 15W-40 CH4 **COMBUSTIBLE** - FS1000 X2 **AIRE** - AH1103 **REFRIGERANTE -** AW-2010SP	Inspección general realizada al equipo el día **23/08/2024** • Revisión sistema de lubricación (presencia de fugas, filtración, líneas de suministro y conexiones) • Revisión sistema de combustible (línea de alimentación, filtración, conexiones) • Revisión sistema de admisión de aire (filtración, indicador de restricción, turbo-cargadores) • Revisión sistema de escape (conexiones, ductos y ventilación) • Revisión sistema de refrigeración (nivel de concentración de anticongelantes y aditivo contra cavitación y corrosión, verificando fugas y estado de conexiones) • Revisión nivel de cargas de las baterías, nivel del electrolito estado de bornes y verificación de conexiones. • Revisión bandas y elementos de transmisión (tensión de bandas) • Revisión limpieza general del grupo electrógeno • Revisión dispositivos de protección (breaker) y componentes eléctricos (cableados) sensores e indicadores y barrajes de conexión, tablero de instrumentos de medición. • Revisión componentes auxiliares de agua y otros. • Revisión y pruebas de funcionamiento adecuado del grupo electrógeno, monitoreo de parámetros principales como frecuencia, tensiones de línea, tensiones de fase, intensidad de línea. Durante la inspección general del equipo se evidencia que se encuentra en excelentes condiciones, cuarto limpio, equipo limpio sin fugas, batería cargando correctamente, nivel de aceite y refrigerante óptimo, tanque de combustible lleno al 90%. Finalmente se realizaron pruebas de encendido en vacío donde el equipo funcionó correctamente, para terminar, se entregó en modo automático.

Registro fotográfico edificio Boulevard de la sexta.











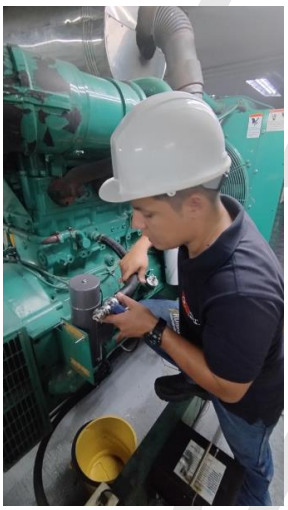
UBICACIÓN	ESTADO INICIAL	PROCEDIMIENTO, ESTADO FINAL Y RECOMENDACIONES
EDIFICIO FUENTE VERSALLES	Planta eléctrica con motor Cummins NTA-855, GENERADOR DE 438KVA y control Detector. Estado operativo. **REFERENCIA DE FILTROS, ACEITE Y REFRIGERANTE.** **ACEITE** - LF3000 **ACEITE:** VALVODIESEL 15W-40 CH4 **COMBUSTIBLE** - FS1000 X2 **COMBUSTIBLE**- FF5369 **AIRE** - DA2502 **REFRIGERANTE** - W-2010SP	Inspección general realizada al equipo el día **23/08/2024** • Revisión sistema de lubricación (presencia de fugas, filtración, líneas de suministro y conexiones) • Revisión sistema de combustible (línea de alimentación, filtración, conexiones) • Revisión sistema de admisión de aire (filtración, indicador de restricción, turbo-cargadores) • Revisión sistema de escape (conexiones, ductos y ventilación) • Revisión sistema de refrigeración (nivel de concentración de anticongelantes y aditivo contra cavitación y corrosión, verificando fugas y estado de conexiones) • Revisión nivel de cargas de las baterías, nivel del electrolito estado de bornes y verificación de conexiones. • Revisión bandas y elementos de transmisión (tensión de bandas) • Revisión limpieza general del grupo electrógeno • Revisión dispositivos de protección (breaker) y componentes eléctricos (cableados) sensores e indicadores y barrajes de conexión, tablero de instrumentos de medición. • Revisión componentes auxiliares de agua y otros. • Revisión y pruebas de funcionamiento adecuado del grupo electrógeno, monitoreo de parámetros principales como frecuencia, tensiones de línea, tensiones de fase, intensidad de línea. Durante la rutina de mantenimiento preventivo anterior se evidencio que el precalentador se encontraba en mal estado por tal motivo se le presenta a la entidad la respectiva cotización **# CR- 14158** para su aprobación debido a que el precalentador antiguo no funcionaba y se encontraba fuera de servicio. Durante la visita técnica de este equipo el día 29/08/2024 se realizó cambio del sistema precalentador según cotización **#CR- 14158** el cual incluye acoples, abrazaderas y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Finalmente, después de haber realizado pruebas de encendido y haber verificado todos sus parámetros se

		entregó el equipo operando en óptimas condiciones y en modo automático, se anexa registro fotográfico.

Registro fotográfico edificio fuente Versalles.




Antes: precalentador defectuoso.




Después: precalentador Nuevo + acoples y accesorios.

UBICACIÓN	ESTADO INICIAL	PROCEDIMIENTO, ESTADO FINAL Y RECOMENDACIONES
CONCEJO MUNICIPAL CAM	Planta eléctrica Cummins con generador de 168.8KVA en operación. **REFERENCIA DE FILTROS, ACEITE Y REFRIGERANTE.** **ACEITE** -LF516 ACEITE: VALVODIESEL 15W-40 CH4 **AIRE** - AH1135 **AGUA** - AW-2010SP **COMBUSTIBLE** - FF5369 **COMBUSTIBLE** - CF108	Inspección general realizada al equipo el día **23/08/2024** • Revisión sistema de lubricación (presencia de fugas, filtración, líneas de suministro y conexiones) • Revisión sistema de combustible (línea de alimentación, filtración, conexiones) • Revisión sistema de admisión de aire (filtración, indicador de restricción, turbo-cargadores) • Revisión sistema de escape (conexiones, ductos y ventilación) • Revisión sistema de refrigeración (nivel de concentración de anticongelantes y aditivo contra cavitación y corrosión, verificando fugas y estado de conexiones) • Revisión nivel de cargas de las baterías, nivel del electrolito estado de bornes y verificación de conexiones. • Revisión bandas y elementos de transmisión (tensión de bandas) • Revisión limpieza general del grupo electrógeno • Revisión dispositivos de protección (breaker) y componentes eléctricos (cableados) sensores e indicadores y barrajes de conexión, tablero de instrumentos de medición. • Revisión componentes auxiliares de agua y otros. • Revisión y pruebas de funcionamiento adecuado del grupo electrógeno, monitoreo de parámetros principales como frecuencia, tensiones de línea, tensiones de fase, intensidad de línea. • servicio de pintura general para planta eléctrica. Revisión y rutina mensual del equipo con sus respectivas pruebas de funcionamiento. Durante la rutina de mantenimiento preventivo anterior se evidencio que el tanque de combustible externo tenía mucha sedimentación y agua almacenado por lo cual se había contaminado el combustible de la base tanque, se evidencia el mal estado de la pintura general del equipo y algunos accesorios externos por tal motivo se le presenta a la entidad la respectiva cotización **# CR- 14156** para su aprobación con el fin de dejar en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento el sistema de combustible y el equipo en general.

		Durante la visita general de este equipo el día 29/08/2024 se realizó pintura general de la planta eléctrica según cotización # CR- 14156, incluyendo también acondicionamiento y pintura del tanque de combustible, base de combustible, base de motor, lavado interno de tanque de combustible con máquina de microfiltración de sedimentos de combustible. Finalmente, después de haber realizado pruebas de encendido y haber verificado todos sus parámetros se entregó operando en óptimas condiciones y en modo automático, se anexa registro fotográfico.

Registro fotográfico concejo municipal.




pintura general del equipo y base de motor




pintura general de base y tanque de combustible

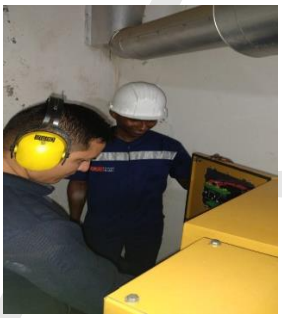
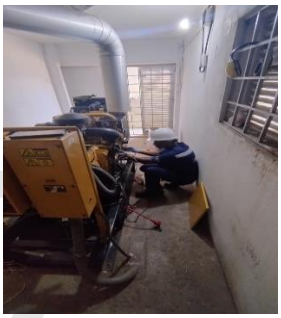
SITIO	ESTADO INICIAL	PROCEDIMIENTO, ESTADO FINAL Y RECOMENDACIONES
CENTRO DE SERVICIOS LADERA	Planta eléctrica Perkins R551345 con generador Olympian de 75 KVA. Se encontró el equipo en modo automático con alarma por sobre tensión, además se logró ver que la correa de alternador estaba mal instalada. **REFERENCIA DE FILTROS, ACEITE Y REFRIGERANTE.** **COMBUSTIBLE –** 26560201 **ACEITE:** VALVODIESEL 15W-40 CH4 **ACEITE -** A1 **AIRE -** DA2570	Inspección general realizada al equipo el día **26/08/2024** Revisión y rutina mensual del equipo con sus respectivas pruebas de funcionamiento • Revisión sistema de lubricación (presencia de fugas, filtración, líneas de suministro y conexiones) • Revisión sistema de combustible (línea de alimentación, filtración, conexiones) • Revisión sistema de admisión de aire (filtración, indicador de restricción, turbo- cargadores) • Revisión sistema de escape (conexiones, ductos y ventilación) • Revisión sistema de refrigeración (nivel de concentración de anticongelantes y aditivo contra cavitación y corrosión, verificando fugas y estado de conexiones) • Revisión nivel de cargas de las baterías, nivel del electrolito estado de bornes y verificación de conexiones. • Revisión bandas y elementos de transmisión (tensión de bandas) • Revisión limpieza general del grupo electrógeno • Revisión dispositivos de protección (breaker) y componentes eléctricos (cableados) sensores e indicadores y barrajes de conexión, tablero de instrumentos de medición. • Revisión componentes auxiliares de agua y otros. • Revisión y pruebas de funcionamiento adecuado del grupo electrógeno, monitoreo de parámetros principales como frecuencia, tensiones de línea, tensiones de fase, intensidad de línea. • servicio para reemplazo, organizar y ajustar cableado de planta eléctrica. • servicio suministro y cambio de correa • servicio de suministro e instalación de batería nueva. Durante la rutina de mantenimiento preventivo anterior se evidencio que la batería y el control del equipo presentaban fallas y que en cualquier momento podían hacer que el equipo quedara fuera de servicio, por tal motivo se le presenta a la entidad la respectiva cotización **# CR- 14159** para su aprobación esto para garantizar el buen funcionamiento del equipo y contar con respaldo eléctrico en caso de no tener la red pública.

		Durante la visita técnica de este equipo el día 30/08/2024 se realizó suministro e instalación de batería 12V-DC 31H nueva, cambio de correa de alternador, ramal eléctrico de control, borneras, protecciones, relés, coraza, pilotos, y demás accesorios para el correcto funcionamiento según cotización **#CR- 14159** esto con el fin de poder manejarlo desde el control digital MEBAY, se realizaron pruebas de encendido en vacío donde el equipo trabajo en perfectas condiciones, se entrega el equipo operativo y en modo automático.

Registro fotográfico Ladera.



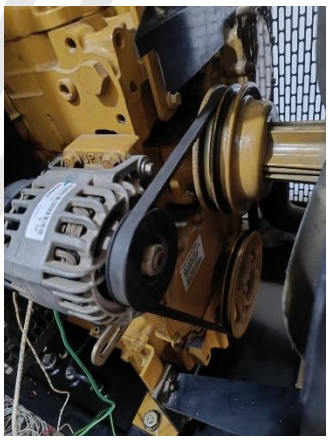

cableado antiguo y defectuoso.

cambio de ramales eléctricos.




cableado eléctrico nuevo organizado y acondicionado con sus respectivos accesorios y coraza.

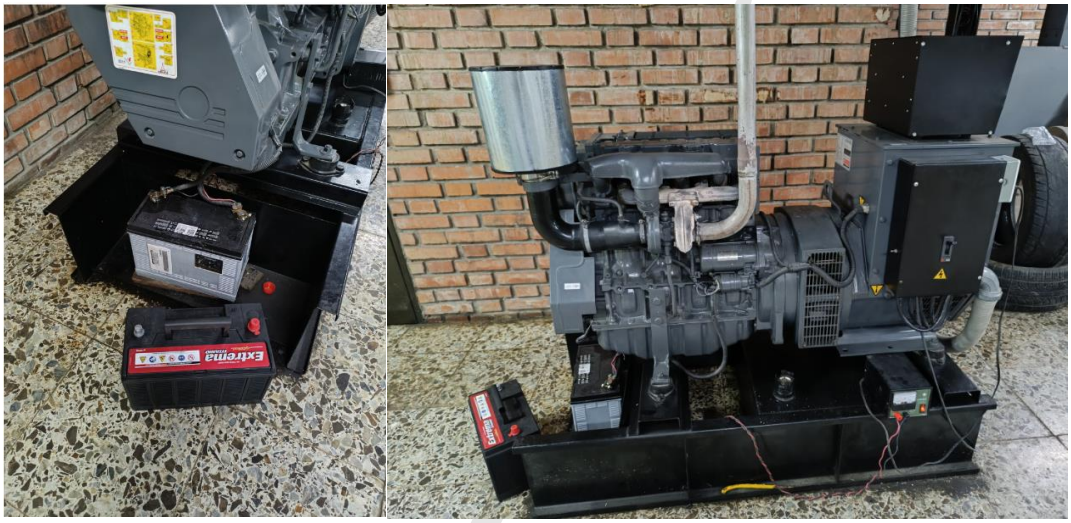




cambio de correa de alternador y batería

UBICACIÓN	ESTADO INICIAL	PROCEDIMIENTO, ESTADO FINAL Y RECOMENDACIONES
DATIC	Planta eléctrica Stewart Stevenson SD-40 con motor Deutz, generador de 55KVA y control ComAp InteliNano. Estado operativo. **REFERENCIA DE FILTROS, ACEITE Y REFRIGERANTE.** **ACEITE** - A223 ACEITE: VALVODIESEL 15W-40 CH4 **COMBUSTIBLE** - A-243004 **AIRE** - ECC085004	Inspección general realizada al equipo el día **26/08/2024** Revisión y rutina mensual del equipo con sus respectivas pruebas de funcionamiento. • Revisión sistema de lubricación (presencia de fugas, filtración, líneas de suministro y conexiones) • Revisión sistema de combustible (línea de alimentación, filtración, conexiones) • Revisión sistema de admisión de aire (filtración, indicador de restricción, turbo-cargadores) • Revisión sistema de escape (conexiones, ductos y ventilación) • Revisión sistema de refrigeración (nivel de concentración de anticongelantes y aditivo contra cavitación y corrosión, verificando fugas y estado de conexiones) • Revisión nivel de cargas de las baterías, nivel del electrolito estado de bornes y verificación de conexiones. • Revisión bandas y elementos de transmisión (tensión de bandas) • Revisión limpieza general del grupo electrógeno • Revisión dispositivos de protección (breaker) y componentes eléctricos (cableados) sensores e indicadores y barrajes de conexión, tablero de instrumentos de medición. • Revisión componentes auxiliares de agua y otros. • Revisión y pruebas de funcionamiento adecuado del grupo electrógeno, monitoreo de parámetros principales como frecuencia, tensiones de línea, tensiones de fase, intensidad de línea. Durante la rutina de mantenimiento preventivo anterior se evidencio que la batería el sistema de amortiguación y el control del equipo presentaban fallas y que en cualquier momento podían hacer que el equipo quedara fuera de servicio, por tal motivo se le presenta a la entidad la respectiva cotización **# CR- 14155** para su aprobación esto para garantizar el buen funcionamiento del equipo y contar con respaldo eléctrico en caso de no tener la red pública. • servicio de suministro e instalación de batería nueva.

		• servicio para reposicionar y anclar caja de conexiones eléctricas, coraza americana, tubería PVC y extender cables de potencia. Servicio de instalación amortiguadores para planta. Durante la visita técnica de este equipo el día 30/08/2024 se realizó cambio de batería 12 VDC 31H completamente nueva, finalmente se realizaron pruebas de encendido donde el equipo trabajo en óptimas condiciones, se entrega operando y en modo automático. Se realizan las actividades relacionadas en la cotización **# CR- 14155**. El cableado de potencia y control que comunica el grupo electrógeno de Datic y la transferencia eléctrica, pasa por una caja que se encontraba descolgada y mal instalada. Se llevo a cabo la instalación correcta de esta caja, sujetándola de con chazos expansivos a la plancha de concreto superior (techo); como se muestra en las fotografías adjuntas, se entrega el equipo operativo y en modo automático.

Registro fotográfico DATIC.



suministro e instalación de batería nueva 12 V-DC.



antes y después reubicación de caja de paso en Datic.

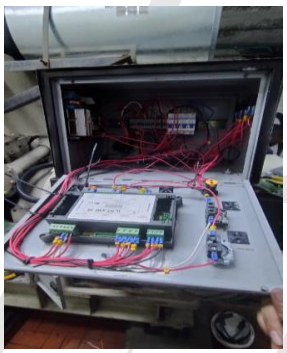
UBICACIÓN	ESTADO INICIAL	PROCEDIMIENTO, ESTADO FINAL Y RECOMENDACIONES
COMPLEJO CAM	Planta eléctrica Cummins con generador de 500KVA en operación. EL cuarto de máquinas presenta indicio de goteras sobre el techo de la planta. **REFERENCIA DE FILTROS, ACEITE Y REFRIGERANTE** **ACEITE** - LF516 **X2** **ACEITE:** VALVODIESEL 15W-40 CH4 **AIRE** - AH1135 **X2** **COMBUSTIBLE** - CF108 **X2** **REFRIGERANTE** AW-2010SP **X2** **COMBUSTIBLE** - FF5369	Inspección general realizada al equipo el día **26/08/2024** • Revisión sistema de lubricación (presencia de fugas, filtración, líneas de suministro y conexiones) • Revisión sistema de combustible (línea de alimentación, filtración, conexiones) • Revisión sistema de admisión de aire (filtración, indicador de restricción, turbo-cargadores) • Revisión sistema de escape (conexiones, ductos y ventilación) • Revisión sistema de refrigeración (nivel de concentración de anticongelantes y aditivo contra cavitación y corrosión, verificando fugas y estado de conexiones) • Revisión nivel de cargas de las baterías, nivel del electrolito estado de bornes y verificación de conexiones. • Revisión bandas y elementos de transmisión (tensión de bandas) • Revisión limpieza general del grupo electrógeno • Revisión dispositivos de protección (breaker) y componentes eléctricos (cableados) sensores e indicadores y barrajes de conexión, tablero de instrumentos de medición. • Revisión componentes auxiliares de agua y otros. • Revisión y pruebas de funcionamiento adecuado del grupo electrógeno, monitoreo de parámetros principales como frecuencia, tensiones de línea, tensiones de fase, intensidad de línea. Durante la rutina de mantenimiento preventivo anterior se evidencio que las baterías el sistema de transferencia y el sistema de control del equipo presentaban fallas y que en cualquier momento podían hacer que el equipo quedara fuera de servicio, por tal motivo se le presenta a la entidad la respectiva cotización **# CR- 14157** para su aprobación esto para garantizar el buen funcionamiento del equipo y contar con respaldo eléctrico en caso de no tener la red pública.

		Durante la visita técnica de este equipo el día 30/08/2024 se realizaron las actividades. • servicio para reemplazo, organizar y corregir fallas de cableado de control. • servicio de suministro e instalación de bomba de transferencia eléctrica para sistema de purga, apoyo para el tanqueo de combustible suministrado por la entidad y mangueras de alimentación del motor. • servicio para suministro e instalación de 2 baterías 8D con sus respectivas pruebas de funcionamiento limpieza y verificación de parámetros generales y las actividades de la cotización **# CR- 14157**, se realizaron pruebas de encendido en vacío donde el equipo trabajo en perfectas condiciones, se entrega el equipo operativo y en modo automático.

Registro fotográfico complejo CAM




ramal electrico viejo

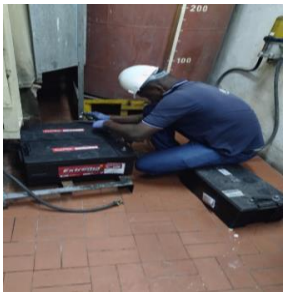

cambio de ramal eléctrico e instalación de borneras, relés y protecciones tipo breker.





ramal eléctrico nuevo protegido con coraza.

suministro e instalación de bomba de trasferencia de combustible incluye mangueras, abrazaderas y acoples

suministro e instalación de baterías nuevas 2und

El desarrollo de las actividades fue realizado por personal capacitado el cual se muestra a continuación:

LUIS MARTINEZ – INGENIERO ELECTROMECANICO

RODRIGO RODRÍGUEZ – INGENIERO ELECTRICISTA

ALEXANDER GÓNGORA – INGENIERO ELECTRÓNICO

DIEGO FERNANDO SAÑUDO - TECNICO EN MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL

INFORME ELABORADO POR:



LUIS MARTINEZ
INGENIERO ELECTROMECANICO

RECIBIDO POR:

HERNAN ALVAREZ.
SUPERVISOR ENCARGADO

ROMO
Comercializadora

COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S
Nit. 900.950.719-7
CL 35 N 3N 70 - Prados del Norte
Cel. 3142076154
Cali - Valle
Email: ventas@comercializadoraromo.com

COTIZACION
No. CR-14155

DATOS CLIENTE

Nombre:	ALCALDIA DE CALI - VALLE DEL CAUCA	**Nit:**	890,399,011-3
Lugar	PLANTA ELECTRICA - PLATAFORMA CAM DATIC	**Ciudad:**	CALI - VALLE DEL CAUCA
Dirección:	AV 2N 10 -70 CENTRO ADMINISTRATIVO CAM	**Celular:**	
Email:	facturaselectronicas@cali.gov.co		

Fecha:	26/08/2024
Forma de Pago:	Credito 30 días
Vendedor:	Liceth Navarro
Vigencia:	Ocho (8) días calendario

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Antes de IVA	% IVA	Valor Total
100010	Servicio para reposicionar y anclar caja de conexiones eléctricas, coraza america,tuberia PVC y extender cables de potencia	1	$ 613.445,38	19	$ 613.445,38
100010	Servico de Instalación amortiguadores para plantas	1	$ 100.840,34	19	$ 100.840,34

Condiciones Comerciales

Tiempo de entrega:	Sujeto a autorización del supervisor
Lugar de servicio	PLATAFORMA CAM DATIC
Cargos a la Venta:	Los suministros adicionales o cambios en los equipos no contemplados en esta cotización, corren por cuenta del cliente
Observación:	N/A

Totales

Valor bruto:	$	714.285,72
Descuentos:	$	-
Sub Total	$	714.285,72
Iva 19%	$	135.714,29
TOTAL	**$**	**850.000,01**

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Liceth Navarro
Ejecutiva Comercial
3142076154
ventas@comercializadoraromo.com
www.comercializadoraromo.com

ROMO
Comercializadora

COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S
Nit. 900.950.719-7
CL 35 N 3N 70 - Prados del Norte
Cel. 3142076154
Cali - Valle
Email: ventas@comercializadoraromo.com

COTIZACION
No. CR-14156

DATOS CLIENTE

Nombre:	ALCALDIA DE CALI - VALLE DEL CAUCA	**Nit:**	890,399,011-3	**Fecha:**	26/08/2024
Lugar	PLANTA ELECTRICA - CONCEJO MUNICIPAL	**Ciudad:**	CALI - VALLE DEL CAUCA	**Forma de Pago:**	Credito 30 días
Dirección:	AV 2N 10 -70 CENTRO ADMINISTRATIVO CAM	**Celular:**		**Vendedor:**	Liceth Navarro
Email:	facturaselectronicas@cali.gov.co			**Vigencia:**	Ocho (8) días calendario

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Antes de IVA	% IVA	Valor Total
100010	MANTENIMIENTO GENERAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE 150 GALONES	1	$ 2.838.336	19	$ 2.838.336
	METROS DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 PULGADA	8	$ 35.167	19	$ 281.336
	ROSCA PARA TUBERIA	14	$ 1.703	19	$ 23.842
	CODO GALVANIZADO DE 1 PULGADA	7	$ 6.807	19	$ 47.649
	UNION UNIVERSAL DE 1 PULGADA	2	$ 24.300	19	$ 48.600
	LLAVE DE PASO DE 1 PULGADA	2	$ 39.706	19	$ 79.412
	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	1	$ 9.076	19	$ 9.076
	SHELAC	1	$ 21.554	19	$ 21.554
	ACOPLE HEMBRA DE 1 PULGADA PARA MANGUERA 3/8	1	$ 33.750	19	$ 33.750

Condiciones Comerciales

Tiempo de entrega:	Sujeto a autorización del supervisor
Lugar de servicio	Concejo Municipal
Garantía:	3 meses por materiales e instalación
Cargos a la Venta:	Los suministros adicionales o cambios en los equipos no contemplados en esta cotización, corren por cuenta del cliente
Observación:	N/A

Totales

Valor bruto:	$	3.383.555
Descuentos:	$	-
Sub Total	$	3.383.555
Iva 19%	$	642.875
TOTAL	**$**	**4.026.430**

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Liceth Navarro
Ejecutiva Comercial
3142076154
ventas@comercializadoraromo.com
www.comercializadoraromo.com

ROMO
Comercializadora

COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S
Nit. 900.950.719-7
CL 35 N 3N 70 - Prados del Norte
Cel. 3142076154
Cali - Valle
Email: ventas@comercializadoraromo.com

COTIZACION
No. CR-14157 - 2

DATOS CLIENTE

Nombre:	ALCALDIA DE CALI - VALLE DEL CAUCA	**Nit:**	890,399,011-3
Lugar	PLANTA ELECTRICA - COMPLEJO CAM	**Ciudad:**	CALI - VALLE DEL CAUCA
Dirección:	AV 2N 10 -70 CENTRO ADMINISTRATIVO CAM	**Celular:**	
Email:	facturaselectronicas@cali.gov.co		

Fecha:	26/08/2024
Forma de Pago:	Credito 30 días
Vendedor:	Liceth Navarro
Vigencia:	Ocho (8) días calendario

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Antes de IVA	% IVA	Valor Total
100010	SERVICIO PARA REMPLAZO, ORGANIZAR Y CORREGIR FALLAS EN EL CABLEADO DEL CONTROL	1	$ 1.008.268,91	19	$ 1.008.268,91
100010	SERVICIO DE PINTURA GENERAL PARA PLANTA ELECTRICA	1	$ 1.831.596,64	19	$ 1.831.596,64
100010	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE PURGA, APOYO PARA EL TANQUEO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD Y MANGUERAS DE ALIMENTACION DEL MOTOR	1	$ 878.151,26	19	$ 878.151,26

Condiciones Comerciales

Tiempo de entrega:	Sujeto a autorización del supervisor
Lugar de servicio	COMPLEJO CAM
Cargos a la Venta:	Los suministros adicionales o cambios en los equipos no contemplados en esta cotización, corren por cuenta del cliente
Observación:	N/A

Totales

Valor bruto:	$	3.718.016,81
Descuentos:	$	-
Sub Total	$	3.718.016,81
Iva 19%	$	706.423,19
TOTAL	$	**4.424.440,00**

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Liceth Navarro
Ejecutiva Comercial
3142076154
ventas@comercializadoraromo.com
www.comercializadoraromo.com

ROMO
Comercializadora

COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S
Nit. 900.950.719-7
CL 35 N 3N 70 - Prados del Norte
Cel. 3142076154
Cali - Valle
Email: ventas@comercializadoraromo.com

COTIZACION
No. CR-14158

DATOS CLIENTE

Nombre:	ALCALDIA DE CALI - VALLE DEL CAUCA	**Nit:**	890,399,011-3
Lugar	PLANTA ELECTRICA - EDIFICIO FUENTE VERSALLES	**Ciudad:**	CALI - VALLE DEL CAUCA
Dirección:	AV 2N 10 -70 CENTRO ADMINISTRATIVO CAM	**Celular:**	
Email:	facturaselectronicas@cali.gov.co		

Fecha:	27/08/2024
Forma de Pago:	Credito 30 días
Vendedor:	Liceth Navarro
Vigencia:	Ocho (8) días calendario

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Antes de IVA	% IVA	Valor Total
100010	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE PRECALENTADOR DE MOTOR	1	$ 2.161.284,03	19	$ 2.161.284,03

Condiciones Comerciales

Tiempo de entrega:	Sujeto a autorización del supervisor
Lugar de servicio	EDIFICIO FUENTE VERSALLES
Cargos a la Venta:	Los suministros adicionales o cambios en los equipos no contemplados en esta cotización, corren por cuenta del cliente
Observación:	N/A

Totales

Valor bruto:	$	2.161.284,03
Descuentos:	$	-
Sub Total	$	2.161.284,03
Iva 19%	$	410.643,97
TOTAL	$	**2.571.928,00**

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Liceth Navarro
Ejecutiva Comercial
3142076154
ventas@comercializadoraromo.com
www.comercializadoraromo.com

ROMO
Comercializadora

COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S
Nit. 900.950.719-7
CL 35 N 3N 70 - Prados del Norte
Cel. 3142076154
Cali - Valle
Email: ventas@comercializadoraromo.com

COTIZACION
No. CR-14159

DATOS CLIENTE

Nombre:	ALCALDIA DE CALI - VALLE DEL CAUCA	**Nit:**	890,399,011-3
Lugar	PLANTA ELECTRICA - CENTRO DE SERVICIOS LADERA	**Ciudad:**	CALI - VALLE DEL CAUCA
Dirección:	AV 2N 10 -70 CENTRO ADMINISTRATIVO CAM	**Celular:**	
Email:	facturaselectronicas@cali.gov.co		

Fecha:	27/08/2024
Forma de Pago:	Credito 30 días
Vendedor:	Liceth Navarro
Vigencia:	Ocho (8) días calendario

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Antes de IVA	% IVA	Valor Total
100010	SERVICIO PARA REMPLAZO, ORGANIZAR Y AJUSTAR CABLEADO DE PLANTA ELECTRICA	1	$ 1.008.268,91	19	$ 1.008.268,91
100010	SERVICIO SUMINISTRO Y CAMBIO DE CORREA	1	$ 201.680,67	19	$ 201.680,67

Condiciones Comerciales

Tiempo de entrega:	Sujeto a autorización del supervisor
Lugar de servicio	CENTRO DE SERVICIOS LADERA
Cargos a la Venta:	Los suministros adicionales o cambios en los equipos no contemplados en esta cotización, corren por cuenta del cliente
Observación:	N/A

Totales

Valor bruto:	$	1.209.949,58
Descuentos:	$	-
Sub Total	$	1.209.949,58
Iva 19%	$	229.890,42
TOTAL	$	**1.439.840,00**

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Liceth Navarro
Ejecutiva Comercial
3142076154
ventas@comercializadoraromo.com
www.comercializadoraromo.com
