CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4838 - 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 05
PERIODO: DEL 05 DE AGOSTO 2024 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4838 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SUPERVISOR:

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS SOLIDARIOS:



3900 DE 2023 – OAC EL DIAMANTE
4239 DE 2023 – OAC CHONTADURO
3681 DE 2023 – OAC LA CONGA

PERIODO:

DEL 05 DE AGOSTO 2024 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024

FLORENCIA – CAQUETÁ

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO

Tipo de Documento: INFORME TÉCNICO	Contrato: ACEPTACIÓN DE OFERTA 4838 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
Titulo: INFORME MENSUAL No 5. AGOSTO/2024		
Emitido para: Aprobación		
ELABORÓ: Ing. Residente	Firma:	
	Nombre:	Ing. Diego Alejandro Morales Cortes c.c. No. 1.106.713.403 de Ambalema M P No. 161037-0504802 TLM
REVISÓ: Ing. Director	Firma:	
	Nombre:	Ing. Elkin David Ramos Mosquera C. C. No. 7.692.245 de NEIVA M P No. 19202 61820 CAU
APROBÓ: Supervisor	Firma:	
	Nombre:	José Ricardo Burbano Barcenas

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-1*)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 3900 DE 2023
4239 DE 2023
3681 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA EL DIAMANTE
Contratista 2: JAC DE LA VEREDA CHONADURO
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA LA CONGA

Contrato de Interventoría No. 4838 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto De Interventoría:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 5

MES O PERIODO: AGOSTO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	7
	CONTENIDO		14
1	**INTRODUCCIÓN**		18
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		21
2.1	Localización		21
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		28
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		28
2.4	Características técnicas del proyecto		30
3	**INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS**		41
3.1	Información general de convenios solidarios		41
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		53
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		64
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		64
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS**		66
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	66
4.2	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	67
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	67
4.4	Informe Financiero y Presupuestal de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	68
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	68
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	68
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros de los convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	69
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad de convenios solidarios	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	69
4.9	Otros documentos de seguimientos mensual		69
	• Seguimiento a la inversión del desembolso		70
	• Seguimiento programa de obra		70
4.10	• Actas de comité de obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	72
4.11	• Actas de reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	72
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		73
5.1	Información general del contrato		73
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		77
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		78
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	78
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	78
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	78
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	78
6.5	Otros documentos seguimiento mensual		78
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	78
7	**Conclusiones y recomendaciones**		79
8	**Anexos**		80
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		80
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		80
8.3	Copia de la bitácora de obra del mes correspondiente del convenio solidario		80
8.4	Informes semanales		80

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 3900 DE 2023
4239 DE 2023
3681 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA EL DIAMANTE
Contratista 2: JAC DE LA VEREDA CHONADURO
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA LA CONGA

Contrato de Interventoría No. 4838 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto De Interventoría:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 5

MES O PERIODO: AGOSTO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
8.5	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios		80
8.6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios		81
8.7	Informe Financiero y presupuestal de convenios solidarios		81
8.8	Estado general del tiempo		81
8.9	Resumen ensayos de laboratorio		81
8.10	Seguimiento garantías y seguros de los convenios solidarios		81
8.11	Plan de inversión de desembolso de los convenios solidarios		82
8.12	Informe de inversión y buen manejo de desembolso de los convenios solidarios		82
8.13	Seguimiento programa de obra		82
8.14	Actas de comité de obra		82
8.15	Equipo y vehículos contrato de interventoría		82
8.16	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social contrato de interventoría		82
8.17	Informe Financiero y presupuestal de contrato de interventoría		82
8.18	Seguimiento garantías y seguros de los contrato de interventoría		82
8.19	Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado		83

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3230 de fecha 15/09/2023.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-2*)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 1/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3900 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE SPETIEMBRE DE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.042.125,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.042.125,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	96
Estructuras (Obras de drenaje)	Alcantarilla de 36"	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	-	-
Estructuras (Obras de drenaje)	Alcantarilla de 36"	Und	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.346.311,00	-	############
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	-	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.155.425,00	-	$ 44.155.425,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.540.389,00	-	$ 4.540.389,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.042.125,00	-	############

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 52.121.531,00	-	$ 52.121.531,00	$ 52.121.531,00
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	$ 52.121.531,00	-	$ 52.121.531,00	$ 52.121.531,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200.042.125,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -47,23%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3900 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 201.042.125,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 201.042.125,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SPETIEMBRE DE 2024	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADA DE 36!



FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LOSA DE SOLERA DEL DESCOLE DE ALCANTARILLA



DESCOLE DE ALCANTARILLA (MURO CABEZAL, ALETAS Y LOSA DE SOLERA)



CAJA POCETA DE ENCOLE DE ALCANTARILA

MATERIALES DE FERRETERÍA

MATERIALES PÉTROS Y DESCARGUE DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 36"

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4239 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.062.799,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.062.799,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	93
Estructuras (Obras de drenaje)	Alcantarilla de 36"	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	-	-
Estructuras (Obras de drenaje)	Alcantarilla de 36"	Und	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.399.186	-	$ 150.399.186
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	-	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.151.637	-	$ 44.151.637
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.511.976	-	$ 4.511.976
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.062.799	-	$ 199.062.799

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 54.094.973,00	-	$ 54.094.973,00	$ 54.094.973,00
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	$ 54.094.973,00	-	$ 54.094.973,00	$ 54.094.973,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.062.799,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -49,275%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4239 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 199.062.799,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 199.062.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 36" CON ATRAQUE



PLACA SOLERA CON LAS ALETAS DEL DESCOLE DE ALCANTARILLA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA



PLACA SOLERA CON ALETAS DEL ENCOLE DE ALCANTARILLA



INSTALACIÓN DE SUB BASE PARA EL TRAMO DE PLACA HUELLA DE 93 ML

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA E INSTALACIÓN DE SUB BASE PARA EL TRAMO DE PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 4/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3681 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CONGA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	111
Estructuras (Obras de drenaje)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	-	-
Estructuras (Obras de drenaje)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.372.854	-	$ 149.372.854
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	-	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531	-	$ 44.147.531
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.481.186	-	$ 4.481.186
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.001.571	-	$ 198.001.571

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 41.507.906,00	-	$ 41.507.906,00	41.507.906,00
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	$ 41.507.906,00	-	$ 41.507.906,00	41.507.906,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 198.001.571,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -34,647%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **4**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 4

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3681 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CONGA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 198.001.571,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 198.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LA VIGA RIOSTA DE LA PLACA HUELLA



CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA EL BORDILLO DE LA PLACA HUELLA

ACERO DE REFUERZO PARA EL TRAMO DE PLACA HUELLA



EXTENDIDO DE MATERIAL SUB BASE CON MAQUINA MOTO NIVELADORA PARA EL TRAMO DE PLACA HUELLA DE LOS 111 ML



COMPACTACIÓN DE SUB BASE CON EQUIPO VIBRO COMPACTADOR DE RODILLO

INSTALACIÓN DE SUB BASE PARA EL TRAMO DE PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 18
ANTECEDENTES 20
FINALIDAD DEL PROYECTO 20
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 21
2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 21
2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS 22
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 28
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 28
A) CONVENIO SOLIDARIO No 3900 de 2023 – EL DIAMANTE 28
B) CONVENIO SOLIDARIO No 4239 de 2023 – CHONTADURO 29
C) CONVENIO SOLIDARIO No 3681 de 2023 – LA CONGA 30
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS 30
3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS 41
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 41
➢ CONVENIO SOLIDARIO No. 3900 DE 2023 41
➢ CONVENIO SOLIDARIO No. 4239 DE 2023 45
➢ CONVENIO SOLIDARIO No. 3681 DE 2023 50
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 53
3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS 64
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 64
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 66
4.1. INFORME SEMANAL 66
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS 67
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS 67
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 68
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 68
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 68
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS 69
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS 69
4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL 69
➢ SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO 70
➢ SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 70
4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 72
4.11. ACTAS DE REUNIÓN 72

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 73
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 73
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 77
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 78
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 78
6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 78
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA 78
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 78
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 78
- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 78**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 79
8. ANEXOS 80
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 80
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 80
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO 80
8.4. INFORMES SEMANALES 80
8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS 80
8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda El Diamante – CS#3900 80
8.5.2. Maquinaria y equipo de la Vereda Chontaduro – CS#4239 80
8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda La Conga – CS#3681 80
8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 81
8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda El Diamante – CS#3900 81
8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Chontaduro – CS#4239 81
8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Conga – CS#3681 81
8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 81
8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda El Diamante – CS#3900 81

8.7.2. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Chontaduro – CS#4239 ..... **81**
8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Conga – CS#3681 ..... **81**
8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **81**
8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda El Diamante – CS#3900 ..... **81**
8.8.2. Estado general del tiempo climático de la Vereda Chontaduro – CS#4239 ..... **81**
8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda La Conga – CS#3681 ..... **81**
8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO **81**
8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda El Diamante – CS#3900 ..... **81**
8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Chontaduro – CS#4239 ..... **81**
8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Conga – CS#3681 ..... **81**
8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **81**
8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda El Diamante – CS#3900 ..... **81**
8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Chontaduro – CS#4239 ..... **81**
8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Conga – CS#3681 ..... **81**
8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **82**
8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda El Diamante – CS#3900 ..... **82**
8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Chontaduro – CS#4239 ..... **82**
8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Conga – CS#3681 ..... **82**
8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **82**
8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda El Diamante – CS#3900 ..... **82**
8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Chontaduro – CS#4239 ..... **82**

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Conga – CS#3681 ..... **82**
8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA **82**
8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda El Diamante – CS#3900 ..... **82**
8.13.2. Seguimiento programa de obra de la Vereda Chontaduro – CS#4239 ..... **82**
8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda La Conga – CS#3681 ..... **82**
8.14. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA **82**
8.14.1. Actas de comité de obra de la Vereda El Diamante – CS#3900 ..... **82**
8.14.2. Actas de comité de obra de la Vereda Chontaduro – CS#4239 ..... **82**
8.14.3. Actas de comité de obra de la Vereda La Conga – CS#3681 ..... **82**
8.15. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA **82**
8.16. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **82**
8.17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **82**
8.18. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **82**
8.19. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO. **83**

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

El presente informe **MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 5** a consideración del **INVIAS,** correspondiente al periodo comprendido entre el **05 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3900 de 2023**; tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.", encabezada por el señor FERNANDO VALENCIA GALINDO de la JAC DE LA VEREDA EL DIAMANTE, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4239 de 2023**; tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.", encabezada por el señor JOSE LIZARDO PARRA de la JAC DE LA VEREDA CHONTADURO, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3681 de 2023**; tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.", encabezada por el señor OSCAR DANIEL ECHEVERRY de la JAC DE LA VEREDA LA CONGA, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

ANTECEDENTES

La economía de los municipios de Florencia y Paujil, en el departamento del Caquetá, está basada principalmente en la ganadería, ocupando un área de productividad de 2.409.028 hectáreas de pasto para un lote de 1.180.470 cabezas de ganado. A sí mismo, la agricultura, aprovechamientos forestales, piscicultura, cría de especies menores, pesca y minería.

Debido al aumento del número de fincas y de la densidad poblacional de las veredas, las trochas son intervenidas con maquinaria pesada para mejorarlas y, así facilitar el transporte de los lugareños. Las vías adecuadas también son utilizadas para movilizar ganado, una de las principales actividades económicas de la región.

A los municipios de Florencia y Paujil se accede por la ruta troncal del llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por las empresas coomotor, taxis verdes, velotax, entre otros. Además, cuenta con otro acceso vial por Villavicencio en el vecino departamento del Meta por el norte, al este con Mitú y al sur con Leticia Amazonas.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El Departamento del Caquetá es uno de los 32 departamentos que conforman a Colombia, se encuentra ubicado al sur - oriente del país haciendo parte de la región Amazónica. Cuenta con una superficie de 88.965 Km², lo que representa el 7.79% del territorio nacional ocupando el tercer puesto de los departamentos más extensos y su capital es la ciudad de Florencia, el departamento está dividido política y administrativamente en 16 municipios, dos de ellos son los municipios de Florencia y el Paujil en donde se ejecutarán las obras viales tipo terciarias.

Para el caso del municipio de Florencia se encuentra localizada en la zona de piedemonte entre la Cordillera Oriental y la Amazonia, en la margen derecha del río Hacha, lo cual le da una posición privilegiada ambientalmente al ser el enlace entre la Región Andina y la Región Amazónica. Se encuentra a 519 km de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Cuenta con 163323 habitantes de acuerdo con la proyección del DANE para 2012. Su extensión territorial es de 2292 km², su altitud media es de 242 m s. n. m., su precipitación media anual es de 3840 mm y su temperatura promedio es de 25 °C. Está constituida por cuatro comunas en su área urbana y siete corregimientos en su área rural.

En cuanto al municipio de Paujil se encuentra ubicado al nororiente del departamento del Caquetá y su cabecera municipal está a una distancia de 48 kilómetros de Florencia por la carretera Marginal de la Selva que conecta 9 de los 16 municipios del departamento. El Paujil limita con al norte con el departamento del Huila, al oriente con el municipio de El Doncello, al sur con los municipios de Cartagena del Chaira y La Montañita y al occidente con el municipio de La Montañita. El municipio forma parte de la zona denominada andino–amazónica de la subregión noroccidental de la Amazonia Página 3 de 17 colombiana y pertenece a las cuencas de los ríos Orteguaza y Caguán, que tributan al río Caquetá uno de los principales afluentes del gran río Amazonas. Esta posición geográfica en la región andino-amazónica le confiere grandes oportunidades y ventajas comparativas con otras zonas de la región, por aspectos como la biodiversidad, servicios ecosistémicos, y recursos paisajísticos, edáficos, hídricos y ecológicos, los cuales se distribuyen en varios pisos bioclimáticos.
Por tanto, en el municipio de Florencia se ejecutarán dos obras en la vereda Chontaduro y el Diamante; en cuanto al municipio de el Paujil se ejecutará una en la vereda la Conga.

2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS



Ilustración 1. *Localización del municipio de Florencia en el departamento del Caquetá.*

- *VEREDA EL DIAMANTE (CS # 3900 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Florencia del departamento del Caquetá, en la Vereda El Diamante, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código:1800, en el acceso a la Vereda Diamante en Km 30+000 de la vía – Filo Chontaduro –Florencia código: 180009, con coordenadas iniciales 1,74361 N; -75,52417 W, y punto final de coordenadas 1,74500 N; - 75,52472 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante los siguientes links "Google Earth y Bing maps".

https://earth.google.com/earth/d/1L92uUuwElFoPhAeoVeslUUmEXaVZfTEh?usp=sharing

https://www.bing.com/maps?osid=c27e6dbd-c9b9-4700-8401-2f97af901eeb&cp=1.744416~-75.525405&lvl=18&style=h&pi=0&v=2&sV=2&form=S00027

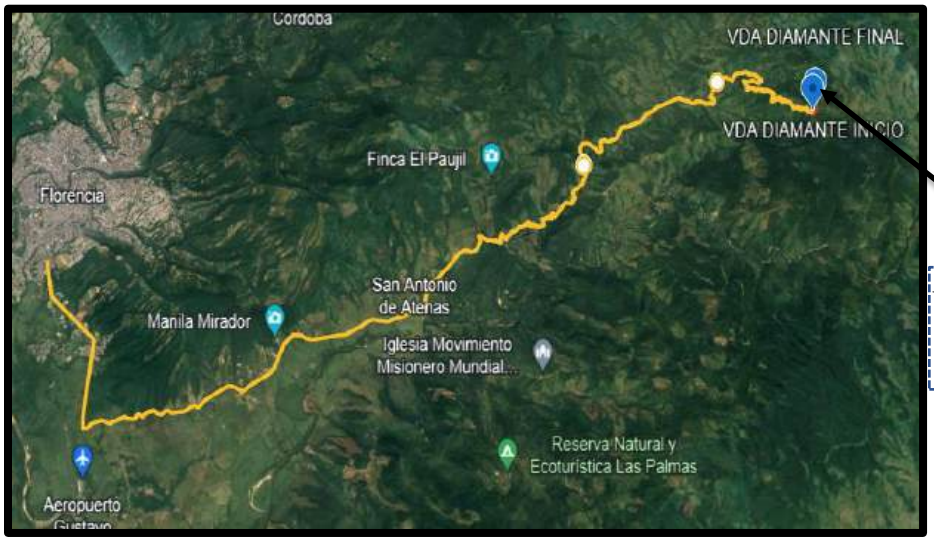


Ilustración 2 *Ubicación del proyecto en la Vereda El Diamante.*



Ilustración 3 *Tramo de placa huella y alcantarilla a intervenir en la Vereda El Diamante.*

- *VEREDA CHONTADURO (CS # 4239 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Florencia del departamento del Caquetá, en la Vereda Chontaduro, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código:1800, en el acceso a la Vereda el Chontaduro en Km 30+000 de la vía – Bodega el Chontaduro – Florencia código: 180009, con coordenadas iniciales 1,76319 N; -75,51171 W y punto final de coordenadas 1,76482 N;-75,51166 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth" y "Bing Mapas".

https://earth.google.com/earth/d/1BYUFV3Zg9r-OKS0_ebhVb47LpYkf4h1k?usp=sharing

https://www.bing.com/maps?osid=b99787f9-1e29-4544-803c-552b696fb425&cp=1.763944~-75.512246&lvl=18&style=h&pi=0&v=2&sV=2&form=S00027

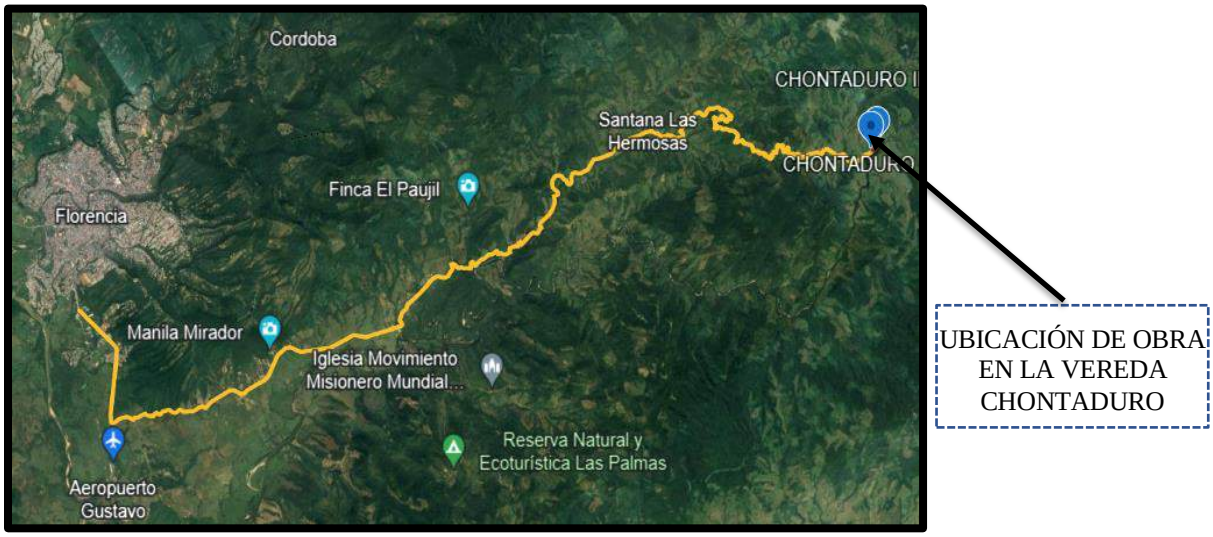


Ilustración 4. *Ubicación del proyecto en la Vereda Chontaduro.*



Ilustración 5. *Tramo de placa huella y alcantarilla a intervenir en la Vereda Chontaduro.*

- *VEREDA LA CONGA (CS # 3681 - 2023)*

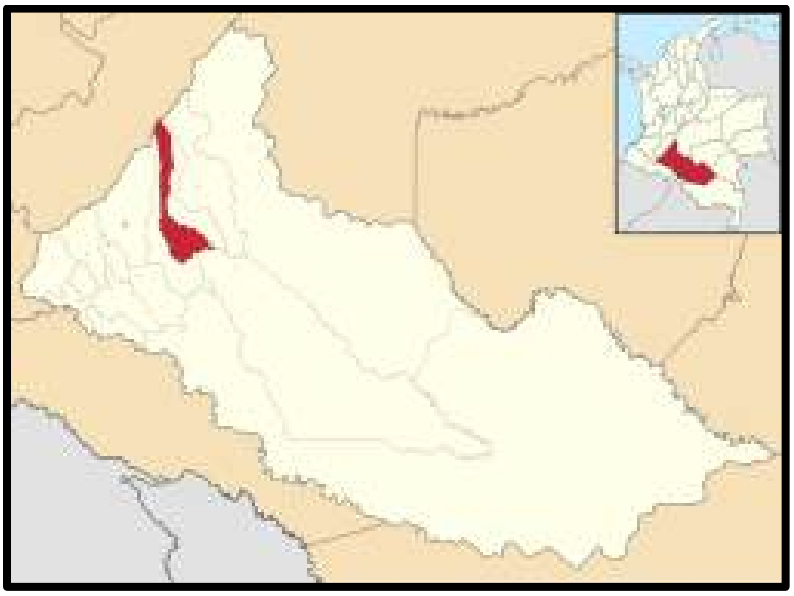


Ilustración 6 *Localización municipio de El Paujil en el departamento del Caquetá.*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Florencia del departamento del Caquetá, en la Vereda La Conga, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la vereda La Conga en Km 50+000 de la vía – Florencia – Paujil código: 181030, con coordenadas iniciales 1,54000 N; - 75,35278 W, y punto final de coordenadas 1,52944 N; - 75,33972 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth".

https://earth.google.com/earth/d/1fQXKraW3Ga0Q3k1x5rRwbh47IomoxR82?usp=sharing

https://www.bing.com/maps?osid=628fac0d-9c81-4d83-a43c-0ea75ceae1bf&cp=1.533954~-75.350032&lvl=15&style=h&pi=0&v=2&sV=2&form=S00027



Ilustración 7 *Ubicación del proyecto en la Vereda La Conga.*

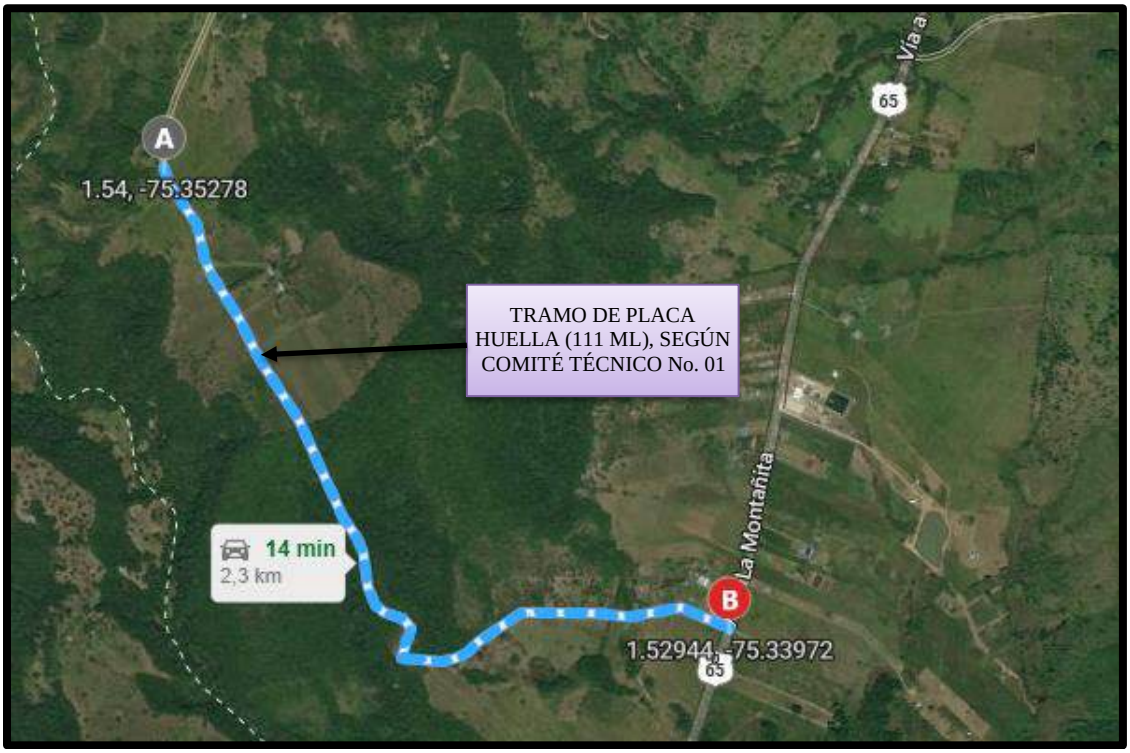


Ilustración 8 Tramo de placa huella de intervención en la Vereda La Conga

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a El Diamante y Chontaduro del municipio de FLORENCIA y La Conga del municipio de El PAUJIL, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos. Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía terciaría, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A) CONVENIO SOLIDARIO No 3900 de 2023 – EL DIAMANTE

- INVENTARIO

En el tramo de intervención, solo se evidenció en sitio de obra, dos alcantarillas en concreto reforzado requieren mantenimiento, limpieza y una alcantarilla en mal estado. Las tres cuentan con caja poceta y aletas para el descole.

Tabla 1. *Inventario en tramo de intervención – Vereda El Diamante.*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Mantenimiento y Limpieza	2
Alcantarilla en concreto reforzado	Deteriorado	1

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda El Diamante, teniendo en cuenta las coordenadas 1,74361 N; -75,52417 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie o rodadura del terreno presenta hundimientos puntuales a lo largo del tramo establecido, a causa del tránsito de caballos, medio que se utiliza como transporte hacia la escuela, dado que en el momento que se presentan lluvias es imposible transitarse en vehículos (moto o carro).
- Se evidencia surcos que se ha generado por de épocas de lluvias mediante proceso de arrastre o por erosión de material limoso, llegando con el tiempo más hundimiento del terreno natural.
- No se cuenta con cunetas en material de concreto reforzado
- No se evidencia material granular (mixto) sobre la capa de rodadura o terreno natural.

B) CONVENIO SOLIDARIO No 4239 de 2023 – CHONTADURO

- INVENTARIO

En el tramo de intervención, se evidenció en sitio de obra, dos alcantarillas en concreto reforzado, una requiere mantenimiento y la otra alcantarilla se encuentra en mal estado.

Tabla 2. *Inventario en tramo de intervención – Vereda Chontaduro.*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Mantenimiento y Limpieza	1
Alcantarilla en concreto reforzado	Deteriorado	1

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda Chontaduro, teniendo en cuenta las coordenadas 1,76319 N; -75,51171 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie o rodadura del terreno presenta hundimientos puntuales a lo largo del tramo establecido, a causa del tránsito de caballos, medio que se utiliza como transporte hacia la escuela, dado que en el momento que se presentan lluvias es imposible transitarse en vehículos (moto o carro).
- Se evidencia surcos que se ha generado por de épocas de lluvias mediante proceso de arrastre o por erosión de material limoso, llegando con el tiempo más hundimiento del terreno natural.

- No se cuenta con cunetas en material de concreto reforzado

No se evidencia material granular (mixto) sobre la capa de rodadura o terreno natural

C) CONVENIO SOLIDARIO No 3681 de 2023 – LA CONGA

- INVENTARIO

No se evidenciaron obras donde se va a realizar la obra.

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda La Conga, teniendo en cuenta las coordenadas 1,54000 N; -75,35278 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie o rodadura del terreno presenta hundimientos puntuales a lo largo del tramo establecido, a causa del tránsito de caballos, medio que se utiliza como transporte hacia la escuela, dado que en el momento que se presentan lluvias es imposible transitarse en vehículos (moto o carro).
- Se evidencia surcos que se ha generado por de épocas de lluvias mediante proceso de arrastre o por erosión de material limoso, llegando con el tiempo más hundimiento del terreno natural.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos consisten en realizar la revisión e implementación del contenido de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje o placa huella en los sectores priorizados. Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución de las obras deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas del INVIAS, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

Las obras que se van a ejecutar, deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de

las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.

A continuación, se describe el alcance y las actividades técnicas a ejecutar de cada uno de los proyectos ubicados en las veredas de El Diamante, Chontaduro y La Conga, de los cuales fueron avalados por esta interventoría como se evidencia en el comité técnico de obra No. 01 desarrollados en cada una de las juntas de acción comunal:


- **JAC EL DIAMANTE** (CS#3900 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda El Diamante tiene como alcance la construcción de 96 metros lineales de placa huella, una alcantarilla y limpieza de alcantarilla.


CONVENIO SOLIDARIO No. 3900 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	96 ML DE PLACA HUELLA, LA CONTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA Y LA LIMPIEZA DE 1 ALCANTARILLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	**PLACA HUELLA**
	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) Acero de refuerzo de 60.000 psi
	ALCANTARILLA
	- Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras


	- Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior


ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

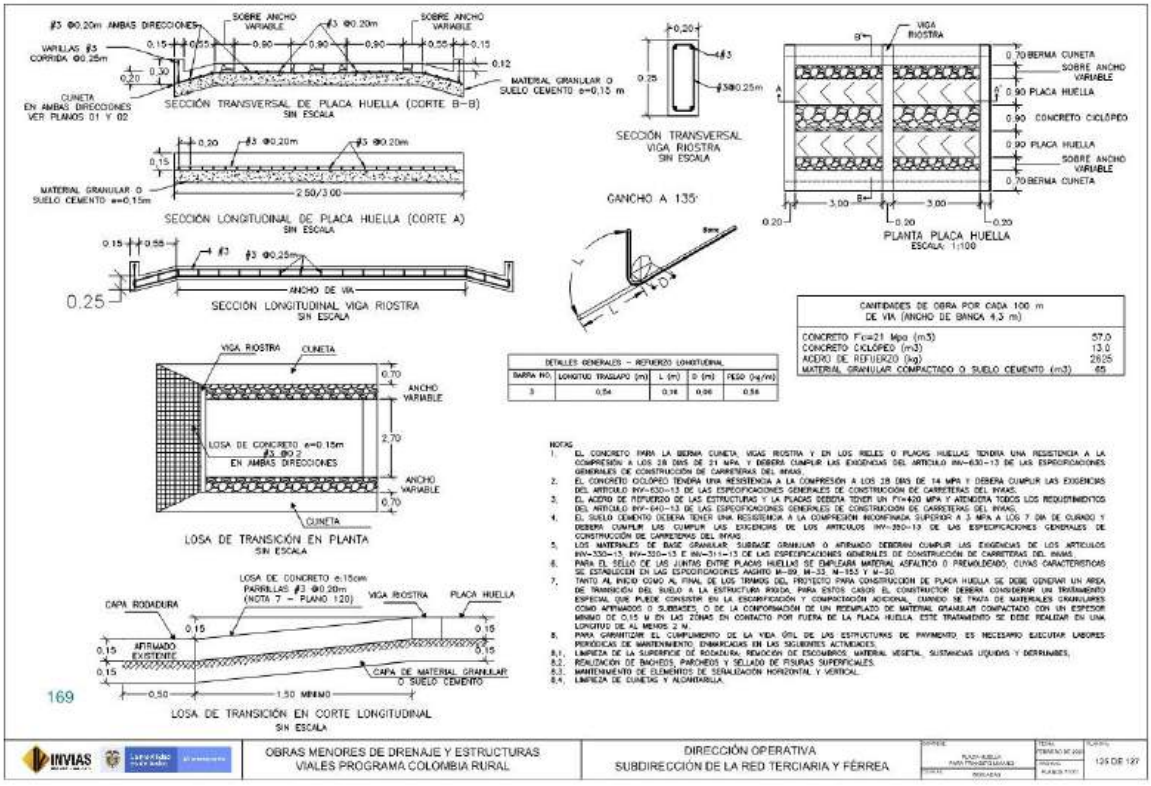

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

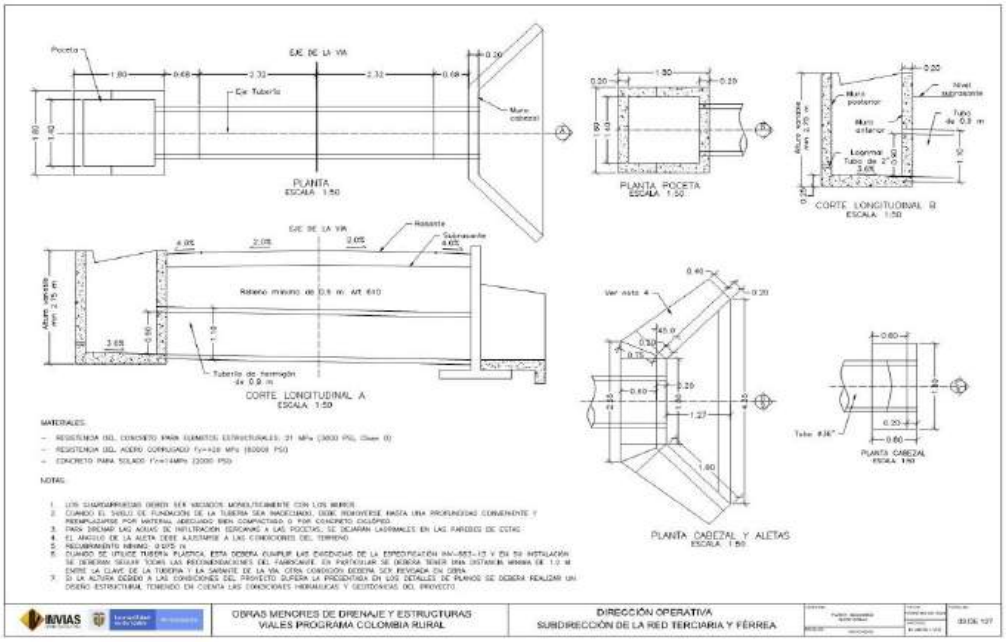

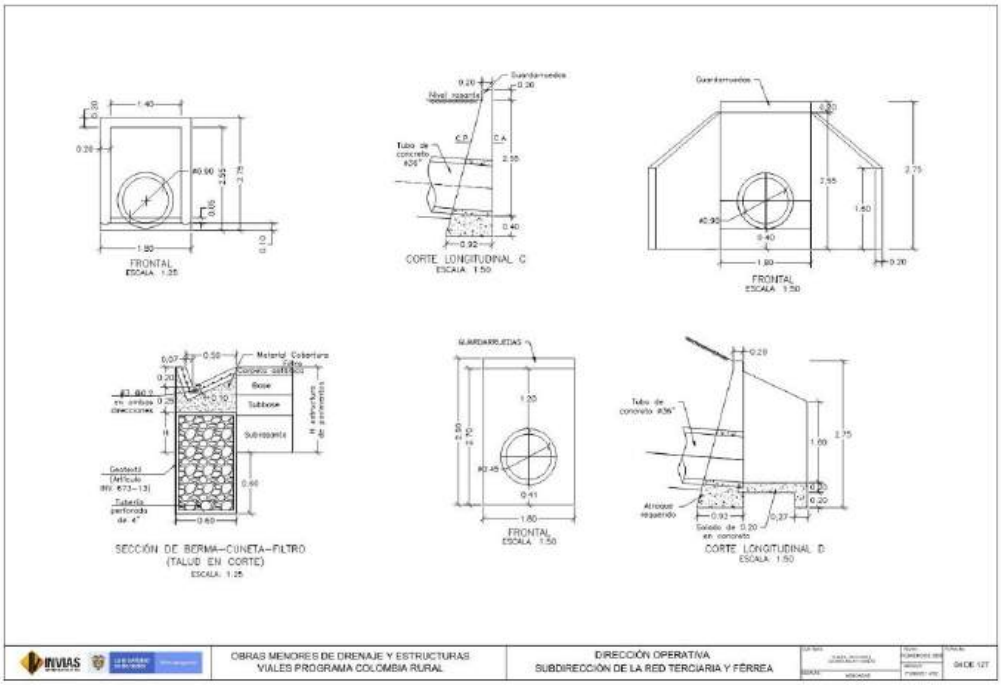

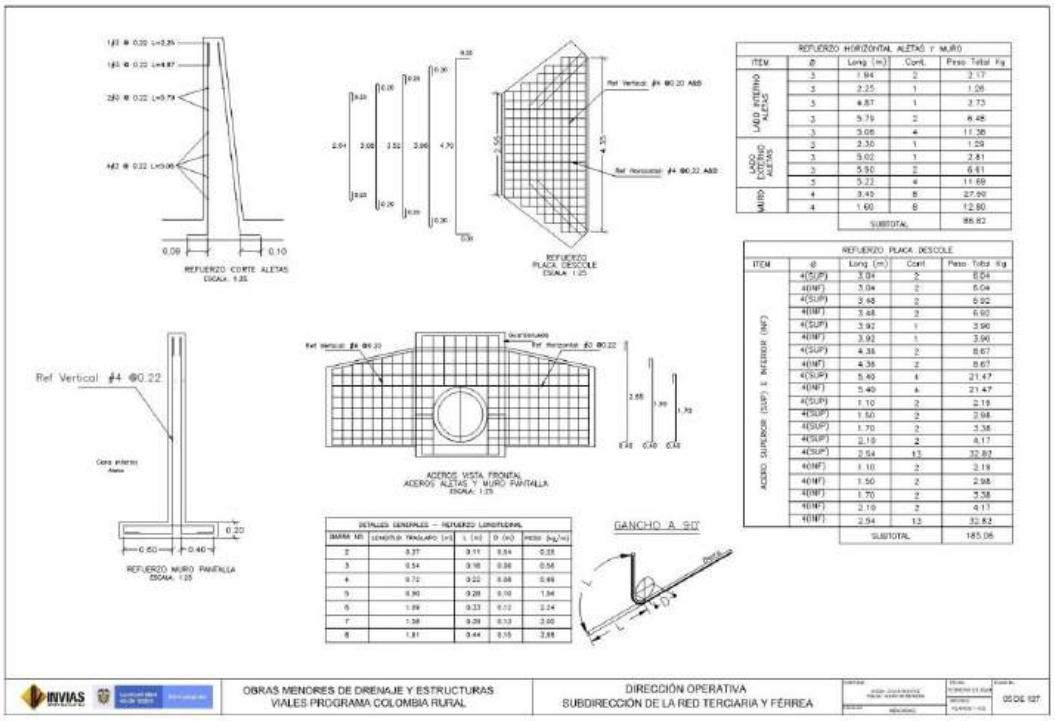

REFUERZO HORIZONTAL ALETAS Y MURO


ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS	3	1.94	2	2.17
	3	2.25	1	1.26
	3	4.87	1	2.73
	3	5.79	2	6.48
	3	3.05	4	11.36
LADO EXTERNO ALETAS	3	2.30	1	1.29
	3	5.02	1	2.81
	3	5.90	2	6.61
MURO	3	5.23	4	11.69
	4	3.43	8	27.00
	4	1.60	8	12.80
		SUBTOTAL		88.82

REFUERZO PLACA DESCOLE

ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF)	4(SUP)	3.04	2	6.04
	4(INF)	3.04	2	6.04
	4(SUP)	3.48	2	6.92
	4(INF)	3.48	2	6.92
	4(SUP)	3.92	1	3.90
	4(INF)	3.92	1	3.90
	4(SUP)	4.36	2	8.67
	4(INF)	4.36	2	8.67
	4(SUP)	5.40	4	21.47
	4(INF)	5.40	4	21.47
	4(SUP)	1.10	2	2.19
	4(SUP)	1.50	2	2.98
	4(SUP)	1.70	2	3.38
	4(SUP)	2.10	2	4.17
	4(SUP)	2.54	13	32.82
	4(INF)	1.10	2	2.19
	4(INF)	1.50	2	2.98
	4(INF)	1.70	2	3.38
	4(INF)	2.10	2	4.17
	4(INF)	2.54	13	32.82
		SUBTOTAL		185.06

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL

BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	3.11	0.64	0.25
3	0.54	3.18	0.86	0.56
4	0.72	3.22	0.88	0.99
5	0.90	3.28	0.90	1.56
6	1.09	3.33	0.92	2.24
7	1.26	3.39	0.93	3.05
8	1.81	3.44	0.95	3.98

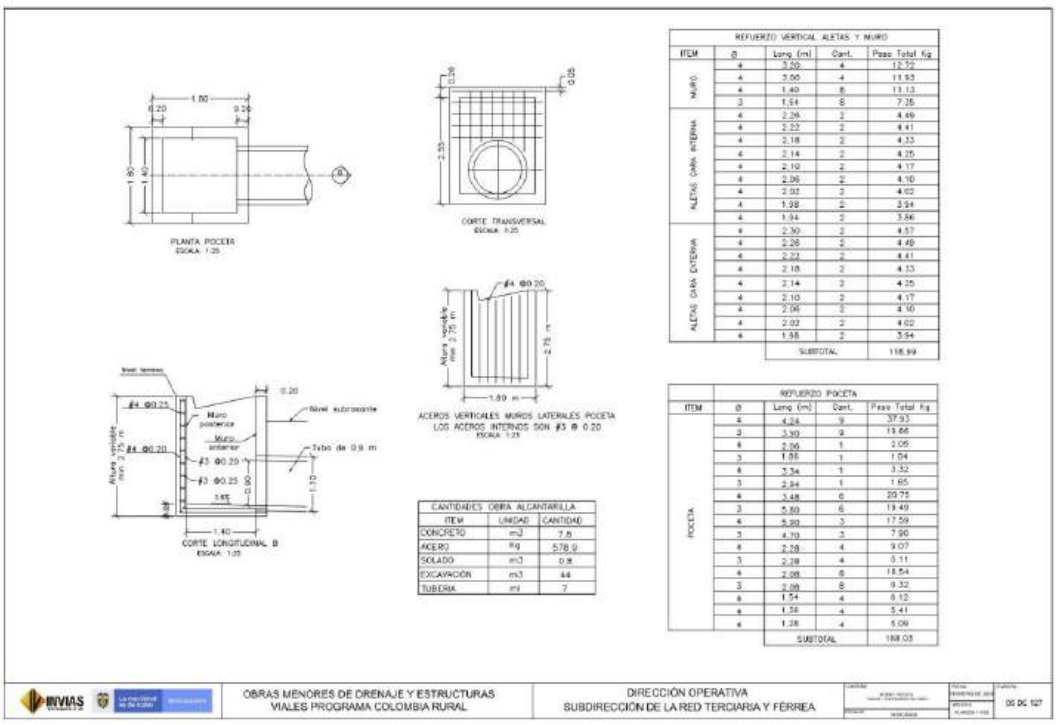

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO

ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
MURO	4	3.20	4	12.72
	4	3.00	4	11.93
	4	1.40	8	11.13
	3	1.64	8	7.26
ALETAS CARA INTERNA	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
	4	1.94	2	3.86
ALETAS CARA EXTERNA	4	2.30	2	4.57
	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
		SUBTOTAL		118.99

REFUERZO POCETA

ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.93
	2	3.90	9	19.66
	4	2.06	1	2.05
	3	1.86	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.65
	4	3.48	6	20.75
	3	5.80	6	19.49
	4	5.30	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.38	4	9.07
	3	2.38	4	5.11
	4	2.98	6	16.54
	3	2.98	6	9.32
	4	1.74	4	6.12
	4	1.38	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
		SUBTOTAL		188.05

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA


ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.5
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.9
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERÍA	ml	7

- **JAC CHONTADURO** (CS#4239 DE 2023)


La junta de acción comunal de la vereda Chontaduro tiene como alcance la construcción de 93 metros lineales de placa huella, una alcantarilla y limpieza de una alcantarilla.


CONVENIO SOLIDARIO No. 4239 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	93 ML DE PLACA HUELLA, LA CONTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA Y LA LIMPIEZA DE 1 ALCANTARILLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	**PLACA HUELLA**
	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) Acero de refuerzo de 60.000 psi
	ALCANTARILLA
	- Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras - Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior


ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

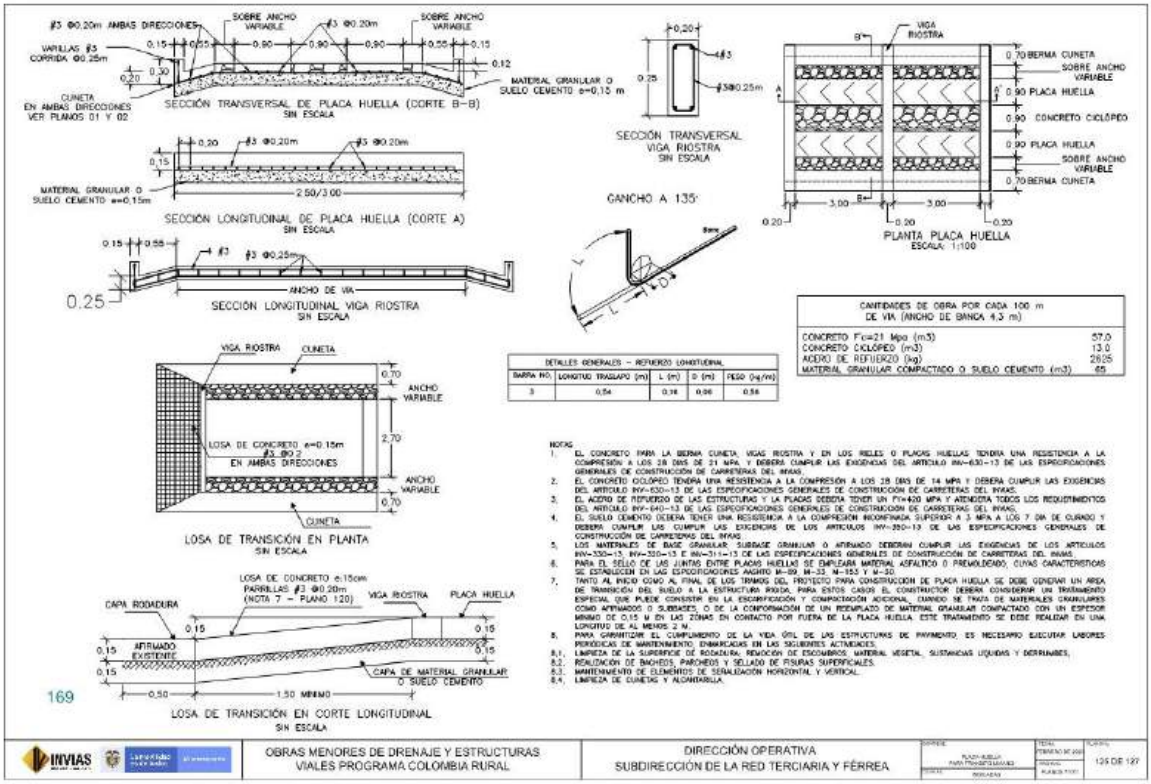

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

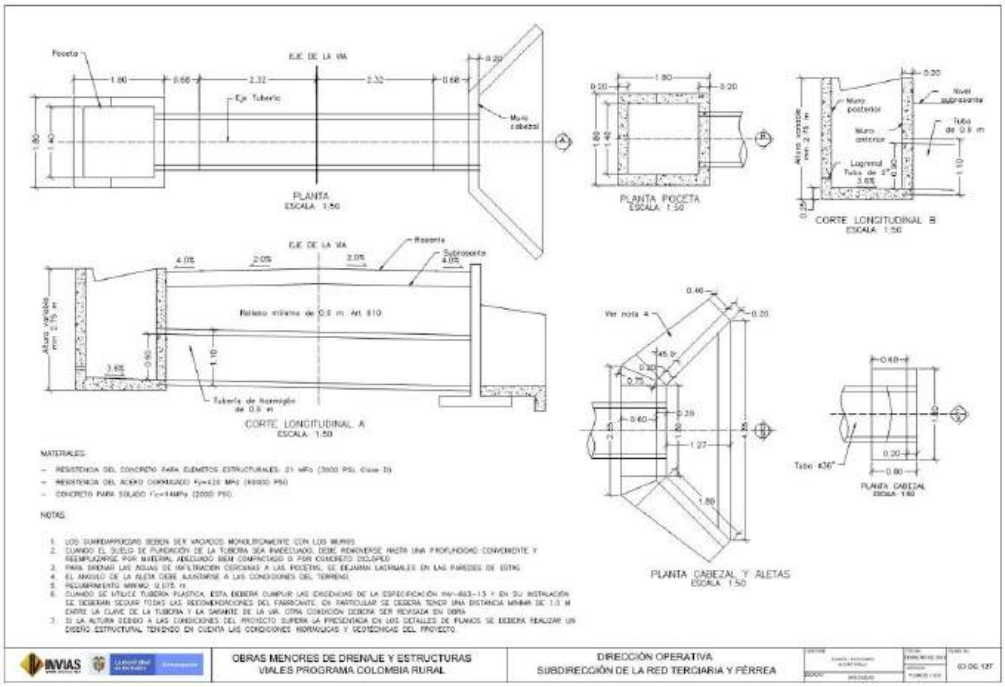

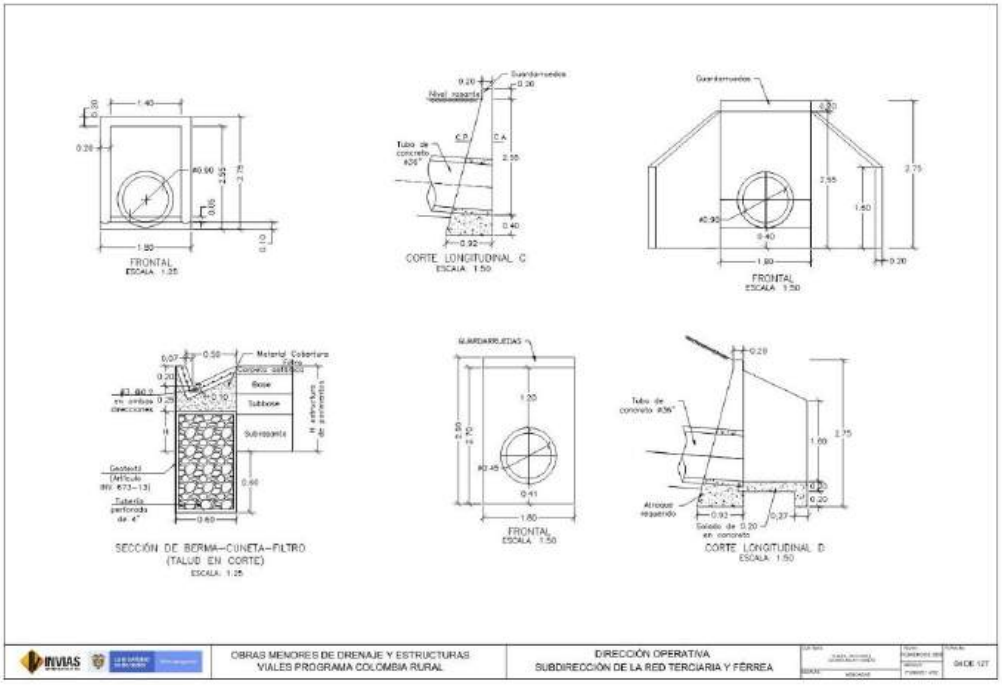

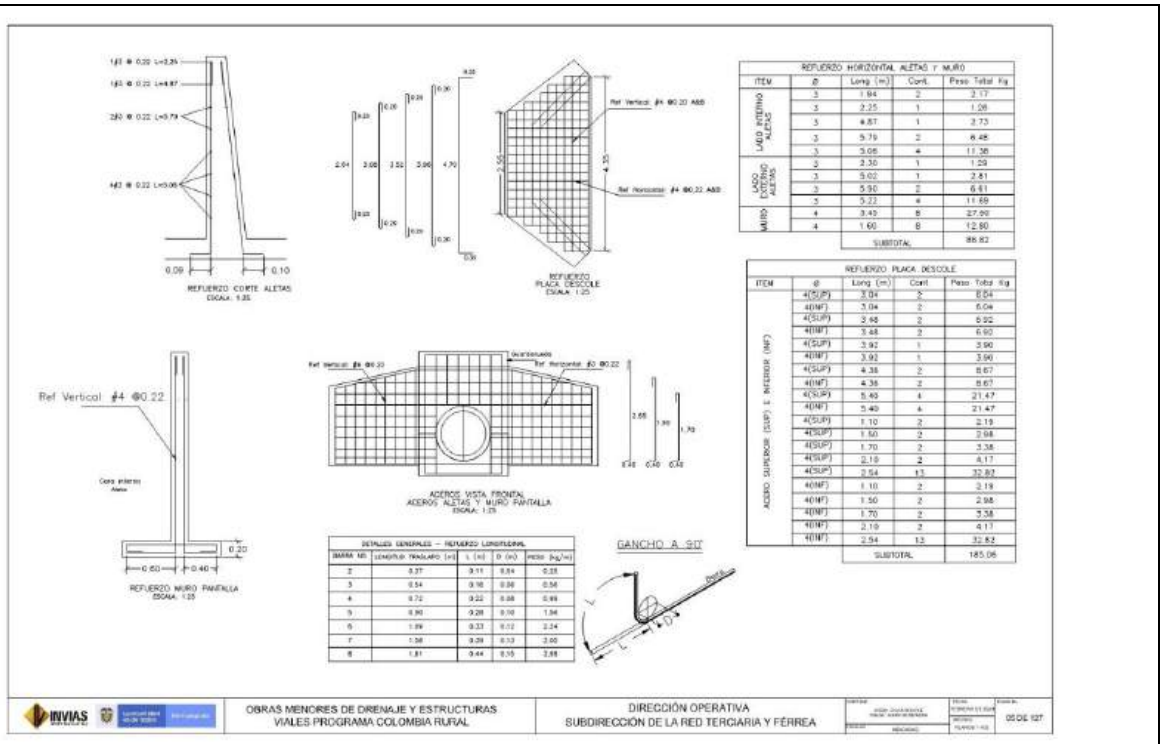

REFUERZO HORIZONTAL ALETAS Y MURO


ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS	3	1.94	2	2.17
	3	2.25	1	1.26
	3	4.87	1	2.73
	3	5.79	2	6.48
	3	3.05	4	11.36
LADO EXTERNO ALETAS	3	2.30	1	1.29
	3	5.02	1	2.81
	3	5.90	2	6.61
MURO	3	5.23	4	11.69
	4	3.43	8	27.00
	4	1.60	8	12.80
		SUBTOTAL		88.82

REFUERZO PLACA DESCOLE

ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF)	4(SUP)	3.04	2	6.04
	4(INF)	3.04	2	6.04
	4(SUP)	3.48	2	6.92
	4(INF)	3.48	2	6.90
	4(SUP)	3.92	1	3.90
	4(INF)	3.92	1	3.90
	4(SUP)	4.36	2	8.67
	4(INF)	4.36	2	8.67
	4(SUP)	5.40	4	21.47
	4(INF)	5.40	4	21.47
	4(SUP)	1.10	2	2.19
	4(SUP)	1.50	2	2.98
	4(SUP)	1.70	2	3.38
	4(SUP)	2.10	2	4.17
	4(SUP)	2.54	13	32.82
	4(INF)	1.10	2	2.19
	4(INF)	1.50	2	2.98
	4(INF)	1.70	2	3.38
	4(INF)	2.10	2	4.17
	4(INF)	2.54	13	32.82
		SUBTOTAL		185.06

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL

BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	3.11	0.54	0.25
3	0.54	3.18	0.56	0.56
4	0.72	3.22	0.58	0.99
5	0.90	3.26	0.60	1.54
6	1.09	3.33	0.62	2.24
7	1.28	3.39	0.63	3.05
8	1.81	3.44	0.65	3.88

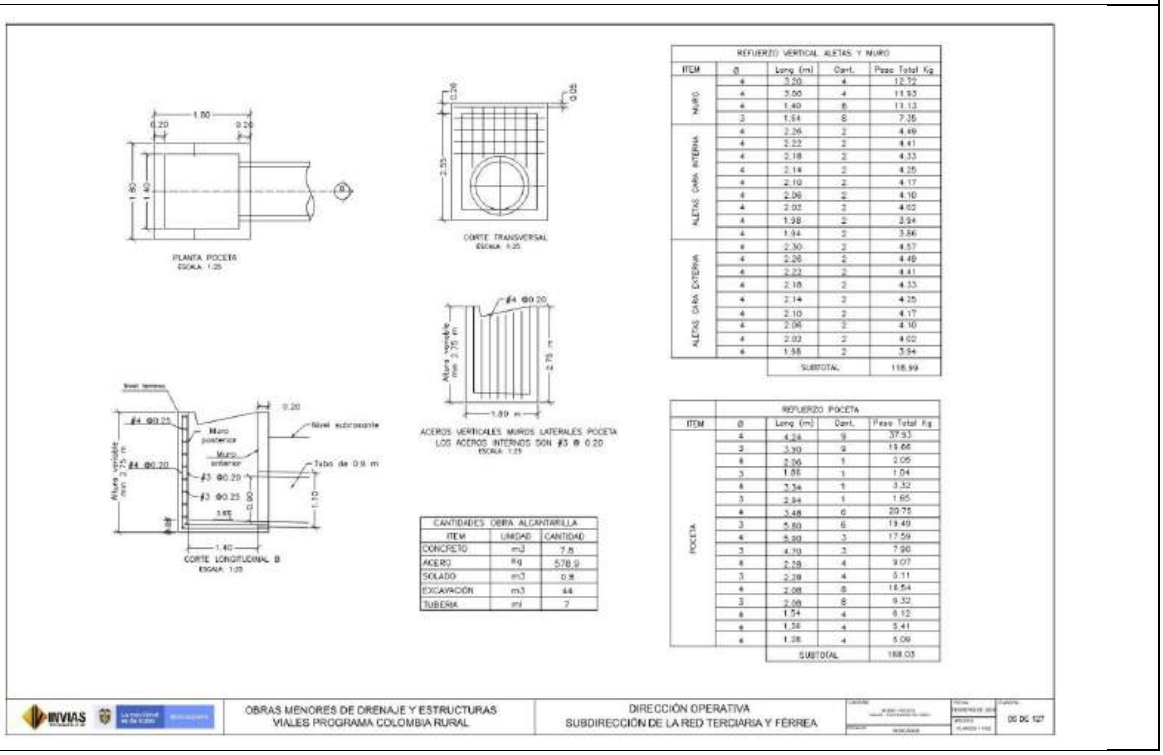

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO

ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
MURO	4	3.20	4	12.72
	4	3.00	4	11.93
	4	1.40	8	11.13
	3	1.64	8	7.26
ALETAS CARA INTERNA	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
	4	1.94	2	3.86
ALETAS CARA EXTERNA	4	2.30	2	4.57
	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
		SUBTOTAL		118.99

REFUERZO POCETA

ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.93
	2	3.90	9	19.66
	4	2.06	1	2.05
	3	1.86	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.65
	4	3.48	6	20.75
	3	5.80	6	19.49
	4	5.30	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.38	4	9.07
	3	2.38	4	5.11
	4	2.98	8	18.54
	3	2.98	8	9.32
	4	1.54	4	6.12
	4	1.36	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
		SUBTOTAL		188.05

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA


ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.5
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.9
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERÍA	ml	7

- **JAC LA CONGA** (CS#3681 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda de La Conga tiene como alcance la construcción de 111 metros lineales de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3681 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	111 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	**PLACA HUELLA** - Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

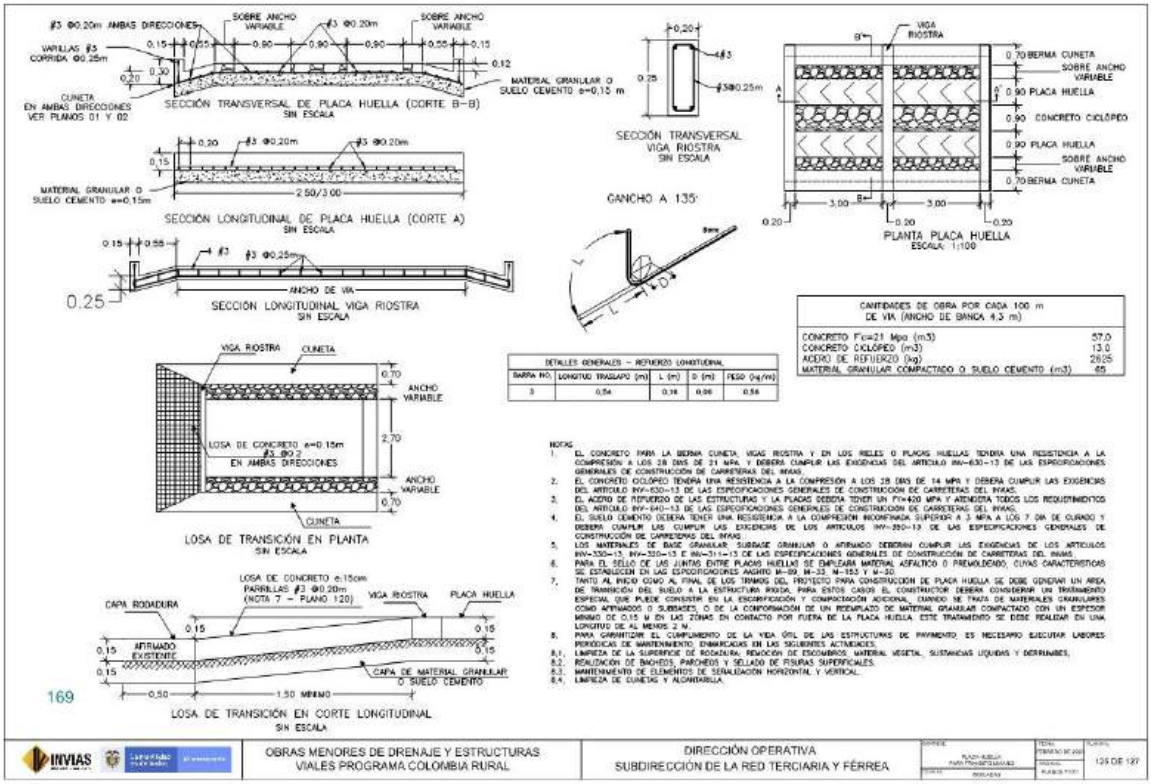

3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3900 DE 2023**

El presente convenio solidario No. 3900 – 2023 se suscribió el día 29 de octubre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *FERNANDO VALENCIA GALINDO* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE**, por un valor del convenio de DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (**$201.042.125**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de DOSCIENTOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (**$200.042.125**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente

CONVENIO SOLIDARIO No.	3900-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE
NIT:	900.116.461-6
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO VALENCIA GALINDO
IDENTIFICACIÓN:	17.690.621 EL DONCELLO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.042.125 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 200.042.125 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	12 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 3900-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio"*, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 20 de junio de 2024 un alcance físico de 96 mL de placa huella, la construcción de una alcantarilla y tres alcantarillas para limpieza. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETÁ	FLORENCIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE	96,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	6,00	$ 66.271,00	$ 397.626,00
							SUB-TOTAL	**$ 397.626,00**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 183.443,00	$ 183.443,00
							SUB-TOTAL	**$ 183.443,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,160	$ 28.211,00	$ 89.147,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	95,040	$ 240.435,00	$ 22.850.942,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	58,350	$ 1.070.351,00	$ 62.454.981,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	24,790	$ 382.691,00	$ 9.486.910,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.806,060	$ 9.484,00	$ 26.612.673,00
							SUB-TOTAL	**$ 121.494.653,00**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETÁ	FLORENCIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE	96,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	54,200	$ 28.211,00	$ 1.529.036,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0,100	$ 58.057,00	$ 5.806,00
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3	3,580	$ 151.900,00	$ 543.802,00
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	15,900	$ 382.691,00	$ 6.084.787,00
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,600	$ 1.070.351,00	$ 10.275.370,00
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	731,000	$ 9.484,00	$ 6.932.804,00
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,400	$ 21.976,00	$ 558.190,00
15	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,000	$ 556.799,00	$ 3.340.794,00
							SUB-TOTAL	**$ 29.270.589,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 151.346.311,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.540.389,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.155.425,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 200.042.125,00**

- **CONVENIO SOLIDARIO No. 4239 DE 2023**

El presente convenio solidario No. 4239 – 2023 se suscribió el día 29 de octubre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *JOSE LIZARDO PARRA BOCANEGRA* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO**, por un valor del convenio de DOSCIENTO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($200.062.799,00)**, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (**$199.062.799,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	4239 - 2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO
NIT:	901.724.821-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE LIZARDO PARRA BOCANEGRA
IDENTIFICACIÓN:	96.332.213 EL PAUJIL

VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.062.799,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 199.062.799,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	12 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 4239-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio"*, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 20

de junio de 2024 un alcance físico de 93 mL de placa huella, la construcción de una alcantarilla y una alcantarilla para limpieza. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	FLORENCIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO	93,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	6,00	$ 66.271,00	$ 397.626,00
							SUB-TOTAL	**$ 397.626,00**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 179.314,00	$ 179.314,00
							SUB-TOTAL	**$ 179.314,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,060	$ 28.211,00	$ 86.326,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	91,300	$ 255.905,00	$ 23.364.127,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	56,500	$ 1.078.262,00	$ 60.921.803,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	24,210	$ 394.292,00	$ 9.545.809,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.719,090	$ 9.258,00	$ 25.173.335,00
							SUB-TOTAL	**$ 119.091.400,00**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	FLORENCIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO	93,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	56,20	$ 28.211,00	$ 1.585.458,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0,30	$ 58.057,00	$ 17.417,00
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3	3,58	$ 151.900,00	$ 543.802,00
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	16,00	$ 394.292,00	$ 6.308.672,00
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	11,10	$ 1.078.262,00	$ 11.968.708,00
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	691,00	$ 9.258,00	$ 6.397.278,00
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	22,20	$ 21.976,00	$ 487.867,00
15	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 570.274,00	$ 3.421.644,00
							SUB-TOTAL	**$ 30.730.846,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 150.399.186,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.511.976,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.151.637,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.062.799,00**

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3681 DE 2023

El presente convenio solidario No. 3681 – 2023 se suscribió el día 29 de octubre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *OSCAR DANIEL ECHEVERRY PARRALES* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA**, por un valor del convenio de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE **($199.001.571,00)**, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE **($198.001.571,00)** y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	3681 - 2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CONGA
NIT:	901.164.516-0
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR DANIEL ECHEVERRY PARRALES
IDENTIFICACIÓN:	96.332.591

VALOR DEL CONTRATO:	$ $199.001.571,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 198. 001.571,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACION No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACION No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	24 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 4239-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio"*, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 20 de junio de 2024 un alcance físico de 111 mL de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	PAUJI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA	111,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,00	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 150.295,00	$ 150.295,00
							SUB-TOTAL	**$ 150.295,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,670	$ 28.211,00	$ 103.534,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	110,000	$ 219.369,00	$ 24.130.590,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	67,670	$ 1.156.607,00	$ 78.267.596,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	28,930	$ 748.209,00	$ 21.645.686,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.240,940	$ 7.737,00	$ 25.075.153,00
							SUB-TOTAL	**$ 149.222.559,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 149.372.854,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.481.186,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.147.531,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 198.001.571,00**

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3900-2023 (EL DIAMANTE)

En el presente mes de agosto del presente año, se llevaron actividades de elaboración de concretos de limpieza de 2.000 psi, concretos de 3.000 psi para la alcantarilla (losa solera, dentellón, zapata del muro cabezal, aletas del descole y muros de caja poceta) e instalación de tubería de concreto reforzado de 36", como también el suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi por parte de la junta de acción comunal de la vereda El Diamante. A continuación, se describe con mayor brevedad cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo:

- **Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ**

Actividad que comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 3.000 psi (21 Mpa), utilizados para la construcción de la alcantarilla de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con un maestro de obra, un oficial de obra y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 1: Concreto de 3.000 psi para zapata del muro cabezal, dentellón y solera del descole de alcantarilla.	**Imagen No. 2**: Concreto de 3.000 psi para la losa de la caja poceta del encole.

	
Imagen No. 3: concreto de 3.000 psi para el muro cabezal y aletas del descole de la alcantarilla.	**Imagen No. 4**: Concreto de 3.000 psi para muros de la caja poceta zona de encole de la alcantarilla.
	
Imagen No. 5: Concreto de 3.000 psi para la caja poceta y aletas de la alcantarilla.	**Imagen No. 6**: terminado final de la alcantarilla en concreto reforzado de 3.000 psi.

- **Concreto de solado de limpieza de resistencia de 14 MPA (F)**

Comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 2.000 psi (14Mpa), utilizados para la construcción de solado de limpieza para protección de los aceros de refuerzo de 60.000, nivelación de la tubería de concreto reforzado y atraque de tubería de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de

obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla y su respectiva instalación de piedra, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, baldes, etc. Se contó además con un maestro de obra, un oficial de obra y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 7: Concreto de 14 Mp de nivelación e instalación para el cuerpo de tubería.	**Imagen No. 8**: Concreto de 14 Mp para solado de limpieza de la solera, zapata del muro cabezal y dentellón del descole de la alcantarilla.

	
Imagen No. 9: Concreto de 14 Mp para solado de limpieza de la losa de fondo de la caja poceta.	**Imagen No. 10**: Concreto de 14 Mp para el atraque de la tubería de concreto reforzado de 36”.

- **Instalación tubería de concreto reforzado de 36”**

Comprende el suministro, transporte de tuberías de concreto reforzado de 36” e instalación con maquinaria retro excavadora tipo pajarita según la “CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES” por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra su respectiva instalación donde se contó con un maestro de obra, un oficial y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de instalación de la misma chequeando los niveles correspondientes.

	
Imagen No. 11: Transporte de tubería de concreto reforzado de 36” al sitio de instalación.	**Imagen No. 12**: Instalación de tubería de concreto reforzado de 36” para la alcantarilla.

- **Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm2 (60.000 psi)**

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto para la alcantarilla definidos en la “CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES” por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se verificó en campo de obra que los aceros de refuerzo correspondieran al número de la barra, espaciado, medidas de cortes acordes y flejes con su respectiva longitud de desarrollo, actividad que se ejecutó con equipos manuales y herramientas menores como pulidora, bichiroque, etc. se contó con un maestro de obra, un oficial y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de corte, figurado e instalación del acero de refuerzo.

	
Imagen No. 13: Acero de refuerzo de 60.000 psi para la losa de solera, zapata, dentellón, y bastones de las aletas del descole de alcantarilla.	**Imagen No. 14**: Acero de refuerzo de 60.000 psi para las aletas del descole de alcantarilla.

	
Imagen No. 15: Acero de refuerzo de 60.000 psi para la losa y muros de la alcantarilla.	**Imagen No. 16**: Acero de refuerzo de 60.000 psi para la losa y muros de la alcantarilla.

- CONVENIO SOLIDARIO No. 4239 -2023 (CHONTADURO)

En el presente mes de agosto del presente año, se llevaron actividades de elaboración de concretos de limpieza de 2.000 psi, concretos de 3.000 psi para la alcantarilla (losa solera, dentellón, zapata del muro cabezal, aletas del descole y muros de caja poceta) e instalación de tubería de concreto reforzado de 36”, como también el suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi por parte de la junta de acción comunal

de la vereda Chontaduro. A continuación, se describe con mayor brevedad cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo:

- **Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ**

Actividad que comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 3.000 psi (21 Mpa), utilizados para la construcción de la alcantarilla de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con un maestro de obra, un oficial de obra y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 17: Concreto de 3.000 psi para zapata del muro cabezal, dentellón y solera zona de descole de alcantarilla.	**Imagen No. 18**: Concreto de 3.000 psi para zapata del muro cabezal, dentellón y solera de la zona de encole de alcantarilla.

	
Imagen No. 19: Concreto de 3.000 psi para el muro cabezal y aletas del descole de la alcantarilla.	**Imagen No. 20**: Concreto de 3.000 psi para el muro cabezal y aletas del encole de la alcantarilla.
	
Imagen No. 21: Concreto de 3.000 psi para aletas del encole y aletas en el descole de la alcantarilla.	**Imagen No. 22**: terminado final de la alcantarilla en concreto reforzado de 3.000 psi.

- **Concreto de solado de limpieza de resistencia de 14 MPA (F)**

Comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 2.000 psi (14Mpa), utilizados para la construcción de solado de limpieza para protección de los aceros de refuerzo de 60.000, nivelación de la tubería de concreto reforzado y atraque de tubería de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de

obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla y su respectiva instalación de piedra, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, baldes, etc. Se contó además con un maestro de obra, un oficial de obra y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 23: Concreto de 14 Mp de nivelación e instalación de tubería de concreto reforzado de 36”.	**Imagen No. 24**: Concreto de 14 Mp para solado de limpieza de la solera, zapata del muro cabezal y dentellón del descole de la alcantarilla.

	
Imagen No. 25: Concreto de 14 Mp para solado de limpieza de la solera, zapata del muro cabezal y dentellón del encole de la alcantarilla.	**Imagen No. 26**: Concreto de 14 Mp para el atraque de la tubería de concreto reforzado de 36”.

- **Instalación tubería de concreto reforzado de 36”**

Comprende el suministro, transporte de tuberías de concreto reforzado de 36” e instalación con maquinaria retro excavadora tipo pajarita según la “CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES” por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra su respectiva instalación donde se contó con un maestro de obra, un oficial y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de instalación de la misma chequeando los niveles correspondientes.

	
Imagen No. 27: Transporte de tubería de concreto reforzado de 36” al sitio de instalación.	**Imagen No. 28**: Instalación de tubería de concreto reforzado de 36” para la alcantarilla.

- **Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm2 (60.000 psi)**

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto para la alcantarilla definidos en la “CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES” por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se verificó en campo de obra que los aceros de refuerzo correspondieran al número de la barra, espaciado, medidas de cortes acordes y flejes con su respectiva longitud de desarrollo, actividad que se ejecutó con equipos manuales y herramientas menores como pulidora, bichiroque, etc. se contó con un maestro de obra, un oficial y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de corte, figurado e instalación del acero de refuerzo.

	
Imagen No. 29: Acero de refuerzo de 60.000 psi para la losa de solera, zapata, dentellón, y bastones de las aletas del descole de alcantarilla.	**Imagen No. 30**: Acero de refuerzo de 60.000 psi para las aletas del descole de alcantarilla.

	
Imagen No. 31: Acero de refuerzo de 60.000 psi para la losa de solera, zapata, dentellón, y bastones de las aletas del encole de alcantarilla.	**Imagen No. 32**: Acero de refuerzo de 60.000 psi para las aletas del encole de alcantarilla.

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3681 -2023 (LA CONGA)

En este convenio solidario en el mes de agosto del presente año, la junta de acción comunal de la vereda La Conga, se llevaron actividades preliminares como el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 60.000 psi para las canastillas de la viga riostras y bordillos como también para el suministro de materiales de ferretería y materiales pétreos (arena y grava) por parte de la junta de acción comunal de la vereda La Conga. Por otra parte, actividades administrativas que condujo a las compras de

materiales de obra, pagos de transportes de materiales, afiliación de personal calificado y no calificado, entre otras. A continuación, se describe con mayor brevedad cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo:

	
Imagen No. 33: Acero de refuerzo de 60.000 psi para la viga riostra.	**Imagen No. 34**: Armado de canastillas para las vigas riostras de todo el tramo de placa huella.

	
Imagen No. 35: Acero de refuerzo de 60.000 psi para el bordillo de la placa huella.	**Imagen No. 36**: Figurado y armado de acero de refuerzo de 60.000 psi para el bordillo y vigas riostras del tramo de placa huella.

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha del presente informe no se han evidenciado ni presentado ítems no previstos en cada uno de los proyectos que se tienen en las veredas de El Diamante, Chontaduro y La Conga.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Conforme a lo estipulado en el contrato de interventoría No. 4838 de 2023, la firma interventora realizó el seguimiento, control y supervisión a las obligaciones de los convenios solidarios número 3900 – 4239 –3681 de 2023, de acuerdo a lo consignado en la guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría emitida por *Colombia Compra Eficiente* y el *manual de interventoría de obra pública (2022)*, y demás lineamientos señalados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

En ese sentido, es importante señalar algunas de las actividades que, a la luz de la normativa vigente en el ordenamiento jurídico, así como en la guía de Colombia Compra Eficiente y en la reiterada Jurisprudencia del Consejo de Estado, debe realizar los interventores:

1. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos de este.
2. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.
3. Hacer seguimiento estricto al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, verificando que se cumpla el plazo y los cronogramas previstos en el contrato.
4. Requerir oportunamente al contratista con el fin de que presente planes de contingencia que conjuren las situaciones que generen retrasos o impactos en el cronograma de obra.
5. Informar oportunamente a la entidad estatal de posibles incumplimientos del contratista, y elaborar y presentar los soportes correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente, el contrato y documentos que lo integran, el Manual de Interventoría de Obra y demás documentos.
6. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para atender las situaciones que afectan la ejecución contractual.

7. Informar oportunamente a la Entidad, las afectaciones al cronograma causadas por las gestiones de terceros y/o Entidades Públicas, con el fin de que sea desarrollada la gestión interinstitucional debida.
8. Informar, analizar, avalar y solicitar a la Entidad oportunamente, las modificaciones contractuales necesarias para la debida ejecución del proyecto.

En virtud de lo anterior, para este periodo del mes de julio de 2024, la interventoría ha realizado el acompañamiento a cada uno de los proyectos que se ejecutan en el departamento del Caquetá que corresponden a las veredas de El Diamante y Chontaduro en el municipio de Florencia y en la vereda La Conga en el municipio de Paujil, dentro de las actividades más puntuales que se han llevado por parte de esta interventoría se describen a continuación:

- Se ha realizado control y registro de cada uno de los pagos solicitados por parte de las juntas de acción comunal, destinadas para compras de materiales de obra, equipos, alquiler de maquinarias y nóminas.
- Verificación en cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de afiliación y pagos de la seguridad social de cada uno de los trabajadores calificados y no calificados de la obra.
- Visitas técnicas a los proyectos de obra con el fin de llevar control y seguimiento de cada una de las actividades ejecutadas previo inicio por parte de las JAC.
- Verificación de dimensiones estipuladas en los diseños de acuerdo a la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INVIAS".

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

4.1. INFORME SEMANAL

En el periodo comprendido del presente informe se presenta por parte de esta firma interventora cinco (4) informes semanales para cada uno de los proyectos de obra que se adelantan en las veredas El Diamante y Chontaduro en el municipio de Florencia y en la vereda La Conga en el municipio de El Paujil, de los cuales se describen a continuación:

- Convenio Solidario No. 3900-2023 (**El Diamante**)

- Informe semanal No. 19: del 05 de agosto al 11 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 20: del 12 de agosto al 18 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 21: del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 22: del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.1**).

- Convenio Solidario No. 4239-2023 (**Chontaduro**)

- Informe semanal No. 19: del 05 de agosto al 11 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 20: del 12 de agosto al 18 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 21: del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 22: del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.2**).

- Convenio Solidario No. 3681-2023 (**La Conga**))

- Informe semanal No. 19: del 05 de agosto al 11 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 20: del 12 de agosto al 18 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 21: del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024
- Informe semanal No. 22: del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.3)**

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Durante el mes de agosto de 2024, esta firma de interventoría llevó registro de maquinaria y equipos utilizados a cada una de las juntas de acción comunal en la obra. Dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda El Diamante - (**Ver Anexo 8.5.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Chontaduro- (**Ver Anexo 8.5.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda La Conga - (**Ver Anexo 8.5.3**).

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS

Durante el mes de agosto de 2024, esta firma de interventoría llevó registro del personal de obra, control de aportes legales y seguridad social de cada una de las juntas de acción comunal. Se adjunta la información diligenciada en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda El Diamante - (**Ver Anexo 8.6.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Chontaduro - (**Ver Anexo 8.6.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda La Conga - (**Ver Anexo 8.6.3**).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Se presenta por parte de esta firma interventora para el mes agosto de 2024 los informes financieros y presupuestales de cada uno de los convenios solidarios, el cual se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda El Diamante - (**Ver Anexo 8.7.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Chontaduro - (**Ver Anexo 8.7.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda La Conga - (**Ver Anexo 8.7.3**).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el mes de agosto de 2024 se registró el tiempo climático diario de cada una de las veredas donde se ejecutan las obras de placa huellas, dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda El Diamante - (**Ver Anexo 8.8.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Chontaduro - (**Ver Anexo 8.8.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda La Conga - (**Ver Anexo 8.8.3**).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo correspondiente al mes de agosto – 2024, no se cuenta con obras que se relacione con la elaboración de concretos, ya que en algunas veredas aún no han iniciado formalmente obras físicas y q a la fecha se continúan con trámites administrativos como, contratación de volquetas, maquinaria pesada, etc. De igual forma, esta interventoría presenta la relación de información correspondiente a los resultados de ensayos de laboratorio en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda El Diamante - (**Ver Anexo 8.9.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Chontaduro - (**Ver Anexo 8.9.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda La Conga - (**Ver Anexo 8.9.3**).

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Comprende la relación de las garantías y seguros de cada uno de los convenios solidarios cuando estos surten modificaciones, por lo que esta firma de interventoría hace seguimiento mensual a través del formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3900, correspondiente a la JAC de la Vereda El Diamante - (**Ver Anexo 8.10.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 4239, correspondiente a la JAC de la Vereda Chontaduro - (**Ver Anexo 8.10.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3681, correspondiente a la JAC de la Vereda La Conga - (**Ver Anexo 8.10.3**).

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, por lo que no es aplicable a ninguno de los convenios solidarios.

Nota: El formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-14* que se establece en la "LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA", No Aplica (N/A).

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

A continuación, se relacionan otros documentos de seguimientos mensuales que se lleva a cada uno de los convenios solidarios por esta interventoría, que corresponde al seguimiento de los desembolsos realizados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –

INVIAS y su respectivo seguimiento de programa de inversiones de ello, que a continuación se relacionan:

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

Para este presente periodo del mes de agosto – 2024, esta firma interventora solicitó a las JAC el informe de seguimiento de la inversión del desembolso mensual de su respectivo convenio basado en el plan de inversión de desembolso presentado por cada una de las Juntas y aprobados por esta firma (**Ver Anexo 8.11.1, Anexo 8.11.2 y Anexo 8.11.3**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3900, JAC de la Vereda El Diamante - (**Ver Anexo 8.12.1**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 4239, JAC de la Vereda Chontaduro - (**Ver Anexo 8.12.2**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3681, JAC de la Vereda La Conga - (**Ver Anexo 8.12.3**).

- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA**

Se realiza por esta firma de interventoría el seguimiento mensual del programa de obra para cada JAC de acuerdo a la programación elaborada por el ingeniero residente y lo aprobado por esta interventoría (**Ver Anexo 8.13.1, Anexo 8.13.2 y Anexo 8.13.3**), programación que es vigente a partir del día 05 de agosto hasta el 01 de septiembre de 2024 para todas las juntas (El Diamante, Chontaduro y La Conga). De acuerdo a lo anterior, se refleja mediante de tablas el porcentaje programado y ejecutado acumulado del presente periodo, donde se deja constancia el atraso o avance física de cada una de las juntas para el presente periodo.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda El Diamante.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "JAC DE LA VEREDA EL DIAMANTE" CONVENIO SOLIDARIO No. 3900 - 2023			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Julio - 2024 Días del 01 al 31	39,441%	7,883	-31,558
Agosto – 2024 Días del 05 al 31	33,695%	25,903	-47,233
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	26,866%	-	-
TOTAL	100,000%	25,903%	-47,233

Tabla 2. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC – El Diamante.*

Según Tabla No. 4, se tiene un avance ejecutado acumulado del 25,903% correspondiente a $ 51.817.641,00 de pesos, contra un programado acumulado de 73,136% equivalente a $ 146.302.808,54 pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda El Diamante, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un -47,233 representa en valor de $ 146.302.808,54 de pesos.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Chontaduro.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "JAC DE LA VEREDA CHONTADURO" CONVENIO SOLIDARIO No. 4239 - 2023			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Julio – 2024 Días del 01 al 31	45,265%	9,921	-37,344
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	30,005%	25,995	-49,275
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	24,730%	-	-
TOTAL	100,000%	25,995%	-49,275%

Tabla 3. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC - Chontaduro.*

Según Tabla No. 5, se tiene un avance ejecutado acumulado del 25,995% correspondiente a $ 51.747.322,00 de pesos, contra un programado acumulado de 30,005% equivalente a $ 149.834.568,81 pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Chontaduro, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un -49,275% que representa en valor de $ 149.834.568,81 de pesos.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda La Conga.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "JAC DE LA VEREDA LA CONGA" CONVENIO SOLIDARIO No. 3681 - 2023			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Julio – 2024 Días del 01 al 31	33,015%	7,963	-25,052
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	36,929%	27,334	-34,647
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	30,056%	-	-
TOTAL	100,000%	27,334%	-34,647%

- ***Tabla 4.*** *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC – La Conga.*

Según Tabla No. 6, se tiene un avance ejecutado acumulado del 27,334% correspondiente a $ 69.888.462,00 de pesos, contra un programado acumulado de 36,929% equivalente a $ 138.490.218,47 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda La Conga, se encuentra en atraso, es decir, por debajo del programado en un -34,647% que representa en valor de $ 138.490.218,47 pesos.

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

No se realizaron Actas de comité de obra en las juntas de acción comunal de las veredas El Diamante, Chontaduro y la Conga del mes de agosto – 2024.

4.11. ACTAS DE REUNIÓN

No se realizaron Actas de reunion en las juntas de acción comunal de las veredas El Diamante, Chontaduro y la Conga del mes de agosto – 2024.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El presente contrato de interventoría No. 4838 – 2023 se suscribió el día 05 diciembre de 2023 entre la señor *JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS* en calidad de **DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA* en calidad de **CONTRATISTA**, por un valor del contrato es de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUNIENTOS TREINTA Y SIETE PESOSENTA Y SIETE PESOS (**$106.174.537**) M/CTE, equivalente a 91,53 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, a continuación, se relaciona los datos generales del contrato de interventoría:

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4838-2023
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, DMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL EJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
NIT:	7.692.245-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 106.174.537,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	05 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENCIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA CUARTA.** VALOR: El valor del contrato de interventoría es por la suma de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUNIENTOS TREINTA Y SIETE PESOSENTA Y SIETE PESOS ($106.174.537) M/CTE, equivalente a 91,53 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera o presupuesto de interventoría inicial:

PRESUPUESTO INICIAL DE INTERVENTORÍA

	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	PARTICIPACIÓN (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3) = (4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
	Director de Interventoría	$ 5.000.000,00		0,50	$ 2.500.000,00
	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00		4,00	$ 16.000.000,00
	Profesional ambiental	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	Profesional social	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.000.000,00
	Especialista en Estructuras	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Vía y/o Pavimentos	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.500.000,00			
	Especialista en diseño Geometrico	$ 5.500.000,00			
	Inspector	$ 1.200.000,00		6,00	$ 7.200.000,00
	Inspector SST	$ 1.200.000,00		0,50	$ 600.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				$ 31.540.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,36
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 74.434.400,00

	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (7)	UTILIZACION (8)	VALOR PARCIAL ($) (7)*(8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
	Viaticos Director y/o Especialistas	**Dia**	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	**Mes**	$ 550.000,00	12,00	$ 6.600.000,00
	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	**Según comprobante por mes**	$ 2.800.000,00	2,00	$ 5.600.000,00
	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	**Según comprobante por mes**	$ 300.000,00	3,00	$ 900.000,00
	OTROS COSTOS				
	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	**Según comprobante por mes**	$ 176.200,00	2,00	$ 352.400,00
	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	**Según comprobante por mes**	$ 80.000,00	3,00	$ 240.000,00
	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	**Según comprobante por mes**	$ 140.000,00	3,00	$ 420.000,00
	Veeduría Técnica Comunitaria	**Según comprobante por mes**	$ 38.500,00	3,00	$ 115.500,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 14.787.900,00
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 89.222.300,00
	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 16.952.237,00
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 106.174.537,00

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Como interventoría, se vienen realizando actividades de seguimiento, acompañamiento y supervisión a cada una de las obras suscritas entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS y las juntas de acción comunal, dentro de las actividades de las cuales realizó esta firma durante el periodo del presente informe se describen a continuación:

- Acompañamiento y socialización del nuevo alcance del proyecto de obra en cada una de las juntas suscritas con el INVIAS donde se explica por qué se actualizó los precios de materiales, transporte y distancia de recorrido dentro del presupuesto de obra, se debe a precios del año anterior, es por eso que el presidente junto con el ingeniero residente realizó estos ajustes del presupuesto inicial. Cabe resaltar que este paso a paso la interventoría estuvo realizando el acompañamiento de cada uno del proceso de ajuste.

- Se continua durante este periodo por parte de la interventoría realizando visitas técnicas junto con los residentes de obra, en cumplimiento al seguimiento y control de cada una de las actividades que se llevan en las obras. Además, por parte del residente y director de esta firma de interventoría se transmitió a los ingenieros residentes de obra recomendaciones muy puntuales en cuanto al despiece, bombeos y peraltes para cada una de las placas huellas y alcantarillas correspondiente a cada vereda.

- Se realizaron tomas de muestras de concreto de 3.000 psi en conjunto entre los ingenieros residentes de obra e interventoría a lo largo del tramo de intervención de construcción de las alcantarillas de la vereda El Diamante y Chontaduro.

- Esta interventoría realiza control de calidad ocular de cada uno de los materiales que son llevados a cada una de las obras; de mismo modo se realiza un seguimiento detallado al proceso constructivo para garantizar que estos proyectos tengan desenlace.

- Se verificó en sitio de obra que el personal de mano de obra calificada y no calificada estuviesen debidamente afiliados al sistema de seguridad social, para las juntas que iniciaron a realizar actividades físicas en obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-5* donde hace referencia el vehículo utilizado por el residente de interventoría para cada una de las veredas donde se supervisa, control y seguimiento técnico de las obras de placa huella.
(**Ver Anexo 8.15**)

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-7* donde se relaciona el personal mínimo requerido de acuerdo a la propuesta económica presentada por esta firma de interventoría, necesarios para llevar a cabo la supervisión técnica de cada uno de los convenios suscritos con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.16**)

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-9* donde se relaciona el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría para el presente periodo.
(**Ver Anexo 8.17**)

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-13* donde se relacionan las pólizas de **a)** cumplimiento general, **b)** pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y **c)** Calidad del servicio; correspondiente al contrato de interventoría No. 4838 – 2023 a la fecha del presente periodo.
(**Ver Anexo 8.18**)

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Otros de los documentos que se llevan periódicamente en el presente informe hace énfasis al formato de plan de cargas o reprogramación al plan de cargas del INVIAS.

- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO**

Se anexa formato *MEPI-MN-IN-9-FR-2* donde se evidencia el plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado para esta firma de interventoría por parte de la supervisión del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.19**)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se verificó por parte de esta firma interventora a las JAC los materiales pétreos adquiridos, y son acordes tal como se establecen en los diseños de concreto de 3.000 psi, siendo estos pétreos de buena calidad y que cumplen con las especificaciones técnicas del INVIAS.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda EL DIAMANTE presenta para este periodo un programado acumulado del 73,136% correspondiente a $146.302.808,54 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 25,903% correspondiente a $ 51.817.641,00 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un 47,233 % correspondiente a $146.302.808,54 pesos M/CTE.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda CHONTADURO presenta para este periodo un programado acumulado del 30,005% correspondiente a $149.834.568,81 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 25,995% correspondiente a $51.747.322,00 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un 49,275% correspondiente a $149.834.568,81 pesos M/CTE.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda LA CONGA presenta para este periodo un programado acumulado del 36,929% correspondiente a $138.490.218,47 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 27,334% correspondiente a $69.888.462,00 pesos M/CTE, lo que indica un atraso por debajo de lo programado en un 34,647% correspondiente a $138.490.218,47 pesos M/CTE.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda El Diamante – CS#3900
8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.1.3. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Conga – CS#3681

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Conga – CS#3681

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.3.2. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Conga – CS#3681

8.4. INFORMES SEMANALES

8.4.1. Informe semanal de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.4.2. Informe semanal de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.4.3. Informe semanal de la Vereda La Conga – CS#3681

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.5.2. Maquinaria y equipo de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda La Conga – CS#3681

8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Conga – CS#3681

8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.7.2. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Conga – CS#3681

8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.8.2. Estado general del tiempo climático de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda La Conga – CS#3681

8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Conga – CS#3681

8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Conga – CS#3681

8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Conga – CS#3681

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Conga – CS#3681

8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.13.2. Seguimiento programa de obra de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda La Conga – CS#3681

8.14. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

8.14.1. Actas de comité de obra de la Vereda El Diamante – CS#3900
8.14.2. Actas de comité de obra de la Vereda Chontaduro – CS#4239
8.14.3. Actas de comité de obra de la Vereda La Conga – CS#3681

8.15. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA


8.16. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.18. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.19. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO.

Atentamente,



ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
MP No. 19202-61820 CAU

ANEXOS

ANEXO 8.1.

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

ANEXO 8.1.1.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda El Diamante – CS#3900

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 - VEREDA EL DIAMANTE

CONVENIO SOLIDARIO No. 3900 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
12/08/2024	Convenio Solidario No. 3900 de 2023	Informe financiero mes de julio	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• FERNANDO VALENCIA GALINDO, REP. LEGAL DE LA JAC DE LA VEREDA EL DIAMANTE
15/08/2024	Aceptación de oferta No. 4838 de 2023	Informe financiero CS No. 3900 de 2023 - JAC VEREDA DIAMANTE	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • DIRECTOR TERRITORIAL JOSÉ RICARDO BURBANO

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

Gmail

Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>

IP 033 cto 4838 - Informe financiero CS No. 3900 de 2023 - JAC VEREDA DIAMANTE

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 5:44 p.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com, atencionciudadano@invias.gov.co

045-4838

Florencia, 15 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Informe financiero CS No. 3900 de 2023 - JAC VEREDA DIAMANTE

Cordial saludo;

En cumplimiento de obligación de realizar vigilancia y control financiero a los recursos entregados por INVIAS a las Juntas u organismos de acción comunal – OAC, establecida en el numeral 12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, del anexo técnico de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso de julio de 2024
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

---

3 archivos adjuntos

3900 Formato Auxiliar Detallado JULIO.pdf
337K

3900 Formato Informe inversión buen manejo desembolso JUL 2024.pdf
362K

045 4838 Infor financiero CS3900.pdf
75K

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 CS 3900 Informe financiero mes: Julio 2024

2 mensajes

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 12 de agosto de 2024, 8:15 a.m.
Para: conanvidal.jv@gmail.com, SANDRITA PARRA <sandraparra642@gmail.com>
CC: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com

Florencia, 12 de agosto de 2024

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE
Sr. Fernando Valencia Galindo
Vice Presidente
conanvidal.jv@gmail.com
Florencia – Caquetá

Referencia: Convenio Solidario No. 3900 de 2023
Asunto: Informe financiero mes: Julio 2024

Cordial saludo;

En cumplimiento de la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGILANCIA Y CONTROL, que determina que "*la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del convenio, serán ejercidas a través de una Interventoría contratada para tal fin*", esta interventoría le solicita de manera urgente la presentación del informe financiero del mes de Julio de 2024.

Dicho informe debe contemplar la presentación de los siguientes formatos los cuales son de su conocimiento:

- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 5:40 p.m.
Para: chaloparra017@gmail.com, contadorpublicoflorencia@gmail.com
CC: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com

045-4838

Florencia, 15 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Informe financiero CS No. 3900 de 2023 - JAC VEREDA DIAMANTE

Cordial saludo;

En cumplimiento de obligación de realizar vigilancia y control financiero a los recursos entregados por INVIAS a las Juntas u organismos de acción comunal – OAC, establecida en el numeral 12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, del anexo técnico de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso de julio de 2024
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso de julio de 2024

[Texto citado oculto]

---

3 archivos adjuntos

045 4838 Infor financiero CS3900.pdf
75K

3900 Formato Auxiliar Detallado JULIO.pdf
337K

3900 Formato Informe inversión buen manejo desembolso JUL 2024.pdf
362K

ANEXO 8.1.2.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Chontaduro – CS#4239

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 - VEREDA CHONTADURO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4239 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
12/08/2024	Convenio Solidario No. 4239 de 2023	Informe financiero mes de julio	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSE LIZARDO PARRA BOCANEGRA, REP. LEGAL DE LA JAC DE LA VEREDA CHONTADURO
13/08/2024	Aceptación de oferta No. 4838 de 2023	Informe financiero CS No. 4239 de 2023 – JAC CHONTADURO	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • DIRECTOR TERRITORIAL JOSÉ RICARDO BURBANO

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 CS 4239 Informe financiero mes: Julio 2024

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 12 de agosto de 2024, 8:20 a.m.
Para: chaloparra017@gmail.com, contadorpublicoflorencia@gmail.com
CC: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com

Florencia, 12 de agosto de 2024

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO
Sr. Jose Lizardo Parra Bocanegra
Vice Presidente
chaloparra017@gmail.com
Florencia – Caquetá

Referencia: Convenio Solidario No. 4239 de 2023
Asunto: Informe financiero mes: Julio 2024

Cordial saludo;

En cumplimiento de la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGILANCIA Y CONTROL, que determina que "*la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del convenio, serán ejercidas a través de una Interventoría contratada para tal fin*", esta interventoría le solicita de manera urgente la presentación del informe financiero del mes de Julio de 2024.

Dicho informe debe contemplar la presentación de los siguientes formatos los cuales son de su conocimiento:

- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 - Informe mensual julio de 2024

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 9:11 a.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com, atencionciudadano@invias.gov.co

043-4838

Florencia, 14 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Informe mensual Julio de 2024

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación pública que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe mensual de Julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

4838 INFOR MENSUAL JULIO INTERVENTORÍA # 4.pdf

043 4838 Infor mensual julio.pdf
73K

ANEXO 8.1.3.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Conga – CS#3681

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 - VEREDA LA CONGA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3681 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
12/08/2024	Convenio Solidario No. 3681 de 2023	Informe financiero mes: Julio 2024	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	OSCAR DANIEL ECHEVERRY PARRALES, REP. LEGAL DE LA JAC DE LA VEREDA LA CONGA
15/08/2024	Aceptación de oferta No. 4838 de 2023	Informe financiero CS No. 3681 de 2023 - JAC VEREDA CONGAS	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • DIRECTOR TERRITORIAL JOSÉ RICARDO BURBANO
30/08/2024	Convenio Solidario No. 3681 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4838 de 2023	Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión ambiental inicial.	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 - Gestión ambiental inicial CS No. 3681 de 2023 - JAC VEREDA CONGAS

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 30 de agosto de 2024, 4:20 p.m.
Para: atencionciudadano@invias.gov.co, nacevedo@invias.gov.co, jalgonzalez@invias.gov.co
CC: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com, bioadrimontoya@gmail.com

047-4838

Florencia – Caquetá, 30 de agosto de 2024-.

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Convenio Solidario No. 3681 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4838 de 2023
Asunto: Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión ambiental inicial.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Conga con **Convenio Solidario No. 3681 de 2023,** presentó el Plan de Gestión Ambiental -PGA según la *"VERSIÓN 3 – 06/2024"* del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, así como los formatos: MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION AMBIENTAL y MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL y los respectivos anexos.

Siendo así, se informa que se aprueba el documento PGA y se solicita al organismo de acción comunal presentar el seguimiento y el balance de gestión ambiental para finalizar el proyecto.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

2 archivos adjuntos

GESTIÓN AMBIENTAL INICIAL_ CS No. 3681 de 2023.zip
10611K

047-4838 OFICIO REMISIÓN GESTIÓN AMBIENTAL INICIAL _ CS No. 3681 de 2023.pdf
67K

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 - Informe financiero CS No. 3681 de 2023 - JAC VEREDA CONGAS

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 6:22 p.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com, atencionciudadano@invias.gov.co

046-4838

Florencia, 15 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Informe financiero CS No. 3681 de 2023 - JAC VEREDA CONGAS

Cordial saludo;

En cumplimiento de obligación de realizar vigilancia y control financiero a los recursos entregados por INVIAS a las Juntas u organismos de acción comunal – OAC, establecida en el numeral 12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, del anexo técnico de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso de julio de 2024
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

---

3 archivos adjuntos

046 4838 Infor financiero CS 3681.pdf
75K

3681 Formato Informe inversión buen manejo desembolso (1).pdf
104K

3681 Formato Auxiliar Detallado.pdf
81K

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 CS 3681 Informe financiero mes: Julio 2024

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 12 de agosto de 2024, 8:11 a.m.
Para: jaccongas@hotmail.com, cristan Andres vargas fuentes <ing.cristianvargasf@gmail.com>, yanehtramirez192@gmail.com
CC: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com

Florencia, 12 de agosto de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA
Sr. Oscar Daniel Echeverry Parrales
Presidente y Representante Legal
jaccongas@hotmail.com
Ing. Cristian Andrés Vargas Fuentes
Ingeniero Residente
ing.cristianvargasf@gmail.com
Florencia – Caquetá

Referencia: Convenio Solidario No. 3681 de 2023
Asunto: Informe financiero mes: Julio 2024

Cordial saludo;

En cumplimiento de la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGILANCIA Y CONTROL, que determina que "*la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del convenio, serán ejercidas a través de una Interventoría contratada para tal fin*", esta interventoría le solicita de manera urgente la presentación del informe financiero del mes de Julio de 2024.

Dicho informe debe contemplar la presentación de los siguientes formatos los cuales son de su conocimiento:

- Formato informe de inversión y buen manejo del desembolso
- Formato auxiliar detallado movimientos buen manejo del desembolso

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

ANEXO 8.1.4.

Relación de correspondencia generada entre interventoría e invias

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 - INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4838 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
06/08/2024	Aceptación de oferta No. 4838 de 2023	Informe semanal #18	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • DIRECTOR TERRITORIAL JOSÉ RICARDO BURBANO
12/08/2024	Aceptación de oferta No. 4838 de 2023	Informe semanal #19	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • DIRECTOR TERRITORIAL JOSÉ RICARDO BURBANO
14/08/2024	Aceptación de oferta No. 4838 de 2023	Informe mensual Julio de 2024	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • DIRECTOR TERRITORIAL JOSÉ RICARDO BURBANO
14/08/2024	Aceptación de oferta No. 4838 de 2023	Acta de costos #01	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • DIRECTOR TERRITORIAL JOSÉ RICARDO BURBANO
14/08/2024	Aceptación de oferta No. 4838 de 2023	Actas de costos	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • DIRECTOR TERRITORIAL JOSÉ RICARDO BURBANO

20/08/2024	Aceptación de oferta No. 4838 de 2023	Informe semanal #20	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • DIRECTOR TERRITORIAL JOSÉ RICARDO BURBANO
26/08/2024	Aceptación de oferta No. 4838 de 2023	Informe semanal #21	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	• SUPERVISORA DE INVIAS ANGY JULIET LARA MURCIA • DIRECTOR TERRITORIAL JOSÉ RICARDO BURBANO

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 - Informe semanal #18

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 6 de agosto de 2024, 6:16 p.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com, william_rodriguez_07@hotmail.com, cristan Andres vargas fuentes <ing.cristianvargasf@gmail.com>

Florencia, 06 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá
Ing. Angy Juliet Lara Murcia
Supervisora
Dra. Karina Rodríguez
Profesional Social
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Informe semanal #18

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe semanal #18 del convenio 4239
- Informe semanal #18 del convenio 3900
- Informe semanal #18 del convenio 3681

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

3 archivos adjuntos

Anexo 8.4.1 I SEMANA 18 - DIAMANTE.pdf
263K

Anexo 8.4.2 I SEMANA 18-CONGA.pdf
271K

Anexo 8.4.2 I SEMANA 18-CHONTADURO.pdf
265K

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 - Informe semanal #19

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 12 de agosto de 2024, 8:51 a.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com, cristan Andres vargas fuentes <ing.cristianvargasf@gmail.com>

Florencia, 12 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá
Ing. Angy Juliet Lara Murcia
Supervisora
Dra. Karina Rodríguez
Profesional Social
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Informe semanal #19

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe semanal #19 del convenio 4239
- Informe semanal #19 del convenio 3900
- Informe semanal #19 del convenio 3681

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

3 archivos adjuntos

Anexo 8.4.2 INFORME SEMANAL 19 CHONTADURO.pdf
262K

Anexo 8.4.3 INFORME SEMANAL 19 CONGA.pdf
216K

Anexo 8.4.1 INFORME SEMANAL 19 DIAMANTE.pdf
259K

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 - Informe mensual julio de 2024

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 9:11 a.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com, atencionciudadano@invias.gov.co

043-4838

Florencia, 14 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Informe mensual Julio de 2024

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación pública que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe mensual de Julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

4838 INFOR MENSUAL JULIO INTERVENTORÍA # 4.pdf

043 4838 Infor mensual julio.pdf
73K

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 - Acta de costos #1 julio de 2024

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 9:44 a.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com

044-4838

Florencia, 14 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Acta de costos #01

Cordial saludo;

En cumplimiento de la cláusula QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Hoja de ruta
- Acta de costos #01
    - Acta de costos
    - Factura
    - RUT
- Afectación presupuestal de obligaciones
- Identificación de ejecución contractual
- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
- Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
- Soporte de nómina electrónica
- Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social
    - Certificación
    - Planilla de autoliquidación de aportes
- Informe mensual de julio de 2024

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

3 archivos adjuntos

044 4838 acta 1 mensual julio.pdf
76K

DTCAQ - ACTA 1 CTO 4838-2023 JULIO24.pdf
1491K

DTCAQ - ACTA 1 CTO 4838-2023 JULIO24.xlsx
597K

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 - Informe semanal #20

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 20 de agosto de 2024, 7:55 a.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com, cristan Andres vargas fuentes <ing.cristianvargasf@gmail.com>

Florencia, 20 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá
Ing. Angy Juliet Lara Murcia
Supervisora
Dra. Karina Rodríguez
Profesional Social
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Informe semanal #20

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe semanal #20 del convenio 4239
- Informe semanal #20 del convenio 3900
- Informe semanal #20 del convenio 3681

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

3 archivos adjuntos

Anexo 8.4.2 I SEMA CHONTA S20.pdf
269K

Anexo 8.4.3 I SEMA CONGA S20.pdf
211K

Anexo 8.4.1 I SEMA DIAM S20.pdf
265K

Gmail **Diego alejandro Morales cortes <ingdiegomorales0292@gmail.com>**

IP 033 cto 4838 - Informe semanal #21

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 26 de agosto de 2024, 7:49 a.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ingdiegomorales0292@gmail.com, cristan Andres vargas fuentes <ing.cristianvargasf@gmail.com>

Florencia, 26 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá
Ing. Angy Juliet Lara Murcia
Supervisora
Dra. Karina Rodríguez
Profesional Social
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Informe semanal #21

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe semanal #21 del convenio 4239
- Informe semanal #21 del convenio 3900
- Informe semanal #21 del convenio 3681

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4838 de 2023

3 archivos adjuntos

Anexo 8.4.3 I SEMA CONGA S21.pdf
260K

Anexo 8.4.1 I SEMA DIAM S21.pdf
264K

Anexo 8.4.2 I SEMA CHONTA S21.pdf
258K

ANEXO 8.2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

ANEXO 8.2.1.


Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda El Diamante – CS#3900

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3900 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL DIAMANTE **FECHA:**01/09/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA

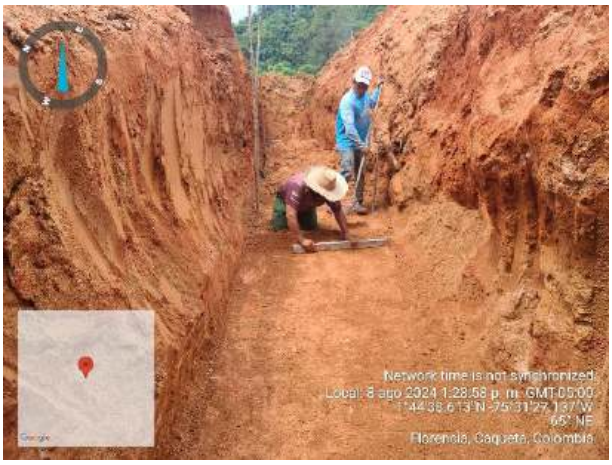	
FOTOGRAFÍA 1 (Excavación de alcantarilla a máquina retro excavadora)	FOTOGRAFÍA 2 (Perfilación manual del terreno del cuerpo de alcantarilla)

	
FOTOGRAFÍA 3 (Solado de limpieza para el cuerpo de tubería de la alcantarilla)	FOTOGRAFÍA 4 (Instalación de tubería de concreto reforzado de 36”)

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL DIAMANTE **FECHA:**01/09/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 5 (Armado del acero de refuerzo de 60.000 psi de la zapata del muro cabezal, solera, dentellón y aletas del descole de la alcantarilla)	FOTOGRAFÍA 6 (Preparación, transporte y vaciado de concreto de 21 Mpa para la placa de la solera, dentellón y zapata del muero cabezal)
	
FOTOGRAFÍA 7 (Instalación de formaleta de madera para las aletas del descole de la alcantarilla)	FOTOGRAFÍA 8 (Desencofrado de formaleta de madera de las aletas y terminado de la misma)

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL DIAMANTE **FECHA:**01/09/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 9 (Figurado de acero de refuerzo de 60.000 psi para la caja poceta del encole de la alcantarilla)	FOTOGRAFÍA 10 (Preparación, transporte y vertido de concreto de 21 Mpa de la losa de poceta)
	
FOTOGRAFÍA 11 (Armado de acero de refuerzo de 60.000 Psi para los muros de la caja poceta)	FOTOGRAFÍA 12 (Terminado final de la caja poceta)

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL DIAMANTE **FECHA:**01/09/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLA

	
FOTOGRAFÍA 13 (Limpieza de caja poceta)	FOTOGRAFÍA 14 (Limpieza de caja poceta con maquina retro excavadora)

	
FOTOGRAFÍA 15 (Losa de seguridad del cuerpo de tubería de concreto para la tubería existente)	FOTOGRAFÍA 16 (Losa de seguridad del cuerpo de tubería de concreto para la tubería existente)

ANEXO 8.2.2.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Chontaduro – CS#4239

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4239 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA CHONTADURO
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
FECHA:01/09/2024

CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Excavación de alcantarilla a máquina retro excavadora)	FOTOGRAFÍA 2 (Perfilación manual del terreno del cuerpo de alcantarilla con su solado de limpieza)

	
FOTOGRAFÍA 3 (Solado de limpieza para el cuerpo de tubería de la alcantarilla)	FOTOGRAFÍA 4 (Instalación de tubería de concreto reforzado de 36”)

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA CHONTADURO **FECHA:**01/09/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 5 (Armado del acero de refuerzo de 60.000 psi de la zapata del muro cabezal, solera, dentellón y aletas del descole de la alcantarilla)	FOTOGRAFÍA 6 (Preparación, transporte y vaciado de concreto de 21 Mpa para la placa de la solera, dentellón y zapata del muero cabezal)
	
FOTOGRAFÍA 7 (Instalación de formaleta de madera para las aletas del descole de la alcantarilla)	FOTOGRAFÍA 8 (Desencofrado de formaleta de madera de las aletas y terminado de la misma)

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA CHONTADURO **FECHA:**01/09/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 9 (Figurado de acero de refuerzo de 60.000 psi para la solera del encole de la alcantarilla con su preparación, transporte y vaciado de concreto de 21 Mpa)	FOTOGRAFÍA 10 (Instalación de formaleta de madera para las aletas del encole de la alcantarilla)

	
FOTOGRAFÍA 11 (Terminado de aletas del encole de la alcantarilla)	FOTOGRAFÍA 12 (Terminado de aletas del encole de la alcantarilla)

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA CHONTADURO **FECHA:**01/09/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 13 (Preparación, transporte y vaciado de concreto de 21 Mpa para la losa de garantía de la tubería de concreto reforzado de 36")	FOTOGRAFÍA 14 (Losa de seguridad y garantía de tubería de 36" en concreto reforzado)

PLACA HUELLA

	
FOTOGRAFÍA 15 (Conformación a máquina del tramo de placa huella)	FOTOGRAFÍA 16 (Instalación de subbase para el tramo de placa huella de 93 ml)

	
FOTOGRAFÍA 17 (Instalación de subbase para el tramo de placa huella de 93 ml)	FOTOGRAFÍA 18 (Instalación de subbase para el tramo de placa huella de 93 ml)

ANEXO 8.2.3.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Conga – CS#3681

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3681 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA CONGA **FECHA:**01/09/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Armado de acero de refuerzo de 60.000 psi para la viga riostra, bordillo y cunetas del tramo de placa huella)	FOTOGRAFÍA 2 (Acero de refuerzo de 60.000 psi para el tramo de placa huella.)

	
FOTOGRAFÍA 3 (Descargue de cemento a sitio de obra)	FOTOGRAFÍA 4 (Instalación de subbase con equipo motoniveladora para el tramo de placa huella de 111 ml)

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA CONGA **FECHA:**01/09/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 5 (Compactación de subbase con equipo vibro compactador de rodillo)	FOTOGRAFÍA 6 (Subbase instalada y compactada.)

	
FOTOGRAFÍA 7 (Instalación de formaleta de madera para bordillo del tramo de placa huella)	FOTOGRAFÍA 8 (Instalación de formaleta de madera para la huella de la placa huella en la abscisa ko+000 hasta k0+015 sobre la margen izquierda y derecha)

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA CONGA **FECHA:**01/09/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 9 (Instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi para viga riostra desde la abscisa k0+000 hasta k0+009)	FOTOGRAFÍA 10 (Instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi para viga riostra desde la abscisa k0+009 hasta k0+021)

ANEXO 8.3.

COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

ANEXO 8.3.1.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda El Diamante– CS#3900

CONVENIO SOLIDARIO 3900 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

NIT= 900.116.461-6.

REP. LEGAL: FERNANDO VALENCIA GALINDO

INTERVENTOR = EIKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NIT: 7.962.245-I

FECHA ORDEN DE INICIO = 14 DE DICIEMBRE DE 2023.

WILLIAM OSWALDO RODRIGUEZ S.
RESIDENTE DE OBRA

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

24/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas
Tarde = lluvias intensas.

NOTA: Se realiza por parte de la junta de acción Comunal (JAC) la actualización de la información y Contraseña del Token para poder realizar pagos de compras de Materiales de ferretería, transporte y Refrig

William Oswaldo Rodriguez S.
Residente de obra

Diego Alejandro Morales C.
Residente de Interventoría.

25/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas
= Tarde = lluvias intensas

NOTA: Se continua con el problema con la actualización de datos por parte de la OAC con el banco para la activación del token
- Se inicia con el proceso de contratación del personal calificado y no calificado

William Oswaldo Rodriguez.
Residente de obra


Diego Alejandro Morales C.
Residente de interventoría


INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

26/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas
Tarde = Seco


NOTA = Se continua con el problema de actuación del token para que la OAC Realice Compras de materiales requeridos en obra.
- Se continua con el proceso de contratación de personal de Mano de obra calificada y no calificada por parte de la OAC.






29/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = - lluvias intensas.

NOTA = Se continua con el problema de actuación del token para que la OAC Realice Compras de Materiales requeridos en obra
- Se Continua con el proceso de contratación de personal de Mano de obra Calificada y no calificada por parte de la OAC.





28/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias moderadas

NOTA = Se continua con el problema de actuación del token para que la OAC Realice compras de materiales requeridos en obra.

Powered by CamScanner

Se continua con el proceso de contratación de personal de mano de obra calificada y no calificada por parte de la OAC.

29/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
tarde = lluvias intensas.

NOTA = Se continua con el problema de actuación de (tarea para que la OAC realice compras de materiales requeridos en obra.
- Se continua con el proceso de contratación de personal de mano de obra calificada y no calificada por parte de la OAC.
- Se realiza la localización y replanteo de la zona de plaza huella de 96m2 usando el punto inicial y final.
- Se realiza exploración geotecnica (CBR) para la zona de plaza huella

30/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
tarde = lluvias intensas.

NOTA = Día Domingo no se laboro

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

01/07/2024	Día festivo no se laboró
02/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas tarde = lluvias moderadas Personal de obra = 2 ingeniero Residente de interventoría 1 ingeniero Residente de obra Maquinarias y equipos = no se evidenció en campo Actividades = se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el banco para el pago de la compra de materiales de ferretería, retroes y transporte.
03/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas tarde seco. Personal de obra = 1 ingeniero Residente de interventoría 1 ingeniero Residente de obra Maquinarias y equipos = no se evidenció en campo Actividades = se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el banco para el pago de compras de materiales y transporte. - se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

04/04/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = lluvias intensas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

1. ingeniero residente de interventoría

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el banco para el pago de compras de materiales y transporte

- Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

[redacted]

05/04/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde

Personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoría.

1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo

Actividades = Se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el Banco para el pago de Compras de materiales y transporte.

[redacted]

06/04/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias moderadas

Personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoría

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

I. ingeniero residente de obra

Maquinarias y equipos = NO se evidenció en campo

Actividades = se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el Banco para el pago de compras de materiales y transporte

[signature] [signature]

07/07/2024 Registro de lluvias - Mañana = Seco

Tarde. Seco

Tra Dominical no se laboro.

[signature] [signature]

08/07/2024 Registro de lluvias = Mañana - lluvias moderadas

tarde = lluvias moderadas

Personal de obra = I. ingeniero Residente de alternancia

I. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo

Actividades = Se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el Banco para el pago de Compras de materiales y Transporte

- Se realiza el seis de julio 2024 la Socialización del reco aleman. de 96mL de placa huella y en construcción de una alcantarilla

- Se continua con la Contratación del personal calificado y no calificado.

[signature] [signature]

Powered by CamScanner

09/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

1. ingeniero Residente de interventoría

Maquinarias y equipos = No se evidencio en campo.

Actividades = Se continua con la actualizacion de datos por parte de la OAC con el Banco para el Pago de compras de materiales y transporte

- Se continua con la contratacion del personal calificado y no calificado

10/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas

Tarde = lluvias intensas.

Personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoría

1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = no se evidenció en campo

Actividades = Se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el Banco para el Pago de compras de materiales y transporte.

- se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

11/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias intensas

INDUCONTABLES


Powered by CamScanner


Personal de obra= 1. ingeniero Residente de interventoría
1. ingeniero Residente de obra

Maquinarias y equipos = no se evidencio en campo'

Actividades = Se continua con la actualizacion de datos por parte de la DAC con el Banco para el pago de materiales y transporte

- se continua con la contratacion del personal calificado y no calificado






12/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = seco


Personal de obra= 1. ingeniero Residente de obra
1. ingeniero Residente de interventoría

Maquinarias y equipos = no se evidencio en campo

Actividades= Se continua con la actualizacion de datos por parte de la DAC con el Banco para el pago de materiales y transporte.

- se continua con la contratacion del personal calificado y no calificado





13/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas

Personal de obra= 1. ingeniero Residente de interventoría
1. ingeniero Residente de obra.

Herramientas y equipos= no se evidencio en obra.
Actividades= se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el Banco para el pago de materiales y transporte.
- se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

[redacted]

14/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
Tarde= seco

Dia (~~festivo no se laboro~~) Domingo no se laboro.

[redacted]

15/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde. seco

Personal de obra= 1. ingeniero Residente de obra
1. ingeniero Residente de interventoria.

Herramientas y equipos= no se evidencio en campo
Actividades= se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el Banco para el pago de materiales y transporte
- se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

[redacted]

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

16/07/2024 Registro de lluvias: Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1. Ingeniero Residente de interventoría

1. Ingeniero Residente de obra

Maquinarias y equipos = no se evidencio en campo.

Actividades = Se continua con la actualización de datos por parte de la Obc con el Banco para el pago de compra de materiales y transporte.

- Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

17/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = seco

Personal de obra = 1. Ingeniero Residente de obra.

1. Ingeniero Residente de interventoría

Maquinarias y equipos = no se evidenció en campo

Actividades = Se continua con la actualización de datos por parte de la Obc con el Banco para el pago de compra de Materiales y transporte.

- Se Continua con la contratacion del personal calificado y no calificado

18/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas

Tarde = seco

Personal de obra= 1. Ingeniero Residente de interventoría
1. Ingeniero Residente de obra.
Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo
Actividades= Se continua con la actualización de datos por parte de la OAc con el Banco para el pago de compra de materiales y transporte.
- Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

19/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
Tarde= lluvias intensas
Personal de obra= 1. Ingeniero Residente de interventoría
1. Ingeniero Residente de obra
Maquinarias y equipos= No se evidencio en campo
Actividades= Se continua con la actualización de datos por parte de la OAc con el Banco para el pago de compra de Materiales y transporte
- Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado
- transporte de material de ferreteria a obra.

20/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco
Día festivo no se labora. Tarde = seco

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

21/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

(Personal) Día Dominical no se labora.

22/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoría

1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias = No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

23/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias moderadas

Personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoría.

1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidencio en campo

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

Powered by CamScanner

24/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas Tarde = seco Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría 1. Ingeniero Residente de obra. Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo Actividades = se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.
25/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas Tarde = seco Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría 1. ingeniero residente de obra. Maquinarias y equipos = no se evidencio en campo. Actividades = se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.
26/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = seco Tarde = lluvias intensas Personal de obra = 1. ingeniero Residente de obra 1. ingeniero Residente de interventoría

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Maquinarias y equipos= No se evidencio en campo

Actividades= Se continua con la contratación de l Personal Calificado y no calificado.

[redacted]

27/07/2024 Registro de lluvias = mañana= seco

Tarde = seco

Personal de obra= 1. ingeniero Residente de interventoría

1 ingeniero Residente de obra

Maquinarias y equipos= no se evidencio en campo

Actividades= Se continua con la contratación del Personal Calificado y no calificado.

[redacted]

28/07/2024 Registro de lluvias= mañana= lluvias moderadas

Tarde= lluvias moderadas

Dia Dominical no se labora

[redacted]

29/07/2024 Registro de lluvias = mañana = seco

Tarde= seco

Personal de obra= 1 ingeniero Residente de interventoria

Powered by CamScanner

1. ingeniero residente de obra.

Maquinarias y equipos = NO se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

30/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias Moderadas

Tarde = lluvias intensas.

Personal de obra = 1 ingeniero residente de obra.

1. ingeniero residente de interventoría.

Maquinarias y equipos = NO se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con la contratación de personal calificado y no calificado

31/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias moderadas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de Obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo

Actividades = Se continua la contratación del personal calificado y no calificado

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

01/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = Nubes moderadas

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría.

1 ingeniero residente de obra.

Maquinarias + equipos = No se evidenció en campo

Actividades = Se realiza la nivelación del personal calificado y no calificado para la construcción de la placa huella y la construcción de los alcantarillas.

[redacted]

02/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1 ingeniero residente de obra

(Maquinarias) = 1 Maestro de obra

2. Ayudantes de obra.

Maquinarias + equipos = NO se evidenció en campo

Actividades = se realiza cortes y figurado de aceros de refuerzo de 60.000 PSI para viga nosta de la placa huella y alcantarillas.

[redacted]

05/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas

Tarde = Seco

Personal de obra. = 1 ingeniero residente de interventoria.

1. Ingeniero residente de obra

1. almacenista de obra

2 Auxiliares de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidencio en campo.

Actividades = Se continua con el corte y figurado de aceros de refuerzo de 60.000 psi para la viga nostra de la PH y alcantarilla

04/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = Seco

Tarde = lluvias intensas.

Por domingo no se labora

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

03/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas

Tarde = Seco

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoria.


1. Ingeniero residente de obra


1. Maestro de obra

2 Ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con el corte y figurado de aceros de refuerzo de 60.000 psi para la viga nostra de la PH y alcantarilla







04/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = Seco

Tarde = lluvias intensas.

Día dominical no se labora





05/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

1. ingeniero residente de interventoria

1. Maestro de obra

1 Oficial de obra

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

	2 ayudantes de obra.
	Maquinaria y equipos = No se evidencio en campo.
	Actividades = se continua con el corte y figurado de aceros de refuerzo de 60.000 psi para la viga nivelada de la placa huella.
06/08/24	Registro de lluvias = Mañana = seco
	Tarde = seco
	Personal de obra: 1. ingeniero residente de obra
	1. ingeniero residente de interventoria
	1. maestro de obra
	1 oficial de obra.
	2 ayudantes de obra.
	Maquinarias y equipos = no se evidencio en campo
	Actividades = se continua con el corte y figurado de aceros de refuerzo de 60.000psi para la viga nivelada de la placa huella
07/08/24	Registro de lluvias = Mañana = seco
	Tarde = seco

Personal de obra= 1 ingeniero residente de obra
1. ingeniero residente de interventoria-
1. Maestro de obra.
1 Oficial de obra
2 ayudantes de obra
Maquinaria y equipos = 1. retro excavadora tipo pajarita.
Actividades = Se continua con el corte y figurado de los aceros de refuerzo de 60.000psi para la viga maestra de la Placa huella.

08/08/24 Registro de clima= Mañana= seco
Tarde= seco.
Personal de obra= 1 ingeniero residente de obra
1. ingeniero residente de interventoría
1 maestro de obra
1. Oficial de obra
2 ayudantes de obra.
Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajarita.
Actividades = Excavación y demolición de alcantarilla existente.
- Preparación, transporte y vaciado de concreto de

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

Limpieza de 14 mpa. y atraque para la tubería de concreto reforzado de 36".
- instalacion de tubería de concreto reforzado de 36"
- Relleno de tubería de 36" con material seleccionado.

09/08/24. Registro de lluvias= Mañana= Lluvia moderada
Tarde= Seco

Personal de obra= 1 ingeniero residente de interventoría.
1 ingeniero residente de obra.
1 maestro de obra
1 oficial de obra.
2 ayudantes de obra.

Maquinarias y equipo= 1 Retro excavadora tipo pajarita
1 Mezcladora de concreto

Actividades = excavación de descole.
- Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 mpa. para el solado de limpieza para la zapata del muro cabezal y caja puente.

10/08/24 Registro de lluvias= Mañana = lluvia intensa
Tarde= lluvia intensa.

Personal de obra= 1 ingeniero residente de obra
1 ingeniero residente de interventoría
1 maestro de obra
1 oficial de obra
2 ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajarita
1 mezcladora de concreto de 1.5 bultos

Actividades= remoción de tierra erosionada en la caja predial y en el solado de la descole.
- reinstalación del tubo de concreto reforzado de 36" del descole. de alcantarilla.
- Se incaron cercos de madera para la estabilización del terreno.

11/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = seco

Día Dominical no se labora.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

12/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas

tarde = seco.

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría

1 ingeniero residente de obra

1 maestro de obra

1 oficial de obra

2 ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajuata

1 Mezcladora de concreto de 1,5 bulto

Actividades = Se continua realizando cortes y figurado de aceros de refuerzo de 60.000 psi para el refuerzo transversal de la pluma huella.

13/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1 ingeniero residente de obra

1 ingeniero residente de interventoría

1 maestro de obra

1 oficial de obra

2 ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajuata.

1 mezcladora de concreto de 1.5 bultos

Actividades:= - Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 mpa. para solado de limpieza para la zolera del descole de la alcantarilla

14/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde. seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoria

1. ingeniero residente de Obra

1 maestro de obra

1 opical de obra

2 ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajarita

1 Mezcladora de concreto de 1.5 bultos

Actividades = Corte y Figurado de los aceros de refuerzo del Fondo de la Aleta y Zapata del muro cabezal del descole.

15/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

Personal de obra= 1 ingeniero residente de interventoría
1 ingeniero residente de obra
1 maestro de obra
1 oficial de obra
2 ayudantes de obra

Maquinarias y equipos= 1 Retro excavadora tipo pajunta
1 Mezcladora de concreto de 2.5 bultos

Actividades= preparación, transporte y vaciado de concreto de rampa con su respectivo acero de refuerzo de 60.000 psi para la placa superior de tubería de concreto reforzado de 36"

16/08/24 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde= seco

Personal de obra= 1 ingeniero residente de obra
1 ingeniero residente de interventoría
1 maestro de obra
1 oficial de obra
2 ayudantes de obra

Maquinarias y equipos= 1 pajunta (Retro excavadora)
1 Mezcladora de concreto de 2.5 bultos.

Actividades:= Corte y figurado de acero de refuerzo de 60.000 Psi para la zapata del muro cabezal la losa solera y dentellón del descole de la abantanilla:-

17/08/24. Registro de lluvias= Mañana = Seco
Tarde= Seco

Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra
1. Maestro de obra
1 Oficial de obra
3. Ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = 1 Retro excavadora tipo pajarita
1 Mezcladora de concreto

Actividades = Preparación, transporte y vaciado de concreto de 21 mpa para la zapata del muro cabezal y loza de la solera del descole.

18/08/24 Registro de lluvias= Mañana = Seco
Tarde= Seco

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

Día Dominical no se labora.

19/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvia moderada
Tarde = lluvia moderada.

personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra
1. maestro de obra
1. oficial de obra
3 Ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = 1. retro excavadora tipo zapatita
1. Mezcladora de concreto 1: bulto.

Actividades = se realiza corte y figurado de los aleros de refuerzo de 60.000 psi para las aletas y el muro cabezal.

20/08/24. Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra
1. maestro de obra

1. oficial de obra

3. ayudantes de obra

Maquinaria y equipos = 1. Retro-excavadora tipo pajarita

1. Mezcladora de concreto de 1.5 bultos

Actividades = limpieza de zonas de caja pereta y solera de material procedente de excavación ocasionada por la lluvia.

- se continua con la instalación de acero de refuerzo de 60.000 Psi para las vigetas y muro cortezal del descole.

21/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

1. maestro de obra

1. oficial de obra

3. Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajarita

1. Mezcladora de 1.5 bulto

Actividades = Preparación, transporte y vaciado de

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

Concreto de limpieza para la loza fondo de la caja pocetal.

22/08/24 Registro de lluvias= Mañana = seco
Tarde = seco

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría
1 ingeniero residente de obra
1 maestro de obra
3 ayudantes de obra

Maquinarias + equipos = 1 Retroexcavadora tipo pata rita
1 mezcladora de 1.5 bultos

Actividades = instalación de formaleta de madera para el muro cabezal, y aletas del descole de la alcantarilla.

23/08/24 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde= seco

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría
1 ingeniero residente de obra
1 maestro de obra

Scanned with CamScanner

1. Oficial de obra
3. Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1. retro excavadora tipo pajarita
1. Mezcladora de concreto de 1,5 bultos.

Actividades = Excavación de tubería existente parte exterior con maquina ~~tipo~~ retro excavadora tipo Pajarita para la alcantarilla.

• corte y figurado de acero de refuerzo de 60.000 Psi para placa de protección de tubería en concreto existente.

Preparación, transporte y vaciado de concreto de 21 mpa para placa de garantía y seguridad de la misma para así evitar posible aplastamiento de la misma.

[24/08/24] Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = seco

Personal de obra 1 ingeniero residente de obra
1 ingeniero residente de interventoría
1. Maestro de obra
1. oficial de obra

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

3. Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1. retro excavadora tipo Retroexcavadora

1 vibradora de concreto de 2 HP

Actividades = se continua con la instalación de formaleta de madera para las aletas y el muro cabezal para la ó el descole de la alcantarilla.

25/08/24. Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = lluvias intensas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoria, 1 ingeniero residente de obra

1. maestro de obra

1. oficial de obra.

2. ayudantes de obra

Actividades = Preparación, transporte y vaciado de concreto de 2 HP para las aletas y muro cabezal del descole.

26/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco
tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría,
1. ingeniero residente de obra
1. Maestro de obra.
1. Oficial de obra
3. Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1. retro excavadora tipo pajarita
1. Mezcladora de concreto

Actividades = Corte y preparado de cemento de referto de 60.000 PSI para los muros de la carga peatonal

27/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco
tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra
1 ingeniero residente de interventoría.
1 maestro de obra
3 Ayudantes de obra
1. Oficial de obra.

Maquinarias y equipos = 1. retro excavadora tipo pajarita

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

1. mezcladora de concreto de 1.5 sacos
1. vibradora compactadora

Actividades= se continua con la instalación de formaleta de madera para la caja para la cimentación

- Conformación de vía con material en la vereda Diagonal.

28/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias moderadas

Personal de obra= 1. ingeniero Residente de cimentación
1. ingeniero Residente de obra
1. Maestro de obra
1. Oficial de obra
3. Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos= 1. retro excavadora tipo pajarita
1. Mezcladora de concreto de 1.5 sacos
1. Rana compactadora.

Actividades= Figurado de acero de Refuerzo de 60.000 Psi para los muros de la caja para

- Instalación de formaleta de Madera para los muros de la caja poceta.
- Llegada de material Petreo a sitio de Obra.

29/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias moderadas

Personal de obra = 1. Ingeniero residente de interventoría
1. Ingeniero residente de obra
1. maestro de obra
3. Ayudantes de obra
1. oficial de obra.

Maquinarias y equipos = 1. retro excavadora tipo Pajarita
1. Mezcladora de concreto de 1.5 bultos
1. Rana compactadora.

Actividades = Preparación, Transporte y vaciado de concreto de concreto de 3000 psi para los muros de la caja poceta de alcantarilla.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

30/08/2024 Registro de lluvias - Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias intensas

Personal de obra - 1. ingeniero residente de obra

1. ingeniero residente de interventoría

1. maestro de obra

3 Ayudantes de obra

1. Oficial de obra.

Maquinaria y equipos = 1. retro excavadora tipo pajunta

1 mezcladora de concreto de 7.5 bultos

1. Rana compactadora

Actividades - se realiza su respectivo descorrido de formaleta - de madera de las muros de la caja poceta.

- se realiza limpieza del sitio de trabajo.

31/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde. lluvias intensas.

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

1. maestro de obra

5. ayudantes de obra

1 Oficial de obra.

Maquinarios y equipos= 1. Retro excavadora tipo pajarita
1. Mezcladora de concreto de 1,5 bultos
1. Rana compactadora

Actividades= limpieza de caja: pocetas y desde de la alcantarilla existente. (Pendiente para limpiar tubería).

- Preparación, transporte y vaciado de concreto de 3000 PSI para el piso de la caja poceta de la alcantarilla existente.

01/09/24 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde= lluvia moderada

Día Dominical no se labora.

02/09/24. Registro de lluvias= Mañana=
Tarde=

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

ANEXO 8.3.2.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Chontaduro – CS#4239

Convenio Solidario 4239 de 2023

OBJETO = Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Chontaduro del municipio de Florencia en el departamento del Caqueta, para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Contratista = Junta de acción comunal de la vereda Chontaduro
NIT: 901.724.821-6.
Rep. Legal: Jose Lizaldo Bocanegra

Interventor = Eikin David Ramos Mosquera.
NIT = 7.962.245-1

Fecha Orden de inicio =

William Oswaldo Rodrigues S.
Residente de obra

Diego Alejandro Morales Cortes
Residente de interventoría

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

24/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias intensas
Tarde: Lluvias intensas.

NOTA: Se realiza por parte de la junta de Acción Comunal (OAC) la actualización de información y contraseña de el Token para poder realizar pagos de compras de materiales de ferretería, transporte y petreos.

[redacted]

William Oswaldo Rodriguez S.
Residente de obra

Diego Alejandro Morales C.
Residente de interventoría.

25/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias intensas
Tarde: Lluvias intensas.

NOTA: Se continua con el problema con la actualización de datos por parte de la OAC con el Banco para la actuación del Token.

- Se inicia con el proceso de contratación del personal calificado y no calificado.

[redacted]

William Oswaldo Rodriguez S.
Residente de obra.


Diego Alejandro Morales C.
Residente de interventoría.


INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

26/06/2024 Registro de lluvias: Mañana = lluvias intensas
Tarde = seco.


NOTA = Se continua con el problema de la actuación del token para que la OAC realicen pagos a los proveedores.
- Se continua con el proceso de contratación de M. Obra calificada y no calificada.





27/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas.

NOTA = Se continua con el problema de actuacion del token para que la OAC relice los pagos pertinentes a los proveedores.
- Se continua con el proceso de contratacion de personal de mano de obra calificada y no calificada.





28/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias moderadas.

NOTA = Se continua con el problema de activación del token para que la OAC realice compras de los Materiales requeridos en obra.

Powered by CamScanner

-Se Continua con el proceso de Contratación de personal de mano de obra Calificada. y no calificada por parte de la OAC.

29/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias Moderadas
Tarde = lluvias intensas.

NOTA = Se Continua con el problema de activación del token para que la OAC Realice compras de Materiales requeridos en obra.

-Se Continua con el proceso de Contratación de personal de mano de obra Calificada y no Calificada por parte de la OAC.

-Se realiza exploración geotecnica de la zona de placa huella aguel (SDR)

30/06/2024. Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas

NOTA = Se continua con el problema de activación del token para que la OAC Realice Compras de Materiales requeridos en obra

-Se Continua con el proceso de Contratación de personal de mano de obra Calificada y no calificado por parte de la OAC.

-Levantamiento Topografico.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

01/07/2024 DÍA FESTIVO NO SE LABORÓ Registro lluvias = Mañana = Seco / Tarde = Seco

[redacted]

02/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = intensas
Tarde = moderadas

-personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoria
1. ingeniero Residente de obra

-Maquinarias y equipos = No se evidencian en campo.

Actividades = Se continuan con la actualización de datos por parte de la OAE y con el Banco para la activación de tokens para realizar compras.

-Se continua con la Contratación del personal Calificado y no calificado

[redacted]

03/07/2024. Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = seco

personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoria
1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidencian en campo.

Actividades = Se continua con la actualización de datos para la activación tokens

-Se continua con la contratación del personal Calificado y no calificado

[redacted]

Powered by CamScanner

04/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = lluvias intensas

05/07/2024) personal de obra = 1. Ingeniero Residente de interventoría.
1. Ingeniero residente de obra.
Maquinarias y equipos = no se evidencian en campo.
Actividades = Se continua con la actualización de datos por parte de la OAC y el banco para la activación del token.
- Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

[redacted] [redacted]

05/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas

Personal de obra = 1. Ingeniero Residente de interventoria.
1. Ingeniero Residente de obra

Maquinarias y equipos = no se evidenció en campo.
Actividades = Se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el banco para la activación del token.
- Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

[redacted] [redacted]

06/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner


Personal de obra = 1. Ingeniero residente de interventoría
1. Ingeniero Residente de obra.
Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.
Actividades = Se realiza la socialización del nuevo alcance de obra por parte de la interventoria para la comunidad de la vereda Chontaduro. Donde se explica el porque? se dio este nuevo alcance. de 96 m de Placa huella para hacer.
- Se continua con la actualización de datos por parte de la DAC con el Banco para la actuacción del token.
- Se continua con la contratación del Personal Calificado y no Calificado

07/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = Seco
Tarde = Seco
Dia Dominical no se labora.

08/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias moderadas
Personal de obra = 1. ingeniero Residente de Interventoria.
1. Ingeniero Residente de obra
Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo

Actividades = se continua con la actualización de datos por parte de la OAC con el Banco para la activación del token.

-Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.





09/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = Seco


Tarde = Seco


Personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoria

1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = NO se evidencio en campo.

Actividades = se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.





10/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas


Tarde = lluvias intensas

Personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoria.

1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = NO se evidencio en campo

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado





INDUCONTABLES

Powered by CamScanner


11/07/2024 Registro de lluvias= Mañana = lluvias moderadas
Tarde= lluvias intensas.

Personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoria.
1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.

Actividades = La OAC Realiza compras de ferreteria "cemento y aceros de refuerzo de 60.000 PSI" para la construcción de Placa huella de 9.5mL y la construcción de una alcantarilla.

- Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.







12/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
Tarde= seco

Personal de obra = 1. ingeniero Residente de interventoria
1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = no se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado





13/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas

Personal de obra = 1. Ingeniero Residente de interventoría
1. Ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

14/07/2024 Día Dominical no se labora.

15/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = seco

Personal de obra = 1. Ingeniero Residente de interventoría.
1. Ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

16/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = seco

Maquinarias y equipos = no se evidenció en campo.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Personal de obra= 1. Ingeniero Residente de obra
1. Ingeniero Residente de interventoría.

Actividades= Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

[redacted]

17/04/2024 Registro de lluvias= Mañana= Muy nublado
Tarde = Seco

Personal de obra = 1. Ingeniero Residente de interventoría.
1. Ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo.

Actividades= Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

[redacted]

18/04/2024 Registro de lluvias= Mañana= Lluvias intensas
Tarde = Seco

Personal de obra = 1. Ingeniero Residente de interventoría.
1. Ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

[redacted]

14/07/2024.	Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas Tarde = lluvias intensas. Personal de obra = 1. Ingeniero Residente de obra 1. Ingeniero Residente de interventoría. Maquinarias y equipos = No se evidencio en campo. Actividades = Transporte a sitio de obra de materiales de Ferretería. para la construcción de placa huella y alcantarilla - se continua con la contratación del personal calificado y no calificado
20/07/2024	Día Festivo no se laboró
21/07/2024	Día Dominical no se labora.
22/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = seco Tarde = seco Personal de obra = 1. Ingeniero Residente de interventoría. 1. Ingeniero Residente de obra. Maquinarias y equipos = no se evidencio en campo. Actividades = Se continua con la contratación

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

del personal calificado y no calificado.

23/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias moderadas.

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra.

Maquinarias y equipos: No se evidenció en campo

Actividades: Se continua ~~con el personal~~ con la contratación del personal calificado y no calificado.

24/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría.

1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.

Actividades = En el momento el distribuidor no cuenta con la tubería de concreto reforzado de 36" para entregar.


-Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.


25/07/2024 Registro de lluvias: Mañana= lluvias intensas
Tarde= seco

Personal de obra= 1. Ingeniero Residente de obra
1. ingeniero Residente de interventoría.

Maquinarias y equipos= no se evidenció en campo.

Actividades: Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.







26/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde= lluvias intensas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría.
1. Ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo.

Actividades= Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.





27/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde= seco

Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Maquinarias y equipos = No se evidencio en campo.
Actividades = Se continua con la contratacion del personal
Calificado y no Calificado.

[redacted]

28/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias moderadas

Dia Dominical no se labora.

[redacted]

29/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoria
1. ingeniero Residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.
Actividades = Se continua con la contratación del Personal
Calificado y no calificado.

[redacted]

30/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas.


Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra.


Powered by CamScanner

1. Ingeniero Residente de interventoría

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo

Actividades= Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.





31/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas


Tarde = lluvias Moderadas.


Personal de obra= 1. ingeniero residente de obra

1. ingeniero residente de interventoría

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo.

Actividades= Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.





01/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo

Actividades= Se realizó la inducción del personal calificado y no calificado para realizar

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

labores en la construcción de la placa huella y la construcción de la alcantarilla.

02/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = Seco

Tarde = Seco.

Personal de obra = 1 ingeniero residente de obra

1. Ingeniero residente de interventoría

1. Maestro de obra.

2. ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = No se encuentró en campo

Actividades = Se realiza cortes de aceros de refuerzo de 60.000 PSI. Para la construcción de la alcantarilla, De mismo modo realizan el figurado de acero para los flejes de la viga riostra de la Placa huella.

03/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = Lluvias intensas

Tarde = Seco

Personal de obra = 1. Ingeniero residente de interventoría

1. Ingeniero residente de obra

1. Maestro de obra.

2. Dificultades de obra.

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con el corte y figurado de aceros de refuerzo de 60.000 Psi para la viga arriostra de la placa huella y alcantarilla.

04/08/2024 Registro de lluvias= Mañana= Seco

Tarde= lluvias intensas.

Dia Dominical no se laboro.

05/08/24 Registro de lluvias= Mañana =

Tarde=

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

2. Ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con el corte y figurado de aceros de refuerzo de 60.000 Psi para la viguetas de la Placa huella y alcantarilla.

04/08/2024 Registro de lluvias= Mañana= Seco

Tarde= lluvias intensas.

Dia Dominical no se labora.

05/08/24 Registro de lluvias= Mañana = Seco

Tarde= Seco

Personal de obra= 1. Ingeniero residente de obra

1. Ingeniero residente de interventoría

1 Maestro de obra

2 Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo

Actividades = Se continua con el corte y figurado de aceros de refuerzo de 60.000 Psi Para la viguetas de la placa huella y alcantarilla

06/08/2024	Registro de lluvias = Mañana = Seco Tarde = Seco Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra 1. Ingeniero residente de interventoría. 1 maestro de obra. 2 Ayudantes de obra. Maquinarias y equipos = No se evidencia en campo. Actividades = Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi para la viga norte. y para la alcantarilla.
07/08/2024	Registro de lluvias = Mañana = Seco Tarde = Seco Día festivo no se laboró
08/08/2024	Registro de lluvias = Mañana = Seco Tarde = Seco Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra 1. Ingeniero residente de interventoría 1 maestro de obra

Scanned with CamScanner

1. Oficial de obra.

1. ayudante.

Maquinarias y equipos: 1 Retroexcavadora tipo Pajarita.

Actividades: Se continua con el corte y picado de acero de refuerzo de 60.000 psi para la vigas nostas y para la alcantarillas.

09/08/24 Registro de Lluvias Mañana = Nula moderada

tarde = seco

Personal de obra: 1 ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

1 Maestro de obra

1 Oficial de obra

2 ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = 1 Retro excavadora tipo pajarita.

1. mezcladora de concreto trompo

Actividades: Excavación y demolición de alcantarilla existente.

- (Solos) Preparación, transporte y vaciado de concreto de limpieza de 14 mpa y atraque para la tubería de concreto de 36".

- instalación de tubería de concreto reforzada de 36".
- Relleno de tubería de 36" con material seleccionado:

10/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas
Tarde = lluvias intensas.

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría.
1. ingeniero residente de obra.
1. maestro de obra
1. operador de obra.
2 ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 Retro excavadora tipo pajarita
1 mezcladora de concreto de 25 bultos

Actividades = En este día se presentó fuertes lluvias durante el día y lo que se logró avanzar. Fue el el corte y figurado de aceros de refuerzos de 60.000 psi para el muro cabezal y zapata.

11/08/24 Registro de lluvias = Mañana = Seco

Tarde = Seco

Dia Dominical no se labora

12/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas

Tarde = Seco.

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría.

1. ingeniero residente de obra

1 maestro de obra

1. Oficial de obra

2. ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajarita.

1. Mezcladora de concreto de 1.5 bultos

Actividades = Se continua con el corte de acero de refuerzo de 60000 psi transversal para la placa Huella

13/08/24. Registro de lluvias = Mañana = Seco

Tarde = Seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

1. Residente de interventoría
1 maestro de obra
1. oficial de obra.
2. ayudantes de obra

Maquinarias y equipos= 1. retro excavadora tipo pagarita.
1 Mezcladora de concreto.

Actividades = Se realiza excavación de aletas con el encole de la alcantarilla con la retro excavadora tipo pagarita..
- Llegada de material sobre sitio de Obra.
- Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 mpa. Para la zapata del muro cabezal.

14/08/24 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde= seco.

Personal de obra= 1 ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra.
1. maestro de obra.
1. oficial de obra
2 ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos= 1 retro excavadora tipo pagarita.

1 mezcladora de concreto de 1.5 bultos.

Actividades = Preparación, transporte y vaciado de concreto de 21 mpa con su respectivo acero de refuerzo de 60.000 psi para la placa superior de tubería de concreto reforzado de 36".

15/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco.

Personal de obra = 1 ingeniero residente de obra

1. ingeniero residente de interventoría

1 maestro de obra.

1 oficial de obra

2 ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajarito

1. mezcladora de concreto.

Actividades = instalación de acero de refuerzo para la zapata del muro cabezal del descole.

- Preparación, transporte y vaciado de concreto de 21 mpa. para zapata del muro de cabezal.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

16/08/24 Registro de lluvias = Mañana = SECO

Tarde = SECO

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría

1 ingeniero residente de obra

1 maestro de obra

1 Oficial de obra

2 ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajarita

1 mezcladora de concreto de 1/5 bultos

Actividades = Se realiza el corte y figurado del acero de refuerzo para la losa de la soleta y los bastones verticales de las aletas del descole con su respectivo dentellón.

17/08/24 Registro de lluvias = Mañana = SECO

Tarde = SECO

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1 ingeniero residente

1. maestro de obra

1. oficial

2 Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1. retro excavadora tipo pajaruta.
1. mezcladora de concreto de 1,5 bultos

Actividades = Preparación, transporte y vaciado de concreto de 21 mpa. para la solera y demolición para el descole de la cal canturilla.

18/08/24

Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = seco

Día Dominical no se labora.

19/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvia moderada
Tarde = lluvia moderada.

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoria
1. ingeniero residente de obra
1. Maestro de obra
1. Oficial de obra
2 ayudantes.

Maquinarias y equipos = 1. retro excavadora tipo pajaruta
Actividades = se realiza corte y figurado de los aceros de refuerzo de 60.000 psi

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

para las verticales para las aletas y muro de cabezal.

20/08/24 Registro de lluvias = Mañana = Seco

Tarde. Seco

Personal de obra = Ingeniero residente.

1. ingeniero residente de interventoria

1. maestro de obra

10 = icial. de obra

5. Ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = 1. retro excavadora tipo pajanta

1. Mezcladora de concreto de 1,5 bultos.

Actividades = llegada de material de sub base

- Armado de acero de refuerzo de 60.000 psi Horizontal para las aletas y muro cabezal del descole.

21/08/24 Registro de lluvia = Mañana = Seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1 ingeniero residente de obra.
1. Maestro de obra.
1. Oficial de obra
3. Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo payurita
1. Mezcladora de concreto de 1.5 bultos

Actividades = llegada de material sub base.
- llegada de material triturado y arena.
- instalación de formaleta de madera para las aletas y muro cabezal para el descole de la alcantarilla

22/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco
tarde. seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra
1. ingeniero residente de interventoría
1. Maestro de obra
1. Oficial de obra.
3. Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1. retro-excavadora Payurita
1. Mezcladora de concreto de 1.5 bultos.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

Actividades= Preparacion, transporte y vaciado de concreto de 21 mpa para el muro cabezal y aletas para el dosole de la alcantarilla.

23/08/24 Registro de lluvias= Mañana = seco
Tarde= seco

Personal de obras= 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra
1. Maestro de obra
3. Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos= 1 retro excavadora tipo pajanta
1. Mezcladora de concreto de 1.5 bultos

Actividades= retiro de Formaleta de madera de las aletas y muro cabezal del desole.
- Llegada de material sub base.

24/08/24 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde seco

Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra

Scanned with CamScanner

1 maestro de obra

3. Ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos= 1. retro excavadora tipo pajarita

1 Mezcladora de concreto de 1.5 bultos.

Actividades= Corte y figurado de acero de refuerzo de 60.000 psi para la zapata del muro Cabezal, solera y dentellón del encole de la alcantarilla.

- Preparación, transporte y vaciado de concreto de 21 Mpa para la zapata del muro cabeza y solera del encole de la alcantarilla.

25/08/24 Registro de lluvias= Mañana= seco

Tarde lluvias intensas.

Día Dominical no se labora

26/08/24. Registro de lluvias= Mañana= seco

Tarde= seco

Personal de obra= 1. Ingeniero residente de interventoría

1. Ingeniero residente de obra

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

1. maestro de obra

3. Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajarita

- 1. Mezcladora 1,5 bultos

Actividades = Corte y figurado de acero de refuerzo de 60.000 PSI para el muro cabezal y aletas del anole de la alcantarilla.

- llegada de material Sub base

27/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco

tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

1. ingeniero residente de interventoria

1. Maestro de obra

1 oficial de obra

3 Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora pajarita

1. Mezcladora de concreto de 1,5 bultos

Actividades = llegada de material de sub base

- instalacion de formaleta de madera para las aletas y muro cabezal del

encole de la alcantarilla.

- conformación del ~~sub~~ terreno para el tramo de placa huella a construir:

28/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

tarde: = lluvias moderadas

personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente ~~ambiental~~

1. oficial de obra

1. maestro de obra

3 Ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo pajarita

1. Mezcladora de concreto de 1.5 bultos

Actividades = Preparación, transporte y vaciado de concreto de 21mpa para las cuetas

29/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias moderadas

Personal de Obra = 1. ingeniero residente de interventoría.

1. ingeniero residente de obra.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

1. Maestro de obra
1. Oficial de obra
3 Ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo Pajarita.
1. Mezcladora de concreto de 1.5 bultos
1. Rana compactadora.

Actividades = Desencofrado de formaleta de madera para las aletas y muro cabezal zona de encole de la alcantarilla.

- Conformación de la vía con ~~equipamiento~~ tipo Pajarita.

30/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas.

Personal de obra = 1. Ingeniero residente de obra
1. Ingeniero residente de interventoría
1. Maestro de obra
1. Oficial de obra
3 Ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = 1. Retro excavadora tipo pajarita
1. Mezcladora de concreto de 1.5 bultos

1. Rana compactadora.

Actividades= instalación de sub base a maquina tipo pajarita.

- Llegada de material Pétreo a sitio de obra (Arena y Triturado)

31/08/24. Registro de lluvias= Mañana= Seco

Tarde= lluvias intensas

Personal de obra= 1. ingeniero residente de obra

1. ingeniero residente de infraestructura

1. Maestro de obra

1. Oficial de obra

3 Ayudantes de obra

Maquinarias y equipos= 1. retro excavadora tipo pajarita

1. mezcladora de concreto de 1.5 bultos

1. Rana compactadora.

Actividades= se continua con la instalación de sub base a maquina con la Retro excavadora tipo pajarita.

- Conformación de la cuneta de la plataforma.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

01/09/24 Registro de lluvias = Mañana = Seco.
Tarde = Lluvia moderada
Día dominical no se laboró.

02/09/24 Registro de lluvias = Mañana =
Tarde =

ANEXO 8.3.3.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Conga – CS#3681

Convenio solidario 3681 de 2023

OBJETO = Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la vereda La Conga del Municipio Paujil, Departamento de Caqueta, para el mantenimiento y mejoramiento vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Contratista = Junta de Accion comunal de la vereda La Conga

Nit = 901. 164. 516-0

Rep. Legal = Oscar Daniel Echeverry Parrales.

Interventor: Eikin David Ramos Mosquera

Nit = 7. 962. 245 -1

Fecha Orden de inicio = 22 de Diciembre de 2023

Cristian Andres Vargas F.
Residente de obra

Diego Alejandro Morales Cortes
Residente de interventoría

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

24/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias moderadas

NOTA = Se realiza por parte de la junta de acción Comunal (JAC) la actualización de la información y contraseña del token para poder realizar pagos de compras de Materiales de ferretería, transporte y Retreos.

Cristhan A Vargas F

Cristhan Andres Vargas F
Residente de obra

Diego Alejandro Morales L.
Residente de Interventoría

25/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas

NOTA = Se continua con el problema con la actualización de datos por parte de la JAC con el banco para la activación de token
-Se inicia con el proceso de contratación del personal calificado y no calificado

Cristhan A Vargas F

26/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = lluvias intensas

NOTA = Se continua con el problema de activación del token

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

para que la Otc realice Compras de Materiales requeridos en Obra.
-Se Continua Con el proceso de contratación de personal de mano de obra Calificada y no calificada por parte de la Otc.

Cinthia A Vargas T

27/04/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas

NOTA: Se continua con el problema de activación del token para que la Otc realice Compras de Materiales requeridos en obra
-Se Continua con el proceso de contratación de personal de mano de obra Calificada y no calificada por parte de la Otc.

Cinthia A Vargas T

28/04/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias moderadas
nota: Se continua con el problema de activación de la cuenta para que la Otc realice Compras de materiales requeridos en obra
Se Continua con el proceso de Contratación de personal de mano de obra Calificada y no calificada por parte de la Otc.

Cinthia A Vargas T

Powered by CamScanner

29/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas

NOTA: Se continua con el problema de actuacion del token para que la OHC realice compras de materiales requeridos en obra.
- Se continua con el proceso de contratacion de personal de mano de obra calificada y no calificada por parte de la OHC
- Se realiza levantamiento topografico de la zona para la placa huella de 111 ml

Cinthia A Vargas T.

30/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas.

Nota = Dia Dominical no se labora.

Cinthia A Vargas T.

01/07/2024 Registro de lluvias = Mañana =
Tarde =

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

29/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas

NOTA: Se continua con el problema de activacion del token para que la OHC realice compras de materiales requeridos en obra.
- Se continua con el proceso de contratacion de personal de mano de obra calificada y no calificada por parte de la OHC
- Se realiza levantamiento topografico de la zona para la placa nivelada de 111 ml

Cinthia A Vargas T.

30/06/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas.

Nota = Dia Dominical no se labora.

Cinthia A Vargas T.

01/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = Seco
Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoria.
1. ingeniero residente de obra
Maquinarias y equipos = No se evidencio en campo

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Actividades = Se continua con el Proceso de contratación del personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas T.

02/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = Seco

Tarde = lluvias moderadas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría.

1. ingeniero residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con el proceso de contratacion del personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas T.

03/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias intensas

Tarde = lluvias intensas

Personal de Obra = 1. ingeniero Residente de Interventoría

1. ingeniero Residente de obra.

~~(Personal de obra)~~ Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con el Proceso de contratación del personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas T.

Powered by CamScanner

04/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas

Tarde= lluvias moderadas

Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo.

Actividades= Se continua con el Proceso de contratación del Personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas F.

05/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas

Tarde= lluvias moderadas

Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría.

1. ingeniero Residente de obra

Maquinarias y equipos= No se evidencio en campo.

Actividades= Se realizó compra de materiales de ferretería pago de anticipo de Transporte y alquiler de equipos.

-se continua con la contratación del personal Calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas F.

06/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas

Tarde= lluvias moderadas

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra.
Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo
Actividades= Se continua con la contratación de personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas T.


07/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
Tarde= lluvias moderadas
Dia Dominical no se labora.

Cinthia A Vargas T.

08/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde= seco
Personal de Obra= 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra.
Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo
Actividades= se continua con la contratación de personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas T.

Powered by CamScanner

09/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = seco Tarde = seco Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría 1. ingeniero residente de obra Maquinarias y equipos = No se evidencio en campo. Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado: Cinthia Vargas 
10/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = seco Tarde = lluvias intensas Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría 1. ingeniero residente de obra Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo. Actividades = se continua con la contratación del personal calificado y no calificado. Cinthia Vargas 
11/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas Tarde = lluvias moderadas Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra 1. ingeniero residente de interventoría

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Maquinarias y equipos = NO se evidencio en campo
Actividades = se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas T.

12/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias moderadas
Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoria
1. ingeniero residente de obra
Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo
Actividades = Compra de materiales de ferretería
- se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas T.

13/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = seco
Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría.
1. ingeniero residente de obra.
Maquinarias y equipos = no se evidenció en campo
Actividades = se continua la contratación del personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas T.

Powered by CamScanner

14/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
Tarde= Seco
Día Dominical no se labora.
Cristhian A Vargas F.

15/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= Seco
Tarde= Seco
Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero Residente de obra.
Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo
Actividades= se continua con la contratación de personal calificado y no calificado
Cristhian A Vargas F.

16/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
Tarde = lluvias moderadas
Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero Residente de obra.
Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo.
Actividades= Se continua con la contratación de personal calificado y no calificado
Cristhian A Vargas F.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

17/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias moderadas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidencio en campo

Actividades = Se continua con la contratacion de personal

Calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas F.

18/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias intensas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

1. ingeniero residente de interventoria.

Maquinarias y equipos = no se evidencio en campo

Actividades = Se continua con la contratacion de personal

Calificado y no calificado

Cinthia A Vargas F.

19/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias moderadas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra.

Powered by CamScanner

Maquinarias y equipos = No se evidencia en campo

Actividades = Se continua con la contratación de Personal Calificado y no calificado:

Cristhian A Vargas T.

20/07/2024 Registro de lluvia = Mañana = Lluvias moderadas

Tarde = Lluvias intensas

Día festivo no se labora.

Cristhian A Vargas T.

21/07/2024 Registro de lluvia = Mañana = Lluvia moderada

Tarde = Seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

1. ingeniero residente de interventoría

Día Dominical no se labora.

(22/07/2024) Cristhian A Vargas T.

22/07/2024 Registro de lluvia = Mañana = Lluvias intensas

Tarde = Lluvias intensas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

	Actividades = se continua con la contratación del personal calificado y no calificados.
23/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas Tarde = seco
	Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoria 1 ingeniero residente obra.
	Maquinarias y Equipos = 1. retro excavadora tipo pajarita
	Actividades = se realiza corte de taludes con maquinaria retro excavadora tipo pajarita y perfilamiento de plataforma - se continua con la contratación de personal calificado y no calificado.
24/07/2024	Registro de lluvias = Mañana = seco Tarde = seco
	Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría. 1 ingeniero residente de obra.
	Maquinarias y equipos = 1. Retro excavadora tipo pajarita
	Actividades = se continua con los cortes de taludes con maquinaria retro excavadora tipo pajarita.

Powered by CamScanner

y la perfilacion del tramo de placa huella de los 111 ml.

-Se continua con la contratacion del personal calificado y no calificado.

Cristian A Vargas T.

25/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= seco

Tarde= seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

1 ingeniero residente de interventoria

Maquinarias y equipos = 1. retro excavadora tipo pajarita

Actividades = Se continua con los cortes de taludes y perfilacion de la placaca huella con maquina tipo pajarita.

-Se continua con la contratacion del personal calificado y no calificado

Cristian A Vargas T.

26/07/2024 Registro de lluvias= Mañana= seco

Tarde= seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

1. ingeniero residente de interventoria

Maquinarias y equipos=1. retro excavadora tipo pajarita:

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Actividades = Se continua con los cortes de taludes y la Perfilacion de la Placa huella con maquina retro excavadora tipo Pajuntas
- Se continua con la contratacion del personal calificado y no calificado

Cinthia A Vargas T.

24/07/2024 Registro de lluvias = Mañana = Lluvias intensas
Tarde = Lluvias intensas.
Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra
Maquinarias y equipos = 1 retro excavadora tipo Pajuntas
Actividades = Se continua con los cortes de taludes y la Perfilacion de la placa huella con maquina retro excavadora tipo pajuntas.
- Se continua con la contratacion del personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas T.

28/08/2024 Registro de lluvias = Mañana = Horas moderadas
Tarde = Seco
Ya Dominical no se labora

29/07/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

1 ingeniero residente de interventoría

Maquinarias y equipos = no se evidenciaron en campo

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

Cristhian A Vargas F.

30/07/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = lluvias intensas

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

Maquinarias y equipos = no se evidenció en campo

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

Cristhian A Vargas F.

31/07/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Maquinarias y equipos= no se evidencio en campo.
Actividades= se continua con la contratación del personal
Calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas F.

01/08/2024 Registro de lluvias= mañana= lluvias moderadas
tarde= lluvias intensas
Personal de obra= 1 ingeniero residente de interventoría
1 ingeniero residente de obra
Maquinarias y equipos= no se evidenció en campo
Actividades= se continua con la contratación del personal
Calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas F.

02/08/2024 Registro de lluvias= Mañana= seco
tarde= seco
Personal de obra= 1 ingeniero residente de obra
1 ingeniero residente de interventoría
Maquinarias y equipos= no se evidenció en campo
Actividades= se continua en la contratación de personal
calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas F.

Powered by CamScanner

03/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = lluvias intensas.

Personal de obra = 1 ingeniera residente de interventoría
1 ingeniero residente de obra

Maquinarias y equipos = no se evidencia en campo.

Actividades = se continua con la construcción de personal calificado y no calificado.

Cristian A Vargas T.

04/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = seco

Día Dominical no se labora

Cristian A Vargas T.

05/08/24 Registro de lluvias = Mañana =
Tarde =

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

03/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderada:
Tarde = lluvias intensas.
Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra.
Maquinarias y equipos = no se evidencia en campo.
Actividades = se continua con la caracterización de personal calificado y no calificado.

Cristian A Vargas T.

04/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = seco
Día Dominical no se labora

Cristian A Vargas T.

05/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = seco.
Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra
Maquinarias y equipos = no se evidencia en campo.
Actividades = se continua con la caracterización del personal calificado

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

06/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1 ingeniero residente de obra

Maquinarias + equipos = No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado + no calificado.

Cinthia A Vargas F.

07/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

Maquinarias + equipos = No se evidenció en campo.

Actividades = Se continua con la contratación del personal calificado + no calificado.

Cinthia A Vargas F.

08/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas.

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

Scanned with CamScanner

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo
Actividades= Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas F.

09/08/24 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
tarde= Seco
Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra.
Maquinarias y equipos= No se evidencio en campo.
Actividades= Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas F.

10/08/24 Registro de lluvias = Mañana= lluvias moderadas
tarde= lluvias intensas
Personal de obra= 1. ingeniero residente de obra
1. ingeniero residente de interventoría
Maquinarias y equipos= No se evidencio en campo
Actividades= Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

Cinthia A Vargas F.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

11/08/24. Registro de lluvias Mañana= seco

Tarde= seco

Día Dominical no se labora.

Cinthia A Vargas F.

12/08/24. Registro de lluvias = Mañana= lluvias moderadas

Tarde= seco

Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra.

Maquinarias y equipos= no se evidencio en campo

Actividades= llegada de material sub base a sitio de obra.

-se continua con la contratación del personal calificado y no calificado.

Cinthia A Vargas F.

13/08/24 Registro de lluvias= Mañana = seco

Tarde= seco

Personal de obra= 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

Maquinarias y equipos= no se evidencio en campo

Actividades = llegada de material sub base

a sitio de obra. y material de ferretería al sitio de obra.

Cristhian A Vargas F.

14/08/24 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
Tarde= seco

Personal de obra = 1. Ingeniero residente de interventoría
1. Ingeniero residente de obra

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo

Actividades= Se continua con la contratación del personal calificado y no calificado

- Llegada de material Subbase a sitio de obra.

Cristhian A Vargas F.

15/08/24 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde= seco

Personal de obra = 1. Ingeniero residente de obra
1 Ingeniero residente de interventoría

Maquinarias y equipos= No se evidenció en campo

Actividades= Se continua con la contratación del personal calificado.

Cristhian A Vargas F.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

16/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = lluvias intensas.

Maquinaria Personal de obra = 1 ingeniero residente

1 ingeniero residente de interventoría

Maquinaria + equipos = NO se evidencia en campo

Actividades = Se continua con la contratación de personal calificado y no calificado.

- Llegada de material sub base al sitio de obra.

Cristian A Vargas T.

17/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría

1 ingeniero residente de obra

Maquinarias + equipos = no se evidencia en campo

Actividades = Se continua con la contratación de personal calificado y no calificado.

- Llegada de material de sub base al sitio de obra

Cristian A Vargas T.

18/08/24 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
Tarde= Seco

Día Dominical no se labora

Cristhian A Vargas F.

19/08/24 Registro de lluvias= Mañana= lluvias moderadas
Tarde= lluvias intensas.

Día festivo no se elabora.

Cristhian A Vargas F.

20/08/24 Registro de lluvias= Mañana= seco
Tarde= seco

Personal de obra= 1. ingeniero Residente de obra
1 ingeniero residente de interventoría
1 maestro de obra
1 oficial de obra.

Maquinaria y equipo= No se evidenció en campo.

Actividades= se realiza la construcción de la bodega para el almacenamiento de los materiales de ferretería

Cristhian A Vargas F.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

21/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = lluvias intensas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

1. maestro de obra

1. oficial de obra

Maquinarias y equipos = NO se evidenció en campo

Actividades = llegada de material de sub base.

- Se continua con la construcción de la bodega para el almacenamiento de materiales de ferretería

Cristhian A Vargas F.

22/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra

1. maestro de obra

1 oficial de obra.

Maquinarias y equipos = NO se evidenció en campo

Actividades = llegada de material sub base

- Se realiza el armado de acero de refuerzo de 60.000 PSI para las vigas nuestras

Scanned with CamScanner

de la placa huella.

Cristhian A Vargas T.

23/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas

Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de obra

1. Ingeniero residente interventoria

1. maestro de obra.

1. Oficial de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidencia en campo.

Actividades = se continua con el armado de acero de refuerzo de 60.000 Psi Para las vigas nates.

- llegada de arena al sitio de obra.

Cristhian A Vargas T.

24/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra.

1 maestro de obra

Maquinarias y equipos = No se evidencia en campo

Actividades = Se continua con el armado de acero de

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

refuerzo de 60.000 psi para las vigas nortes de la Placa huella

Cinthia A Vargas T.

25/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = lluvias intensas.

Día Dominical no se labora.

Cinthia A Vargas T.

26/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco

Tarde = seco

personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría

1. ingeniero residente de obra.

1. maestro de obra

1 oficial de obra.

Maquinaria y equipos = no se evidenció en campo.

Actividades = se continua con el armado de acero de refuerzo de 60.000 psi para la viga norte de la Placa huella.

Cinthia A Vargas T.

Scanned with CamScanner

27/08/24 Registro de lluvias = Mañana = seco
Tarde = seco

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra.
1. maestro de obra
3. Ayudantes de obra.
1. oficial de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo
Actividades = se continua con el armado de acero de refuerzo de 60.000 Psi para la viga nosta de la placa huella.
- Llegada de material granular duro al sitio de obra

Cristian A Vargas F.

28/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde. lluvias intensas.

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra
1. Maestro de obra
1. oficial de obra
3 Ayudantes

Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

	Actividades = Se continua con el armado de acero de refuerzo de 60 000 Psi para la viga viga de la placa huella. - Llegada de Material pétreo (Arena y grava) al sitio de obra y de material de ferretería. Cinthia A Vargas F.
29/08/24	Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas tarde = lluvias intensas
	Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría 1. ingeniero residente obra. 1. maestro de obra. 1. oficial de obra. 3. Ayudantes de obra.
	Maquinarias y equipos = No se evidenció en campo
	Actividades = Corte y figurado de acero de refuerzo de 60.000 Psi para el bordillo y la huella de el tramo de placa huella. Cinthia A Vargas F.
30/08/24	Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas tarde = lluvias intensas

Personal de obra = 1. ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra
1. maestro de obra
1. Oficial de obra.
3. Ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = No se evidencio en campo.

Actividades = cortes de acero de refuerzo de 60.000 psi (Parrilla) de la escalera transversal de las huellas y bordillos de el frame de placa huella.

- Llegada de material pétreo a sitio de obra

Cristian A Vargas H.

31/08/24 Registro de lluvias = Mañana = lluvias moderadas
Tarde = Seco.

Personal de obra = 1 ingeniero residente de interventoría
1. ingeniero residente de obra.
1 maestro de obra
1. oficial de obra
3 ayudantes de obra.

Maquinarias y equipos = no se evidenció en campo

Actividades = se continua con los cortes del acero

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

del acero de refuerzo de 60.000 PSI de la Seccion transversal de las huellas, bordillo del tramo de placa huella,

Cinthia A Vargas F.

01/09/24 Registro de Horas = Mañana = seco
Tarde = seco

Dia Dominical no se labora

Cinthia A Vargas F.

02/09/24 Registro de Horas = Mañana =
Tarde.

ANEXO 8.4.

INFORMES SEMANALES

ANEXO 8.4.1.

Informe semanal de la Vereda El Diamante – CS#3900

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	11/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 19 del 5/08/2024 al 11/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

96 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 96 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI; LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3900 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.042.125,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.042.125,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.042.125	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.042.125,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 100.453.153,49	50,216%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.056.296,00	9,526%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-40,690%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.554.538,97	10,775%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.286.501,00	1,643%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10,775% Avance o Atraso Físico % -40,690%
Meta Física Ejecutada % 4,542%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	1
*	placa huella	ML	96
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0,467%				
Ejec	33,333%				
Prog	38,400%				
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código:1800, en el acceso a la Vereda Diamante en Km 30+000 de la vía – Filo Chontaduro –Florencia código: 180009

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	11/08/2024
			(Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO: SI	X NO
	PÉTREOS DEL CAQUETÁ	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) LLEGADA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA AL SITIO DE OBRA

2) EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 36"

3) PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA EL CUERPO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36"

4) SE REALIZA COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS Y DE FERRETERÍA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE LA LLEGADA DE MATERIALES PÉTREOS Y DE FERRERETERÍA

2) SE PRETENDE REALIZAR LOS CORTES Y FIGURADO DE LOS ACEROS DE REFUERZO DE LAS ALETAS Y EL CAJON DE LA ALCANTARILLA

3) SE PRETENDE REALIZAR EL SOLADO DE LIMPIEZA PARA LA CAJA POCETA Y LA SOLERA DEL DESCOLE DE LA ALCANTARILLA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA DE CONCRETO 36"



SOLADO DE LIMPIEZA PARA CUERPO DE TUBERIA 36"



CONCRETO DE 14 MPA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 20 del 12/08/2024 al 18/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

96 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 96 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI; LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3900 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.042.125,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.042.125,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.042.125	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.042.125,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 115.736.371,84	57,856%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 22.210.255,00	11,103%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-46,753%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.283.218,35	7,640%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.959,00	1,577%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,640% Avance o Atraso Físico % -46,753%
Meta Física Ejecutada % 16,000%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* alcaltarillas	Unidad	1
* placa huella	ML	96
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0,533%				
Ejec	33,333%				
Prog	51,200%				
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código:1800, en el acceso a la Vereda Diamante en Km 30+000 de la vía – Filo Chontaduro –Florencia código: 180009

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO: SI	X NO
	PÉTREOS DEL CAQUETÁ	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LA ZAPATA DEL MURO CABEZAL, DENTELLÓN, ALETAS, PARRILLA DE LA SOLERA DEL DESCOLE DE LA ALCANTARILLA Y PLACA DE REFUERZO DEL CUERPO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 36"

2) PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LA ZAPATA DEL MURO CABEZAL Y SOLERA DEL DESCOLE

3) CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LA CAJA POCETA DEL ENCOLE DE LA ALCATARILLA

4) LLEGADA DE MATERIAL PÉTREO (TRITURADI Y ARENA)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE PARA LA PROXIMA SEMANA REALIZAR LAS ALETAS DEL DESCOLE Y LA CAJA POCETA DEL ENCOLE DE LA ALCANTARILLA.

2) PRE PRETENTE LA LLEGADA ME MATERIAL DE SUBBASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI SOLERA, ZAPATA Y ALETAS PARA EL DESCOLE DE ALCANTARILLA



PREPARACIÓN TRANASPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LA SOLERA DEL DESCOLE DE LA ALCANTARILLA



CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LA CAJA POCETA DE LA ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 21 del 19/08/2024 al 25/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

96 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 96 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI; LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3900 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.042.125,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.042.125,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.042.125	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.042.125,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 131.019.590,19	65,496%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25.812.740,00	12,904%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-52,592%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.283.218,35	7,640%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.602.486,00	1,801%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,640% Avance o Atraso Físico % -52,592%
Meta Física Ejecutada % 18,000%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	1
*	placa huella	ML	96
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0,533%				
Ejec	83,333%				
Prog	57,600%				
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código:1800, en el acceso a la Vereda Diamante en Km 30+000 de la vía – Filo Chontaduro –Florencia código: 180009

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO: SI	X NO
	PÉTREOS DEL CAQUETÁ	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE REALIZA CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL DE 60.000 PSI PARA LAS ALETAS Y CAJA POCETA

2) PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LAS ALETAS DEL DESCOLE Y LA LOSA DE LA CAJA DE LA POCETA

3) LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EXITENTE EL CUAL, SE REALIZA UN CORTE DE TALUD CON MAQUINA RETRO EXCAVADORA TIPO PAJARITA; YA QUE DESDE HACE TIEMPO SE PRESENTÓ DESLIZAMIENTO HACIENDO QUE LA CAJA POCETA QUEDARA 100% OBSTRUIDA.

4) SE REALIZA UNA OBRA DE MITIGACIÓN PARA LA ALCANTARILLA EXISTENTE PARA EL CUERPO DE TUBERÍA, DONDE SE INSTALÓ CON UN CONCRETO REFORZADO CON LA INSTALACION DE UNA PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI EN AMBAS DIRECCIONES.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE PARA LA PROXIMA SEMANA REALIZAR LA CAJA POCETA DEL ENCOLE DE LA ALCANTARILLA.

2) SE PRETENDE CONFORMAR E INSTALAR LA SUBBASE DEL TRAMO DE 96 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA.

3) PRE PRETENTE LA LLEGADA ME MATERIAL DE SUBBASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA.

4) SE PRETENTE LA LLEGADA DE MATERIAL PETREO A SITIO DE OBRA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PREPARACION, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA PARA ALETAS DE DESCOLE



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EXISTENTE CON CORTE DE TALUD EN LA ZONA DE LA CAJA POCETA



OBRA DE MITIGACIÓN DE TUBERÍA EN LA ALCANTARILLA EXISTENTE MEDIANTE UNA LOSA DE CONCRETO REFORZADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 22 del 26/08/2024 al 1/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

96 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 96 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI; LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3900 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.042.125,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.042.125,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.042.125	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.042.125,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 146.302.808,54	73,136%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 51.817.641,00	25,903%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-47,233%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.283.218,35	7,640%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.004.901,00	13,000%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,640% Avance o Atraso Físico % -47,233%
Meta Física Ejecutada % 35,000%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	1
*	placa huella	ML	96
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100,000%				
Ejec	100,000%				
Prog	64,000%				
Ejec	20,000%				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código:1800, en el acceso a la Vereda Diamante en Km 30+000 de la vía – Filo Chontaduro –Florencia código: 180009

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ PÉTREOS DEL CAQUETÁ	PERMISO MINERO: SI	X NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) LLEGA DE MATERIAL SUB BASE PARA EL TRAMO DE LOS 96 ML DE PLACA HUELLA.

2) PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOS MUROS DE LA CAJA DE LA POCETA.

3) CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LOS FLEJES EN S PARA EL BORDILLO DE LA CUNETA DEL TRAMO DE PLACA HUELLA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE REALIZAR LA CONFORMACIÓN Y LA APLICACIÓN DE SUB BASE PARA EL TRAMO DE 96 ML DE PLACA HUELLA

2) SE PRETENDE PARA LA PROXIMA INSTALAR FORMALETA DE MADERA PARA UN TRAMO DE CICLOPEO DE PLACA HUELLA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



STOCK DE SUB BASE EN SITIO DE OBRA



CONSTRUCCIÓN DE CAJA POCETA DE LA ALCANTARILLA



CORTE FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA FLEJES DEL BORDILLO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.2.

Informe semanal de la Vereda Chontaduro – CS#4239

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	11/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

SEMANA No.: 19 del 5/08/2024 al 11/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

93 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" (ALETA POR ALETA) Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 93 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI; LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" (ALETA POR ALETA) Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4239 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.062.799,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.062.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.062.799	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.062.799,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 108.909.247,96	54,711%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.922.130,00	9,506%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-45,205%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.803.471,99	9,446%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.688,00	1,584%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 9,446% Avance o Atraso Físico % -45,205%

Meta Física Ejecutada % 4,042%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	1
*	placa huella	ML	93
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0,333%				
Ejec	-				
Prog	31,000%				
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código:1800, en el acceso a la Vereda el Chontaduro en Km 30+000 de la vía – Bodega el Chontaduro – Florencia código: 180009

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	11/08/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ PÉTREOS DEL CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) LLEGADA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA AL SITIO DE OBRA

2) EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 36"

3) SE REALIZA COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS Y DE FERRETERÍA.

4) PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PARA ATRAQUE Y SOLADO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36"

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE LA LLEGADA DE MATERIALES PÉTREOS Y DE FERRERETERÍA

2) SE PRETENDE REALIZAR LOS CORTES Y FIGURADO DE LOS ACEROS DE REFUERZO DE LAS ALETAS Y EL CAJON DE LA ALCANTARILLA

3) SE PRETENDE REALIZAR EL SOLADO DE LIMPIEZA PARA LA CAJA POCETA Y LA SOLERA DEL DESCOLE DE LA ALCANTARILLA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA DE CONCRETO 36"



SOLADO DE LIMPIEZA PARA CUERPO DE TUBERIA 36"



CONCRETO DE 14 MPA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

SEMANA No.: 20 del 12/08/2024 al 18/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

93 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" (ALETA POR ALETA) Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 93 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI; LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" (ALETA POR ALETA) Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4239 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.062.799,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.062.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.062.799	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.062.799,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 108.909.247,96	54,711%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.922.130,00	9,506%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-45,205%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.803.471,99	9,446%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.688,00	1,584%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 9,446% Avance o Atraso Físico % -45,205%
Meta Física Ejecutada % 17,000%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	1
*	placa huella	ML	93
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0,333%				
Ejec	-				
Prog	31,000%				
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código:1800, en el acceso a la Vereda el Chontaduro en Km 30+000 de la vía – Bodega el Chontaduro – Florencia código: 180009

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO: SI	X NO
	PÉTREOS DEL CAQUETÁ	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LA ZAPATA DEL MURO CABEZAL, DENTELLÓN, ALETAS, PARRILLA DE LA SOLERA DEL DESCOLE DE LA ALCANTARILLA Y PLACA DE REFUERZO DEL CUERPO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 36"

2) PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LA ZAPATA DEL MURO CABEZAL Y SOLERA DEL DESCOLE

3) CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LA ZAPATA DEL MURO CABEZAL, ALETAS Y PARRILLA DE LA SOLERA DEL ENCOLE DE LA ALCANTARILLA

4) LLEGADA DE MATERIAL DE SUBBASE

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE PARA LA PROXIMA SEMANA REALIZAR LAS ALETAS DEL DESCOLE Y LA CAJA POCETA DEL ENCOLE DE LA ALCANTARILLA.

2) PRE PRETENTE LA LLEGADA ME MATERIAL PÉTREO (ARENA Y TRITURADO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI SOLERA, ZAPATA Y ALETAS PARA EL DESCOLE DE ALCANTARILLA



PREPARACIÓN TRANASPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LA LOSA SUPERIOR EL CUERPO DE TUBERÍA DE 36"



PREPARACIÓN TRANASPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LA SOLERA DEL DESCOLE DE LA ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 21 del 19/08/2024 al 25/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

93 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" (ALETA POR ALETA) Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 93 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI; LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" (ALETA POR ALETA) Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4239 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.062.799,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.062.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.062.799	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.062.799,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.192.795,19	68,417%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25.229.507,00	12,674%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-45,205%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.641.773,62	6,853%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.688,00	1,584%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,853% Avance o Atraso Físico % -45,205%
Meta Física Ejecutada % 18,000%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	1
*	placa huella	ML	93
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0,900%				
Ejec	0,8333				
Prog	55,800%				
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código:1800, en el acceso a la Vereda el Chontaduro en Km 30+000 de la vía – Bodega el Chontaduro – Florencia código: 180009

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO: SI	X NO
	PÉTREOS DEL CAQUETÁ	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE REALIZA CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL DE 60.000 PSI PARA LAS ALETAS DEL DESCOLE

2) SE REIIZA CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LA SOLERA, ZAPATA Y LOS BASTONES VERTICALES DE ALETAS DEL ENCOLE DE LA ALCANTARILLA.

3) PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LAS ALETAS DEL DESCOLE.

4) PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LA ZAPATA Y LA LOSA DE LA SOLERA DEL ENCOLE DE LA ALCANTARILLA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE PARA LA PROXIMA SEMANA REALIZAR LAS ALETAS DEL ENCOLE DE LA ALCANTARILLA.

2) SE PRETENDE CONFORMAR E INSTALAR LA SUBBASE DEL TRAMO DE 93 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA.

3) SE PRETENTE LA LLEGADA DE MATERIAL PETREO A SITIO DE OBRA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PREPARACION, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA PARA ALETAS DE DESCOLE



DESCOLE DEL ALCANTARILLA



PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA PARA LA ZAPATA Y SOLERA DEL ENCOLE DE LA ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

SEMANA No.: 22 del 26/08/2024 al 1/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

93 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" (ALETA POR ALETA) Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 93 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI; LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36" (ALETA POR ALETA) Y 1 ALCANTARILLA PARA LIMPIEZA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4239 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.062.799,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.062.799,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.062.799	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.062.799,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.834.568,81	75,270%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 51.747.322,00	25,995%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-49,275%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.641.773,62	6,853%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.517.815,00	13,321%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75,270% Avance o Atraso Físico % -49,275%
Meta Física Ejecutada % 36,000%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	1
*	placa huella	ML	93
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100,000%				
Ejec	100,000%				
Prog	55,800%				
Ejec	20,000%				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código:1800, en el acceso a la Vereda el Chontaduro en Km 30+000 de la vía – Bodega el Chontaduro – Florencia código: 180009

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	FLORENCIA - CAQUETÁ	PERMISO MINERO: SI	X NO
	PÉTREOS DEL CAQUETÁ	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE REALIZÓ LA CONFORMACION E INSTALACIÓN DE SUB BASE PARA EL TRAMO DE PLACA HUELLA DE 93 ML

2) PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LAS ALETAS DEL ENCOLE DE ALCANTARILLA

3) PERFILACIÓN MANUAL DE TERRENO DE LA ZONA DE CUNETA DE UN TRAMO DE PLAC HUELLA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE PARA LA PROXIMA SEMANA REALIZAR EL CICLOPEO DE TODO EL TRAMO DE PLACA HUELLA

2) SE PRETENDE INSTALAR FORMALETA DE MADERA EL CICLOPEO DEL TRAMO DE PLACA HUELLA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONFORMACIÓN DEL TRAMO DE PLACA HUELLA



INSTALACIÓN DE SUB BASE PARA EL TRAMO DE PLACA HUELLA DE 93 ML



CONSTRUCCIÓN DE ALETAS DE ENCOLE DE ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.3.

Informe semanal de la Vereda La Conga – CS#3681

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	11/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

SEMANA No.: 19 del 5/08/2024 al 11/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

111 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 111 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3681 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 21.898.973,75	11,004%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.920.370,00	9,508%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-34,519%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.898.973,75	11,004%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.395,00	1,585%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,004% Avance o Atraso Físico % -34,519%
Meta Física Ejecutada % -

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	placa huella	ML	111
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	52%				
Ejec	-				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la vereda La Conga en Km 50+000 de la vía – Florencia – Paujil código: 181030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	11/08/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	VDA LA GRANADA, DONCELLO	PERMISO MINERO: SI	X NO
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUAN COORDINANDO ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS POR PARTE DEL INGENIERO RESIDENTE Y EL PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA LA CONGA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE QUE EL PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA LA CONGA JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA, CONTINUAN COORDINANDO ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPOS, TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS Y SELECCIONANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

SEMANA No.: 20 del 12/08/2024 al 18/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

111 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 111 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3681 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 104.342.867,89	52,433%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 22.073.766,00	11,092%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-41,550%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.073.675,47	8,580%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.395,00	1,585%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8,580% Avance o Atraso Físico % -41,550%
Meta Física Ejecutada % -

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	placa huella	ML	111
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	52%				
Ejec	-				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la vereda La Conga en Km 50+000 de la vía – Florencia – Paujil código: 181030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	18/08/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	VDA LA GRANADA, DONCELLO	PERMISO MINERO: SI	X NO
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: O

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUAN COORDINANDO ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS POR PARTE DEL INGENIERO RESIDENTE Y EL PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA LA CONGA

2) SE CONTINUA CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE QUE EL PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA LA CONGA JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA, CONTINUAN COORDINANDO ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPOS, TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS Y SELECCIONANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

SEMANA No.: 21 del 19/08/2024 al 25/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

111 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 111 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3681 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 121.416.543,35	61,013%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25.227.161,00	12,677%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-48,580%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.073.675,47	8,580%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.153.395,00	1,585%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8,580% Avance o Atraso Físico % -48,580%
Meta Física Ejecutada % -

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	placa huella	ML	111
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	52%				
Ejec	-				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la vereda La Conga en Km 50+000 de la vía – Florencia – Paujil código: 181030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	25/08/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	VDA LA GRANADA, DONCELLO	PERMISO MINERO: SI	X NO
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: O

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONSTRUYE EL CAMPAMENTO (BODEGA) PARA EL STOCK DE MATERIALES DE FERRETERÍA

2) SE REALIZA CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LA VIGA RIOSTA

3) LLEGADA DE MATERIAL DE FERRETERÍA (CEMENTO)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE CONFORMAR E INSTALAR LA SUB BASE DEL TRAMO DE PLACA HUELLA DE 111 ML DE OLACA HUELLA

2) SE PRETENDE LA LLEGADA DE MATERIAL PÉTREO (ARENA Y TRITURADO) PARA EL TRAMO DE PLACA HUELLA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CAMPAMEMTO PARA STOCK DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y ZONA DE TRABAJO



FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA LA VIGA RIOSTA



DESCARGUE DE MATERAL DE FERRETERÍA (CEMENTO)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

SEMANA No.: 22 del 26/08/2024 al 1/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

111 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 111 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3681 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.001.571,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.001.571,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4838 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.001.571	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.174.537,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.001.571,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 155.563.894,29	78,172%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 80.674.242,00	40,540%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-37,823%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.073.675,47	8,580%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.785.780,00	5,420%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 78,172% Avance o Atraso Físico % -37,823%
Meta Física Ejecutada % 32,230%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	placa huella	ML	111
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	81%				
Ejec	32,230				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR : PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la vereda La Conga en Km 50+000 de la vía – Florencia – Paujil código: 181030

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	1/09/2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VDA LA GRANADA, DONCELLO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUAN COORDINANDO ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA POR PARTE DEL INGENIERO RESIDENTE Y EL PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA LA CONGA

2) SE CONTINUA CON EL CORTE Y FIGURADO DE CERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA EL BORDILLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA DE 111 ML

3) LLEGADA DE MATERIALES PÉTREOS A SITIO DE OBRA (ARENA Y TRITURADO)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) SE PRETENDE QUE EL PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA LA CONGA JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA, CONTINUAN COORDINANDO ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA, TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS (ARENA Y TRITURADO) PARA LA PRÓXIMA SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA FLEJES DE BORDILLO Y VIGA RIOSTRA



ARMADO DE CASTILLOS (CANASTAS) PARA BORDILLOS Y VIGA RIOSTRA



ACOPIO DE MATERIAL PÉTREO EN SITIO DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES

Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.5.1.

Maquinaria y equipo de la Vereda El Diamante – CS#3900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3900 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	I	I	I	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
RANA COMPACTADORA				I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO				I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,7	0,7	0	0,7	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	0	0,5	0,7	0,7	0,5	0,7	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,7	0,7	0	0,7	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	0	0,5	0,7	0,7	0,5	0,7	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				1	1	1	1	1	1	1	0,3	0,3	0,3	1	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	1	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	39%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	12	40%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,000%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	18,833	60,753%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE UTILIZÓ LA MAQUINARIA PARA ESOS DIAS REPORTADOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: SE EVIDENCIAN MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN OBRA REALIZANDO EXCAVACIONES DE LA ALCANTARILLA Y PARA LA LIMPIEZA DE UNA ALCATARILLA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-357841 TLM

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.2.

Maquinaria y equipo de la Vereda Chontaduro – CS#4239

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ** **PERIODO MES:** **4**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4239 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES DE JUNIO**																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	A	A	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
RANA COMPACTADORA				I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO				I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,7	0,5	0	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5	0,7	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,7	0,5	0	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5	0,7	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,3	0,5	1	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,3	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,3	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	38%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	12	39%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,000%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	19,167	61,828%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE UTILIZÓ LA MAQUINARIA PARA ESOS DIAS REPORTADOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: SE EVIDENCIAN MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN OBRA REALIZANDO EXCAVACIONES DE LA ALCANTARILLA Y PARA LA LIMPIEZA DE UNA ALCATARILLA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-357841 TLM

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.3.

Maquinaria y equipo de la Vereda La Conga – CS#3681

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3681 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUIIO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CONGA

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RANA COMPACTADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,000%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0,000	0,000%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE EVIDENCIAN MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN OBRA DEBIDO A QUE LA JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL SE ENCUENTRA BUSCANDO PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CRISTIAN ANDRES VARGAS FUENTES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70201 - 50837 TLM

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.6.1.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda El Diamante – CS#3900

ANEXO 8.6.2.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Chontaduro – CS#4239

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 4239 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS ERNESTO SANCHEZ BOCANEGRA	1117826023	MAESTRO	$ 2.158.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO	$ 2.158.000,00	$ 150.200	V	ASMET SALUD	30926563	$ 86.400	PORVENIR	30926563	$ 345.300	$ 63.300	$ -	$ -	
2	JHONATAN ANTONIO CICERI TRIVIÑO	1006417312	OFICIAL	$ 1.580.316	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO	$ 1.580.316,00	$ 110.000	V	ASMET SALUD	30926563	$ 63.300	COLPENSIONES	30926563	$ 345.300	$ 86.400	$ -	$ -	
3	EDUARD FABIAN QUINAYA MONTEALEGRE	1117553992	AYUDANTE	$ 1.300.620	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO	$ 1.300.620,00	$ 90.600	V	ASMET SALUD	30926563	$ 52.100	PORVENIR	30926563	$ 208.100	$ 52.100	$ -	$ -	
4	EDWIN YOLIVER QUINAYA MONTEALEGRE	1117530701	AYUDANTE	$ 1.300.620	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO	$ 1.300.620,00	$ 90.600	V	ASMET SALUD	30926563	$ 52.100	PROTECCION	30926563	$ 208.100	$ 52.100	$ -	$ -	
5	WILLIAM ANDRES QUINAYA MONTEALEGRE	1006504835	AYUDANTE	$ 1.300.620	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO	$ 1.300.620,00	$ 90.600	V	ASMET SALUD	30926563	$ 52.100	PORVENIR	30926563	$ 208.100	$ 52.100	$ -	$ -	
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NO SE RELACIONA PERSONAL EN EL FORMATO, DEBIDO A QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA NO CUENTA CON MATERIALES DE FERRETERÍA EN SITIO DE OBRA

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSE LIZARDO PARRA BOCANEGRA
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-357841 TLM

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.3.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Conga –CS#3681

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3681 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CONGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE IDERMAN MOLINA LARA	754550	MAESTRO	$ 2.158.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCCION COMUNAL VEREDA LA CONGA	$ 791.267	$ 55.100	V	ASMET SALUD	9473300462	$ 99.000	COLPENSIONES	9473300462	$ 126.700	$ 31.700	$ -	$ -	
2	BENJAMIN CANACUE CHALA	7695538	OFICIAL	$ 1.600.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCCION COMUNAL VEREDA LA CONGA	$ 586.667	$ 40.900	V	ASMET SALUD	9473300462	$ 73.400	PROTECCION	9473300462	$ 93.900	$ 23.500	$ -	$ -	
3	EDISON FERNANDO MARTINEZ OCAMPO	1007442894	AYUDANTE	$ 1.300.620																									X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCCION COMUNAL VEREDA LA CONGA	$ 216.770	$ 15.100	V	ASMET SALUD	9473300462	$ 27.100	PORVENIR	9473300462	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	
4	EDWIN FERNANDO MARTINEZ OCAMPO	1118021200	AYUDANTE	$ 1.300.620																									X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCCION COMUNAL VEREDA LA CONGA	$ 216.770	$ 15.100	V	ASMET SALUD	9473300462	$ 27.100	PORVENIR	9473300462	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	
5	JHON JAIRO CHALA CANACUE	1118023343	AYUDANTE	$ 1.300.620																									X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCCION COMUNAL VEREDA LA CONGA	$ 216.770	$ 15.100	V	ASMET SALUD	9473300462	$ 27.100	PORVENIR	9473300462	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
10																																											
N																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NO SE RELACIONA PERSONAL EN EL FORMATO, DEBIDO A QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA NO CUENTA CON MATERIALES DE FERRETERÍA EN SITIO DE OBRA

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR DANIEL ECHEVERRY PARRALES
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: CRISTIAN ANDRES VARGAS FUENTES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70201 - 50837 TLM

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.7.1.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda El Diamante – CS#3900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3900 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1204023		10	NACIÓN	3900-0	$ 200.042.125	$ 200.042.125
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 201.042.125,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3900 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: WILLIAM OSWALDO RODRIGUEZ SALAZAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-370979 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.2.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda Chontaduro – CS#4239

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 4239 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN EN EL SECOP					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 200.062.799,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 4239 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: WILLIAM OSWALDO RODRIGUEZ SALAZAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-370979 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.3.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Conga – CS#3681

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3681 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CONGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1135423		10	NACIÓN	3681-0	$ 197.824.563	$ 197.824.563
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.001.571,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3681 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CONGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CRISTIAN ANDRES VARGAS FUENTES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70201 - 50837 TLM

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

ANEXO 8.8.1.

Estado general del tiempo climático de la Vereda El Diamante – CS#3900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-10 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3900 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	15	18	24	24	24	24	19	15	24	19	24	24	24	24	24	24	15	24	24	24	24	24	19	24	24	15	15	15	20	664
Lluvias moderadas	1	0	3	1	0	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	5	0	38
Lluvias intensas	0	0	6	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	4	5	4	4	42
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-357841 TLM

Firm
Nombre: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.2.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Chontaduro – CS#4239

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 4239 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	24	15	18	24	24	24	24	19	15	24	19	24	24	24	24	24	24	15	24	24	24	24	24	19	24	24	15	15	15	20	664
Lluvias moderadas	1	0	3	1	0	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	5	0	38
Lluvias intensas	0	0	6	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	4	5	4	4	42
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-357841 TLM

Firm
Nombre: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.3.

Estado general del tiempo climático de la Vereda La Conga – CS#3681

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 5

CONVENIO SOLIDARIO No: 3681 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CONGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4838 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	20	24	19	24	20	24	24	22	19	15	24	19	24	22	24	22	24	20	15	24	21	24	19	24	19	24	24	15	15	15	20	649
Lluvias moderadas	2	0	3	0	4	0	0	0	5	5	0	5	0	2	0	0	0	4	4	0	0	0	5	0	0	0	0	5	4	5	0	53
Lluvias intensas	2	0	2	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	3	0	0	0	5	0	0	4	5	4	4	42
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CRISTIAN ANDRES VARGAS FUENTES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 7020150837 TLM

Firm
Nombre: DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 161037-0504802 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 8.9.1.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda El Diamante – CS#3900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3900 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-357841 TLM

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.2.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Chontaduro – CS#4239

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4239 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-357841 TLM

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4239 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-357841 TLM

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.3.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Conga – CS#3681

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3681 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CONGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: CRISTIAN ANDRES VARGAS FUENTES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70201 - 50837 TLM



Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.10.1.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda El Diamante– CS#3900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 31

CONVENIO SOLIDARIO No. 3900 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 28/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.042.125,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.042.125,00 (incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2024 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.208.425,00	12/10/2024	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.106,25	12/10/2024	31/10/2024
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.637,50	31/12/2024	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-10028998 0

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegura	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	115%	$ 232.000.000	12/10/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071140 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	8	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegura	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.2.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Chontaduro – CS#4239

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No. 4239 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHONTADURO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 28/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.062.799,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.062.799,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.3.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Conga – CS#3681

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 5

CONVENIO SOLIDARIO No. 3681 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CONGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUIIO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.001.571,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.001.571,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.800.314,00	5/10/2023	5/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.950.079,00	5/10/2023	5/01/2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.700.471,00	5/10/2023	5/10/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3759084-8

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	117%	$ 232.000.000	5/10/2023	5/01/2024
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0933305-5 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.

PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.11.1.

Plan de inversión de desembolso de la Vereda El Diamante – CS#3900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3900 DE 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4838 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 60.538.525,00	$ 45.403.893,00	$ 45.403.893,00		$ 151.346.311,00	75,7%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.540.389,00		$ 4.540.389,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.662.169,00	$ 13.246.628,00	$ 13.246.628,00		$ 44.155.425,00	22,1%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 78.200.694,00	$ 58.650.521,00	$ 63.190.910,00		$ 200.042.125,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: FERNANDO VALENCIA GALINDO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: SANDRAPATRICIA PARRA TORRES
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 118739-T

Contratista

Firma:
Nombre: WILLIAM OSWALDO RODRIGUEZ SALAZAR
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-370979 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.2.

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Chontaduro – CS#4239

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4239 de 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4838 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 60.159.674,00	$ 45.119.756,00	$ 45.119.756,00		$ 150.399.186,00	75,6%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.511.976,00		$ 4.511.976,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.660.655,00	$ 13.245.491,00	$ 13.245.491,00		$ 44.151.637,00	22,2%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 77.820.329,00	$ 58.365.247,00	$ 62.877.223,00		$ 199.062.799,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: Jose Lizardo Parra Bocanegra
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Nolberto Fierro Galvis
Asesoría Contable y Tributaria
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
T.P. 199216-T

Firma:
Nombre: NOLBERTO FIERRO GALVIS
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 199216-T

Contratista

Firma:
Nombre: WILLIAM OSWALDO RODRIGUEZ SALAZAR
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-370979 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.3.

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Conga – CS#3681

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3681 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4838 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 59.749.142,00	$ 44.811.856,00	$ 44.811.856,00		$ 149.372.854,00	75,4%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.481.186,00		$ 4.481.186,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.659.013,00	$ 13.244.259,00	$ 13.244.259,00		$ 44.147.531,00	22,3%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 77.408.155,00	$ 58.056.115,00	$ 62.537.301,00		$ 198.001.571,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: OSCAR DANIEL ECHEVERRY PARRALES
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: YANETH LUCERO RAMIREZ HERMOSA
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 214364-T

Contratista

Firma:
Nombre: CRISTIAN ANDRES VARGAS FUENTES
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 70201-50837 TLM

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.12.1.

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda El Diamante – CS#3900

ANEXO 8.12.2.

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Chontaduro – CS#4239

ANEXO 8.12.3.

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Conga – CS#3681

ANEXO 8.13.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

ANEXO 8.13.1.

Seguimiento programa de obra de la Vereda El Diamante – CS#3900

CONVENIO SOLIDARIO No. 3900-2023

FERNANDO VALENCIA GALINDO
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA EL DIAMANTE

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA															
			SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 397.626,00		$ 397.626,00														**$ 397.626,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 183.443,00		$ 91.721,50	$ 91.721,50													**$ 183.443,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 89.147,00					$ 9.905,22	$ 9.905,22	$ 9.905,22	$ 9.905,22	$ 9.905,22	$ 9.905,22	$ 9.905,22	$ 9.905,22	$ 9.905,22			**$ 89.147,00**
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 22.850.942,00				$ 5.712.735,50	$ 5.712.735,50	$ 5.712.735,50	$ 5.712.735,50									**$ 22.850.942,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 62.454.981,00						$ 7.806.872,63	$ 7.806.872,63	$ 7.806.872,63	$ 7.806.872,63	$ 7.806.872,63	$ 7.806.872,63	$ 7.806.872,63	$ 7.806.872,63			**$ 62.454.981,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 9.486.910,00							$ 1.355.272,86	$ 1.355.272,86	$ 1.355.272,86	$ 1.355.272,86	$ 1.355.272,86	$ 1.355.272,86	$ 1.355.272,86			**$ 9.486.910,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 26.612.673,00				$ 2.956.963,67	$ 2.956.963,67	$ 2.956.963,67	$ 2.956.963,67	$ 2.956.963,67	$ 2.956.963,67	$ 2.956.963,67	$ 2.956.963,67	$ 2.956.963,67				**$ 26.612.673,00**
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 1.529.036,00			$ 764.518,00	$ 764.518,00												**$ 1.529.036,00**
600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO	$ 5.806,00			$ 2.903,00	$ 2.903,00												**$ 5.806,00**
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$ 543.802,00			$ 543.802,00													**$ 543.802,00**
630.1.6	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F) MEZCLA IN SITU	$ 6.084.787,00				$ 3.042.393,50	$ 3.042.393,50											**$ 6.084.787,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 10.275.370,00				$ 3.425.123,33	$ 3.425.123,33	$ 3.425.123,33										**$ 10.275.370,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 MPA	$ 6.932.804,00			$ 2.310.934,67	$ 2.310.934,67	$ 2.310.934,67											**$ 6.932.804,00**
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	$ 558.190,00							$ 558.190,00									**$ 558.190,00**
661.1	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR	$ 3.340.794,00				$ 3.340.794,00												**$ 3.340.794,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.540.389,00													$ 1.816.155,60	$ 1.816.155,60	$ 908.077,80	**$ 4.540.389,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.155.425,00		$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	$ 3.153.958,93	**$ 44.155.425,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 200.042.125,00	**$ 0,00**	**$ 3.643.306,43**	**$ 6.867.838,10**	**$ 24.710.324,60**	**$ 20.612.014,82**	**$ 23.065.559,28**	**$ 21.553.898,80**	**$ 15.282.973,30**	**$ 15.282.973,30**	**$ 15.282.973,30**	**$ 15.282.973,30**	**$ 15.282.973,30**	**$ 14.142.165,23**	**$ 4.970.114,53**	**$ 4.062.036,73**	**$ 200.042.125,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,000%	1,821%	3,433%	12,353%	10,304%	11,530%	10,775%	7,640%	7,640%	7,640%	7,640%	7,640%	7,070%	2,485%	2,031%	100,000%	
	ACUMULADO	0,000%	1,821%	5,254%	17,607%	27,911%	39,441%	50,216%	57,856%	65,496%	73,136%	80,776%	88,416%	95,486%	97,971%	100,000%		

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,577%	1,577%	1,577%	1,577%	1,577%	1,643%	1,577%	1,801%	13,000%	3,490%						
	ACUMULADO	0,000%	1,577%	3,153%	4,730%	6,307%	7,883%	9,526%	11,103%	12,904%	25,903%	29,393%						

ANEXO 8.13.2.

Seguimiento programa de obra de la Vereda Chontaduro – CS#4239

CONVENIO SOLIDARIO No. 4239-2023

JOSE LIZARDO PARRA BOCANEGRA
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA CHONTADURO

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA															
			SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 397.626,00		$ 397.626,00														**$ 397.626,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 179.314,00	$ 89.657,00	$ 89.657,00														**$ 179.314,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 86.326,00				$ 8.632,60	$ 8.632,60	$ 8.632,60	$ 8.632,60	$ 8.632,60	$ 8.632,60	$ 8.632,60	$ 8.632,60	$ 8.632,60	$ 8.632,60			**$ 86.326,00**
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 23.364.127,00			$ 4.672.825,40	$ 4.672.825,40	$ 4.672.825,40	$ 4.672.825,40	$ 4.672.825,40									**$ 23.364.127,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 60.921.803,00					$ 6.769.089,22	$ 6.769.089,22	$ 6.769.089,22	$ 6.769.089,22	$ 6.769.089,22	$ 6.769.089,22	$ 6.769.089,22	$ 6.769.089,22	$ 6.769.089,22			**$ 60.921.803,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 9.545.809,00						$ 1.193.226,13	$ 1.193.226,13	$ 1.193.226,13	$ 1.193.226,13	$ 1.193.226,13	$ 1.193.226,13	$ 1.193.226,13	$ 1.193.226,13			**$ 9.545.809,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 25.173.335,00			$ 2.517.333,50	$ 2.517.333,50	$ 2.517.333,50	$ 2.517.333,50	$ 2.517.333,50	$ 2.517.333,50	$ 2.517.333,50	$ 2.517.333,50	$ 2.517.333,50	$ 2.517.333,50				**$ 25.173.335,00**
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 1.585.458,00			$ 792.729,00	$ 792.729,00												**$ 1.585.458,00**
600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO	$ 17.417,00			$ 8.708,50	$ 8.708,50												**$ 17.417,00**
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$ 543.802,00			$ 543.802,00													**$ 543.802,00**
630.1.6	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F) MEZCLA IN SITU	$ 6.308.672,00				$ 3.154.336,00	$ 3.154.336,00											**$ 6.308.672,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 11.968.708,00				$ 3.989.569,33	$ 3.989.569,33	$ 3.989.569,33										**$ 11.968.708,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 MPA	$ 6.397.278,00			$ 2.132.426,00	$ 2.132.426,00	$ 2.132.426,00											**$ 6.397.278,00**
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	$ 487.867,00							$ 487.867,00									**$ 487.867,00**
661.1	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR	$ 3.421.644,00				$ 3.421.644,00												**$ 3.421.644,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.511.976,00													$ 1.804.790,40	$ 1.804.790,40	$ 902.395,20	**$ 4.511.976,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.151.637,00		$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	$ 3.153.688,36	**$ 44.151.637,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 199.062.799,00	**$ 89.657,00**	**$ 3.640.971,36**	**$ 13.821.512,76**	**$ 23.851.892,69**	**$ 26.397.900,41**	**$ 22.304.364,54**	**$ 18.802.662,20**	**$ 13.641.969,80**	**$ 13.641.969,80**	**$ 13.641.969,80**	**$ 13.641.969,80**	**$ 13.641.969,80**	**$ 12.929.426,70**	**$ 4.958.478,76**	**$ 4.056.083,56**	**$ 199.062.799,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,045%	1,829%	6,943%	11,982%	13,261%	11,205%	9,446%	6,853%	6,853%	6,853%	6,853%	6,853%	6,495%	2,491%	2,038%	100,000%
	ACUMULADO	0,045%	1,874%	8,817%	20,799%	34,060%	45,265%	54,711%	61,564%	68,417%	75,270%	82,123%	88,976%	95,471%	97,962%	100,000%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,584%	1,584%	1,584%	1,584%	1,584%	1,584%	1,584%	1,584%	13,321%	4,357%					
	ACUMULADO	0,000%	1,584%	3,169%	4,753%	6,337%	7,921%	9,506%	11,090%	12,674%	25,995%	30,353%					

ANEXO 8.13.3.

Seguimiento programa de obra de la Vereda La Conga – CS#3681

CONVENIO SOLIDARIO No. 3681-2023

OSCAR DANIEL ECHEVERRY PARRALES
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA LA CONGA

ELKIN DAVI RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA DEL MUNICIPIO DE PAUJIL, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA															
			SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	**0,00**																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 150.295,00	$ 75.147,50	$ 75.147,50														**$ 150.295,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 103.534,00					$ 10.353,40	$ 10.353,40	$ 10.353,40	$ 10.353,40	$ 10.353,40	$ 10.353,40	$ 10.353,40	$ 10.353,40	$ 10.353,40	$ 10.353,40		**$ 103.534,00**
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 24.130.590,00			$ 4.826.118,00	$ 4.826.118,00	$ 4.826.118,00	$ 4.826.118,00	$ 4.826.118,00									**$ 24.130.590,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 78.267.596,00					$ 8.696.399,56	$ 8.696.399,56	$ 8.696.399,56	$ 8.696.399,56	$ 8.696.399,56	$ 8.696.399,56	$ 8.696.399,56	$ 8.696.399,56	$ 8.696.399,56			**$ 78.267.596,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 21.645.686,00						$ 2.705.710,75	$ 2.705.710,75	$ 2.705.710,75	$ 2.705.710,75	$ 2.705.710,75	$ 2.705.710,75	$ 2.705.710,75	$ 2.705.710,75			**$ 21.645.686,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 25.075.153,00			$ 2.507.515,30	$ 2.507.515,30	$ 2.507.515,30	$ 2.507.515,30	$ 2.507.515,30	$ 2.507.515,30	$ 2.507.515,30	$ 2.507.515,30	$ 2.507.515,30	$ 2.507.515,30				**$ 25.075.153,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.481.186,00													$ 1.792.474,40	$ 1.792.474,40	$ 896.237,20	**$ 4.481.186,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00		$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	**$ 44.147.531,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 198.001.571,00	**$ 75.147,50**	**$ 3.228.542,57**	**$ 10.487.028,37**	**$ 10.487.028,37**	**$ 19.193.781,33**	**$ 21.899.492,08**	**$ 21.899.492,08**	**$ 17.073.374,08**	**$ 17.073.374,08**	**$ 17.073.374,08**	**$ 17.073.374,08**	**$ 17.073.374,08**	**$ 16.358.333,18**	**$ 4.956.222,87**	**$ 4.049.632,27**	**$ 198.001.571,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,038%	1,631%	5,296%	5,296%	9,694%	11,060%	11,060%	8,623%	8,623%	8,623%	8,623%	8,623%	8,262%	2,503%	2,045%	100,000%
	ACUMULADO	0,038%	1,669%	6,965%	12,261%	21,955%	33,015%	44,075%	52,698%	61,321%	69,944%	78,567%	87,190%	95,452%	97,955%	100,000%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	22,556%	5,447%					
	ACUMULADO	0,000%	1,593%	3,185%	4,778%	6,370%	7,963%	9,556%	11,148%	12,741%	35,297%	40,744%					

ANEXO 8.14.

8.14. ACTAS DE REUNION DE OBRA

ANEXO 8.14.1.

Actas de reunión de obra de la Vereda El Diamante – CS#3900

ANEXO 8.14.2.

Actas de reunión de obra de la Vereda Chontaduro – CS#4239

ANEXO 8.14.3.

Actas de reunión de obra de la Vereda La Conga – CS#3681

ANEXO 8.15.

EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/07/2024 al 31/07/2024

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4838 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

CONTRATO DE OBRA No. CONVENIO SOLIDARIO # 3900 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 4239 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 3681 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DIAMANTE – MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO – MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA - MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
VEHÍCULO DE PLACA HQX 980	CAMIONETA MITSUBISHI - L200, MODELO 2015. CILINDRAJE 2477	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOTOCICLETA DE PLACA ZJA58G	MOTOCICLETA HONDA WR 150L, MODELO 2025. CILINDRAJE 149	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031733966

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ZJA58G	HONDA	XR 150L E3	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	ROJO BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KD07E-3095617	N	9FMKD0796SE000067

NUMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FMKD0796SE000067	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
RAMOS MOSQUERA ELKIN DAVID	C.C. 7692245

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	13

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	NE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882023000113273	I	13/12/2023	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
07/05/2024	08/05/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FLORENCIA



LT07003052847

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012318750

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HQX980	MITSUBISHI	L 200 2.5L	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.477	PLATA COOL	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NUMERO DE MOTOR	RL	VIN
4D56UCET7305	N	MMBJNKB40FD000188

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
******	N	MMBJNKB40FD000188	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

RAMOS MOSQUERA ELKIN DAVID — C.C. 7692245

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	134

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882014000090224	I	11/07/2014	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
29/07/2014	16/08/2016	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE



LT02004137760

ANEXO 8.16.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

PERIODO MES: 01/08/2024 al 31/08/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/08/2024 al 31/08/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO SOLIDARIO No: CONVENIO SOLIDARIO # 3900 DE 2023; CONVENIO SOLIDARIO # 4239 DE 2023; CONVENIO SOLIDARIO # 3681 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DIAMANTE – MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO – MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA - MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETA

NOMBRE ARL: POSITIVA ARL

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	7.682.245	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.650.000,00	X	X						X	X					X	X					X	X					X	X			33%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 4.060.000,00	$ 282.576,00	V	SANITAS	30575474	$ 507.500,00	COLPENSIONES	30575474	$ 649.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
2	DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES	1.106.713.403	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.300.000,00	$ 90.480,00	V	SANITAS	30976861	$ 52.000,00	PORVENIR	30976861	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	
3	INGRID YULIETH MEJIA PEÑA	1.117.505.206	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.232.000,00	X	X						X	X	X				X	X	X					X	X	X					X	X			44%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.300.000,00	$ 90.480,00	V	NUEVA EPS	30976861	$ 52.000,00	PORVENIR	30976861	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	
4	ADRIANA JULIETH MONTOYA GONZALEZ	1.118.027.920	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.232.000,00	X	X						X	X	X				X	X	X					X	X	X					X	X			44%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.300.000,00	$ 90.480,00	V	ASMET SALUD	30976861	$ 52.000,00	COLPENSIONES	30976861	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	
5	MAYRA KATHERINE BERMUDEZ PARRA	1.117.492.838	PROFESIONAL SISO	$ 1.232.000,00	X	X						X	X	X				X	X	X					X	X	X					X	X			44%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.300.000,00	$ 90.480,00	V	SANITAS	30976861	$ 52.000,00	PORVENIR	30976861	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	
6																																																
7																																																	
8																																																
9																																																
10																																																
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 9.346.000																																			$ 644.496				$ 715.500			$ 1.481.600	$ 208.000	$ 0,00	$ 0,00	

El Interventor adjunta la certificación de fecha 10/09/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

Florencia, 10 de septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4838 de 2023
Asunto: Certificación Pago de obligaciones provenientes del sistema de seguridad social

Con el objeto de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27/diciembre/2020, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad del juramento.

CERTIFICO:

Que el **Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA** identificado con CC # 7.692.245 expedida Neiva ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riegos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, para el periodo 01/agosto/2024 a 31/agosto/2024.

Así mismo certifico que el **Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA** identificado con CC # 7.692.245 expedida Neiva ha realizado el pago de manera oportuna en los últimos 6 meses.

Atentamente,

VIVIANA ARBOLEDA DURANGO
Contador Público Titulado
CC. 1.117.513.231
TP 247382 – T

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
CC # 7.692.245 expedida Neiva

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2509E4D3AF9FCC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VIVIANA ARBOLEDA DURANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117513231 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 247382-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
CC-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	Todas	POSITIVA	SIN CCF	INDEPENDIENTE	I - INDEPENDIENTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	2024-07-01	2024-08-01

INFORMACIÓN PLANILLAS PAGADAS

TIPO COT	SUBTIPO COT	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO DE PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	LIQUIDACIÓN DETALLADA																						
								ADMINISTRADORA PENSIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA PENSIÓN	DÍAS COTIZADOS	IBC AFP	APORTE AFP	APORTE FONDO SOLIDARIDAD	APORTE FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL AFP	ADMINISTRADORA SALUD	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA SALUD	DÍAS COTIZADOS	IBC EPS	APORTE EPS	ARL	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	CENTRO DE TRABAJO	TARIFA ARL	DÍAS COTIZADOS	IBC ARL	APORTE ARL
57	0	2024-07	2024-07	30533418	I	2024-07-31	0	COLPENSIONES	25-14	16,00 %	30	$ 4.060.000	$ 649.600	$ 0	$ 0	$ 649.600	SANITAS	EPS005	12,50 %	30	$ 4.060.000	$ 507.500	POSITIVA	14-23	7692245	6,96 %	30	$ 4.060.000	$ 282.600
57	0	2024-08	2024-08	30575474	I	2024-09-05	0	COLPENSIONES	25-14	16,00 %	30	$ 4.060.000	$ 649.600	$ 0	$ 0	$ 649.600	SANITAS	EPS005	12,50 %	30	$ 4.060.000	$ 507.500	POSITIVA	14-23	7692245	6,96 %	30	$ 4.060.000	$ 282.600
								TOTAL PENSION				$ 8.120.000	$ 1.299.200	$ 0	$ 0	$ 1.299.200	TOTAL SALUD				$ 8.120.000	$ 1.015.000	TOTAL ARL					$ 8.120.000	$ 565.200

APORTES PARAFISCALES

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CAJAS DE COMPENSACIÓN						PARAFISCALES								
						CAJA DE COMPENSACIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA CCF	DÍAS COTIZADOS	IBC CCF	APORTE CCF	IBC PARAFISCALES	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF	TARIFA MEN	APORTE MEN	TARIFA ESAP	APORTE ESAP
2024-07	2024-07	30533418	I	2024-07-31	0	SIN CCF	SINCCF	0,00 %	0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
2024-08	2024-08	30575474	I	2024-09-05	0	SIN CCF	SINCCF	0,00 %	0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
						TOTAL CAJA COMPENSACIÓN				$ 0	$ 0		TOTAL SENA	$ 0	TOTAL ICBF	$ 0	TOTAL MEN	$ 0	TOTAL ESAP	$ 0

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
CC-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	Todas	POSITIVA	SIN CCF	INDEPENDIENTE	I - INDEPENDIENTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	2024-07-01	2024-08-01

TOTALES POR SUBSISTEMA		
SUBSISTEMA	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES
PENSION	COLPENSIONES	$ 1.299.200
SALUD	SANITAS	$ 1.015.000
RIESGOS	POSITIVA	$ 565.200
CAJA DE COMP.	SIN CCF	$ 0
SENA	SENA	$ 0
ICBF	ICBF	$ 0
MEN	MINEDU	$ 0
ESAP	ESAP	$ 0
TOTAL CONSOLIDADO		$ 2.879.400

2024-09-05, 15:00

ASOPAGOS s.a.

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	Todas	POSITIVA	COMFACA	EMPLEADOR	B - MENOR DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-1106713403	DIEGO ALEJANDRO MORALES	2024-07-01	2024-08-01

INFORMACIÓN PLANILLAS PAGADAS

TIPO COT	SUBTIPO COT	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO DE PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	LIQUIDACIÓN DETALLADA																						
								ADMINISTRADORA PENSIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA PENSIÓN	DÍAS COTIZADOS	IBC AFP	APORTE AFP	APORTE FONDO SOLIDARIDAD	APORTE FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL AFP	ADMINISTRADORA SALUD	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA SALUD	DÍAS COTIZADOS	IBC EPS	APORTE EPS	ARL	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	CENTRO DE TRABAJO	TARIFA ARL	DÍAS COTIZADOS	IBC ARL	APORTE ARL
01	0	2024-07	2024-08	30566714	E	2024-07-31	1711001	PROTECCION	230201	16,00 %	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	4,00 %	30	$ 1.300.000	$ 52.000	POSITIVA	14-23	14	6,96 %	30	$ 1.300.000	$ 90.500
01	0	2024-08	2024-09	30976861	E	2024-09-10	1711001	PROTECCION	230201	16,00 %	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	4,00 %	30	$ 1.300.000	$ 52.000	POSITIVA	14-23	14	6,96 %	30	$ 1.300.000	$ 90.500
								TOTAL PENSION				$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 416.000	TOTAL SALUD				$ 2.600.000	$ 104.000	TOTAL ARL					$ 2.600.000	$ 181.000

APORTES PARAFISCALES

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CAJAS DE COMPENSACIÓN						PARAFISCALES								
						CAJA DE COMPENSACIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA CCF	DÍAS COTIZADOS	IBC CCF	APORTE CCF	IBC PARAFISCALES	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF	TARIFA MEN	APORTE MEN	TARIFA ESAP	APORTE ESAP
2024-07	2024-08	30566714	E	2024-07-31	1711001	COMFACA	CCF13	4,00 %	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
2024-08	2024-09	30976861	E	2024-09-10	1711001	COMFACA	CCF13	4,00 %	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
						TOTAL CAJA COMPENSACIÓN				$ 2.600.000	$ 104.000		TOTAL SENA	$ 0	TOTAL ICBF	$ 0	TOTAL MEN	$ 0	TOTAL ESAP	$ 0

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	Todas	POSITIVA	COMFACA	EMPLEADOR	B - MENOR DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-1106713403	DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES	2024-07-01	2024-08-01

TOTALES POR SUBSISTEMA		
SUBSISTEMA	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES
PENSION	PROTECCION	$ 416.000
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	$ 104.000
RIESGOS	POSITIVA	$ 181.000
CAJA DE COMP.	COMFACA	$ 104.000
SENA	SENA	$ 0
ICBF	ICBF	$ 0
MEN	MINEDU	$ 0
ESAP	ESAP	$ 0
TOTAL CONSOLIDADO		$ 805.000

ASOPAGOS s.a.

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	Todas	POSITIVA	COMFACA	EMPLEADOR	B - MENOR DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-1118027920	ADRIANA JULIETH MONTOYA	2024-07-01	2024-08-01

INFORMACIÓN PLANILLAS PAGADAS

TIPO COT	SUBTIPO COT	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO DE PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	LIQUIDACIÓN DETALLADA																					
								ADMINISTRADORA PENSIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA PENSIÓN	DÍAS COTIZADOS	IBC AFP	APORTE AFP	APORTE FONDO SOLIDARIDAD	APORTE FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL AFP	ADMINISTRADORA SALUD	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA SALUD	DÍAS COTIZADOS	IBC EPS	APORTE EPS	ARL	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	CENTRO DE TRABAJO	TARIFA ARL	DÍAS COTIZADOS	IBC ARL	APORTE ARL
01	0	2024-07	2024-08	30566714	E	2024-07-31	5711001	COLPENSIONES	25-14	16,00 %	28	$ 1.213.334	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 194.200	ESSC ASMET SALUD	ESSC62	4,00 %	28	$ 1.213.334	$ 48.600	POSITIVA	14-23	14	6,96 %	28	$ 1.213.334	$ 84.500
01	0	2024-08	2024-09	30976861	E	2024-09-10	5711001	COLPENSIONES	25-14	16,00 %	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	ESSC ASMET SALUD	ESSC62	4,00 %	30	$ 1.300.000	$ 52.000	POSITIVA	14-23	14	6,96 %	30	$ 1.300.000	$ 90.500
								TOTAL PENSION				$ 2.513.334	$ 402.200	$ 0	$ 0	$ 402.200	TOTAL SALUD				$ 2.513.334	$ 100.600	TOTAL ARL					$ 2.513.334	$ 175.000

APORTES PARAFISCALES

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CAJAS DE COMPENSACIÓN						PARAFISCALES								
						CAJA DE COMPENSACIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA CCF	DÍAS COTIZADOS	IBC CCF	APORTE CCF	IBC PARAFISCALES	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF	TARIFA MEN	APORTE MEN	TARIFA ESAP	APORTE ESAP
2024-07	2024-08	30566714	E	2024-07-31	5711001	COMFACA	CCF13	4,00 %	28	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
2024-08	2024-09	30976861	E	2024-09-10	5711001	COMFACA	CCF13	4,00 %	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
						TOTAL CAJA COMPENSACIÓN				$ 2.513.334	$ 100.600		TOTAL SENA	$ 0	TOTAL ICBF	$ 0	TOTAL MEN	$ 0	TOTAL ESAP	$ 0

ASOPAGOS s.a.

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	Todas	POSITIVA	COMFACA	EMPLEADOR	B - MENOR DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-1118027920	ADRIANA JULIETH MONTOYA GONZALEZ	2024-07-01	2024-08-01

TOTALES POR SUBSISTEMA		
SUBSISTEMA	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES
PENSION	COLPENSIONES	$ 402.200
SALUD	ESSC ASMET SALUD	$ 100.600
RIESGOS	POSITIVA	$ 175.000
CAJA DE COMP.	COMFACA	$ 100.600
SENA	SENA	$ 0
ICBF	ICBF	$ 0
MEN	MINEDU	$ 0
ESAP	ESAP	$ 0
TOTAL CONSOLIDADO		$ 778.400

2024-09-10, 11:35

ASOPAGOS s.a.

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	Todas	POSITIVA	COMFACA	EMPLEADOR	B - MENOR DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-1117505206	INGRID YULIETH MEJIA PEÃA	2024-07-01	2024-08-01

INFORMACIÓN PLANILLAS PAGADAS

TIPO COT	SUBTIPO COT	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO DE PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	LIQUIDACIÓN DETALLADA																						
								ADMINISTRADORA PENSIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA PENSIÓN	DÍAS COTIZADOS	IBC AFP	APORTE AFP	APORTE FONDO SOLIDARIDAD	APORTE FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL AFP	ADMINISTRADORA SALUD	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA SALUD	DÍAS COTIZADOS	IBC EPS	APORTE EPS	ARL	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	CENTRO DE TRABAJO	TARIFA ARL	DÍAS COTIZADOS	IBC ARL	APORTE ARL
01	0	2024-07	2024-08	30566714	E	2024-07-31	5711001	PORVENIR	230301	16,00 %	28	$ 1.213.334	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 194.200	NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	4,00 %	28	$ 1.213.334	$ 48.600	POSITIVA	14-23	14	6,96 %	28	$ 1.213.334	$ 84.500
01	0	2024-08	2024-09	30976861	E	2024-09-10	5711001	PORVENIR	230301	16,00 %	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	4,00 %	30	$ 1.300.000	$ 52.000	POSITIVA	14-23	14	6,96 %	30	$ 1.300.000	$ 90.500
								TOTAL PENSION				$ 2.513.334	$ 402.200	$ 0	$ 0	$ 402.200	TOTAL SALUD				$ 2.513.334	$ 100.600	TOTAL ARL					$ 2.513.334	$ 175.000

APORTES PARAFISCALES

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CAJAS DE COMPENSACIÓN						PARAFISCALES								
						CAJA DE COMPENSACIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA CCF	DÍAS COTIZADOS	IBC CCF	APORTE CCF	IBC PARAFISCALES	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF	TARIFA MEN	APORTE MEN	TARIFA ESAP	APORTE ESAP
2024-07	2024-08	30566714	E	2024-07-31	5711001	COMFACA	CCF13	4,00 %	28	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
2024-08	2024-09	30976861	E	2024-09-10	5711001	COMFACA	CCF13	4,00 %	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
						TOTAL CAJA COMPENSACIÓN				$ 2.513.334	$ 100.600		TOTAL SENA	$ 0	TOTAL ICBF	$ 0	TOTAL MEN	$ 0	TOTAL ESAP	$ 0

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	Todas	POSITIVA	COMFACA	EMPLEADOR	B - MENOR DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-1117505206	INGRID YULIETH MEJIA PEÃA	2024-07-01	2024-08-01

TOTALES POR SUBSISTEMA		
SUBSISTEMA	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES
PENSION	PORVENIR	$ 402.200
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	$ 100.600
RIESGOS	POSITIVA	$ 175.000
CAJA DE COMP.	COMFACA	$ 100.600
SENA	SENA	$ 0
ICBF	ICBF	$ 0
MEN	MINEDU	$ 0
ESAP	ESAP	$ 0
TOTAL CONSOLIDADO		$ 778.400

2024-09-10, 11:35

ASOPAGOS s.a.

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	Todas	POSITIVA	COMFACA	EMPLEADOR	B - MENOR DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-1117492838	MAYRA KATHERINE BERMUDEZ	2024-07-01	2024-08-01

INFORMACIÓN PLANILLAS PAGADAS

TIPO COT	SUBTIPO COT	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO DE PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	LIQUIDACIÓN DETALLADA																						
								ADMINISTRADORA PENSIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA PENSIÓN	DÍAS COTIZADOS	IBC AFP	APORTE AFP	APORTE FONDO SOLIDARIDAD	APORTE FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL AFP	ADMINISTRADORA SALUD	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA SALUD	DÍAS COTIZADOS	IBC EPS	APORTE EPS	ARL	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	CENTRO DE TRABAJO	TARIFA ARL	DÍAS COTIZADOS	IBC ARL	APORTE ARL
01	0	2024-07	2024-08	30566714	E	2024-07-31	5711001	PORVENIR	230301	16,00 %	28	$ 1.213.334	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 194.200	SANITAS	EPS005	4,00 %	28	$ 1.213.334	$ 48.600	POSITIVA	14-23	14	6,96 %	28	$ 1.213.334	$ 84.500
01	0	2024-08	2024-09	30976861	E	2024-09-10	5711001	PORVENIR	230301	16,00 %	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	SANITAS	EPS005	4,00 %	30	$ 1.300.000	$ 52.000	POSITIVA	14-23	14	6,96 %	30	$ 1.300.000	$ 90.500
								TOTAL PENSION				$ 2.513.334	$ 402.200	$ 0	$ 0	$ 402.200	TOTAL SALUD				$ 2.513.334	$ 100.600	TOTAL ARL					$ 2.513.334	$ 175.000

APORTES PARAFISCALES

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CAJAS DE COMPENSACIÓN						PARAFISCALES								
						CAJA DE COMPENSACIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA CCF	DÍAS COTIZADOS	IBC CCF	APORTE CCF	IBC PARAFISCALES	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF	TARIFA MEN	APORTE MEN	TARIFA ESAP	APORTE ESAP
2024-07	2024-08	30566714	E	2024-07-31	5711001	COMFACA	CCF13	4,00 %	28	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
2024-08	2024-09	30976861	E	2024-09-10	5711001	COMFACA	CCF13	4,00 %	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
						TOTAL CAJA COMPENSACIÓN				$ 2.513.334	$ 100.600		TOTAL SENA	$ 0	TOTAL ICBF	$ 0	TOTAL MEN	$ 0	TOTAL ESAP	$ 0

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-7692245	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	Todas	POSITIVA	COMFACA	EMPLEADOR	B - MENOR DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-1117492838	MAYRA KATHERINE BERMUDEZ PARRA	2024-07-01	2024-08-01

TOTALES POR SUBSISTEMA		
SUBSISTEMA	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES
PENSION	PORVENIR	$ 402.200
SALUD	SANITAS	$ 100.600
RIESGOS	POSITIVA	$ 175.000
CAJA DE COMP.	COMFACA	$ 100.600
SENA	SENA	$ 0
ICBF	ICBF	$ 0
MEN	MINEDU	$ 0
ESAP	ESAP	$ 0
TOTAL CONSOLIDADO		$ 778.400

2024-09-10, 11:35

ANEXO 8.17.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MES INFORME MENSUAL: 01/08/2024 al 31/08/2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO # 3900 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 4239 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 3681 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DIAMANTE – MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO – MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA - MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1396923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 106.174.537,00	$ 58.404.521,70
TOTAL						$ 106.174.537,00	$ 58.404.521,70

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 106.174.537,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	jun-24	$ 15.675.555,00	$ 2.978.355,45	$ 18.653.910,45	$ -	$ 18.653.910,45	$ -		$ 87.520.626,55	$ 87.520.626,55		
2	jul-24	$ 24.467.315,00	$ 4.648.789,85	$ 29.116.104,85	$ -	$ 29.116.104,85	$ -		$ 58.404.521,70	$ 58.404.521,70		
2	jul-24	$ 24.398.221,00	$ 4.635.661,99	$ 29.033.882,99	$ -	$ 29.033.882,99	$ -		$ 29.370.638,71	$ 29.370.638,71		
TOTALES		$ 64.541.091,00	$ 12.262.807,29	$ 76.803.898,29	$ -	$ 76.803.898,29	$ -	$ -	$ 29.370.638,71	$ 29.370.638,71		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)	$ 89.222.300,00		$ 89.222.300,00
IVA = 19% * (C) = (D)		$ 16.952.237,00	$ 16.952.237,00
VALOR TOTAL	$ 89.222.300,00	$ 16.952.237,00	$ 106.174.537,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.



Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.18.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 26-dic-24

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-sep-24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00

VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	5/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	5/12/2023	5/01/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	5/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003489

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 11-dic-23

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	26/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	5/12/2023	26/01/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	26/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003489

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	3/11/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	5/12/2023	3/05/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	3/11/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003489

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	3/01/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	5/12/2023	3/07/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	3/01/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003489

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	3/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	5/12/2023	3/09/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	3/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003489

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4-may-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	3/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	5/12/2023	3/12/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	5/12/2023	26/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003489

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.06 09:08:06 -05:00

Código de Seguridad: sTgy7zfTc2xGtQ94Z3M1hw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	CT-100003489	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	120046121	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/12/2023	24:00 Horas Del	05/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID	**No. DOC. IDENTIDAD**	7.692.245
DIRECCIÓN	CARRERA 3B BIS 12 18 RINCON DE IPANEMA	**TELÉFONO**	4359385
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ACEPTACION DE OFERTA NO.483B DE 2023 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/12/2023	24:00 Horas Del 05/07/2024	10.617.453,70	11.153,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/12/2023	24:00 Horas Del 05/01/2027	21.234.907,40	98.350,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 05/12/2023	24:00 Horas Del 05/07/2024	10.617.453,70	11.153,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 42.469.814,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OSSA & ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	120.656,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	120.656,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	23.875,00
TOTAL A PAGAR	$	149.531,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CT-100003489** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **05/12/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN TULUA a los **06** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.03.26 08:52:29 -05:00

Código de Seguridad: 9Z2KeizgcQm8mvz5sMkUlQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CT-100003489	**No. ANEXO**	2	**No. CERTIFICADO**	120046756	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	26/03/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	26/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID	**No. DOC. IDENTIDAD**	7.692.245
DIRECCIÓN	CARRERA 3B BIS 12 18 RINCON DE IPANEMA	**TELÉFONO**	4359385
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26/12/2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS A LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4838 DE 2023 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 26/07/2024	10.617.453,70	11.153,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 26/01/2027	21.234.907,40	98.350,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 26/07/2024	10.617.453,70	11.153,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 42.469.814,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OSSA & ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	120.656,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	120.656,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	23.875,00
TOTAL A PAGAR	$	149.531,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CT-100003489	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	120046756	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	26/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

S LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CT-100003489** y endoso, 2 cuyo afianzado es: **RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **26/03/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN TULUA a los **26** días del mes **MARZO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.03.26 09:44:07 -05:00

Código de Seguridad: enNGbYzyhbL6oXd8wk8JSg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	CT-100003489	**No. ANEXO**	3	**No. CERTIFICADO**	120046761	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	26/03/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	03/05/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID	**No. DOC. IDENTIDAD**	7.692.245
DIRECCIÓN	CARRERA 3B BIS 12 18 RINCON DE IPANEMA	**TELÉFONO**	4359385
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION 1 DE FECHA 28/12/2023; ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION 1 DE FECHA 17/01/2024; ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION 2 DE FECHA 13/02/2024 Y SEGUN ACTA DE REACTIVACION DE FECHA 19/03/2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4838 DE 2023 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/03/2024	24:00 Horas Del 03/11/2024	10.617.453,70	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/03/2024	24:00 Horas Del 03/05/2027	21.234.907,40	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 19/03/2024	24:00 Horas Del 03/11/2024	10.617.453,70	6.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 42.469.814,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OSSA & ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.800,00
TOTAL A PAGAR	$	23.800,01

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/01/2027

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PARA - API

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CT-100003489	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	120046761	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	03/05/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

ADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CT-100003489** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **26/03/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN TULUA a los **26** días del mes **MARZO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.03.26 09:50:31 -05:00

Código de Seguridad: W8UuNxw/VPPsn3XDHskkOg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CT-100003489	**No. ANEXO**	4	**No. CERTIFICADO**	120046762	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	26/03/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	03/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID	**No. DOC. IDENTIDAD**	7.692.245
DIRECCIÓN	CARRERA 3B BIS 12 18 RINCON DE IPANEMA	**TELÉFONO**	4359385
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA DE FECHA 19/03/2024, SE PRORROGA HASTA EL 30/04/2024, PARA LO CUAL SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS A LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4838 DE 2023 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/03/2024	24:00 Horas Del 03/01/2025	10.617.453,70	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/03/2024	24:00 Horas Del 03/07/2027	21.234.907,40	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 19/03/2024	24:00 Horas Del 03/01/2025	10.617.453,70	6.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 42.469.814,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OSSA & ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.800,00
TOTAL A PAGAR	$	23.800,01

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/05/2027

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAVA - API

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CT-100083489	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	120046762	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	03/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

GILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

ADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CT-100003489** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **26/03/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN TULUA a los **26** días del mes **MARZO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.25 13:49:55 -05:00

Código de Seguridad: romLo1Z+Hmkl3bv81i+aNQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1117-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	CT-100003506	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	120046956	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	03/09/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID	No. DOC. IDENTIDAD	7.692.245
DIRECCIÓN	CARRERA 3B BIS 12 18 RINCON DE IPANEMA	TELÉFONO	4359385
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 24/04/2024, SE PRORROGA HASTA EL 30/06/2024, PARA LO CUAL SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS A LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4879 DE 2023 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE
LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/04/2024	24:00 Horas Del 03/03/2025	10.617.453,70	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/04/2024	24:00 Horas Del 03/09/2027	21.234.907,40	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 24/04/2024	24:00 Horas Del 03/03/2025	10.617.453,70	6.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 42.469.814,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OSSA & ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.800,00
TOTAL A PAGAR	$	23.800,01

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/07/2027

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CT-100003506	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	120046956	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	03/09/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ADF

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CT-100003506** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS** , expedida por la Compañía en **25/04/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN TULUA a los **25** días del mes **ABRIL** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Powered by CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.27 17:03:30 -05:00

Código de Seguridad: Q7ZX7D/HqeRj84SxkaKelQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	CT-100003489	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	120047360	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	03/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID	No. DOC. IDENTIDAD	7.692.245
DIRECCIÓN	CARRERA 38 BIS 12 18 RINCON DE IPANEMA	TELÉFONO	4359385
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NO. 4838 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE ACUERDO CON LA PRORROGA NO. 3 DE 2024 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024.

LAS DEMAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE NO HUBIEREN SIDO EXPRESAMENTE MODIFICADAS POR EL PRESENTE, CONSERVAN SU EFICACIA Y VIGENCIA EN LOS TERMINOS INICIALMENTE PACTADOS.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4838 DE 2023 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/06/2024	24:00 Horas Del 03/06/2025	10.617.453,70	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/06/2024	24:00 Horas Del 03/12/2027	21.234.907,40	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 26/06/2024	24:00 Horas Del 26/06/2025	10.617.453,70	6.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 42.469.814,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OSSA & ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.800,00
TOTAL A PAGAR	$	23.800,01

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/09/2027

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PAZ APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CT-100003489	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	120047360	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN TULUA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	03/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA • PAGA APP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CT-100003489** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **RAMOS MOSQUERA, ELKIN DAVID** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **27/06/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN TULUA a los **27** días del mes **JUNIO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ANEXO 8.19.1.

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☒ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA: CONVENIO SOLIDARIO # 3900 DE 2023; CONVENIO SOLIDARIO # 4239 DE 2023; CONVENIO SOLIDARIO # 3681 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 31/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 106.174.537,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 106.174.537,00

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DIAMANTE – MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHONTADURO – MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CONGA - MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETA

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. _1_ de fecha _26 / 06 /2024_		AÑO 2024																		TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		MES		MES		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
1	1	Director de Interventoría	5.000.000,00		0,50	2.500.000,00			1,32	$ 6.600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 1.650.000,00	0,33	$ 1.650.000,00	0,33	$ 1.650.000,00	0,33	$ 1.650.000,00							1,32	$ 6.600.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	4.000.000,00		4,00	16.000.000,00			4,00	$ 16.000.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00							4,00	$ 16.000.000,00
3	1	Profesional ambiental	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00							1,32	$ 3.696.000,00
4	1	Profesional social	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00							1,32	$ 3.696.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				3.000.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
	1	Especialista en Estructuras	5.500.000,00																													
	1	Especialista en Vía y/o Pavimentos	5.500.000,00																													
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	5.500.000,00																													
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	5.500.000,00																													
	1	Especialista en diseño Geométrico	5.500.000,00																													
6	1	Inspector	1.200.000,00		6,00	7.200.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
7	1	Inspector SST	1.200.000,00		0,50	600.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -								$ -
		NO PREVISTOS																														
8	1	Profesional SST	2.800.000,00		-	-			1,32	$ 3.696.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00							1,32	$ 3.696.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						31.540.000,00				$ 33.688.000,00				$ -		$ -		$ 5.650.000,00		$ 9.346.000,00		$ 9.346.000,00		$ 9.346.000,00								$ 33.688.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36								2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						74.434.400,00				$ 79.503.680,00				$ -		$ -		$ 13.334.000,00		$ 22.056.560,00		$ 22.056.560,00		$ 22.056.560,00								$ 79.503.680,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024																		TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
9	1	Viáticos Director y/o Especialistas	140.000,00	Día	4,00	560.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en ad	550.000,00	Mes	12,00	6.600.000,00			4,00	$ 2.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00							4,00	$ 2.200.000,00
11	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y	2.800.000,00	Según comp	2,00	5.600.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
12	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y	300.000,00	Según comp	3,00	900.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		OTROS COSTOS																												
13	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes	176.200,00	Según comp	2,00	352.400,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de d	80.000,00	Según comp	3,00	240.000,00			4,00	$ 320.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00							4,00	$ 320.000,00
15	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,com	140.000,00	Según comp	3,00	420.000,00			4,00	$ 560.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00							4,00	$ 560.000,00
16	1	Veeduría Técnica Comunitaria	38.500,00	Según comp	3,00	115.500,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -							-	$ -
		NO PREVISTOS																												
17	1	Costos de alquiler de Equipo -Vehiculo mayor a 20	4.229.257,00	Mes	-	-			1,32	$ 5.582.619,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 1.395.654,75	0,33	$ 1.395.654,75	0,33	$ 1.395.654,75	0,33	$ 1.395.654,75							1,32	$ 5.582.619,00
18	1	Oficina (incluye servicios públicos)	800.000,00	Mes	-	-			1,32	$ 1.056.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 264.000,00	0,33	$ 264.000,00	0,33	$ 264.000,00	0,33	$ 264.000,00							1,32	$ 1.056.000,00
19	1	AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 1,00																						$ 1,00
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				14.787.900,00				$ 9.718.620,00				$ -		$ -		$ 2.429.654,75		$ 2.429.654,75		$ 2.429.654,75		$ 2.429.654,75								$ 9.718.620,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)				89.222.300,00				$ 89.222.300,00				$ -		$ -		$ 15.763.654,75		$ 24.486.214,75		$ 24.486.214,75		$ 24.486.214,75								$ 89.222.300,00
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				16.952.237,00				$ 16.952.237,00				$ -		$ -		$ 2.995.094,00		$ 4.652.381,00		$ 4.652.381,00		$ 4.652.381,00								$ 16.952.237,00
	*	COSTO TOTAL = (C) + (D)				106.174.537,00				$ 106.174.537,00				$ -		$ -		$ 18.758.748,75		$ 29.138.595,75		$ 29.138.595,75		$ 29.138.595,75								$ 106.174.537,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por necesidades en la ejecución del contrato se hace necesario la modificación de la dedicación de los profesionales vinculados al proyecto.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL:

•El Director de Interventoría deberá coordinar los trabajos y asesorar las JAC en la correcta ejecución de las obras. Su participación de incrementa.
•El profesional ambiental de la Interventoría deberá realizar seguimiento y control al Plan de Gestión Ambiental (complejidad baja) elaborado y presentar informes durante la ejecución del proyecto. Su participación de incrementa.
•El profesional social de la Interventoría deberá acompañar y/o asesorar a las OAC en la elaboración del Plan de Gestión Social, que es responsabilidad de la OAC, ya que en los presupuestos de los convenios suscritos con las OAC no existe rubro que cubra esos gastos. El profesional social de la Interventoría deberá realizar seguimiento al Plan de Gestión Social y presentar informes durante la ejecución del proyecto. Su participación de incrementa.
•Por la necesidad en la ejecución del proyecto el cual debe estar acorde con el recurso disponible y que el catalogo de mínimo impacto y baja complejidad, se hace necesario eliminar la participación de los Especialistas y el Inspector.
•En la oferta económica de la Interventoría existe un Inspector SST el cual no posee la idoneidad para responsabilizarse del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Su participación de disminuye.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - NO PREVISTOS

•La Interventoría debe vincular un profesional en SST, que deberá acompañar y/o asesorar a las OAC en la elaboración del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que es responsabilidad de la OAC, ya que en los presupuestos de los convenios suscritos con las OAC no existe rubro que cubra esos gastos. Además, este profesional deberá realizar seguimiento al Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y presentar informes durante la ejecución del proyecto.

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

OTROS COSTOS DIRECTOS:

•Por la necesidad en la ejecución del proyecto el cual debe estar acorde con el recurso disponible y que se cataloga de mínimo impacto y baja complejidad, se hace necesario eliminar: 1) Viáticos de Especialistas, 2) Topografía y Ensayos de laboratorio, ya que estos costos están en el presupuesto de obra, 3) Transportes aéreos de Especialistas y 4) Veeduría técnica comunitaria.

OTROS COSTOS DIRECTOS – NO PREVISTOS

•El trabajo coordinado del Director y Residente con los profesionales Ambientales, Sociales, de SST, obligan a tener: 1) una oficina para el desempeño de sus obligaciones, 2) un vehículo para los desplazamientos a las obras. Estos serán se dedicación parcial.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
