NSR- INTER-DIR-1651-0007

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2024

Señores:
Superintendencia de Notariado y Registro - SNR
Att: Ing. Jaqueline Guzmán Herazo.
Supervisión Superintendencia de Notariado y Registro - SNR
Ciudad.

Referencia: CONTRATO 1653 de 2024

ASUNTO: RADICACIÓN DE PROGRAMACIONES PRORROGA 1.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en aras de garantizar el correcto funcionamiento del proyecto, esta interventoría se permite presentar después de haber revisado y verificado las programaciones correspondientes a la prorroga No. 1 de obra.


Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente

RICARDO J. MANSILLA B.
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERCONSULTORES
Anexo 1: Programación e obra de Bogotá Centro
Anexo 2: Programación de obra Bodega Funza
Anexo 3 Flujo de caja de Bogotá Centro.
Anexo 4: Flujo de caja de Bodega Funza


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 2, 2023
1	**PRESUPUESTO OFICIAL ORIP BOGOTA CENTRO**	**$ 377.575.566,06**	**98 días**	**vie 7/06/24**	**lun 21/10/24**		
2	**PRELIMINARES**	**$ 35.722.402,71**	**98 días**	**vie 7/06/24**	**lun 21/10/24**		
3	LOGISTICA Y ALISTAMIENTO DE MATERIALES Y PERSONAL OPERATIVO	$ 469.085,80	1 día	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
4	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	$ 545.058,15	70 días	mar 11/06/24	lun 16/09/24	22CC+2 días	
5	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	$ 5.671.235,97	70 días	mar 11/06/24	lun 16/09/24	4CC	
6	DESMONTE DE CIELORRASO	$ 0,00	75 días	mar 11/06/24	lun 23/09/24	4CC;5CC	
7	DESMONTE DE ALFOMBRA	$ 164.391,26	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
8	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	$ 1.494.904,95	3 días	lun 17/06/24	mié 19/06/24		
9	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	$ 55.605,74	75 días	lun 17/06/24	vie 27/09/24	3CC	
10	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	$ 2.000.028,45	1 día	lun 17/06/24	lun 17/06/24	9CC	
11	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	$ 1.295.076,75	22 días	mar 3/09/24	mié 2/10/24	22FC+2 días	
12	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	$ 0,00	60 días	mar 18/06/24	lun 9/09/24	10	
13	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	$ 8.282.424,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
14	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	$ 2.590.695,16	90 días	jue 13/06/24	mar 15/10/24	6CC+2 días	
15	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	$ 619.525,75	75 días	lun 17/06/24	vie 27/09/24	9CC;10CC	

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24




Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 2, 2023
16	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	$ 0,00	7 días	mar 11/06/24	mié 19/06/24	6CC	
17	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
18	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
19	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	$ 962.016,19	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
20	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACIÓN	$ 8.741.976,64	15 días	mar 11/06/24	lun 1/07/24	16CC	
21	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	$ 0,00	96 días	mar 11/06/24	lun 21/10/24	20CC	
22	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	$ 2.830.377,90	60 días	vie 7/06/24	jue 29/08/24		
23	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**$ 3.074.952,73**	**52 días**	**lun 17/06/24**	**mar 27/08/24**		
24	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	$ 2.231.151,20	2 días	lun 26/08/24	mar 27/08/24		
25	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	$ 843.801,53	2 días	lun 26/08/24	mar 27/08/24		
26	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150K	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
27	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**$ 920.657,20**	**52 días**	**lun 17/06/24**	**mar 27/08/24**		
28	BARRA DE SEGURIDAD 60CM	$ 187.705,63	2 días	lun 26/08/24	mar 27/08/24		
29	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	$ 732.951,57	2 días	lun 26/08/24	mar 27/08/24		

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

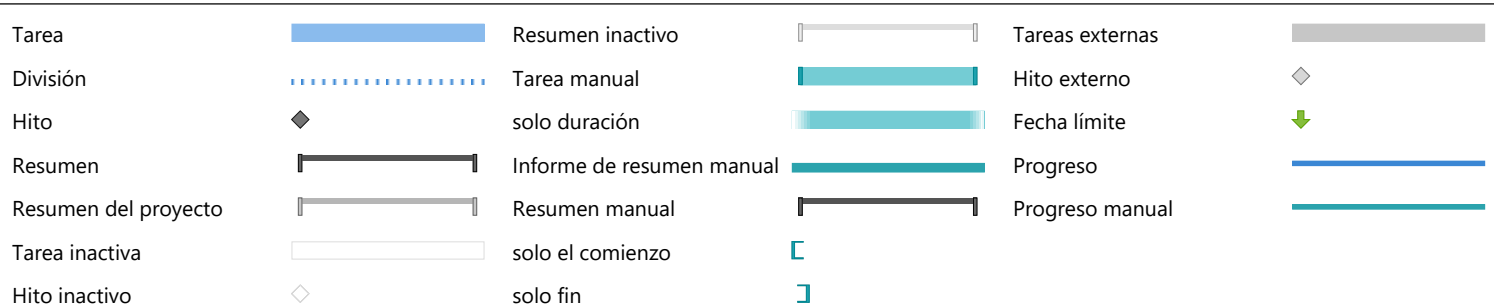


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 2, 2023
30	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
31	**CIELORRASOS**	**$ 83.713.366,03**	**93 días**	**vie 14/06/24**	**lun 21/10/24**		
32	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	$ 83.713.366,03	93 días	vie 14/06/24	lun 21/10/24	70CC-28 días	
33	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**$ 2.038.564,85**	**21 días**	**mar 11/06/24**	**mar 9/07/24**		
34	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	$ 2.038.564,85	21 días	mar 11/06/24	mar 9/07/24	16CC	
35	**ENCHAPE MUROS**	**$ 4.597.562,39**	**27 días**	**lun 17/06/24**	**mar 23/07/24**		
36	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	$ 4.597.562,39	21 días	mar 25/06/24	mar 23/07/24	16FC+3 días	
37	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
38	**PINTURAS**	**$ 10.979.698,36**	**92 días**	**lun 17/06/24**	**lun 21/10/24**		
39	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	$ 194.444,57	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
40	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
41	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	$ 10.785.253,79	45 días	mié 21/08/24	lun 21/10/24	32CC+2 días	
42	**PISOS**	**$ 18.941.683,51**	**86 días**	**mié 19/06/24**	**mié 16/10/24**		
43	DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	$ 0,00	0 días	mié 19/06/24	mié 19/06/24	16	
44	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	$ 2.130.921,10	9 días	jue 20/06/24	mar 2/07/24	16	
45	ALISTADO DE PISO 2CM	$ 16.810.762,41	45 días	vie 16/08/24	mié 16/10/24		
46	**RED ELÉCTRICA**	**$ 39.928.139,80**	**92 días**	**lun 17/06/24**	**lun 21/10/24**		

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24




Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 2, 2023
47	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	$ 11.468.687,27	5 días	mar 15/10/24	lun 21/10/24		
48	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
49	CANALETA PLASTICA 100X45MM	$ 3.264.207,89	20 días	mar 24/09/24	vie 18/10/24		
50	TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS	$ 900.739,70	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
51	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	$ 16.189.214,56	9 días	mié 9/10/24	lun 21/10/24		
52	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	$ 0,00	9 días	mar 8/10/24	lun 21/10/24		
53	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE UTP CAT. 6A	$ 8.105.290,38	10 días	mar 8/10/24	lun 21/10/24		
54	**RED HIDRÁULICA**	**$ 2.771.053,37**	**54 días**	**lun 17/06/24**	**jue 29/08/24**		
55	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	$ 31.851,91	3 días	jue 20/06/24	lun 24/06/24	16	
56	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml	$ 61.397,93	3 días	jue 20/06/24	lun 24/06/24	55CC;16	
57	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO. Promedio 3 ml	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
58	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	$ 122.795,86	4 días	jue 20/06/24	mar 25/06/24	56CC	
59	TAPA REGISTRO 20X20CM	$ 31.473,77	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24		
60	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	$ 372.568,82	4 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24		

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24




Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 2, 2023
61	LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	$ 989.290,89	4 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24	60CC	
62	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye Grifería	$ 1.161.674,19	4 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24	61CC	
63	**RED SANITARIA**	**$ 2.042.221,73**	**1 día**	**mar 27/08/24**	**mar 27/08/24**		
64	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	$ 1.042.335,25	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24	44	
65	SANITARIO TIPO AHORRADOR	$ 999.886,48	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24	64CC	
66	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**$ 1.257.336,61**	**86 días**	**vie 7/06/24**	**dom 6/10/24**		
67	ASEO GENERAL DE OBRA	$ 1.257.336,61	86 días	vie 7/06/24	dom 6/10/24	22CC	
68	**NO PREVISTOS**	**$ 171.587.926,...**	**94 días**	**jue 13/06/24**	**lun 21/10/24**		
69	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	$ 1.748.360,95	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24		
70	PISO GRANITO MARMOL	$ 110.976.813,27	64 días	mié 24/07/24	vie 18/10/24		
71	PUERTA TIPO PERSIANA, LAMINA CALIBRE 18 PINTURA ELECTROESTATICA 0,60 a 75 - h=2,00 a 2,200 incluye marco metálico y chapa de seguridad	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24		
72	RESANE	$ 1.263.461,16	30 días	mar 6/08/24	lun 16/09/24		
73	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	$ 233.771,00	3 días	mar 17/09/24	jue 19/09/24	72	
74	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	$ 10.626.543,68	75 días	jue 13/06/24	mié 25/09/24	14CC	


Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24



Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 2, 2023
75	PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	$ 1.938.870,40	14 días	mar 17/09/24	vie 4/10/24	72	
76	GUARDAESCOBA GRANITO MARMOL 8-10 CM	$ 10.148.177,81	10 días	mar 8/10/24	lun 21/10/24		
77	SALIDA SANITARIA BAÑO 2"	$ 245.481,85	2 días	mar 27/08/24	mié 28/08/24	69	
78	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS NORMAL O REGULADO	$ 2.225.992,65	3 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24		
79	DESMONTE DE CABLE UTP	$ 10.365.346,61	3 días	jue 10/10/24	lun 14/10/24		
80	DESMONTE DE CABLE RED REGULADA Y NORMAL	$ 4.553.807,16	3 días	jue 10/10/24	lun 14/10/24		
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PUERTOS CAT. 6 A	$ 2.436.585,97	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24		
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD 2 MTS CAT 6A	$ 703.806,69	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24		
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE No. 12 LIBRE DE HALOGENO	$ 14.120.907,57	6 días	lun 14/10/24	lun 21/10/24	78	


Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

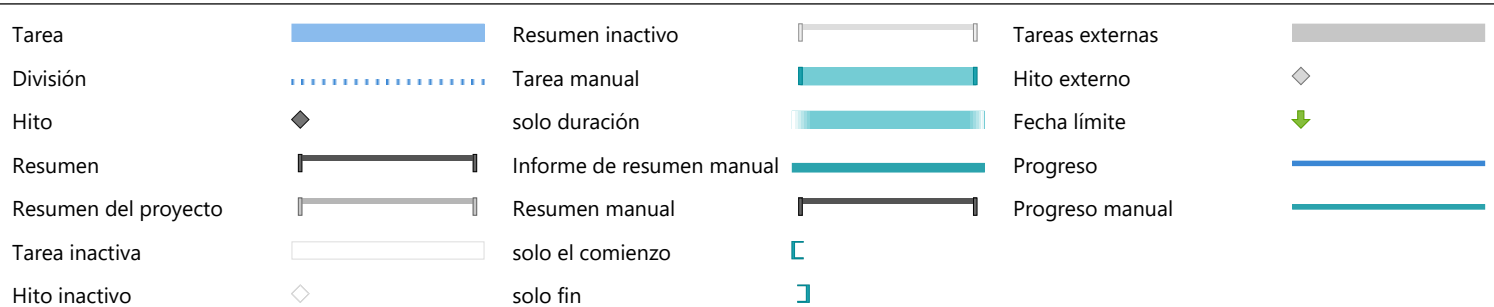

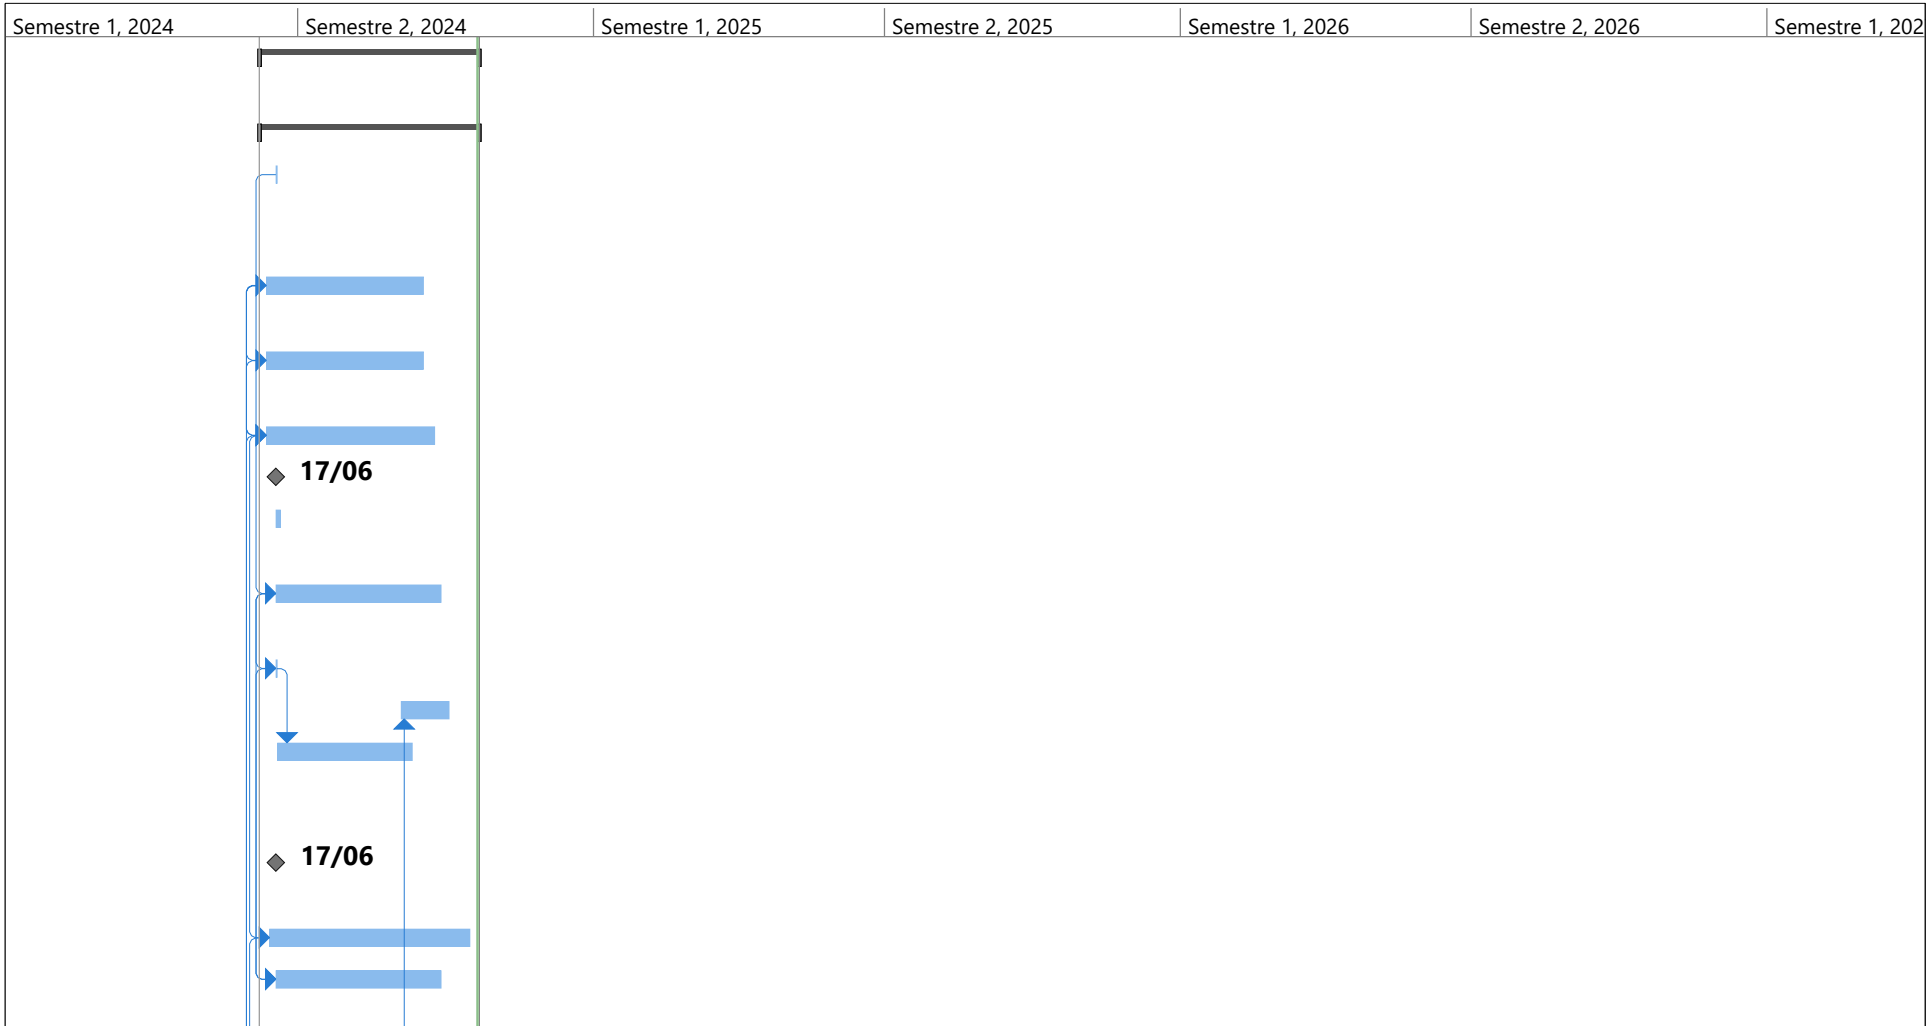


Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

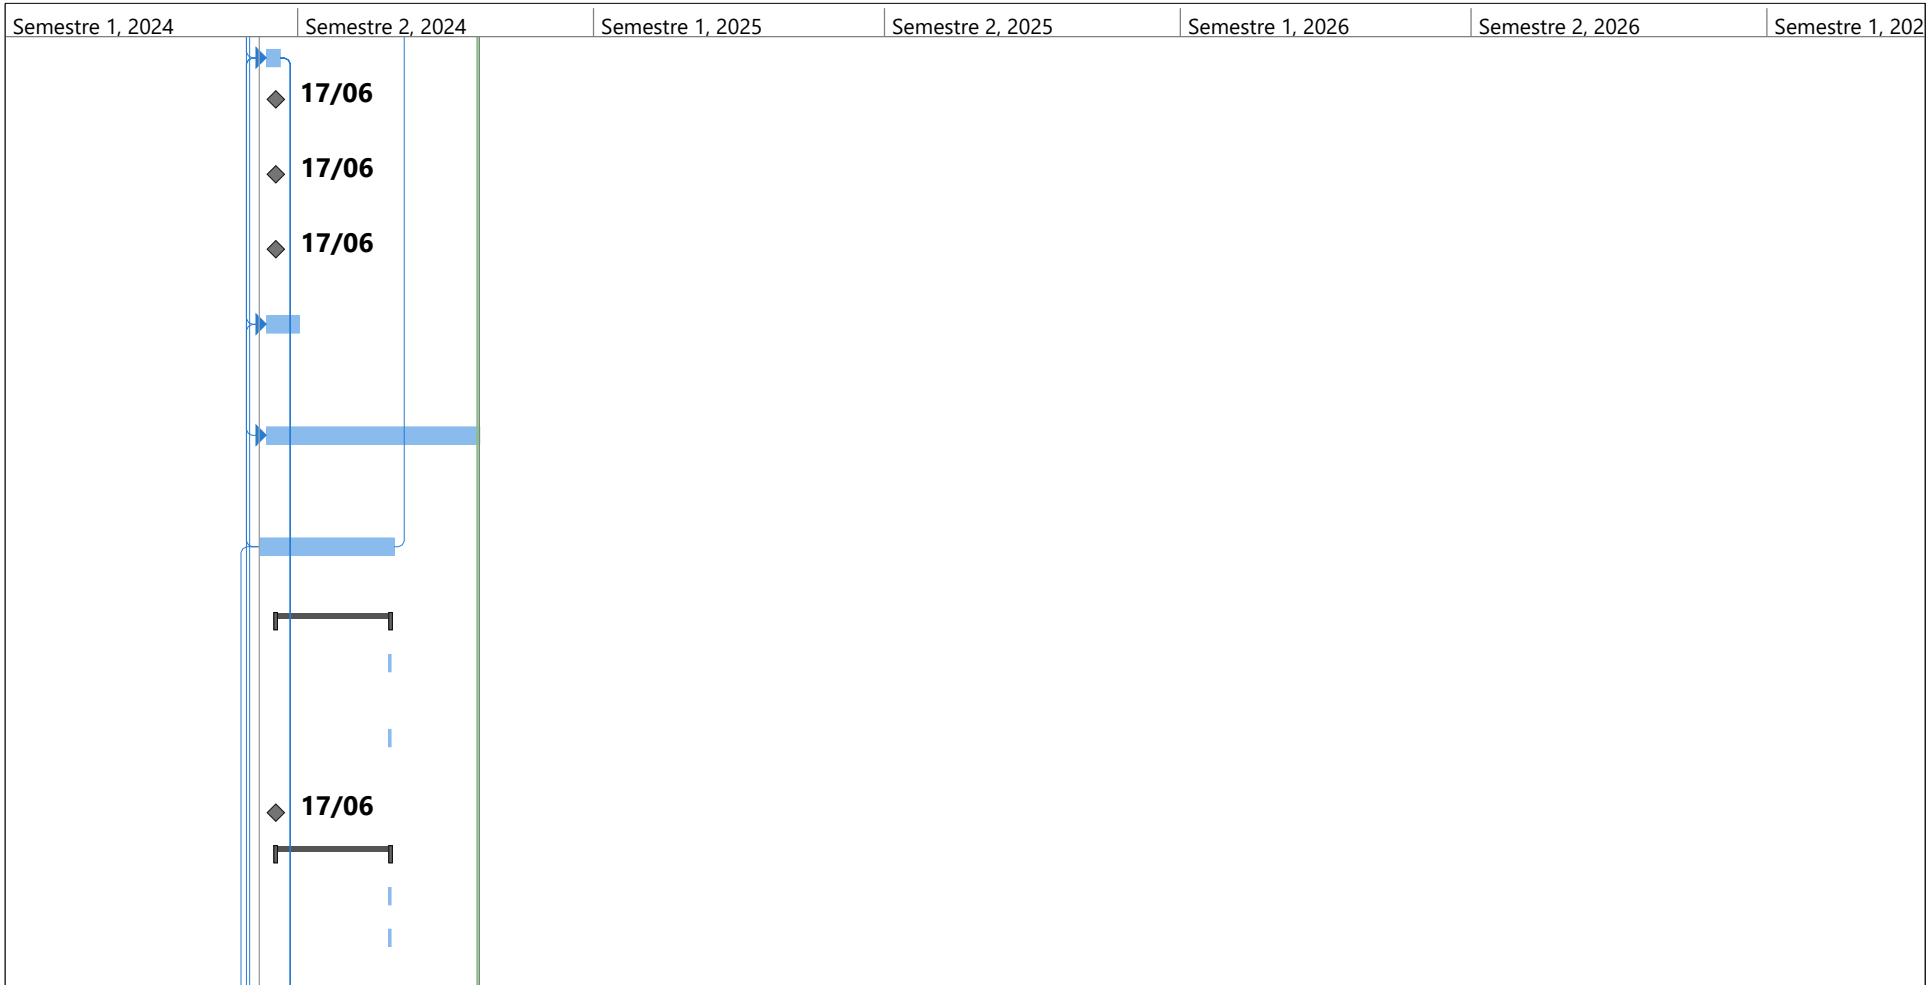


Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

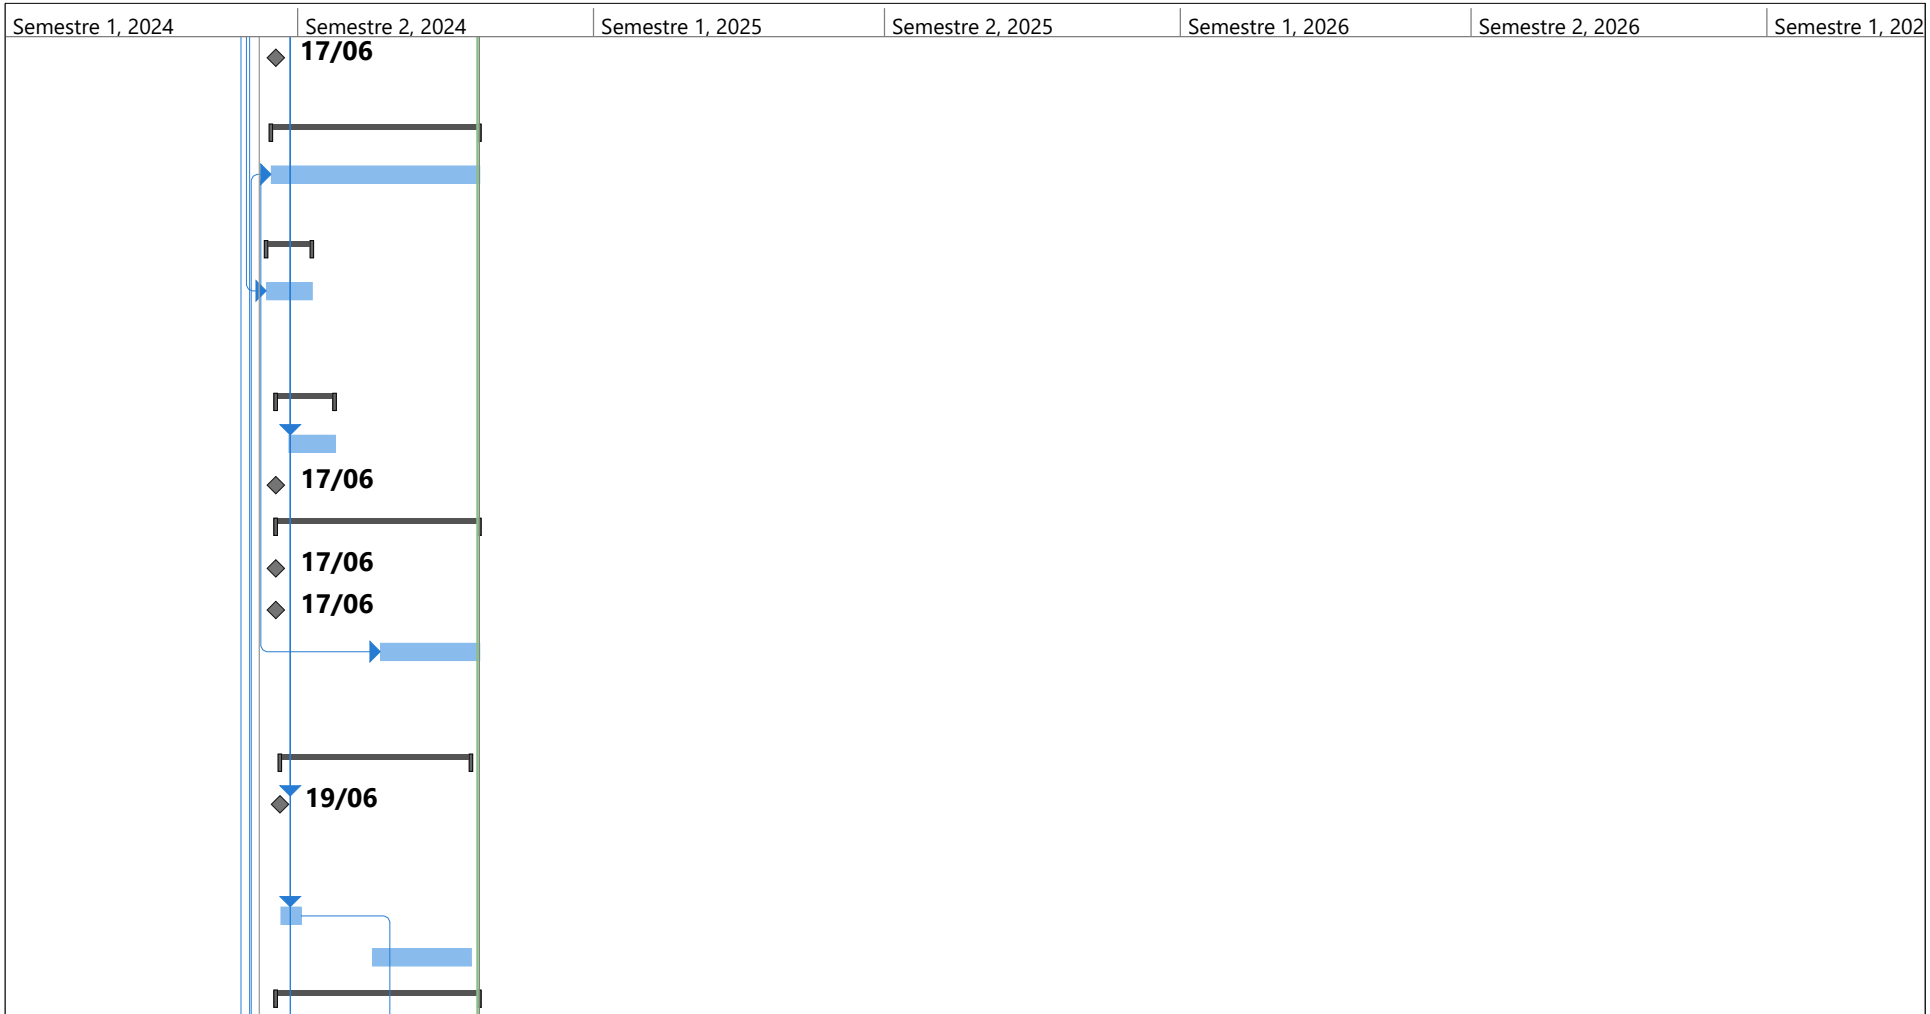


Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

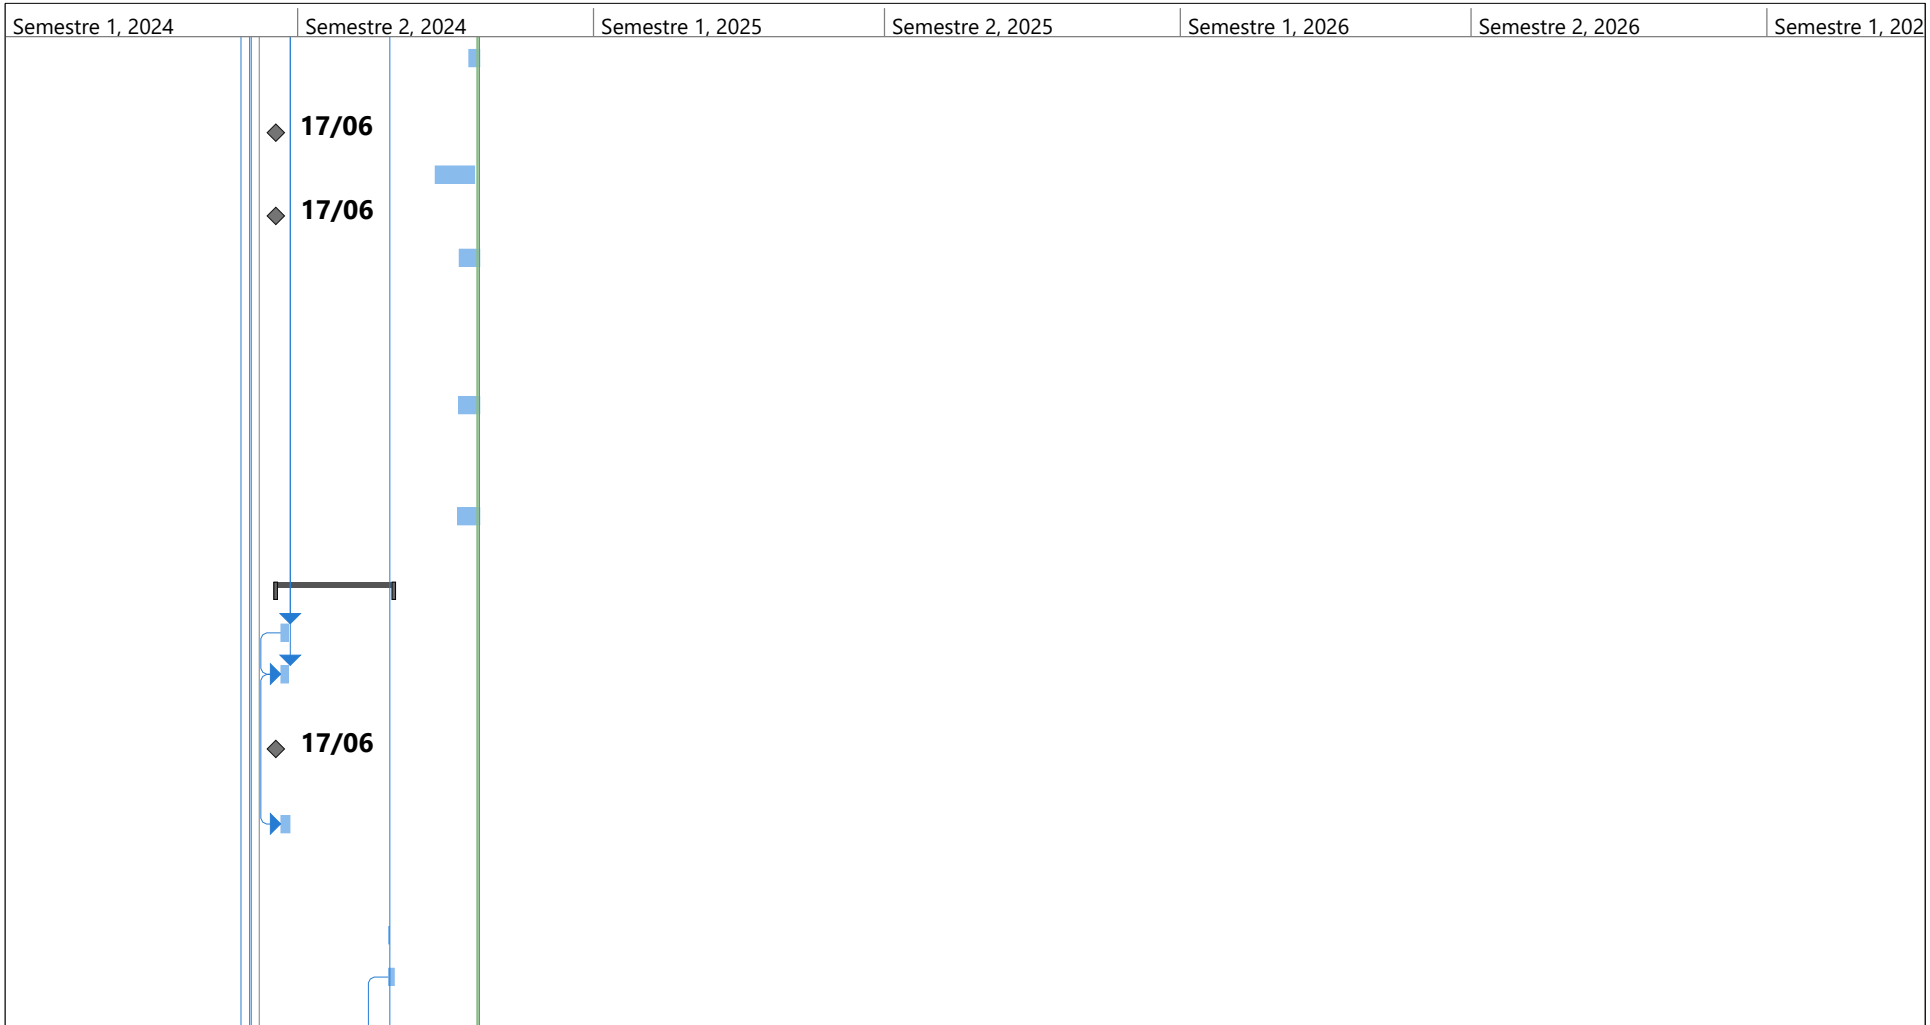


Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

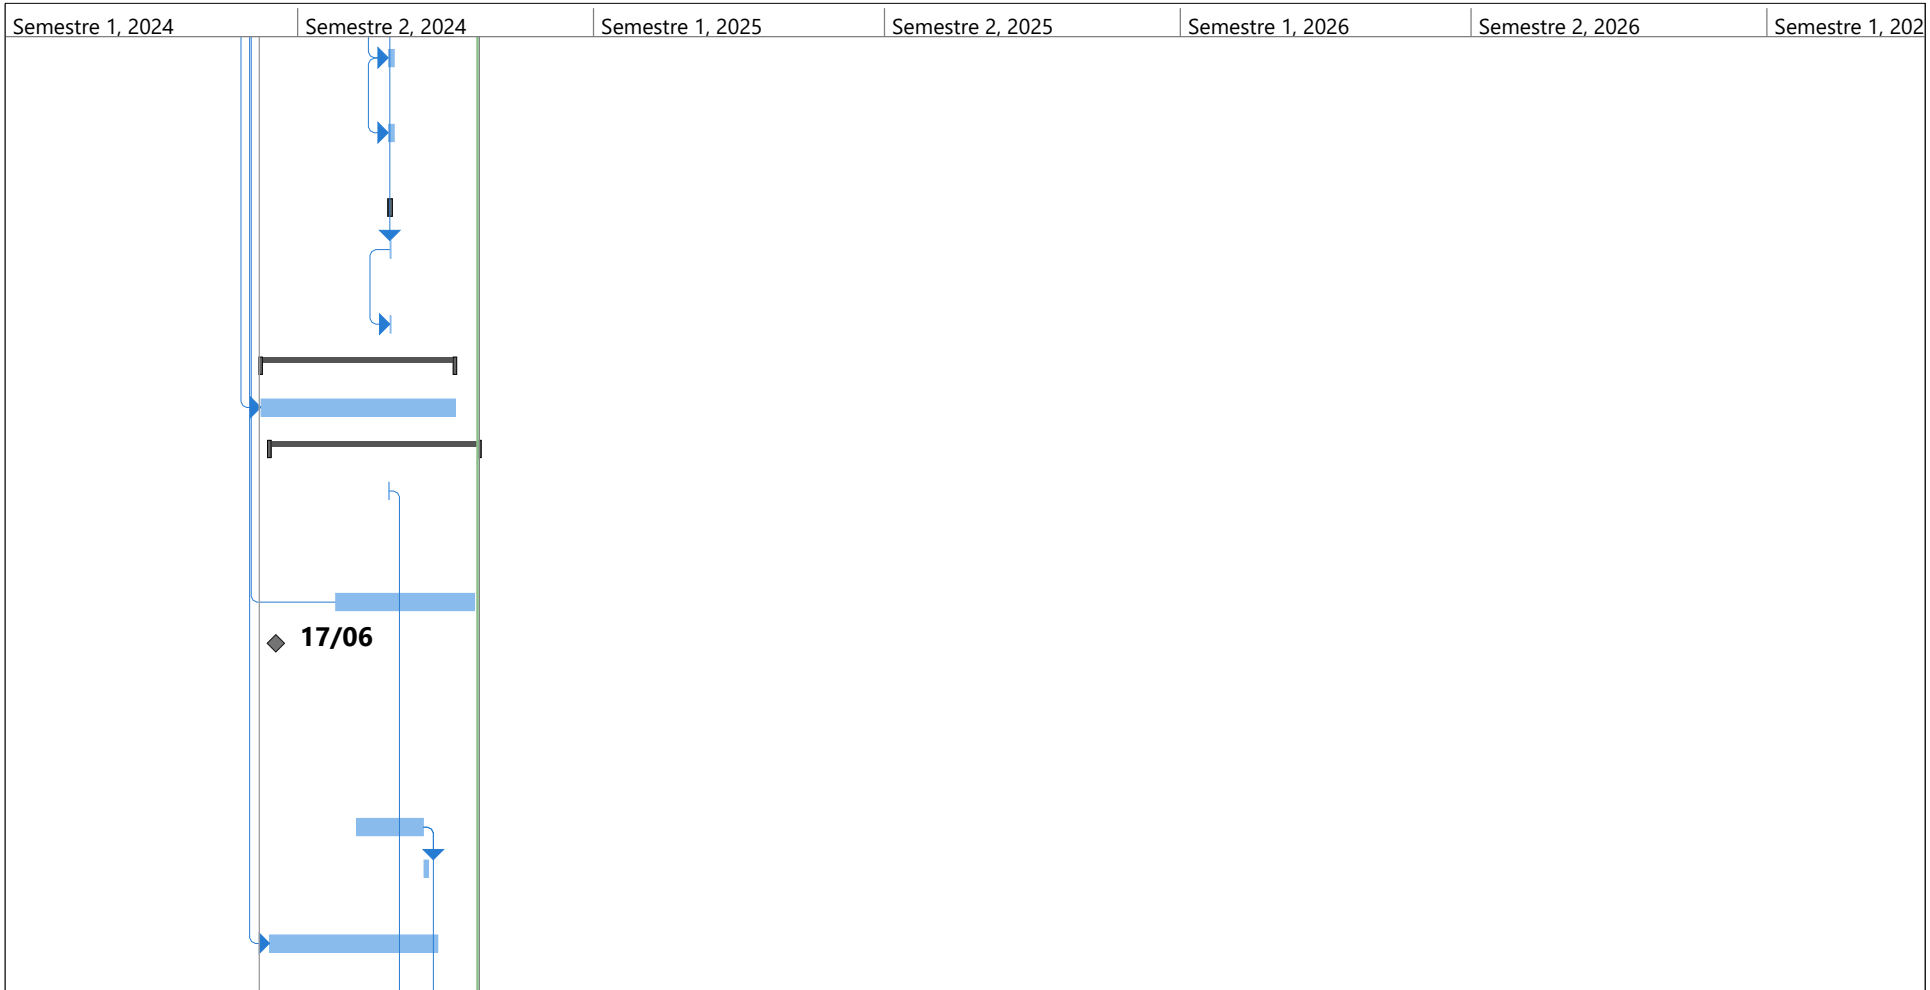

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

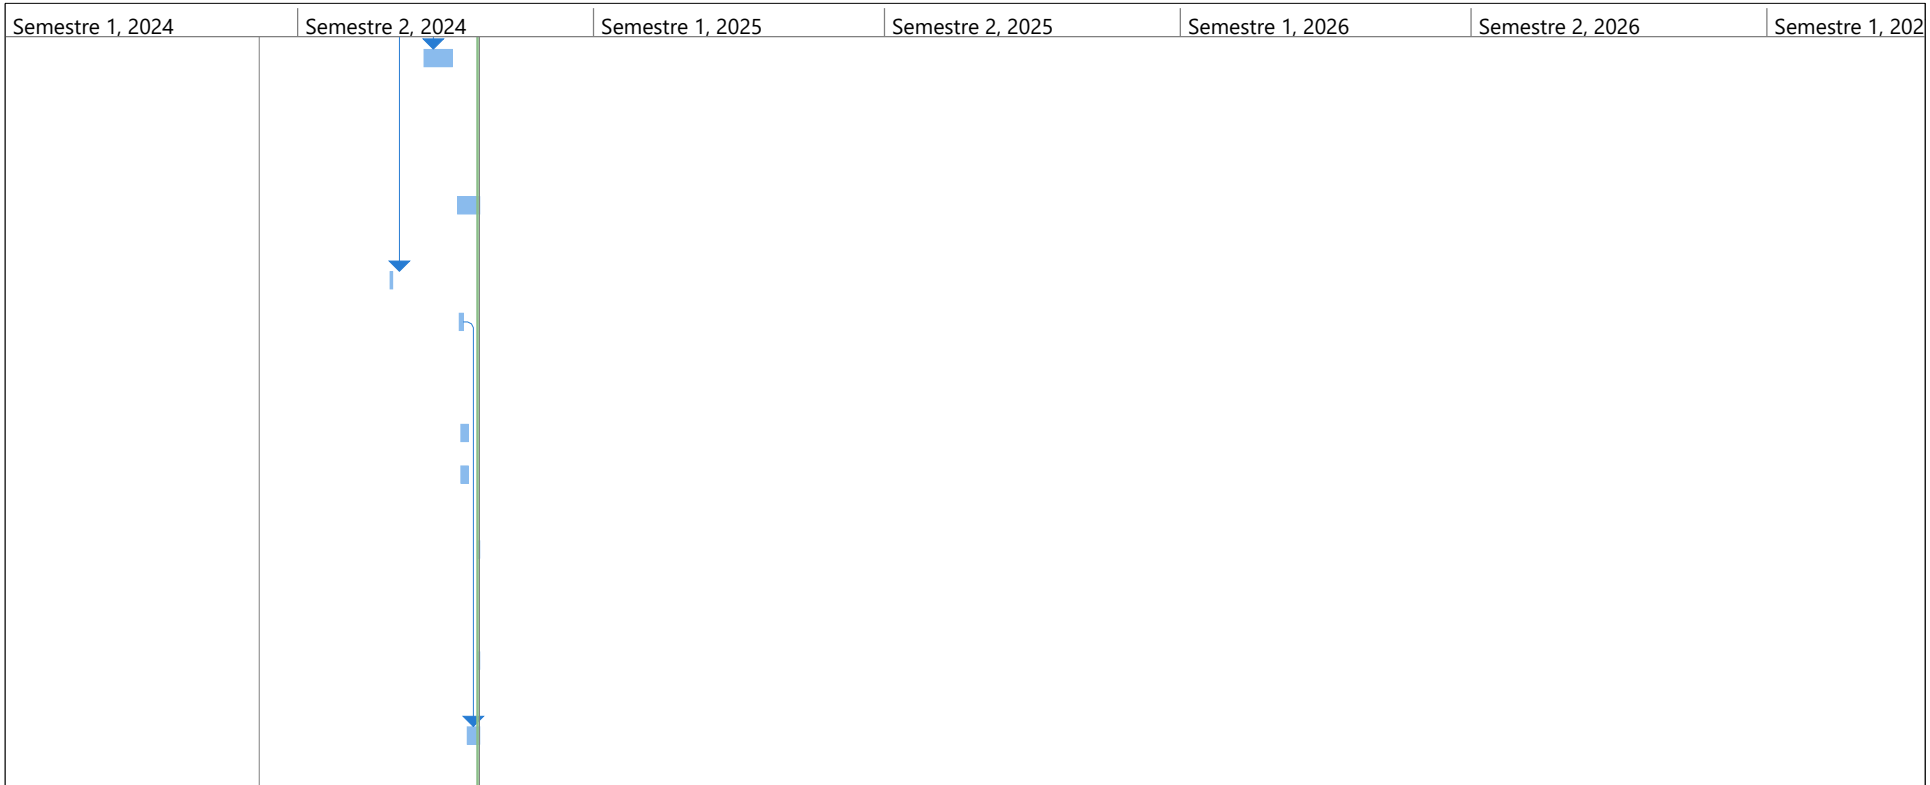

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**ORIP BODEGA No. 2 ARCHIVO SNR - FUNZA (Cundinamarca).**	**$ 1.089.396.709,...**	**98 días?**	**vie 7/06/24**	**lun 21/10/24**	
2		**PRELIMINARES**	**$ 38.771.592,97**	**24 días**	**vie 7/06/24**	**mié 10/07/24**	
3		LOGISTICA Y ALISTAMIENTO DE MATERIALES Y PERSONAL OPERATIVO	$ 0,00	23 días	vie 7/06/24	mar 9/07/24	
4		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24	
5		RETIRO DE PINTURA EXISTENTE SOBRE PISO	$ 38.771.592,97	12 días	mar 25/06/24	mié 10/07/24	4CC
6		**CIELORRASOS**	**$ 166.907.275,...**	**20 días**	**lun 9/09/24**	**dom 6/10/24**	
7		SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar)	$ 166.907.275,92	20 días	lun 9/09/24	dom 6/10/24	19CC
8		**ENCHAPE MUROS**	**$ 2.142.345,78**	**15 días**	**jue 11/07/24**	**mié 31/07/24**	
9		RESANE	$ 2.142.345,78	15 días	jue 11/07/24	mié 31/07/24	5
10		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**$ 0,00**	**0 días**	**jue 1/08/24**	**jue 1/08/24**	
11		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	$ 0,00	0 días	jue 1/08/24	jue 1/08/24	9FC+1 día

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
12		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**$ 0,00**	**0 días**	**jue 1/08/24**	**jue 1/08/24**	
13		SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON POLIUREA E=1,5MM	$ 0,00	0 días	jue 1/08/24	jue 1/08/24	11CC
14		**PINTURAS**	**$ 708.346.611,...**	**91 días?**	**lun 17/06/24**	**vie 18/10/24**	
15		PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	$ 80.506.525,38	15 días	jue 11/07/24	mié 31/07/24	9CC
16		PINTURA DE ACABADO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO, 3 CAPAS	$ 174.012.490,75	24 días	mié 18/09/24	vie 18/10/24	
17		PINTURA DE ACABADO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO. LINEAS DE SEÑALIZACION, 3 CAPAS	$ 0,00	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24	

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
18		RECUBRIMIENTO ESMALTE 3 EN 1 EN PASAMANOS Y BARANDALES, se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes, dos manos	$ 0,00	1 día?	lun 17/06/24	lun 17/06/24	
19		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE DE BASE ACUOSA NULLFIRE o Similar. Incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y preparación de la superficie y elementos para trabajo en alturas. Se debe cubrir las superficies horizonta	$ 453.827.595,38	45 días	mar 9/07/24	lun 9/09/24	
20		**RED ELÉCTRICA**	**$ 0,00**	**1 día**	**lun 17/06/24**	**lun 17/06/24**	
21		INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24	
22		SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24	
23		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	$ 0,00	1 día	lun 17/06/24	lun 17/06/24	
24		SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24	
25		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**$ 173.228.883,...**	**92 días**	**lun 17/06/24**	**lun 21/10/24**	
26		ASEO GENERAL DE OBRA	$ 8.566.919,65	15 días	mié 2/10/24	lun 21/10/24	


Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
27		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24	24CC
28		PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24	27CC
29		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24	28CC
30		SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO. 3 PUESTOS 53LT	$ 0,00	0 días	lun 17/06/24	lun 17/06/24	29CC
31		**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 164.661.964,...**	**74,81 días**	**mié 10/07/24**	**lun 21/10/24**	
32		DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS	$ 1.900.720,71	9 días	mié 10/07/24	lun 22/07/24	
33		DESMONTE DE DIVISIONES MOD	$ 520.223,65	3 días	jue 11/07/24	lun 15/07/24	
34		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZA	$ 0,00	8 días	mar 30/07/24	jue 8/08/24	
35		LUMINARIA LED 60X60CM DE SOB	$ 17.481.790,34	8 días	mar 16/07/24	jue 25/07/24	32CC+4 días
36		REPARACIÓN DE FISURAS PLACA	$ 48.868.724,12	8 días	mar 30/07/24	jue 8/08/24	
37		LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 2.971.316,65	8 días	mar 30/07/24	jue 8/08/24	
38		IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZ	$ 0,00	5 días	jue 8/08/24	jue 15/08/24	37
39		SELLADO DE FLANCHES INLUYE	$ 4.119.482,39	8 días	jue 8/08/24	mar 20/08/24	34
40		MANTENIMINETO CUBIERTA INCL	$ 57.553.522,18	50 días	mié 7/08/24	lun 14/10/24	34CC+6 días
41		REVISIÓN Y AJUSTE DE LAMPARA	$ 5.004.566,21	10 días	mié 18/09/24	mar 1/10/24	
42		PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	$ 26.241.617,91	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	


Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24



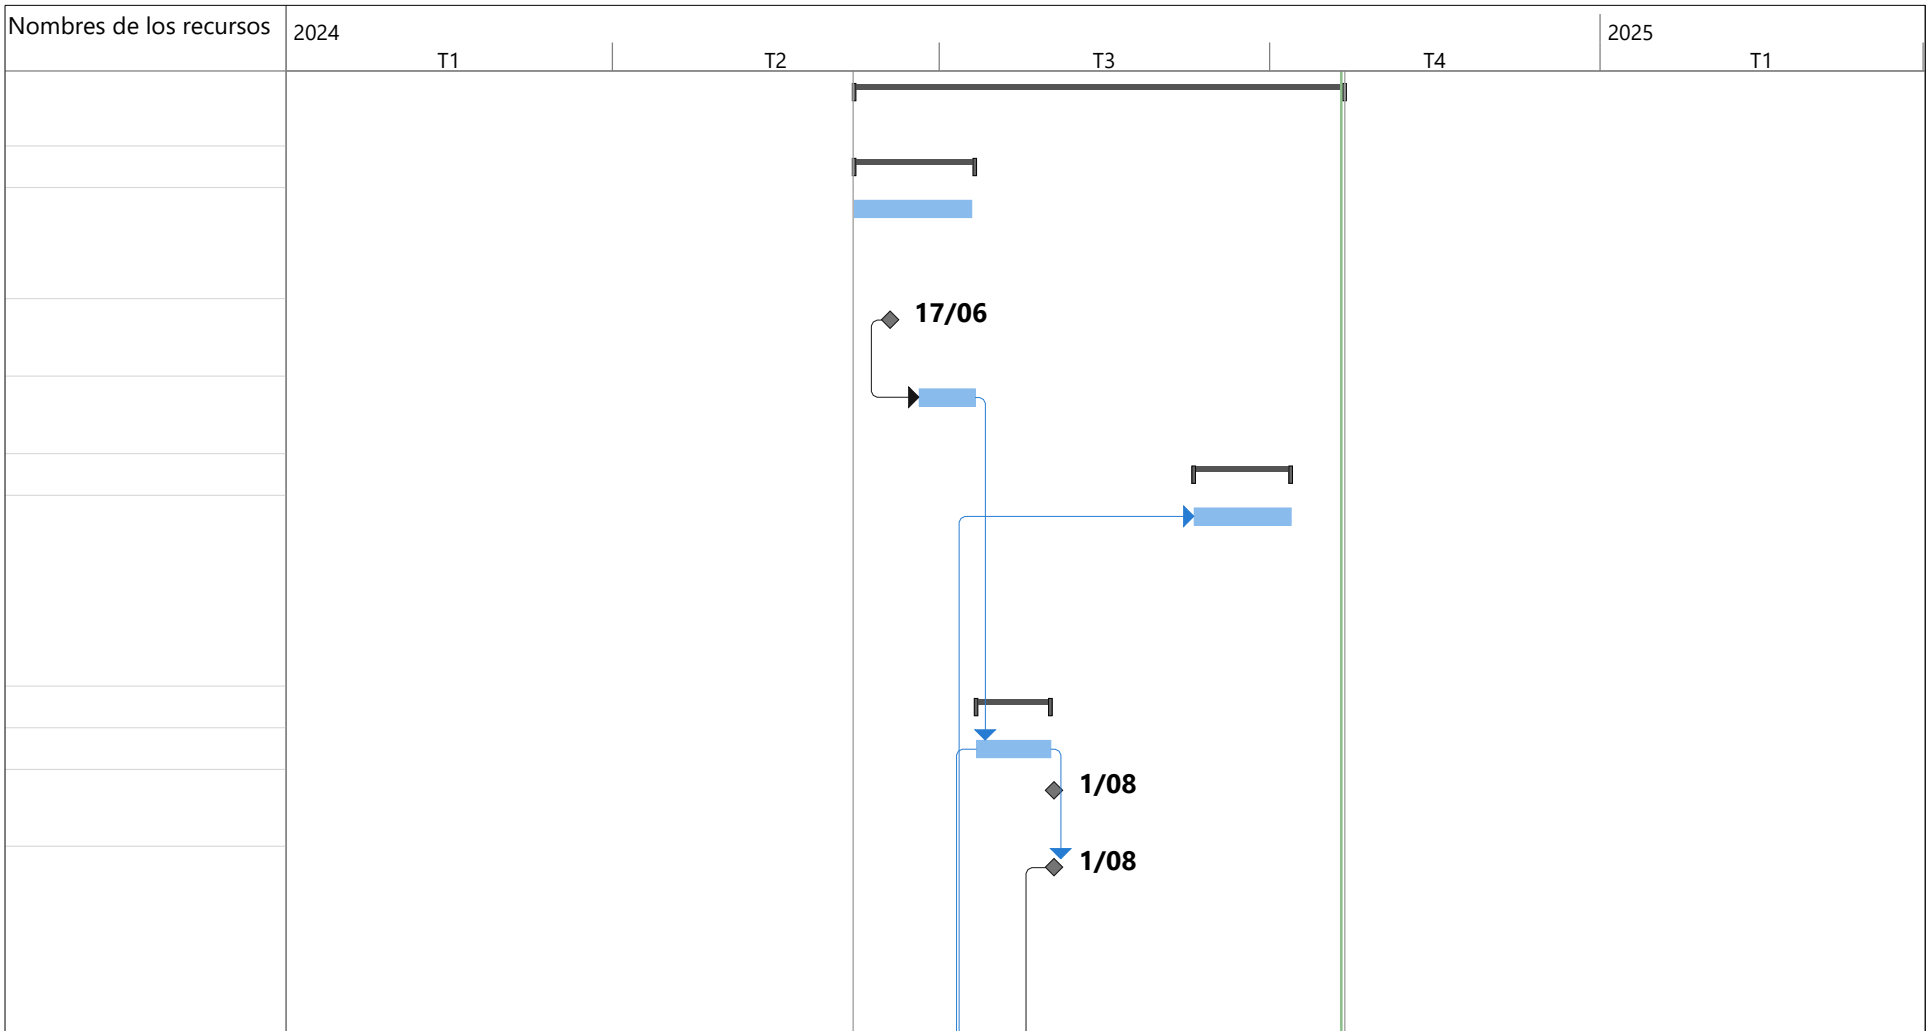


Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

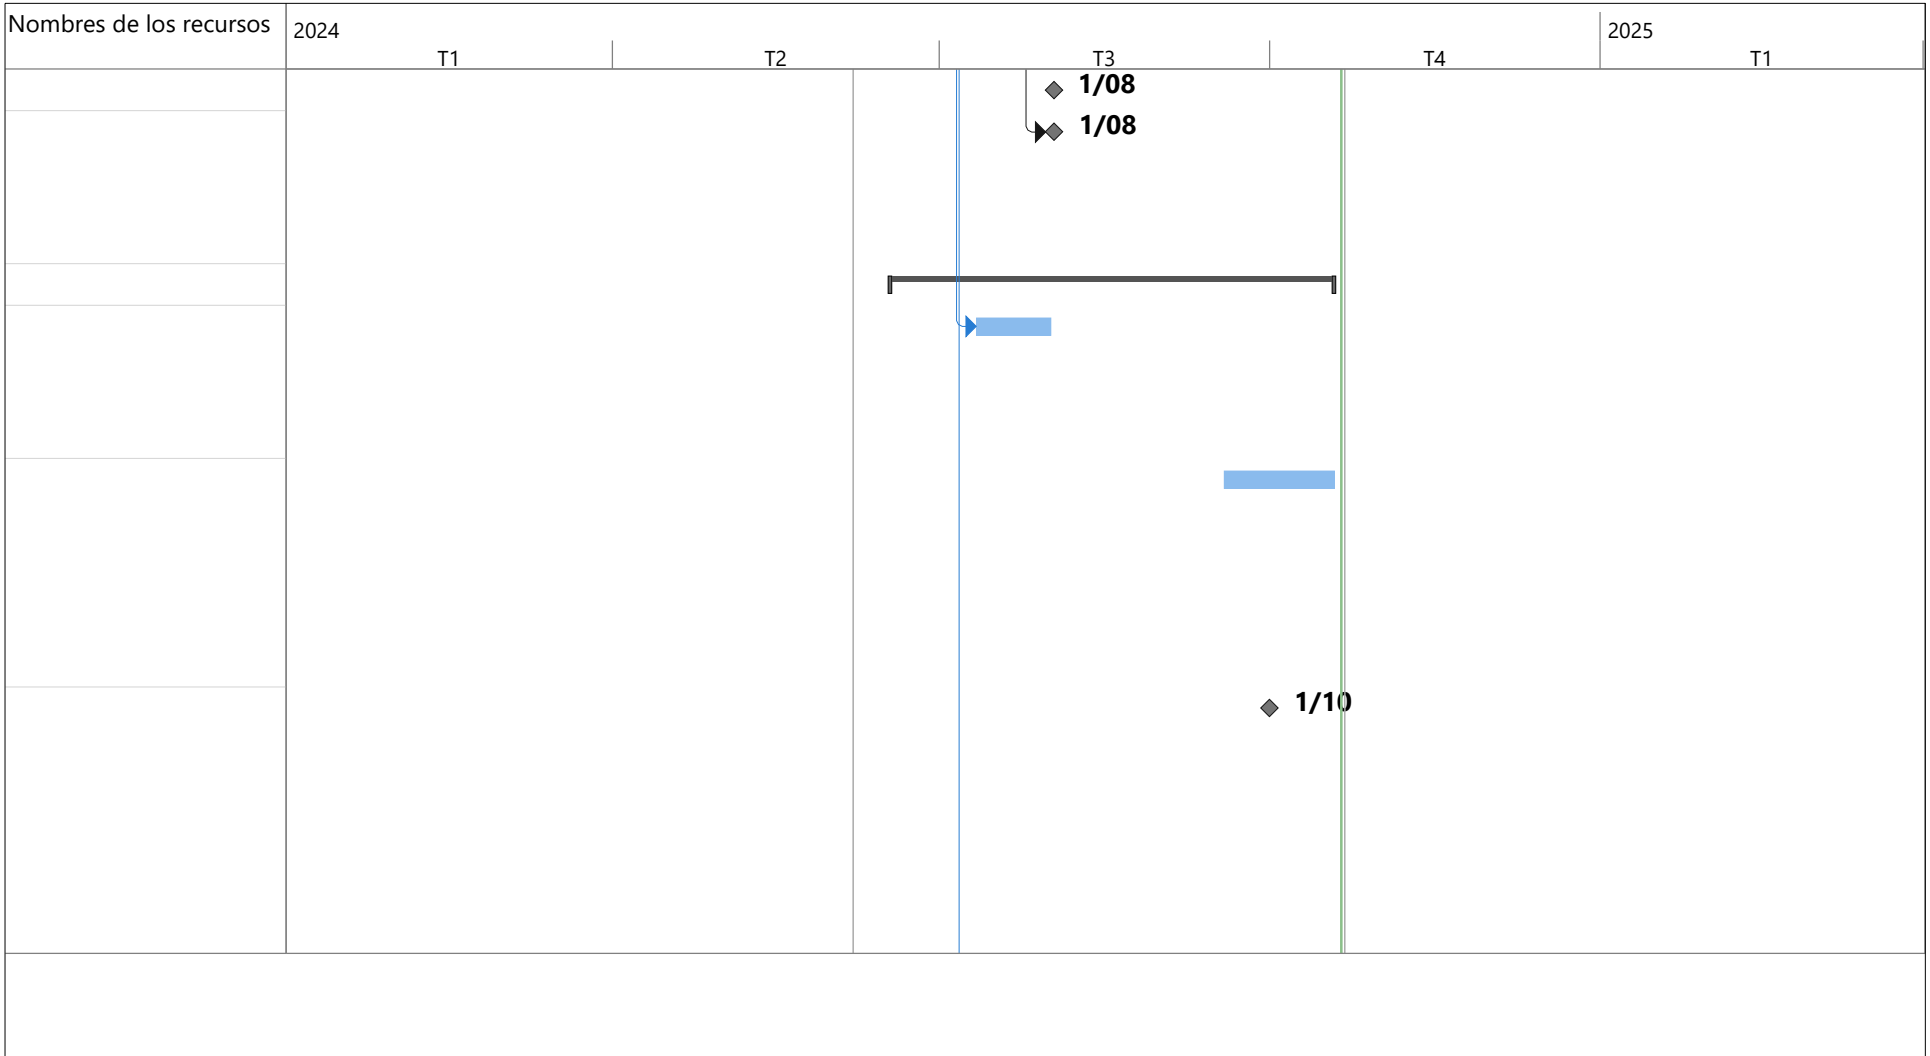


Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

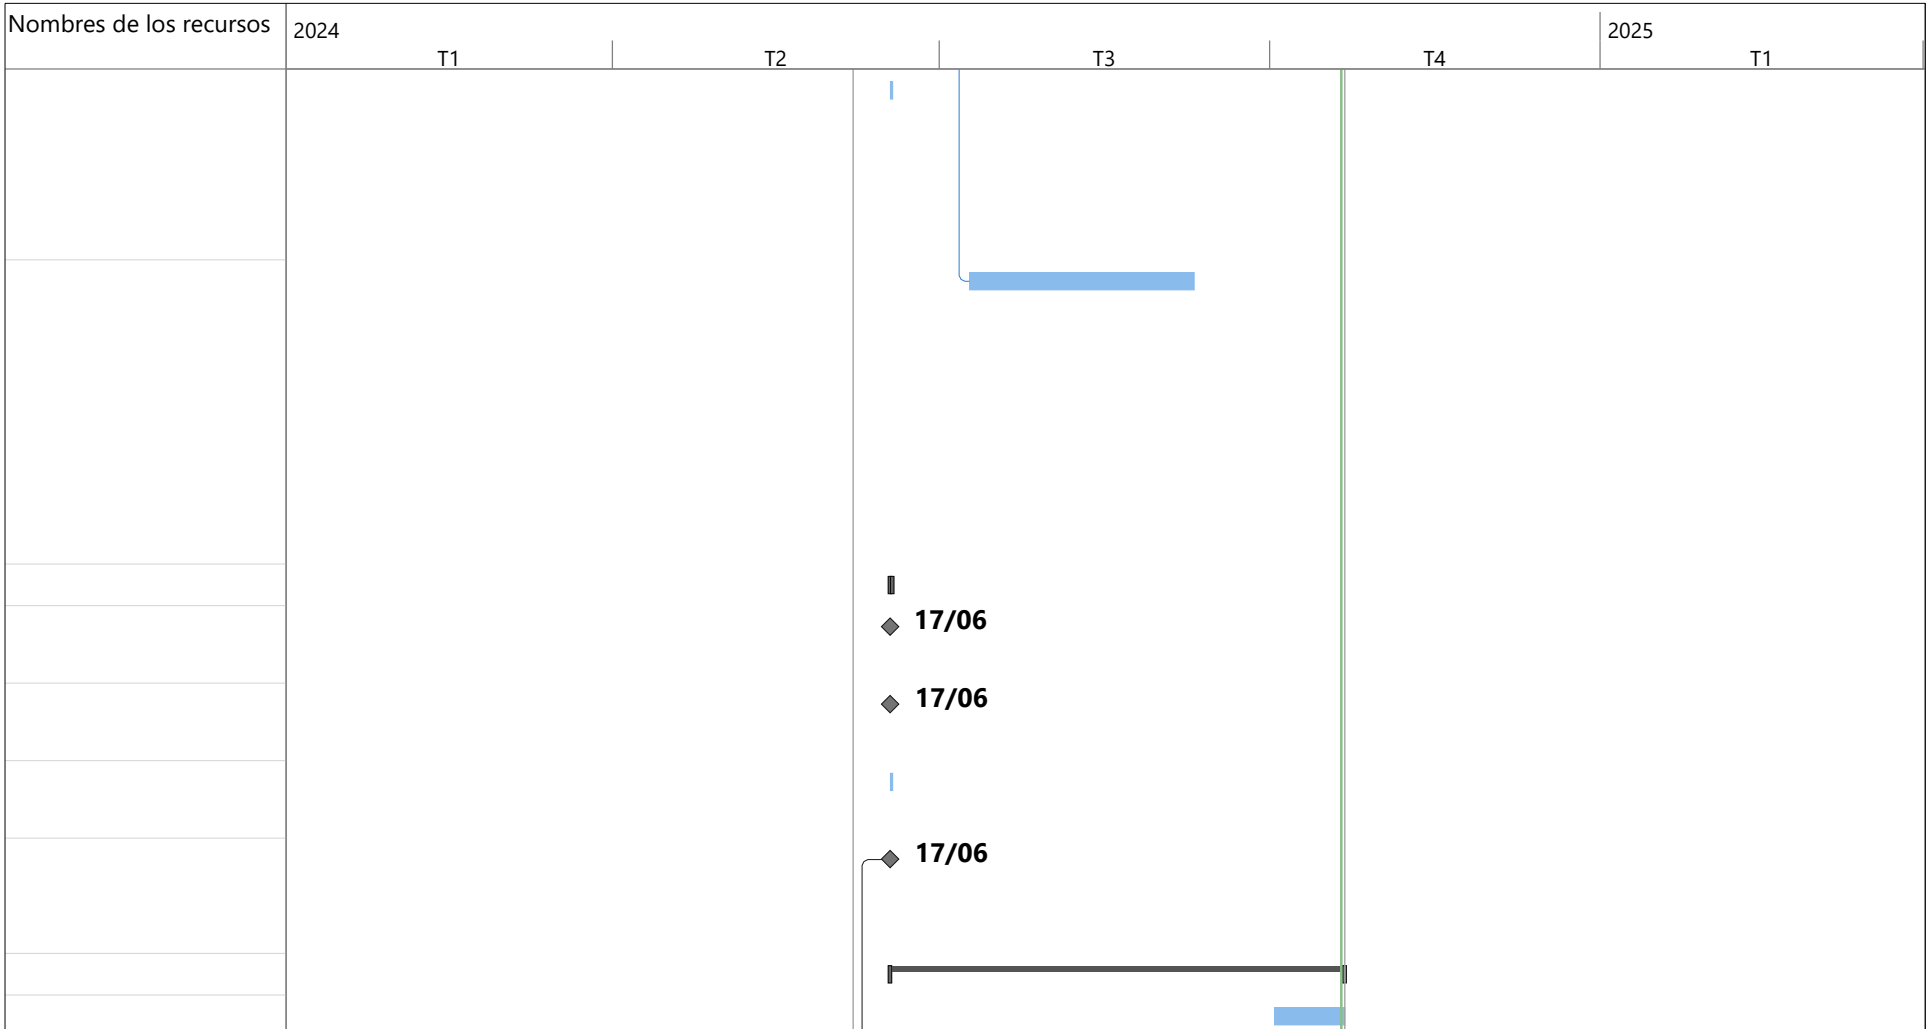

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

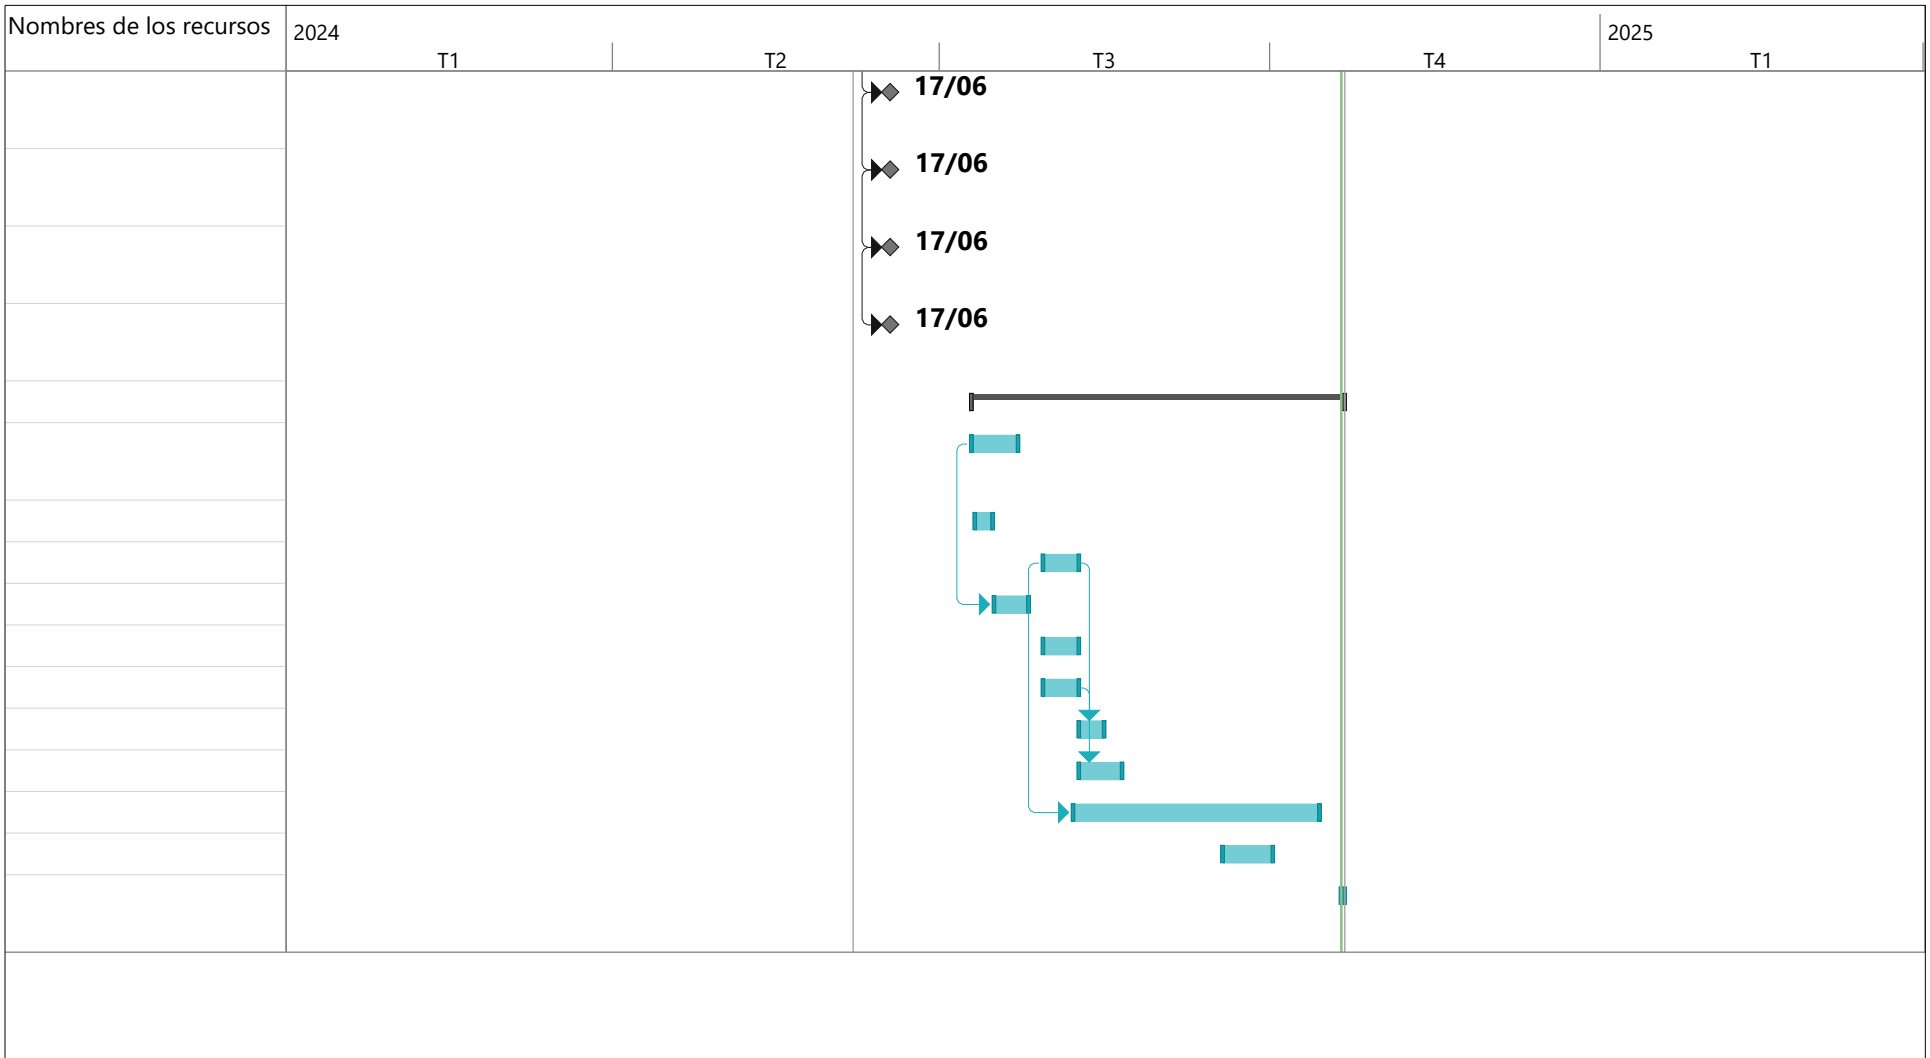

Proyecto: PROGRAMACION FU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
