
PROGRAMA DE OBRA

PRE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS" LOTE 1

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo
0	0	**IDU-1739-2023-CVERDE-CL82 PRECONST V-LE 2 20241007**	1/12/23	12/02/31	2212 días	$ 385 101 884 884
1	1	**CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD REQUERIDA DEL CORREDOR CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 3**	1/12/23	12/02/31	2212 días	$ 385 101 884 884
2	1.1	**PRELIMINARES**	1/12/23	15/02/24	61 días	$ 0
3	1.1.1	Firma de Contrato	1/12/23	1/12/23	0 días	$ 0
4	1.1.2	Designar Director de Proyecto - Contratista	14/12/23	14/12/23	0 días	$ 0
5	1.1.3	**Garantía Única de Cumplimiento**	11/12/23	28/12/23	14 días	$ 0
6	1.1.3.1	Presentación de Garantía Única de Cumplimiento	11/12/23	11/12/23	0 días	$ 0
7	1.1.3.2	Aprobación u Observaciones Garantía Única de Cumplimiento por parte del IDU	15/12/23	15/12/23	0 días	$ 0
8	1.1.3.3	Atención Observaciones y/o corrección Garantía Única de Cumplimiento	21/12/23	21/12/23	0 días	$ 0
9	1.1.3.4	Aprobación de Garantías	28/12/23	28/12/23	0 días	$ 0
10	1.1.4	**Anticipo**	6/12/23	19/12/23	10 días	$ 0
11	1.1.4.1	Informar al IDU si va a solicitar un Anticipo, porcentaje y valor	12/12/23	12/12/23	0 días	$ 0
12	1.1.4.2	Elaboración Plan de Inversión del Anticipo	6/12/23	19/12/23	10 días	$ 0
13	1.1.4.3	Entrega Plan de inversión del anticipo al IDU	19/12/23	19/12/23	0 días	$ 0
14	1.1.5	**Plan Parcial Pedregal**	6/02/26	15/02/26	8 días	$ 0
15	1.1.5.1	Recopilación información existente - Imcluye reunión en IDU	6/02/26	6/02/24	0 días	$ 0
16	1.1.5.2	Solicitud información - Reunión con Pedregal	15/02/26	15/02/24	0 días	$ 0
17	1.1.5.3	Entrega parcial de información por Pedregal	15/02/26	15/02/24	0 días	$ 0
18	1.1.6	**Elaboración y entrega a Interventoría PAC - enero 2024**	29/01/24	29/01/24	0 días	$ 0
19	1.2	**ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN**	22/02/24	11/02/25	284 días	$ 5 109 222 653
20	1.2.1	**Obligaciones Contractuales**	23/02/24	31/01/25	276 días	$ 361 875 493
21	1.2.1.1	Firma Acta de inicio Etapa de Construcción	23/02/24	23/02/24	0 días	$ 0
22	1.2.1.2	Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de la interventoría y el IDU, el director del proyecto	1/03/24	1/03/24	0 días	$ 0
23	1.2.1.3	**Contrato de fiducia**	23/02/24	26/03/24	26 días	$ 0
24	1.2.1.3.1	Entrega a la Interventoría Minuta contrato de fiducia	23/02/24	1/03/24	6 días	$ 0
25	1.2.1.3.2	Observaciones al Contrato de Fiducia por parte de Interventoría	1/03/24	6/03/24	4 días	$ 0
26	1.2.1.3.3	Mesas de trabajo verificación Contrato de fiducia	8/03/24	8/03/24	0 días	$ 0
27	1.2.1.3.4	Atención de observaciones Contrato de Fiducia - Contratista	8/03/24	13/03/24	4 días	$ 0
28	1.2.1.3.5	Entrega minuta contrato de fiducia	19/03/24	19/03/24	0 días	$ 0
29	1.2.1.3.6	Aprobación Contrato de Fiducia - Interventoría	26/03/24	26/03/24	0 días	$ 0
30	1.2.1.4	**Anticipo**	23/02/24	3/04/24	30 días	$ 0
31	1.2.1.4.1	Entrega Plan de Inversión del Anticipo a Interventoría	23/02/24	23/02/24	0 días	$ 0
32	1.2.1.4.2	Revisión por parte de Interventoría - Plan Inversión anticipo	1/03/24	1/03/24	0 días	$ 0
33	1.2.1.4.3	Atención observaciones por parte del Contratista - Plan Inversión anticipo	1/03/24	13/03/24	10 días	$ 0
34	1.2.1.4.4	Entrega Plan de inversión del anticipo	13/03/24	13/03/24	0 días	$ 0
35	1.2.1.4.5	Aprobación Plan de Inversión del Anticipo por parte del IDU	3/04/24	3/04/24	0 días	$ 0
36	1.2.1.5	**Plan de Calidad y Plan de Inspección y ensayos**	23/02/24	1/04/24	28 días	$ 0
37	1.2.1.5.1	Elaboración Plan de Calidad y Plan de Inspección y ensayos	23/02/24	1/03/24	6 días	$ 0
38	1.2.1.5.2	Entrega Plan de Calidad y Plan de Inspección y ensayos	1/03/24	1/03/24	0 días	$ 0
39	1.2.1.5.3	Revisión por parte de Interventoría Plan de Calidad y Plan de Inspección y ensayos	1/03/24	8/03/24	6 días	$ 0
40	1.2.1.5.4	Atención de Observaciones Plan de Calidad y Plan de Inspección y ensayos	8/03/24	15/03/24	6 días	$ 0
41	1.2.1.5.5	Aprobación Plan de Calidad y Plan de Inspección y ensayos	1/04/24	1/04/24	0 días	$ 0
42	1.2.1.6	**Cronograma de etapa de Preconstrucción**	1/03/24	22/03/24	18 días	$ 381 875 493
43	1.2.1.6.1	Entrega Cronograma de etapa de Preconstrucción	1/03/24	1/03/24	0 días	$ 0
44	1.2.1.6.2	Revisión Interventoría	1/03/24	13/03/24	10 días	$ 0
45	1.2.1.6.3	Atención de Observaciones Cronograma de Preconstrucción	13/03/24	19/03/24	5 días	$ 0
46	1.2.1.6.4	Aprobación Cronograma de Preconstrucción	22/03/24	22/03/24	0 días	$ 381 875 493
47	1.2.1.7	**Plan Anual de Caja - PAC**	27/03/24	31/01/25	249 días	$ 0
48	1.2.1.7.1	Elaboración y entrega a Interventoría PAC - marzo 2024	27/03/24	27/03/24	0 días	$ 0
49	1.2.1.7.2	Elaboración y entrega a Interventoría PAC - mayo 2024	30/05/24	30/05/24	0 días	$ 0
50	1.2.1.7.3	Elaboración y entrega a Interventoría PAC - julio 2024	30/07/24	30/07/24	0 días	$ 0
51	1.2.1.7.4	Elaboración y entrega a Interventoría PAC - septiembre 2024	30/09/24	30/09/24	0 días	$ 0
52	1.2.1.7.5	Elaboración y entrega a Interventoría PAC - noviembre- 2024	29/11/24	29/11/24	0 días	$ 0
53	1.2.1.7.6	Elaboración y entrega a Interventoría PAC - enero- 2025	31/01/25	31/01/25	0 días	$ 0
54	1.2.1.8	Informar a la interventoría, el tipo de acción a tomar para la revisión y aprogación de diseños entregados por la entidad - Cláusula 3.4 del	22/03/24	22/03/24	0 días	$ 0
55	1.2.2	**ESTUDIOS Y DISEÑOS**	23/02/24	11/02/25	284 días	$ 2 482 190 706
56	1.2.2.1	**Plan Parcial Pedregal**	23/02/24	22/05/24	70 días	$ 0
57	1.2.2.1.1	Revisión Información	23/02/24	23/03/24	25 días	$ 0
58	1.2.2.1.2	Armonización inicial, siempre y cuando existan planos de diseños definitivos por parte del Pedregal con el fin de colejar diseños con el corredor Verde	22/05/24	22/05/24	0 días	$ 0
59	1.2.2.2	**Primera Entrega de Estudios y Diseños (Incluye coordinación BIM, Deprimido Cl. 100, Empalme Cl. 107 a Cl 115, Area de Oportunidad**	23/02/24	4/04/24	80 días	$ 0
60	1.2.2.2.1	**Building Information Modeling (BIM)**	23/02/24	7/03/24	11 días	$ 0
61	1.2.2.2.1.1	Elaboración de documento plan te dejecución BIM (PEB)	23/02/24	1/03/24	6 días	$ 0
62	1.2.2.2.1.2	Entrega de documento plan de dejecución BIM (PEB)	1/03/24	1/03/24	0 días	$ 0
63	1.2.2.2.1.3	Aprobación documento PEB	7/03/24	7/03/24	0 días	$ 0
64	1.2.2.2.2	**Levantamiento Topográfico - Incluye BIM**	23/02/24	30/05/24	77 días	$ 0
65	1.2.2.2.2.1	Trabajo de Campo e Información documental (georreferenciación y nivelación poligonal)	23/02/24	22/04/24	44 días	$ 0
66	1.2.2.2.2.2	Informe y anexos (cálculos y memorias, planos planta - perfil - secciones, MDT, inspección redes)	22/04/24	2/05/24	8 días	$ 0
67	1.2.2.2.2.3	Radicación a interventoría informe topografía	2/05/24	2/05/24	0 días	$ 0
68	1.2.2.2.2.4	Revisión de Interventoría	2/05/24	15/05/24	10 días	$ 0
69	1.2.2.2.2.5	Atención Observaciones por el Contratista	15/05/24	24/05/24	8 días	$ 0
70	1.2.2.2.2.6	Concepto a los estudios y diseños (Interventoria) - Topografia	30/05/24	30/05/24	0 días	$ 0
71	1.2.2.2.3	**Diseño Geométrico**	23/02/24	4/04/24	80 días	$ 0
72	1.2.2.2.3.1	Revisión Parámetros y Diseños (Documental)	23/02/24	23/03/24	25 días	$ 0
73	1.2.2.2.3.2	Reunión de inicio - Mesa de Trabajo con Interventoria	23/03/24	23/03/24	0 días	$ 0
74	1.2.2.2.3.3	Actualización y ajustes de Diseño Geométrico (Planta y rasante corredor y giros izquierdos calle 109 y 102)-Versión 1	26/03/24	22/05/24	45 días	$ 0
75	1.2.2.2.3.4	Radicación a Interventoría	22/05/24	22/05/24	0 días	$ 0
76	1.2.2.2.3.5	Revisión de Interventoría	22/05/24	4/06/24	10 días	$ 0
77	1.2.2.2.4	**Urbanismo y Espacio Público**	23/02/24	4/04/24	80 días	$ 0
78	1.2.2.2.4.1	Revisión Parámetros y Diseños (Documental)	23/02/24	23/03/24	25 días	$ 0
79	1.2.2.2.4.2	Reunión de inicio - Mesa de Trabajo con Interventoría	20/03/24	20/03/24	0 días	$ 0
80	1.2.2.2.4.3	Actualización y ajustes de Urbanismo y Espacio Público	20/03/24	22/05/24	48 días	$ 0
81	1.2.2.2.4.4	Radicación a Interventoría	22/05/24	22/05/24	0 días	$ 0
82	1.2.2.2.4.5	Revisión de Interventoría	22/05/24	4/06/24	10 días	$ 0
83	1.2.2.2.5	**Redes Húmedas**	23/02/24	4/04/24	80 días	$ 0
84	1.2.2.2.5.1	Revisión Parámetros y Diseños (Documental)	23/02/24	3/04/24	30 días	$ 0
85	1.2.2.2.5.2	Reunión de inicio - Mesa de Trabajo con Interventoría	20/03/24	20/03/24	0 días	$ 0
86	1.2.2.2.5.3	Inventario diagnóstico de redes existentes	26/03/24	1/05/24	29 días	$ 0
87	1.2.2.2.5.4	Actualización y ajustes de redes Húmedas	26/03/24	22/05/24	45 días	$ 0
88	1.2.2.2.5.5	Radicación a Interventoría	22/05/24	22/05/24	0 días	$ 0
89	1.2.2.2.5.6	Revisión de Interventoría	22/05/24	4/06/24	10 días	$ 0
90	1.2.2.2.6	**Redes Secas y Telemáticos**	23/02/24	4/04/24	80 días	$ 0
91	1.2.2.2.6.1	Revisión Parámetros y Diseños (Documental)	23/02/24	3/04/24	30 días	$ 0
92	1.2.2.2.6.2	Reunión de inicio - Mesa de Trabajo con Interventoría	20/03/24	20/03/24	0 días	$ 0
93	1.2.2.2.6.3	Inventario diagnóstico de redes existentes	3/04/24	8/05/24	29 días	$ 0
94	1.2.2.2.6.4	Actualización y ajustes de Secas y Telemáticos	3/04/24	22/05/24	40 días	$ 0
95	1.2.2.2.6.5	Radicación a Interventoría	22/05/24	22/05/24	0 días	$ 0
96	1.2.2.2.6.6	Revisión de Interventoría	22/05/24	4/06/24	10 días	$ 0
97	1.2.2.2.7	**Geotecnia**	23/02/24	4/04/24	80 días	$ 0
98	1.2.2.2.7.1	Revisión Parámetros y Diseños (Documental)	23/02/24	3/04/24	30 días	$ 0
99	1.2.2.2.7.2	Reunión de inicio - Mesa de Trabajo con Interventoría	20/03/24	20/03/24	0 días	$ 0
100	1.2.2.2.7.3	Recopilación y revisión de las campañas de investigación previas	23/02/24	3/04/24	30 días	$ 0
101	1.2.2.2.7.4	Elaboración perfiles geológico - geotécnicos preliminares	3/04/24	17/04/24	12 días	$ 0
102	1.2.2.2.7.5	Sectorización preliminar del corredor a partir de la información secundaria disponible	4/04/24	23/04/24	15 días	$ 0
103	1.2.2.2.7.6	Campaña complementaria de prospecciones y ensayos de laboratorio	15/04/24	31/05/24	38 días	$ 0
104	1.2.2.2.7.7	Informe de avance con información secundaria	22/04/24	22/05/24	24 días	$ 0
105	1.2.2.2.7.8	Radicación a Interventoría	22/05/24	22/05/24	0 días	$ 0
106	1.2.2.2.7.9	Revisión de Interventoría	22/05/24	4/06/24	10 días	$ 0
107	1.2.2.2.8	**Pavimentos**	23/02/24	4/04/24	80 días	$ 0
108	1.2.2.2.8.1	Revisión Parámetros y Diseños (Documental)	23/02/24	3/04/24	30 días	$ 0
109	1.2.2.2.8.2	Reunión de inicio - Mesa de Trabajo con Interventoría	20/03/24	20/03/24	0 días	$ 0
110	1.2.2.2.8.3	Campaña Exploración complementaria (Pavimentos) - Incuye ensayos de laboratorio	15/04/24	31/05/24	38 días	$ 0
111	1.2.2.2.8.4	Dimensionamiento preliminar de estructuras de pavimento	26/03/24	22/04/24	20 días	$ 0
112	1.2.2.2.8.5	Análisis de información de campo - Avance 1	10/05/24	22/05/24	8 días	$ 0
113	1.2.2.2.8.6	Radicación a Interventoría	8/30/24	22/05/24	0 días	$ 0
114	1.2.2.2.8.7	Revisión de Interventoría	22/05/24	4/06/24	10 días	$ 0
115	1.2.2.2.9	**Diseños Estructurales**	23/02/24	4/04/24	80 días	$ 0
116	1.2.2.2.9.1	Revisión Parámetros y Diseños (Documental)	23/02/24	3/04/24	30 días	$ 0
117	1.2.2.2.9.2	Reunión de inicio - Mesa de Trabajo con Interventoría	20/03/24	20/03/24	0 días	$ 0
118	1.2.2.2.9.3	**Estaciones BRT**	25/06/24	4/04/24	30 días	$ 0
119	1.2.2.2.9.3.1	Arquitectura estaciones (calle 100 - 106 y 127)	25/04/24	22/05/24	20 días	$ 0
120	1.2.2.2.9.3.2	Arquitectura estación (calle 116)	25/04/24	22/05/24	20 días	$ 0
121	1.2.2.2.9.3.3	Radicación a Interventoría	22/05/24	22/05/24	0 días	$ 0
122	1.2.2.2.9.3.4	Revisión de Interventoría	22/05/24	4/06/24	10 días	$ 0
123	1.2.2.3	**Segunda Entrega de Estudios y Diseños (Incluye coordinación BIM, Deprimido Cl. 100, Empalme Cl. 107 a Cl 115, Area de Oportunidad**	22/05/24	22/10/24	124 días	$ 0
124	1.2.2.3.1	**Diseño Geométrico**	24/06/24	1/08/24	32 días	$ 0
125	1.2.2.3.1.1	Diseño secciones transversales con actualización de pavimento	24/06/24	22/07/24	22 días	$ 0
126	1.2.2.3.1.2	Radicación a Interventoría	22/07/24	22/07/24	0 días	$ 0
127	1.2.2.3.1.3	Revisión de Interventoría	22/07/24	1/08/24	10 días	$ 0
128	1.2.2.3.2	**Urbanismo y Espacio Público**	4/06/24	24/07/24	40 días	$ 0
129	1.2.2.3.2.1	Armonización interdisciplinaria	4/06/24	29/06/24	21 días	$ 0
130	1.2.2.3.2.2	Elaboración secciones y detalles	20/06/24	11/07/24	17 días	$ 0
131	1.2.2.3.2.3	Radicación a Interventoría	11/07/24	11/07/24	0 días	$ 0
132	1.2.2.3.2.4	Revisión de Interventoría	11/07/24	24/07/24	10 días	$ 0
133	1.2.2.3.3	**Redes Húmedas**	4/06/24	22/10/24	114 días	$ 0
134	1.2.2.3.3.1	Atención de observaciones de interventoría	4/06/24	5/07/24	25 días	$ 0
135	1.2.2.3.3.2	Trabajo conjunto con EAAB	11/06/24	5/07/24	20 días	$ 0
136	1.2.2.3.3.3	Entrega informe de redes húmedas - planos y perfiles versión 1	9/07/24	22/07/24	10 días	$ 0
137	1.2.2.3.3.4	**Productos**	30/09/24	22/10/24	20 días	$ 0
138	1.2.2.3.3.4.1	**Red Matriz de 42"**	2/10/24	11/10/24	8 días	$ 0
139	1.2.2.3.3.4.1	Radicación a Interventoría	2/10/24	2/10/24	0 días	$ 0
140	1.2.2.3.3.4.1	Revisión y entrega de Observaciones	2/10/24	8/10/24	5 días	$ 0
141	1.2.2.3.3.4.1	Radicación a Interventoría	8/10/24	11/10/24	3 días	$ 0
142	1.2.2.3.3.4.1	Aval de Interventoría, radicar y EAAB	11/10/24	11/10/24	0 días	$ 0
143	1.2.2.3.3.4.2	**Protecciones Red Matriz de 48"60" y 86"**	7/10/24	22/10/24	12 días	$ 0
144	1.2.2.3.3.4.2	Radicación a Interventoría	7/10/24	7/10/24	0 días	$ 0
145	1.2.2.3.3.4.2	Revisión y entrega de Observaciones	7/10/24	15/10/24	6 días	$ 0
146	1.2.2.3.3.4.2	Radicación a Interventoría	15/10/24	22/10/24	6 días	$ 0
147	1.2.2.3.3.4.3	**Redes matrices de 20 y 24"**	7/10/24	22/10/24	12 días	$ 0
148	1.2.2.3.3.4.3	Radicación a Interventoría	7/10/24	7/10/24	0 días	$ 0
149	1.2.2.3.3.4.3	Revisión y entrega de Observaciones	7/10/24	11/10/24	4 días	$ 0
150	1.2.2.3.3.4.3	Radicación a Interventoría	10/10/24	10/10/24	0 días	$ 0

PROGRAMA DE OBRA

PRE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS" LOTE 1

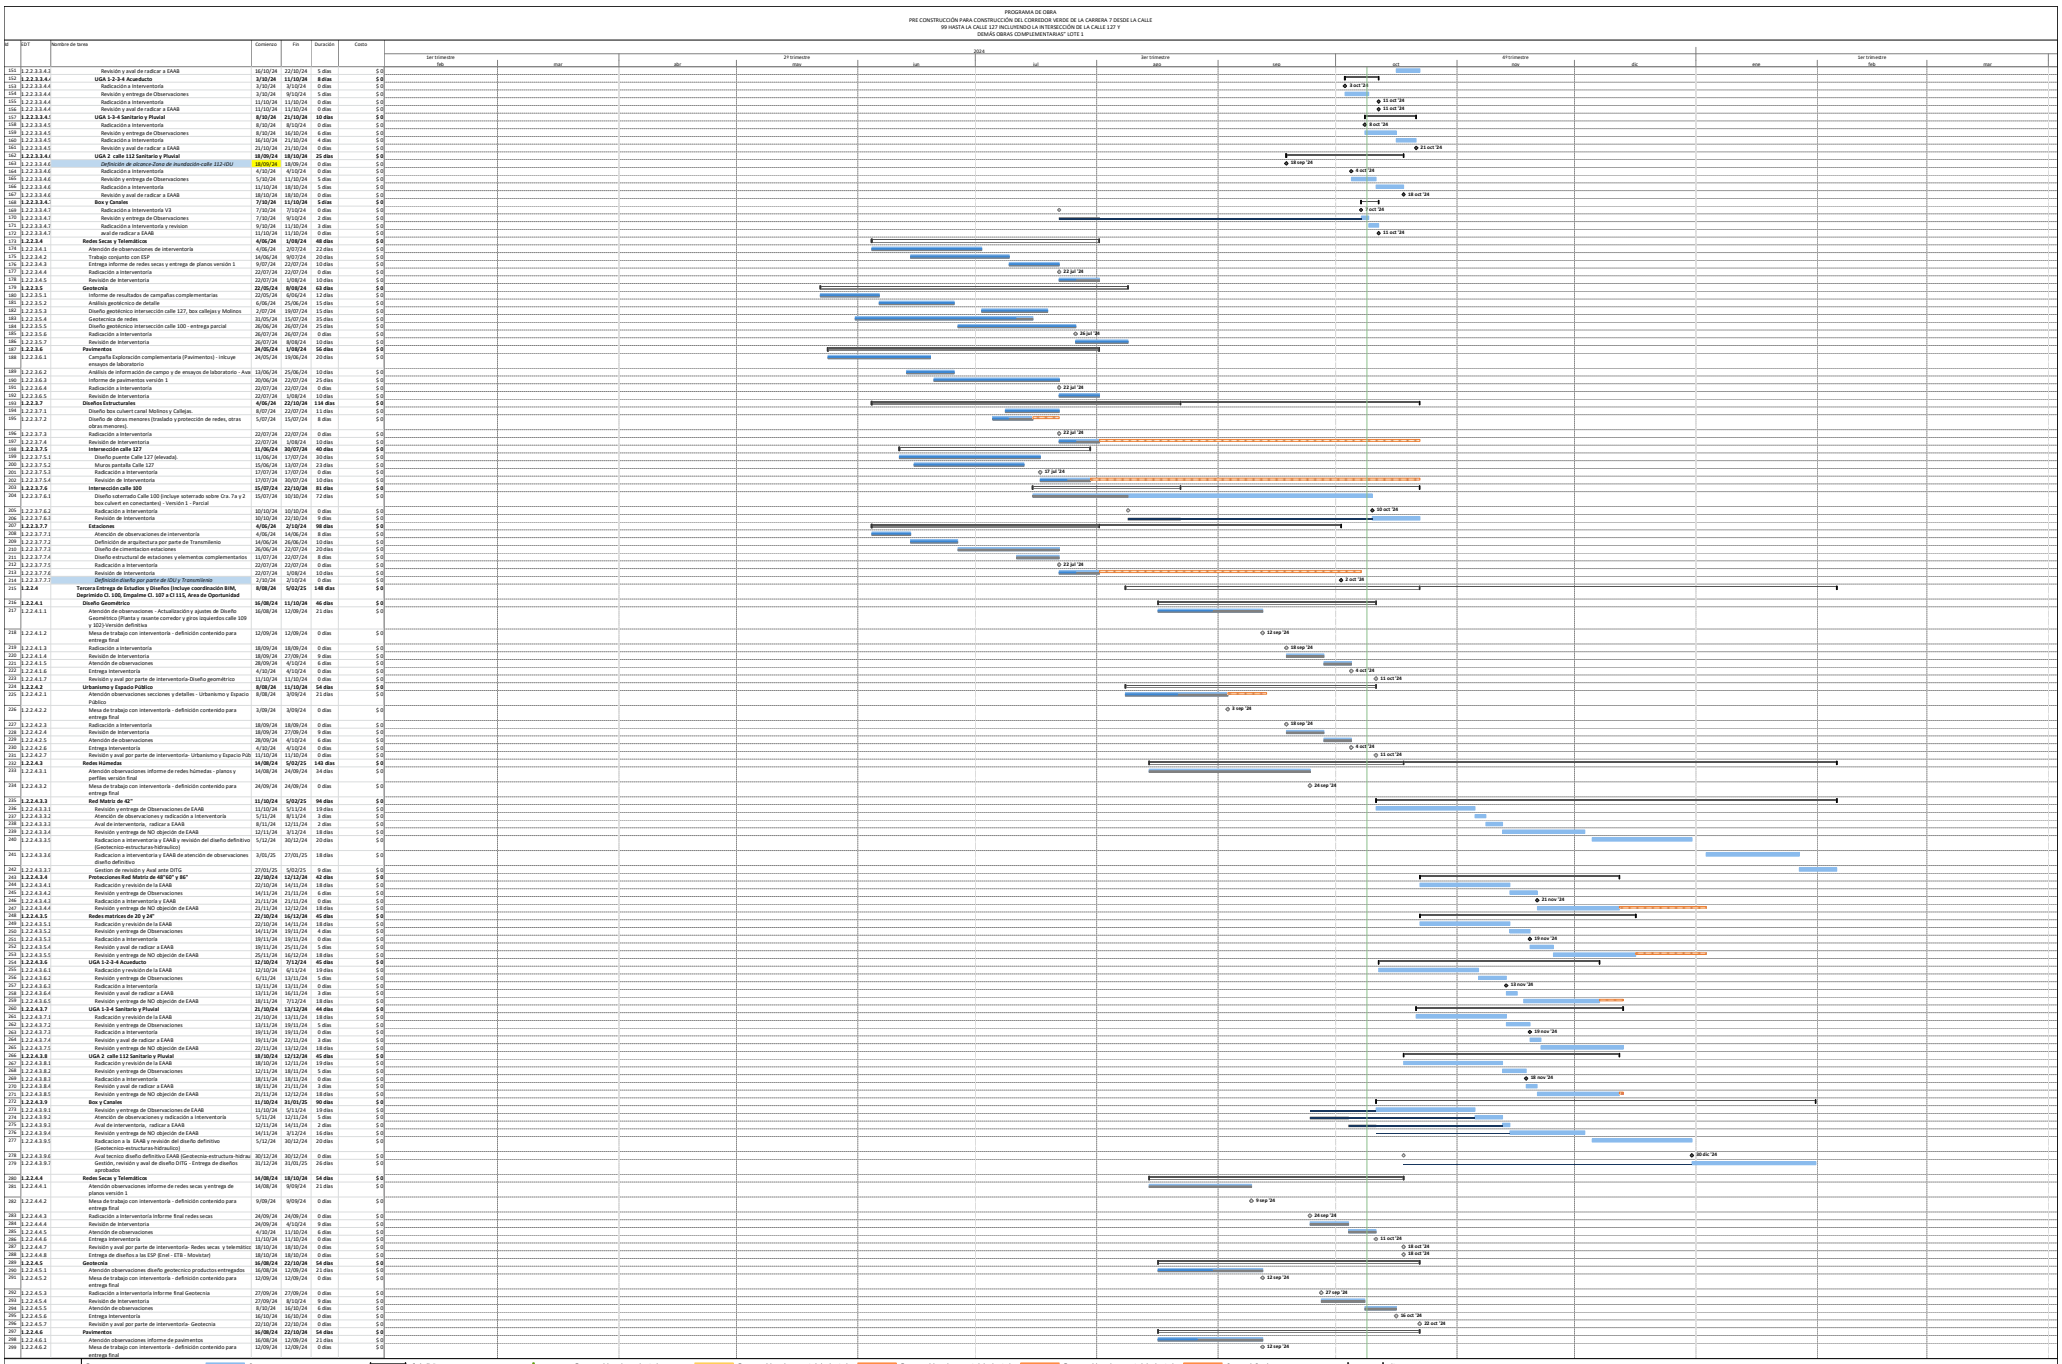


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo
151	1.2.2.3.3.4.3	Revisión y aval de radicar a EAAB	16/10/24	22/10/24	5 días	$ 0
152	**1.2.2.3.3.4.4**	**UGA 1-2-3-4 Acueducto**	**3/10/24**	**11/10/24**	**8 días**	**$ 0**
153	1.2.2.3.3.4.4	Radicación a Interventoría	3/10/24	9/10/24	6 días	$ 0
154	1.2.2.3.3.4.4	Revisión y entrega de Observaciones	3/10/24	9/10/24	5 días	$ 0
155	1.2.2.3.3.4.4	Radicación a Interventoría	11/10/24	11/10/24	0 días	$ 0
156	1.2.2.3.3.4.4	Revisión y aval de radicar a EAAB	11/10/24	11/10/24	0 días	$ 0
157	**1.2.2.3.3.4.7**	**UGA 1-3-4 Sanitario y Pluvial**	**8/10/24**	**21/10/24**	**10 días**	**$ 0**
158	1.2.2.3.3.4.5	Radicación a Interventoría	8/10/24	8/10/24	0 días	$ 0
159	1.2.2.3.3.4.5	Revisión y entrega de Observaciones	8/10/24	16/10/24	6 días	$ 0
160	1.2.2.3.3.4.5	Radicación a Interventoría	16/10/24	21/10/24	4 días	$ 0
161	1.2.2.3.3.4.5	Revisión y aval de radicar a EAAB	21/10/24	21/10/24	0 días	$ 0
162	**1.2.2.3.3.4.4**	**UGA 2 calle 112 Sanitario y Pluvial**	**18/09/24**	**18/10/24**	**25 días**	**$ 0**
163	1.2.2.3.3.4.4	*Definición de alcance-Zona de inundación-calle 112-IDU*	18/09/24	18/09/24	0 días	$ 0
164	1.2.2.3.3.4.6	Radicación a Interventoría	4/10/24	4/10/24	0 días	$ 0
165	1.2.2.3.3.4.6	Revisión y entrega de Observaciones	5/10/24	11/10/24	5 días	$ 0
166	1.2.2.3.3.4.6	Radicación a Interventoría	11/10/24	18/10/24	5 días	$ 0
167	1.2.2.3.3.4.6	Revisión y aval de radicar a EAAB	18/10/24	18/10/24	0 días	$ 0
168	**1.2.2.3.3.4.5**	**Box y Canales**	**7/10/24**	**11/10/24**	**5 días**	**$ 0**
169	1.2.2.3.3.4.7	Radicación a Interventoría V3	7/10/24	7/10/24	0 días	$ 0
170	1.2.2.3.3.4.7	Revisión y entrega de Observaciones	7/10/24	9/10/24	2 días	$ 0
171	1.2.2.3.3.4.7	Radicación a Interventoría y revision	9/10/24	11/10/24	3 días	$ 0
172	1.2.2.3.3.4.7	Aval de radicar a EAAB	11/10/24	11/10/24	0 días	$ 0
173	**1.2.2.3.4**	**Redes Secas y Telemáticos**	**4/06/24**	**1/08/24**	**40 días**	**$ 0**
174	1.2.2.3.4.1	Atención de observaciones de interventoría	4/06/24	2/07/24	22 días	$ 0
175	1.2.2.3.4.2	Trabajo conjunto con ESP	14/06/24	9/07/24	20 días	$ 0
176	1.2.2.3.4.3	Entrega informe de redes secas y entrega de planos versión 1	9/07/24	22/07/24	10 días	$ 0
177	1.2.2.3.4.4	Radicación a Interventoría	22/07/24	22/07/24	0 días	$ 0
178	1.2.2.3.4.5	Revisión de Interventoría	22/07/24	1/08/24	10 días	$ 0
179	**1.2.2.3.5**	**Geotecnia**	**22/05/24**	**8/08/24**	**63 días**	**$ 0**
180	1.2.2.3.5.1	Informe de resultados de campañas complementarias	22/05/24	6/06/24	12 días	$ 0
181	1.2.2.3.5.2	Análisis geotécnico de detalle	6/08/24	25/08/24	15 días	$ 0
182	1.2.2.3.5.3	Diseño geotécnico intersección calle 127, box calliejes y Molinos	2/07/24	19/07/24	15 días	$ 0
183	1.2.2.3.5.4	Geotecnia de redes	21/05/24	15/07/24	35 días	$ 0
184	1.2.2.3.5.5	Diseño geotécnico intersección calle 100 - entrega parcial	26/06/24	26/07/24	25 días	$ 0
185	1.2.2.3.5.6	Radicación a Interventoría	26/07/24	26/07/24	0 días	$ 0
186	1.2.2.3.5.7	Revisión de Interventoría	26/07/24	8/08/24	10 días	$ 0
187	**1.2.2.3.6**	**Pavimentos**	**24/05/24**	**1/08/24**	**56 días**	**$ 0**
188	1.2.2.3.6.1	Campaña Exploración complementaria (Pavimentos) - incluye ensayos de laboratorio	24/05/24	19/06/24	20 días	$ 0
189	1.2.2.3.6.2	Análisis de información de campo y de ensayos de laboratorio - Asoc	13/06/24	25/06/24	10 días	$ 0
190	1.2.2.3.6.3	Informe de pavimentos versión 1	20/06/24	22/07/24	25 días	$ 0
191	1.2.2.3.6.4	Radicación a Interventoría	22/07/24	22/07/24	0 días	$ 0
192	1.2.2.3.6.5	Revisión de Interventoría	22/07/24	1/08/24	10 días	$ 0
193	**1.2.2.3.7**	**Diseños Estructurales**	**4/06/24**	**22/10/24**	**114 días**	**$ 0**
194	1.2.2.3.7.1	Diseño box culvert canal Molinos y Callejas.	8/07/24	22/07/24	11 días	$ 0
195	1.2.2.3.7.2	Diseño de obras menores (traslado y protección de redes, otras obras menores).	5/07/24	15/07/24	8 días	$ 0
196	1.2.2.3.7.3	Radicación a Interventoría	22/07/24	22/07/24	0 días	$ 0
197	1.2.2.3.7.4	Revisión de Interventoría	22/07/24	1/08/24	10 días	$ 0
198	**1.2.2.3.7.5**	**Intersección calle 127**	**11/06/24**	**30/07/24**	**40 días**	**$ 0**
199	1.2.2.3.7.5.1	Diseño puente Calle 127 (elevada).	11/06/24	17/07/24	30 días	$ 0
200	1.2.2.3.7.5.2	Muros pantalla Calle 127	15/06/24	13/07/24	23 días	$ 0
201	1.2.2.3.7.5.3	Radicación a Interventoría	17/07/24	17/07/24	0 días	$ 0
202	1.2.2.3.7.5.4	Revisión de Interventoría	17/07/24	30/07/24	10 días	$ 0
203	**1.2.2.3.7.6**	**Intersección calle 100**	**15/07/24**	**22/10/24**	**81 días**	**$ 0**
204	1.2.2.3.7.6.1	Diseño cubrimiento Calle 100 (incluye soterrado sobre Cra. 7a y 2 box culvert en conectantes) - Versión 1 - Parcial	15/07/24	30/08/24	72 días	$ 0
205	1.2.2.3.7.6.2	Radicación a Interventoría	10/10/24	10/10/24	0 días	$ 0
206	1.2.2.3.7.6.3	Revisión de Interventoría	10/10/24	22/10/24	9 días	$ 0
207	**1.2.2.3.7.7**	**Estaciones**	**4/06/24**	**2/10/24**	**98 días**	**$ 0**
208	1.2.2.3.7.7.1	Atención de observaciones de interventoría	4/06/24	14/06/24	8 días	$ 0
209	1.2.2.3.7.7.2	Definición de arquitectura por parte de Transmilenio	14/06/24	26/06/24	10 días	$ 0
210	1.2.2.3.7.7.3	Diseño de cimentacion estaciones	26/06/24	22/07/24	20 días	$ 0
211	1.2.2.3.7.7.4	Diseño estructural de estaciones y elementos complementarios	11/07/24	22/07/24	8 días	$ 0
212	1.2.2.3.7.7.5	Radicación a Interventoría	22/07/24	22/07/24	0 días	$ 0
213	1.2.2.3.7.7.6	Revisión de Interventoría	22/07/24	1/08/24	10 días	$ 0
214	1.2.2.3.7.7.7	*Definición diseño por parte de IDU y Transmilenio*	2/10/24	2/10/24	0 días	$ 0
215	**1.2.2.4**	**Tercera Entrega de Estudios y Diseños (incluye coordinación BIM, Deprimido Cl. 100, Empalme Cl. 107 a Cl 111, Area de Oportunidad**	**8/08/24**	**5/02/25**	**148 días**	**$ 0**
216	**1.2.2.4.1**	**Diseño Geométrico**	**16/08/24**	**11/10/24**	**46 días**	**$ 0**
217	1.2.2.4.1.1	Atención de observaciones - Actualización y ajustes de Diseño Geométrico (Planta y rasante corredor y giros izquierdos calle 109 y 102)-Versión definitiva	16/08/24	12/09/24	21 días	$ 0
218	1.2.2.4.1.2	Mesa de trabajo con interventoria - definición contenido para entrega final	12/09/24	12/09/24	0 días	$ 0
219	1.2.2.4.1.3	Radicación a Interventoría	18/09/24	18/09/24	0 días	$ 0
220	1.2.2.4.1.4	Revisión de Interventoría	18/09/24	27/09/24	9 días	$ 0
221	1.2.2.4.1.5	Atención de observaciones	28/09/24	4/10/24	6 días	$ 0
222	1.2.2.4.1.6	Entrega Interventoría	4/10/24	4/10/24	0 días	$ 0
223	1.2.2.4.1.7	Revisión y aval por parte de interventoría-Diseño geométrico	11/10/24	11/10/24	0 días	$ 0
224	**1.2.2.4.2**	**Urbanismo y Espacio Público**	**8/08/24**	**11/10/24**	**54 días**	**$ 0**
225	1.2.2.4.2.1	Atención observaciones secciones y detalles - Urbanismo y Espacio Público	8/08/24	3/09/24	21 días	$ 0
226	1.2.2.4.2.2	Mesa de trabajo con interventoria - definición contenido para entrega final	3/09/24	3/09/24	0 días	$ 0
227	1.2.2.4.2.3	Radicación a Interventoría	18/09/24	18/09/24	0 días	$ 0
228	1.2.2.4.2.4	Revisión de Interventoría	18/09/24	27/09/24	9 días	$ 0
229	1.2.2.4.2.5	Atención de observaciones	28/09/24	4/10/24	6 días	$ 0
230	1.2.2.4.2.6	Entrega Interventoría	4/10/24	4/10/24	0 días	$ 0
231	1.2.2.4.2.7	Revisión y aval por parte de interventoría- Urbanismo y Espacio Pub	11/10/24	11/10/24	0 días	$ 0
232	**1.2.2.4.3**	**Redes Húmedas**	**16/08/24**	**5/02/25**	**145 días**	**$ 0**
233	1.2.2.4.3.1	Atención observaciones informe de redes húmedas - planos y perfiles versión final	14/08/24	24/09/24	34 días	$ 0
234	1.2.2.4.3.2	Mesa de trabajo con interventoria - definición contenido para entrega final	24/09/24	24/09/24	0 días	$ 0
235	**1.2.2.4.3.3**	**Red Matriz de 42"**	**11/10/24**	**5/02/25**	**94 días**	**$ 0**
236	1.2.2.4.3.3.1	Revisión y entrega de Observaciones de EAAB	11/10/24	5/11/24	19 días	$ 0
237	1.2.2.4.3.3.2	Atención de observaciones y radicación a Interventoría	5/11/24	8/11/24	3 días	$ 0
238	1.2.2.4.3.3.3	Aval de interventoría, radicar a EAAB	8/11/24	12/11/24	2 días	$ 0
239	1.2.2.4.3.3.4	Revisión y entrega de NO objeción de EAAB	12/11/24	3/12/24	18 días	$ 0
240	1.2.2.4.3.3.5	Radicacion a interventoría y EAAB y revisión del diseño definitivo (Geotecnico-estructuras-hidraulico)	5/12/24	30/12/24	20 días	$ 0
241	1.2.2.4.3.3.6	Radicacion a interventoría y EAAB de atención de observaciones diseño definitivo	3/01/25	27/01/25	18 días	$ 0
242	1.2.2.4.3.3.7	Gestion de revisión y Aval ante DITG	27/01/25	5/02/25	9 días	$ 0
243	**1.2.2.4.3.4**	**Protecciones Red Matriz de 48"60" y 86"**	**22/10/24**	**12/12/24**	**42 días**	**$ 0**
244	1.2.2.4.3.4.1	Radicación y revisión de la EAAB	22/10/24	14/11/24	18 días	$ 0
245	1.2.2.4.3.4.2	Revisión y entrega de Observaciones	14/11/24	21/11/24	6 días	$ 0
246	1.2.2.4.3.4.3	Radicación a Interventoría y EAAB	21/11/24	21/11/24	0 días	$ 0
247	1.2.2.4.3.4.4	Revisión y entrega de NO objeción de EAAB	21/11/24	12/12/24	18 días	$ 0
248	**1.2.2.4.3.5**	**Redes matrices de 20 y 24"**	**22/10/24**	**16/12/24**	**45 días**	**$ 0**
249	1.2.2.4.3.5.1	Radicación y revisión de la EAAB	22/10/24	14/11/24	18 días	$ 0
250	1.2.2.4.3.5.2	Revisión y entrega de Observaciones	14/11/24	19/11/24	4 días	$ 0
251	1.2.2.4.3.5.3	Radicación a Interventoría	19/11/24	19/11/24	0 días	$ 0
252	1.2.2.4.3.5.4	Revisión y aval de radicar a EAAB	19/11/24	25/11/24	5 días	$ 0
253	1.2.2.4.3.5.5	Revisión y entrega de NO objeción de EAAB	25/11/24	16/12/24	18 días	$ 0
254	**1.2.2.4.3.6**	**UGA 1-2-3-4 Acueducto**	**12/10/24**	**7/12/24**	**45 días**	**$ 0**
255	1.2.2.4.3.6.1	Radicación y revisión de la EAAB	12/10/24	6/11/24	19 días	$ 0
256	1.2.2.4.3.6.2	Revisión y entrega de Observaciones	6/11/24	13/11/24	5 días	$ 0
257	1.2.2.4.3.6.3	Radicación a Interventoría	13/11/24	13/11/24	0 días	$ 0
258	1.2.2.4.3.6.4	Revisión y aval de radicar a EAAB	13/11/24	16/11/24	3 días	$ 0
259	1.2.2.4.3.6.5	Revisión y entrega de NO objeción de EAAB	18/11/24	7/12/24	18 días	$ 0
260	**1.2.2.4.3.7**	**UGA 1-3-4 Sanitario y Pluvial**	**21/10/24**	**13/12/24**	**46 días**	**$ 0**
261	1.2.2.4.3.7.1	Radicación y revisión de la EAAB	21/10/24	13/11/24	18 días	$ 0
262	1.2.2.4.3.7.2	Revisión y entrega de Observaciones	13/11/24	19/11/24	5 días	$ 0
263	1.2.2.4.3.7.3	Radicación a Interventoría	19/11/24	19/11/24	0 días	$ 0
264	1.2.2.4.3.7.4	Revisión y aval de radicar a EAAB	19/11/24	22/11/24	3 días	$ 0
265	1.2.2.4.3.7.5	Revisión y entrega de NO objeción de EAAB	22/11/24	13/12/24	18 días	$ 0
266	**1.2.2.4.3.8**	**UGA 2 calle 112 Sanitario y Pluvial**	**18/10/24**	**12/12/24**	**45 días**	**$ 0**
267	1.2.2.4.3.8.1	Radicación y revisión de la EAAB	18/10/24	12/11/24	19 días	$ 0
268	1.2.2.4.3.8.2	Revisión y entrega de Observaciones	12/11/24	18/11/24	5 días	$ 0
269	1.2.2.4.3.8.3	Radicación a Interventoría	18/11/24	18/11/24	0 días	$ 0
270	1.2.2.4.3.8.4	Revisión y aval de radicar a EAAB	18/11/24	21/11/24	3 días	$ 0
271	1.2.2.4.3.8.5	Revisión y entrega de NO objeción de EAAB	21/11/24	12/12/24	18 días	$ 0
272	**1.2.2.4.3.9**	**Box y Canales**	**11/10/24**	**31/01/25**	**90 días**	**$ 0**
273	1.2.2.4.3.9.1	Revisión y entrega de Observaciones de EAAB	11/10/24	5/11/24	19 días	$ 0
274	1.2.2.4.3.9.2	Atención de observaciones y radicación a Interventoría	5/11/24	12/11/24	5 días	$ 0
275	1.2.2.4.3.9.3	Aval de interventoría, radicar a EAAB	12/11/24	14/11/24	2 días	$ 0
276	1.2.2.4.3.9.4	Revisión y entrega de NO objeción de EAAB	14/11/24	3/12/24	16 días	$ 0
277	1.2.2.4.3.9.5	Radicacion a la EAAB y revisión del diseño definitivo (Geotecnico-estructuras-hidraulico)	5/12/24	30/12/24	20 días	$ 0
278	1.2.2.4.3.9.6	Aval tecnico diseño definitivo EAAB (Geotecnia-estructura-hidrau	30/12/24	30/12/24	0 días	$ 0
279	1.2.2.4.3.9.7	Gestión, revisión y aval de diseño DITG - Entrega de diseños aprobados	31/12/24	31/01/25	24 días	$ 0
280	**1.2.2.4.4**	**Redes Secas y Telemáticos**	**14/08/24**	**18/10/24**	**54 días**	**$ 0**
281	1.2.2.4.4.1	Atención observaciones informe de redes secas y entrega de planos versión 1	14/08/24	9/09/24	21 días	$ 0
282	1.2.2.4.4.2	Mesa de trabajo con interventoria - definición contenido para entrega final	9/09/24	9/09/24	0 días	$ 0
283	1.2.2.4.4.3	Radicación a Interventoría Informe final redes secas	24/09/24	24/09/24	0 días	$ 0
284	1.2.2.4.4.4	Revisión de Interventoría	24/09/24	4/10/24	9 días	$ 0
285	1.2.2.4.4.5	Atención de observaciones	4/10/24	11/10/24	6 días	$ 0
286	1.2.2.4.4.6	Entrega Interventoría	11/10/24	11/10/24	0 días	$ 0
287	1.2.2.4.4.7	Revisión y aval por parte de interventoría- Redes secas y telemáticos	18/10/24	18/10/24	0 días	$ 0
288	1.2.2.4.4.8	Entrega de diseños a las ESP (Enel - ETB - Movistar)	18/10/24	18/10/24	0 días	$ 0
289	**1.2.2.4.5**	**Geotecnia**	**16/08/24**	**22/10/24**	**54 días**	**$ 0**
290	1.2.2.4.5.1	Atención observaciones diseño geotecnico productos entregados	16/08/24	12/09/24	21 días	$ 0
291	1.2.2.4.5.2	Mesa de trabajo con interventoría - definición contenido para entrega final	12/09/24	12/09/24	0 días	$ 0
292	1.2.2.4.5.3	Radicación a Interventoría Informe final Geotecnia	27/09/24	27/09/24	0 días	$ 0
293	1.2.2.4.5.4	Revisión de Interventoría	27/09/24	8/10/24	9 días	$ 0
294	1.2.2.4.5.5	Atención de observaciones	9/10/24	16/10/24	6 días	$ 0
295	1.2.2.4.5.6	Entrega Interventoría	16/10/24	16/10/24	0 días	$ 0
296	1.2.2.4.5.7	Revisión y aval por parte de interventoría- Geotecnia	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 0
297	**1.2.2.4.6**	**Pavimentos**	**16/08/24**	**22/10/24**	**54 días**	**$ 0**
298	1.2.2.4.6.1	Atención observaciones informe de pavimentos	16/08/24	12/09/24	21 días	$ 0
299	1.2.2.4.6.2	Mesa de trabajo con interventoría - definición contenido para entrega final	12/09/24	12/09/24	0 días	$ 0

PROGRAMA DE OBRA


PRE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS" LOTE 1

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo
300	1.2.2.4.6.3	Radicación a Interventoría Informe final Pavimentos	27/09/24	27/09/24	0 días	$ 0
301	1.2.2.4.6.4	Revisión de Interventoría	27/09/24	8/10/24	9 días	$ 0
302	1.2.2.4.6.5	Atención de observaciones	8/10/24	16/10/24	6 días	$ 0
303	1.2.2.4.6.6	Entrega Interventoría	16/10/24	16/10/24	0 días	$ 0
304	1.2.2.4.6.7	Revisión y aval por parte de interventoría- Pavimentos	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 0
305	**1.2.2.4.7**	**Diseños Estructurales**	**22/10/24**	**10/01/25**	**64 días**	**$ 0**
306	1.2.2.4.7.1	Atención observaciones informes y/o productos entregados	22/10/24	9/11/24	15 días	$ 0
307	1.2.2.4.7.2	Mesa de trabajo con interventoría - definición contenido para entrega final	9/11/24	9/11/24	0 días	$ 0
308	1.2.2.4.7.3	Radicación a Interventoría Informes de estructuras	22/11/24	22/11/24	0 días	$ 0
309	1.2.2.4.7.4	Revisión de Interventoría	22/11/24	3/12/24	9 días	$ 0
310	1.2.2.4.7.5	Atención de observaciones	3/12/24	10/12/24	6 días	$ 0
311	1.2.2.4.7.6	Entrega Interventoría	10/12/24	10/12/24	0 días	$ 0
312	1.2.2.4.7.7	Revisión y aval por parte de interventoría- Estructuras	16/12/24	16/12/24	0 días	$ 0
313	1.2.2.4.7.8	Radicación a Interventoría Diseño Integral-Estaciones	14/12/24	14/12/24	0 días	$ 0
314	1.2.2.4.7.9	Revisión de Interventoría y gestion de aval definitivo diseño Estación	16/12/24	10/01/25	20 días	$ 0
315	**1.2.2.4.8**	**Señalización, demarcación y semaforización**	**13/09/24**	**22/10/24**	**32 días**	**$ 0**
316	1.2.2.4.8.1	Elaboración Informe Señalización, demarcación y semaforización	13/09/24	27/09/24	12 días	$ 0
317	1.2.2.4.8.2	Radicación a Interventoría Informe Señalización, demarcación y semaforización	27/09/24	27/09/24	0 días	$ 0
318	1.2.2.4.8.3	Revisión de Interventoría	27/09/24	8/10/24	9 días	$ 0
319	1.2.2.4.8.4	Atención de observaciones	8/10/24	16/10/24	6 días	$ 0
320	1.2.2.4.8.5	Entrega Interventoría	16/10/24	16/10/24	0 días	$ 0
321	1.2.2.4.8.6	Revisión y aval por parte de interventoría- Pavimentos	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 0
322	**1.2.2.5**	**Deprimido Cl. 100 (Incluye Geotecnia, Estructuras, Pavimentos, Urbanismo, Tránsito, Redes Húmedas, Redes Secas)**	**22/11/24**	**22/11/24**	**0 días**	**$ 992 870 282**
323	1.2.2.5.1	Entrega Estudios y diseños - Deprimido calle 100	22/11/24	22/11/24	0 días	$ 992 870 282
324	**1.2.2.6**	**Empalme Cl. 107 a Cl 115 (Incluye pavimentos, Urbanismo, Tránsito, Redes Húmedas, Redes Secas)**	**22/11/24**	**22/11/24**	**0 días**	**$ 685 084 635**
325	1.2.2.6.1	Entrega Estudios y diseños - Empalme Cl. 107 a Cl 115	22/11/24	22/11/24	0 días	$ 685 084 635
326	**1.2.2.7**	**Area de Oportunidad Calle 126A**	**22/11/24**	**22/11/24**	**0 días**	**$ 14 893 144**
327	1.2.2.7.1	Entrega Estudios y diseños - AO Calle 126 A	22/11/24	22/11/24	0 días	$ 14 893 144
328	1.2.2.8	Terminación del proceso de revisión por parte de la Interventoría de los Estudios y Diseños	10/01/25	10/01/25	0 días	$ 466 651 853
329	**1.2.2.9**	**Radicación para aprobaciones/trámites/permisos en las entidades con aprobación por parte del interventor**	**23/02/24**	**11/02/25**	**284 días**	**$ 151 604 671**
330	**1.2.2.9.1**	**Ministerio de Cultura -EIC**	**23/02/24**	**11/02/25**	**284 días**	**$ 124 109 535**
331	1.2.2.9.1.1	Recorrido para reconocimiento del área a intervenir	1/03/24	1/03/24	0 días	$ 0
332	1.2.2.9.1.2	Revisión de la información emitida por el IDU de la etapa de estudios y Diseños	23/02/24	9/04/24	35 días	$ 0
333	1.2.2.9.1.3	Entrega a interventoría del informe de lo observado de estudios y diseños	12/04/24	12/04/24	0 días	$ 0
334	1.2.2.9.1.4	Actualización, ajustes y complementación planimetría a radicar ante entidades competentes (IDPC, Ministerio de las culturas, las artes y los saberes)	2/05/24	22/10/24	140 días	$ 0
335	1.2.2.9.1.5	Entrega a interventoría de estudios y planimetría ajustada y completa	11/10/24	11/10/24	0 días	$ 0
336	1.2.2.9.1.6	Revisión y organización de documentos técnicos y jurídicos a radicar	11/10/24	21/10/24	7 días	$ 0
337	1.2.2.9.1.7	APROBACIÓN DE DISEÑO TOACAOS (ETB-ENEL-MOVISTAR-TIGO-UNE-EAAB	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 0
338	1.2.2.9.1.8	Radicación ante entidades competentes (IDPC, Ministerio de las culturas, las artes y los saberes)-Aprobación de terceros	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 124 109 535
339	1.2.2.9.1.9	Revisión por parte de entidades competentes	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 0
340	1.2.2.9.1.10	Atención de observaciones	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 0
341	1.2.2.9.1.11	Informe final de entrega de resolución (IDPC, Ministerio de las culturas, las artes y los saberes)	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 0
342	**1.2.2.9.2**	**ICANH**	**29/07/24**	**22/10/24**	**70 días**	**$ 27 405 036**
343	1.2.2.9.2.1	Elaboración	29/07/24	9/10/24	60 días	$ 0
344	1.2.2.9.2.2	Entrega a Interventoría	9/10/24	9/10/24	0 días	$ 0
345	1.2.2.9.2.3	Atención Observaciones	9/10/24	22/10/24	10 días	$ 0
346	1.2.2.9.2.4	Radicación a Interventoría	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 0
347	1.2.2.9.2.5	Radicación ante ICANH	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 27 405 036
348	**1.2.2.10**	**Radicación para aprobaciones/trámites/permisos en las ESP con aprobación por parte del Interventor**	**22/10/24**	**11/02/25**	**90 días**	**$ 171 080 221**
349	**1.2.2.10.1**	**PERMISOS TIPO A - A cargo del IDU**	**11/02/25**	**11/02/25**	**0 días**	**$ 126 780 664**
350	1.2.2.10.1.1	EAAB	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 126 780 664
351	**1.2.2.10.2**	**PERMISOS TIPO B - A cargo del Contratista**	**22/10/24**	**22/11/24**	**25 días**	**$ 44 297 557**
352	**1.2.2.10.2.1**	**Enel/Codensa**	**22/10/24**	**22/11/24**	**25 días**	**$ 37 855 674**
353	1.2.2.10.2.1	Serie 1 - Media Tensión	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 12 601 891
354	1.2.2.10.2.1	Serie 3 - Sub Estaciones	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 12 601 891
355	1.2.2.10.2.1	Serie 6 - Alumbrado Público	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 12 601 891
356	1.2.2.10.2.1	Serie 6 - Alumbrado Público (soterrado)	22/11/24	22/11/24	0 días	$ 0
357	1.2.2.10.2.2	Vanti	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 1 527 902
358	1.2.2.10.2.3	Movistar / Tigo	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 2 673 128
359	1.2.2.10.2.4	ETB	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 2 290 253
360	**1.2.2.11**	**Equipos y Personal**	**5/02/25**	**5/02/25**	**0 días**	**$ 0**
361	1.2.2.11.1	Manifestación que contenga una relación de los equipos, materiales e insumos	5/02/25	5/02/25	0 días	$ 0
362	**1.2.2.12**	**Actas de armonización con tramos adyacentes**	**16/09/24**	**29/11/24**	**60 días**	**$ 0**
363	**1.2.2.12.1**	**Armonización Calle 99**	**16/09/24**	**22/10/24**	**30 días**	**$ 0**
364	1.2.2.12.1.1	Elaboración actas de armonización	16/09/24	27/09/24	10 días	$ 0
365	1.2.2.12.1.2	Entrega actas de armonización	3/10/24	3/10/24	0 días	$ 0
366	1.2.2.12.1.3	Revisión por interventoría actas de armonización	3/10/24	10/10/24	6 días	$ 0
367	1.2.2.12.1.4	Atención de observaciones	10/10/24	18/10/24	6 días	$ 0
368	1.2.2.12.1.5	Aprobación actas de armonización	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 0
369	**1.2.2.12.2**	**Armonización Trama 2 - Calle 127**	**22/10/24**	**29/11/24**	**30 días**	**$ 0**
370	1.2.2.12.2.1	Elaboración actas de armonización	22/10/24	2/11/24	10 días	$ 0
371	1.2.2.12.2.2	Entrega actas de armonización	9/11/24	9/11/24	0 días	$ 0
372	1.2.2.12.2.3	Revisión por interventoría actas de armonización	9/11/24	18/11/24	6 días	$ 0
373	1.2.2.12.2.4	Atención de observaciones	25/11/24	25/11/24	0 días	$ 0
374	1.2.2.12.2.5	Aprobación actas de armonización	28/11/24	28/11/24	0 días	$ 0
375	**1.2.2.12.3**	**Armonización Plan Parcial Pedregal**	**22/10/24**	**28/11/24**	**30 días**	**$ 0**
376	1.2.2.12.3.1	Elaboración actas de armonización	22/10/24	2/11/24	10 días	$ 0
377	1.2.2.12.3.2	Entrega actas de armonización	9/11/24	9/11/24	0 días	$ 0
378	1.2.2.12.3.3	Revisión por interventoría actas de armonización	9/11/24	18/11/24	6 días	$ 0
379	1.2.2.12.3.4	Atención de observaciones	25/11/24	25/11/24	0 días	$ 0
380	1.2.2.12.3.5	Aprobación actas de armonización	28/11/24	28/11/24	0 días	$ 0
381	**1.2.2.13**	**Presupuesto y programación (Incluye coordinación BIM)**	**31/12/24**	**11/02/25**	**34 días**	**$ 0**
382	1.2.2.13.1	Calculo y analisis de cantidades para elaboración de presupuesto	31/12/24	10/01/25	8 días	$ 0
383	1.2.2.13.2	Entrega presupuesto	10/01/25	10/01/25	0 días	$ 0
384	1.2.2.13.3	Análisis, sectorización del proyecto, verificación de PMT, elaboración de EDT - Planeación de fases y simulación constructiva	10/01/25	16/01/25	5 días	$ 0
385	1.2.2.13.4	Elaboración de PDT Etapa de Construcción	16/01/25	27/01/25	8 días	$ 0
386	1.2.2.13.5	Entrega de PDT Etapa de Construcción	27/01/25	27/01/25	0 días	$ 0
387	1.2.2.13.6	Revisión por parte de interventoría	27/01/25	5/02/25	8 días	$ 0
388	1.2.2.13.7	Atención de observaciones	5/02/25	11/02/25	5 días	$ 0
389	1.2.2.13.8	Radicación Interventoría	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 0
390	**1.2.2.14**	**Actas de competencia de pagos**	**6/11/24**	**29/01/25**	**67 días**	**$ 0**
391	**1.2.2.14.1**	**EAAB**	**13/12/24**	**9/01/25**	**20 días**	**$ 0**
392	1.2.2.14.1.1	Elaboración	13/12/24	2/01/25	15 días	$ 0
393	1.2.2.14.1.2	Entrega a Interventoría y ESP	2/01/25	2/01/25	0 días	$ 0
394	1.2.2.14.1.3	Mesa de trabajo con interventoría, ESP e IDU	3/01/25	3/01/25	0 días	$ 0
395	1.2.2.14.1.4	Atención de Observaciones	3/01/25	9/01/25	4 días	$ 0
396	1.2.2.14.1.5	Radicación en interventoría	9/01/25	9/01/25	0 días	$ 0
397	**1.2.2.14.2**	**EAAB - RED MATRIZ**	**3/01/25**	**29/01/25**	**20 días**	**$ 0**
398	1.2.2.14.2.1	Elaboración	3/01/25	22/01/25	15 días	$ 0
399	1.2.2.14.2.2	Entrega a Interventoría y ESP	22/01/25	22/01/25	0 días	$ 0
400	1.2.2.14.2.3	Mesa de trabajo con interventoría, ESP e IDU	23/01/25	23/01/25	0 días	$ 0
401	1.2.2.14.2.4	Atención de Observaciones	23/01/25	29/01/25	4 días	$ 0
402	1.2.2.14.2.5	Radicación en interventoría	29/01/25	29/01/25	0 días	$ 0
403	**1.2.2.14.3**	**ENEL**	**6/11/24**	**30/11/24**	**20 días**	**$ 0**
404	1.2.2.14.3.1	Elaboración	6/11/24	25/11/24	15 días	$ 0
405	1.2.2.14.3.2	Entrega a Interventoría y ESP	25/11/24	25/11/24	0 días	$ 0
406	1.2.2.14.3.3	Mesa de trabajo con interventoría, ESP e IDU	26/11/24	26/11/24	0 días	$ 0
407	1.2.2.14.3.4	Atención de Observaciones	26/11/24	30/11/24	4 días	$ 0
408	1.2.2.14.3.5	Radicación en interventoría	30/11/24	30/11/24	0 días	$ 0
409	**1.2.2.14.4**	**ETB**	**6/11/24**	**30/11/24**	**20 días**	**$ 0**
410	1.2.2.14.4.1	Elaboración	6/11/24	25/11/24	15 días	$ 0
411	1.2.2.14.4.2	Entrega a Interventoría y ESP	25/11/24	25/11/24	0 días	$ 0
412	1.2.2.14.4.3	Mesa de trabajo con interventoría, ESP e IDU	26/11/24	26/11/24	0 días	$ 0
413	1.2.2.14.4.4	Atención de Observaciones	26/11/24	30/11/24	4 días	$ 0
414	1.2.2.14.4.5	Radicación en interventoría	30/11/24	30/11/24	0 días	$ 0
415	**1.2.2.14.5**	**MOVISTAR**	**6/11/24**	**30/11/24**	**20 días**	**$ 0**
416	1.2.2.14.5.1	Elaboración	6/11/24	25/11/24	15 días	$ 0
417	1.2.2.14.5.2	Entrega a Interventoría y ESP	25/11/24	25/11/24	0 días	$ 0
418	1.2.2.14.5.3	Mesa de trabajo con interventoría, ESP e IDU	26/11/24	26/11/24	0 días	$ 0
419	1.2.2.14.5.4	Atención de Observaciones	26/11/24	30/11/24	4 días	$ 0
420	1.2.2.14.5.5	Radicación en interventoría	30/11/24	30/11/24	0 días	$ 0
421	**1.2.3**	**APENDICE C - COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA SILVESTRE, MDV Y SST**	**20/02/24**	**11/02/25**	**270 días**	**$ 216 082 716**
422	1.2.3.1	Presentación de hojas de vida	29/02/24	29/02/24	0 días	$ 0
423	1.2.3.2	Visita área objeto de intervención con la asistencia de la totalidad de los residentes A&SST del Contratista e Interventoría	1/03/24	1/03/24	0 días	$ 0
424	**1.2.3.3**	**Programa de actividades A&SST para cada una de las etapas**	**5/03/24**	**27/03/24**	**18 días**	**$ 10 804 136**
425	1.2.3.3.1	Elaboración	5/03/24	11/03/24	5 días	$ 10 804 136
426	1.2.3.3.2	Entrega	11/03/24	11/03/24	0 días	$ 0
427	1.2.3.3.3	Revisión de Interventoría	11/03/24	18/03/24	5 días	$ 0
428	1.2.3.3.4	Atención de observaciones	18/03/24	22/03/24	5 días	$ 0
429	1.2.3.3.5	Entrega Interventoría	22/03/24	22/03/24	0 días	$ 0
430	1.2.3.3.6	Revisión y aval por parte de interventoría	27/03/24	27/03/24	0 días	$ 0
431	**1.2.3.4**	**Plan de Manejo Ambiental - RCD**	**25/06/24**	**11/10/24**	**89 días**	**$ 21 608 272**
432	1.2.3.4.1	Elaboración	25/06/24	9/09/24	61 días	$ 21 608 272
433	1.2.3.4.2	Entrega	26/09/24	26/09/24	0 días	$ 0
434	1.2.3.4.3	Revisión de Interventoría	26/09/24	2/10/24	5 días	$ 0
435	1.2.3.4.4	Atención de observaciones	2/10/24	8/10/24	5 días	$ 0
436	1.2.3.4.5	Entrega Interventoría	8/10/24	8/10/24	0 días	$ 0
437	1.2.3.4.6	Revisión y aval por parte de interventoría	11/10/24	11/10/24	0 días	$ 0
438	**1.2.3.5**	**Validación de Inventario forestal**	**4/04/24**	**8/05/24**	**28 días**	**$ 21 608 272**
439	1.2.3.5.1	Elaboración	4/04/24	22/04/24	15 días	$ 21 608 272
440	1.2.3.5.2	Entrega	22/04/24	22/04/24	0 días	$ 0
441	1.2.3.5.3	Revisión de Interventoría	22/04/24	26/04/24	5 días	$ 0
442	1.2.3.5.4	Atención de observaciones	26/04/24	3/05/24	5 días	$ 0
443	1.2.3.5.5	Entrega Interventoría	3/05/24	3/05/24	0 días	$ 0
444	1.2.3.5.6	Revisión y aval por parte de interventoría	8/05/24	8/05/24	0 días	$ 0
445	**1.2.3.6**	**Revisión Diseño paisajístico**	**28/09/24**	**3/12/24**	**53 días**	**$ 21 608 272**
446	1.2.3.6.1	Elaboración	28/09/24	18/11/24	40 días	$ 21 608 272
447	1.2.3.6.2	Entrega	18/11/24	18/11/24	0 días	$ 0
448	1.2.3.6.3	Revisión de Interventoría	18/11/24	23/11/24	5 días	$ 0
449	1.2.3.6.4	Atención de observaciones	25/11/24	29/11/24	5 días	$ 0

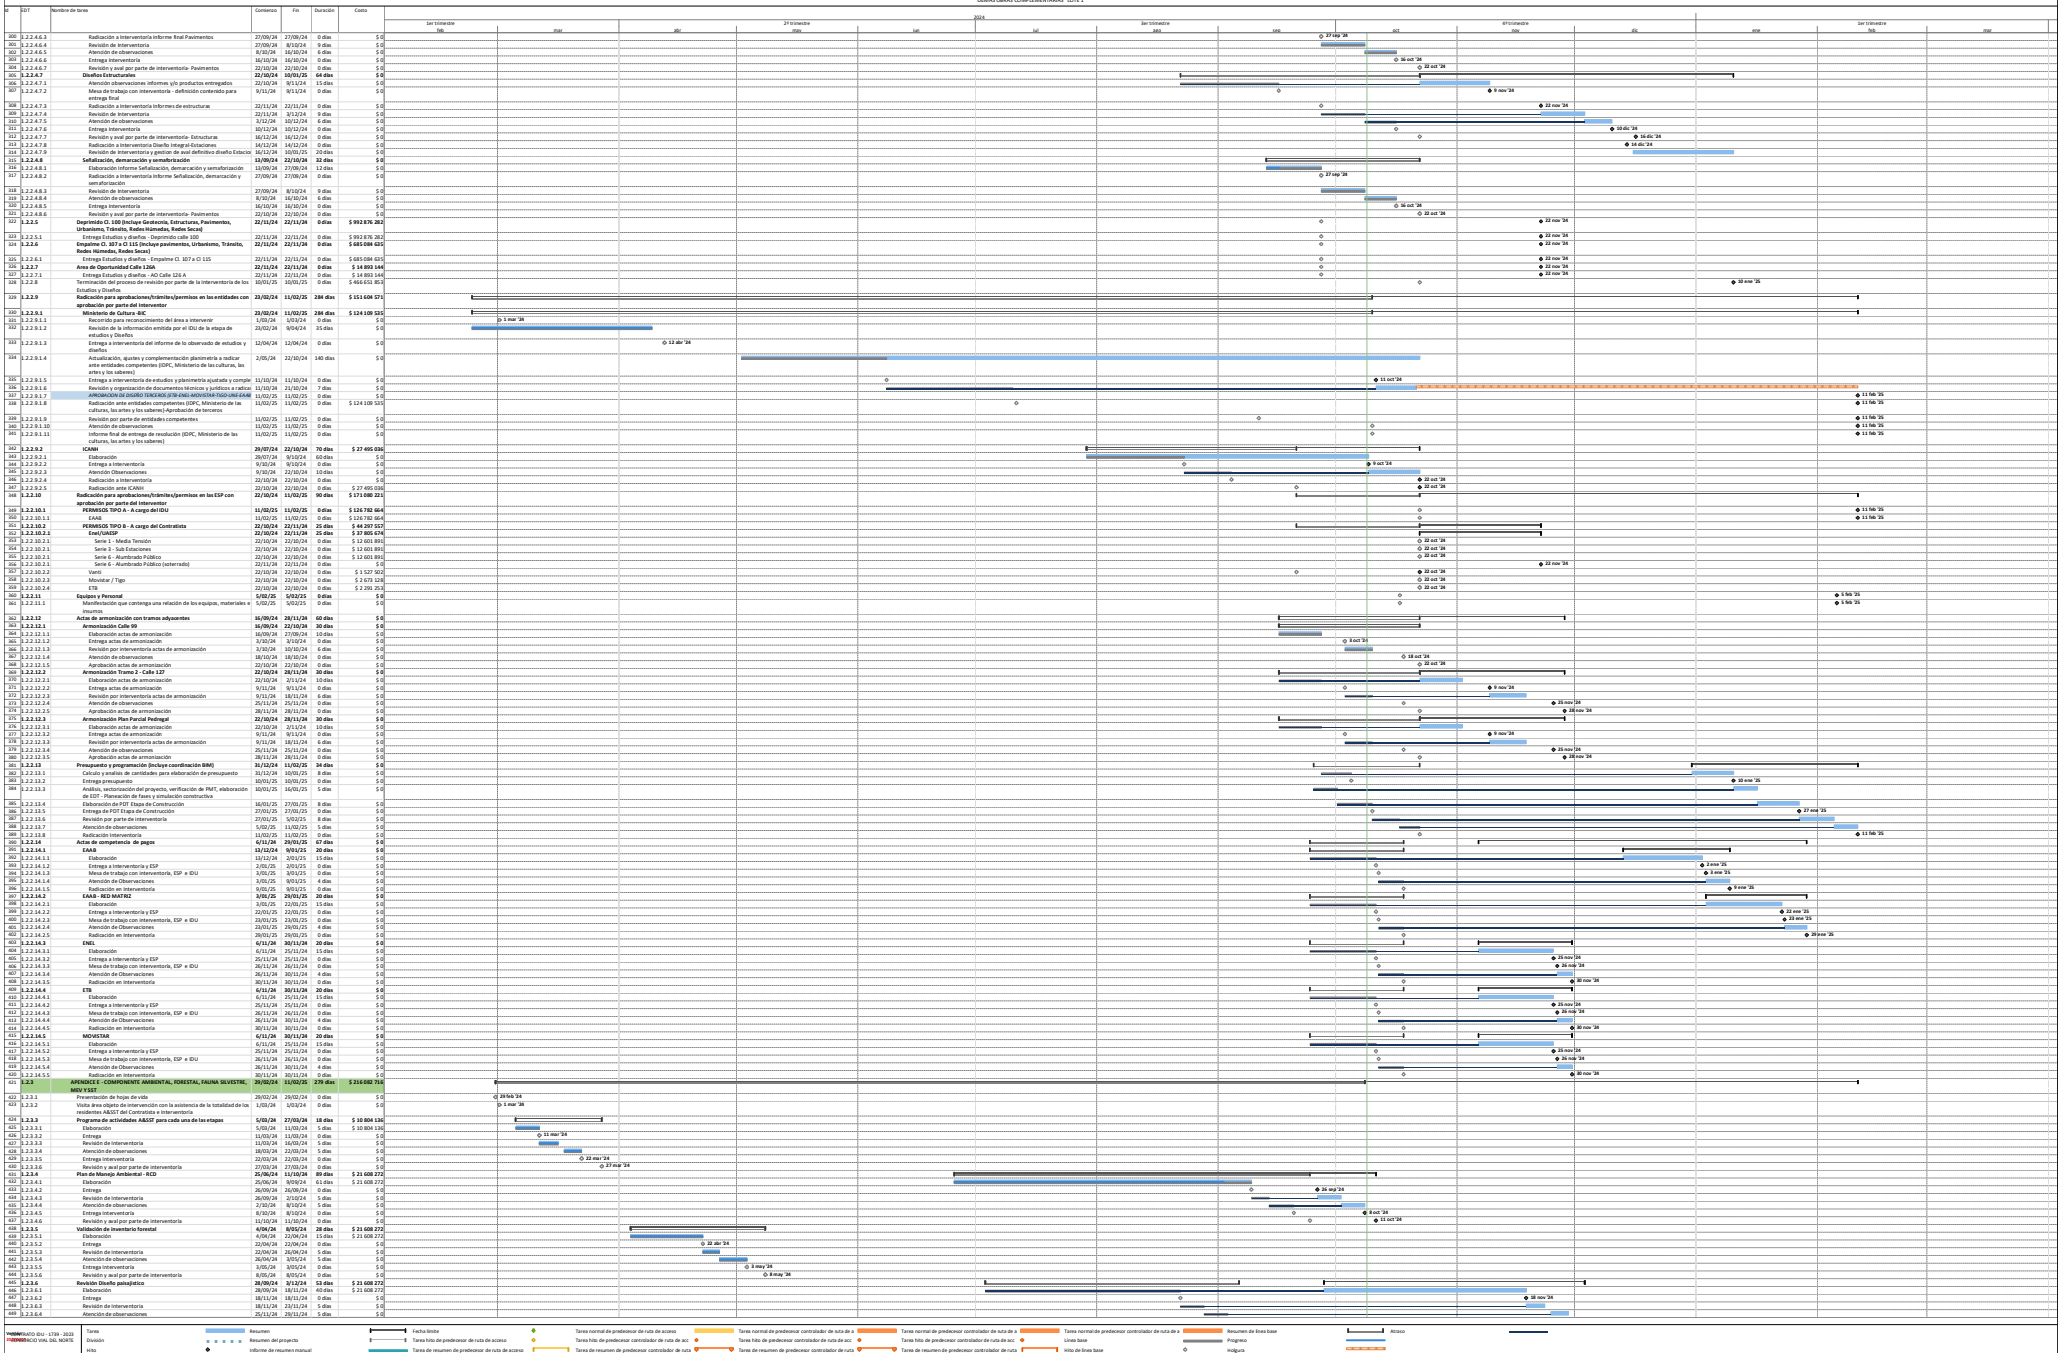

PROGRAMA DE OBRA

PRE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DIAGONAL OBRAS COMPLEMENTARIAS" LOTE 1

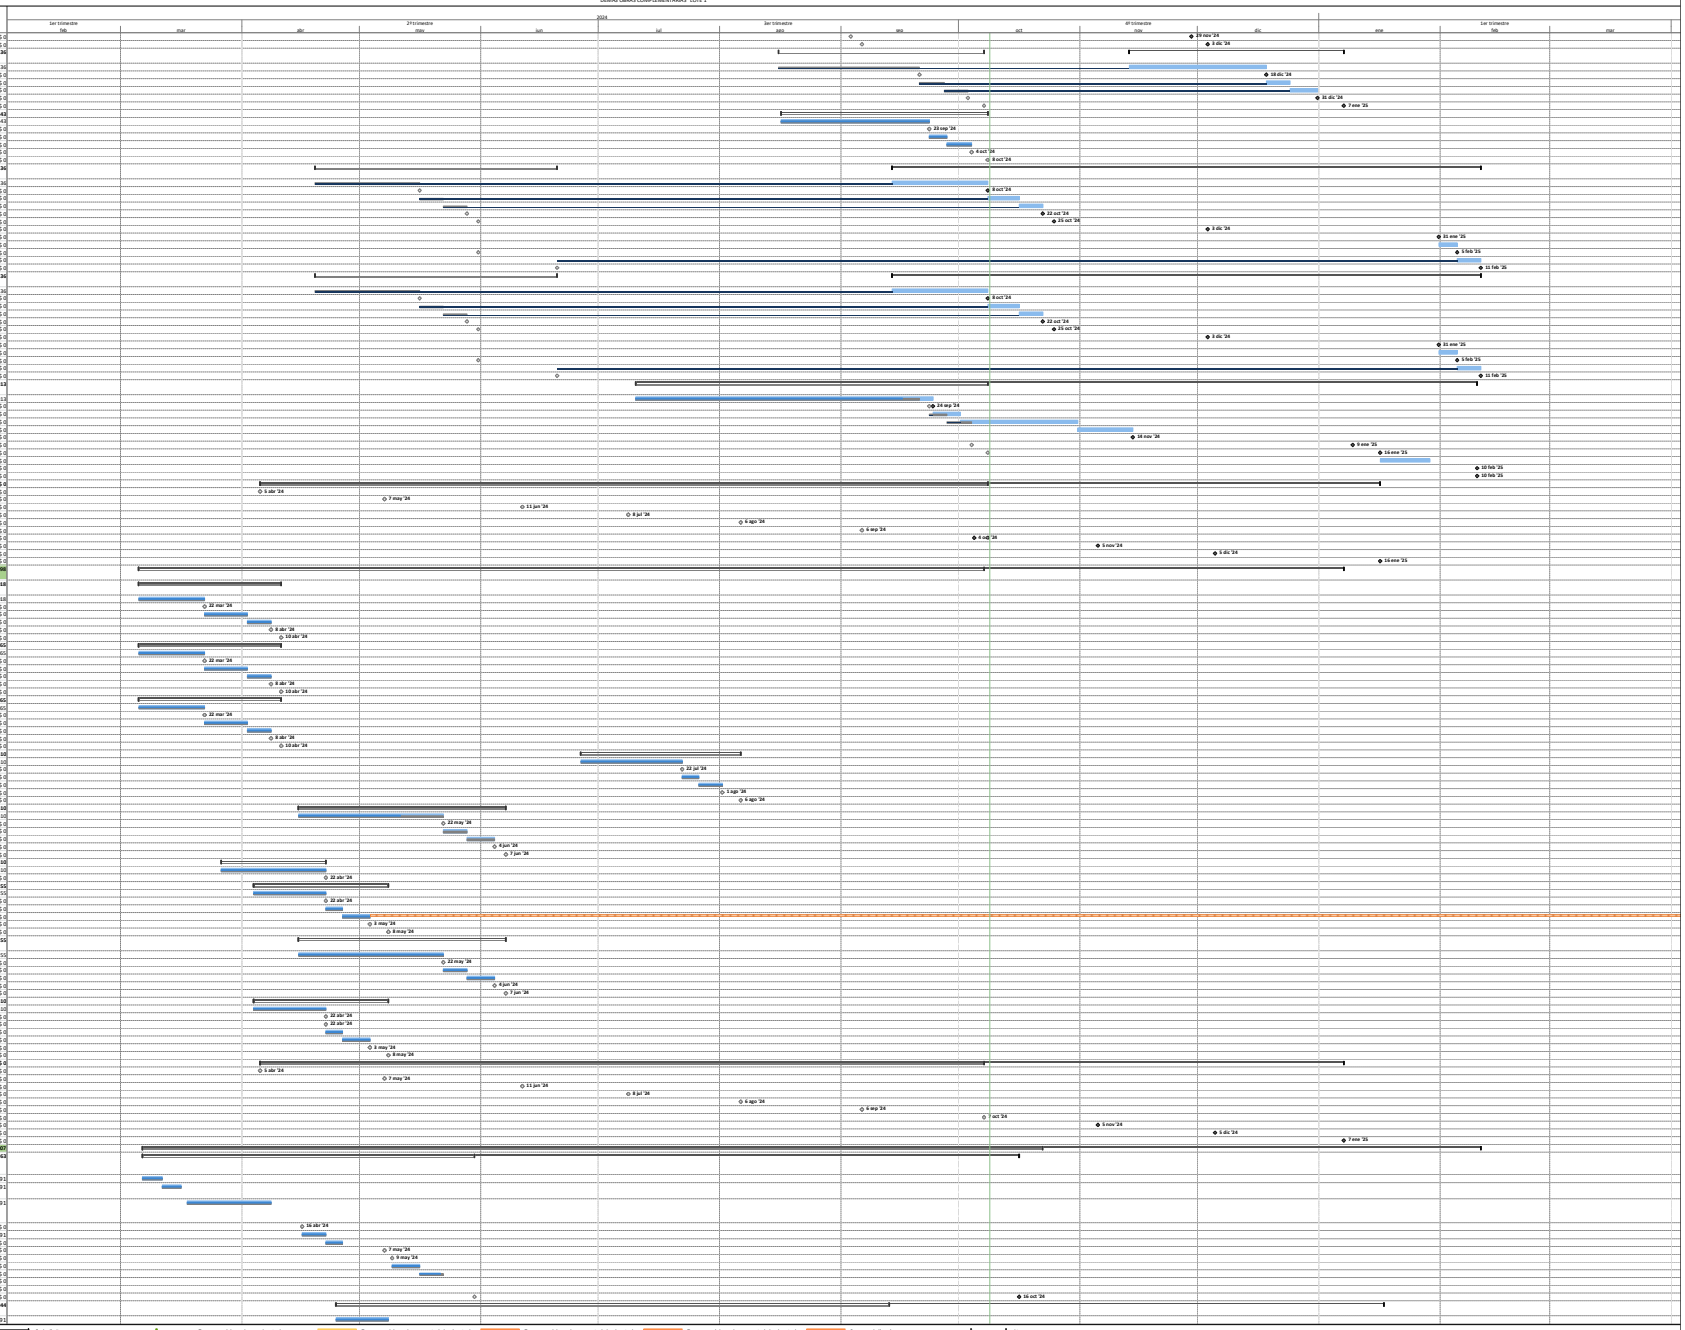


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo
450	1.2.3.6.5	Entrega interventoria	26/11/24	29/11/24	0 días	$ 0
451	1.2.3.6.6	Revisión y aval por parte de interventoria	3/12/24	3/12/24	0 días	$ 0
452	**1.2.3.7**	**Metodología y cronograma para garantizar la implementación del diseño paisajístico**	**13/11/24**	**7/01/25**	**43 días**	**$ 10 804 136**
453	1.2.3.7.1	Elaboración	13/11/24	18/12/24	30 días	$ 10 804 136
454	1.2.3.7.2	Entrega	18/12/24	18/12/24	0 días	$ 0
455	1.2.3.7.3	Revisión de interventoria	18/12/24	24/12/24	5 días	$ 0
456	1.2.3.7.4	Atención de observaciones	24/12/24	31/12/24	5 días	$ 0
457	1.2.3.7.5	Entrega Interventoria	31/12/24	31/12/24	0 días	$ 0
458	1.2.3.7.6	Revisión y aval por parte de interventoria	7/01/25	7/01/25	0 días	$ 0
459	**1.2.3.8**	**Plan de Manejo - Inventario de Nidos y Fauna Silvestre**	**16/08/24**	**8/10/24**	**43 días**	**$ 43 216 543**
460	1.2.3.8.1	Elaboración	16/08/24	23/09/24	30 días	$ 43 216 543
461	1.2.3.8.2	Entrega	23/09/24	23/09/24	0 días	$ 0
462	1.2.3.8.3	Revisión de interventoria	23/09/24	27/09/24	5 días	$ 0
463	1.2.3.8.4	Atención de observaciones	28/09/24	4/10/24	5 días	$ 0
464	1.2.3.8.5	Entrega Interventoria	4/10/24	4/10/24	0 días	$ 0
465	1.2.3.8.6	Revisión y aval por parte de interventoria	8/10/24	8/10/24	0 días	$ 0
466	**1.2.3.9**	**Documentos para tramite Permiso de ocupación de cauce - POC y Sinesamientos Callejas**	**14/09/24**	**11/02/25**	**121 días**	**$ 10 804 136**
467	1.2.3.9.1	Elaboración del documento preliminar sin aval de diseños por terceros	14/09/24	8/10/24	20 días	$ 10 804 136
468	1.2.3.9.2	Entrega a interventoria preliminar	8/10/24	8/10/24	0 días	$ 0
469	1.2.3.9.3	Revisión de interventoria	8/10/24	16/10/24	6 días	$ 0
470	1.2.3.9.4	Atención de observaciones	16/10/24	22/10/24	5 días	$ 0
471	1.2.3.9.5	Entrega Interventoria	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 0
472	1.2.3.9.6	Revisión y aval por parte de interventoria	25/10/24	25/10/24	0 días	$ 0
473	1.2.3.9.7	Viabilidad Tecnica de la DAAB del diseño Box Culvert	3/12/24	3/12/24	0 días	$ 0
474	1.2.3.9.8	Aprobación diseños definitivos IDU-DITG	31/01/25	31/01/25	0 días	$ 0
475	1.2.3.9.9	Entrega a interventoria documento definitivo para solicitud de permis	31/01/25	5/02/25	3 días	$ 0
476	1.2.3.9.10	Radicación de documento ant el IDU	5/02/25	5/02/25	0 días	$ 0
477	1.2.3.9.11	Revisión por parte del IDU	5/02/25	11/02/25	5 días	$ 0
478	1.2.3.9.12	Radicacion ante la SDA	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 0
479	**1.2.3.10**	**Documentos para tramite Permiso de ocupación de cauce - POC y Sinesamientos Molinos**	**14/09/24**	**11/02/25**	**121 días**	**$ 10 804 136**
480	1.2.3.10.1	Elaboración del documento preliminar sin aval de diseños por terceros	14/09/24	8/10/24	20 días	$ 10 804 136
481	1.2.3.10.2	Entrega a interventoria preliminar	8/10/24	8/10/24	0 días	$ 0
482	1.2.3.10.3	Revisión de interventoria	8/10/24	16/10/24	6 días	$ 0
483	1.2.3.10.4	Atención de observaciones	16/10/24	22/10/24	5 días	$ 0
484	1.2.3.10.5	Entrega Interventoria	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 0
485	1.2.3.10.6	Revisión y aval por parte de interventoria	25/10/24	25/10/24	0 días	$ 0
486	1.2.3.10.7	Viabilidad Tecnica de la DAAB del diseño Box Culvert	3/12/24	3/12/24	0 días	$ 0
487	1.2.3.10.8	Aprobación diseños definitivos IDU-DITG	31/01/25	31/01/25	0 días	$ 0
488	1.2.3.10.9	Entrega a interventoria documento definitivo para solicitud de permis	31/01/25	5/02/25	3 días	$ 0
489	1.2.3.10.10	Radicación de documento ant el IDU	5/02/25	5/02/25	0 días	$ 0
490	1.2.3.10.11	Revisión por parte del IDU	5/02/25	11/02/25	5 días	$ 0
491	1.2.3.10.12	Radicacion ante la SDA	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 0
492	**1.2.3.11**	**Presentación del MAO (Manejo ambiental en obra) para aprobación de la interventoria.**	**10/07/24**	**10/02/25**	**174 días**	**$ 64 824 813**
493	1.2.3.11.1	Elaboración	10/07/24	24/09/24	62 días	$ 64 824 813
494	1.2.3.11.2	Entrega preliminar	24/09/24	24/09/24	0 días	$ 0
495	1.2.3.11.3	Revisión de interventoria	24/09/24	1/10/24	6 días	$ 0
496	1.2.3.11.4	Atención de observaciones	1/10/24	31/10/24	25 días	$ 0
497	1.2.3.11.5	Entrega interventoria y revisión	31/10/24	14/11/24	10 días	$ 0
498	1.2.3.11.6	Aprobacion de interventoria doc peliminar	14/11/24	14/11/24	0 días	$ 0
499	1.2.3.11.7	Entrega interventoria documento def	9/01/25	9/01/25	0 días	$ 0
500	1.2.3.11.8	Revisión de interventoria	16/01/25	16/01/25	0 días	$ 0
501	1.2.3.11.9	Atención de observaciones	16/01/25	29/01/25	10 días	$ 0
502	1.2.3.11.10	Entrega interventoria y revisión	10/02/25	10/02/25	0 días	$ 0
503	1.2.3.11.11	Aprobacion de interventoria y rad a IDU	10/02/25	10/02/25	0 días	$ 0
504	**1.2.3.12**	**Informes mensuales - Ambiental**	**5/04/24**	**16/01/25**	**230 días**	**$ 0**
505	1.2.3.12.1	Entrega informe mes 1 - Ambiental	5/04/24	5/04/24	0 días	$ 0
506	1.2.3.12.2	Entrega informe mes 2 - Ambiental	7/05/24	7/05/24	0 días	$ 0
507	1.2.3.12.3	Entrega informe mes 3 - Ambiental	11/06/24	11/06/24	0 días	$ 0
508	1.2.3.12.4	Entrega informe mes 4 - Ambiental	8/07/24	8/07/24	0 días	$ 0
509	1.2.3.12.5	Entrega informe mes 5 - Ambiental	6/08/24	6/08/24	0 días	$ 0
510	1.2.3.12.6	Entrega informe mes 6 - Ambiental	6/09/24	6/09/24	0 días	$ 0
511	1.2.3.12.7	Entrega informe mes 7 - Ambiental	4/10/24	4/10/24	0 días	$ 0
512	1.2.3.12.8	Entrega informe mes 8 - Ambiental	5/11/24	5/11/24	0 días	$ 0
513	1.2.3.12.9	Entrega informe mes 9 - Ambiental	5/12/24	5/12/24	0 días	$ 0
514	1.2.3.12.10	Entrega informe mes 10 - Ambiental	16/01/25	16/01/25	0 días	$ 0
515	**1.2.4**	**APÉNDICE H - COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA**	**5/03/24**	**7/01/25**	**245 días**	**$ 916 865 098**
516	**1.2.4.1**	**Guia de Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género**	**5/03/24**	**10/04/24**	**28 días**	**$ 183 373 018**
517	1.2.4.1.1	Elaboración	5/03/24	22/03/24	15 días	$ 183 373 018
518	1.2.4.1.2	Entrega	22/03/24	22/03/24	0 días	$ 0
519	1.2.4.1.3	Revisión de interventoria	22/03/24	2/04/24	5 días	$ 0
520	1.2.4.1.4	Atención de observaciones	2/04/24	8/04/24	5 días	$ 0
521	1.2.4.1.5	Entrega Interventoria	8/04/24	8/04/24	0 días	$ 0
522	1.2.4.1.6	Revisión y aval por parte de interventoria	10/04/24	10/04/24	0 días	$ 0
523	**1.2.4.2**	**El Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicaciones Estratégicas**	**5/03/24**	**10/04/24**	**28 días**	**$ 137 529 765**
524	1.2.4.2.1	Elaboración	5/03/24	22/03/24	15 días	$ 137 529 765
525	1.2.4.2.2	Entrega	22/03/24	22/03/24	0 días	$ 0
526	1.2.4.2.3	Revisión de interventoria	22/03/24	2/04/24	5 días	$ 0
527	1.2.4.2.4	Atención de observaciones	2/04/24	8/04/24	5 días	$ 0
528	1.2.4.2.5	Entrega Interventoria	8/04/24	8/04/24	0 días	$ 0
529	1.2.4.2.6	Revisión y aval por parte de interventoria	10/04/24	10/04/24	0 días	$ 0
530	**1.2.4.3**	**Informe Análisis de antecedentes**	**5/03/24**	**10/04/24**	**28 días**	**$ 137 529 765**
531	1.2.4.3.1	Elaboración	5/03/24	22/03/24	15 días	$ 137 529 765
532	1.2.4.3.2	Entrega	22/03/24	22/03/24	0 días	$ 0
533	1.2.4.3.3	Revisión de interventoria	22/03/24	2/04/24	5 días	$ 0
534	1.2.4.3.4	Atención de observaciones	2/04/24	8/04/24	5 días	$ 0
535	1.2.4.3.5	Entrega Interventoria	8/04/24	8/04/24	0 días	$ 0
536	1.2.4.3.6	Revisión y aval por parte de interventoria	10/04/24	10/04/24	0 días	$ 0
537	**1.2.4.4**	**Metodología mesas de diálogo con grupos de interés, líderes y/o ciudad**	**26/06/24**	**6/08/24**	**33 días**	**$ 91 686 510**
538	1.2.4.4.1	Elaboración	26/06/24	22/07/24	20 días	$ 91 686 510
539	1.2.4.4.2	Entrega	22/07/24	22/07/24	0 días	$ 0
540	1.2.4.4.3	Revisión de interventoria	22/07/24	26/07/24	5 días	$ 0
541	1.2.4.4.4	Atención de observaciones	26/07/24	1/08/24	5 días	$ 0
542	1.2.4.4.5	Entrega Interventoria	1/08/24	1/08/24	0 días	$ 0
543	1.2.4.4.6	Revisión y aval por parte de interventoria	6/08/24	6/08/24	0 días	$ 0
544	**1.2.4.5**	**Consolidado mesas de diálogo con grupos de interés, líderes y/o ciudad**	**22/04/24**	**7/06/24**	**43 días**	**$ 91 686 510**
545	1.2.4.5.1	Elaboración	15/04/24	22/05/24	20 días	$ 91 686 510
546	1.2.4.5.2	Entrega	22/05/24	22/05/24	0 días	$ 0
547	1.2.4.5.3	Revisión de interventoria	22/05/24	28/05/24	5 días	$ 0
548	1.2.4.5.4	Atención de observaciones	28/05/24	4/06/24	5 días	$ 0
549	1.2.4.5.5	Entrega Interventoria	4/06/24	4/06/24	0 días	$ 0
550	1.2.4.5.6	Revisión y aval por parte de interventoria	7/06/24	7/06/24	0 días	$ 0
551	**1.2.4.6**	**Actualizar el mapa de actores**	**26/03/24**	**22/04/24**	**20 días**	**$ 91 686 510**
552	1.2.4.6.1	Elaboración	26/03/24	22/04/24	20 días	$ 91 686 510
553	1.2.4.6.2	Entrega	22/04/24	22/04/24	0 días	$ 0
554	**1.2.4.7**	**Inventario de predios**	**4/04/24**	**8/05/24**	**28 días**	**$ 45 843 255**
555	1.2.4.7.1	Elaboración	4/04/24	22/04/24	15 días	$ 45 843 255
556	1.2.4.7.2	Entrega	22/04/24	22/04/24	0 días	$ 0
557	1.2.4.7.3	Revisión de interventoria	22/04/24	26/04/24	5 días	$ 0
558	1.2.4.7.4	Atención de observaciones	26/04/24	3/05/24	5 días	$ 0
559	1.2.4.7.5	Entrega Interventoria	3/05/24	3/05/24	0 días	$ 0
560	1.2.4.7.6	Revisión y aval por parte de interventoria	8/05/24	8/05/24	0 días	$ 0
561	**1.2.4.8**	**Plan de Mitigación de Impactos al Sector Empresarial, Comercial y Logístico - PMI**	**15/04/24**	**7/06/24**	**43 días**	**$ 45 843 255**
562	1.2.4.8.1	Elaboración	15/04/24	22/05/24	30 días	$ 45 843 255
563	1.2.4.8.2	Entrega	22/05/24	22/05/24	0 días	$ 0
564	1.2.4.8.3	Revisión de interventoria	22/05/24	28/05/24	5 días	$ 0
565	1.2.4.8.4	Atención de observaciones	28/05/24	4/06/24	5 días	$ 0
566	1.2.4.8.5	Entrega Interventoria	4/06/24	4/06/24	0 días	$ 0
567	1.2.4.8.6	Revisión y aval por parte de interventoria	7/06/24	7/06/24	0 días	$ 0
568	**1.2.4.9**	**Metodología y cronograma para la elaboración de las actas de vecindad**	**4/04/24**	**8/05/24**	**28 días**	**$ 91 686 510**
569	1.2.4.9.1	Elaboración	4/04/24	22/04/24	15 días	$ 91 686 510
570	1.2.4.9.2	Entrega metodología	22/04/24	22/04/24	0 días	$ 0
571	1.2.4.9.3	Entrega cronograma para elaboración de actas de vecindad - preliminar	22/04/24	22/04/24	0 días	$ 0
572	1.2.4.9.4	Revisión de interventoria	22/04/24	26/04/24	5 días	$ 0
573	1.2.4.9.5	Atención de observaciones	26/04/24	3/05/24	5 días	$ 0
574	1.2.4.9.6	Entrega Interventoria	3/05/24	3/05/24	0 días	$ 0
575	1.2.4.9.7	Revisión y aval por parte de interventoria	8/05/24	8/05/24	0 días	$ 0
576	**1.2.4.10**	**Informes mensuales - Diálogo Ciudadano**	**5/04/24**	**7/01/25**	**221 días**	**$ 0**
577	1.2.4.10.1	Entrega informe mes 1 - Diálogo Ciudadano	5/04/24	5/04/24	0 días	$ 0
578	1.2.4.10.2	Entrega informe mes 2 - Diálogo Ciudadano	7/05/24	7/05/24	0 días	$ 0
579	1.2.4.10.3	Entrega informe mes 3 - Diálogo Ciudadano	11/06/24	11/06/24	0 días	$ 0
580	1.2.4.10.4	Entrega informe mes 4 - Diálogo Ciudadano	8/07/24	8/07/24	0 días	$ 0
581	1.2.4.10.5	Entrega informe mes 5 - Diálogo Ciudadano	6/08/24	6/08/24	0 días	$ 0
582	1.2.4.10.6	Entrega informe mes 6 - Diálogo Ciudadano	6/09/24	6/09/24	0 días	$ 0
583	1.2.4.10.7	Entrega informe mes 7 - Diálogo Ciudadano	7/10/24	7/10/24	0 días	$ 0
584	1.2.4.10.8	Entrega informe mes 8 - Diálogo Ciudadano	5/11/24	5/11/24	0 días	$ 0
585	1.2.4.10.9	Entrega informe mes 9 - Diálogo Ciudadano	5/12/24	5/12/24	0 días	$ 0
586	1.2.4.10.10	Entrega informe mes 10 - Diálogo Ciudadano	7/01/25	7/01/25	0 días	$ 0
587	**1.2.5**	**APÉNDICE F - COMPONENTE DE TRANSITO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS**	**6/03/24**	**16/10/24**	**219 días**	**$ 1 617 535 987**
588	**1.2.5.1**	**ELABORACION Metodologia para la toma de información: SDM, (TABLA DE CONTENIDO MÍNIMO DE LA METODOLOGÍA DE TOMA DE INFORMACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE LA LÍNEA BASE)**	**6/03/24**	**16/10/24**	**179 días**	**$ 63 007 962**
589	1.2.5.1.1	Definicion de corredores a utilizar como rutas de desvio - si aplica	6/03/24	11/03/24	4 días	$ 15 751 991
590	1.2.5.1.2	Diagnostico y definicion de puntos de aforo para la definicion de la Linea Base de seguimiento a los parametros de Transito	11/03/24	16/03/24	5 días	$ 15 751 991
591	1.2.5.1.3	Elaboracion Documento denominado Metodologia para la toma de informacion para la definicion de la Linea base de seguimiento a los parametros de Transito	18/03/24	8/04/24	15 días	$ 15 751 991
592	1.2.5.1.4	Entrega para Revision de interventoria	16/04/24	16/04/24	0 días	$ 0
593	1.2.5.1.5	Atención Observaciones	16/04/24	22/04/24	5 días	$ 15 751 991
594	1.2.5.1.6	Segunda Revisión por parte de la interventoria	22/04/24	26/04/24	5 días	$ 0
595	1.2.5.1.7	Aprobación por parte de Interventoria	7/05/24	7/05/24	0 días	$ 0
596	1.2.5.1.8	Entrega para Revision de SDM	9/05/24	9/05/24	0 días	$ 0
597	1.2.5.1.9	Atención Observaciones	9/05/24	16/05/24	5 días	$ 0
598	1.2.5.1.10	Segunda Revisión por parte de SDM	16/05/24	22/05/24	5 días	$ 0
599	1.2.5.1.11	Atencion y gestion de informacion adicional requerida SDM	22/05/24	4/10/24	130 días	$ 0
600	1.2.5.1.12	Radicación def a SDM	4/10/24	16/10/24	9 días	$ 0
601	1.2.5.1.13	Aprobación por parte de SDM	16/10/24	16/10/24	0 días	$ 0
602	**1.2.5.2**	**ELABORACION DOCUMENTO DEFINICION DE LA LINEA BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE TRANSITO**	**21/04/24**	**17/01/25**	**215 días**	**$ 94 511 946**
603	1.2.5.2.1	Programacion de ejecucion de actividades de campo	25/04/24	8/05/24	10 días	$ 15 751 991

Página 4

PROGRAMA DE OBRA

PRE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS" LOTE 1

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo
604	1.2.5.2.2	Programacion de personal, examenes de ingreso y afiliacion de personal de campo	8/05/24	15/05/24	5 días	$ 15 751 991
605	1.2.5.2.3	Ejecución de actividades de campo, aforos y velocidades	17/05/24	5/06/24	15 días	$ 15 751 991
606	1.2.5.2.4	Elaboracion documento denominado Definicion de la linea Base de seguimiento a los parametros de Tránsito	5/06/24	21/10/24	112 días	$ 47 255 972
607	1.2.5.2.5	Entrega para Revision de interventoria	30/10/24	7/11/24	6 días	$ 0
608	1.2.5.2.6	Atención Observaciones	7/11/24	15/11/24	6 días	$ 0
609	1.2.5.2.7	Segunda Revisión por parte de la interventoría	15/11/24	21/11/24	5 días	$ 0
610	1.2.5.2.8	Aprobación por parte de Interventoria	21/11/24	21/11/24	0 días	$ 0
611	1.2.5.2.9	Entrega para Revision de SDM	21/11/24	29/12/24	25 días	$ 0
612	1.2.5.2.10	Atención Observaciones	20/12/24	27/12/24	5 días	$ 0
613	1.2.5.2.11	Segunda Revisión por parte de SDM	27/12/24	17/01/25	16 días	$ 0
614	1.2.5.2.12	Aprobación por parte de SDM	17/01/25	17/01/25	0 días	$ 0
615	**1.2.5.3**	**ELABORACION PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA EL INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION**	**21/11/24**	**11/02/25**	**66 días**	**$ 0**
616	1.2.5.3.1	Reunion de revisión y planeamiento de inicio de ejecución de actividades de obra para planeamiento de PMT	21/11/24	22/11/24	1 día	$ 0
617	1.2.5.3.2	Elaboracion PMT especifico para inicio de actividades de obra	22/11/24	9/01/25	36 días	$ 0
618	1.2.5.3.3	Entrega para Revision de interventoria	14/01/25	14/01/25	0 días	$ 0
619	1.2.5.3.4	Atención Observaciones	14/01/25	15/01/25	2 días	$ 0
620	1.2.5.3.5	Segunda Revisión por parte de la interventoría	16/01/25	17/01/25	2 días	$ 0
621	1.2.5.3.6	Aprobación por parte de Interventoria	23/01/25	23/01/25	0 días	$ 0
622	1.2.5.3.7	Entrega para Revision de SDM	28/01/25	29/01/25	0 días	$ 0
623	1.2.5.3.8	Atención Observaciones SDM	30/01/25	5/02/25	5 días	$ 0
624	1.2.5.3.9	Segunda Revisión por parte de SDM	5/02/25	11/02/25	5 días	$ 0
625	1.2.5.3.10	Aprobación por parte de SDM	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 0
626	**1.2.5.4**	**Informes mensuales - Tránsito, Señalización y Desvíos**	**5/04/24**	**7/01/25**	**221 días**	**$ 0**
627	1.2.5.4.1	Entrega informe mes 1 - Tránsito, Señalización y Desvíos	5/04/24	5/04/24	0 días	$ 0
628	1.2.5.4.2	Entrega informe mes 2 - Tránsito, Señalización y Desvíos	7/05/24	7/05/24	0 días	$ 0
629	1.2.5.4.3	Entrega informe mes 3 - Tránsito, Señalización y Desvíos	11/06/24	11/06/24	0 días	$ 0
630	1.2.5.4.4	Entrega informe mes 4 - Tránsito, Señalización y Desvíos	8/07/24	8/07/24	0 días	$ 0
631	1.2.5.4.5	Entrega informe mes 5 - Tránsito, Señalización y Desvíos	6/08/24	6/08/24	0 días	$ 0
632	1.2.5.4.6	Entrega informe mes 6 - Tránsito, Señalización y Desvíos	6/09/24	6/09/24	0 días	$ 0
633	1.2.5.4.7	Entrega informe mes 7 - Tránsito, Señalización y Desvíos	4/10/24	4/10/24	0 días	$ 0
634	1.2.5.4.8	Entrega informe mes 8 - Tránsito, Señalización y Desvíos	5/11/24	5/11/24	0 días	$ 0
635	1.2.5.4.9	Entrega informe mes 9 - Tránsito, Señalización y Desvíos	5/12/24	5/12/24	0 días	$ 0
636	1.2.5.4.10	Entrega informe mes 10 - Tránsito, Señalización y Desvíos	7/01/25	7/01/25	0 días	$ 0
637	**1.2.6**	**ARQUEOLOGIA**	**21/03/24**	**22/11/24**	**196 días**	**$ 0**
638	1.2.6.1	Revisión documental del Plan de Manejo Arqueológico aprobado bajo la Resolución No. 0810 del 31 de mayo de 2023, recorridos iniciales del área y proyección de compromisos.	26/03/24	25/06/24	25 días	$ 0
639	1.2.6.2	Elaboración y solicitud de Cambio Mayor del Polígono Específico ante el ICANH para su entrega a interventoría	10/05/24	11/06/24	24 días	$ 0
640	1.2.6.3	Proyección definitiva de las Unidades de Monitoreo Arqueológico según el Cambio Mayor efectuado, entrega a interventoría para su evaluación y aprobación	12/06/24	2/07/24	16 días	$ 0
641	1.2.6.4	Acompañamiento a exploraciones del subsuelo, registro y actualización de Modelo de Datos.	30/04/24	24/05/24	20 días	$ 0
642	1.2.6.5	Proyección de los Muestreos de prospección arqueológica a efectuar en fase de construcción	19/07/24	31/07/24	10 días	$ 0
643	1.2.6.6	Elaboración y entrega informes mensuales Arqueología	21/03/24	22/11/24	196 días	$ 0
644	1.2.6.7	Elaboración del informe semestral de avance ICANH y entrega a interventoría para su evaluación	31/07/24	31/07/24	0 días	$ 0
645	**1.2.7**	**BIENES MUEBLES**	**1/03/24**	**15/10/24**	**182 días**	**$ 0**
646	1.2.7.1	Evaluación de la información entregada por el contratista, en la fase de	1/03/24	10/04/24	30 días	$ 0
647	1.2.7.2	Visita de campo a los monumentos para levantamiento de documentación fotográfica e información del estado de conservación, medidas, técnica de intervención, estado de conservación del espacio	10/04/24	9/05/24	25 días	$ 0
648	1.2.7.3	Revisión de documentación del proyecto para verificar la incidencia y afectación en los monumentos, con el fin de levantar la información requerida y realizar la propuesta de protección acorde a la obra de intervención	26/04/24	29/05/24	25 días	$ 0
649	1.2.7.4	Formulario de solicitud de autorización de intervención de Bienes Muebl	29/06/24	26/08/24	45 días	$ 0
650	1.2.7.5	Formulario de solicitud de autorización de traslado Bienes Muebles	8/07/24	26/08/24	40 días	$ 0
651	1.2.7.6	Elaborar la memoria técnica con la propuesta de protección temporal para los bienes muebles que se encuentran dentro del trazado del	18/07/24	13/08/24	20 días	$ 0
652	1.2.7.7	Elaborar la memoria técnica con la propuesta de traslado para los bienes muebles que se encuentran dentro del trazado del proyecto	29/07/24	25/09/24	48 días	$ 0
653	1.2.7.8	Radicación de la información ante la entidad correspondiente	15/10/24	15/10/24	0 días	$ 0
654	**1.2.8**	**PLAN ENTREGA DE PREDIOS**	**22/04/24**	**22/10/24**	**148 días**	**$ 0**
655	1.2.8.1	Reunión mes 2 para verificar estado entrega predial con IDU	22/04/24	22/04/24	0 días	$ 0
656	1.2.8.2	Reunión mes 3 para verificar estado entrega predial con IDU	22/05/24	22/05/24	0 días	$ 0
657	1.2.8.3	Reunión mes 4 para verificar estado entrega predial con IDU	21/06/24	21/06/24	0 días	$ 0
658	1.2.8.4	Reunión mes 5 para verificar estado entrega predial con IDU	22/07/24	22/07/24	0 días	$ 0
659	1.2.8.5	Reunión mes 6 para verificar estado entrega predial con IDU	22/08/24	22/08/24	0 días	$ 0
660	1.2.8.6	Reunión mes 7 para verificar estado entrega predial con IDU	23/09/24	23/09/24	0 días	$ 0
661	1.2.8.7	Reunión mes 8 para verificar estado entrega predial con IDU	22/10/24	22/10/24	0 días	$ 0
662	1.2.8.8	Entrega por parte del IDU de cronograma de entrega predial - como producto para planear etapa de Construcción	23/09/24	23/09/24	0 días	$ 0
663	1.2.8.9	Entrega cronograma levantamiento atas de vecindad	23/09/24	23/09/24	0 días	$ 0
664	1.2.9	Cierre y aprobaciones de productos finales de ESP	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 190 937 747
665	1.2.10	Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 763 750 986
666	1.2.11	Fin etapa de preconstrucción	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 0
667	1.2.12	FIRMA ACTA INICIO	11/02/25	11/02/25	0 días	$ 0
668	**1.3**	**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**9/12/24**	**11/02/28**	**972 días**	**$ 368 842 790 068**
669	**1.3.1**	**Entrega informes finales etapa de Preconstrucción**	**9/12/24**	**11/03/25**	**75 días**	**$ 0**
670	1.3.1.1	Entrega informe final Ambiental - Preconstrucción	11/03/25	11/03/25	0 días	$ 0
671	1.3.1.2	Entrega informe final Social y Diálogo ciudadano - Preconstrucción	27/02/25	27/02/25	0 días	$ 0
672	1.3.1.3	Entrega informe final Tránsito - Preconstrucción	27/02/25	27/02/25	0 días	$ 0
673	1.3.1.4	Entrega informe final Arqueología - Preconstrucción	9/12/24	9/12/24	0 días	$ 0
674	1.3.2	Componente Principal de la Etapa de Construcción (Incluye AIU)	11/02/25	10/02/28	939 días	$ 154 458 675 599
675	1.3.3	Componente de Obras Para Redes. (Incluye AIU)	11/02/25	10/02/28	939 días	$ 71 003 625 625
676	1.3.4	Componente por Labores Ambientales y SST en la Etapa de Construcción	12/02/25	10/02/28	939 días	$ 11 976 459 990
677	1.3.5	Componente Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en la E.C.	11/02/25	11/02/28	939 días	$ 3 470 307 501
678	1.3.6	Componente de Manejo de Tráfico y Señalización en la Etapa de Construcci	11/02/25	11/02/28	939 días	$ 6 702 533 339
679	1.3.7	Componente de Obras Especiales (Incluye AIU)	11/02/25	11/02/28	939 días	$ 43 454 358 154
680	1.3.8	Componente de las actividades de acero a precios unitarios (Incluye AIU)	11/02/25	11/02/28	939 días	$ 28 388 181 439
681	1.3.9	Valor Máximo del Fondo de Compensaciones	11/02/25	11/02/28	939 días	$ 43 847 117 362
682	1.3.10	Componente de ensayos de laboratorio	11/02/25	11/02/28	939 días	$ 5 194 134 781
683	1.3.11	Valor fondo especial para reembolso de compensaciones, evaluación y seguimiento de la autoridad ambiental (incluye fondo por cambio de vigencia e iva)	11/02/25	11/02/28	939 días	$ 148 364 304
684	1.3.12	Fin etapa de Construcción	11/02/28	11/02/28	0 días	$ 0
685	**1.4**	**ETAPA DE MANTENIMIENTO**	**14/02/28**	**12/02/31**	**938 días**	**$ 11 149 869 133**
686	1.4.1	Componente de Mantenimiento	14/02/28	12/02/31	938 días	$ 8 004 854 982
687	1.4.2	Componente por Labores Ambientales y SST en la Etapa de Mantenimiento	14/02/28	12/02/31	938 días	$ 1 607 152 748
688	1.4.3	Componente Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en la Etapa de Mantenimiento	14/02/28	12/02/31	938 días	$ 475 881 132
689	1.4.4	Componente de Manejo de Tráfico y Señalización en la Etapa de Mantenim	14/02/28	12/02/31	938 días	$ 1 661 980 271
690	1.4.5	Fin Etapa de Mantenimiento	14/02/28	12/02/31	938 días	$ 0
691	1.4.6	**Fin del Proyecto**	14/02/28	12/02/31	938 días	$ 0

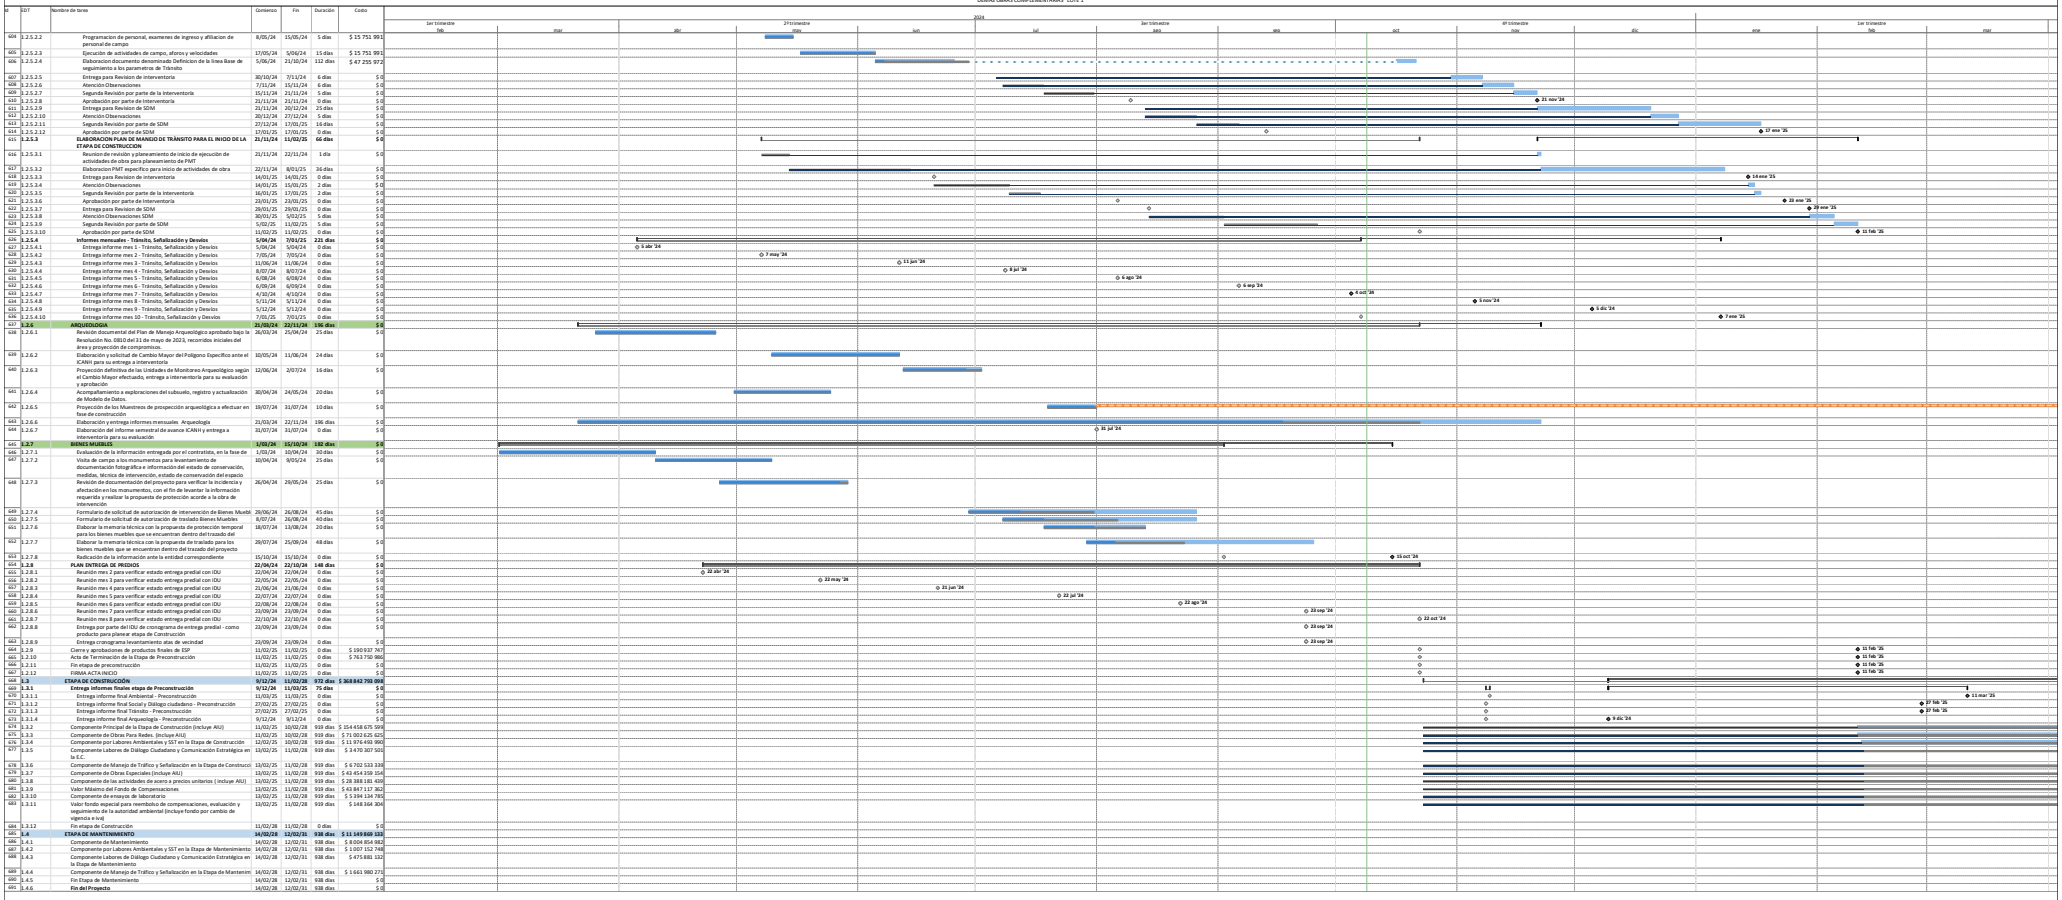

Proyecto: CONTRATO IDU - 1739 - 2020
CORREDOR VIAL DEL NORTE

Tareas | Resumen | Fecha límite | Tarea normal de predecesor de ruta de acceso | Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a | Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a | Tareas normal de predecesor controlador de ruta de a | Resumen de línea base | Atraso
División | Resumen del proyecto | Tarea hito de predecesor de ruta de acceso | Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc | Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc | Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc | Línea base | Progreso
Hito | Informe de resumen manual | Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso | Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta | Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta | Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta | Hito de línea base | Holgura
