FORMATO		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Construcción de Proyectos	3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** **de Ejecución del Subsistema Vial**

SEMANA N. 17 **DEL** 28/05/2024 **AL** 3/06/2024 **ETAPA / FASE ACTUAL DEL CONTRATO** **Etapa de Preliminares**

CONTRATO No **IDU-1777-2023** (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1771-2023 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA BELZCON S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.252.860-7 (Escriba el NIT del contratista) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

INTERVENTOR RESTREPO Y URIBE S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 860.009.250-6 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU Maritza Lozano Triviño (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** Febrero (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5 (Día) **DE** Mayo (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	15.630.957.236	Valor Inicial	3.828.083.700
Valor Actualizado	15.630.957.236	Valor Actualizado	3.828.083.700
No. empleos personal administrativo	19		
No. empleos personal operativo diurno	19	No. empleos personal operativo diurno	24
No. empleos personal operativo nocturno		No. empleos personal operativo nocturno	

2. AVANCES DEL PROYECTO

De acuerdo con mesas de trabajo efectuadas los días 26 de abril y 2 de mayo de 2024 entre representantes del IDU, el Contratista y la Interventoría, en las cuales se estableció que mientras no se inicien actividades de obra, el avance físico no es representativo de la ejecución del Proyecto, a continuación se reportan para el Contrato los porcentajes correspondientes a la programación y ejecución financiera.

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,12%	4,20%	Trabajo Ejecutado	0,12%	2,56%
Valor del Trabajo Programado	$ 18.973.824	$ 656.076.355	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 18.552.184	$ 400.824.614
ETAPA/FASE PRELIMINARES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	2,83%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	94,68%
Valor del Trabajo Programado	$ 10.320.766	$ 364.723.662	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 0	$ 345.323.601
ETAPA/FASE CONSTRUCCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0%	0%	Trabajo Ejecutado	0%	0%
Valor del Trabajo Programado	$ 0	$ 0,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 0	$ 0,00

RESUMEN CRONOGRAMA

Los avances del proyecto presentados fueron determinados con base a la última versión del PDT emitida por el Contratista mediante el comunicado BEL-AFM-ADM-0068-24 del 12 de marzo de 2024, este PDT fue aprobado por la Interventoría y remitido al IDU mediante comunicado C.2304/FM0059/24/5.4 del 13 de marzo de 2024. Al respecto, mediante comunicado STESV 202433600449971 del 19 de marzo de 2024 el IDU dio aval del respectivo PDT, con lo cual, a continuación, se presenta resumen de los avances con corte a la fecha del presente informe, junto con la descripción del avance de las actividades:

	FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
1	IDU-1771-2023-FRANCISCOMIRANDA-CSG20240422_REV IN	44,26%	35,57%	8,69%	
1	CTO IDU-1771-23 CONSTRUCCIÓN AV. FRANCISCO MIRAN	44,26%	35,57%	8,69%	
2	Acta de Inicio	100,00%	100,00%	0,00%	
2	ETAPA DE PRELIMINARES	99,48%	76,69%	22,79%	
3	INICIO DE ETAPA DE PRELIMINARES	100,00%	100,00%	0,00%	
3	ACTIVIDADES INICIALES	100,00%	98,25%	1,75%	
3	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	100,00%	86,24%	13,76%	
3	COMPONENTE SOCIAL	100,00%	88,49%	11,51%	

FORMATO		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Construcción de Proyectos	3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** **de Ejecución del Subsistema Vial**

SEMANA N. 17 **DEL** 28/05/2024 **AL** 3/06/2024 **ETAPA / FASE ACTUAL DEL CONTRATO** **Etapa de Preliminares**

CONTRATO No **IDU-1777-2023**
(Número de Contrato)

3	COMPONENTE PMT	100,00%	39,52%	60,48%
3	COMPONENTE BIC	100,00%	81,73%	18,27%
3	COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	100,00%	76,31%	23,69%
3	COMPONENTE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	91,67%	55,73%	35,94%
3	TRAMITE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO	100,00%	75,80%	24,20%
3	COMPONENTE DE CALIDAD	100,00%	98,54%	1,46%
3	TRAMITES TERMINACIÓN ETAPA DE PRELIMINARES	98,04%	18,14%	79,90%
3	FIN DE PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%
2	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%
3	COMPONENTES DE GESTIÓN PRELIMINARES	98,18%	98,18%	0,00%

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Longitud de la vía	Km	0,22	0	0	0	0
Ancho de carril	m	0,72	0	0	0	0
Numero carriles calzada sur	UNIDAD	2	0	0	0	0
Numero carriles calzada norte	UNIDAD	2	0	0	0	0
Área E. P. peatonal	m2	2930	0	0	0	0
Franjas de calidad y paisaje	m2	596	0	0	0	0

De acuerdo con los documentos contractuales, las Metas Físicas definitivas del proyecto, serán el resultado de las que se materialicen producto de las actividades de construcción

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA 1771 DE 2023

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTRATISTA:

FECHA	PROCEDENCIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CONTENIDO O TEMA TRATADO
28-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-292-24	Rta observaciones Informe Mensual SST N.º 2 V1
28-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-293-24	Rta observaciones Informe Mensual Tránsito N.º 1 y N.º 2
28-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-294-24	Entrega producto final redes secas - MOVISTAR
28-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-272-24	Rta observaciones equipo mínimo
28-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-295-24	Alcance solicitud de prórroga al contrato
28-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-297-24	Rta atraso de actividades de la Etapa de Preliminares
28-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-296-24	Rta observaciones al informe de mesas de diálogo ciudadano
28-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-298-24	Rta armonización corredor verde
29-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-300-24	Alcance comunicado BEL-AFM-ADM-237-24 Subsanación observaciones Informe Técnico No. 3
29-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-301-24	ITEM 10.13.1 CTO OBRA IDU-1771-2023 - Obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.
29-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-302-24	ITEM 10.13.1 CTO OBRA IDU-1771-2023 - Obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.
29-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-303-24	ITEM 10.13.1 CTO OBRA IDU-1771-2023 - Obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.
29-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-306-24	Programación etapa de obra Y PAC
29-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-304-24	Entrega registro fotográfico y fílmico – Vías de desvío
29-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-299-24	Radicación informe estrategia mesas de diálogo ciudadano
29-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-307-24	Observaciones Informe Mensual SST N.º 3 Versión 1
30-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-310-24	Rta observaciones Informe Mensual Ambiental N 3
30-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-308-24	Atención observaciones oficio IDU 202418500158843 Plan de Diálogo Ciudadano
30-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-312-24	Inventario de daños vías de desvío
30-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-311-24	Entrega registro fotográfico y fílmico de las condiciones actuales del sitio
30-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-319-24	Rta compensación porcentaje (%) de Dedicación Residente SST
30-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-318-24	Rta observaciones Informe Mensual SST N.º 2 V2
31-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-314-24	Diseñó de redes de Vanti.
31-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-313-24	Diseño ETB
31-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-317-24	Informe trazabilidad componente de patrimonio
31-may-24	BELZCON S.A.S	BEL-AFM-ADM-309-24	Autorización tramites IDPC

1) Se realizó el comité de obra N.º 16 el 29 de mayo de 2024 a las 8:00 a.m. vía Google meet, en conjunto con el apoyo de la supervisión del IDU, Contratista e Interventoría, y sus profesionales, donde se realizó el acta correspondiente.

FORMATO		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Construcción de Proyectos	3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** **de Ejecución del Subsistema Vial**

SEMANA N. 17 **DEL** 28/05/2024 **AL** 3/06/2024 **ETAPA / FASE ACTUAL DEL CONTRATO** **Etapa de Preliminares**

CONTRATO No **IDU-1777-2023**
(Número de Contrato)

ACTIVIDADES TÉCNICAS CONTRATISTA:
- El Contratista envió respuesta a las observaciones realizadas al informe mensual de tránsito N.º 1 y N.º 2 de los periodos comprendidos del 1 al 31 de marzo de 2024 y del 1 al 30 de abril de 2024.
- El Contratista remitió la entrega del producto final de la ESP MOVISTAR, para revisión y aprobación de la Interventoría.
- El Contratista envió el alcance a la solicitud de prórroga del Contrato 1771-2023, donde solicita prorrogar por 40 días.
- El Contratista remitió respuesta a la notificación de atraso en las actividades de la Etapa de Preliminares realizada por la Interventoría, dando respuesta punto a punto.
- El Contratista envió respuesta a los comunicados con los cuales la Interventoría realizó observaciones con respecto a la armonización con el corredor verde.
- El Contratista remitió el alcance a las observaciones realizadas al informe mensual técnico N.º 3 correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2024, desde los componentes de diseño geométrico y redes secas.
- El Contratista remitió la programación correspondiente a la Etapa de Construcción y el PAC, para revisión de la Interventoría.
- El Contratista envió la entrega del registro fotográfico y fílmico correspondiente a las vías de desvío, de acuerdo al check list para el cambio de etapa.
- El Contratista remitió el inventario de daños de vías de desvío de acuerdo a los compromisos del check list para cambio de etapa.
- El Contratista remitió la entrega del registro fotográfico y fílmico de las condiciones actuales del sitio, de acuerdo a los compromisos contractuales del check list.
- El Contratista remitió el diseño de redes de las ESP VANTI de acuerdo a los diseños revisados en la mesa de trabajo celebrada el día lunes 20 de mayo de 2023 con el delegado de la empresa, para su revisión
- El Contratista remitió el diseño de redes de la ESP ETB para revisión.
- El Contratista envió el informe de trazabilidad del componente de patrimonio de acuerdo a lo requerido en el PDT.
- El Contratista envió la solicitud de autorización para los trámites ante el Instituto Distrital de Patrimonio – Distrital – IDPC, de acuerdo a lo revisado en la mesa de trabajo realizada el día 30 de mayo de 2024.

ACTIVIDADES PRESUPUESTO CONTRATISTA:
- El Contratista tiene aprobada la versión final del PDT por parte de la Interventoría y se encuentra ajustando las observaciones realizadas por la Interventoría al desglose del AIU del Contrato.
- El Contratista envió el presupuesto general de obra y las memorias de cálculo de cantidades correspondientes para el cambio de etapa, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

ACTIVIDADES AMBIENTALES CONTRATISTA:
- El 27 de mayo de 2024 se llevó a cabo comité ambiental y SST entre profesionales del IDU, Contratista e Interventoría, en donde se trataron varios temas, entre otros, los referidos al trámite de la Valla y tramite del PIN Ambiental.
- El 27 de mayo de 2024 mediante comunicado BEL-AFM-ADM-291-24 el Contratista remitió a esta Interventoría el Plan de manejo de fauna silvestre con la subsanación de las observaciones generadas en la mesa de trabajo del 22 de mayo del 2024.
- El 29 de mayo de 2024 mediante comunicado BEL-AFM-ADM-310-24 el Contratista remitió a esta Interventoría respuesta a las Observaciones Informe Mensual Ambiental N.º 3.

ACTIVIDADES SOCIALES CONTRATISTA:
- A la entrega del reporte semanal N.º 17 se demuestra evidencia de la contratación de 19 personas de las que corresponden a 12 mujeres para un porcentaje del 63.1%.
- El 30 de mayo de 2024, se llevó a cabo el comité de seguimiento social de manera virtual en el cual se realizó seguimiento a las actividades sociales realizadas durante la semana.
- El 4 de junio de 2024, el Contratista radica informe semanal N.º 16 con información correspondiente a las actividades relacionadas para la semana en mención.
-El Contratista con comunicado BEL-AFM-ADM-308-24 del 30 de mayo de 2024 remitió respuesta a la Atención observaciones oficio IDU 202418500158843 Plan de Diálogo Ciudadano.
- El Contratista el 31 de mayo de 2024, remitió proyección de respuesta Atención al Usuario N.º 2 , comunicación a la fecha en revisión de Interventoría.
Con comunicación BEL-AFM-ADM-299-24 del 29 de mayo, el Contratista realizó radicación informe estrategia mesas de diálogo ciudadano.
- El Contratista con comunicaciones Nos. BEL-AFM-ADM-301-24, BEL-AFM-ADM-302-24 y BEL-AFM-ADM-303-24 emitió respuesta a obligaciones contractuales Contrato 1771-2023 Ítems 10.13.1 - Obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.
- El Contratista con comunicación BEL-AFM-ADM-296-24 del 28 de mayo de 2024 remitió respuesta a comunicado C.2304/FM0284/24/5.6 informe mesas de diálogo.
- El 29 de mayo de 2024 el IDU dio respuesta a Derecho de Petición interpuesto por Sofía Gutiérrez, con el fin de solicitar la desvinculación de la plataforma SIAC donde la contratada es relacionada en dos contratos IDU, sin embargo, se aclara que dentro de la respuesta la Guía Cívico pertenece al contrato 1771 - 2023.
- Durante la presente semana, se realizaron actividades de levantamiento de actas del edificio Cataluña 78 y un local ubicado en el edificio Tauros7, nos permitimos aclarar que en el Edificio Tauros pese a las diferentes socializaciones no se permitió el ingreso a las zonas de apartamentos ya que los arrendatarios no cuentan con disponibilidad e interés en dicho levantamiento, es así como las profesionales del equipo social del Contratista informó líder del edificio el 28 de mayo que ya se cumplían los tiempos a dicha programación de actas de vecindad, por lo cual, se dejó aclaración que no por ello la comunidad puede solicitar estas actividades antes de iniciar la etapa de obra. Así mismo, el 31 de mayo de 2024 se realizó entrega de copia de actas de vecindad aprobadas por la interventoría a la comunidad para un total de 12 actas.
- El 31 de mayo de 2024 el Contratista envió a Interventoría proyección de PQRSD N.º 2 solicitud de levantamiento de actas de vecindad por parte de la entidad Metro en los predios del Instituto para la construcción calle 45.
- El 30 de mayo de 2024 el Contratista cargó en el sistema Bachué información correspondiente a las actualizaciones PSI, piezas de divulgación y se atendieron observaciones de las actas de reunión.
- El 28 de mayo de 2024 el Contratista realizó atención a observaciones por parte de volantes IDU a la plantilla del volante N.º 10 levantamiento actas de rampa.

ACTIVIDADES SST CONTRATISTA:
El Contratista remitió:
- El comunicado BEL-AFM-ADM-292-24, allegando a la Interventoría el 27 de mayo de 2024 con asunto respuesta a C.2304FM0281/24/5.8 Observaciones Informe Mensual SST N.º 2 V1, en el cual atienden las observaciones realizadas al informe SST, mediante al aplicativo.
- El comunicado BEL-AFM-ADM-272-24, allegando a la Interventoría el 28 de mayo de 2024 con asunto respuesta comunicado C.2304/FM0186/24/5.6 observaciones equipo mínimo, en el cual citan el Apéndice E Componente Ambiental, Forestal, Fauna Silvestre, MEV y SST e informan que con cinco (5) días de anterioridad al ingreso de la obra remitirán la documentación faltante de la maquinaria.
- El comunicado BEL-AFM-ADM-307-24, allegando a la Interventoría el 29 de mayo de 2024 con asunto Observaciones Informe Mensual SST N.º 3 Versión 1, en el cual atienden las observaciones realizadas al informe SST, mediante al aplicativo, remitidas mediante el comunicado C.2304/FM0287/24/5.8
- El comunicado BEL-AFM-ADM-318-24, allegando a la Interventoría el 31 de mayo de 2024 con asunto respuesta a C.2304/FM0308/24/5.8 Observaciones Informe Mensual SST N.º 2 V2, en el cual atienden las observaciones realizadas al informe SST, mediante al aplicativo.
- El comunicado BEL-AFM-ADM-0319-24, allegando a la Interventoría el 31 de mayo de 2024 con asunto Respuesta oficio No. C.2304/FM0291/24/5. Compensación porcentaje (%) de Dedicación Residente SST.

ACTIVIDADES PLAN CALIDAD CONTRATISTA:
La Interventoría se encuentra en revisión de la atención de observaciones al Plan de Calidad presentado por el Contratista y el Plan de Inspección de Ensayos se encuentra en revisión por parte del Contratista.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** **de Ejecución del Subsistema Vial**

SEMANA N. 17 **DEL** 28/05/2024 **AL** 3/06/2024 **ETAPA / FASE ACTUAL DEL CONTRATO** **Etapa de Preliminares**

CONTRATO No **IDU-1777-2023**
(Número de Contrato)

ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA LA SIGUENTE SEMANA (Por componentes):

Técnicas:

- El Contratista debe incluir el cruce con las redes, incorporar las cajas al diseño, la ubicación de niveles y pendientes, la referenciación de cortes, la ubicación de alturas de puertas de acceso peatonal y vehicular, elementos como barandas, ubicación de losetas, inter distancias, cortes, etc., en la subsanación de las observaciones realizadas por la Interventoría al avance del componente de urbanismo.
- El Contratista de subsanar las observaciones realizadas por la Interventoría a la solicitud de prórroga.
- El Contratista debe presentar el informe de TPD, con su debida aprobación de parte de la Interventoría, esto para su inclusión en el documento de diseño de pavimentos, que a la fecha no ha sido entregado por el Contratista para su aprobación, así mismo, debe definir si acepta la propuesta realizar mesa de trabajo para tratar los temas mencionados en el documento, por lo que, la Interventoría se encuentra presta para agendar este espacio de reunión, de confirmarse esta invitación por parte del Contratista.
- El Contratista debe atender las observaciones de los documentos del laboratorio presentado, complementando la información del laboratorio, conforme a lo requerido en la Especificación IDU-ET-IC-01-V4, para la respectiva aprobación por parte de la Interventoría como laboratorio de seguimiento para la Etapa de Construcción.
- El Contratista debe atender las observaciones realizadas por la Interventoría al informe de Alcance, Enfoque y Metodología de la Construcción, desde el componente BIC, redes hidrosanitarias y pavimentos. No obstante, debe tener en cuenta que el informe se encuentra en revisión por parte de los demás componentes de los profesionales de la Interventoría, de los cuales se remitirán observaciones.
- El Contratista debe realizar la entrega del cronograma actualizado según la prórroga de 40 días, considerando que la prórroga y respectivo modificatorio del Contrato de Obra de la referencia se encuentra en trámite ante el IDU, se solicita al Contratista realizar la entrega del Cronograma o Plan Detallado de Trabajo de la Etapa de Preliminares actualizado, de manera inmediata (martes 4 de junio de 2024).
- El Contratista debe atender las observaciones realizadas al desglose del AIU, teniendo en cuenta lo indicado por el IDU en reunión celebrada de manera virtual el día 23 de mayo de 2024, para el cálculo de impuestos y garantías, donde el Contratista debe tener en cuenta la estructura de costos implementada por el IDU para la estimación del Presupuesto Oficial, sin tener en cuenta el rubro de “MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEM NP Y OTROS GASTOS CONTINGENTES” por valor de $ 1.936.964.667.

Ambientales:

- Se espera continuar con la participación de los componentes forestal, ambiental y fauna, en los comités integrales que se adelantan semanalmente.
- Se espera conocer desde el IDU información relacionada con el avance del trámite del permiso silvicultural requerido para el inicio de las actividades constructivas.

Sociales:

- Se encuentra pendiente las actas de vías y desvíos.
- Socialización de volante de rampas el día 4 de junio de 2024
- El Contratista participará en el Comité Semanal N.º 16 el 6 de junio de 2024.
- Durante la presente semana, el contratista se encuentra elaborando el informe mensual del periodo mayo 2024

SST:

- Atender el comunicado C.2304/FM0311/24/5.8 del 31 de mayo de 2024, en el cual se remitió al contratista la Observaciones Informe Mensual SST N.º 3 Versión 2, en atención al radicada con No 202452600972122 en el APLICATIVO SST disponible en el programa Oddo del sistema ZIPA (Sistema de Gestión Integral de Proyectos), dando alcance al comunicado BEL-AFM-ADM-307-24 del 29 de mayo de 2024.
- Atender el comunicado C.2304/FM0296/24/5.1 del 29 de mayo de 2024, en el cual se remitió al contratista Observaciones de los Documentos de Ingreso Cambio de Personal, para los profesionales Juan Sebastián Rodríguez Llanos, Andrés Fernando Ramírez Gutiérrez y Luis Alejandro Quimbayo Juanias.

ACTIVIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1777 DE 2023

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORÍA:

COMUNICADO	ENVIADA A	REFERENCIA / ASUNTO	FECHA	FECHA Y NÚMERO DE RADICADO ORIGINAL	FECHA Y NÚMERO DE RADICADO COPIAS
C.2304/FM0288/24/5.5	BELZCON S.A.S	Observaciones Estudios y Diseños Urbanismo	28-may-24	28/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600961382
C.2304/FM0289/24/5.2	Instituto de Desarrollo Urbano	Respuesta a la comunicación BEL-AFM-ADM-273-24 – Solicitud de Prórroga y Adición del Contrato de Obra IDU-1771-2023 – presentada por el Contratista BELZCON S.A.S.	29-may-24	21/05/2024 - 202452600964802	N.A
C.2304/FM0290/24/4.2	Instituto de Desarrollo Urbano	Entrega Informe Semanal de Interventoría N.º 16	28-may-24	28/05/2024 - 202452600961532	N.A
C.2304/0187/24/1	Instituto de Desarrollo Urbano	Solicitud Modificación Contrato	28-may-24	29/05/2024 - 202452600967292	N.A
C.2304/FM0291/24/5.1	BELZCON S.A.S	Compensación porcentaje (%) de Dedicación Residente SST	29-may-24	29/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600971372
C.2304/FM0292/24/5.8	BELZCON S.A.S	Observaciones para la elaboración de Informes Sociales Mensuales	29-may-24	29/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600971512
C.2304/FM0293/24/5.6	BELZCON S.A.S	Concepto Actas de Vecindad de Inicio-Lista de Chequeo por cambio de etapa.	29-may-24	29/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600971692
C.2304/FM0294/24/5.1	BELZCON S.A.S	Aprobación Hoja de Vida Modelador y/o Especialista BIM	29-may-24	29/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600971562
C.2304/FM0295/24/5.6	BELZCON S.A.S	Calificación de Fichas de Seguimiento A&SST	29-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600973952
C.2304/FM0296/24/5.1	BELZCON S.A.S	Observaciones Documentos de Ingreso Cambio de Personal	29-may-24	29/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600971772

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** **de Ejecución del Subsistema Vial**

SEMANA N. 17 **DEL** 28/05/2024 **AL** 3/06/2024 **ETAPA / FASE ACTUAL DEL CONTRATO** **Etapa de Preliminares**

CONTRATO No **IDU-1777-2023**
(Número de Contrato)

C.2304/FM0297/24/5.6	BELZCON S.A.S	Ubicación del Campamento Contratista	29-may-24	29/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600971882
C.2304/FM0298/24/5.8	BELZCON S.A.S	Aprobación Informe RAI de Estructuras	29-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600977282
C.2304/FM0299/24/5.1	BELZCON S.A.S	Perfiles Profesionales Contratista - Etapa de Construcción	29-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600974072
C.2304/FM0300/24/5.6	BELZCON S.A.S	Lista de chequeo Valla Informativa Fija	29-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600974142
C.2304/FM0301/24/5.1	BELZCON S.A.S	Documentos de Ingreso Personal	29-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600977542
C.2304/FM0302/24/5.8	BELZCON S.A.S	Aprobación Informe SST Mensual N.º 1 V1	29-may-24	29/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600968552
C.2304/FM0303/24/5.8	BELZCON S.A.S	Aprobación Informe Técnico Mensual N.º 2 V3	30-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600974212
C.2304/FM0304/24/5.6	BELZCON S.A.S	Información Guía Cívico- Proceso de Aceptación Hoja de Vida ORSC- IDU y Calificación Índices de Cumplimiento	30-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600974262
C.2304/FM0305/24/5.6	BELZCON S.A.S	Observaciones Documentos Laboratorio Contratista	30-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600976062
C.2304/FM0306/24/5.6	BELZCON S.A.S	Aprobación N.º 5 Actas de Vecindad de Inicio	30-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600977592
C.2304/FM0307/24/5.6	BELZCON S.A.S	Observaciones Proyección TPD	30-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600973872
C.2304/FM0308/24/5.8	BELZCON S.A.S	Observaciones Informe Mensual SST N.º 2 Versión 2	30-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600976192
C.2304/FM0309/24/5.6	BELZCON S.A.S	Observaciones Informe de Alcance, Enfoque y Metodología de la Construcción	30-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600976212
C.2304/FM0310/24/5.1	BELZCON S.A.S	Documentos de Ingreso Guía Cívico	30-may-24	30/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600978942
C.2304/FM0311/24/5.8	BELZCON S.A.S	Observaciones Informe Mensual SST N.º 3 Versión 2	31-may-24	31/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600987332
C.2304/FM0312/24/5.8	BELZCON S.A.S	Aprobación Informe SST Mensual N.º 2 V3	31-may-24	31/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600987412
C.2304/FM0313/24/5.5	BELZCON S.A.S	Aprobación Informe Final de Topografía V2	31-may-24	31/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600987482
C.2304/FM0314/24/5.4	BELZCON S.A.S	Solicitud Entrega Cronograma Actualizado Según Prórroga 40 días	31-may-24	31/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600987592
C.2304/FM0315/24/5.6	BELZCON S.A.S	Observaciones desglose AIU	31-may-24	31/05/2024 - Radicado por correo electrónico	202452600987992

COMUNICACIONES RECIBIDAS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU):

FECHA	PROCEDENCIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CONTENIDO O TEMA TRATADO
28-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	STESV 202433600705621	Respuesta Al Radicado Número 202452600780322 - Cambio y aprobación Hoja de vida Residente de obra IDU-1771-2023
28-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	STESV 202433600709241	Respuesta a los radicados 202452600832462 del 7/05/2024 y 202452600877872 del 15/05/2024 - Observaciones al Plan de Acción y Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica
28-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	STESV 202433600709231	Respuesta al radicado 202452600831812 del 7/05/2024 - Observaciones al informe mensual social #2 V2 correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, Etapa preliminares.
28-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	STESV 202433600709221	Respuesta al Radicado Número 202452600887432 del 16/05/2024 - Observaciones informe mensual de Interventoría #3 V1 componente técnico etapa preliminar periodo del 1 al 30 de abril de 2024.
30-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	OGA 202417500675851	Respuesta al radicado 202452600826852 del 07/05/2024. Observaciones informe mensual SST de interventoría No 1 V. 1 (INF-ZIPA- 564).
30-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	OGA 202417500719111	Respuesta Al Radicado Número 202452600887682 . Observaciones informe mensual ambiental 3 versión 1. Contrato IDU 1777 de 2023

FORMATO		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Construcción de Proyectos	3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** **de Ejecución del Subsistema Vial**

SEMANA N. 17 **DEL** 28/05/2024 **AL** 3/06/2024 **ETAPA / FASE ACTUAL DEL CONTRATO** **Etapa de Preliminares**

CONTRATO No **IDU-1777-2023**
(Número de Contrato)

30-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	STESV 202433600718851	Procedimiento Consignación Rendimientos financieros del Anticipo
31-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	OGA 202417500725931	Respuesta Al Radicado Número 202452600764832 . Observaciones formato I del Decreto 507 de 2023. Contrato IDU 1777 2023
31-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	OGA 202417500726461	Respuesta Al Radicado Número 202452600889122 Informe MEV 3 Versión 1 - Interventoría. 1777 2023
31-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	STESV 202433600729881	Respuesta radicado 202452600964802 del 29/05/2024 - Solicitud de Prórroga del Contrato de Obra IDU-1771-2023 presentada por el Contratista BELZCON S.A.S.
31-may-24	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	STESV 202433600729891	Respuesta al radicado 202452600967292 del 29/05/2024 - Solicitud de modificación del contrato de interventoría.

1) El IDU dio respuesta a la solicitud de prórroga del Contratista, en la cual indicó que "no es procedente tramitar la solicitud de modificatorio para el contrato de obra IDU-1771-2023, debido a que ésta fue recibida en la Entidad, el 29 de mayo de 2024, cuatro (4) días hábiles previos a la fecha de terminación del plazo de la Etapa de Preliminares es decir fuera del plazo establecido por el MANUAL DE GESTIÓN INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS – V10, para tal fin.", razón por la cual, solicitó a la interventoría estudiar una alternativa técnica, jurídica y económicamente viable que permita continuar con la ejecución del proyecto. Así mismo, se indicó la misma directriz ante la solicitud de modificación del Contrato de Interventoría.
2) El IDU remitió observaciones a los informes mensuales de la Interventoría y otras correspondientes a la documentación de ingreso de personal del Contratista.

1) Se realizó el comité de obra N.º 16 el 29 de mayo de 2024 a las 8:00 a.m. vía Google meet, en conjunto con el apoyo de la supervisión del IDU, Contratista e Interventoría, y profesionales de los componentes, donde se realizó el acta correspondiente.

ACTIVIDADES TÉCNICAS INTERVENTORÍA:
- La Interventoría radicó al IDU la entrega del informe semanal N.º 16, describiendo las actividades realizadas del 21 al 27 de mayo de 2024.
- La Interventoría radicó al IDU la respuesta a la comunicación BEL-AFM-ADM-273-24 – Solicitud de Prórroga y Adición del Contrato de Obra IDU-1771-2023 – presentada por el Contratista BELZCON S.A.S, donde, una vez realizado el análisis expuesto en el comunicado C.2304/FM0289/24/5.2, esta Interventoría emite concepto favorable sobre la solicitud de prórroga cuarenta (40) días solicitada por el Contratista, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en el CAPITULO CUARTO: CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORÍA RESPECTO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA y en el CAPITULO SEXTO: ANÁLISIS DE IMPUTABILIDAD del comunicado C.2304/FM0289/24/5.2.
- La Interventoría radicó al IDU la solicitud de modificación del Contrato de Interventoría mediante comunicado C.2304/0187/24/1 con radicado IDU 202452600967292 del 29 de mayo de 2024, donde se demanda un incremento en el valor de la Etapa de Preliminares, donde, al valor mensual a remunerar durante el tiempo de la prórroga se deberá tener en cuenta el valor total de la etapa de preliminares incluyendo los costos asociados al tiempo prorrogado, se solicita modificar el plazo del Contrato y así mismo la Cláusula 6, además, se anexo el formato FO-GC-27 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, entre otros.
- La Interventoría remitió la aprobación del informe mensual técnico N.º 2 V.3 del Contratista, correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024.
- La Interventoría devolvió al Contratista la proyección del TPD, ya que, de acuerdo con las revisiones efectuadas, se concluyó que se requiere presentar el informe de TPD, con su debida aprobación de parte de la Interventoría, para su inclusión en el documento de diseño de pavimentos, que a la fecha no ha sido entregado por el Contratista para su aprobación, así mismo, y con el propósito de dar claridad al producto final de TPD, se propuso realizar mesa de trabajo para tratar los temas mencionados en el documento, por lo tanto, esta Interventoría se encuentra presta para agendar este espacio de reunión, de confirmarse esta invitación por parte del Contratista.
- La Interventoría envió la aprobación del informe RAI del componente de estructuras, ya que se atendieron y/o aclararon las observaciones realizadas al documento.
- La Interventoría remitió observaciones a los documentos del laboratorio presentado por el Contratista, donde se solicitó al Contratista complementar la información del laboratorio, conforme a lo requerido en la Especificación IDU-ET-IC-01-V4, para la respectiva aprobación como laboratorio de seguimiento para la Etapa de Construcción.
- La Interventoría envió al Contratista observaciones al informe de Alcance, Enfoque y Metodología de la Construcción, desde el componente BIC, redes hidrosanitarias y pavimentos, aclarando que el informe se encuentra en revisión por parte de los demás componentes, de los cuales se remitirán las observaciones correspondientes dando alcance al comunicado.
- La Interventoría solicitó al Contratista la entrega del cronograma actualizado según la prórroga de 40 días, esto considerando que la prórroga y respectivo modificatorio del Contrato de Obra de la referencia se encuentra en trámite ante el IDU, se solicita al Contratista realizar la entrega del Cronograma o Plan Detallado de Trabajo de la Etapa de Preliminares actualizado, de manera inmediata (martes 4 de junio de 2024).
- La Interventoría envió observaciones al desglose del AIU presentado por el Contratista, donde conforme lo indicado por el IDU en reunión celebrada de manera virtual el día 23 de mayo de 2024, para el cálculo de impuestos y garantías, el Contratista debe tener en cuenta la estructura de costos implementada por el IDU para la estimación del Presupuesto Oficial, sin tener en cuenta el rubro de “MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEM NP Y OTROS GASTOS CONTINGENTES” por valor de $ 1.936.964.667.

ACTIVIDADES PRESUPUESTO INTERVENTORÍA:
- El IDU aprobó el PDT del Contratista. La Interventoría se encuentra a la espera del pronunciamiento a la atención de observaciones realizadas al AIU de acuerdo a lo establecido en el comunicado C.2304/FM0315/24/5.6.
- La Interventoría se encuentra revisando los precios unitarios no previstos presentados por el Contratista, los cuales se verificarán si aplican o no.

ACTIVIDADES AMBIENTALES INTERVENTORÍA:
- El 29 de mayo de 2024 mediante comunicado C.2304/FM0295/24/5.6 se remitió al Contratista la Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, en el formato IDU FO-AC-32 FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES, para el mes de abril de 2024.
- El 27 de mayo de 2024 se llevó a cabo comité ambiental y SST entre profesionales del IDU, Contratista e Interventoría, en donde se trataron varios temas, entre otros, los referidos al tramite de la Valla y tramite del PIN Ambiental.
- El 29 de mayo se llevó a cabo comité integral de obra, en donde, desde el componente ambiental se trataron varios temas y de los cuales tuvo relevancia el tramite del PIN Ambiental, toda vez que es requisito indispensable para inicio de obra.
- De manera general se informa que, en mesa del 27 de mayo de 2024, desde el IDU informaron que el tramite del permiso forestal se podría tardar poco mas de mes y medio. Del mismo modo, se conoció del comunicado 202417500719111 del 30 de mayo de 2024, el cual presenta observaciones de parte del IDU a la documentación requerida para el PIN ambiental.

FORMATO		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Construcción de Proyectos	3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** **de Ejecución del Subsistema Vial**

SEMANA N. 17 **DEL** 28/05/2024 **AL** 3/06/2024 **ETAPA / FASE ACTUAL DEL CONTRATO** **Etapa de Preliminares**

CONTRATO No **IDU-1777-2023**
(Número de Contrato)

ACTIVIDADES SOCIALES INTERVENTORÍA:
- Durante la semana se realizó acompañamiento por parte de la Interventoría a las actividades relacionadas con elaboración de actas de vecindad de inicio que a la fecha ejecuta el Contratista.
- El 30 de mayo de 2024 se realizó el Comité social semanal N.º 15 el cual contó con la participación del área social del IDU, Contratista e Interventoría.
- El 27 de mayo de 2024, se realizó informe semanal integral N.º 16 del periodo del 21 al 27 de mayo de 2024, así mismo, se remitió vía correo electrónico informe a Profesional Social de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía-ORSC del IDU.
-El 27 de mayo de 2024 el Contratista remitió a Interventoría proyección de respuesta a peticionario la cual fue verificada y avalada por Interventoría. Así mismo, durante la semana se realizó seguimiento a Atenciones al Ciudadano Nos. 1 y 2.
- El 28 de mayo de 2024, se remitió a profesional Social y técnica del IDU volante No.10 con plantilla ajustada y se contó con concepto favorable el 31 de mayo para remisión a volantes IDU.
- El Contratista el 31 de mayo de 2024 con comunicado BEL-AFM-ADM-308-24, remitió comunicado de asunto- Atención observaciones oficio IDU 202418500158843 Plan de Diálogo Ciudadano.
- El 31 de mayo de 2024 se brindó atención a solicitud de Profesional Apoyo Supervisión Social del IDU en lo referente a información de contactos de lideres del proyecto.
- El 31 de mayo de 2024, se realizó acompañamiento a Profesional Apoyo Supervisión Social del IDU a Alcaldía Local de Chapinero para verificación de aspectos relacionados con el aviso del Punto IDU, suministrando información el Asesor Jurídico del Despacho quien aclara que este tipo de aviso no requiere permiso, recomienda que al ubicarse el aviso en una propiedad horizontal requerirá permiso del administrador y se revise que su ubicación no pueda causar riesgos a transeúntes o residentes.
- Durante la semana se realizó actualización de toda la información de la gestión social del proyecto relacionada con el aplicativo del Sistema Bachué.
- El 30 de mayo de 2024, con comunicación C.2304/FM0306/24/5.6 de asunto Aprobación N.º 5 Actas de Vecindad de Inicio, contando con la suscripción de 51 actas y 8 de atención de observaciones.
- Con comunicación C.2304/FM0300/24/5.6 del 29 de mayo se emitió concepto de Lista de chequeo Valla Informativa Fija
- El 29 de mayo de 2024, con comunicación C.2304/FM0293/24/5.6 se emitió concepto Actas de Vecindad de Inicio-Lista de Chequeo por cambio de etapa.

ACTIVIDADES SST INTERVENTORÍA:
- Mediante el comunicado C.2304/FM0291/24/5.1 del 29 de mayo de 2024, por la cual se le solicita al contratista compensar el porcentaje (%) de Dedicación Residente SST.
- Mediante el comunicado C.2304/FM0295/24/5.6 del 29 de mayo de 2024, se remite al contratista la Calificación de Fichas de Seguimiento A&SST, correspondiente al mes de abril.
- Mediante el comunicado C.2304/FM0296/24/5.1 del 29 de mayo de 2024, se remite al contratista Observaciones de los Documentos de Ingreso Cambio de Personal, para los profesionales Juan Sebastián Rodríguez Llanos, Andrés Fernando Ramírez Gutiérrez y Luis Alejandro Quimbayo Juanias.
- Mediante el comunicado C.2304/FM0297/24/5.6 del 29 de mayo de 2024, con asunto Ubicación del Campamento Contratista, se remite al contratista que este requerimiento se encuentra acorde a lo solicitado en el FO-EO-12 LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, así mismo, este fue aprobado y remitido al IDU, mediante el comunicado C.2304/FM0250/24/5.6 del 16 de mayo de 2024, como uno de los anexos del MAO-SST.
- Mediante el comunicado C.2304/FM0299/24/5.1 del 29 de mayo de 2024, se remite al contratista los perfiles requeridos por el IDU para el personal de la Interventoría, como se acordó en el Comité semanal de seguimiento N.º 15, de acuerdo a lo solicitado mediante el comunicado BEL-AFM-ADM-249-24 recibido en esta Interventoría el 17 de mayo de 2024, con el cual el Contratista relaciona los profesionales previstos para la etapa de Construcción y requiere "claridad y especificación de los especialistas requeridos para esta fase, teniendo en cuenta que en el documento "ANEXO DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL MÍNIMO DEL PROYECTO"
- Mediante el comunicado C.2304/FM0301/24/5.1 del 29 de mayo de 2024, se remite al contratista la aprobación de los Documentos de Ingreso Personal, dando alcance al comunicado C.2304/FM0247/24/5.1 del 15 de mayo de 2024
- Mediante el comunicado C.2304/FM0302/24/5.8 del 29 de mayo de 2024, se remite al contratista la aprobación Informe SST Mensual N.º 1 V1, dando alcance al comunicado C.2304/FM0216/24/5.8 del 6 de mayo de 2024, con el que esta Interventoría emitió concepto de APROBADO al Informe Mensual SST N.º 1 V4 del Contratista, correspondiente al periodo del 6 al 29 de febrero de 2024, se aclara que, de acuerdo con el radicado en el APLICATIVO SST, este documento corresponde con el Informe Mensual SST N.º 1 V.1 con radicado de entrada 202452600810772.
- Mediante el comunicado C.2304/FM0308/24/5.8 del 30 de mayo de 2024, se remite al contratista la Observaciones Informe Mensual SST N.º 2 Versión 2, en atención al radicado de entrada 202452600953872, generado través del APLICATIVO SST y dando alcance al comunicado BEL-AFM-ADM-292-24 del 27 de mayo de 2024.
- Mediante el comunicado C.2304/FM0311/24/5.8 del 31 de mayo de 2024, se remite al contratista la Observaciones Informe Mensual SST N.º 3 Versión 2, en atención al radicada con No 202452600972122 en el APLICATIVO SST disponible en el programa Oddo del sistema ZIPA (Sistema de Gestión Integral de Proyectos), dando alcance al comunicado BEL-AFM-ADM-307-24 del 29 de mayo de 2024.
- Mediante el comunicado C.2304/FM0312/24/5.8 del 31 de mayo de 2024, se remite al contratista la Aprobación Informe SST Mensual N.º 2 V3, en atención al radicado de entrada No 202452600982702 en el APLICATIVO SST y dando alcance al comunicado BEL-AFM-ADM-318-24 del 31 de mayo de 2024, evidenciando que cumple con los requerimientos de la entidad para esta componente.

ACTIVIDADES PLAN CALIDAD INTERVENTORÍA:
Se esta a la espera de la respuesta por parte del IDU sobre el Plan de Gestión Integral de la Interventoría, además, la Interventoría remitió al IDU la atención de observaciones del plan de acción del componente social. La Interventoría esta a la espera de la respuesta por parte del IDU a la atención de observaciones realizadas al Plan de Acción ambiental y SST.

ACTIVIDADES COMPONENTE TRÁNSITO:
- De acuerdo a lo establecido en el comité semanal N.º 16 del 29 de mayo de 2024, se indicó que el Contratista no ha presentado el PMT ni la propuesta de proceso constructivo. Además, este se encuentra adelantando gestiones ante la SDM.
- Se remitieron observaciones a la proyección del TPD, ASPI MISMO, con el propósito de dar claridad al producto final de TPD, se propuso realizar mesa de trabajo para tratar los temas mencionados en el documento, por lo tanto, esta Interventoría se encuentra presta para agendar este espacio de reunión, de confirmarse esta invitación por parte del Contratista.

ACTIVIDADES COMPONENTE URBANISMO:
- La Interventoría remitió observaciones al avance de urbanismo presentado por el Contratista, se evidenció que presentó el avance en el diseño urbano, sin embargo, faltó que realizara el cruce con las redes, incorporar las cajas al diseño, la ubicación de niveles y pendientes, la referenciación de cortes, la ubicación de alturas de puertas de acceso peatonal y vehicular, elementos como barandas, ubicación de losetas, inter distancias, cortes, etc.

ACTIVIDADES COMPONENTE REDES SECAS:
- El 29 de mayo de 2024 se asistió al comité semanal integral N.º 16, donde se revisaron los productos requeridos en el check list para cambio de etapa.
- El 29 de mayo de 2024 se gestionó formato FO-AC-84 "Registro Inducción Capacitación Entrenamiento Y Charlas".
- El 29 de mayo de 2024 se recibió comunicado BEL-AFM-ADM-300-24 referente a subsanación observaciones informe técnico No. 3.
- El 29 de mayo de 2024 se remitió oficio CE-C.2304-ELE-0011-24 en respuesta al comunicado BEL-AFM-ADM-285-24 referente al acta de Competencia ETB.
- El 29 de mayo de 2024 se remitió oficio CE-C.2304-ELE-0012-24 en respuesta al comunicado BEL-AFM-ADM-274-24 referente al acta de Competencia VANTI.
- El 29 de mayo de 2024 se envió el oficio CE-C.2304-ELE-0013-24 en respuesta al comunicado BEL-AFM-ADM-269-24 referente al acta de Competencia MOVISTAR.
- El 30 de mayo de 2024 se envió oficio CE-C.2304-ELE-0014-24 en respuesta a oficio BEL-AFM-ADM-255-24 referente al registro fotográfico proyecto.
- El 31 de mayo de 2024 se recibió comunicado BEL-AFM-ADM-313-24 del Contratista para entregar diseño ETB. El vínculo de descarga recibido está vacío.
- El 31 de mayo de 2024 se recibió comunicado BEL-AFM-ADM-314-24 del Contratista para entregar diseño VANTI. El vínculo de descarga recibido está vacío.
- El 31 de mayo de 2024 se remitió comunicado CE-C.2304-ELE-0015-24 en respuesta al oficio BEL-AFM-ADM-275-24 referente a las acta de Competencia de CODENSA

ACTIVIDADES COMPONENTE REDES HUMEDAS:
- Se realizó la revisión del oficio BEL-AFM-ADM-298-24 - Respuesta a oficios No C.2304/FM0180/24/5.4 y C.2304/FM0220/24/5.4 armonización corredor verde.
- Se realizó la revisión del informe de alcance, enfoque y metodología de la construcción, remitido mediante comunicado BEL-AFM-ADM-253-24.

FORMATO		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Construcción de Proyectos	3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** **de Ejecución del Subsistema Vial**

SEMANA N. 17 **DEL** 28/05/2024 **AL** 3/06/2024 **ETAPA / FASE ACTUAL DEL CONTRATO** **Etapa de Preliminares**

CONTRATO No **IDU-1777-2023**
(Número de Contrato)

ACTIVIDADES COMPONENTE BIC:
- El 30 de mayo de 2024 se realizó el comité del componente BIC en donde participaron el IDU, Contratista e Interventoría, en el cual, se llego a la conclusión que el contratista no cuenta con los diseños finales para proceder con la radicación ante el IDPC, por lo cual, es necesario que presenten un plan de acción para cumplir con las obligaciones contractuales en el tiempo de la proconstrucción.
- El 31 de mayo de 2024, el Contratista realizó la entrega mediante el comunicado BEL-AFM-ADM-309-24 la solicitud de autorización para radicar ante el IDPC y, también entrego con el comunicado BEL-AFM-ADM-317-24 un informe de trazabilidad de las actividades ejecutadas en los meses de marzo, abril, mayo.

ACTIVIDADES COMPONENTE FORESTAL:
- Se asistió al comité integral semanal N.º 16 el 29 de mayo de 2024, donde se revisaron los productos de acuerdo al check list para cambio de etapa.
- Se encuentra en revisión y emisión de observaciones el documento "ALCANCE, ENFOQUE Y METODOLOGIA DE LACONSTRUCCIÓN.
- El 31 de mayo de 2024, se asistió a la reunión de socialización Suds y paisajismo proyecto Av. francisco miranda cll. 45 contrato de obra IDU-1771-2023.

ACTIVIDADES COMPONENTE FAUNA:
- Se encuentra en revisión el plan de manejo de fauna versión 2, el cual se realizó en conjunto con profesionales biólogos del IDU, Contratista e Interventoría en mesa de trabajo.

ACTIVIDADES COMPONENTE TOPOGRAFIA:
- El 28 de mayo de 2024 se asistió a la reunión del componente de topografía (IDU, Contratista e Interventoría), relacionado a trámites y aprobaciones ante terceros (EAAB) para el componente.
- Se asistió al comité integral semanal N.º 16 el 29 de mayo de 2024, entre IDU, Contratista e Interventoría, donde se revisaron los productos de acuerdo al check list para cambio de etapa.
- La Interventoría envió la aprobación del informe final de topografía versión 2 , no obstante el concepto por la Interventoría respecto de este producto, el Contratista deberá atender las observaciones o solucionar las objeciones que el IDU, las Empresas de Servicios Públicos o las entidades competentes presenten.

ACTIVIDADES COMPONENTE GEOTECNIA:
- Se realizó la elaboración del concepto técnico CE/C.2304/GEO/0007/24 producto de la revisión del contenido del comunicado No. BEL-AFM-ADM-271-24 del 22 de mayo de 2024 con asunto “Documentos laboratorio y visita de acuerdo a documentos Check list cambio de etapa” y sus documentos adjuntos / Respuesta al comunicado No. BEL-AFM-ADM-271-24.
- Se realizó la elaboración del concepto técnico CE/C.2304/GEO/0008/24 producto de la visita técnica realizada a las instalaciones del Laboratorio de Suelos “Equipos & Ensayos Especializados SAS” / Respuesta al comunicado No. BEL-AFM-ADM-279-24.

ACTIVIDADES COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO:
- Se esta a la espera de la atención de observaciones por parte del Contratista a los diseños finales.

ACTIVIDADES COMPONENTE PAVIMENTOS:
- El 28 de mayo de 2024, se realizó visita al laboratorio que proyecta el Contratista para la obra “Equipos & Ensayos Especializados SAS” y realización de concepto de visita.
- El 30 de mayo de 2024, se elaboró el concepto CE/C.2304/PAV/0009/24 - Comunicado BEL-AFM-ADM-304-24 Registro fotográfico y fílmico – Vías de desvío, donde se requirió presentar informe según lo establecido en el Apéndice A.
- El 31 de mayo de 2024, se elaboró el concepto CE/C.2304/PAV/0010/24 - Comunicado BEL-AFM-ADM-312-24 Inventario de daños vías de desvío, donde se reitera presentar el informe según lo establecido en el Apéndice A. Además, se hizo énfasis en planteamiento de intervención, cantidades de obra, TPD, vida residual.
- El 31 de mayo de 2024, en atención al comunicado BEL-AFM-ADM-311-24 se indica que no se conceptúa desde pavimentos información sin análisis del Especialista de Pavimentos.

ACTIVIDADES A EJECUTAR POR LA INTERVENTORÍA LA SIGUENTE SEMANA (Por componentes):

Técnicas:
- La Interventoría revisará el informe mensual de tránsito N.º 1 y N.º 2 de los periodos comprendidos del 1 al 31 de marzo de 2024 y del 1 al 30 de abril de 2024, presentados por el Contratista subsanando las observaciones realizadas.
- La Interventoría revisará el producto final remitido por el Contratista de la ESP MOVISTAR, el cual se espera remitir aprobado.
- La Interventoría revisará la respuesta presentada por el Contratista a la notificación de atraso en las actividades de la Etapa de Preliminares realizada por la Interventoría, verificando punto a punto.
- La Interventoría verificará que el Contratista haya atendido a satisfacción las observaciones realizadas a la armonización con el corredor verde, desde el componente de urbanismo, redes hidrosanitarias y diseño geométrico.
- La Interventoría revisará la atención a las observaciones realizadas por el Contratista al alcance del informe mensual técnico N.º 3 correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2024, desde los componentes de diseño geométrico y redes secas.
- La Interventoría revisará el programa la programación presentada por el Contratista para la Etapa de Construcción y el PAC.
- La Interventoría revisará el registro fotográfico y fílmico correspondiente a las vías de desvío entregada por el Contratista, verificando que cumpla de acuerdo al check list del IDU para el cambio de etapa.
- La Interventoría revisará el inventario de daños correspondiente a las vías de desvío entregada por el Contratista, verificando que cumpla de acuerdo al check list del IDU para el cambio de etapa, desde el componente de urbanismo, pavimentos y social.
- La Interventoría revisará la entrega del registro fotográfico y fílmico de las condiciones actuales del sitio, verificando que cumpla de acuerdo al check list del IDU para el cambio de etapa.
- La Interventoría revisará y verificará el diseño de redes de las ESP VANTI de acuerdo a los diseños revisados en la mesa de trabajo celebrada el día lunes 20 de mayo de 2023 con el delegado de la empresa, para su revisión
- La Interventoría revisará el diseño de redes de la ESP ETB, en el cual se atendieron las observaciones realizadas mediante comunicado C.2304/FM0286/24/5.6 del 24 de mayo de 2024.
- La Interventoría revisará y verificará el l informe de trazabilidad del componente de patrimonio de acuerdo a lo requerido en el PDT.
- La Interventoría revisará la solicitud de autorización para los trámites ante el Instituto Distrital de Patrimonio – Distrital – IDPC, de acuerdo a lo revisado en la mesa de trabajo realizada el día 30 de mayo de 2024, verificando que estos cumplan para su remisión a la entidad.

Ambientales:
- Se espera continuar con la participación de los componentes forestal, ambiental y fauna, en los comités integrales que se adelantan semanalmente.
- Se espera conocer desde el IDU información relacionada con el avance del trámite del permiso silvicultural requerido para el inicio de las actividades constructivas.
- Una vez conocidas las observaciones por parte del IDU a los documentos del PIN ambiental, se remitirá al Contratista para su atención expedita.

Sociales:
- El 6 de junio de 2024 se asistirá al Comité Social semanal N.º 16 con el acompañamiento del área social del IDU, Contratista e Interventoría. Así mismo, será el empalme con nueva Supervisora Social del IDU.
- Se hará seguimiento a las actividades de realización de actas de vecindad en el AID del proyecto.
- Atención de observaciones a documento PAI social de Interventoría con referencia a comunicación IDU 202433600709241 del 28 de mayo .
- Se hará seguimiento a la respuesta por parte del Contratista PQRS N.º 1 y N.º 2.
- Revisión y aprobaciones de información Sistema Bachué (modulo PQRSD).
- Se dará respuesta a los comunicados obligaciones sociales Contrato 1771-2023 Plan de Diálogo.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** **de Ejecución del Subsistema Vial**

SEMANA N. 17 **DEL** 28/05/2024 **AL** 3/06/2024 **ETAPA / FASE ACTUAL DEL CONTRATO** **Etapa de Preliminares**

CONTRATO No **IDU-1777-2023**
(Número de Contrato)

SST:
- Se dará respuesta al comunicado OGA 202417500726461, allegando a la Interventoría el 30 de mayo de 2024 con Envío Respuesta Al Radicado Número 202452600889122 Informe MEV 3 Versión 1 - Interventoría. 1777 2023.
- Se dará respuesta al comunicado OGA 202417500675851, allegando a la Interventoría el 30 de mayo de 2024, por medio del cual el IDU remiten las observaciones al informe mensual SST No. 1 versión 1 del periodo comprendido entre el 6 al 29 de febrero de 2024 mediante el APLICATIVO SST con código Zipa INF-SST-564.
- Se dará respuesta al comunicado BEL-AFM-ADM-0319-24, allegando a la Interventoría el 31 de mayo de 2024 con asunto Respuesta oficio No. C.2304/FM0291/24/5. Compensación porcentaje (%) de Dedicación Residente SST.
- Se atenderá el comunicado BEL-AFM-ADM-272-24, allegando a la Interventoría el 28 de mayo de 2024 con asunto respuesta comunicado C.2304/FM0186/24/5.6 observaciones equipo mínimo, en el cual citan el Apéndice E Componente Ambiental, Forestal, Fauna Silvestre, MEV y SST e informan que con cinco (5) días de anterioridad al ingreso de la obra remitirán la documentación faltante de la maquinaria.

RELACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS EN LA SEMANA

ENSAYO REALIZADO	FRENTE / UBICACION	CANTIDAD	OBSERVACION
			A la fecha de corte no se han realizado ensayos de laboratorio.

Nota: los resultados de ensayos de laboratorio y su cumplimiento deberán relacionarse y presentarse en el informe mensual de interventoría del respectivo periodo

4. PRECIOS NO PREVISTOS EN TRAMITE

ITEMS IDENTIFICADOS	DESCRIPCION	RESPOSABLE ACTUAL	AFECTA CRONOGRAMA	OBSERVACION
				A la fecha de corte no se ha gestionado precios No Previstos. Se evalúa la posibilidad de gestionar un eventual ítem NP por concepto de la tecnología Time lapse

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

DESCRIPCION RIESGOS MATERIALIZADOS EN EL CONTRATO	FECHA DE OCURRENCIA	TRATAMIENTO REALIZADO
-	-	A la fecha de corte no se han materializado riesgos en el contrato.

RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR A FUTURO EN EL CONTRATO DE OBRA CON ALTA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
En la fase de preliminares se pueden presentar demoras en el cierre de trámites de licencias, permisos, aprobaciones y autorizaciones que se requieran para terminar procesos propios de la etapa. Las entidades encargadas de otorgar los permisos no dan trámite con la oportunidad que espera el contratista.
En desarrollo de la fase de ejecución se espera la interacción con contratos de este o de otros proyectos del IDU que también intervienen en la misma zona de construcción de la obra.
En desarrollo de la fase de ejecución se espera interacción con contratos no relacionados con el IDU (empresas de servicios públicos, empresas de telecomunicaciones, entre otros) que también intervienen en la misma zona de construcción de la obra.
Hallazgos arqueológicos que se presenten durante el desarrollo de las actividades de prospección, excavaciones y demás labores propias de las obras civiles, que excedan mas allá de lo previsto inicialmente por la entidad y supere lo regulado en el contrato.
El contratista ocasiona o genera dentro de sus actuaciones u omisiones, extensiones de las labores de interventoría
Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños, pérdida o robo de bienes, elementos y equipos propios del Contratista destinados a la ejecución del Contrato por acaecimiento de actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas, y en general por eventos de fuerza mayor asegurables.
Daño, pérdida o afectación de redes de servicios públicos, de redes de telecomunicaciones, bienes o infraestructura del IDU o de terceros, debido a causas atribuibles al contratista.
Escasez en el mercado de materiales, insumos, equipos, herramientas, y/o proveedores de bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato.
No contar o insuficiencia en el flujo de caja del Contratista, que permita garantizar la ejecución de los trabajos, obras y en general todas las actividades necesarias para el adecuado desarrollo del contrato, derivado de fallas en la planeación financiera del proyecto.
Adelantar por parte del contratista, el refuerzo, soporte, contenciones, consolidaciones, anclajes y demás actividades necesarias para el manejo de la inestabilidad geológica, geotécnica e hidrogeológica de los lugares donde se ejecutará el Proyecto y su zona de influencia, de tal forma que se garantice la estabilidad a las Obras.
Se presenta variación en los precios o valores de materiales, insumos, elementos o cualquier componente que haga parte del precio, costo o gasto, de los ítems que serán pagados por precios unitarios, por encima de lo establecido en la forma de pago y sus fórmulas de ajuste. Cambian las condiciones macroeconómicas y de mercado (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas, salario mínimo, etc.).
Insuficiencia, errores u omisiones en las cuentas y presupuestos que debe realizar el contratista desde el momento mismo en que presenta su oferta. Ineficiencia en la gestión de tiempos y costos durante la ejecución del proyecto. Cambios en factores económicos por la dinámica de mercados y en el sector de la construcción.
Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de terceros. Derivada de deformación de edificaciones circundantes e infraestructura vial u otras estructuras cercanas existentes, daños a otros bienes, muerte o lesiones de personas, por accidentes o eventos que ocurran en los predios de la obra, en propiedades adyacentes, o en desarrollo de las actividades de la obra.
Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de empleados del contratista o subcontratistas. Derivada de daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes de trabajo o eventos que ocurran en los predios de la obra, en propiedades adyacentes, o en desarrollo de las actividades de la obra.
Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas por incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato.
Durante el plazo del contrato se podrían presentar acciones judiciales o de oposición al proyecto. Debido a que grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso, quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, o la comunidad realiza acciones de hecho, a pesar de la debida diligencia del contratista de obra y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden.
En los sitios en donde se ejecutan la obras, se pueden presentar manifestaciones o protesta social, quebrantando el orden público y realizando actos vandálicos o acciones tipificadas en la legislación penal.
Durante la ejecución del contrato se pueden presentar cambios de regulación, parámetros técnicos de operación, entre otros y/o normatividad técnica que afecten el proyecto, a excepción del componente electromecánico.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** **de Ejecución del Subsistema Vial**

SEMANA N. 17 **DEL** 28/05/2024 **AL** 3/06/2024 **ETAPA / FASE ACTUAL DEL CONTRATO** **Etapa de Preliminares**

CONTRATO No **IDU-1777-2023**
(Número de Contrato)

Durante la ejecución del contrato se pueden presentar cambios de regulación de carácter ambiental, de seguridad social en el trabajo, urbanísticos, entre otros.
Durante el plazo del contrato se pueden presentar cambios de la normatividad tributaria.

RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR A FUTURO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON ALTA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Cambios en el flujo de caja del contrato de Interventoría, derivado de atrasos en el contrato de obra. Causando variación de las dedicaciones mínimas establecidas en el contrato, ya sean valles o picos en distintos momentos del plazo contractual.
En desarrollo de la fase de ejecución se espera la interacción y armonización con contratos de este o de otros proyectos del IDU que también intervienen en la misma zona de construcción de la obra.
En desarrollo de la fase de ejecución se identifica que otros contratistas o proyectos del IDU también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o normal ejecución de las obras.
Que el Contratista de Obra, no ejecute o ejecute parcialmente las metas físicas o presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de los siguientes aspectos: terminación anticipada del contrato, reducción de la meta física, abandono de obra, caducidad.
Durante la fase de preliminares se requiere de una prórroga al contrato, no imputable al Interventor, en consecuencia hace necesario realizar labores propias de la Interventoría durante el tiempo de la Prórroga.
Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Debido a daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes generados en las labores de Interventoría en campo principalmente.
Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del Interventor o subcontratistas. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo
Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del Interventor o subcontratistas. Por el no pago de obligaciones laborales del interventor o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido.
Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños o pérdida de bienes, elementos y equipos propios del interventor destinados a la ejecución del Contrato, por acaecimiento de actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas, y en general por eventos de fuerza mayor asegurables.
En los sitios en donde se ejecutan la obras, se pueden presentar manifestaciones o protesta social, quebrantando el orden público y realizando actos vandálicos o acciones tipificadas en la legislación penal
Se presentan acciones judiciales o de oposición al proyecto, que impiden el inicio de las actividades o determina la suspensión de actividades. Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del Proyecto, o la comunidad realiza acciones de hecho, a pesar de la debida diligencia del contratista de obra y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden.

NOTA: En los comités de seguimiento la Interventoría le ha manifestado al Contratista la preocupación que tiene con los atrasos que se podrían presentar en la Etapa de Preliminares, los cuales pueden incidir en la gestión en los trámites de licencias, permisos, aprobaciones y autorizaciones que se requieran, además de lo relacionado al tema de estudios y diseños. Así mismo, la Interventoría en los diferentes comités de seguimiento semanal efectuados, ha expresado a la supervisión del IDU los atrasos que presenta el Contratista, por lo cual, en el comité de seguimiento semanal N.º 16 se reiteró al Contratista que es importante la suscripción de la solicitud de prórroga.
Por otra parte, se recalcó que no se ha tenido respuesta a los oficios remitidos de la Interventoría con motivo del atraso reportado en los Informes semanales de las últimas semanas.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Comité semanal N.º 16 29-05-2024




Foto 2. Acompañamiento Realización Actas de Vecindad de Inicio y Visita Punto IDU 31-may-24





Nota: anexo al formato se presenta archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría V10.0, en Bogotá, D.C., a los

Cuatro (Día en letras) (4) (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) DIEGO FAUSTO VANEGAS BERNAL
Director de Interventoría.
RESTREPO Y URIBE S.A.S

ANEXO SOCIAL

RESTREPO Y URIBE S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES	"CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"	idu

INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA No 17 DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2024

	ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE LA ETAPA DE PRELIMINARES- AREA SOCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2024
1	**Talento Humano para el Proyecto**			
1.1	Cumplimiento de Personal Contractual- Talento Humano para el Diálogo Ciudadano y la Comunicación Estratégica	lación de la plataforma SIAC donde la contratada es relacionada	Con comunicación C.2304/FM0025/24/5.1 Rad. IDU 202452600406112 del 26/02/2024 se realizó entrega de las Hojas de Vida del Componente Social para aceptación por parte de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía-ORSC del IDU. El Contratista remitió a Interventoría notificación del cambio del Guía Cívico Sr. Alexander Rodríguez por Sra. Ivanne Sofía Gutiérrez, comunicación a la fecha dentro de los tiempos para revisión de Interventoría. La Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía del IDU con oficio 202433600477111 del 27/03/2024 emitió aval a las hojas de vida de los profesionales sociales del Contrato IDU-1771- 2023 (Dayana Carolina López Núñez, Daniela Ciprian Casallas, Cyndy Carolina Tobos Rodríguez y Durguy Julieth Sierra Aguilar). Con comunicación C.2304/FM0114/24/5.6 del 4/04/2024 se realizó la aprobación de la hoja de vida del guía cívico en atención a cambio solicitado por el Contratista. Interventoría con comunicación C.2304/FM0127/24/5.6 del 9/04/2024 remitió a la ORSC del IDU la hoja de vida cambio Guía Cívico. El IDU con oficio 202433600646331 del 16/05/2024 referido la no aprobación de la Guía Cívico al citar "La profesional aparece vinculada con el contrato IDU-1668 2022 en ejecución, con una dedicación del 100%" Interventoría con comunicación C.2304/FM0271/24/5.6 del 22/05/2024 remitió al IDU respuesta a observaciones Hoja de Vida Guía Cívico memorando ORSC 202418500150263 del 10/05/2024. El 29/05/2024 ante la respuesta del Contratista al rechazo de Interventoría en el sistema Bachué ítem Generación de Empleo del ID N.º 46241, se remitió en el sistema una nueva solicitud de verificación de información en la que se anexa la respuesta al derecho de petición interpuesto por la Guía Cívico ante el IDU.	N/A
2	**Análisis de Antecedentes**			
2.1	Efectuar el análisis de información primaria y secundaria existente, así como contemplar los estudios realizados por el IDU para el proyecto, mediante cualquier otro contrato del que se tenga conocimiento y armonizar los productos que se requieran.	El Contratista dio cumplimiento con la entrega del documento de análisis de antecedentes mediante comunicado BEL-AFM-ADM-047-24 del 6/03/2024. El Contratista el 27/03/2024 mediante comunicado BEL-AFM-ADM-102-24 radicó ante la Interventoría las observaciones al informe de análisis de antecedentes. El Contratista el 15/04/2024 radicó mediante comunicado BEL-AFM-ADM-154-24 respuesta a oficio C.2304/FM0126/24/5.6 ante la Interventoría las observaciones al informe de análisis de antecedentes.	La Interventoría emitió observaciones al documento que comprende el análisis de información primaria y secundaria existente, así como contemplar los estudios realizados por el IDU para el proyecto, con comunicado C.2304/FM0072/24/5.6 del 19/03/2024. La Interventoría remitió observaciones al Contratista con comunicado C.2304/FM0126/24/5.6 del 9/04/2024 relacionadas con antecedentes del proyecto. Con comunicación C.2304/FM0168/24/5.6 del 19/04/2024, la Interventoría emitió la aprobación Informe Análisis de Antecedentes V2. El 2/05/2024 se remitió al IDU comunicado C.2304/FM0202/24/5.6 para concepto y/o aceptación del IDU, concepto de aprobación Informe Análisis de Antecedentes.	Seguimiento respuesta del IDU a documento concepto de aprobación Análisis de Antecedentes
2.2	Realizar un informe que describa los contenidos encontrados, y cómo estos se incorporan, actualizan, para construir los documentos y acciones necesarias, establecidas en el Apéndice.			
3	**Alistamiento del componente social en la fase de preliminares**			
3.1	Realizar mesas de diálogo con grupos de interés, líderes y/o ciudadanos entre otros	El 6/05/2024 el Contratista con comunicado BEL-AFM-ADM-214-24 radicó a Interventoría el informe de mesas de diálogo. El 30/04/2024 el Contratista realizó el envió de volantes con las respectivas observaciones atendidas, estas fueron reenviadas por la Interventoría a volantes IDU, quienes aprobaron y no remitieron observaciones a volantes de invitación a mesas de diálogo. por lo cual para el 2/05/2024 se da inicio por parte del Contratista del proceso de convocatoria a las mesas de diálogo virtuales. El 10/05/2024 la Interventoría reenvío correo del equipo de formación y cultura ciudadana de la ORSC con relación Mesas de Diálogo Contrato 1771-2023- CL 45 y su recomendación: "Amablemente se aprueba dejando como observación enviar las metodologías con anticipación para tener el tiempo de revisarlas, enviar observaciones, subsanar los ajustes y finalmente que sean aprobadas". El 10/05/2024 se realizaron las dos (2) mesas de diálogo destinadas al sector comercio y sector comunitario y social. Las cuales se desarrollaron de manera virtual y se obtuvo la asistencia esperada de ambos sectores. El Contratista con comunicación BEL-AFM-ADM-296-24 del 28 de mayo remitió respuesta a comunicado C.2304/FM0284/24/5.6 informe mesas de diálogo. Con comunicación BEL-AFM-ADM-299-24 del 29 de mayo, el Contratista realizó radicación informe estrategia mesas de diálogo ciudadano.	El 2/05/2024, se remitió observaciones por parte de la Interventoría con relación a la presentación mesas de diálogo, las cuales fueron atendidas por el Contratista y remitidas el 3/05/2024 vía correo electrónico. . Interventoría el 9/05/2024 realizó pronunciamiento de aprobación de presentación de mesas de diálogo, así mismo, se realizaron recomendaciones de Interventoría para la ejecución de las mesas de diálogo modalidad virtual. El 24/05/2024 mediante oficio C.2304/FM0284/24/5.6 se remiten a Contratista observaciones al informe mesas de diálogo y el 24/05/2024 se realizó el rechazo de información subida por el Contratista al no contar con la firma de aprobación por parte de Interventoría.	Durante la semana Interventoría realizara verificación a comunicaciones BEL-AFM-ADM-296-24 del 28/05/2024 y BEL-AFM-ADM-299-24 del 29/05/2024.
3.2	Entrega producto un documento que consolide los resultados, como también las actas y los diferentes soportes de dichos encuentros			
3.3	Entrega metodología para mesas de diálogo debidamente aprobada por la Interventoría.	El Contratista emitió respuesta a las observaciones realizadas a la metodología para mesas de diálogo con comunicación BEL-AFM-ADM-044-24 del 12/03/2024. El 6/05/2024 se realizó mesa de trabajo con oficina de comunicaciones IDU, Interventoría y profesionales sociales IDU, con el fin de aclarar dudas por parte del contratista a la estrategia de mejora y observaciones a la metodología mesas de diálogo las cuales fueron aclaradas.	La Interventoría con comunicación C.2304/FM0065/24/5.6 del 15/03/2024, realizó la aprobación a la Metodología de Mesas de Diálogo con Grupos de Interés. La Interventoría remitió al IDU comunicación C.2304/FM0113/24/5.6 Rad. IDU 202452600640682 del 4/04/2024 Remisión Documentos Aprobados por Interventoría Componente Social Etapa de Preliminares, entre estos metodología mesas de diálogo. El 22/04/2024 el IDU remitió a Interventoría observaciones al documento de metodología de mesas de diálogo. El 6/05/2024 se realizó con el IDU, Contratista e Interventoría mesa de trabajo relacionada con la metodología de mesas de diálogo y se remitió propuesta ajustada y nueva metodología para reuniones del 10/05/2024 de los corrientes, obteniendo para esta misma fecha concepto favorable por parte del Grupo de Formación del IDU.	
4	Apoyar el desarrollo de acciones que el IDU planee y/o concerté con actores interesados en el proyecto y que considere necesarias, para fortalecer el diálogo ciudadano y la comunicación estratégica durante esta etapa.	A la fecha no han existido requerimientos por parte de la Entidad.		N/A

INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA No 17 DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2024

	ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE LA ETAPA DE PRELIMINARES- AREA SOCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2024
5	Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	El Contratista dio cumplimiento con la entrega del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicaciones Estratégicas mediante comunicado BEL-AFM-ADM-047-24 del 6/03/2024. Se emitió atención de observaciones con comunicado BEL-AFM-ADM-110-24 del 1/04/2024. El 15/04/2024 el Contratista mediante oficio BEL-AFM-ADM-163-24 dio respuesta a comunicado C.2304FM0131245.6 Plan de Diálogo Ciudadano. El 30/04/2024 el Contratista radico mediante oficio BEL-AFM-ADM-209-24 Respuesta a comunicado C.2304FM0131245.6 Observaciones Plan de Diálogo Ciudadano. El Contratista con comunicado BEL-AFM-ADM-308-24 del 30/05/2024 remitió respuesta a la Atención observaciones oficio IDU 202418500158843 Plan de Diálogo Ciudadano.	Interventoría con comunicación C.2304/FM0131/24/5.6 del 9/04/2024 remitió observaciones al Contratista del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicaciones Estratégicas. Para la semana Interventoría realizó revisión de comunicado de atención de observaciones Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicaciones Estratégicas y se remitió concepto al Contratista con comunicado C.2304/FM0174/24/5.6 del 23/04/2024. Así mismo, el 26 de abril de 2024 se realizó mesa de trabajo entre el Contratista e Interventoría para atender observaciones del documento. Se realizó una mesa de trabajo entre el Contratista e Interventoría el 30/04/2024 relacionada con el Plan de Diálogo Ciudadano. Interventoría con comunicado C.2304/FM0206/24/5.6 del 3/052024 realizó Aprobación Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica V.3. El 7/05/2024 se remitió por parte de Interventoría comunicado C.2304/FM0226/24/5.6 Rad. IDU 202452600832462 para concepto y/o aceptación del IDU del Plan de Diálogo y Comunicación Estratégica V3 Aprobado por Interventoría. El 22/05/2024 se realizó mesa de trabajo con Profesional Social de la ORSC del IDU para verificación de observaciones tanto del Plan de Diálogo Ciudadano y PAI social de Interventoría. El IDU con comunicado 202418500158843 del 28/05/2024 remitió observaciones a documento PAI de Interventoría.	Para la semana se realizara verificación de comunicado BEL-AFM-ADM-308-24 del 30/05/2024 y se dará respuesta a comunicado IDU 202418500158843 del 28/05/2024.
6	Actualización Mapa de Actores	El 8/04/2024, se realizó radicación de documento con matriz mapa de actores dando cumplimiento así a lo establecido en el apéndice mediante oficio BEL-AFM-ADM-126-24. El 22/042024, el Contratista emitió respuesta a observaciones dadas por la Interventoría a matriz mapa de actores mediante oficio BEL-AFM-ADM-183-24.	Con comunicación C.2304/FM0153/24/5.6 del 17/042024, se emitieron observaciones al Mapa de Actores elaborado por el Contratista. Con comunicación BEL-AFM-ADM-191-24 del 29/042024 se emitió al Contratista aprobación del mapa de actores sociales. El 3/05/2024 se remitió al IDU comunicado C.2304/FM0215/24/5.6 para concepto y/o aceptación del IDU de Mapa de Actores.	Seguimiento respuesta del IDU a documento concepto de aprobación de Interventoría Mapa de Actores.
7	Inventario de Predios (incluye recorridos de campo)	El 8/04/2024 se realizó radicación a la matriz inventario de predios dando cumplimiento así a lo establecido en el apéndice mediante oficio BEL-AFM-ADM-125-24 El 22/04/2024, el Contratista emitió respuesta a observaciones dadas por la interventoría a la matriz inventario de predios mediante oficio BEL-AFM-ADM-184-24	Con comunicación C.2304/FM0154/24/5.6 del 17/04/2024, se emitieron observaciones al Inventario de Predios elaborado por el Contratista. Con comunicación BEL-AFM-ADM-192-24 del 29/042024 se emitió al Contratista la aprobación del inventario de predios. El 3/05/2024 se remitió al IDU comunicado C.2304/FM0203/24/5.6 para concepto y/o aceptación del IDU de Inventario de Predios.	Seguimiento respuesta del IDU a documento concepto de aprobación de Interventoría a Inventario de Predios.
8	Metodología y Cronograma para la elaboración de las Actas de vecindad	N/A	El 26/04/2024 la Interventoría remitió al IDU comunicación C.2304/FM0188/24/5.6 con la atención de las observaciones del oficio IDU 202433600546841 del 22 de abril de 2024 Metodología y Cronograma para la Elaboración de Actas de Vecindad. El IDU con oficio 202433600676401 Rad.22/05/2024 remitió concepto de "revisado y recibido de acuerdo con lo establecido en el contrato y en el manual de interventoría vigente." Información reenviada al Contratista el 23/05/2024 para conocimiento al ser uno de los requisitos contractuales al tener que contar el documento con aceptación del IDU.	N/A
9	Informe de la fase de Preliminares.	N/A	N/A	N/A
LINEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO				
	PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA			
10	Sistema de Gestión Social IDU (PQRSD)	El 31/05/2024 el Contratista envió a Interventoría proyección de PQRSD N.° 2 solicitud de levantamiento de actas de vecindad por parte de la entidad Metro en los predios del Instituto para la construcción calle 45.	El 27/05/2024 el Contratista remitió a Interventoría proyección de respuesta a peticionario la cual fue verificada y avalada por Interventoría. Así mismo, durante la semana se realizó seguimiento a Atenciones al Ciudadano N.° 1 y N.° 2.	Seguimiento semanal Sistema Bachué inicio desde el 26/03/2024. Así mismo, seguimiento a respuestas Atenciones al Usuario N.° 1 y N.° 2.
11	Sistema Bachué	El 30 de mayo el Contratista cargó en el sistema Bachué información correspondiente a las actualizaciones PSI, piezas de divulgación y se atendieron observaciones de las actas de reunión.	Durante la semana se realizó actualización de toda la información de la gestión social del proyecto relacionada con el aplicativo del Sistema Bachué.	
12	Punto IDU	Durante la semana se evidencia el funcionamiento del Punto IDU conforme a lo establecido en el Contrato. El IDU con comunicación 202433600546851 del 22/04/2024 informó *"que fue revisado y recibido de acuerdo con lo establecido en el contrato y en el apéndice social".*		Seguimiento funcionamiento Punto IDU proyecto 1771-2023.
13	Recorridos Urbanos	N/A	N/A	N/A
14	Atención a Veedurías Ciudadanas	N/A	N/A	N/A
	PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
15	Reuniones de Inicio	N/A	Interventoría se encuentra en seguimiento del avance del proceso de solicitud de prórroga solicitada por el Contratista, aspecto que determinara la fecha para la realización de reunión de inicio del proyecto.	Seguimiento fecha que se establezca para dar inicio a fase constructiva previo trámite de prórroga
15.1	Volante de inicio (Los volantes se entregarán predio a predio a residentes, comerciantes y población en general del área de influencia directa)	El Contratista cita se recibe correo "Precisiones socialización volante de inicio Contrato 1771-2023" en la que la interventoría recomienda no realizar la socialización de este ya que no se cuenta con la fecha de inicio de etapa constructiva"		
16	Reuniones Extraordinarias	N/A	N/A	N/A
17	Mesas de diálogo con el sector comercial y/o empresarial	N/A	N/A	N/A
18	Gestiones relacionadas con conformación del Comité IDU de Diálogo Ciudadano	N/A	N/A	N/A
	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS			
19	Actividades de protección para inmuebles y población aledaña a demoliciones	N/A	N/A	N/A

INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA No 17 DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2024

	ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE LA ETAPA DE PRELIMINARES- AREA SOCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2024
20	Actas de Vecindad	Para la semana el Contratista reporta las siguientes actividades relacionadas con la ejecución de actas de vecindad de inicio: Durante la presente semana, se realizaron actividades de levantamiento de actas del edificio Cataluña 78 y un local ubicado en el edificio Tauros7, nos permitimos aclarar que en el Edificio Tauros pese a las diferentes socializaciones no se permitió el ingreso a las zonas de apartamentos ya que los arrendatarios no cuentan con disponibilidad e interés en dicho levantamiento, es así como las profesionales del equipo social del Contratista informó líder del edificio el 28/05/2024 que ya se cumplían los tiempos a dicha programación de actas de vecindad, por lo cual, se dejó aclaración que no por ello la comunidad puede solicitar estas actividades antes de iniciar la etapa de obra. Así mismo, el 31/05/2024 se realizó entrega de copia de actas de vecindad aprobadas por la interventoría a la comunidad para un total de 12 actas.	El Contratista con comunicado BEL-AFM-ADM-290-24 del 27 de mayo de 2024 realizó la radicación a Interventoría de 54 actas de vecindad de inicio y remitió la atención de observaciones de 10 actas de vecindad, información a la fecha en revisión de Interventoría. En el Comité semanal N.° 15 se reportan los siguientes datos de avance de la elaboración de las actas de vecindad, se informa por parte del Contratista la realización de 130 actas, de las cuales han sido radicadas a Interventoría 74, aprobadas 115 y 8 de atendieron observaciones, para un total de 123 actas de vecindad de inicio aprobadas al 31/052024. El 30/05/2024, con comunicación C.2304/FM0306/24/5.6 de asunto Aprobación N.° 5 Actas de Vecindad de Inicio, contando con la suscripción de 51 actas y 8 de atención de observaciones. El 29/05/2024, con comunicación C.2304/FM0293/24/5.6 se emitió concepto Actas de Vecindad de Inicio-Lista de Chequeo por cambio de etapa.	Seguimiento proceso de realización actas de vecindad de inicio.
21	Actas de rampas y acceso vehicular a predios (garajes)	El 28/05/2024 el Contratista realizó atención a observaciones por parte de volantes IDU a la plantilla del volante N.° 10 levantamiento actas de rampa.	Durante la semana, se realizó trámite para aprobación de volante N.° 10 relacionado con actas de rampas.	Seguimiento trámite aprobación de volante para realización de actas de rampas. Remisión arte volante a volantes IDU el 4/06/2024.
22	Información de suspensión de acceso a garajes	N/A	N/A	N/A
23	Actas de Compromiso	N/A	N/A	N/A
24	Registro Fílmico de andenes, fachadas y vías	N/A	N/A	N/A
25	Actas de adecuación de bajantes de aguas lluvias	N/A	N/A	N/A
	PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA			
26	Acciones de formación con la ciudadanía en general	N/A	N/A	N/A
27	Acciones de formación a empleados de obra	N/A	N/A	N/A
28	Talleres con actores del Sector Educativo	N/A	N/A	N/A
	PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD			
29	Gestión y articulación interinstitucional	N/A	N/A	N/A
30	Contratación del 13,8% de mujeres parte del personal del Proyecto	A la entrega del reporte semanal N.° 17 del Contratista, se presenta la contratación de 19 personas de las que corresponden a 12 mujeres para un porcentaje del 63.1% de contratación de mujeres para el proyecto.	Se reporta una contratación de 19 personas que corresponde a 12 mujeres para un indicador del 63.1%	La información se reportará en informe mensual N.° 4 con respectivo certificado de representante legal y revisor fiscal.
31	Gestiones proceso de convocatoria previo a fase ejecución para contratación población LGTBIQ+	N/A	N/A	N/A
32	Gestiones proceso de convocatoria previo a fase ejecución, para contratación del 5% población vulnerable MONC	N/A	N/A	N/A
33	Gestiones proceso de convocatoria previo a fase ejecución, para contratación del 2% población MONC victimas del conflicto armado	N/A	N/A	N/A
34	Gestiones proceso de convocatoria previo a fase ejecución, para contratación del 20% población MONC de la localidad	N/A	N/A	N/A
	PROGRAMA DE MANEJO AL PAISAJE URBANO			
35	Metodología Programa de Manejo del Paisaje Urbano (Acciones con Predios Culatas y Remanentes)	N/A	N/A	N/A
36	Acciones con Predios Culatas	N/A	N/A	N/A
37	Acciones con Predios Remanentes	N/A	N/A	N/A
LINEA ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA				
	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO			
38	Plan Estratégico de Comunicaciones	El 30/04/2024 la profesional social de comunicaciones del IDU mediante correo electrónico cito "no se generan comentarios, ajustaron muy bien el documento". Adicionalmente, el IDU con oficio 20243360059882l del 6/052024 solicitó la radicación del documento con la atención de las observaciones. EL 8/05/2024, se remitió al IDU comunicación C.2304/FM0231/24/5.6 Rad. IDU 202452600842132 Atención de Observaciones Documento Aprobado Plan Estratégico de Comunicaciones V.2		Seguimiento respuesta del IDU a comunicación Rad. IDU 202452600842132 del 8/05/2024.
	PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO			
39	Puntos satélites de Información-PSI	No se presenta información por parte del Contratista	Seguimiento actualización PSI	
40	Vallas Informativas	El Contratista para la semana cita "este trámite se encuentra bajo la responsabilidad del IDU para la radicación ante la Secretaria Distrital de Ambiente.	Interventoría el 9/04/2024 remitió a volantes IDU formato FO-CO-02 de solicitud de	Proceso de divulgación de piezas de información del proyecto.

INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA No 17 DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2024

	ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE LA ETAPA DE PRELIMINARES- AREA SOCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2024
41	Volantes y afiches de información	El 26/03/2024, la oficina de comunicaciones IDU dio aprobación a los volantes N.° 1,2,3 y 4 con relación a invitación mesas de diálogo ciudadano y estos fueron socializados de manera presencial y virtual por el Contratista el 27/032024; así como también actualización en PSI. El 27/03/2024, la oficina de comunicaciones dio aprobación a los volantes levantamiento actas de vecindad N°5,6 y 7 y el Contratista inició socialización el 1 de abril de 2024 así como su respectiva actualización en PSI. El 5/04/2024 el Contratista realizó atención a observaciones dadas por la profesional social de interventoría al formato FO-CO-02 de solicitud de piezas divulgativas donde se encuentra incluidos los afiches de información. El 25/04/2024 la Alcaldía Local de Chapinero aprobó mediante su oficio 20245230189771 la localización de la valla fija donde se propuso inicialmente por el contratista. Así mismo, el contratista envió mediante el respectivo componente ambiental oficio BEL-AFM-ADM- 195-24 a la secretaría de ambiente para aprobación instalación valla fija.	material de divulgación contractual con los insumos para producción de piezas, para la misma fecha la oficina de comunicaciones del IDU requiere él envió de registro fotográfico de la zona, por lo cual se solicitó información al Contratista. El 10/04/2024 se remitió registro fotográfico de la zona a la oficina de comunicaciones del IDU quienes emitieron de respuesta refiriendo "recibimos su solicitud para volante, valla fija y móvil y afiche de inicio. Una vez estén diseñadas las piezas, y aprobadas por las respectivas coordinaciones técnica y social, les enviaremos artes con las especificaciones, por este medio". El 15/04/2024 el área de comunicaciones del IDU aprobó material de piezas de divulgación entre estas valla fija y móviles. Desde el área ambiental de Interventoría se realizó radicación al IDU de comunicado C.2304/FM0201/24/5.6 del 2/052024 con información para el registro ante la Secretaria de Ambiente. El área ambiental del Contratista se encuentra atendiendo las observaciones realizadas por el IDU a formato de solicitud de valla fija. Interventoría con comunicación C.2304/FM0278/24/5.6 del 22/05/2024 remitió al IDU documentos ajustados de registro valla fija para continuar con trámite ambiental. Interventoría con comunicación C.2304/FM0300/24/5.6 del 29 de mayo se emitió concepto de Lista de chequeo Valla Informativa Fija	Seguimiento procedimiento para instalación de valla fija.
42	Divulgación del Plan de Manejo de Tránsito-PMT	N/A	N/A	N/A
43	Productos comunicacionales para divulgación del PMT	N/A	N/A	N/A
44	Volantes de información PMT, señalización y desvíos	N/A	N/A	N/A
45	Polisombras (caso de existir solicitud del IDU)	N/A	N/A	N/A
	LINEA ESTRATÉGICA:MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTOS			
46	Actividades relacionadas con solicitudes de la Entidad para mediciones de percepción ciudadana.	N/A	N/A	N/A
	REPORTES SEMANALES Y MENSUALES			
47	Comité de Seguimiento Social	El 30/05/2024, se realizó el Comité Social Semanal N.° 15, el cual contó con la participación de profesionales de talento humano establecidos por parte del Contratista para la ejecución del componente de diálogo ciudadano y comunicación estratégica , profesional social del IDU y profesional de Interventoría.		Se efectuara Comité Social Semanal N.° 16 el 06/06/2024.
48	Calificación Mensual	N/A	Para la semana Interventoría se encuentra en la elaboración de la lista de chequeo del mes, dado que fue necesario la realización de reunión técnica el 22/05/2024 para aclaraciones relacionadas con trazabilidad de valla fija y análisis de caso Guía Cívico en Comité Social del 30/05/2024.	Interventoría remitirá índices sociales de cumplimiento.
49	Comité Integral	El 29/05/2024 se realizó participación en el Comité integral del proyecto el cual contó con la participación del IDU, Contratista e Interventoría.		A la fecha no se ha determinado nuevo comité integral.
50	Informe Semanal	El 04/06/2024 el Contratista remitió informe semanal N.° 17 del 28 de mayo al 3 de junio de 2024.	Informe semanal del Contratista es un insumo para elaboración informe de Interventoría	Próximo informe semanal corresponde del 4 al 10 de junio al de 2024.
51	Informe Mensual	El 5/04/2024 mediante oficio BEL-AFM-ADM-118-24 el Contratista radicó informe social mensual preliminar periodo Marzo de 2024 El Contratista atendió las observaciones al informe mensual N.°2, mediante oficio BEL-AFM-ADM-169-24 del 17/042024. El Contratista con comunicado BEL-AFM-ADM-215-24 del 6/05/2024 radicó a Interventoría informe social mensual N.° 3 que corresponde al periodo del 1 al 30 de abril de 2024. El Contratista el 15/05/2024 mediante oficio BEL-AFM-ADM-243-24 radicó a Interventoría observaciones a informe mensual N.° 3.	El Contratista remitió la atención de observaciones a informe mensual N.° 1 del 6 al 29 de febrero de 2024, la Interventoría realizó verificación del documento y con comunicado C.2304/FM0125/24/5.8 del 8 de abril de 2024 emitió aprobación a documento . La Interventoría remitió observaciones a Informe Social Mensual N.° 2 del periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, vía correo electrónico el 10/04/2024, aspecto que se formalizó con comunicado C.2304/FM0139/24/5.8 del 11/04/2024. Con comunicación C.2304/FM0178/24/5.8 del 23/04/2024 se emitió por parte de Interventoría aprobación Informe Social Mensual N.° 2 – V1. Se emitieron observaciones al documento de Informe mensual social N.° 3 del Contratista del periodo del 1 al 30 de abril de 2024,con comunicación C.2304/FM0236/24/5.8 del 9/05/2024. Durante la semana se realizó Informe Mensual Social de Interventoría N.° 3, el cual fue radicado con comunicación C.2304/FM0255/24/4.3 Rad. IDU 202452600888722 del 16/05/2024. El 23/05/2024 la interventoría radicó comunicación de la aprobación informe social N.° 3 mediante comunicado C.2304/FM0285/24/5.8. Con comunicación C.2304/FM0292/24/5.8 del 29/05/2024 se emitieron al Contratista Observaciones para la elaboración de Informes Sociales Mensuales.	Para la semana se realizara Informe social mensual N.° 4 del periodo del 1 al 31 de mayo de 2024, así mismo, Interventoría dará inicio a elaboración de informe mensual de Interventoría.
	Otras obligaciones establecidas en el Contrato 1771-2023 numeral 10.13. Obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica			
52	Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del Proyecto y remitir la información al Interventor para su revisión y aprobación.	El Contratista con comunicaciones Nos. BEL-AFM-ADM-301-24, BEL-AFM-ADM-302-24 y BEL-AFM-ADM-303-24 emitió respuesta a obligaciones contractuales Contrato 1771-2023 Ítems 10.13.1 - Obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.	Verificados comunicados BEL-AFM-ADM-301-24, BEL-AFM-ADM-302-24 y BEL-AFM-ADM-303-24, el Contratista no remitió informes si no aclaraciones refiriendo otros documentos contractuales.	Durante la semana Interventoría realizará concepto a los comunicados BEL-AFM-ADM-301-24, BEL-AFM-ADM-302-24 y BEL-AFM-ADM-303-24. Ítems 10.13.1 - Obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.
53	Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico socioeconómico y cultural del Proyecto, así como remitir la información al Interventor para su revisión y aprobación.			
54	Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de los mismos, y enviarlos al Interventor.			
	Otras obligaciones establecidas en el Contrato 1777-2023 numeral 10.10 presentación de la Guía para prevención y denuncia de la violencia basada en género			

RESTREPO Y URIBE S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES	"CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"	idu

INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA No 17 DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2024


	ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE LA ETAPA DE PRELIMINARES- AREA SOCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2024
55	Elaborará Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género	El Contratista con comunicado BEL-AFM-ADM-044-24 del 12/03/2024 realizó radicación de la versión 1 de la Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género. El Contratista el 15/04/2024 radicó mediante oficio BEL-AFM-ADM-155-24 respuesta a oficio C.2304/FM0132/24/5.6 ante la interventoría con las respectivas observaciones al documento Guía de Acciones para la Prevención y Denuncia de Violencia Basada en Género que se encontraba con observaciones dadas directamente del instituto de desarrollo urbano IDU. El Contratista remitió con comunicación BEL-AFM-ADM-155-24 atención a observaciones generadas por el IDU a la Guía de Acciones de Género.	El 3/05/2024 el Grupo de Formación del IDU remitió vía correo electrónico respuesta refiriendo "la guía fue revisada y se atendieron las subsanaciones" Interventoría con comunicación C.2304/FM0237/24/5.6 Rad. IDU 202452600851362 del 9/05/2024, remitió al IDU Alcance Remisión Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género V2, documento que a la fecha cuenta con la atención de observaciones del grupo de formación del IDU.	Seguimiento respuesta del IDU a concepto Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género, comunicación C.2304/FM0237/24/5.6 Rad. IDU 202452600851362 del 9/05/2024.
Otras obligaciones establecidas en el Contrato 1777-2023 numeral 7.2 Capitulo2- Especificaciones Técnicas de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica				
56	Recorridos de reconocimiento con el Contratista de Obra	Se realizó el Primer Recorrido de Reconocimiento el 28/02/2024, contando con la participación del área social de la ORSC del IDU, Contratista e Interventoría y el acompañamiento del área técnica del Contratista e Interventoría. Así mismo, Interventoría realizó acta de recorrido que fue enviada vía correo electrónico a los participantes el 29/02/2024.		N/A (no se identifica a la fecha más recorridos de reconocimiento a ejecutar)

RESTREPO Y URIBE S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA	ELABORÓ: LGU	FECHA: 04/06/2024
		REVISÓ: DCV	ARCHIVO:

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO INFORME SEMANAL	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL REPORTE AVANCE DE ACTIVIDADES	**VERSIÓN** 0	

Fecha: Del 28 de mayo al 3 de junio 2024

LOCALIDAD: CHAPINERO	**BARRIO:** CHAPINERO CENTRO	**AREA SOCIAL INTERVENTORÍA**

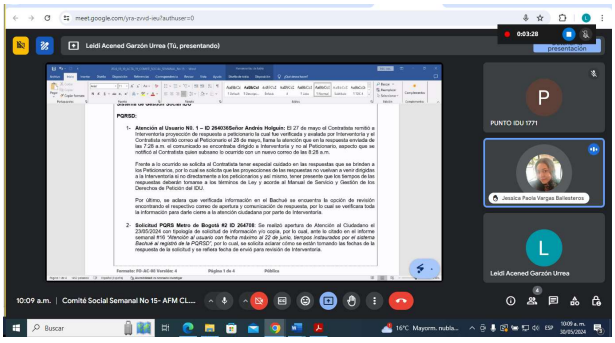

TÍTULO No. 1 : Comité Social Semanal N.º 15 IDU, Contratista e Interventoría 30/05/2024.



TÍTULO No. 2 : Visita Alcaldía Chapinero - verificación Aviso Punto IDU 31/05/2024.



TÍTULO No. 3 : Verificación Punto IDU con el acompañamiento de Profesional Social del IDU 31/05/2024




TÍTULO No. 4 : Acompañamiento actividades de realización de actas de vecindad de inicio 31/05/2024

RESTREPO Y URIBE S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES	**INFORME SEMANAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA**	**ELABORÓ:** LGU	**FECHA:** 04/06/2024
		REVISÓ: DCV	**ARCHIVO:**

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% Ejecutado Físico	% completado decimales	% Ejecutado Físico decimales	% Planeado Financiero
0		**0**	**IDU-1771-2023-FRANCISCOMIRANDA-CSG20240603_REV INTERV**	**415 días**	**mar 6/02/24**	**lun 5/05/25**	44%	36%	**44,26%**	**35,57%**	**4,20%**
1		**1**	**CTO IDU-1771-23 CONSTRUCCIÓN AV. FRANCISCO MIRANDA CLL. 45**	**415 días**	**mar 6/02/24**	**lun 5/05/25**	44%	36%	**44,26%**	**35,57%**	**4,20%**
2		1.1	Acta de Inicio	0 días	mar 6/02/24	mar 6/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
3		**1.2**	**ETAPA DE PRELIMINARES**	**110 días**	**mar 6/02/24**	**mié 5/06/24**	99%	77%	**99,48%**	**76,69%**	**80,00%**
4		*1.2.1*	*INICIO DE ETAPA DE PRELIMINARES*	*0 días*	*mar 6/02/24*	*mar 6/02/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
5		**1.2.2**	**ACTIVIDADES INICIALES**	**38 días**	**mar 6/02/24**	**vie 15/03/24**	100%	98%	**100,00%**	**98,25%**	**100,00%**
6		*1.2.2.1*	*Inicio de actividades iniciales*	*0 días*	*mar 6/02/24*	*mar 6/02/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
7		1.2.2.2	Visita lugar del proyecto	4 días	mar 6/02/24	vie 9/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
8		1.2.2.3	Suscripción acta de visita	4 días	mar 6/02/24	vie 9/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
9		**1.2.2.4**	**Desglose AIU**	**8 días**	**mar 6/02/24**	**mié 14/02/24**	100%	99%	**100,00%**	**98,75%**	**100,00%**
10		1.2.2.4.1	Elaboración y Presentación	2 días	mar 6/02/24	mié 7/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
11		1.2.2.4.2	Revisión interventoría	2 días	mié 7/02/24	vie 9/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
12		1.2.2.4.3	Atención observaciones	2 días	vie 9/02/24	lun 12/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
13		1.2.2.4.4	Aprobación	2 días	lun 12/02/24	mié 14/02/24	100%	95%	100,00%	95,00%	100,00%
14		**1.2.2.5**	**Cronograma PDT preliminares**	**25 días**	**mar 6/02/24**	**sáb 2/03/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
15		1.2.2.5.1	Elaboración y Presentación	4 días	mar 6/02/24	vie 9/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
16		1.2.2.5.2	Revisión interventoría	6 días	sáb 10/02/24	vie 16/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
17		1.2.2.5.3	Atención observaciones	6 días	sáb 17/02/24	vie 23/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
18		1.2.2.5.4	Aprobación	6 días	sáb 24/02/24	sáb 2/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
19		*1.2.2.5.5*	*Aprobación para pago*	*0 días*	*sáb 2/03/24*	*sáb 2/03/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
20		**1.2.2.6**	**Plan de inversión del anticipo etapa de preliminares**	**38 días**	**mar 6/02/24**	**vie 15/03/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
21		1.2.2.6.1	Elaboración y Presentación	12 días	mar 6/02/24	sáb 17/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
22		1.2.2.6.2	Revisión interventoría	13 días	lun 19/02/24	lun 4/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
23		1.2.2.6.3	Atención observaciones	8 días	mar 5/03/24	mié 13/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
24		1.2.2.6.4	Aprobación	3 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
25		**1.2.2.7**	**HOJAS DE VIDA PROFESIONALES**	**26 días**	**mar 6/02/24**	**lun 4/03/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
26		1.2.2.7.1	Elaboración y Presentación	5 días	mar 6/02/24	sáb 10/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
27		1.2.2.7.2	Revisión interventoría	6 días	lun 12/02/24	sáb 17/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
28		1.2.2.7.3	Atención observaciones	6 días	lun 19/02/24	sáb 24/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
29		1.2.2.7.4	Aprobación	6 días	lun 26/02/24	lun 4/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
30		**1.2.2.8**	**APUS ITEMS CONTRACTUALES**	**26 días**	**mar 6/02/24**	**lun 4/03/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
31		1.2.2.8.1	Elaboración y Presentación	5 días	mar 6/02/24	sáb 10/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
32		1.2.2.8.2	Revisión interventoría	6 días	lun 12/02/24	sáb 17/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
33		1.2.2.8.3	Atención observaciones	6 días	lun 19/02/24	sáb 24/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
34		1.2.2.8.4	Aprobación	6 días	lun 26/02/24	lun 4/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
35		**1.2.2.9**	**EQUIPO MINIMO**	**26 días**	**mar 6/02/24**	**lun 4/03/24**	100%	90%	**100,00%**	**89,57%**	**100,00%**
36		1.2.2.9.1	Elaboración y Presentación	5 días	mar 6/02/24	sáb 10/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
37		1.2.2.9.2	Revisión interventoría	6 días	lun 12/02/24	sáb 17/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
38		1.2.2.9.3	Atención observaciones	6 días	lun 19/02/24	sáb 24/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
39		1.2.2.9.4	Aprobación	6 días	lun 26/02/24	lun 4/03/24	100%	60%	100,00%	60,00%	100,00%
40		*1.2.2.10*	*fin actividades iniciales*	*0 días*	*vie 15/03/24*	*vie 15/03/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
41		**1.2.3**	**COMPONENTE AMBIENTAL Y SST**	**101 días**	**mar 6/02/24**	**sáb 25/05/24**	100%	86%	**100,00%**	**86,24%**	**100,00%**
42		*1.2.3.1*	*Inicio componente ambiental y SST*	*0 días*	*mar 6/02/24*	*mar 6/02/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
43		**1.2.3.2**	**Programa de actividades A&SST a desarrollar en la etapa de preconstrucción**	**31 días**	**mar 6/02/24**	**sáb 9/03/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
44		1.2.3.2.1	Elaboración y Presentación	13 días	mar 6/02/24	mar 20/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
45		1.2.3.2.2	Revisión interventoría	5 días	mié 21/02/24	lun 26/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%

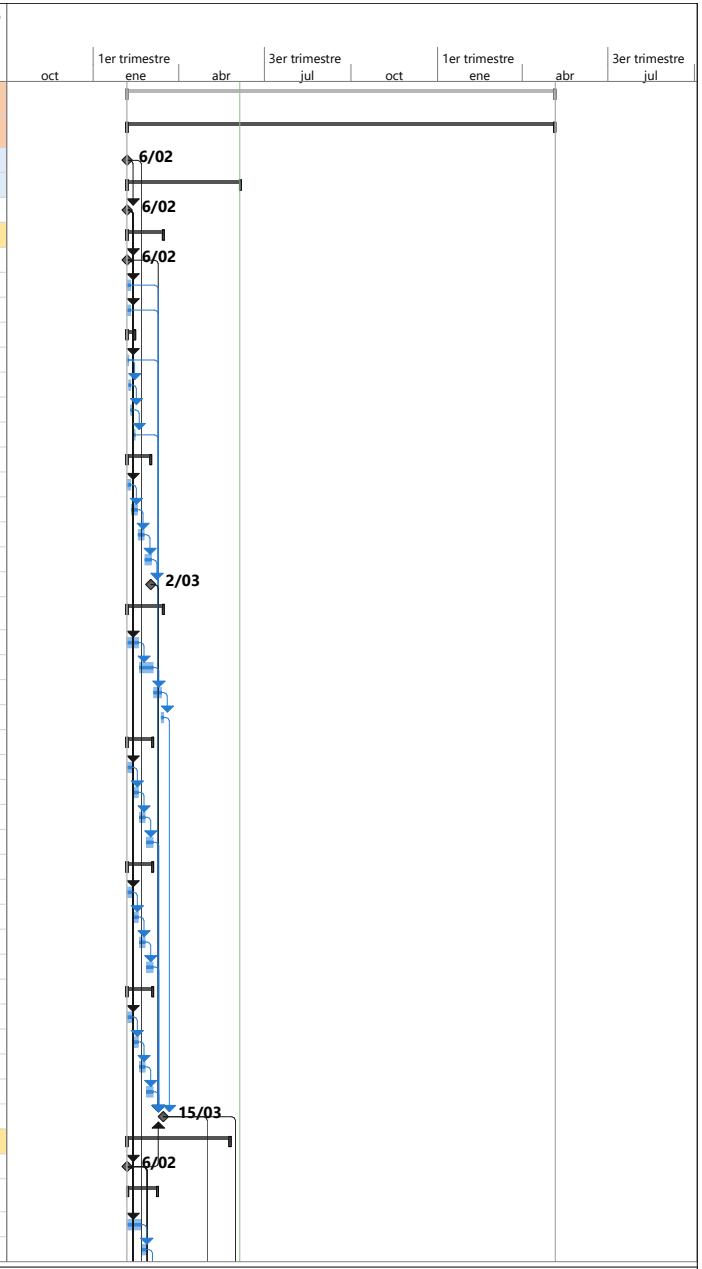

Proyecto: IDU-1771-2023-FRAN
Fecha: mié 5/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% Ejecutado Físico	% completado decimales	% Ejecutado Físico decimales	% Planeado Financiero
46		1.2.3.2.3	Atención observaciones	5 días	mar 27/02/24	lun 4/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
47		1.2.3.2.4	Aprobación	5 días	mar 5/03/24	sáb 9/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
48		**1.2.3.3**	**Inventario del estado estructural e hidráulico de los sumideros y pozos existentes y cuerpos de aguas superficiales presentes**	**31 días**	**mié 7/02/24**	**lun 11/03/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
49		1.2.3.3.1	Elaboración y Presentación	13 días	mié 7/02/24	mié 21/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
50		1.2.3.3.2	Revisión interventoría	5 días	jue 22/02/24	mar 27/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
51		1.2.3.3.3	Atención observaciones	5 días	mié 28/02/24	lun 4/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
52		1.2.3.3.4	Aprobación	5 días	mar 5/03/24	lun 11/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
53		**1.2.3.4**	**Plan de manejo ambiental de obra - MAO**	**61 días**	**mar 27/02/24**	**sáb 4/05/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
54		1.2.3.4.1	Elaboración y Presentación	32 días	mar 27/02/24	jue 4/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
55		1.2.3.4.2	Revisión interventoría	12 días	vie 5/04/24	mié 17/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
56		1.2.3.4.3	Atención observaciones	8 días	jue 18/04/24	vie 26/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
57		1.2.3.4.4	Aprobación	6 días	sáb 27/04/24	sáb 4/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
58		**1.2.3.5**	**Plan de manejo de RCD**	**80 días**	**mar 27/02/24**	**sáb 25/05/24**	100%	86%	**100,00%**	**86,16%**	**100,00%**
59		1.2.3.5.1	Elaboración y Presentación	32 días	mar 27/02/24	jue 4/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
60		1.2.3.5.2	Revisión interventoría	12 días	vie 5/04/24	mié 17/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
61		1.2.3.5.3	Atención observaciones	8 días	jue 18/04/24	vie 26/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
62		1.2.3.5.4	Aprobación	6 días	sáb 27/04/24	sáb 4/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
63		1.2.3.5.5	Aprobación documentos RCD por IDU	10 días	mar 7/05/24	sáb 18/05/24	100%	49%	100,00%	49,00%	100,00%
64		1.2.3.5.6	Obtención del PIN (RCD) por secretaria de ambiente	5 días	mar 21/05/24	sáb 25/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
65		**1.2.3.6**	**Tramite documento tratamiento silviculturales**	**90 días**	**mié 7/02/24**	**jue 16/05/24**	100%	60%	**100,00%**	**60,00%**	**100,00%**
66		1.2.3.6.1	Radicación IDU a secretaría distrital de ambiente	0 días	mié 7/02/24	mié 7/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
67		1.2.3.6.2	Recorrido delgado secretaría distrital de ambiente inventario forestal	60 días	mié 7/02/24	sáb 13/04/24	100%	90%	100,00%	90,00%	100,00%
68		1.2.3.6.3	Aprobación secretaría de ambiente resolución	30 días	sáb 13/04/24	jue 16/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
69		**1.2.3.7**	**Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo**	**81 días**	**lun 26/02/24**	**sáb 25/05/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
70		1.2.3.7.1	Elaboración y Presentación	32 días	lun 26/02/24	mié 3/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
71		1.2.3.7.2	Revisión interventoría	12 días	jue 4/04/24	mar 16/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
72		1.2.3.7.3	Atención observaciones	8 días	mié 17/04/24	jue 25/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
73		1.2.3.7.4	Aprobación	6 días	vie 26/04/24	vie 3/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
74		*1.2.3.7.5*	*Fin componente ambiental y SST*	*0 días*	*sáb 25/05/24*	*sáb 25/05/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
75		**1.2.4**	**COMPONENTE SOCIAL**	**108 días**	**mar 6/02/24**	**sáb 1/06/24**	100%	88%	**100,00%**	**88,49%**	**100,00%**
76		*1.2.4.1*	*Inicio componente social*	*0 días*	*mar 6/02/24*	*mar 6/02/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
77		**1.2.4.2**	**Informe analisis de antecedentes**	**35 días**	**mar 20/02/24**	**sáb 30/03/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
78		1.2.4.2.1	Elaboración y Presentación	15 días	mar 20/02/24	mié 6/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
79		1.2.4.2.2	Revisión interventoría	10 días	mié 6/03/24	sáb 16/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
80		1.2.4.2.3	Atención observaciones	5 días	sáb 16/03/24	vie 22/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
81		1.2.4.2.4	Aprobación	5 días	vie 22/03/24	sáb 30/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
82		**1.2.4.3**	**Mesas de diálogo con grupos de interés**	**56 días**	**mar 6/02/24**	**sáb 6/04/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
83		1.2.4.3.1	Elaboración metodología mesas de diálogo con grupos de interés	29 días	mar 6/02/24	mié 6/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
84		1.2.4.3.2	Radicación y revisión de metodología por parte de Interventoría	5 días	mié 6/03/24	mar 12/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
85		1.2.4.3.3	Atención observaciones metodología mesas de diálogo con grupos de interés	3 días	mar 12/03/24	jue 14/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
86		1.2.4.3.4	Aprobación metodología mesas de diálogo con grupos de interés	3 días	jue 14/03/24	lun 18/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
87		1.2.4.3.5	Elaboración mesas de diálogo con grupos de interés	16 días	lun 18/03/24	sáb 6/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%

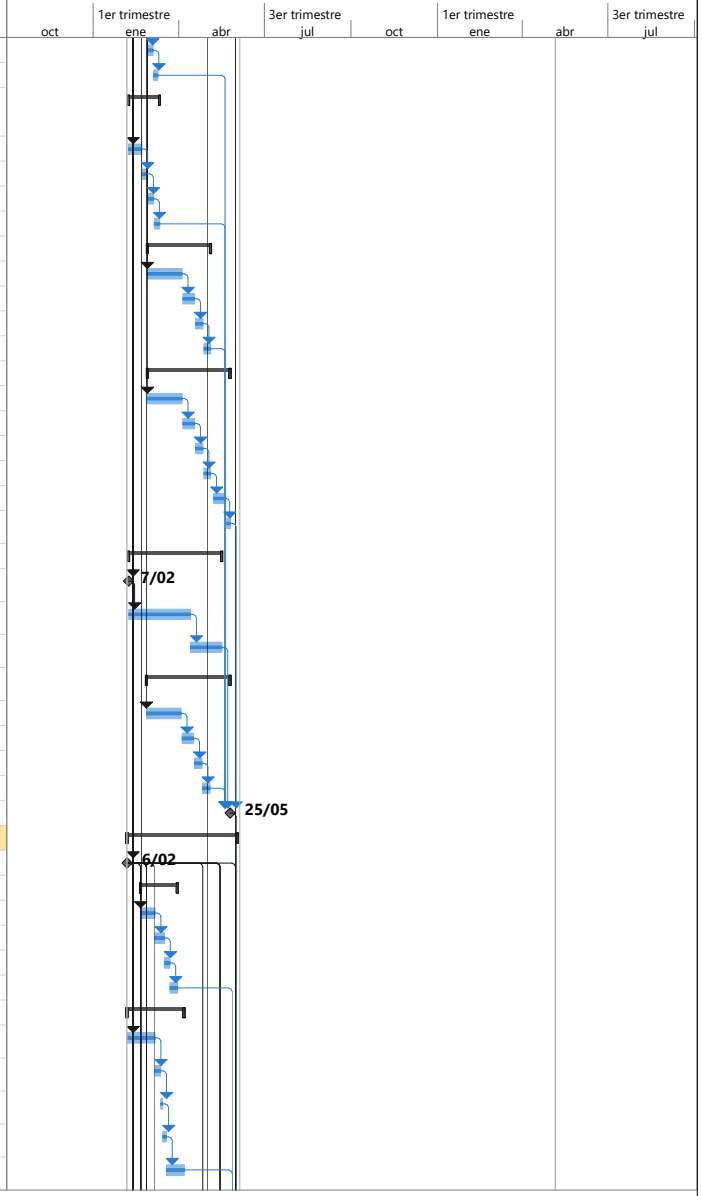

Proyecto: IDU-1771-2023-FRAN
Fecha: mié 5/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% Ejecutado Físico	% completado decimales	% Ejecutado Físico decimales	% Planeado Financiero
88		**1.2.4.4**	**Plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica**	**32 días**	**lun 26/02/24**	**mié 3/04/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
89		1.2.4.4.1	Elaboración y Presentación	9 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
90		1.2.4.4.2	Revisión interventoría	10 días	vie 8/03/24	mar 19/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
91		1.2.4.4.3	Atención observaciones	6 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
92		1.2.4.4.4	Aprobación	3 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
93		**1.2.4.5**	**Mapa de actores**	**58 días**	**lun 26/02/24**	**mar 30/04/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
94		1.2.4.5.1	Elaboración y Presentación	36 días	lun 26/02/24	sáb 6/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
95		1.2.4.5.2	Revisión interventoría	10 días	sáb 6/04/24	mié 17/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
96		1.2.4.5.3	Atención observaciones	7 días	mié 17/04/24	mié 24/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
97		1.2.4.5.4	Aprobación	5 días	mié 24/04/24	mar 30/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
98		**1.2.4.6**	**Metodología para realizar acta de vecindad**	**18 días**	**lun 26/02/24**	**vie 15/03/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
99		1.2.4.6.1	Recorridos tecnico	8 días	lun 26/02/24	mar 5/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
100		1.2.4.6.2	Realización y Presentación	9 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
101		1.2.4.6.3	Revisión interventoría	3 días	mié 6/03/24	sáb 9/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
102		1.2.4.6.4	Atención observaciones	3 días	sáb 9/03/24	mié 13/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
103		1.2.4.6.5	Aprobación	3 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
104		**1.2.4.7**	**Inventario de predios**	**56 días**	**lun 26/02/24**	**sáb 27/04/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
105		1.2.4.7.1	Recorridos en campo	3 días	mar 5/03/24	vie 8/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
106		1.2.4.7.2	Realización y Presentación	34 días	lun 26/02/24	jue 4/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
107		1.2.4.7.3	Revisión interventoría	10 días	vie 5/04/24	lun 15/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
108		1.2.4.7.4	Atención observaciones	7 días	lun 15/04/24	mar 23/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
109		1.2.4.7.5	Aprobación	5 días	mar 23/04/24	sáb 27/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
110		**1.2.4.8**	**Elaboración y entrega actas de vecindad**	**43 días**	**mar 16/04/24**	**sáb 1/06/24**	100%	85%	**100,00%**	**85,00%**	**100,00%**
111		1.2.4.8.1	Realización y Presentación primera entrega	18 días	mar 16/04/24	lun 6/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
112		1.2.4.8.2	Realización y Presentación segunda entrega	7 días	lun 6/05/24	mar 14/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
113		1.2.4.8.3	Realización y Presentación tercera entrega	5 días	mié 15/05/24	lun 20/05/24	100%	33%	100,00%	33,00%	100,00%
114		1.2.4.8.4	Revisión interventoría	3 días	lun 20/05/24	jue 23/05/24	100%	77%	100,00%	77,01%	100,00%
115		1.2.4.8.5	Atención observaciones	3 días	vie 24/05/24	lun 27/05/24	100%	72%	100,00%	72,01%	100,00%
116		1.2.4.8.6	Aprobación	4 días	mié 29/05/24	sáb 1/06/24	100%	72%	100,00%	71,98%	100,00%
117		**1.2.4.9**	**Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género**	**37 días**	**lun 26/02/24**	**lun 8/04/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
118		1.2.4.9.1	Elaboración y Presentación	9 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
119		1.2.4.9.2	Revisión interventoría	15 días	jue 7/03/24	vie 22/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
120		1.2.4.9.3	Atención observaciones	5 días	mar 26/03/24	mié 3/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
121		1.2.4.9.4	Aprobación	4 días	jue 4/04/24	lun 8/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
122		**1.2.4.10**	**Información correspondiente al área de influencia del Proyecto**	**15 días**	**mié 15/05/24**	**jue 30/05/24**	100%	0%	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
123		1.2.4.10.1	Elaboración y Presentación	15 días	mié 15/05/24	jue 30/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
124		**1.2.4.11**	**Información correspondiente al diagnóstico socioeconómico y cultural del Proyecto**	**15 días**	**mié 15/05/24**	**jue 30/05/24**	100%	0%	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
125		1.2.4.11.1	Elaboración y Presentación	15 días	mié 15/05/24	jue 30/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
126		**1.2.4.12**	**Evaluación de impacto social y plan de manejo de los mismos**	**15 días**	**mié 15/05/24**	**jue 30/05/24**	100%	0%	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
127		1.2.4.12.1	Elaboración y Presentación	15 días	mié 15/05/24	jue 30/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
128		**1.2.4.13**	**Punto de Atención al Ciudadano- Punto IDU**	**14 días**	**mar 20/02/24**	**mar 5/03/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
129		1.2.4.13.1	Presentación punto de atención IDU	7 días	mar 20/02/24	mar 27/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
130		1.2.4.13.2	Revisión de interventoría punto IDU	3 días	mar 27/02/24	vie 1/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
131		1.2.4.13.3	Atención observaciones punto IDU	3 días	vie 1/03/24	lun 4/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
132		1.2.4.13.4	Aprobación punto IDU	1 día	mar 5/03/24	mar 5/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%

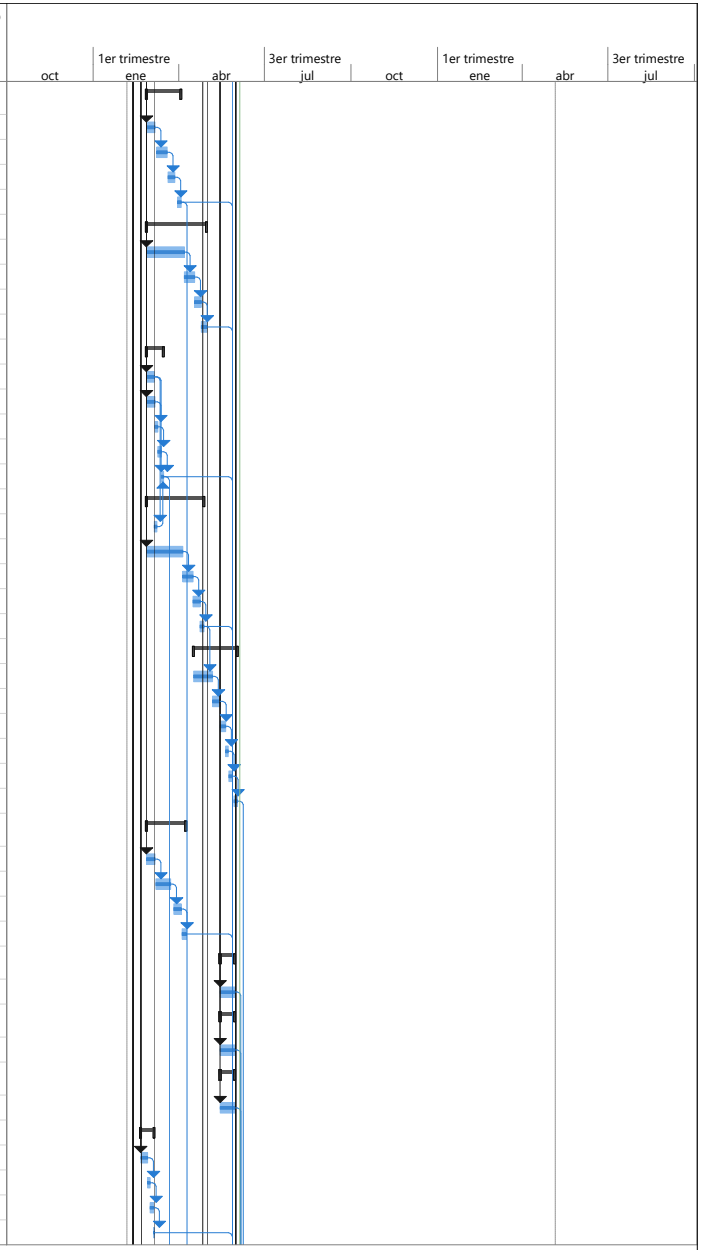

Proyecto: IDU-1771-2023-FRAN
Fecha: mié 5/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% Ejecutado Físico	% completado decimales	% Ejecutado Físico decimales	% Planeado Financiero
133		**1.2.4.14**	**Puntos Satélites de Información –PSI**	**17 días**	**mié 3/04/24**	**sáb 20/04/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
134		1.2.4.14.1	Presentación puntos de atención satélites IDU (10)	10 días	mié 3/04/24	sáb 13/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
135		1.2.4.14.2	Revisión de interventoría puntos de atención satélites IDU (10)	3 días	sáb 13/04/24	mar 16/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
136		1.2.4.14.3	Atención observaciones puntos de atención satélites IDU (10)	3 días	mar 16/04/24	vie 19/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
137		1.2.4.14.4	Aprobación puntos de atención satélites IDU (10)	1 día	vie 19/04/24	sáb 20/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
138		**1.2.4.15**	**Valla informativas fija y móviles**	**55 días**	**mar 5/03/24**	**lun 6/05/24**	100%	99%	**100,00%**	**98,75%**	**100,00%**
139		1.2.4.15.1	Presentación valla informativa fija y vallas móviles	7 días	mar 5/03/24	mié 13/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
140		1.2.4.15.2	Revisión de interventoría valla fija y vallas móviles	5 días	mié 13/03/24	lun 18/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
141		1.2.4.15.3	Atención observaciones valla fija y vallas móviles	5 días	lun 18/03/24	vie 22/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
142		1.2.4.15.4	Aprobación valla fija y vallas móviles	4 días	sáb 23/03/24	sáb 30/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
143		1.2.4.15.5	Aprobación secretaria de ambiente instalación valla	7 días	vie 26/04/24	sáb 4/05/24	100%	95%	100,00%	95,00%	100,00%
144		1.2.4.15.6	Instalación valla fija y vallas móviles	0 días	lun 6/05/24	lun 6/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
145		1.2.4.16	Entrega actas de reunión y diferentes soportes inicio - seguimiento - cierre	7 días	vie 26/04/24	sáb 4/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
146		*1.2.4.17*	*Fin componente social*	*0 días*	*sáb 1/06/24*	*sáb 1/06/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
147		**1.2.5**	**COMPONENTE PMT**	**101 días**	**mar 6/02/24**	**sáb 25/05/24**	100%	40%	**100,00%**	**39,52%**	**100,00%**
148		*1.2.5.1*	*Inicio componente PMT*	*0 días*	*mar 6/02/24*	*mar 6/02/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
149		**1.2.5.2**	**Plan manejo de tránsito**	**92 días**	**mar 6/02/24**	**jue 16/05/24**	100%	15%	**100,00%**	**15,35%**	**100,00%**
150		1.2.5.2.1	Elaboración y Presentación	6 días	mar 6/02/24	lun 12/02/24	100%	85%	100,00%	85,00%	100,00%
151		1.2.5.2.2	Revisión interventoría	11 días	mar 13/02/24	vie 23/02/24	100%	60%	100,00%	60,00%	100,00%
152		1.2.5.2.3	Atención observaciones	39 días	sáb 24/02/24	mar 9/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
153		1.2.5.2.4	Aprobación	3 días	mié 10/04/24	sáb 13/04/24	100%	50%	100,00%	50,00%	100,00%
154		1.2.5.2.5	Radicado a secretaría de movilidad	3 días	lun 15/04/24	jue 18/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
155		1.2.5.2.6	Aprobación secretaria de movilidad	24 días	vie 19/04/24	jue 16/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
156		**1.2.5.3**	**Diagnóstico vías de desvío**	**63 días**	**vie 15/03/24**	**sáb 25/05/24**	100%	74%	**100,00%**	**74,17%**	**100,00%**
157		1.2.5.3.1	Elaboración Diagnóstico vías de desvío	42 días	vie 15/03/24	vie 3/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
158		1.2.5.3.2	Revisión interventoría diagnóstico vías de desvío	10 días	sáb 4/05/24	mié 15/05/24	100%	25%	100,00%	25,00%	100,00%
159		1.2.5.3.3	Atención observaciones diagnóstico vías de desvío	5 días	jue 16/05/24	mié 22/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
160		1.2.5.3.4	Aprobación diagnóstico vías de desvío	3 días	jue 23/05/24	sáb 25/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
161		*1.2.5.4*	*Fin componente PMT*	*0 días*	*sáb 25/05/24*	*sáb 25/05/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
162		**1.2.6**	**COMPONENTE BIC**	**108 días**	**mar 6/02/24**	**sáb 1/06/24**	100%	82%	**100,00%**	**81,73%**	**100,00%**
163		*1.2.6.1*	*Inicio componente BIC*	*0 días*	*mar 6/02/24*	*mar 6/02/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
164		1.2.6.2	Presentación del componente.	34 días	mar 6/02/24	mié 13/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
165		1.2.6.3	Acercamiento con entidades competentes.	10 días	mié 13/03/24	vie 22/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
166		1.2.6.4	Realización de estudios y planimetría BIC para trámite de intervención espacio público área de protección BIC nivel 1.	10 días	sáb 23/03/24	vie 5/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
167		1.2.6.5	Revisión de interventoría estudios y planimetría	10 días	vie 5/04/24	mar 16/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
168		1.2.6.6	Compilación y revisión documentos jurídicos y técnicos a radicar en IDPC.	10 días	mar 16/04/24	vie 26/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
169		1.2.6.7	Revisiones (mesa de trabajo pre entrega IDPC)	10 días	vie 26/04/24	mié 8/05/24	100%	85%	100,00%	85,00%	100,00%
170		1.2.6.8	Radicación a entidad competente IDPC.	5 días	mié 8/05/24	mar 14/05/24	100%	50%	100,00%	50,00%	100,00%
171		1.2.6.9	Informe final (trazabilidad ...)	5 días	mié 15/05/24	lun 20/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
172		1.2.6.10	Revisión interventoría informe final.	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
173		1.2.6.11	Aprobación informe BIC	5 días	vie 24/05/24	jue 30/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
174		1.2.6.12	Entrega insumos a entidades de patrimonio cultural	0 días	sáb 1/06/24	sáb 1/06/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%

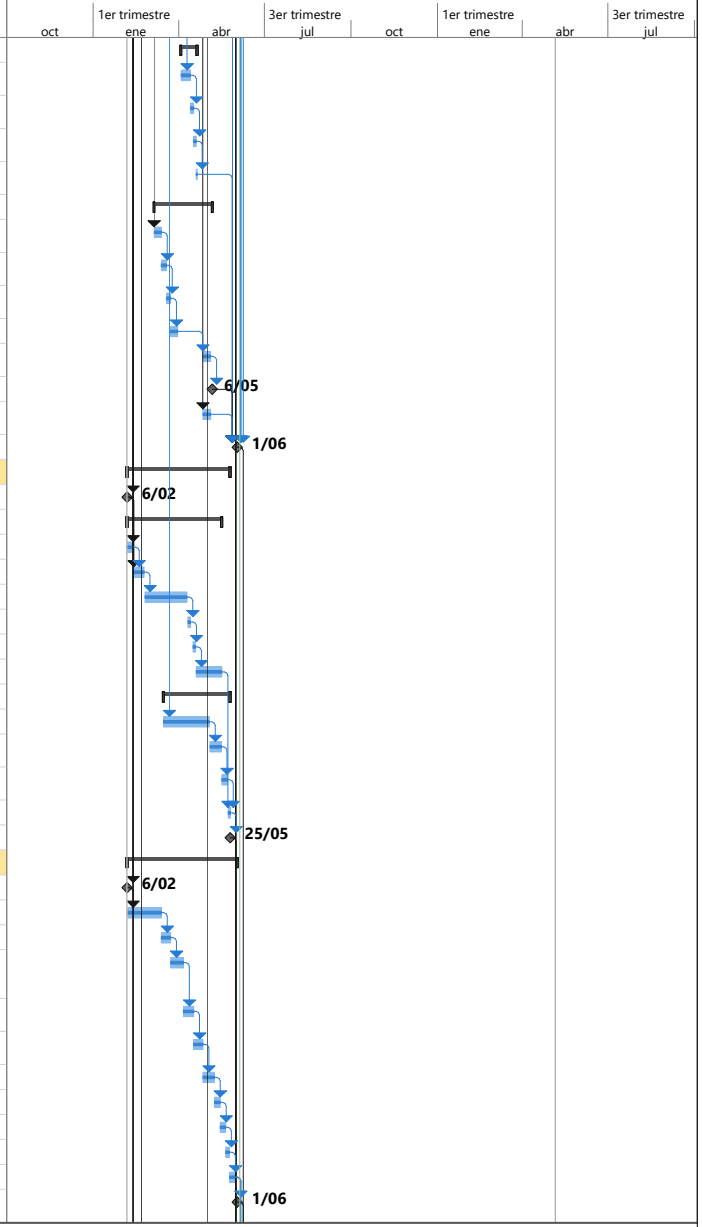

Proyecto: IDU-1771-2023-FRAN
Fecha: mié 5/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% Ejecutado Físico	% completado decimales	% Ejecutado Físico decimales	% Planeado Financiero
175		1.2.6.13	Entrega informe trazabilidad de gestiones a entidades de patrimonio cultural	0 días	sáb 1/06/24	sáb 1/06/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
176		*1.2.6.14*	*Fin componente BIC*	*0 días*	*sáb 1/06/24*	*sáb 1/06/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
177		**1.2.7**	**COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**83 días**	**mar 6/02/24**	**lun 6/05/24**	100%	76%	**100,00%**	**76,31%**	**100,00%**
178		*1.2.7.1*	*Inicio componente estudios y diseños*	*0 días*	*mar 6/02/24*	*mar 6/02/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
179		**1.2.7.2**	**Estudios y diseños (Topografía)**	**71 días**	**jue 15/02/24**	**vie 3/05/24**	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
180		1.2.7.2.1	Entrega certificados de calibración equipos y personal	24 días	jue 15/02/24	lun 11/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
181		1.2.7.2.2	Verificación topografía amarres	7 días	lun 11/03/24	lun 18/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
182		1.2.7.2.3	Revisión interventoría	7 días	lun 18/03/24	mar 26/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
183		1.2.7.2.4	Entrega final de estudios y diseños	10 días	lun 18/03/24	lun 1/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
184		1.2.7.2.5	Revisión interventoría	4 días	mié 3/04/24	sáb 6/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
185		1.2.7.2.6	Atención observaciones	15 días	mar 9/04/24	mié 24/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
186		1.2.7.2.7	Aprobación	6 días	jue 25/04/24	vie 3/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
187		**1.2.7.3**	**Estudios y diseños (Geotécnico - Geométrico)**	**74 días**	**jue 15/02/24**	**lun 6/05/24**	100%	89%	**100,00%**	**89,24%**	**100,00%**
188		1.2.7.3.1	Entrega parcial de estudios y diseños	20 días	jue 15/02/24	mié 6/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
189		1.2.7.3.2	Revisión interventoría	10 días	mié 6/03/24	sáb 16/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
190		1.2.7.3.3	Entrega final de estudios y diseños	24 días	mié 6/03/24	jue 4/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
191		1.2.7.3.4	Revisión interventoría	10 días	vie 5/04/24	mar 16/04/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
192		1.2.7.3.5	Atención observaciones	10 días	jue 18/04/24	lun 29/04/24	100%	50%	100,00%	50,00%	100,00%
193		1.2.7.3.6	Aprobación	5 días	mar 30/04/24	lun 6/05/24	100%	30%	100,00%	30,00%	100,00%
194		**1.2.7.4**	**Estudios y diseños (Estructuras - BIC - Pavimentos - Redes Hidrosanitarias)**	**68 días**	**jue 15/02/24**	**lun 29/04/24**	100%	64%	**100,00%**	**64,00%**	**100,00%**
195		1.2.7.4.1	Entrega parcial de estudios y diseños	20 días	jue 15/02/24	mié 6/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
196		1.2.7.4.2	Revisión interventoría	10 días	mié 6/03/24	sáb 16/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
197		1.2.7.4.3	Entrega final de estudios y diseños	20 días	mié 6/03/24	sáb 30/03/24	100%	50%	100,00%	50,00%	100,00%
198		1.2.7.4.4	Revisión interventoría	10 días	lun 1/04/24	jue 11/04/24	100%	50%	100,00%	50,00%	100,00%
199		1.2.7.4.5	Atención observaciones	10 días	vie 12/04/24	mar 23/04/24	100%	25%	100,00%	25,00%	100,00%
200		1.2.7.4.6	Aprobación	5 días	mié 24/04/24	lun 29/04/24	100%	10%	100,00%	10,00%	100,00%
201		**1.2.7.5**	**Estudios y diseños (Tránsito - Urbanismo)**	**71 días**	**jue 15/02/24**	**vie 3/05/24**	100%	63%	**100,00%**	**63,46%**	**100,00%**
202		1.2.7.5.1	Entrega parcial de estudios y diseños	20 días	jue 15/02/24	mié 6/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
203		1.2.7.5.2	Revisión interventoría	10 días	mié 6/03/24	sáb 16/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
204		1.2.7.5.3	Entrega final de estudios y diseños	25 días	mié 6/03/24	jue 4/04/24	100%	70%	100,00%	70,00%	100,00%
205		1.2.7.5.4	Revisión interventoría	10 días	vie 5/04/24	mar 16/04/24	100%	20%	100,00%	20,00%	100,00%
206		1.2.7.5.5	Atención Observaciones	10 días	mié 17/04/24	sáb 27/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
207		1.2.7.5.6	Aprobación	3 días	lun 29/04/24	vie 3/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
208		**1.2.7.6**	**Estudios y diseños (Redes secas)**	**71 días**	**jue 15/02/24**	**vie 3/05/24**	100%	66%	**100,00%**	**65,70%**	**100,00%**
209		1.2.7.6.1	Entrega parcial de estudios y diseños	20 días	jue 15/02/24	mié 6/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
210		1.2.7.6.2	Revisión interventoría	10 días	mié 6/03/24	sáb 16/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
211		1.2.7.6.3	Entrega final de estudios y diseños	25 días	mié 6/03/24	jue 4/04/24	100%	75%	100,00%	75,00%	100,00%
212		1.2.7.6.4	Revisión interventoría	5 días	vie 5/04/24	jue 11/04/24	100%	50%	100,00%	50,00%	100,00%
213		1.2.7.6.5	Atención Observaciones	5 días	vie 12/04/24	mié 17/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
214		1.2.7.6.6	Aprobación	3 días	jue 18/04/24	lun 22/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
215		1.2.7.6.7	Radicación del diseño ante el Operador de Red	1 día	lun 22/04/24	mar 23/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
216		1.2.7.6.8	Revisión de los diseños por parte del Operador de Red	1 día	mar 23/04/24	mar 23/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
217		1.2.7.6.9	Respuesta y concepto técnico del operador de red con respecto al diseño presentado	1 día	mié 24/04/24	mié 24/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
218		1.2.7.6.10	Evaluación del concepto técnico del operador de red por parte del Contratista e interventoría	1 día	mié 24/04/24	jue 25/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%

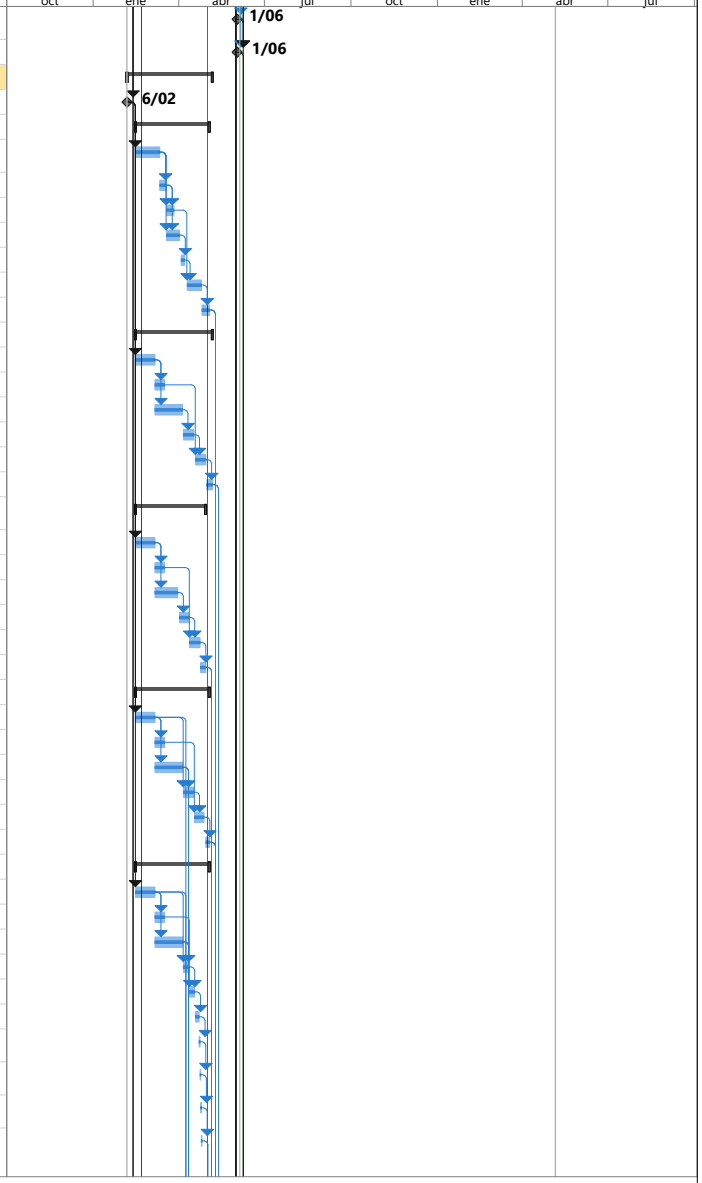

Proyecto: IDU-1771-2023-FRAN
Fecha: mié 5/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% Ejecutado Físico	% completado decimales	% Ejecutado Físico decimales	% Planeado Financiero
219		1.2.7.6.11	Ajuste por parte del Contratista al Diseño inicial presentado, acorde a las observaciones realizadas por el operador de red	1 día	jue 25/04/24	vie 26/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
220		1.2.7.6.12	Revisión del diseño ajustado por parte de la Interventoría	1 día	vie 26/04/24	sáb 27/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
221		1.2.7.6.13	Atención por parte del Contratista a las observaciones realizadas por la Interventoría al diseño ajustado	1 día	sáb 27/04/24	lun 29/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
222		1.2.7.6.14	Radicación del diseño ajustado ante el Operador de Red	1 día	lun 29/04/24	mar 30/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
223		1.2.7.6.15	Revisión del diseño ajustado por parte del Operador de Red	1 día	mar 30/04/24	jue 2/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
224		1.2.7.6.16	Aprobación del diseño ajustado si no hay observaciones	1 día	jue 2/05/24	vie 3/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
225		*1.2.7.7*	*Aprobación para pago*	*0 días*	*lun 6/05/24*	*lun 6/05/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
226		*1.2.7.8*	*fin componente estudios y diseños*	*0 días*	*lun 6/05/24*	*lun 6/05/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
227		**1.2.8**	**COMPONENTE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN**	**27 días**	**lun 6/05/24**	**mié 5/06/24**	92%	56%	**91,67%**	**55,73%**	**92,00%**
228		*1.2.8.1*	*Inicio componente presupuesto y programación*	*0 días*	*lun 6/05/24*	*lun 6/05/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
229		**1.2.8.2**	**APUS no previstos**	**27 días**	**lun 6/05/24**	**mié 5/06/24**	92%	67%	**91,67%**	**66,67%**	**92,00%**
230		1.2.8.2.1	Elaboración y Presentación	11 días	lun 6/05/24	sáb 18/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
231		1.2.8.2.2	Revisión interventoría	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
232		1.2.8.2.3	Atención observaciones	5 días	sáb 25/05/24	vie 31/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
233		1.2.8.2.4	Aprobación	3 días	sáb 1/06/24	mié 5/06/24	33%	0%	33,33%	0,00%	33,00%
234		**1.2.8.3**	**Presupuesto oficial del contrato**	**27 días**	**lun 6/05/24**	**mié 5/06/24**	92%	65%	**91,67%**	**64,58%**	**92,00%**
235		1.2.8.3.1	Elaboración y Presentación	11 días	lun 6/05/24	sáb 18/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
236		1.2.8.3.2	Revisión interventoría	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	100%	90%	100,00%	90,00%	100,00%
237		1.2.8.3.3	Atención observaciones	5 días	sáb 25/05/24	vie 31/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
238		1.2.8.3.4	Aprobación	3 días	sáb 1/06/24	mié 5/06/24	33%	0%	33,33%	0,00%	33,00%
239		**1.2.8.4**	**PDT Etapa de construcción**	**27 días**	**lun 6/05/24**	**mié 5/06/24**	92%	46%	**91,67%**	**45,83%**	**92,00%**
240		1.2.8.4.1	Elaboración y Presentación	11 días	lun 6/05/24	sáb 18/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
241		1.2.8.4.2	Revisión interventoría	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
242		1.2.8.4.3	Atención observaciones	5 días	sáb 25/05/24	vie 31/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
243		1.2.8.4.4	Aprobación	3 días	sáb 1/06/24	mié 5/06/24	33%	0%	33,33%	0,00%	33,00%
244		**1.2.8.5**	**PAC**	**27 días**	**lun 6/05/24**	**mié 5/06/24**	92%	46%	**91,67%**	**45,83%**	**92,00%**
245		1.2.8.5.1	Elaboración y Presentación	11 días	lun 6/05/24	sáb 18/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
246		1.2.8.5.2	Revisión interventoría	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
247		1.2.8.5.3	Atención observaciones	5 días	sáb 25/05/24	vie 31/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
248		1.2.8.5.4	Aprobación	3 días	sáb 1/06/24	mié 5/06/24	33%	0%	33,33%	0,00%	33,00%
249		*1.2.8.6*	*Fin componente presupuesto y programación*	*0 días*	*mié 5/06/24*	*mié 5/06/24*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
250		**1.2.9**	**TRAMITE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO**	**66 días**	**lun 26/02/24**	**jue 9/05/24**	100%	76%	**100,00%**	**75,80%**	**100,00%**
251		*1.2.9.1*	*Inicio tramite Empresas de Servicios Públicos*	*0 días*	*lun 26/02/24*	*lun 26/02/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
252		**1.2.9.2**	**Solicitud de Permisos de las Empresas de Servicios Públicos**	**15 días**	**lun 26/02/24**	**mié 13/03/24**	100%	90%	**100,00%**	**90,40%**	**100,00%**
253		1.2.9.2.1	EAAB	15 días	lun 26/02/24	mié 13/03/24	100%	92%	100,00%	92,00%	100,00%
254		*1.2.9.2.2*	*Aprobación para pago*	*0 días*	*mié 13/03/24*	*mié 13/03/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
255		1.2.9.2.3	ENEL - UAESP	15 días	lun 26/02/24	mié 13/03/24	100%	80%	100,00%	80,00%	100,00%
256		*1.2.9.2.4*	*Aprobación para pago*	*0 días*	*mié 13/03/24*	*mié 13/03/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
257		1.2.9.2.5	VANTI	15 días	lun 26/02/24	mié 13/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
258		*1.2.9.2.6*	*Aprobación para pago*	*0 días*	*mié 13/03/24*	*mié 13/03/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
259		1.2.9.2.7	MOVISTAR/TIGO	15 días	lun 26/02/24	mié 13/03/24	100%	90%	100,00%	90,00%	100,00%
260		*1.2.9.2.8*	*Aprobación para pago*	*0 días*	*mié 13/03/24*	*mié 13/03/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
261		1.2.9.2.9	ETB	15 días	lun 26/02/24	mié 13/03/24	100%	90%	100,00%	90,00%	100,00%

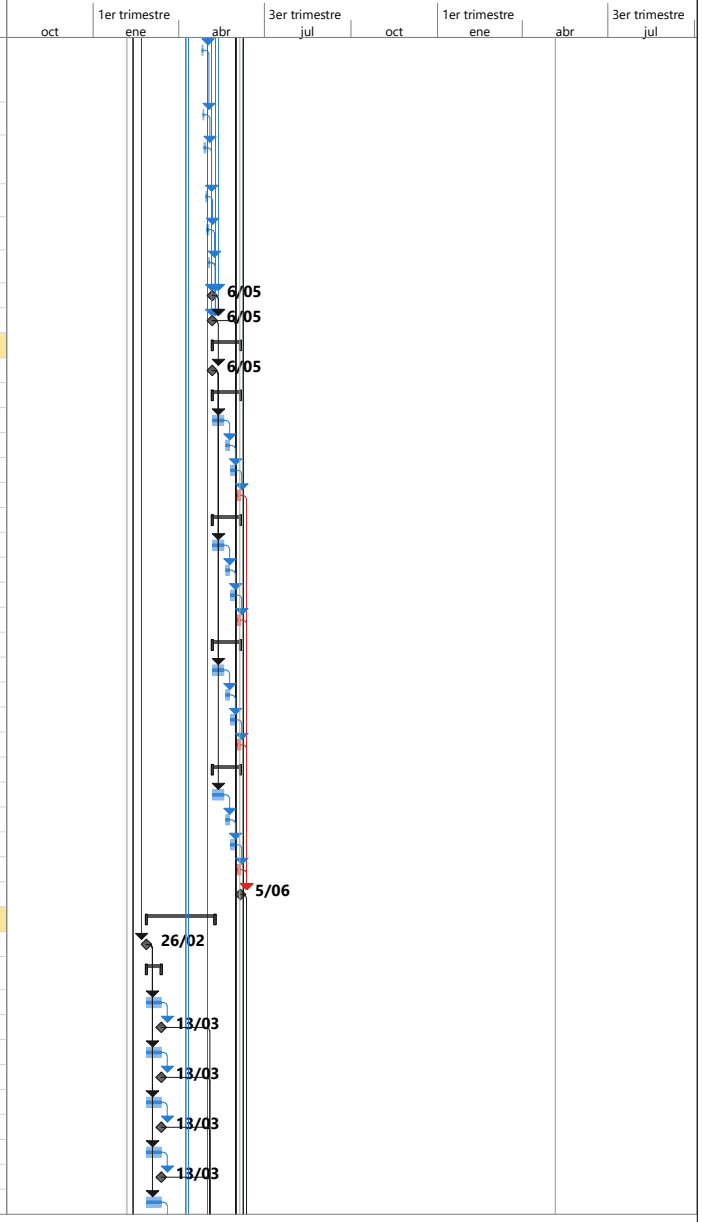

Proyecto: IDU-1771-2023-FRAN
Fecha: mié 5/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% Ejecutado Físico	% completado decimales	% Ejecutado Físico decimales	% Planeado Financiero
262		*1.2.9.2.10*	*Aprobación para pago*	*0 días*	*mié 13/03/24*	*mié 13/03/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
263		1.2.9.3	Entrega Actas de Competencia	10 días	lun 8/04/24	jue 18/04/24	100%	80%	100,00%	80,00%	100,00%
264		1.2.9.4	Revisión interventoría actas de competencia	5 días	vie 19/04/24	mié 24/04/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
265		1.2.9.5	Aprobación ACTAS DE COMPETENCIA	5 días	jue 25/04/24	jue 2/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
266		1.2.9.6	Revisión y aprobación de ACTAS DE COMPETENCIA con ESP	5 días	sáb 4/05/24	jue 9/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
267		*1.2.9.7*	*Aprobación para pago*	*0 días*	*jue 9/05/24*	*jue 9/05/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
268		*1.2.9.8*	*Fin tramite Empresas de Servicios Públicos*	*0 días*	*jue 9/05/24*	*jue 9/05/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
269		**1.2.10**	**COMPONENTE DE CALIDAD**	**40 días**	**mar 6/02/24**	**lun 18/03/24**	100%	99%	**100,00%**	**98,54%**	**100,00%**
270		*1.2.10.1*	*Inicio componente de calidad*	*0 días*	*mar 6/02/24*	*mar 6/02/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
271		**1.2.10.2**	**Plan de calidad**	**40 días**	**mar 6/02/24**	**lun 18/03/24**	100%	98%	**100,00%**	**98,06%**	**100,00%**
272		1.2.10.2.1	Elaboración y Presentación	14 días	mar 6/02/24	mar 20/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
273		1.2.10.2.2	Revisión interventoría	10 días	jue 22/02/24	lun 4/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
274		1.2.10.2.3	Atención observaciones	5 días	mar 5/03/24	sáb 9/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
275		1.2.10.2.4	Aprobación	7 días	lun 11/03/24	lun 18/03/24	100%	90%	100,00%	90,00%	100,00%
276		**1.2.10.3**	**Plan de inspección de ensayos**	**40 días**	**mar 6/02/24**	**lun 18/03/24**	100%	99%	**100,00%**	**99,03%**	**100,00%**
277		1.2.10.3.1	Elaboración y Presentación	14 días	mar 6/02/24	mar 20/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
278		1.2.10.3.2	Revisión interventoría	10 días	jue 22/02/24	lun 4/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
279		1.2.10.3.3	Atención observaciones	5 días	mar 5/03/24	sáb 9/03/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
280		1.2.10.3.4	Aprobación	7 días	lun 11/03/24	lun 18/03/24	100%	95%	100,00%	95,00%	100,00%
281		*1.2.10.4*	*Fin componente de calidad*	*0 días*	*lun 18/03/24*	*lun 18/03/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
282		**1.2.11**	**TRAMITES TERMINACIÓN ETAPA DE PRELIMINARES**	**27 días**	**lun 6/05/24**	**mié 5/06/24**	98%	18%	**98,04%**	**18,14%**	**98,00%**
283		*1.2.11.1*	*Inicio tramites terminación etapa de preliminares*	*0 días*	*lun 6/05/24*	*lun 6/05/24*	100%	0%	*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*
284		**1.2.11.2**	**Entrega de los contratos laborales, de las afiliaciones al sistema general de seguridad Social**	**13 días**	**sáb 18/05/24**	**sáb 1/06/24**	100%	73%	**100,00%**	**73,08%**	**100,00%**
285		1.2.11.2.1	Elaboración y Presentación	5 días	sáb 18/05/24	jue 23/05/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
286		1.2.11.2.2	Revisión interventoría	5 días	vie 24/05/24	mié 29/05/24	100%	90%	100,00%	90,00%	100,00%
287		1.2.11.2.3	Atención observaciones	3 días	mié 29/05/24	sáb 1/06/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
288		1.2.11.2.4	Aprobación	0 días	sáb 1/06/24	sáb 1/06/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
289		**1.2.11.3**	**Informe preliminares**	**25 días**	**lun 6/05/24**	**sáb 1/06/24**	100%	0%	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
290		1.2.11.3.1	Elaboración y Presentación	11 días	lun 6/05/24	sáb 18/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
291		1.2.11.3.2	Revisión interventoría	5 días	mar 21/05/24	sáb 25/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
292		1.2.11.3.3	Atención observaciones	3 días	mar 28/05/24	vie 31/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
293		1.2.11.3.4	Aprobación	0 días	sáb 1/06/24	sáb 1/06/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
294		**1.2.11.4**	**Acta de terminación etapa de preliminares**	**19 días**	**mié 15/05/24**	**mié 5/06/24**	89%	0%	**89,47%**	**0,00%**	**89,00%**
295		1.2.11.4.1	Elaboración y Presentación	5 días	mié 15/05/24	mar 21/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
296		1.2.11.4.2	Revisión interventoría	5 días	mar 21/05/24	sáb 25/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
297		1.2.11.4.3	Atención observaciones	5 días	sáb 25/05/24	vie 31/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
298		1.2.11.4.4	Aprobación	4 días	vie 31/05/24	mié 5/06/24	50%	0%	50,00%	0,00%	50,00%
299		*1.2.11.4.5*	*Aprobación para pago*	*0 días*	*mié 5/06/24*	*mié 5/06/24*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
300		**1.2.11.5**	**Presentación reunión de inicio**	**24 días**	**lun 6/05/24**	**sáb 1/06/24**	100%	13%	**100,00%**	**13,16%**	**100,00%**
301		1.2.11.5.1	Elaboración y Presentación	5 días	lun 6/05/24	sáb 11/05/24	100%	50%	100,00%	50,00%	100,00%
302		1.2.11.5.2	Revisión interventoría	5 días	mar 14/05/24	sáb 18/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
303		1.2.11.5.3	Atención observaciones	3 días	mar 21/05/24	jue 23/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
304		1.2.11.5.4	Aprobación Interventoría	3 días	vie 24/05/24	mar 28/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
305		1.2.11.5.5	Aprobación presentación reunión de inicio por IDU	3 días	mié 29/05/24	sáb 1/06/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
306		**1.2.11.6**	**Relación equipo y personal mínimo**	**18 días**	**mié 15/05/24**	**sáb 1/06/24**	100%	36%	**100,00%**	**36,11%**	**100,00%**
307		1.2.11.6.1	Elaboración y Presentación	5 días	mié 15/05/24	lun 20/05/24	100%	80%	100,00%	80,00%	100,00%

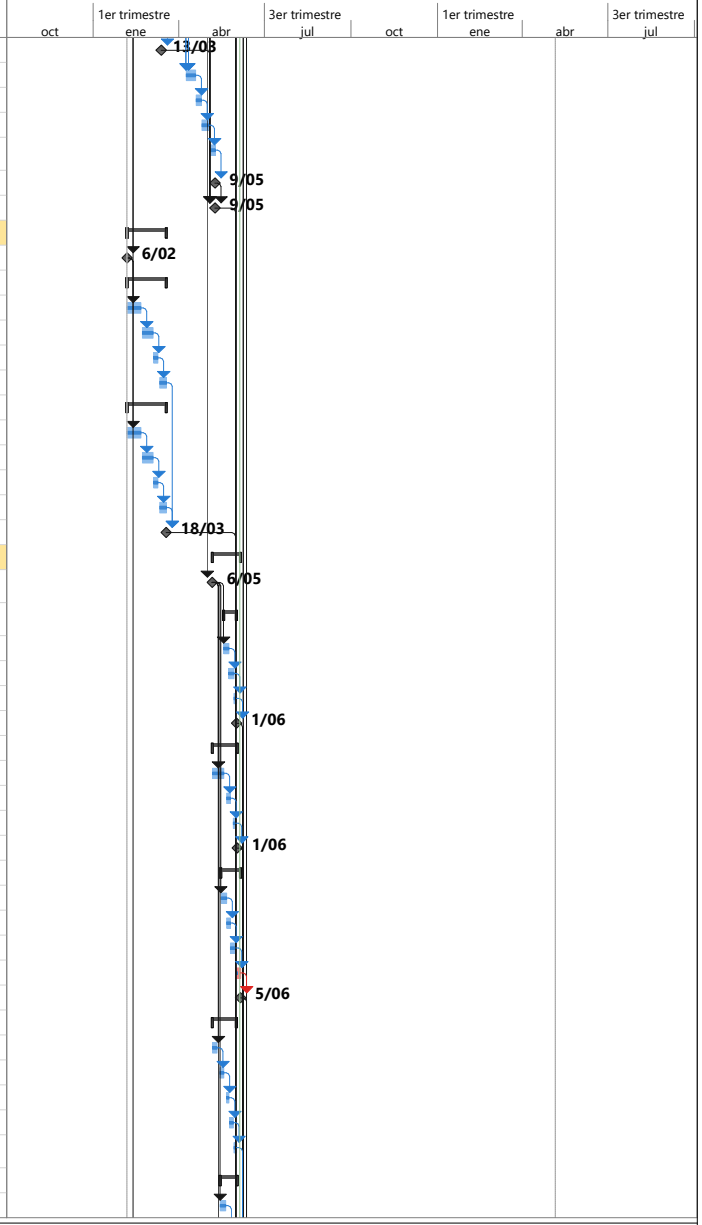

Proyecto: IDU-1771-2023-FRAN
Fecha: mié 5/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% Ejecutado Físico	% completado decimales	% Ejecutado Físico decimales	% Planeado Financiero
308		1.2.11.6.2	Revisión interventoría	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	100%	50%	100,00%	50,00%	100,00%
309		1.2.11.6.3	Atención observaciones	5 días	vie 24/05/24	jue 30/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
310		1.2.11.6.4	Aprobación	3 días	jue 30/05/24	sáb 1/06/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
311		**1.2.11.7**	**Presentación divulgación PMT**	**13 días**	**lun 6/05/24**	**mar 21/05/24**	100%	0%	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
312		1.2.11.7.1	Elaboración y Presentación	5 días	lun 6/05/24	sáb 11/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
313		1.2.11.7.2	Revisión interventoría	3 días	sáb 11/05/24	mié 15/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
314		1.2.11.7.3	Atención observaciones	1 día	mié 15/05/24	jue 16/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
315		1.2.11.7.4	Aprobación	1 día	jue 16/05/24	vie 17/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
316		1.2.11.7.5	Divulgación PMT con volantes	1 día	vie 17/05/24	sáb 18/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
317		1.2.11.7.6	simulacro de reunión de inicio	1 día	sáb 18/05/24	lun 20/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
318		1.2.11.7.7	señalización provisional	1 día	lun 20/05/24	mar 21/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
319		1.2.11.7.8	REUNION DE INICIO	1 día	lun 20/05/24	mar 21/05/24	100%	0%	100,00%	0,00%	100,00%
320		*1.2.11.8*	*Fin tramites terminación etapa de preliminares*	*0 días*	*mié 5/06/24*	*mié 5/06/24*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
321		***1.2.12***	***FIN DE PRELIMINARES***	***0 días***	***mié 5/06/24***	***mié 5/06/24***	0%	0%	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***
322		**1.3**	**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**304 días**	**jue 6/06/24**	**lun 5/05/25**	0%	0%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
323		*1.3.1*	*ACTA DE INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN*	*0 días*	*jue 6/06/24*	*jue 6/06/24*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
324		**1.3.2**	**OBRA**	**279 días**	**jue 6/06/24**	**sáb 5/04/25**	0%	0%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
325		*1.3.2.1*	*INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN*	*0 días*	*jue 6/06/24*	*jue 6/06/24*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
326		1.3.2.2	PRELIMINARES	26 días	jue 6/06/24	vie 5/07/24	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
327		1.3.2.3	RELLENOS	27 días	sáb 6/07/24	lun 5/08/24	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
328		1.3.2.4	ESTRUCTURAS	83 días	mar 6/08/24	mar 5/11/24	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
329		1.3.2.5	PAVIMENTOS	195 días	mar 6/08/24	mié 5/03/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
330		1.3.2.6	PAISAJISMO	25 días	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
331		1.3.2.7	REDES HUMEDAS	223 días	sáb 6/07/24	mié 5/03/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
332		1.3.2.8	REDES SECAS	195 días	mar 23/07/24	mié 19/02/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
333		1.3.2.9	URBANISMO	25 días	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
334		1.3.2.10	SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	29 días	mié 5/03/25	sáb 5/04/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
335		*1.3.2.11*	*FIN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN*	*0 días*	*sáb 5/04/25*	*sáb 5/04/25*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
336		1.3.3	RECIBO OBRA	25 días	sáb 5/04/25	lun 5/05/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
337		**1.4**	**COMPONENTES DE GESTIÓN / FONDOS**	**390 días**	**mar 6/02/24**	**sáb 5/04/25**	14%	14%	**14,19%**	**14,17%**	**4,79%**
338		1.4.1	Inicio componente de gestión / fondos	0 días	mar 6/02/24	mar 6/02/24	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
339		**1.4.2**	**COMPONENTES DE GESTIÓN PRELIMINARES**	**110 días**	**mar 6/02/24**	**mié 5/06/24**	98%	98%	**98,18%**	**98,18%**	**98,18%**
340		*1.4.2.1*	*Inicio componentes de gestion preliminares*	*0 días*	*mar 6/02/24*	*mar 6/02/24*	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
341		1.4.2.2	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	110 días	mar 6/02/24	mié 5/06/24	98%	98%	98,18%	98,18%	98,18%
342		1.4.2.3	OMPONENTE DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	110 días	mar 6/02/24	mié 5/06/24	98%	98%	98,18%	98,18%	98,18%
343		1.4.2.4	COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN	110 días	mar 6/02/24	mié 5/06/24	98%	98%	98,18%	98,18%	98,18%
344		*1.4.2.5*	*Fin componentes de gestion preliminares*	*0 días*	*mié 5/06/24*	*mié 5/06/24*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
345		**1.4.3**	**COMPONENTES DE GESTIÓN DE OBRA**	**279 días**	**jue 6/06/24**	**sáb 5/04/25**	0%	0%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
346		1.4.3.1	*Inicio componentes de gestion etapa de obra*	0 días	jue 6/06/24	jue 6/06/24	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
347		1.4.3.2	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	279 días	jue 6/06/24	sáb 5/04/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
348		1.4.3.3	OMPONENTE DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	279 días	jue 6/06/24	sáb 5/04/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
349		1.4.3.4	COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN	279 días	jue 6/06/24	sáb 5/04/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
350		*1.4.3.5*	*Fin componentes de gestion etapa de obra*	*0 días*	*sáb 5/04/25*	*sáb 5/04/25*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
351		**1.4.4**	**COMPONENTES / FONDOS**	**279 días**	**jue 6/06/24**	**sáb 5/04/25**	0%	0%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
352		*1.4.4.1*	*Inicio componentes / fondos*	*0 días*	*jue 6/06/24*	*jue 6/06/24*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*

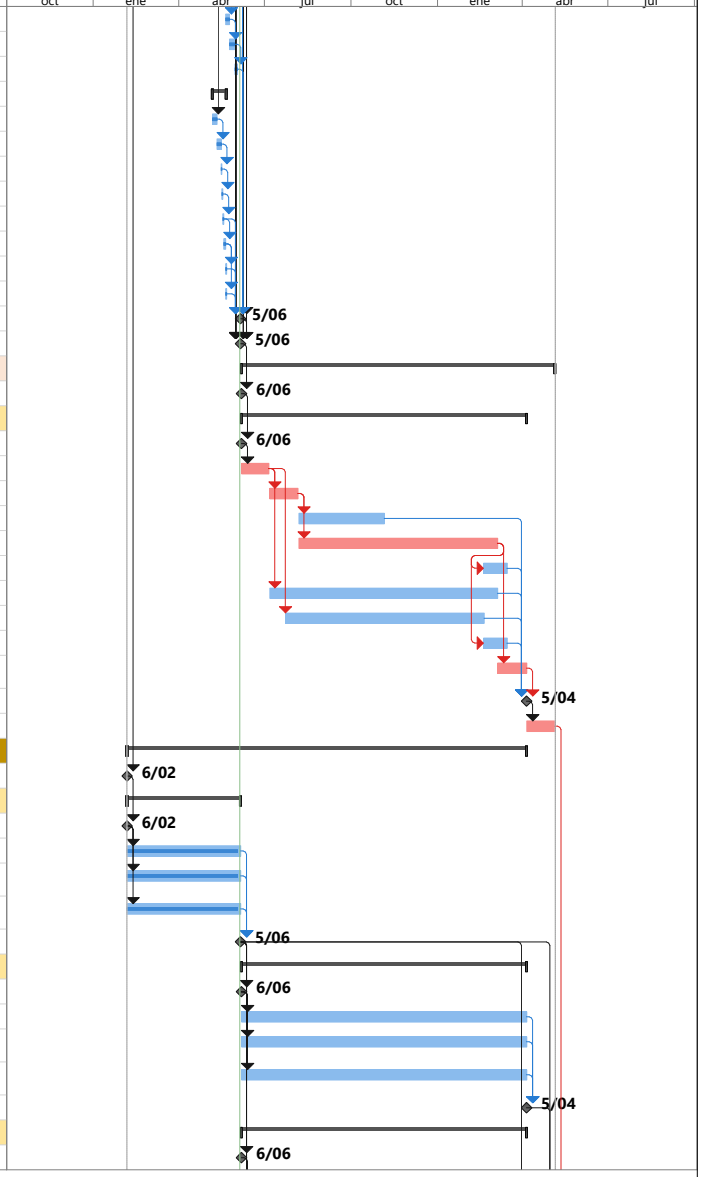

Proyecto: IDU-1771-2023-FRAN
Fecha: mié 5/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% Ejecutado Físico	% completado decimales	% Ejecutado Físico decimales	% Planeado Financiero
353		1.4.4.2	VALOR PARA ACTIVIDADES DE ACERO	279 días	jue 6/06/24	sáb 5/04/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
354		1.4.4.3	COMPONENTE DE ENSAYOS DE LABORATORIO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	279 días	jue 6/06/24	sáb 5/04/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
355		1.4.4.4	FONDO ESPECIAL PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	279 días	jue 6/06/24	sáb 5/04/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
356		1.4.4.5	FONDO DE COMPENSACIONES	279 días	jue 6/06/24	sáb 5/04/25	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
357		*1.4.4.6*	*Fin componentes / fondos*	*0 días*	*sáb 5/04/25*	*sáb 5/04/25*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
358		*1.4.5*	*Fin componente de gestión / fondos*	*0 días*	*sáb 5/04/25*	*sáb 5/04/25*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
359		*1.5*	*FIN PROYECTO*	*0 días*	*lun 5/05/25*	*lun 5/05/25*	0%	0%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*

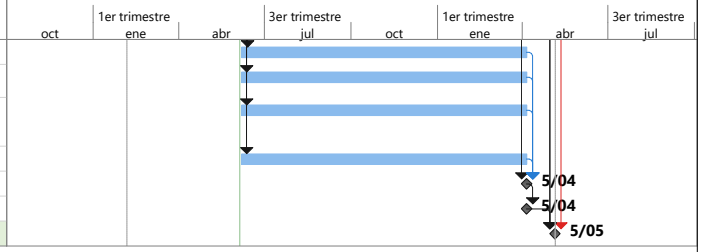

Proyecto: IDU-1771-2023-FRAN
Fecha: mié 5/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	
