INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

CONTRATO No. 2000.13.03.001-2024

OBJETO DEL CONTRATO : "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA DEL AGUA,

CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/02/2024 AL 31/03/2024

Nombre del Supervisor: MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO
Nombre del Apoyo del supervisor: JOHANNA JORDÁN ORTIZ

CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S

FECHA: MARZO DE 2024

FIRMA : _____
SUPERVISOR

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

PERIODO: 13/02/2024 AL 31/03/2024

INFORME No.: 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 2000.13.03.001-2024

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	
1	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
2	EJECUCION FINANCIERA		
3	CONTROL DE GARANTÍAS		
4	ASPECTOS TÉCNICOS		
5	SEGURIDAD SOCIAL		
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
7	REGISTRO FOTOGRAFICO		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No.: 1		PERIODO: 13/02/2024 AL 31/03/2024	
PROYECTOS: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, FASE 7			
ESTUDIOS Y DISENOS	OBRA	OTRO X	ESPECIFIQUE: SUMINISTRO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO

1.1 Identificación del Contrato / Convenio

CONTRATO No.	2000.13.12.004-2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, FASE 7
CONTRATISTA:	CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
NIT	860.008.495-9

1.2. Plazos del Contrato / Convenio

FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	9/02/2024
FECHA DE ACTA DE INICIO	13/02/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15/12/2024
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN:	N.A
FECHA DEL ACTA DE REINICIO	N.A
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI NO._:	
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI NO._:	
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI NO._:	
OTRO SI NO._:	

1.3 Valor del Contrato / Convenio

VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA/CONVENIO:	$ 2.497.215.000,00
OTRO SÍ EN VALOR :	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 2.497.215.000,00
ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO Y FECHA	
No. de CDR	16071 DEL 16-11-2023
CARTA DE VIABILIZACION DEL MVCT Y FECHA (si aplica)	N.A

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No.: 1 | PERIODO: 13/02/2024 AL 31/03/2024

2. EJECUCION FINANCIERA

Concepto	Fecha Acta (dd/mm/aa)	Valor del Acta	% Ejecución	Amortización Anticipo	Valor Total Pagado	Estado
Anticipo (__%)	N.A					
Acta No. 1	20-feb.-2024	$ 499.443.000	20%	$ -	$ 499.443.000,00	PAGADO
Acta No. 2						
Acta No. 3						
Acta No. 4						
Acta No. 5						
Acta No. 6						
TOTALES		**$ 499.443.000,00**		**$ -**	**$ 499.443.000,00**	

De acuerdo a lo anterior, el presente informe describe las actividades de supervisión efectuadas durante el PERIODO: 13/02/2024 AL 31/03/2024, de acuerdo al Manual del Interventoría de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME No.: 1		PERIODO: 13/02/2024 AL 31/03/2024

3. CONTROL DE GARANTIAS

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Observaciones
				Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 499.443.000,00	21-44-101434738	Seguros del Estado S.A	9-feb.-2024	9-jun.-2025	Resolución aprobación 2000.45.03.047-2024 del 13-02-2024
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Personal	$ 124.860.750,00	21-44-101434738	Seguros del Estado S.A	9-feb.-2024	10-dic.-2027	Resolución aprobación 2000.45.03.047-2024 del 13-02-2024
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						
Calidad del Servicio	$ 499.443.000,00	21-44-101434738	Seguros del Estado S.A	9-jun.-2025	10-dic.-2025	Resolución aprobación 2000.45.03.047-2024 del 13-02-2024
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						
Responsabilidad contractual	$ 520.000.000,00	21-40-101226435	Seguros del Estado S.A	25-ene.-2024	25-nov.-2024	Resolución aprobación 2000.45.03.047-2024 del 13-02-2024
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No.: 1 | PERIODO: 13/02/2024 AL 31/03/2024

4. ASPECTOS TÉCNICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1

Informe	Fecha de Corte
1. EL CONTRATISTA PRESENTA EL PRODUCTO 1, CORRESPONDIENTE A LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, DOCUMENTO QUE DA CUENTA DE COMO Y QUE PROCEDIMIENTOS SE SEGUIRAN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN CADA UNA DE SUS ETAPAS Y FRENTES DE TRABAJO, DOCUMENTO EL CUAL SE REVISA Y SE PROCEDE A REALIZARLE ALGUNAS OBSERVACIONES EN TEMAS DE LOGOS Y ERRORES, QUE FUERON CORREGIDOS POR EL CONTRATISTA. 2. EL CONTRATISTA PRESENTA EL PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE A UN INFORME DONDE SE CONSOLIDA LA FASE DE DIAGNÓSTICO Y SOCIALIZACIÓN EJECUTADA EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, A TRAVES DE INFORMES, ESTOS DOCUMENTOS PRESENTAN POR CADA MUNICIPIO UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL: SOCIAL, ECONÓMICO, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL. 3. EL CONTRATISTA PRESENTA LA CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 1 Y 2 DEL CONTRATO, QUE EQUIVALEN AL 20% DEL VALOR TOTAL DEL MISMO, SE REVISA INFORMACIÓN ENTREGADA Y SE PROCEDE A PASARLO AL ÁREA FINANCIERA PARA PAGO. SE DISPONE INFORMACIÓN EN EL SECOP II. 4. SE PRESENTA EL CONTRATISTA Y EL PROYECTO, MEDIANTE DOCUMENTO ESCRITO DIRIGIDO A LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EL CONTRATO. 5. EL CONTRATISTA REALIZA UN PRIMER ACERCAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTABLECIDAS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR - VEREDA EL EDEN: I.E PRIMAVERA, CANDELARIA:: I.E MANUELA BELTRÁN Y FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN EL CORREGIMIENTO DE BUCHITOLO, RIOFRÍO - CORREGIMIENTO PORTUGAL: I.E ALFREDO GARRIDO TOVAR, ROLDANILLO - VEREDA CAJAMARCA: I.E. BELISARIO PEÑA PIÑEIRO Y YOTOCO: I.E. SAN JUAN BOSCO EN CORREGIMIENTO LAS DELICIAS Y GABRIELA MISTRAL EN CORREGIMIENTO PUENTE TIERRA.DURANTE ESTAS VISITAS, SE SOCIALIZA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL PROYECTO Y SE ESTABLECE EL MEJOR LUGAR PARA INSTALAR LAS PTAP A SUMINISTRAR.	31/03/2024

4.2 Reporte de las fichas de seguimiento entregados por el contratista (Si aplica)

Ficha de Seguimiento	Fecha de Corte
N.A	


4.3 Avance de ejecución

El avance físico estimado del proyecto hasta la fecha del presente informe es 1,5%

1. Porcentaje de obra física ejecutada a fecha de corte del informe de interventoría: 1,5%.

4.4 Cronograma

FECHA (dd/mm/aa)	% AVANCE	VALOR DE ACTA DE AVANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA
9/02/2024	0,00%	$ -	0,00%
20/02/2024	20,00%	$ 499.443.000,00	20,00%

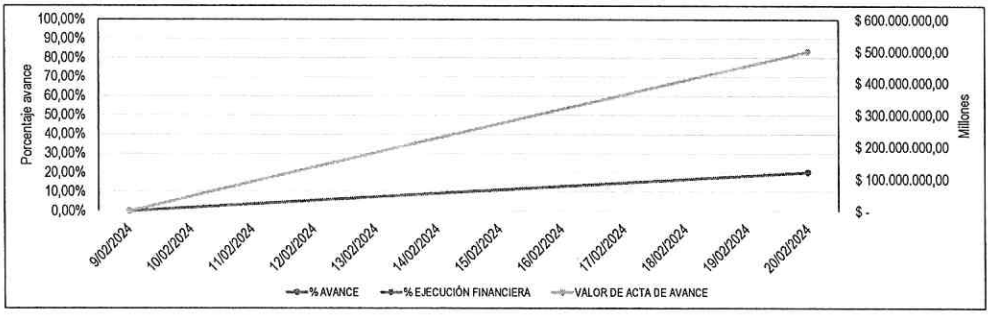

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No.: 1	PERIODO: 13/02/2024 AL 31/03/2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjuntó las planillas de pago de seguridad social conforme a la ley, lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato que figura en la propuesta y la del representante legal.

6. CONCLUSIONES


El contratista ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S ha presentado los productos correspondientes de acuerdo a los requerimientos de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., mostrando su ejecución tal como lo estipula el contrato de interventoria.

Firma del Supervisor Contrato No. 2000.13.03.001-2024
Área Técnica - Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.


Elaborado : Ing. JOHANNA JORDÁN ORTIZ
Revisado por: MIGUEL E. ZULUAGA - Director Técnico
Aprobado por : Ing. Miguel Zuluaga - Director Técnico, Luis Eduardo Pineda - Director Jurídico, José Edilso Rueda - Director Financiero

INFORME No.: 1	PERIODO: 13/02/2024 AL 31/03/2024

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

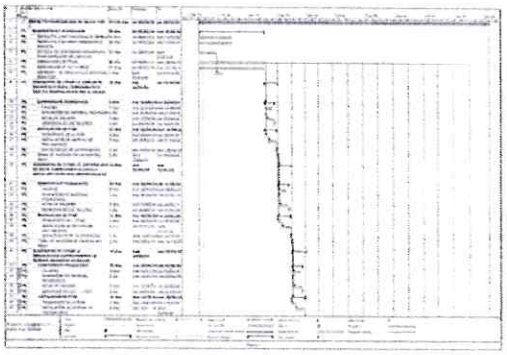


Producto 1: Cronograma y Plan de Trabajo

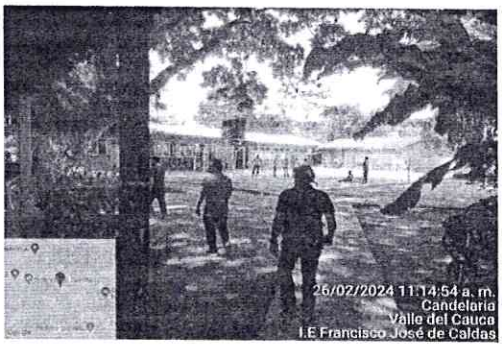

Visita prediagnóstico I.E. Fco José Caldas - Buchitolo - Candelaria



Visita prediagnóstico I.E. Manuela Beltrán - Buchitolo - Candelaria

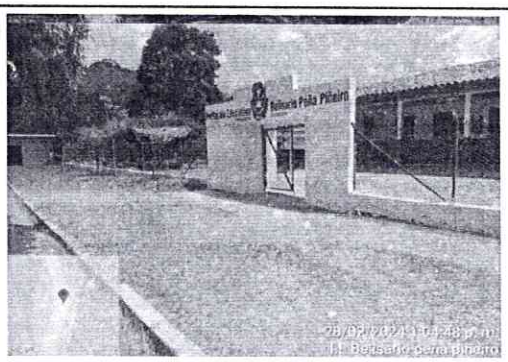

Visita prediagnóstico I.E. Belisario Peña Piñeiro - Roldanillo



Visita prediagnóstico I.E. San Juan Bosco - Las Delicias - Yotoco



Visita prediagnóstico I.E. Gabriela Mistral - Puente Tierra - Yotoco
