INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

CONTRATO No. 2000.13.03.001-2024

OBJETO DEL CONTRATO : "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA DEL AGUA,

CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/04/2024 AL 31/05/2024

Nombre del Supervisor: MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO
Nombre del Apoyo del supervisor: JOHANNA JORDÁN ORTIZ

CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S

FECHA: MAYO DE 2024

FIRMA : _____
SUPERVISOR

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

PERIODO: 01/04/2024 AL 31/05/2024

INFORME No.: 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 2000.13.03.001-2024

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	
1	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
2	EJECUCION FINANCIERA		
3	CONTROL DE GARANTÍAS		
4	ASPECTOS TÉCNICOS		
5	SEGURIDAD SOCIAL		
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
7	REGISTRO FOTOGRAFICO		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No.: 2		PERIODO: 01/04/2024 AL 31/05/2024	
PROYECTOS: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, FASE 7			
ESTUDIOS Y DISENOS	OBRA	OTRO X	ESPECIFIQUE: SUMINISTRO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO

1.1 Identificación del Contrato / Convenio

CONTRATO No.	2000.13.12.004-2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, FASE 7
CONTRATISTA:	CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
NIT	860.008.495-9

1.2. Plazos del Contrato / Convenio

FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	9/02/2024
FECHA DE ACTA DE INICIO	13/02/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15/12/2024
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN:	N.A
FECHA DEL ACTA DE REINICIO	N.A
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI NO._:	
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI NO._:	
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI NO._:	
OTRO SI NO._:	

1.3 Valor del Contrato / Convenio

VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA/CONVENIO:	$ 2.497.215.000,00
OTRO SÍ EN VALOR :	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 2.497.215.000,00
ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO Y FECHA	
No. de CDR	16071 DEL 16-11-2023
CARTA DE VIABILIZACION DEL MVCT Y FECHA (si aplica)	N.A

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No.: 2	PERIODO: 01/04/2024 AL 31/05/2024

2. EJECUCION FINANCIERA

Concepto	Fecha Acta (dd/mm/aa)	Valor del Acta	% Ejecución	Amortización Anticipo	Valor Total Pagado	Estado
Anticipo (__%)	N.A					
Acta No. 1	20-feb.-2024	$ 499.443.000	20%	$ -	$ 499.443.000,00	PAGADO
Acta No. 2	20-may.-2024	$ 998.886.000	40%		$ 998.886.000,00	
Acta No. 3						
Acta No. 4						
Acta No. 5						
Acta No. 6						
TOTALES		**$ 1.498.329.000,00**		**$ -**	**$ 1.498.329.000,00**	

De acuerdo a lo anterior, el presente informe describe las actividades de supervisión efectuadas durante el PERIODO: 01/04/2024 AL 31/05/2024, de acuerdo al Manual del Interventoría de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No.: 2	PERIODO: 01/04/2024 AL 31/05/2024

3. CONTROL DE GARANTIAS

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Observaciones
				Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 499.443.000,00	21-44-101434738	Seguros del Estado S.A	9-feb.-2024	9-jun.-2025	Resolución aprobación 2000.45.03.047-2024 del 13-02-2024
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Personal	$ 124.860.750,00	21-44-101434738	Seguros del Estado S.A	9-feb.-2024	10-dic.-2027	Resolución aprobación 2000.45.03.047-2024 del 13-02-2024
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						
Calidad del Servicio	$ 499.443.000,00	21-44-101434738	Seguros del Estado S.A	9-jun.-2025	10-dic.-2025	Resolución aprobación 2000.45.03.047-2024 del 13-02-2024
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						
Responsabilidad contractual	$ 520.000.000,00	21-40-101226435	Seguros del Estado S.A	25-ene.-2024	25-nov.-2024	Resolución aprobación 2000.45.03.047-2024 del 13-02-2024
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No.: 2	PERIODO: 01/04/2024 AL 31/05/2024

4. ASPECTOS TÉCNICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1

Informe	Fecha de Corte
A. EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PRODUCTOS 3, 4 Y 5 : PRODUCTO 3: FASE II: CAPACITACIÓN, Y FORMACIÓN EN TEMAS DE AGUA (ACTAS, LISTADOS ASISTENCIA, FOTOS) PRODUCTO 4: FASE III: SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (CARTILLAS, KIT DE TRATAMIENTO) - (ACTAS, FOTOS) PRODUCTO 5:INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DE ALMACENAMIENTO (ACTAS, FOTOS) EJECUTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE: 1. PTAP BOLÍVAR VEREDA EL EDÉN - I.E PRIMAVERA 2. PTAP BUGA CORREGIMIENTO LA MARÍA - I.E NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 3. PTAP CANDELARIA CORREGIMIENTO BUCHITOLO - I.E FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 4. PTAP CANDELARIA CORREGIMIENTO BUCHITOLO - I.E MANUELA BELTRÁN 5. PTAP RIO FRIO CORREGIMIENTO PORTUGAL - I.E ALFREDO GARRIDO TOVAR 6. PTAP ROLDANILLO VEREDA CAJAMARCA - I.E BELISARIO PEÑA PIÑERO 7. PTAP YOTOCO CORREGIMIENTO LAS DELICIAS - I.E SAN JUAN BOSCO 8. PTAP YOTOCO CORREGIMIENTO PUENTE TIERRA - I.E GABRIELA MISTRAL DOCUMENTOS LOS CUALES SE REVISAN Y SE PROCEDE A REALIZARLES ALGUNAS OBSERVACIONES EN TEMAS COMO FALTANTES DE FOTOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA COMPLEMENTA LA INFORMACIÓN. B. EL CONTRATISTA ENTREGA LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PRODUCTOS 3, 4 Y 5 DEL CONTRATO, QUE ACORDE A LA CLAUSULA SEGUNDA *PAGOS A TRAVÉS DE ACTAS PARCIALES, CADA UNO DE ELLOS EQUIVALENTE AL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO, CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 3, 4 Y 5 DE CADA UNA DE LAS 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS* AL ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE A 8 I.E., EL COBRO EQUIVALE AL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SE REVISA CUENTA, SE GENERA ACTA DE PAGO Y SE PROCEDE A PASARLO AL ÁREA FINANCIERA C. SE DISPONE INFORMACIÓN DE PAGO Y PRODUCTOS, EN EL SECOP II. D. CONTRATISTA INICIA ACERCAMIENTOSL CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTABLECIDAS EN LOS MUNICIPIOS DE: 1. PTAP ANSERMANUEVO - I.E ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 2. PTAP BUGALAGRANDE CORREGIMIENTO CEYLÁN - I.E AGRICOLA CENTRAL 3. PTAP BUGALAGRANDE CORREGIMIENTO CHORRERAS - I.E ANTONIO NARIÑO 4. PTAP BUGALAGRANDE CORREGIMIENTO GALICIA - I.E MARIANO GONZALEZ 5. PTAP EL AGUILA VEREDA SANTA MARTHA - I.E CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL 6. PTAP SAN PEDRO CORREGIMIENTO BUENOS AIRES - I.E JULIO CAICEDO TÉLLEZ 7. PTAP VERSALLES CORREGIMIENTO LA FLORIDA - I.E MEGACOLEGIO DURANTE ESTAS VISITAS SE SOCIALIZA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL PROYECTO Y SE ESTABLECE EL MEJOR LUGAR PARA INSTALAR LAS PTAP A SUMINISTRAR.	31/05/2024

Ficha de Seguimiento	Fecha de Corte
N.A	


4.3 Avance de ejecución

Porcentaje total ejecutado a fecha de corte del informe: 60%.

1. El avance estimado del proyecto durante el periodo reportado en este informe es 40%
2. El avance considera 8 instituciones Educativas capacitadas, con PTAP y Kit Suministrados

4.4 Cronograma

FECHA (dd/mm/aa)	% AVANCE	VALOR DE ACTA DE AVANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA
9/02/2024	0,00%	$ -	0,00%
20/02/2024	20,00%	$ 499.443.000,00	20,00%
20/05/2024	40,00%	$ 998.886.000,00	40,00%

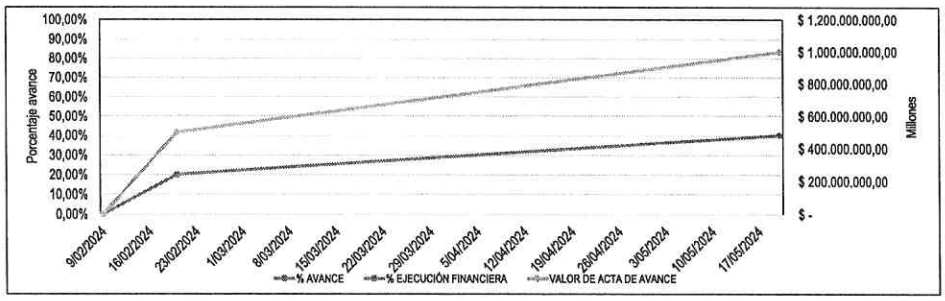

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE SUMINISTRO**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No.: 2	PERIODO: 01/04/2024 AL 31/05/2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjuntó las planillas de pago de seguridad social conforme a la ley, lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato que figura en la propuesta y la del representante legal.

6. CONCLUSIONES

El contratista ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S ha presentado los productos correspondientes de acuerdo a los requerimientos de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., mostrando su ejecución tal como lo estipula el contrato de interventoria.

Firma del Supervisor Contrato No. 2000.13.03.001-2024
Área Técnica - Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.

Elaborado : Ing. JOHANNA JORDÁN ORTIZ

Revisado por: MIGUEL E. ZULUAGA - Director Técnico

Aprobado por : Ing. Miguel Zuluaga - Director Técnico, Luis Eduardo Pineda - Director Jurídico, José Edilso Rueda - Director Financiero

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Producto 3: I.E. BELISARIO PEÑA PIÑEIRO




Producto 3: I.E. NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA




Producto 4: I.E. ALFREDO GARRIDO TOVAR



Producto 4: I.E. PRIMAVERA

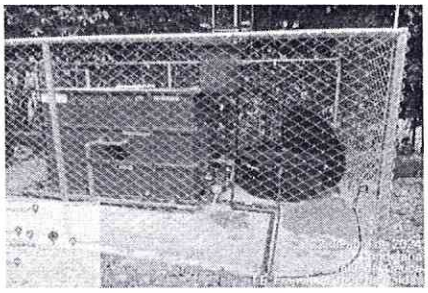

Producto 5: I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

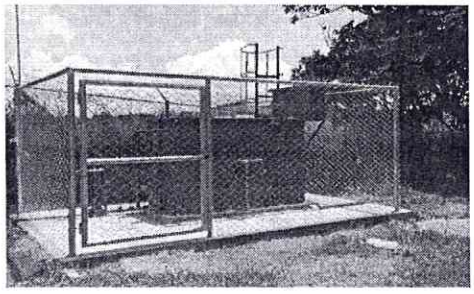

Producto 5: I.E. GABRIELA MISTRAL
