DOCUMENTOS PAGOS PARCIALES	SI	NO
Informe de Supervisión		
Factura y/o cuenta de cobro		
Acta Parcial (adjunto memoria de cantidades ejecutadas)		
Informe de obra (incluye ensayos y soportes que apliquen)		
Bitacora de obra		
Registro fotográfico (digital)		
Informe de Interventoría		
Acta de conformación de veeduría (mínimo 2 veedores)		
Pago seguridad social (EPS - ARP - AFP), incluye equipo de trabajo presentado en la propuesta por el periodo de cobro.		
Certificación Contador con sus respectivos documentos		
Certificado bancario		

Para el cobro de la primera Acta Parcial se debe adicionar:	SI	NO
Copia CDP		
Copia Contrato de obra		
Copia RP		
Copia Pólizas aprobadas		
Copia Acta de Inicio		
Copia de cedula		
Copia del RUT		

Para el cobro de Actas parciales en las que aplique.	SI	NO
Copia adiciones y prorrogas (en el periodo de cobro en que aplique)		
Copia Suspensiones y reinicios (en el periodo de cobro en que aplique)		

DOCUMENTOS PAGO FINAL	SI	NO
Infirme de Supervisión		
Factura y/o cuenta de cobro	✓	
Acta Final (adjunto memoria de cantidades ejecutadas)	✓	
Informe de obra (incluye ensayos y soportes que apliquen)	✓	
Bitacora de obra	✓	
Registro fotográfico (digital)	✓	
Planos de obra Record	✓	
Informe de Interventoría	✓	
Acta de cierre de veeduría	✓	
Pago seguridad social (EPS - ARP - AFP), incluye equipo de trabajo presentado en la propuesta por el periodo de cobro.	✓	
Certificación Contador con sus respectivos documentos	✓	
Parafiscales (pago ICBF, SENA, Oficina de Trabajo)	✓	
Justificación de imprevistos avalado por la Interventoría	✓	
Certificado bancario	✓	
Acta de terminación	✓	
Acta de liquidación		N.A.
Soporte de rendimientos financieros		N.A.
Pólizas finales extendidas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil	✓	

Nota: Se deben entregar 2 paquetes de los documentos que apliquen para cada cobro, en físico y digital.

1. INFORME DE SUPERVISION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA NIT. Calle 4 N° 6 - 68 Código Postal: 415040 Tel. 837 80 31 - alcaldia@paicol-huila.gov.co INFORME DE SUPERVISIÓN	Version 1.0 Fecha: 01-03-24024 CÓDIGO: GG-120-18.09 Pagina 1 de 1	mipg

Fecha de Elaboración	16/10/2024
Supervisor del contrato	ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato No.	142 de 2023	**Tipo de Contrato**	OBRA	**Modalidad**	LICITACIÓN PÚBLICA	**Valor**	$715.214.130	**Plazo**	4 meses y 27 días
Objeto del contrato	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA".								
Contratista	GRUPO MSG S.A.S.			**NIT.**	901.110.550-1.	**Representante Legal**		ANA COROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ.	
Fecha suscripcion contrato	25/07/2023	**CDP N°**	2023000204	**RP N°**	2023000634	**Banco de proyectos N°**		2022415180020	
Póliza Cumplimiento N°	33-44-101240822	**Póliza Respons. Civil N°**				**Fecha aprobación pólizas**		15 de agosto de 2023	
Fecha acta inicio	5/09/2023			**Fecha de Terminación**		8/06/2024			

Forma de pago: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

MODIFICACIONES

Modificaciones	**SI**	x	**NO**					
Tipo de modificación	**Fecha**			**Detalle de la modificación**				
Modificación cantidades y adición de plazo	29/11/2023			**Otrosi N°**	1	**Prorroga N°**	1	
Prorroga N° 01 - Otrosí N° 01	2/12/2023			**Tiempo adicional**	Hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023.			
Suspensión N° 01	27/12/2023			**Tiempo total**	Tres (03) meses y veintisiete (27) días.			
Reinicio	9/05/2024			**Otrosi N°**	2	**Prorroga N°**	2	
Prorroga N° 02 - Otrosí N° 02	9/05/2024			**Tiempo adicional**	UN (01) MES, a partir del vencimiento de la prorroga N° 01.			
Acta de Terminación	8/06/2024			**Tiempo total**	Cuatro (04) meses y veintisiete (27) días.			

NOTAS:	Las Modificaciones como Otrosí N° 01, Otrosí N° 02, Suspensión N° 01 y Reinicio, cuentan con la respectiva actualización de pólizas y aprobación.
	Con relación al Acta de Modificación de cantidades y adición de plazo suscrita el día veintinueve (29) de noviembre de 2023, la Administración Municipal aclara:
	1. Que el documento se conoció una vez se dio terminación al Contrato de obra, por lo que la misma no hizo parte del expediente enviado para la Refrendación de Reservas. 2. Que el documento no se encuentra cargado en la Plataforma Secop ii. 3. Que el documento no cuenta con la respectiva actualización de pólizas. 4. Que el Acta de modificación es posterior en fecha a los pagos N° 1 y N° 2, donde se cobrarón en algunos items actividades mayores a las establecidas en el presupuesto oficial inicial, sin tener vigente en los pagos 1 y 2 de obra, la modificación de mayores y menores cantidades. Los pagos fueron realizados y autorizados en la vigencia 2023.
	Que los formatos de Actas Parciales no corresponden al formato de Presupuesto tipo establecido para Procesos de Licitación, por el contrario se evidencia que desglosan los valores unitarios y los establecen en cada item sin A.I.U., ésto, debido que el Costo de A.I.U. (30%) lo calculan y suman después del Total de Costo Directos; aclarando que la suma establecida para IMPREVISTOS del contrato se cobrará en elActa final del Contrato (5% final).

Fecha acta de liquidación	N.A

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato	$715.214.130,00				
A) Pago Parcial N° 01:					
Periodo Objeto de pago	05/09/2023 al 28/09/2023				
Acta Parcial/Final	ACTA PARCIAL N° 01	**Fecha acta Parcial/Final**	27/09/2023	**factura N°**	FELE 92
Valor Acta	**$214.320.330,00**	**(%) De Ejecución**	29,97%	**Fecha factura**	28/09/2023

B) Pago Parcial N° 02:					
Periodo Objeto de pago	29/09/2023 al 31/10/2023				
Acta Parcial/Final	ACTA PARCIAL N° 02	**Fecha acta Parcial/Final**	31/10/2023	**factura N°**	FELE 93
Valor Acta	**$183.761.158,00**	**(%) De Ejecución**	25,69%	**Fecha factura**	1/11/2023

C) Pago Parcial N° 03:					
Periodo Objeto de pago	01/11/2023 al 02/12/2023				
Acta Parcial/Final	ACTA PARCIAL N° 03	Fecha acta Parcial/Final	21/12/2023	factura N°	FELE 100
Valor Acta	$223.503.078,70	(%) De Ejecución	31,25%	Fecha factura	27/12/2023

D) Pago Parcial N° 04:					
Periodo Objeto de pago	03/12/2023 al 27/12/2023				
Acta Parcial/Final	ACTA PARCIAL N° 04	Fecha acta Parcial/Final	1/06/2024	factura N°	FELE 109
Valor Acta	$57.882.330,00	(%) De Ejecución	8,09%	Fecha factura	13/08/2024

D) Pago Final:					
Periodo Objeto de pago	09/05/2024 al 08/06/2024				
Acta Parcial/Final	ACTA FINAL	Fecha acta Parcial/Final	10/06/2024	factura N°	FELE 111
Valor Acta	$26.042.677,00	(%) De Ejecución	5,00%	Fecha factura	16/10/2024
Valor imprevistos pendientes de pago	$9.704.556,30				
Valor total del acta final	$35.747.233,30				

RESUMEN			
Descripción	Valor	Valor pagado	Saldo
Valor inicial del contrato	$715.214.130,00		
Valor acta Parcial N° 01		$214.320.330,00	$500.893.800,00
Valor acta Parcial N° 02		$183.761.158,00	$317.132.642,00
Valor acta Parcial N° 03		$223.503.078,70	$93.629.563,30
Valor acta Parcial N° 04		$57.882.330,00	$35.747.233,30
Valor acta Final		$35.747.233,30	$0,00
Totales	$715.214.130,00	$715.214.130,00	$0,00

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se recibe a satisfacción por parte de la Secretaria de Planeación y obras Públicas la ejecución del 5% del contrato, con el avance de las actividades correspondientes a:

1. Vereda Alto Granadillo. Tramo 5. Avance desde abscisa km 000+050 a km 000+080 en actividades de:
Ítem 2.1 Excavación mecánica (Explanación) ESP 210-13 INVIAS. Incluye retiro de material proveniente de la excavación a disposición final del mismo.
Ítem 2.4 Acero de refuerzo 4200 kg/cm2 (60000psi) ESP. 640-13INVIAS Para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones.
Ítem 2.5 Suministro e instalación de concreto normal clase D. (F'c=210kg/cm2) o (3000 psi) para dentellones, placas, riostras, cunetas y bordillos.

2. Vereda La Cumbre. Tramo 7: Avance desde abscisa km 000+000 km a 000+050 en actividades de:
Ítem 2.3 Suministro, instalación, extendida, nivelación, humedecimiento o aireación y compactación de subbase granular CBR ≥ 40%. esp. 320-13 inv. Ítem 2.4 Acero de refuerzo 4200kg/cm2 (60000psi) ESP. 640-13INVIAS Para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones.
Ítem 2.5 Suministro e instalación de concreto normal clase D. (F'c=210kg/cm2) o (3000 psi) para dentellones, placas, riostras, cunetas y bordillos Ítem 3.1 Suministro e instalación de solado de limpieza en concreto normal clase f-(f'c= 140kgf/cm2), para obras de arte. Ítem 3.2 Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f'c=210 kgf/cm2), para construcción de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobre piso de alcantarillas.
Ítem 3.4 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2 (60.000 psi) esp. 640-13 inv. para alcantarilla, box, muros, incluye transporte. Ítem 3.5 Suministro e instalación material granular filtrante, esp. 673-13 inv.

La Secretaria de Planeación y Obras Públicas, certifica que se ha realizado supervisión al Contrato de Obra N° 142 de 2023, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA", verificando su cumplimiento conforme a lo estipulado en el presupuesto oficial, con responsabilidad y cumpliendo con lo estipulado en el proceso de contratación, en el periodo comprendido desde el 09 de mayo de 2024 al 08 de junio de 2024.

OBSERVACIONES

A la fecha de cierre del periodo de ejecución del presente informe de Supervisión, se recibe a satisfación la ejecución del 5% final del contrato de obra.

Con el presente Informe de Supervisión se recibe a satisfacción y se avala el 5% restante de ejecución del contrato en el periodo comprendido entre el 09 de mayo al 08 de junio, para un avance financiero y físico acumulado del 100% según como se establece en la forma de pago del contrato.

En calidad de Supervisor del Contrato de Obra N° 142 de 2023, aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista ha cumplido a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que en cumplimiento de la cláusula dieciocho. Garantás , del contrato, se verifica la existencia de la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual de las obligaciones contraídas por parte del contratista, las cuales se encuentran constituidas y aprobadas.

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de las planillas adjuntas al presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.



REGISTRO FOTOGRÁFICO







El Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra N° 142 de 2023, aclara que el avance financiero y lo establecido en el presente Informe, concuerda con la información reportada por el Contratista de obra, a fecha del 09 de mayo de 2024 donde se reportó avance del 5% final.

Para constancia se firma a los 16 días del mes de octubre de 2024.

Firma Supervisor del Contrato

Nombre

ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

GRUPO MSG SAS

NIT 901110550-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764062859331
Fecha 28/12/2023 - 28/12/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FELE101 al FELE250
Email: contabilidad2019.msg@gmail.com
Teléfono: 3215005499

Departamento	Fecha		
Huila	16	10	2024

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° FELE111

Cliente:	MUNICIPIO DE PAICOL	**NIT:**	891180194	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	MCP DE PAICOLALCALDIA MUNICIPAL	**Departamento:**	Huila	**Teléfono:**	6018378031
Email:	municipiopaicol@hotmail.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	14:00:46-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 4					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	Costo Directo	1,00	CD CORTE No.5 MEJORAMIENTO DE VÍASTERCIARIASMEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA ENSITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIOPAICOLDEPARTAMENTO DEL HUILA	EA				$17.202.855,00	$17.202.855,00
2	AIU 2	1,00	Imprevistos	EA				$9.704.556,00	$9.704.556,00
3	SERV	1,00	COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT)	WSD				$3.264.000,00	$3.264.000,00
4	SERV	1,00	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	WSD				$5.575.822,00	$5.575.822,00

Notas:

SON: (treinta y cinco millones setecientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y tres pesos)
CUFE:

Subtotal:	$35.747.233,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$35.747.233,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

3. ACTA FINAL

	OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA".							
	CONTRATO Nº:	140 DE 2023	CONTRATISTA:	GRUPO MSG S.A.S	FECHA INICIO:	05 SEPTIEMBRE 2023	PLAZO INICIAL:	3 MESES	ACTA:	FINAL
	TIPO CONTRATO:	OBRA	NIT:	901.192.591-1	MODIF. CANT. Y PLAZO:	29 NOVIEMBRE 2023	PRÓRROGA Nº 1:	HASTA 31/12/2023 (27 DIAS)	ACTA Nº:	5
	MODALIDAD:	LICITACIÓN PÚBLICA	REPRES. LEGAL:	ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	PRÓRROGA Nº 1:	30 DICIEMBRE 2023	PRÓRROGA Nº 2:	1 MES	FECHA ACTA:	30 DE JUNIO 2024
	POLIZA CUMPLIM:	33-44-101040822	C.C.	1.019.015.582	SUSPENSIÓN Nº 1:	27 DICIEMBRE 2023	PLAZO TOTAL:	4 MESES 27 DIAS	VALOR ACTA:	$36.747.233,30
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA	POLIZA R. CIVIL:	33-40-101075706	INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	REINICIO:	26 MAYO 2024	VALOR INICIAL:	$715.214.130	% EJECUTADO:	100%
	CDP:	2023000204	REPRES. LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS	PRÓRROGA Nº 2:	30 MAYO 2024	VALOR ADICIONAL:	$0	SALDO POR PAGAR:	$0,00
NIT: 813.1.580.154-4	RP:	2023000834	SUPERVISOR:	MIGUEL ALBERTO DURÁN S.	FECHA TERMINACIÓN:	06 JUNIO 2024	VALOR TOTAL:	$715.214.130		

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				ACTA PARCIAL Nº 1		ACTA PARCIAL Nº 2		ACTA PARCIAL Nº 3		ACTA PARCIAL Nº 4		ACTA FINAL 5%		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL	CANT. ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	CANT. ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	CANT. ACTA 3	VALOR TOTAL ACTA 3	CANT	VALOR TOTAL	CANT. ACTA FINAL	VALOR TOTAL ACTA FINAL	CANT. ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES				$2.068.413				$2.376.269		$1.106.799		$327.709		$942.310		$0,00		$0,00		$2.376.269
1,1	Localización y replanteo	ML	510,00	$4.207	$2.068.413	+	70,0	580,00	$ 2.376.269	272,89	$1.106.799	80,30	$327.709	230,06	$942.310	0,00	$ 0,00		$0,00	580,00	$2.376.269
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA				$863.258.894				$870.101.970		$216.538.599		$182.916.710		$268.841.864		$ 48.295.391		$154.298.414		$870.101.970
2,1	Excavación mecánica (explanación), esp. 2/0-13 inv. incluye retiro de material proveniente de la excavación a disposición final del mismo.	M3	225,00	$57.671	$13.148.987	+	460,72	678,72	$ 39.142.461	334,57	$19.294.686	229,86	$13.256.258	42,21	$2.434.293	72,06	$ 4.156.925			678,72	$39.142.461
2,2	Excavación manual en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.)	M3	58,00	$67.027	$3.887.589	-	-31,41	26,60	$ 1.782.918	0,00	$0	15,30	$1.025.513	11,30	$757.405	0,00	$ 0,00			26,60	$1.782.918
2,3	Suministro, instalación, extendida, nivelación, humedecimiento o aireación y compactación de subbase granular con ≥ 40% esp. 325-13 inv.	M3	324,00	$157.583	$51.105.523	+	84,90	408,90	$ 64.599.240	125,45	$19.845.992	176,25	$27.644.504	105,75	$16.208.702	1,45	$ 229.075			408,90	$64.599.249
2,4	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-13 inv. para placas, mochos, cunetas, bordillos y cordelones	KG	21538,90	$9.099	$196.706.410	+	1481,90	23299,80	$ 212.004.880	7178,80	$65.302.813	5380,20	$48.954.440	8583,80	$78.103.996	2156,50	$ 19.643.631			23299,80	$212.004.880
2,5	Suministro e instalación de concreto normal clase d - (f´c=210 kg/cm2) o (3.000 psi) para dentellones- placas - mochos - cunetas - bordillo	M3	365,00	$762.466	$289.600.420	-	-13,70	371,30	$ 279.390.626	118,65	$87.775.158	71,71	$53.959.337	131,09	$99.092.349	29,59	$ 22.295.469	21,66	$16.298.414	371,30	$279.390.626
2,6	Suministro e instalación de concreto ciclópeo de 210 kg/cm² (3.000 psi) superior 0,15 m.60% concreto normal de 210 kg/cm² (3.000 psi) , 40% piedra esp. 630-13 inv. para bordes	M3	93,00	$501.376	$46.627.965	+	52,96	145,96	$ 73.181.844	48,60	$24.368.874	73,93	$37.066.728	23,43	$11.747.240	0,00	$ 0,00			145,96	$73.181.844
3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS ALCANTARILLAS (6)				$691.626.011				$33.896.870		$0		$0.195.544		$17.209.209		$11.397.825,50		$904.441		$33.896.870
3,1	Suministro e instalación de solado de limpieza en concreto normal clase f (f'c=140 kg/cm2), para obras de arte.	M3	18,00	$285.691	$10.564.646	-	-16,35	1,65	$ 974.239	0,00	$0	0,00	$0	1,26	$751.220	0,38	$ 223.019,00			1,65	$974.239
3,2	Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kg/cm2), para construccion de cabezales, muros, aletas, dentellon y placas de sobrepiso de alcantarillas.	M3	51,00	$252.466	$36.375.766	-	-34,92	16,08	$ 12.099.653	0,00	$0	0,00	$0	7,06	$5.312.415	9,02	$ 6.787.243,00			16,08	$12.099.653
3,3	Suministro e instalacion de tuberia en concreto H-96", i=1m. esp. 661-13 inv.	M	30,00	$520.717	$15.621.508	-	-19,00	11,00	$ 5.727.867	0,00	$0	8,09	$3.124.302	5,00	$2.603.565	0,00	$ 0,00			11,00	$5.727.867
3,4	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-13 inv. para alcantarilla, box, muros, incluye transporte.	KG	3473,00	$9.099	$31.601.534	-	-2436,00	1037,00	$ 9.435.663	0,00	$0	0,00	$0	469,00	$4.272.890	468,00	$ 4.258.332,00	99,40	$904.441	1037,00	$9.435.663
3,5	Suministro e instalacion aletaral granular filtrante esp. 673-13 inv.	M3	3,00	$192.991	$578.972	+	15,75	18,75	$ 3.618.548	0,00	$0	0,00	$0	17,10	$3.300.146	1,65	$ 318.435,00			18,75	$3.618.548
3,6	Terraplen / mejoramiento conformado con material seleccionado esp. 220 1-13 inv.	M3	42,00	$103.004	$4.284.185	-	-22,00	20,00	$ 2.040.080	0,00	$0	10,50	$1.071.042	9,50	$969.038	0,00	$ 0,00			20,00	$2.040.080
	SUBTOTAL OBRAS				$706.374.308				$704.374.308		$217.664.789		$186.629.882		$286.993.483		$57.863.330		$17.202.855		$706.374.308
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$3.264.000				$ 3.264.000										$3.264.000		$3.264.000
	PAGA				$5.575.822				$ 5.575.822										$5.575.822		$5.575.822
	VALOR TOTAL				$715.214.130				$ 715.214.130		$217.664.789		$186.629.882		$286.993.483		$57.863.330		$26.042.677		$715.214.130

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
Nota 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
Nota 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRAC	23%	23%
Nota 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	IMPREVISTO	2%	2%
	UTILIDAD	5%	5%
	VALOR A.I.U.	30%	30%

NOTA: Las Actas Parciales pagadas en la vigencia 2023, se cancelaron sin el costo de Imprevistos, por lo cual, en la presente vigencia se realizará el pago de los mismos en el Acta Final. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de costos por Acta Parcial y el valor de los Imprevistos pendientes de pago, con el fin de cerrar el avance financiero del Proyecto en Cero (0).

	ACTA PARCIAL Nº 1	ACTA PARCIAL Nº 2	ACTA PARCIAL Nº 3	ACTA PARCIAL Nº 4	ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO
Valor con A.U.I (Obra ejec)	$217.664.789	$186.629.882	$226.993.483	$57.862.330	$26.042.677	$715.214.130
Valor sin Imprevistos - Valor pagado en vigencia 2023	$214.328.330,00	$183.761.158,00	$223.593.578,70			
Valor de Imprevistos por ejec	$3.345.428,00	$2.868.724,00	$3.400.404,30			
Valor total de imprevistos - pendientes de pago	$6.744.556,30					
Valor total Acta Final	Se suman los costos del acta final con los costos de los imprevistos pendientes de pago.				$36.747.233,30	

RESUMEN FINANCIERO			
VALOR INICIAL	$715.214.130,00		
VALOR ADICIONAL	$0,00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$715.214.130,00	
VALOR SIN EJECUTAR		$0,00	
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO			$0,00
TOTALES	$715.214.130,00	$715.214.130,00	$0,00

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA PESOS ($715.214.130,00) MCTE.

VALOR PRESENTE ACTA: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 36.747.233,30) MCTE.

ING. MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS
INTERVENTOR

GRUPO MSG S.A.S.
R.L. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA


	ACTA 05	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	UNIDAD	M3


JUNIO DE 2024


TRAMO	ABSC. INICIAL	ABSC. FINAL	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	H Prom. (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACION
TRAMO 1 PEÑA NEGRA 1	k0+000	k0+040	15.00	5.00	0.2	0.3	0.3		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+040	2	40.00	0.5	0.15	3.00		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+040	2	40.00	0.175	0.45	3.15		Placas
	k0+000	k0+040	2	40.00	0.9	0.15	5.40		Riostras (Atura0.15_ Ancho0.2_Largo5
TRAMO 2 PEÑA NEGRA 2	k0+000	k0+040	15.00	5.00	0.2	0.3	0.3		
	k0+000	k0+040	2	40.00	0.5	0.15	3.00		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+040	2	40.00	0.175	0.45	3.15		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+040	2	40.00	0.9	0.15	5.40		Placas
TRAMO 3 LA MESA (EL CHAPARRO)	k0+000	k0+070	23.00	5.00	0.2	0.3	0.3		Riostras (Atura0.15_ Ancho0.2_Largo5
	k0+000	k0+070	2	70.00	0.5	0.15	5.25		
	k0+000	k0+070	2	70.00	0.175	0.45	5.51		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+160	2	160.00	0.9	0.15	21.60		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
TRAMO 4 LA LAJA	k0+000	k0+080	27.00	5.00	0.2	0.3	0.3		Placas
	k0+000	k0+080	2	80.00	0.5	0.15	6.00		Riostras (Atura0.15_ Ancho0.2_Largo5
	k0+000	k0+080	2	80.00	0.175	0.45	6.30		
	k0+000	k0+080	2	80.00	0.9	0.15	10.80		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
TRAMO 5 ALTO GRANADILLO	k0+000	k0+080	27.00	5.00	0.2	0.3	0.3		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+080	2	80.00	0.5	0.15	6.00		Placas
	k0+000	k0+080	2	80.00	0.175	0.45	6.30		Riostras (Atura0.15_ Ancho0.2_Largo5
	k0+000	k0+080	2	80.00	0.9	0.15	10.80		
TRAMO 6 LA REFORMA	k0+000	k0+100	33.00	5.00	0.2	0.3	0.3		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+100	2	100.00	0.5	0.15	7.50		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+100	2	100.00	0.175	0.45	7.88		Placas
	k0+000	k0+100	2	100.00	0.9	0.15	13.50		Riostras (Atura0.15_ Ancho0.2_Largo5
TRAMO 7 LA CUMBRE	k0+000	k0+080	27.00	13.37	0.2	0.3	0.80	21.66	Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+080	2	80.00	0.5	0.15	6.00		Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+080	2	80.00	0.175	0.45	6.30		Placas
	k0+000	k0+080	2	80.00	0.9	0.15	10.80		Riostras (Atura0.15_ Ancho0.2_Largo5
TOTAL EJECUTADO:								371.30	
COBRADO A LA FECHA:								349.63	
TOTAL:								21.66	













RESIDENTE DE OBRA
Ana Carolina Gonzalez

GRUPO MSG SAS

Aprobó:

RL interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

	ACTA 05	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

3.4 ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	KG

JUNIO DE 2024

UBICACIÓN	ELEMENTO ESTRUCTURAL	ABS	ABS FINAL	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	H Prom (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACION
LA CUMBRE	CAJILLA INGRESO		18,00	3	3	54	0,56	30,24	
			32,00	1,6	3	51,2	0,56	28,67	
			6,00	6,6	3	50	0,56	28,00	
	CABEZAL DE SALIDA								
			20,00	1,7	3	34	0,37	12,49	
TOTAL EJECUTADO:								1.037,00	
COBRADO A LA FECHA:								937,50	
TOTAL:								99,40	



DIRECTOR DE OBRA
Ana Carolina Gonzalez

GRUPO MSG SAS

Revisó:
Residente interventoria SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Juan Carlos Agudelo Puerto

Aprobó:

RL interventoria SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

4. INFORME FINAL CONTRATISTA

INFORME TECNICO

INFORME FINAL TECNICO

GRUPO MSG SAS
PAICOL – HUILA




INTRODUCCIÓN

A través del mejoramiento de la red terciaria y en especial de placas huella se espera impulsar la reactivación económica en el departamento del Huila, para el sector de Paicol, está adjudicado al Grupo MSG Sas un total de 510 m de vía en placa huella, distribuidos en siete tramos (La reforma 100 m, las lajas 80 m, Chaparro 90 m, peña negra tramo uno 40 m, peña negra tramo dos 40 m, alto granadillo 80 m, la cumbre 80 m), la cuantía del Contrato asciende a setecientos quince millones doscientos catorce mil ciento treinta m/cte ($715.214.130.00), un plazo de 3 (tres) meses a partir del 05 de septiembre del 2023 y tiene como objeto él "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA", el pliego de condiciones y la propuesta del Contratista, se espera con esto dar una gran solución en movilidad al sector.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra en la zona rural del Municipio de Paicol del Departamento del Huila.

Ilustración 1 Localización del municipio de Paicol

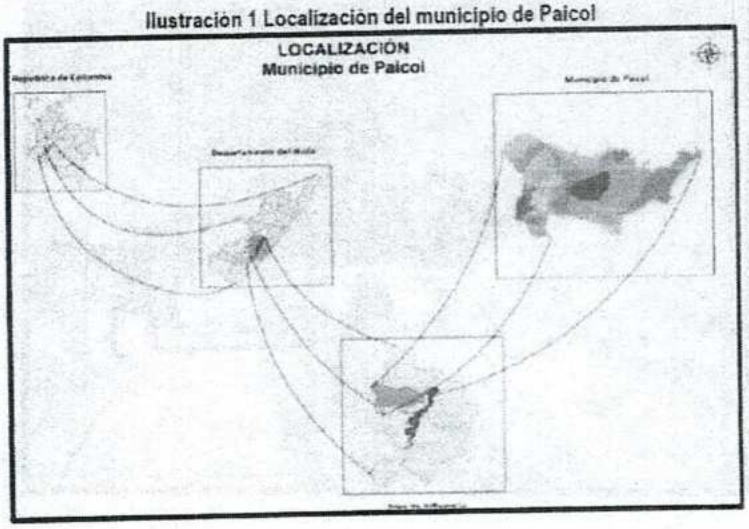

Paicol es un municipio colombiano localizado al occidente del departamento del Huila. Yace sobre las estribaciones de la cordillera central donde confluye el río Magdalena con río Páez. Hace parte de la región Suboccidente del departamento. Su extensión territorial es de 340 km², su altura es de 886 msnm y su temperatura promedio es de 26 °C.

Cuenta con una población de 5.734 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019. Su economía se basa principalmente, en la agricultura y ganadería (La producción cafetera, de leche y sus derivados lácteos se realiza a gran escala). El ecoturismo es otro reglón importante gracias a la presencia de distintos balnearios y cascadas que forman piscinas de agua natural como la Caja de Agua y la Caverna La Cumbre, ideales para la recreación y el esparcimiento, además de una imponente formación geológica donde se puede practicar espeleología recreativa; ofrece al visitante un hermoso atractivo natural. Este municipio que se caracteriza por sus casas blancas coloniales y calles empedradas, rodeada por la belleza natural de su geografía. Es conocido como la «La Villa de las Maravillas naturales o puerta del viento.

GRUPO MSG



DATOS DEL CONTRATO

RADICADO - CONTRATO	142-2023
SECRETARIA	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
ORDENADOR DEL GASTO	Aníbal Chavarro Chantre
CONTRATISTA	GRUPO MSG SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901110550-1
REPRESENTANTE LEGAL	Ana Carolina González Rodríguez
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
VALOR	$ 715.214.130.00
PLAZO	3 MESES
FECHA DE INICO	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DESARROLLO DEL INFORME

En la ejecución del contrato se intervinieron en su totalidad 7 tramos de placa huella, completando así 520 ML, para el cumplimiento contractual del contrato 142-2023, a continuación, mediante registro fotográfico se reportará la terminación de vías terciarias ejecutadas:

- **VEREDA PEÑA NEGRA TRAMO 1**

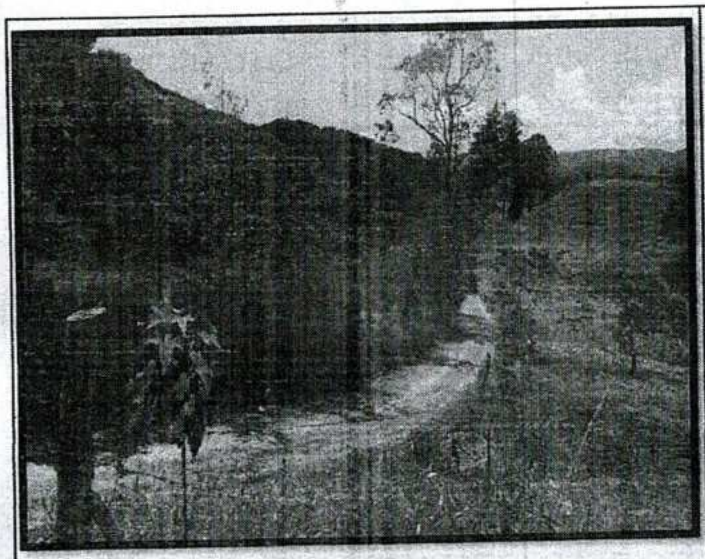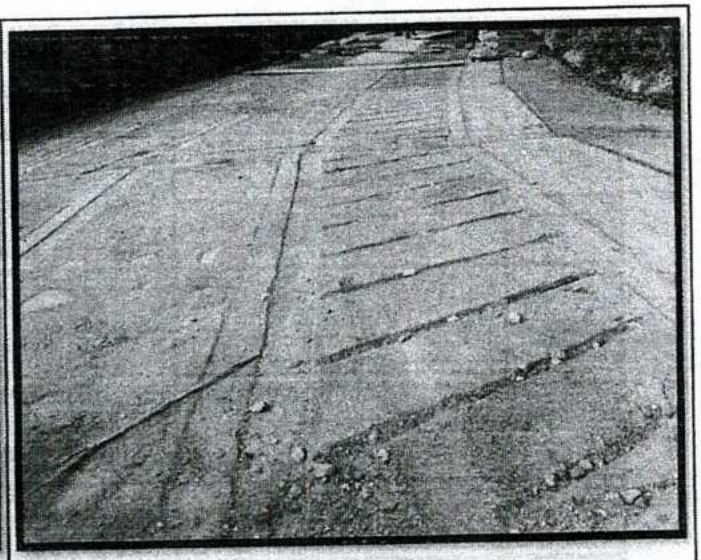	
ANTES	DESPUES

Municipio de Paicol

No.	DESCRIPCION (VEREDA)	Localización (Coordenadas)	Long. Tramo (Km)
A	**Municipio de Paicol**		
1	Vereda Peña Negra Tramo 1	2°23'0.34"N 75°48'20.53"W	40
2	Vereda Peña Negra Tramo 2	2°22'54.51"N 75°48'23.42"W	40
3	Vereda La Mesa (El Chaparro)	2°24'56.53"N 75°44'21.63"W	90
4	Vereda La Laja	2°23'55.55"N 75°45'21.69"W	80
5	Vereda Alto Granadillo	2°21'40.05"N 75°45'2.65"W	80
6	Vereda La Reforma	2°26'50.95"N 75°42'6.32"W	100
7	Vereda La Cumbre	2°23'16.60"N 75°47'16.20"W	80
	SUB TOTAL		**510**

Nota: El sistema de coordenadas utilizado es el siguiente:


Coordinate System: MAGNA Colombia Bogota
Projection: Transverse Mercator
Datum: MAGNA
False Easting: 1.000.000.0000
False Northing: 1.000.000,0000
Central Meridian: -74,0775
Scale Factor: 1,0000
Latitude Of Origin: 4,5962
Units: Meter

A continuación, se muestra tabla donde se encuentran los tramos a intervenir y el cumplimiento total cada tramo



TRAMO	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	EJECUTADO (m)	PERSONAL	OBSERVACIONES
1	VEREDA PEÑA NEGRA TRAMO 1	40	40	0	EJECUTADO
2	VEREDA PEÑA NEGRA TRAMO 2	40	40	0	EJECUTADO
3	VEREDA LA MESA (EL CHAPARRO)	160	160	0	EJECUTADO
4	VEREDA LAS LAJAS	80	80	0	EJECUTADO
5	VEREDA ALTO GRANADILLO	80	80	0	EJECUTADO
6	VEREDA LA REFORMA	100	100	0	EJECUTADO
7	VEREDA LA CUMBRE	80	80	0	EJECUTADO

GRUPO MSG


- **VEREDA LAS LAJAS**

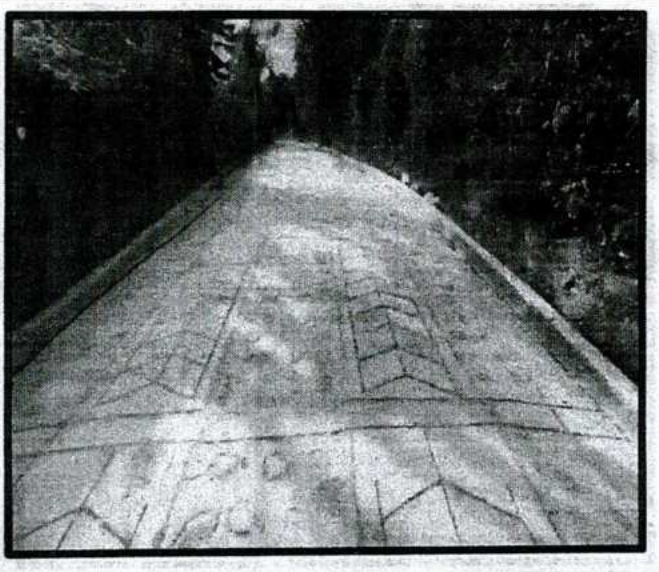	
ANTES	DESPUES


- **VEREDA ALTO GRANADILLO**

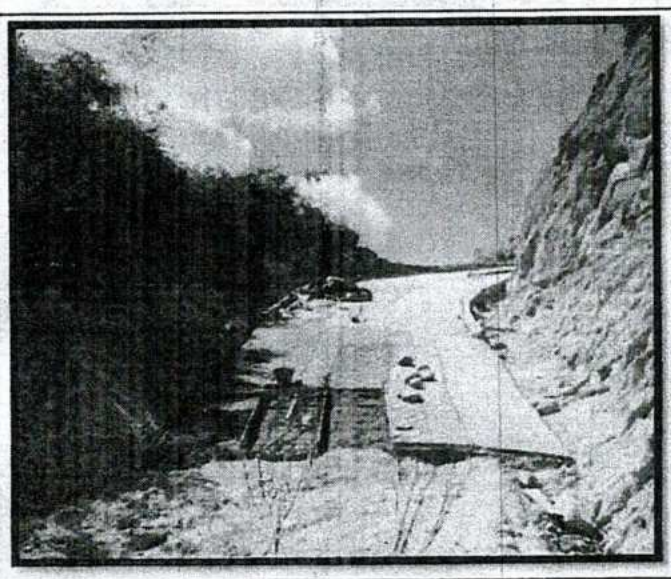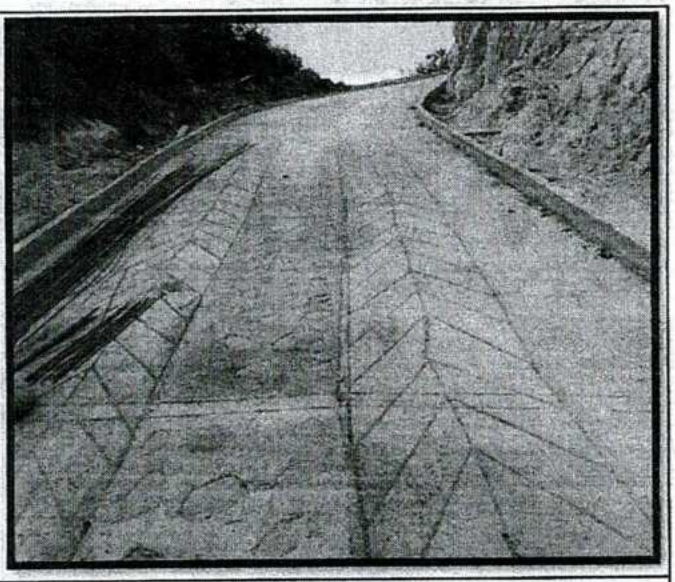	
ANTES	DESPUES


- **VEREDA PEÑA NEGRA TRAMO 2**

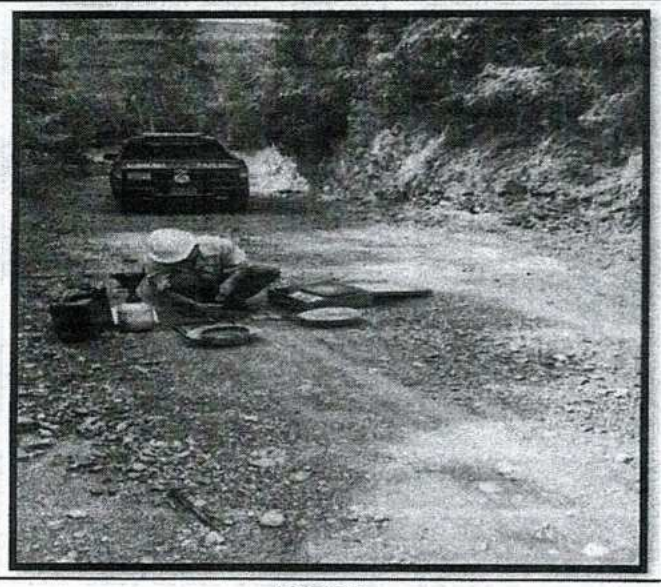	
ANTES	DESPUES



- **VEREDA LA MESA (EL CHAPARRO)**

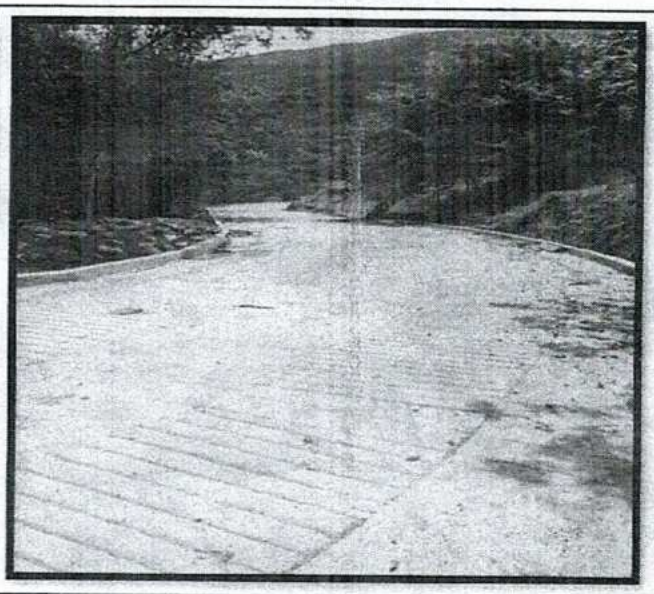	
ANTES	DESPUES

- **VEREDA LA REFORMA**

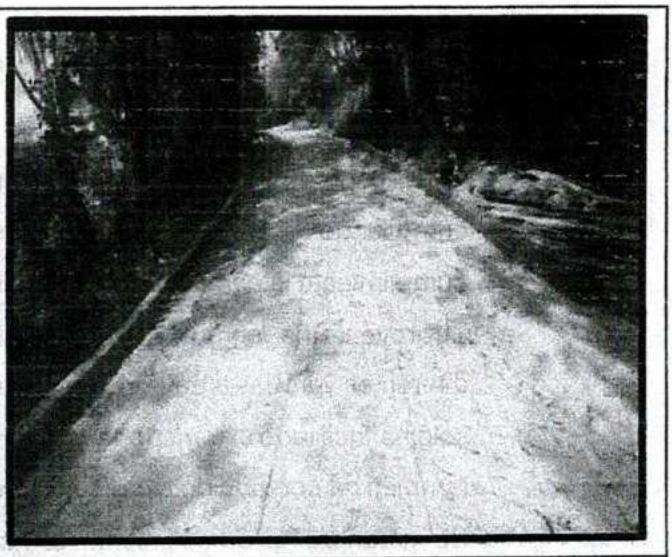	
Antes	Despues

- **VEREDA LA CUMBRE**

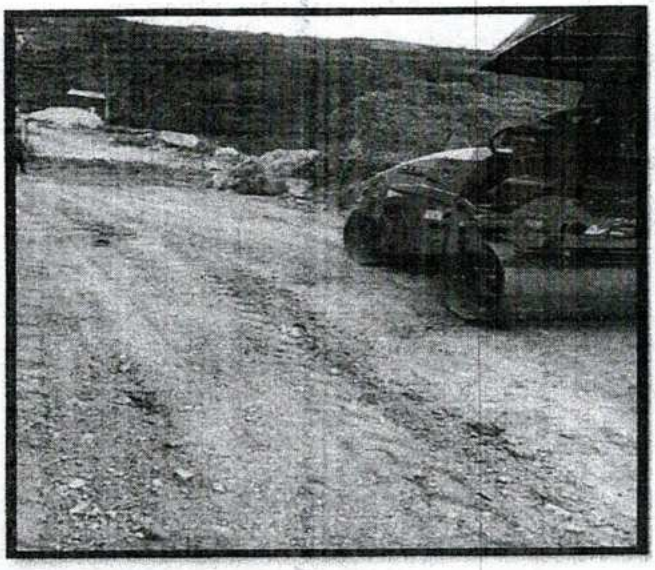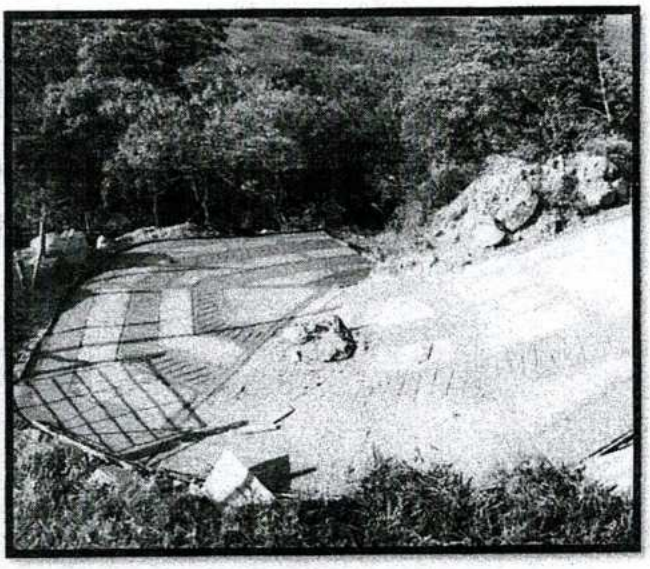	
Antes	Despues

CONCLUSIONES

- Se ha logrado completar todos los metros lineales especificados en el contrato, cumpliendo así con todos los términos acordados de manera precisa y puntual. Este cumplimiento integral demuestra nuestro compromiso absoluto con la ejecución
- El proyecto ha logrado cumplir con su objetivo principal: mejorar el acceso a las diferentes veredas a través de la optimización de las vías terciarias. Esta iniciativa no solo ha facilitado el transporte y la conectividad para los residentes locales, sino que también ha contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico de la región
- Se garantiza el cumplimiento estricto de las normas de calidad en ingeniería, asegurando que cada aspecto del proyecto cumpla con los más altos estándares establecidos por las autoridades competentes y las mejores prácticas del sector. Este enfoque meticuloso no solo garantiza la seguridad y durabilidad de las estructuras diseñadas, sino que también promueve la eficiencia y la confiabilidad en la ejecución de todas las etapas del proyecto. Nuestro compromiso con la excelencia en ingeniería se refleja en cada detalle, desde el diseño inicial hasta la implementación y la entrega final, asegurando resultados que superan las expectativas y contribuyen positivamente al desarrollo sostenible y al bienestar de la comunidad.

CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA
INGENIERIA - LABORATORIOS - SERVICIOS

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673-2010
LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No. 315 - 24

CLIENTE GRUPO MSG SAS


PROYECTO CONTRATO DE OBRA 142-2023 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

LOCALIZACION MUNICIPIO DE LA PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: 27 de mayo de 2024

CONSOLIDADO GENERAL DE ROTURAS

Esquema de los tipos de falla NTC 673-2010



Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	COD. CLIENTE	Muestra No.	Diametro y Longitud (cm)		Peso (g)	Carga en (KN)	Slump (Pulg)	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida en (PSI) y en (Kg/cm2)		% de Evolución	Tipo de falla	Peso Unitario (g/cm3)	Resistencia de Especificación en (PSI) y en (Kg/cm2)		Resistencia a la Compresion en MPa	Observaciones y/o Ubicación
17/05/2024	16/05/2024	PAICOL 001	16	15,00	30,00	12845	162,43	5,0"	7	23/05/2024	2110	199	94%	TIPO 2	2,423	3000	210	19,44	CONCRETO NORMAL ELABORADO EN OBRA - SE FUNDE: PLACA HUELLA - VEREDA LA CUMBRE - K0+10
17/05/2024	16/05/2024	PAICOL 002	19	15,00	30,00	13005	261,69	5,0"	7	23/05/2024	2148	206	96%	TIPO 2	2,453	3000	210	19,85	CONCRETO NORMAL ELABORADO EN OBRA - SE FUNDE: PLACA HUELLA VEREDA ALTO GRANADILLO K0+15

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS, TRANSPORTADA POR EL CLIENTE; CURADAS POR EL LABORATORIO DESDE LA FECHA DE INGRESO DE CADA MUESTRA.

ING. JAIME ENRIQUE BONILLA
DIRECTOR DE LABORATORIO

V.Bo. MEB

....FIN DEL REPORTE....


CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIOS - SERVICIOS

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673-2010

LAB - FOR - 24

Esquema de los tipos de falla NTC 673-2010



ORDEN DE SERVICIO No. 328 - 24

CLIENTE GRUPO MSG SAS

PROYECTO CONTRATO DE OBRA 142-2023 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

LOCALIZACION MUNICIPIO DE LA PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: 04 de Junio de 2024

CONSOLIDADO GENERAL DE ROTURAS

Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	COD. CLIENTE	Muestra No.	Diametro y Longuitud (cm)		Peso (g)	Carga en (KN)	Slump (Pulg)	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida en (PSI) y en (Kg/cm2)		% de Evolución	Tipo de falla	Peso Unitario (g/cm3)	Resistencia de Especificación en (PSI) y en (Kg/cm2)		Resistencia a la Compresion en MPa	Observaciones y/o Ubicación
17/05/2024	16/05/2024	PAICOL 001	17	15,00	30,00	12845	162,43	5,0"	**14**	30/05/2024	**2110**	218	103%	TIPO 2	2,423	3000	210	21,30	CONCRETO NORMAL ELABORADO EN OBRA - SE FUNDE: PLACA HUELLA - VEREDA LA CUMBRE - K0+10
17/05/2024	16/05/2024	PAICOL 002	20	15,00	30,00	13005	261,69	5,0"	14	30/05/2024	**2148**	226	105%	TIPO 2	2,453	3000	210	21,71	CONCRETO NORMAL ELABORADO EN OBRA - SE FUNDE: PLACA HUELLA VEREDA ALTO GRANADILLO K0+15

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS, TRANSPORTADA POR EL CLIENTE; CURADAS POR EL LABORATORIO DESDE LA FECHA DE INGRESO DE CADA MUESTRA.

ING. JAIME ENRIQUE BONILLA
DIRECTOR DE LABORATORIO

V.Bo. MEB

....FIN DEL REPORTE....

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA

ORDEN DE SERVICIO N° 247 - 24
CLIENTE GRUPO MSG SAS
PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA
LOCALIZACION MUNICIPIO DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA
MATERIAL SUB BASE GRANULAR
FUENTE: -

	AA	MM	DD	
FECHA RECEPCION	2024	05	13	**ESPECIFICACIÓN** --
ENSAYO	2024	05	13	**NORMA DE ENSAYO** INV E-161-13
REPORTE	2024	05	15	

N° DE PRUEBA		1	2	3					
LOCALIZACIÓN GENERAL DEL AREA		PLACA HUELLA GRANADILLO	PLACA HUELLA GRANADILLO	PLACA HUELLA GRANADILLO					
MARGEN		IZQUIERDA	DERECHA	CENTRO					
Peso del frasco+cono +arena inicial		6512	6820	6084					
Peso del frasco+cono +arena final		3129	3810	2325					
Masa del material extraido humedo Pasa 3/4"		2331	3312	3312					
Masa del material humedo Ret 3/4"		169	170	150					
Gravedad Especifica Bulk (g/cm3)		2,600	2,600	2,600					
Constante del cono		1560	1603	1603					
Peso arena total usada		1450	1337	1557					
Densidad de la arena		1,42	1,42	1,42					
Volumen total del hueco		920,10	959,6	899,2					
Peso del material extraido seco		1673,8	1830,9	2830,9					
Densidad seca g/cm3		2,037	2,036	2,054					
PROCTOR	**Densidad máxima seca de laboratorio (g/cm3)**	2,085	2,085	2,085					
	Humedad Optima %	6,7	6,7	6,7					
% de Compactación		98,7	98,9	98,0					
HUMEDAD DEL SUELO PASANTE DE 3/4" (horno)	**%W**	6,7%	6,7%	7,4%					

OBSERVACIONES:

ING. JAIME ENRIQUE BONILLA
DIRECTOR DE LABORATORIO

V.Bo. MEB

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA

ORDEN DE SERVICIO N° 245 - 24
CLIENTE GRUPO MSG SAS
PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA
LOCALIZACION MUNICIPIO DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA
MATERIAL SUB BASE GRANULAR
FUENTE: -

	AA	MM	DD	ESPECIFICACIÓN
FECHA RECEPCION	2024	05	13	-
ENSAYO	2024	05	13	NORMA DE ENSAYO
REPORTE	2024	05	15	INV E-161-13

N° DE PRUEBA		1	2	3					
GENERAL DEL AREA PLACA HUELLA		PLACA HUELLA LA CUMBRE	PLACA HUELLA LA CUMBRE	PLACA HUELL LA CUMBRE					
MARGEN		IZQUIERDA	DERECHA	CENTRO					
Peso del frasco+cono +arena inicial		6910	6880	6750					
Peso del frasco+cono +arena final		4020	3830	3810					
Masa del material extraido humedo Pasa 3/4"		1908	2080	1970					
Masa del material humedo Ret 3/4"		80	170	110					
Gravedad Especifica Bulk (g/cm3)		2,600	2,600	2,600					
Constante del cono		1603	1603	1603					
Peso arena total usada		1287	1447	1337					
Densidad de la arena		1,42	1,42	1,42					
Volumen total del hueco		875,6	953,6	899,2					
Peso del material extraido seco		1774,9	1947,6	1830,9					
Densidad seca g/cm3		2,027	2,042	2,036					
PROCTOR	Densidad máxima seca de laboratorio (g/cm3)	2,085	2,085	2,085					
	Humedad Optima %	6,7	6,7	6,7					
% de Compactación		98,2	98,5	98,4					
HUMEDAD DEL SUELO PASANTE DE 3/4" (horno)	%W	6,8%	7,5%	7,6%					

OBSERVACIONES:

ING. JAIME ENRIQUE BONILLA
DIRECTOR DE LABORATORIO

V.Bo. MEB

INFORME SSTMA

2024

INFORME GESTION SSTMA FINAL

JUNIO

CONTRATO DE OBRA

OBJETO

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

GRUPO MSG

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO


1.1 OBJETO DEL INFORME

Presentar a la, interventoría del proyecto y por su intermedio al Ente Contratante ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA, el informe final de la gestión SST realizada durante el periodo del mes de octubre de 2023.

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado **Paicol** es un municipio colombiano localizado al occidente del departamento del Huila. Yace sobre las estribaciones de la cordillera central donde confluye el río Magdalena con río Páez. Hace parte de la región Suboccidente del departamento. Su extensión territorial es de 340 km², su altura es de 886 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 26 °C.[4]

- Norte: Tesalia, Nataga y el departamento del cauca
- Sur: El agrado y el pital
- Este: Gigante
- Oeste: Plata

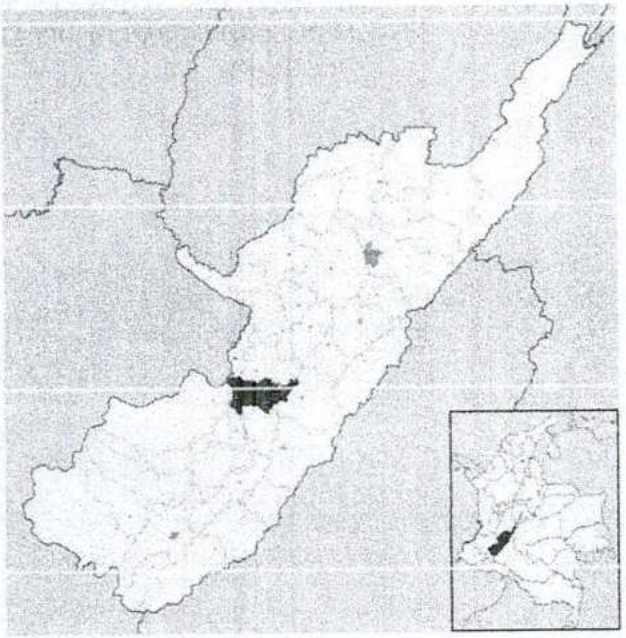

Este proceso de inducción nos permitió, exponer el sg-sst y así educar de forma previa a cada colaborador para prevenir accidentes laborales y futuras enfermedades laborales, por otro lado, buscar estrategias para reconocer la diferencia entre riesgo y peligro, y conocer a detalle los peligros expuestos por sus actividades laborales y generar el autocuidado

ACCIDENTES DE TRABAJO.

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron accidentes laborales, así cumpliendo con el objetivo.

CAPACITACIONES

En el desarrollo del proyecto, se realizaron diferentes capacitaciones, donde se buscaba entrenar y concientizar a todos los colaboradores que prestaban sus servicios

3. GESTIÓN AMBIENTAL.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Se aporto de forma positiva al impacto ambiental en el sector, de esta forma se realiza el correcto manejo de residuos en el proyecto.

CONCLUSIONES.

- Se cumplió con el objetivo 0 accidentes.
- No se desmejoraron las condiciones ambientales
- Se aporto al auto cuidado de la cada persona del proyecto

Valery V.	Lina Peralta	Ana Carolina González
Elaboro: Valery Vanegas Segura cc.1.018.515.205 Auxiliar en SST	Reviso: Lina María Peralta Cifuentes C.c: 1.010.232.399 Licencia 12314 de 2021 Profesional SISOMA	Aprobó: Ana Carolina González C.c 1.019.015.582 TP. 25202-277716 CND Representante Legal

1.3 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO.

El área de influencia directa del proyecto es: Vías terciarias Paicol- Huila

2. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GESTIÓN EN EMERGENCIAS

Equipo con el que cuenta el Grupo MSG para la atención de emergencias está conformado

Camilla rígida
Botiquín de emergencias
Extintores ABC
Kit Antiderrames

En el desarrollo del proyecto se contaron con diferentes elementos para atender emergencias primarias, en los diferentes frentes de trabajo que se ejecutaron a lo largo del proyecto.

SOCIODEMOGRAFICO

Se toman las encuestas del perfil sociodemográfico del personal de obra, esto con la finalidad de conocer la población trabajadora.

Esto permitiendo enfocar las capacitaciones SST y ambientales con la destreza desarrollada por cada persona.

INDUCCIÓN SST Y AMBIENTE

Se realiza la inducción de SST y ambiente al personal del proyecto

12. PAGA

Informe de Avance y Seguimiento del PAGA
01 de octubre al 30 de noviembre de 2023

INFORME N°2

GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

NOVIEMBRE DE 2023

PROGRAMA 1: DESAROLLLO Y APLIACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL



Desde el componente ambiental, su actividad fundamental es velar por la protección de Fauna y biodiversidad principalmente en el la influencia directa del proyecto, para ello desde el área ambiental se capacita y sensibiliza al personal de obra sobre el conocimiento y cuidado de la fauna, además que la salvaguarda de la vegetación natural del sitio es primordial para conservar el hábitat de las especies faunísticas de la zona.

Para ello, se les notifica que en caso de encontrar un animal silvestre en los frentes de trabajo deben seguir el siguiente protocolo:

- No los manipules.
- No les arrojes objetos, ya que puedes espantarlos o asustarlos y generarles estrés.
- No los mantengas en cautiverio o adoptar como mascotas
- No suministrar alimentos de manera forzada

Teniendo esto en cuenta, si se encuentras un animal silvestre, debes reportar la situación a la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA de manera inmediata a través de los siguientes medios:

- Teléfonos Grupo Fauna Silvestre: 3778854 - 3778855 - 300 3197888
- Ventanilla de atención Grupo Fauna Silvestre: 3778925
- PBX SDA: 3778899
- Correo electrónico: fauna@secretariadeambiente.gov.co

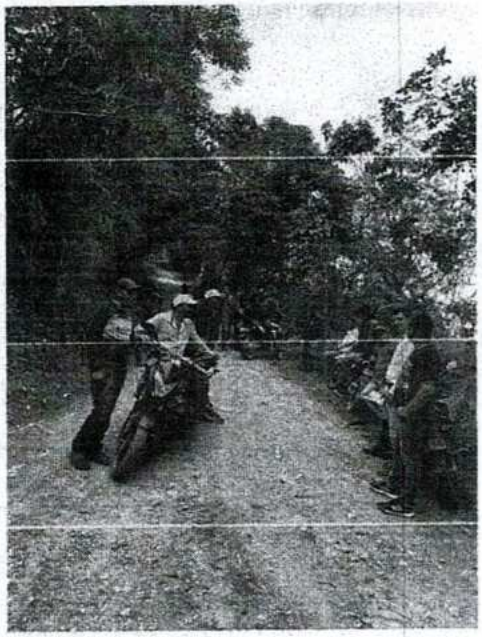CAPACITACIÓN AMBIENTAL	
	
Evidencia 1	**Evidencia 2**
	
Evidencia 3	**Evidencia 4**

PROGRAMA 2: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Con la finalidad de evitar accidentes, en componentes ambientales y de tránsito, el GRUPO MSG S.A.S, instala señalización preventiva en los frentes de trabajo de forma temporal, adicional se asignada senderos peatonales para los habitantes de las diferentes veredas.

Desde las actividades constructivas, también se instalan puntos ecológicos estos con la finalidad de que los colaboradores dispongan los elementos.

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	
PROYECTO 1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL	Código: DAGA-1.1-01

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía ambiental-PAGA.

TIPO DE MEDIDAS

Prevención	Corrección	Mitigación	Compensación
X	X	X	

ACCIONES A EJECUTAR:

- El contratista de obra debe contar con un equipo profesional social y ambiental para la implementación de los programas y/o proyectos que aplican conforme a los requerimientos contractuales existentes.
- La gestión SOCIOAMBIENTAL del proyecto estará a cargo de los profesionales ambiental y social quienes propenderán por el cumplimiento de todas las políticas y lineamientos.
- Se contará con el director de obra e inspector para la implementación de los programas y/o proyectos de manejo ambiental que aplican en el proyecto y así poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones.
- Se dará cumplimiento de cada uno de los programas de manejo socio ambiental propuesto en el PAGA.
- Garantizar la respuesta a todas las quejas, inquietudes y/o reclamos que la comunidad manifieste dando la solución pertinente.
- El residente SISOMA acompañará el proceso de respuesta de los requerimientos de: Autoridades
- El residente SISOMA y asesor social elaborará informes mensuales de ejecución del PAGA. Este deberá ir conforme los programas de manejo ambiental formulados en el presente documento.
- De ser necesario, el residente Ambiental y social participará de los comités de obra que se desarrollen a lo largo del proyecto, con el fin de tratar asuntos de la comunidad y ambiental, resolver inquietudes, dar informe verbal sobre las actividades ejecutadas y atender los requerimientos que apliquen.
- El residente Ambiental y social deberá actualizar el PAGA cada vez que se requiera de acuerdo con las condiciones del proyecto o del medio que cambien, así como presentar las versiones ajustadas.
- Las demás medidas, acciones que hagan parte de los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y contrato de obra.

LUGAR DE LA APLICACIÓN: Los corredores viales de los tramos rurales del municipio de Paicol – Huila

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

ITEM	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (3 MESES)		
1	Residencia en el manejo socio-ambiental	X	X	X
2	Atención de requerimientos.	X	X	X
3	Elaboración de informe de ejecución del PAGA	X	X	X
4	Participación de los profesionales en comités de obra.	X	X	X
5	Realización de actualizaciones del PAGA.		X	

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: GRUPO MSG S.A.S	COSTOS: $ 680.000

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO:

PROGRAMA 5: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO


Durante el mes de septiembre, se seleccionó un sitio

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			
PROYECTO 5. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO			CÓDIGO: PMIT-5.1-15
OBJETIVO: Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.			
TIPO DE MEDIDAS			
Prevención	Corrección	Mitigación	Compensación
X	X	X	
IMPACTOS A MANEJAR: Disminución/Aumento de la calidad visual del paisaje, Conflictos con las comunidades, Contaminación por residuos oleosos y/o lechada de concreto.			
ACCIONES A EJECUTAR:			

- CAMPAMENTOS:
  - Instalación: Se instalará un campamento administrativo en el casco urbano del municipio.
  - Funcionamiento: El fin de estos es almacenar herramientas y equipos menores, también servirá para resguardo de la lluvia, actividades de descanso, alimentación y uso de unidad sanitaria.
  - En el campamento se publicará la documentación socio-ambiental y así mismo se dotará de elementos de primeros auxilios, extintor y listado de teléfonos de emergencias de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Contingencias.
  - El Servicio de Atención al Usuario-SAU se instalará en el campamento Administrativo, preferiblemente en un sitio central y estratégico dentro del casco urbano del municipio, lo cual centraliza el acceso a la comunidad.
  - En el campamento se tendrá el kit de manejo para derrames contingentes de lechada de concreto y/o residuos oleosos, sobre lo cual se detalló en el proyecto PAGA
  - Desmantelamiento: se dará cierre a los permisos tramitados con los propietarios de los predios tramitados, los terrenos quedaran en iguales o mejores condiciones a las registradas al inicio.
  - Para el cierre ambiental se entregará la paz y salvo de recibo a satisfacción por parte de los dueños de los predios.

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS			
PROYECTO 2. SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES			CÓDIGO: PAC-4.3-06
OBJETIVO: Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal.			
TIPO DE MEDIDAS			
Prevención	Corrección	Mitigación	Compensación
X	X	X	
IMPACTOS A MANEJAR: Disminución de la calidad visual del paisaje, Afectación de predios: cultivos y/o viviendas, Contaminación por lechada de concreto, Aumento de la presión sonora y Contaminación atmosférica por material particulado.			
ACCIONES A EJECUTAR:			
• Cerramiento a áreas de trabajo. • Senderos Peatonales: Se establecerán cuando así se requiera. La superficie de éstos deberá ser antideslizante, sin obstáculos y a un mismo nivel, que facilite la movilidad de los transeúntes. • Trabajos Nocturnos: En caso de presentarse trabajos nocturnos se instalarán señales reflectivas o luminosas, tales como conos luminosos, licuadoras, flechas, ojos de gato que indiquen la labor que se está realizando.			
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: GRUPO MSG S.A.S			**COSTOS: $ 427.300**


EVIDENCIA CUMPLIMIENTO

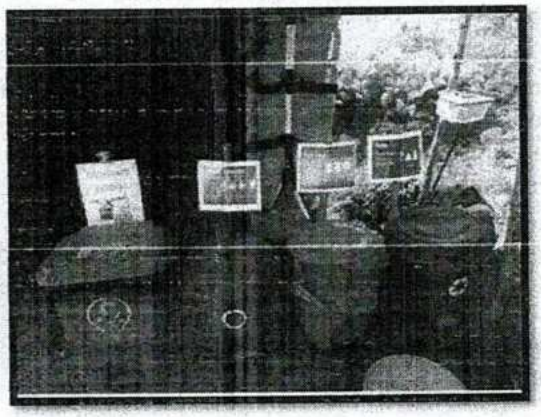







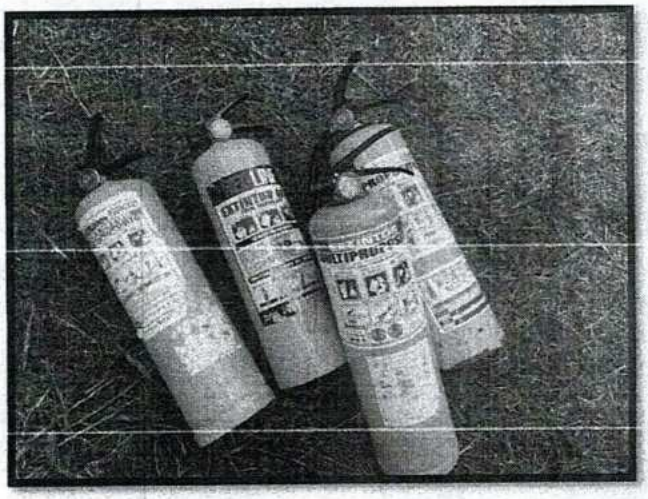

PROGRAMA 6: GESTIÓN SOCIAL

PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL			
PROYECTO 6. GESTIÓN SOCIAL			CÓDIGO: PMIT-5.1-16
OBJETIVO: Socializar a la comunidad del Paicol – Huila, el proyecto, sus avances e interactuar con la finalidad de demostrar la correcta inversión al proyecto.			
TIPO DE MEDIDAS			
Prevención	Corrección	Mitigación	Compensación

- SITIOS DE ACOPIO
  - Cuando se requiera tramitar permiso para el acopio de materiales se tendrá en cuenta que las áreas seleccionadas no afecten los componentes iniciales del suelo, que no estén en mediaciones a fuentes hídricas o de importancia bilógica.
  - Se tramitará la respectiva acta de apertura y cierre del permiso de ocupación temporal el cual debe incluir un registro fotográfico del antes y después.
  - Los campamentos, frentes de obra y sitios de acopio temporal de materiales realizaran jornadas periódicas de orden y aseo.

LUGAR DE LA APLICACIÓN: Los corredores viales de los tramos rurales del municipio Paicol – Huila


CRONOGRAMA

ITEM	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (3 MESES)		
1	Instalación del campamento	X	X	X
2	Dotación del campamento	X		
3	Mantenimiento de los campamentos y sitios de acopio.	X	X	X
4	Desmantelamiento de campamentos y entrega de sitios de acopio.	X	X	X

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:	**COSTOS: $ 2.660.000**
Director de Obra, Ingeniero Residente de Obra, inspector SST y Profesional Ambiental	

EVIDENCIA



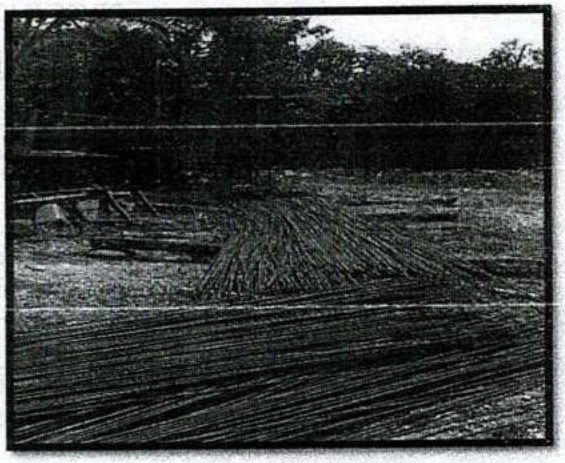

Fecha	Nº de Atenciones General	Temática	Observaciones
01 de octubre al 30 de octubre	0	PQRS	0
		Solicitud de Información	0
		Entrega Hoja de Vida	15
		Entrega de Oficio	0
		Atención a través de Línea Telefónica	0
Total			15

Atención solicitudes de la comunidad.

INDICADORES

Actividades	No	Indicador			Cumplimiento				Metas
		RELACION	%	VALOR	SI	NO	Parcial	%	
Organizar consolidado de PQRS	27	(Nº 0 de PQRS atendidos en el periodo/ Nº 0 de PQRS tenidos en el periodo) x100	NA	0*/0100	X			100%	100%
Instalación de buzón de sugerencias	29	Nº de buzones de sugerencias instalados por frente de trabajo=1	100	1/1 x 100	X			100%	100%

PROYECTO 2: INFORMACION Y DIVULGACION

OBJETIVO: Mantener informada a la comunidad de los avances de la obra

ACCIONES DESARROLLADAS:

1. Se informa a la comunidad e los cierres viales
2. Se entrega informe de avances al presidente de la veeduría.

REGISTRO FOTOGRAFICO

X	X	X	

IMPACTOS A MANEJAR: NO APLICA

ACCIONES A EJECUTAR:

- Entrega de volante y socialización a la comunidad, donde mostraremos el avance del proyecto, con la finalidad de que estén enterados del avance el proyecto y la inversión del mismo
- Impresiones requeridas para las actividades del proyecto.
- Se elabora un buzón donde se instalará en el restaurante, con la finalidad que la gente pueda sugerir mejorar en el proceso social
- Se crea un punto de atención para la atención de la comunidad

LUGAR DE LA APLICACIÓN: Los corredores viales de los tramos rurales del municipio Paicol – Huila

CRONOGRAMA

ITEM	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (3 MESES)		
1	Volantes	X	X	X
2	Impresiones	X		
3	Buzón	X	X	X
4	Punto de atención	X	X	X

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:	**COSTOS: $ 2.010.000**
Director de Obra, Ingeniero Residente de Obra, inspector SST y Profesional Ambiental	

INDICADORES

Dentro del marco del programa de gestión social se busca atender las diversas solitudes e inquietudes que tiene la comunidad de cara a la ejecución de la obra, se pone a su disposición diferentes medios de comunicación para que oficialicen sus PQRSF.

Actividades	No	Indicador RELACION	%	VALOR	SI	NO	Cumplimiento Parcial	%	Metas
Realización de reunión informativa de Inicio.	30	(N° reuniones programadas/N° de reuniones ejecutadas) x 100	0	1/1 x 100	x		100%	0	80%


PROYECTO 4: CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA


OBJETIVO: Apoyar los esfuerzos de la comunidad en el mantenimiento de los valores y prácticas culturales tradicionales

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:


1. Se convoco la reunión de la veeduría
2. Se obtiene resolución de comité veedor por parte de la entidad contrate


REGISTRO FOTORGRAFICO

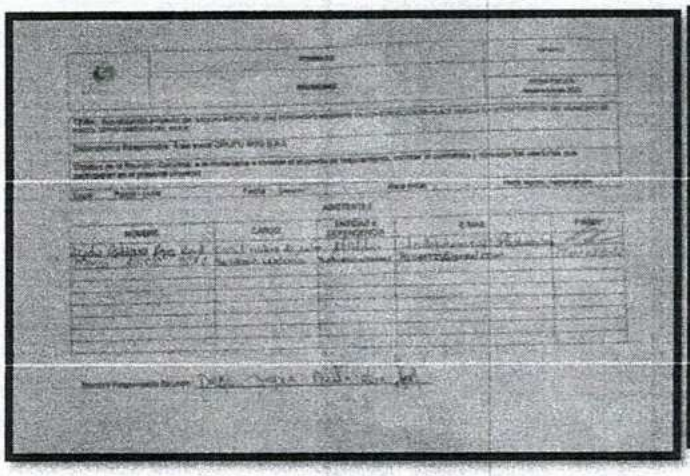

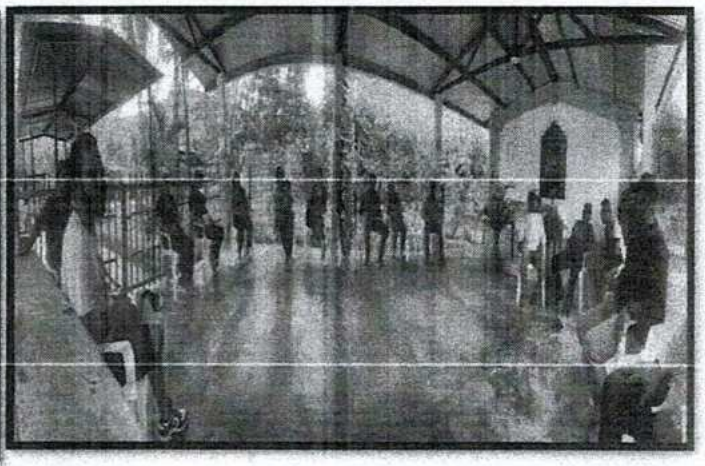

1. Se convoco la reunión de la comunidad, con la finalidad de socializar el inicio del proyecto

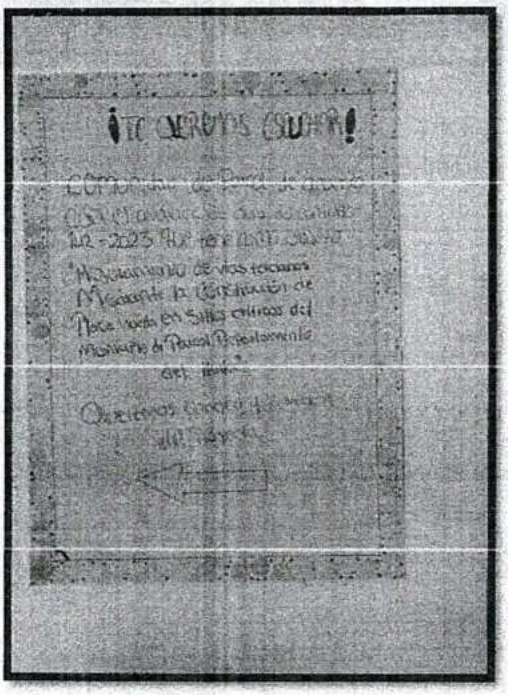





INDICADOR

NPUBLICIDAD Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.419.067-
CL 136F 159A 10
Tel: (031) 3222235
Bogotá - Colombia
mondragonyuly586@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEL 181

Señores	GRUPO MSG SAS		
NIT	901.110.550-1	**Teléfono**	(031) 6454103 - Ext. 000
Dirección	CL 171 55B 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2023, 12:54
Expedición	29/11/2023, 13:56
Vencimiento	29/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUMINISTRO CINTA SEÑALIZACION ROLLO	10.00	10,252.00	121,998.80
2	SUMINISTRO PALETAS PARE	2.00	20,882.00	49,699.16
3	SUMINISTRO SEÑAL SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA	2.00	66,386.00	157,998.68
4	SUMINISTRO SEÑAL SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	2.00	66,386.00	157,998.68
5	SUMINISTRO SENAL OBRA EN LA VIA	2.00	66,386.00	157,998.68
6	SUMINISTRO SEÑAL CARRIL IZQUIERDO	2.00	66,386.00	157,998.68
7	SUMINISTRO SEÑAL CARRIL DERECHO CERRADO	2.00	66,386.00	157,998.68
8	SUMINISTRO SEÑAL PASO UNO A UNO	2.00	66,386.00	157,998.68
9	SUMINISTRO SEÑAL APROXIMACIO OBRA EN LA VIA	2.00	66,386.00	157,998.68
10	SUMINISTRO SEÑAL VELOCIDAD MAXIMA	2.00	66,386.00	157,998.68
11	SUMINISTRO SEÑAL FIN VIA CERRADA	2.00	66,386.00	157,998.68
12	SUMINISTRO SEÑAL FIN DE LA OBRA	2.00	66,386.00	157,998.68
13	SUMINISTRO BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES MALETINES	2.00	114,202.00	271,800.76
14	SUMINISTRO SEÑAL REFLECTIVA	1.00	61,429.00	73,100.51
15	SUMINISTRO DELINEADORES TOBULARES	10.00	92,437.00	1,100,000.30
16	SUMINISTRO INICIO OBRA	1.00	56,639.00	67,400.41
17	SUMINISTRO CANECA DE COLORES	1.00	201,513.00	239,800.47
18	SUMINISTRO SEÑALIZACION DE EMERGENCIA PARA CAMPAMENTOS	16.00	9,848.00	187,505.92
19	SUMINISTRO KIT ANTIDERRAMES	2.00	210,084.00	499,999.92
20	SUMINISTRO EXTINTORES ABC 10 LIB	4.00	84,037.00	400,016.12
21	SUMINISTRO BOTIQUIN CRUZ ROJA DE PRIMEROS AUXILIOS	4.00	126,050.00	599,998.00
22	SUMINISTRO CAMILLAS EMERGENCIA	4.00	243,698.00	1,160,002.48
23	SUMINISTRO VOLANTES	500.00	2,353.00	1,400,035.00
24	SUMINISTRO IMPRESIONES	300.00	336.00	119,952.00
25	SUMINISTRO BUZON	1.00	42,017.00	50,000.23

Total ítems: 25

Total Bruto	6,656,552.00
IVA 19%	1,264,744.88
Total a Pagar	7,921,296.88

Valor en Letras: Siete millones novecientos veintiun mil doscientos noventa y seis pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,921,296.88


Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059248212 aprobado en 20231102 prefijo FEL desde el número 178 al 500 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa

CUFE: 84575eb15c368a40bc86c85577be3e8ab7a8f654e38228504ad54b08a740d0616e24c02f0aba02ef558ab701d4db62f0

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

REGISTRO FOTORGRAFICO

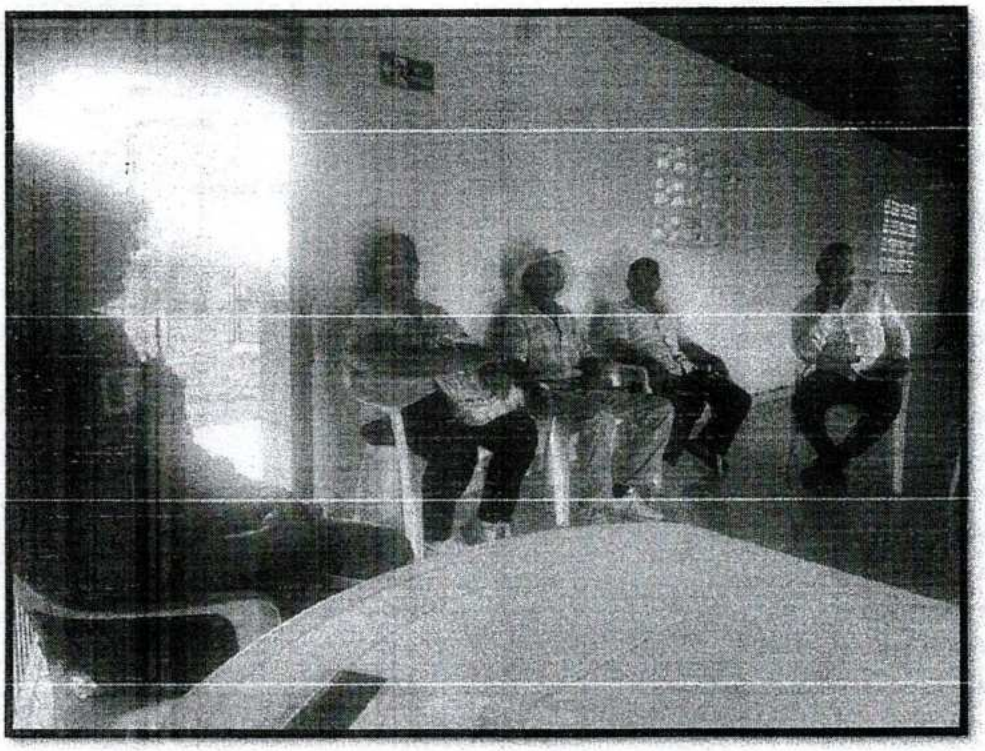

INDICADOR

Actividades	No	Indicador RELACION	%	VALOR	SI	NO	Cumplimiento Parcial	%	Metas
Apoyo a conformación del Comité Veedor	35	Conformación de comité de participación= 1 Ciudadana:	100	1/1 x 100				100	80%

Elaboro: Valery Vanegas Segura cc.1.018.515.205 Auxiliar en SST	Reviso: Lina Maria Peralta Cifuentes C.c: 1.010.232.399 Licencia 12314 de 2021 Profesional SISOMA	Aprobó: Ana Carolina González C.c 1.019.015.582 TP. 25202-277716 CND Representante Legal

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
	CÓDIGO: SST-F-001	VERSIÓN: 02	FECHA: Enero 2023

TIPO DE ACTIVIDAD (Marque con una X en el cuadro correspondiente)

Capacitación / Entrenamiento		Inducción / Re-Inducción		Charla de 5 Minutos		Otra/ Cual	X

Tema:	Socialización Avance contrato 112-2023		
Instructor:	Interno		Externo
Objetivo de la Capacitación:	Entrega Vidantes DAGA		
Fecha de Realización:	Hora:		Duración:

N°	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1.	Yisela Mejia	—	Yisela Mejia
2.	Yisela vargas	—	Yisela vargas
3.	Luis Fernando camin Q	—	Luis Fernando.
4.	Jhojan cons Tello	—	Jhojan cons Tello
5.	Germán quibana	—	Germán quibana
6.	Falberth Quibano	—	Falberth Quibano
7.	Eduardo quibano	—	Eduardo Q.
8.	Ivan Chavarro	—	I. C.
9.	Juan David camas C.	—	Juan David C.
10.	Milton Bonilla E	—	Milton B.
11.	Consuelo Dominguez	—	Consuelo D.
12.	Yerith cheintre	—	
13.	Miguel Bonilla	—	Miguel A. Bonilla
14.	Alejandro chimbuco	—	Alejandro Chimbuco
15.	Cristobal Alvarado	—	Cristobal A.
16.	Gentil Mamatos	—	Gentil Mamatos
17.	Alexandra campo Q.	—	Alexandra C.
18.	Maria del mar Rojas	—	Mar Rojas
19.	Kelly vargas sans	—	Kelly vargas S.
20.	Harold torres	—	Harold torres.
21.	Yuliana Dominguez	—	Yuliana D.
22.	Mary cabrera Q.	—	Mary cabrera
23.	Jhonathan Alejander Diaz	—	Jhonathan D.
24.	Luis David camero	—	Luis D. camero
25.	Victor Ramirez	~	Victor Ramirez.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
GRUPO MS	CÓDIGO: SST-F-001	VERSIÓN: 02	FECHA: Enero 2023

TIPO DE ACTIVIDAD (Marque con una X en el cuadro correspondiente)

Capacitación / Entrenamiento		Inducción / Re-Inducción		Charla de 5 Minutos		Otra/ Cual	X

Tema: Socialización Acuerdo contrato 1112-2023

Instructor: **Interno** **Externo**

Objetivo de la Capacitación:

Entrega Volantes PAGA

Fecha de Realización: **Hora:** **Duración:**

N	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1.	Beatriz cabrera		Beatriz Cabrera
2.	Martha Ramirez		Martha C. Ramirez
3.	Edilberto silva		Edilberto silva
4.	Diana cañon		Diana Cañon
5.	carolina Terradentro		carolina T.
6.	Fredy velasco		Fredy velasco
7.	Amparo QUIPO		Amparo quipo
8.	Victor carquera		victor carquera
9.	Gloria quintero		Gloria Quintero
10.	Orlando campo		Orlando campo
11.	Benito Pobre		Benito pobre
12.	Yuli perdomo		Yuli perdomo
13.	Yordi castro		Yordi castro
14.	Viviana Pardo		viviana pardo
15.	victoria cuellar		victoria cuellar
16.	Victor Rojas		
17.	Veronica Martinez		Veronica M.
18.	Vanessa Diaz Chavarro		Vanessa Diaz
19.	Valentina Lugo Lopez		~~Valentina Lugo~~
20.	Luis obando		Luis obando
21.	Tatiana Tierradentro		Tatiana T.
22.	Luis Dary Morales		Luis Dary
23.	Marina Gonzalez		marina G.
24.	Sonia Parra		~~Sonia Parra~~
25.	Paula Andrea Giraldo		Paula

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
	CÓDIGO: SST-F-001	VERSIÓN: 02	FECHA: Enero 2023

TIPO DE ACTIVIDAD (Marque con una X en el cuadro correspondiente)							
Capacitación / Entrenamiento		Inducción / Re-Inducción		Charla de 5 Minutos		Otra/ Cual	X

Tema:	Socialización Avance contrato 142-2023				
Instructor:		**Interno**		**Externo**	
Objetivo de la Capacitación:	Entrega volantes PAGA				
Fecha de Realización:		**Hora:**		**Duración:**	

N	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1.	Francy Helena Ramirez	—	FRANCY R.
2.	Yineth Ramirez cabrera	—	Yineth Ramirez
3.	Eduardo Gonzalez	—	Eduardo G.
4.	octavio cuellar	—	octavio cuellar
5.	Reynaldo Ramirez	—	REYNALDO RAMIREZ
6.	Gilma Lizcano	—	Gilma Lizcano
7.	Maria jose oñoda	—	maria jose O.
8.	Alcides gulindo	—	A. Gulindo
9.	Alvaro Rodriguez	—	Alvaro R.
10.	Loren camila Rodriguez	—	Loren Rodriguez
11.	Luis Fernando Rodriguez	—	LUISFER R.
12.	Lida cristina Rodriguez	—	Lida C. R.
13.	Amparo camira	—	AMPARO C.
14.	Ana isabel quibano	—	Ana quibano
15.	Ana saavedra	—	
16.	Ana Rita Zuñiga	—	Ana Rita Z.
17.	Anayibe Andrade	—	AnayAndrade
18.	Andrea Ramirez	—	Andrea R.
19.	camila Herrera	—	Camila H.
20.	Angelica olarte	—	Angelica olarte
21.	Mario Olarte	—	Mario olarte
22.	Jose olarte	—	Jose olarte
23.	Andres Ramirez	—	Andres R.
24.	Victor Blanco	—	Victor Blanco
25.	carolina Fierro	—	Carolina F.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
	CÓDIGO: SST-F-001	VERSIÓN: 02	FECHA: Enero 2023

TIPO DE ACTIVIDAD (Marque con una X en el cuadro correspondiente)

Capacitación / Entrenamiento		Inducción / Re-Inducción		Charla de 5 Minutos		Otra/ Cual	X

Tema:	Socialización Avance contrato 141 - 2023		
Instructor:		Interno	Externo
Objetivo de la Capacitación:			
	Entrega volantes PAGA		
Fecha de Realización:	Hora:		Duración:

N	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1.	Maria jose castillo Q.	—	Maria Jose C.
2.	Adriana silva	—	[illegible]
3.	Alejandro osorio	—	Alejandro O
4.	Luz Elida cabrera	—	luz cabrera
5.	Natalia Peralta	—	[illegible]
6.	Alvaro guevara	—	[illegible]
7.	Angie gisbon Iriana	—	Angie Milena G.
8.	Dary Tovar cabrera	—	Dary Tovar C.
9.	Dayana Medina	—	Dayana Medina
10.	Gonzalo Rodriguez	—	Gonzalo Rodriguez
11.	Wilson Gonzalez	—	[illegible]
12.	Leonidas Hierro	—	Leonidas Hierro
13.	Luz Divia Quintero	—	[illegible]
14.	Adela chavarro Polo	—	Adela Chavarro
15.	Duvan Gonzalez	—	[illegible]
16.	EDWIN RAMIREZ	—	EDWIN J. RAMIREZ
17.	Karina Sanchez	—	karina Sanchez
18.	Fabio vargas	—	[illegible]
19.	Edgar Quintilio campo	—	Edgar
20.	ELIZABETH LUGO	—	Elizabeth Lugo
21.	Francy Pobre	—	Francy Pobre
22.	Humberto Castro	—	[illegible]
23.	Fernanda Arguchos	—	Fernanda Arguchos
24.	Carlos Perdomo	—	Carlos Perdomo
25.	Elkin Rodriguez Gonzalez	—	Elkin Rodriguez

Informe PAGA

GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

JUNIO DE 2024

PROGRAMA 1: DESAROLLLO Y APLIACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL

Desde el componente ambiental, su actividad fundamental es velar por la protección de Fauna y biodiversidad principalmente en el la influencia directa del proyecto, para ello desde el área ambiental se capacita y sensibiliza al personal de obra sobre el conocimiento y cuidado de la fauna, además que la salvaguarda de la vegetación natural del sitio es primordial para conservar el hábitat de las especies faunísticas de la zona.

Para ello, se les notifica que en caso de encontrar un animal silvestre en los frentes de trabajo deben seguir el siguiente protocolo:

- No los manipules.
- No les arrojes objetos, ya que puedes espantarlos o asustarlos y generarles estrés.
- No los mantengas en cautiverio o adoptar como mascotas
- No suministrar alimentos de manera forzada

Teniendo esto en cuenta, si se encuentras un animal silvestre, debes reportar la situación a la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA de manera inmediata a través de los siguientes medios:

- Teléfonos Grupo Fauna Silvestre: 3778854 - 3778855 - 300 3197888
- Ventanilla de atención Grupo Fauna Silvestre: 3778925
- PBX SDA: 3778899
- Correo electrónico: fauna@secretariadeambiente.gov.co

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL			
PROYECTO 1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL			Código: DAGA-1.1-01
OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía ambiental-PAGA.			
TIPO DE MEDIDAS			
Prevención	Corrección	Mitigación	Compensación
X	X	X	

ACCIONES A EJECUTAR:

- El contratista de obra debe contar con un equipo profesional social y ambiental para la implementación de los programas y/o proyectos que aplican conforme a los requerimientos contractuales existentes.
- La gestión SOCIOAMBIENTAL del proyecto estará a cargo de los profesionales ambiental y social quienes propenderán por el cumplimiento de todas las políticas y lineamientos.
- Se contará con el director de obra e inspector para la implementación de los programas y/o proyectos de manejo ambiental que aplican en el proyecto y así poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones.
- Se dará cumplimiento de cada uno de los programas de manejo socio ambiental propuesto en el PAGA.
- Garantizar la respuesta a todas las quejas, inquietudes y/o reclamos que la comunidad manifieste dando la solución pertinente.
- El residente SISOMA acompañará el proceso de respuesta de los requerimientos de: Autoridades
- El residente SISOMA y asesor social elaborará informes mensuales de ejecución del PAGA. Este deberá ir conforme los programas de manejo ambiental formulados en el presente documento.
- De ser necesario, el residente Ambiental y social participará de los comités de obra que se desarrollen a lo largo del proyecto, con el fin de tratar asuntos de la comunidad y ambiental, resolver inquietudes, dar informe verbal sobre las actividades ejecutadas y atender los requerimientos que apliquen.
- El residente Ambiental y social deberá actualizar el PAGA cada vez que se requiera de acuerdo con las condiciones del proyecto o del medio que cambien, así como presentar las versiones ajustadas.
- Las demás medidas, acciones que hagan parte de los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y contrato de obra.

LUGAR DE LA APLICACIÓN: Los corredores viales de los tramos rurales del municipio de Paicol – Huila

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

ITEM	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (3 MESES)		
1	Residencia en el manejo socio-ambiental	X	X	X
2	Atención de requerimientos.	X	X	X
3	Elaboración de informe de ejecución del PAGA	X	X	X
4	Participación de los profesionales en comités de obra.	X	X	X
5	Realización de actualizaciones del PAGA.		X	

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: GRUPO MSG S.A.S	COSTOS: $ 680.000

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO:

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS			
PROYECTO 2. SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES			CÓDIGO: PAC-4.3-06
OBJETIVO: Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal.			
TIPO DE MEDIDAS			
Prevención	Corrección	Mitigación	Compensación
X	X	X	
IMPACTOS A MANEJAR: Disminución de la calidad visual del paisaje, Afectación de predios: cultivos y/o viviendas, Contaminación por lechada de concreto, Aumento de la presión sonora y Contaminación atmosférica por material particulado.			
ACCIONES A EJECUTAR:			
• Cerramiento a áreas de trabajo. • Senderos Peatonales: Se establecerán cuando así se requiera. La superficie de éstos deberá ser antideslizante, sin obstáculos y a un mismo nivel, que facilite la movilidad de los transeúntes. • Trabajos Nocturnos: En caso de presentarse trabajos nocturnos se instalarán señales reflectivas o luminosas, tales como conos luminosos, licuadoras, flechas, ojos de gato que indiquen la labor que se está realizando.			
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: GRUPO MSG S.A.S			**COSTOS: $ 427.300**

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO





PROGRAMA 5: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante el mes de septiembre, se seleccionó un sitio

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			
PROYECTO 5. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO			CÓDIGO: PMIT-5.1-15
OBJETIVO: Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.			
TIPO DE MEDIDAS			
Prevención	Corrección	Mitigación	Compensación
X	X	X	
IMPACTOS A MANEJAR: Disminución/Aumento de la calidad visual del paisaje, Conflictos con las comunidades, Contaminación por residuos oleosos y/o lechada de concreto.			
ACCIONES A EJECUTAR:			

- CAMPAMENTOS:
  - Instalación: Se instalará un campamento administrativo en el casco urbano del municipio.
  - Funcionamiento: El fin de estos es almacenar herramientas y equipos menores, también servirá para resguardo de la lluvia, actividades de descanso, alimentación y uso de unidad sanitaria.
  - En el campamento se publicará la documentación socio-ambiental y así mismo se dotará de elementos de primeros auxilios, extintor y listado de teléfonos de emergencias de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Contingencias.
  - El Servicio de Atención al Usuario-SAU se instalará en el campamento Administrativo, preferiblemente en un sitio central y estratégico dentro del casco urbano del municipio, lo cual centraliza el acceso a la comunidad.
  - En el campamento se tendrá el kit de manejo para derrames contingentes de lechada de concreto y/o residuos oleosos, sobre lo cual se detalló en el proyecto PAGA
  - Desmantelamiento: se dará cierre a los permisos tramitados con los propietarios de los predios tramitados, los terrenos quedaran en iguales o mejores condiciones a las registradas al inicio.
  - Para el cierre ambiental se entregará la paz y salvo de recibo a satisfacción por parte de los dueños de los predios.

- SITIOS DE ACOPIO
  - Cuando se requiera tramitar permiso para el acopio de materiales se tendrá en cuenta que las áreas seleccionadas no afecten los componentes iniciales del suelo, que no estén en mediaciones a fuentes hídricas o de importancia bilógica.
  - Se tramitará la respectiva acta de apertura y cierre del permiso de ocupación temporal el cual debe incluir un registro fotográfico del antes y después.
  - Los campamentos, frentes de obra y sitios de acopio temporal de materiales realizaran jornadas periódicas de orden y aseo.


LUGAR DE LA APLICACIÓN: Los corredores viales de los tramos rurales del municipio Paicol – Huila


CRONOGRAMA

ITEM	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (3 MESES)		
1	Instalación del campamento	X	X	X
2	Dotación del campamento	X		
3	Mantenimiento de los campamentos y sitios de acopio.	X	X	X
4	Desmantelamiento de campamentos y entrega de sitios de acopio.	X	X	X

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:	**COSTOS: $ 2.660.000**
Director de Obra, Ingeniero Residente de Obra, inspector SST y Profesional Ambiental	

EVIDENCIA

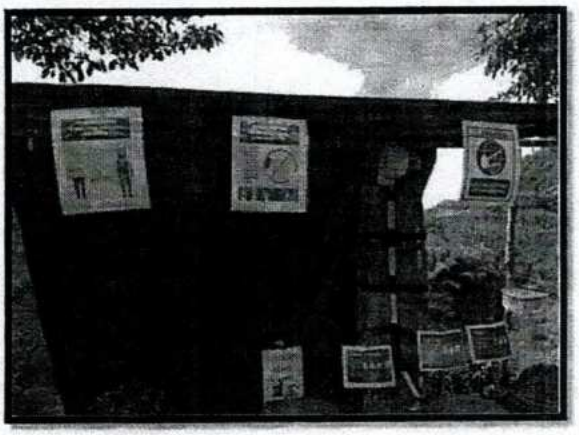

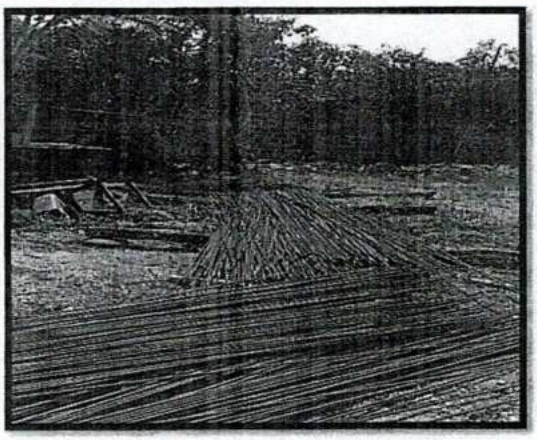







PROGRAMA 6: GESTIÓN SOCIAL

PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL			
PROYECTO 6. GESTIÓN SOCIAL			CÓDIGO: PMIT-5.1-16
OBJETIVO: Socializar a la comunidad del Paicol – Huila, el proyecto, sus avances e interactuar con la finalidad de demostrar la correcta inversión al proyecto.			
TIPO DE MEDIDAS			
Prevención	Corrección	Mitigación	Compensación

X	X	X	

IMPACTOS A MANEJAR: NO APLICA

ACCIONES A EJECUTAR:

- Entrega de volante y socialización a la comunidad, donde mostraremos el avance del proyecto, con la finalidad de que estén enterados del avance el proyecto y la inversión del mismo
- Impresiones requeridas para las actividades del proyecto.
- Se elabora un buzón donde se instalará en el restaurante, con la finalidad que la gente pueda sugerir mejorar en el proceso social
- Se crea un punto de atención para la atención de la comunidad

LUGAR DE LA APLICACIÓN: Los corredores viales de los tramos rurales del municipio Paicol – Huila

CRONOGRAMA

ITEM	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (3 MESES)		
1	Volantes	X	X	X
2	Impresiones	X		
3	Buzón	X	X	X
4	Punto de atención	X	X	X

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:	**COSTOS: $ 2.010.000**
Director de Obra, Ingeniero Residente de Obra, inspector SST y Profesional Ambiental	

INDICADORES

Dentro del marco del programa de gestión social se busca atender las diversas solitudes e inquietudes que tiene la comunidad de cara a la ejecución de la obra, se pone a su disposición diferentes medios de comunicación para que oficialicen sus PQRSF.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
	CÓDIGO: SST-F-001	VERSIÓN: 02	FECHA: Enero 2023

TIPO DE ACTIVIDAD (Marque con una X en el cuadro correspondiente)							
Capacitación / Entrenamiento		Inducción / Re-Inducción		Charla de 5 Minutos		Otra/ Cual	X

Tema:	Socialización Avance contrato 112-2023		
Instructor:	Interno		Externo
Objetivo de la Capacitación:	Entrega volantes PAGA		
Fecha de Realización:	Hora:		Duración:

N	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1.	Francy Helena Ramirez	—	FRANCY R.
2.	Yineth Ramirez cabrera	—	Yineth Ramirez
3.	Eduardo Gonzalez	—	Eduardo G.
4.	octavio cuellar	—	octavio cuellar
5.	Reynaldo Ramirez	—	REYNALDO RAMIREZ
6.	Gilma Lizcano	—	Gilma Lizcano
7.	Ward jose ojeda	—	ward jose o.
8.	Alcides galindo	—	A. Galindo
9.	Alvaro Rodriguez	—	Alvaro R.
10.	Laura camila Rodriguez	—	Laura Rodriguez
11.	Luis Fernando Rodriguez	—	Luis Fer R.
12.	Lida cristina Rodriguez	—	Lida C. R.
13.	Amparo camero	—	Amparo C.
14.	Ana isabel Quintero	—	Ana Quintero
15.	Ana saavedra	—	
16.	Ana Rita Zuñiga	—	Ana Rita Z.
17.	Angybe Andrade	—	Angy Andrade
18.	Andrea Ramirez	—	Andrea R.
19.	camila Maria	—	Camila H.
20.	Angela olarte	—	Angela olarte
21.	Maria Olarte	—	Maria olarte
22.	Jose olarte	—	Jose olarte
23.	Andres Ramirez	—	Andres Ramir
24.	Victor Blanco	—	Victor Blanco
25.	carolina Fierro	—	Carolina F.

8. INFORME INTERVENTORIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL – HUILA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA.

INFORME DE INTERVENTORIA DEL 09 DE MAYO 2024 AL 08 DE JUNIO DE 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 149 DE 2023.

CONTRATO DE OBRA No. 142 de 2023

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría No.	Contrato No.149 de 2023
Objeto	Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA.
Valor Inicial	$52.335.346,00
Valor total	$52.335.346,00
Plazo	La interventoría CONTRATADA deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de obra respecto del cual se ejerza la interventoría, tres (03).
Plazo adicional	Un (01) mes y 27 días
Plazo total	Cuatro (04) meses, y veintisiete (27) días.
Anticipo	$0
Contratista	SOCIEDAD TÉCNCA SOTA LTDA
Representante Legal	ING. JAVIER BARRERO MOSSOS.
Supervisor	ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS.
Contratante	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL – HUILA. SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.
Fecha de Inicio	05 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación 1	04 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación 2	31 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación 3	08 de junio de 2024
OTRO SI No 1	02 de diciembre del 2023
OTRO SI No 2	09 de mayo del 2024
Acta de suspensión	27 de diciembre del 2023
Fecha de Reinicio No.1	09 de mayo de 2024
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL



RELACION DE POLIZAS DE INTERVENTORÍA

Estado de las Pólizas – ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL				
Póliza Legalización del Contrato FECHA EXP23/AGO/2023 - FECHA DE APROBACION:24/AGO/2023				
Amparo	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**	**Vlr. Asegurado**
Cumplimiento	CHU-100001080_0	11/08/2023	11/03/2024	$10.467.069,20
Anticipo	CHU-100001080_0	11/08/2023	11/03/2024	$15.700.604,00
Prestaciones Sociales	CHU-100001080_0	11/08/2023	11/11/2026	$10.467.069,20
Calidad del Servicio	CHU-100001080_0	11/11/2023	11/11/2028	$10.467.069,20

Amparo	No. Póliza	Desde	Hasta	Vlr. Asegurado
Responsabilidad Civil Extracontractual	CHU-100001080	11/08/2023	11/11/2023	$232.000.000,00

ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE INTERVENTORÍA POR ACTA DE INICIO

FECHA EXP: 13/SEP/2023 - FECHA DE APROBACION: 10/ OCTUBRE /2023				
Amparo	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**	**Vlr. Asegurado**
Cumplimiento	CHU-100005536	05/09/2023	05/04/2024	$10.467.069,20
Anticipo	CHU-100005536	05/09/2023	05/04/2024	$15.700.604,00
Prestaciones Sociales	CHU-100005536	05/09/2023	06/12/2026	$10.467.069,20
Calidad del Servicio	CHU-100005536	06/12/2023	06/12/2028	$10.467.069,20

FECHA EXP: 13/SEP/2023 - FECHA DE APROBACION: 10 /OCTUBRE/ 2023				
Amparo	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**	**Vlr. Asegurado**
Responsabilidad Civil Extracontractual	CHU-100001080	05/09/2023	6/12/2023	$232.000.000,00

ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE INTERVENTORÍA POR ADICION DE PLAZO 1. OTROSI 1.

FECHA EXP: 14/DICIEMBRE/2023 - FECHA DE APROBACION: 15/diciembre/2023.				
Amparo	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**	**Vlr. Asegurado**
Cumplimiento	CHU-100005536	04/12/2023	05/05/2024	$10.467.069,20
Anticipo	CHU-100005536	04/12/2023	05/05/2024	$15.700.603,80
Prestaciones Sociales	CHU-100005536	04/12/2023	06/01/2027	$10.467.069,20
Calidad del Servicio	CHU-100005536	06/01/2024	06/01/2029	$10.467.069,20

FECHA EXP: 18/DICIEMBRE/2023 - FECHA DE APROBACION: 18/diciembre/2023.				
Amparo	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**	**Vlr. Asegurado**
Amparo Básico – predios, labores y operaciones.	CHU-100001080	05/09/2023	6/01/2024	$232.000.000,00
Patronal.	CHU-100001080	05/09/2023	6/01/2024	$69.600.000,00
Contratista y Sub contratistas.	CHU-100001080	05/09/2023	6/01/2024	$69.600.000,00
Vehículos propios y no propios.	CHU-100001080	05/09/2023	6/01/2024	$69.600.000,00

ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE INTERVENTORÍA POR REINICIO Y ADICION DE PLAZO 2 . OTROSI 2.

FECHA EXP: 24/MAYO/2024 - FECHA DE APROBACION: 05/JUNIO/2024.				
Amparo	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**	**Vlr. Asegurado**
Cumplimiento	CHU-100005536	09/10/2024	20/10/2024	$10.467.069,20
Anticipo	CHU-100005536	20/05/2024	20/10/2024	$15.700.603,80
Prestaciones Sociales	CHU-100005536	09/05/2024	20/06/2027	$10.467.069,20
Calidad del Servicio	CHU-100005536	20/06/2024	20/06/2029	$10.467.069,20

FECHA EXP:24/MAYO /2024 - FECHA DE APROBACION: 05/Junio/2024.				
Amparo	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**	**Vlr. Asegurado**
Amparo Básico – predios, labores y operaciones.	CHU-100001080	05/09/2023	20/06/2024	$232.000.000,00
Patronal.	CHU-100001080	05/09/2023	20/06/2024	$69.600.000,00
Contratista y Sub contratistas.	CHU-100001080	05/09/2023	20/06/2024	$69.600.000,00
Vehículos propios y no propios.	CHU-100001080	05/09/2023	20/06/2024	$69.600.000,00



INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de obra No.	Contrato No. 142 de 2023
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA.
Valor Inicial	$ 715.214.130,00
Plazo	Tres (03) meses a partir de Acta de Inicio
Plazo adicional	56 días calendario.
Plazo total	Cuatro (04) meses y veintisiete (27) días.
Anticipo	$ 0
Contratista	GRUPO MSG S.A.S.
Representante Legal	ING. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
Supervisor	Municipio Paicol – ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
Fecha de Inicio	05 de septiembre de 2023.
Fecha de Terminación 1	04 de diciembre de 2023.
Fecha de Terminación 2	31 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación 3	08 de junio de 2024
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de suspensión No.01	27 de diciembre de 2023
Fecha de Reiniciación No.01	09 de mayo de 2024
Valor Pagado a la fecha	$ 621.580.343,26. Acta parcial 1, 2 y 3.



1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

El equipo de la Interventoría continúa realizando la labor de supervisión y seguimiento en los procesos constructivos en el sitio de la obra lo cual nos ha permitido estar en pleno contacto con el Contratista, la Alcaldía municipal y la comunidad de las veredas a intervenir de Paicol, para que la obra se desarrolle en los más altos estándares de calidad, y sea la misma comunidad beneficiaria, la que pueda estar mejorando su "Calidad de Vida".

EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

El contrato en mención tiene un avance del 100%

EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Durante este mes se ejecutaron obras en los DOS (2) frentes (TRAMOS):

Vereda Alto Granadillo. Tramo 5. Avance desde abscisa km000+050 a km000+080:

*2.1 Excavación mecánica (Explanación) ESP 210-13 INVIAS. Incluye retiro de material proveniente de la excavación a disposición final del mismo.

*2.4 Acero de refuerzo 4200kg/cm2 (60000psi) ESP. 640-13INVIAS Para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones.

*2.5 Suministro e instalación de concreto normal clase D. (F'c=210kg/cm2) o (3000 psi) para dentellones, placas, riostras, cunetas y bordillos.

Con una cuadrilla integrada por (1) maestro de obra, (4) ayudantes de obra.

Vereda La Cumbre. Tramo 7: Avance desde abscisa km000+000 a km000+050:

*2.3 Suministro, instalación, extendida, nivelación, humedecimiento o aireación y compactación de subbase granular CBR ≥ 40%. esp. 320-13 inv.

*2.4 Acero de refuerzo 4200kg/cm2 (60000psi) ESP. 640-13INVIAS Para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones.

*2.5 Suministro e instalación de concreto normal clase D. (F'c=210kg/cm2) o (3000 psi) para dentellones, placas, riostras, cunetas y bordillos.

* 3.1 Suministro e instalación de solado de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2). para obras de arte.



* 3.2 Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). para construcción de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobre piso de alcantarillas.

*3.4 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-13 inv. para alcantarilla, box, muros, incluye transporte.

* 3.5 Suministro e instalación material granular filtrante. esp. 673-13 inv.

Con una cuadrilla integrada por (1) maestro de obra, (4) ayudantes de obra.

RELACIÓN DE LAS OBRAS.

CONTRADAS INICIALES:

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localizacion y replanteo	ML	510	$ 4.096,89	$ 2.089.413,14
	SUBTOTAL				$ 2.089.413,14
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA				
2.1	Excavacion mecanica (Explaneacion) ESP 210-13 INVIAS. Incluye retiro de material proveniente de la excavacion a disposicion final del mismo.	m3	228	$ 57.671,00	$ 13.148.987,07
2.2	Excavacion manual en seco (Incluye transporte al sitio autorizado)	m3	58	$ 67.027,39	$ 3.887.588,65
2.3	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedeciiento o aireacion y compactacion de subbase granular CBR>=40% . ESP. 320-13 INVIAS	m3	324	$ 157.983,10	$ 51.186.523,01
2.4	Acero de refuerzo 4200kg/cm2 (60000psi) ESP. 640-13INVIAS Para placas, riostras, cunetas, bordillos y	kg	21838	$ 9.099,20	$ 198.708.410,40
2.5	Suministro e instalacion de concreto normal clase D. (F'c=210kg/cm2) o (3000 psi) para dentellones, placas , riostras, cunetas y bordillos.	m3	385	$ 752.466,00	$ 289.699.409,08
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA	m3	93	$ 501.375,97	$ 46.627.965,37
	SUBTOTAL				$ 603.258.883,57
3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (6)				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F'C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS	m3	18	$ 586.891,47	$ 10.564.046,42
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE	m3	51	$ 752.466,00	$ 38.375.765,88
3.3	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	m	30	$ 520.716,92	$ 15.621.507,56
3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE	Kg	3473	$ 9.099,20	$ 31.601.534,45
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	m3	3	$ 192.990,70	$ 578.972,09
3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.	m3	42	$ 102.004,40	$ 4.284.184,67
	SUBTOTAL				$ 101.026.011,07
	SUBTOTAL DE OBRAS				$ 706.374.307,77
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 3.264.000,00
	PAGA				$ 5.575.822,00
	VALOR TOTAL DIRECTOS				$ 715.214.130,00

EJECUTADAS PRESENTE PERIODO: MAYO 09 a JUNIO 08 2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. MUNICIPIO DE ACEVEDO								
PRELIMINARES								
1	1,1		1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML		$ 3.151	$ 0
Subtotal								$ 0
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA								
2	2,1	ESP. 210-13 INV		EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	m3		$ 44.362	$ 0
3	2,2		2P	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)	m3		$ 51.560	$ 0
4	2,3	ESP. 320-13 INV.		SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV.	m3		$ 121.525	$ 0
5	2,4	ESP.640-13 INV.		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	kg		$ 6.999	$ 0
6	2,5	ART. 630 INV		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	m3	21,66	$ 578.820	$ 12.537.241
7	2,6	ESP. 630-13 INV.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) . 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS.	m3		$ 385.874	$ 0
Subtotal								$ 12.537.241
OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (6)								
8	3,1	ESP. 630-13 INV.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE	m3		$ 451.455	$ 0
9	3,2	ART. 630 INV		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	m3		$ 578.820	$ 0
10	3,3	ESP. 661-13 INV.		SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	m		$ 400.551	$ 0
11	3,4	ESP.640-13 INV.		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	Kg	99,40	$ 6.999	$ 695.739
12	3,5	ESP. 673-13 INV.		SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	m3		$ 148.454	$ 0
13	3,6	ESP. 220.1-13 INV.		TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.	m3		$ 78.465	$ 0
Subtotal								$ 695.739
COSTO DIRECTO								$ 13.232.981,00

ADMINISTRACION	23%	$ 3.043.586,00
IMPREVISTO	2%	
UTILIDAD	5%	$ 661.649,00
SUBTOTAL		$ 16.938.216,00

IMPREVISTOS	$ 9.969.195,30
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 3.264.000,00
PAGA	$ 5.575.822,00
VALOR TOTAL	$ 35.747.233,30



1.1.1 Estado de las Pólizas – ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza Legalización del Contrato **Anexo 1**

Fecha de expedición: 01/agosto/2023 **Fecha de Aprobación: 15/agosto/2023**

No. Póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
33-44-101240822	Cumplimiento del Contrato	$143,042,826.00	25/julio/2023	25/marzo/2024
33-44-101240822	Salarios y Prestaciones Sociales	$35,760,707.00	25/julio/2023	25/octubre/2026
33-44-101240822	Estabilidad de la Obra	$143,042,826.00	25/octubre/2023	25/octubre/2028
33-40-101075700	Responsabilidad civil extracontractual	$232,000,000.00	25/julio/2023	25/octubre/2023

Actualización Póliza Acta de Inicio **Anexo 2**

Fecha de Expedición: 12/ OCTUBRE/2023 **- Fecha de Aprobación: 25/OCTUBRE/2023**

No. Póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
33-44-101240822	Cumplimiento del Contrato	$143,042,826.00	05/sep/2023	07/Abril/2024
33-44-101240822	Salarios y Prestaciones Sociales	$35,760,707.00	05/sep/2023	06/Dic/2026
33-44-101240822	Estabilidad de la Obra	$143,042,826.00	06/Dic/2023	06/Dic/2028
33-40-101075700	Responsabilidad civil extracontractual	$232,000,000.00	05/sept/2023	06/dic/2023

Actualización Póliza Acta de MODIFICACION PLAZO. (PRORROGA 1) **Anexo 3**

Fecha de Expedición: 14/ DICIEMBRE/2023 **- Fecha de Aprobación: 14/ DICIEMBRE/2023**

No. Póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
33-44-101240822	Cumplimiento del Contrato	$143,042,826.00	05/sep/2023	30/Abril/2024
33-44-101240822	Salarios y Prestaciones Sociales	$35,760,707.00	05/sep/2023	31/Dic/2026
33-44-101240822	Estabilidad de la Obra	$143,042,826.00	06/Dic/2023	06/Dic/2028
33-40-101075700	Responsabilidad civil extracontractual	$232,000,000.00	05/sept/2023	31/dic/2023

Actualización Póliza Acta de MODIFICACION PLAZO. (Suspensión y Reinicio)				Anexo 4 -6
Fecha de Expedición: 10/ MAYO/2024		- Fecha de Aprobación: 16/ MAYO/2023		
No. Póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
33-44-101240822	Cumplimiento del Contrato	$143,042,826.00	5/09/2023	11/09/2024
33-44-101240822	Salarios y Prestaciones Sociales	$35,760,707.00	5/09/2023	11/05/2027
33-44-101240822	Estabilidad de la Obra	$143,042,826.00	6/12/2023	06/12/2028
33-40-101075700	Responsabilidad civil extracontractual	$260,000,000.00	05/09/2023	11/05/2024

Actualización Póliza Acta de MODIFICACION PLAZO. (Prórroga 2)				Anexo 7
Fecha de Expedición: 10/ MAYO/2024		- Fecha de Aprobación: 16/ MAYO/2023		
No. Póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
33-44-101240822	Cumplimiento del Contrato	$143,042,826.00	5/09/2023	11/10/2024
33-44-101240822	Salarios y Prestaciones Sociales	$35,760,707.00	5/09/2023	11/06/2027
33-44-101240822	Estabilidad de la Obra	$143,042,826.00	6/12/2023	06/12/2028
33-40-101075700	Responsabilidad civil extracontractual	$260,000,000.00	05/09/2023	11/06/2024

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Contrato de Obra

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	05/09/2023	N/A	N/A	04/12/2023
Otro sí No. 1	02/12/2023	88	N/A	31/12/2023
Suspensión No. 1	27/12/2023	114	N/A	31/12/2023
Reiniciación No 1	09/05/2024	114	134	N/A
Otro sí No. 2	09/05/2024	114	134	08/06/2024
Terminación	08/06/2024	144	134	08/06/2024

Historial Cronológico del Contrato de Interventoría				
ACTIVIDAD	**FECHA**	**DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
Iniciación	05/09/2023	145	N/A	N/A
Terminación	04/12/2023	N/A	N/A	8/06/2024

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta de Inicio de obra	1	05 de septiembre del 2023
Acta parcial 1	2	29 de septiembre del 2023
Acta Parcial 2	3	01 de noviembre del 2023
Acta prorroga 1	4	02 de diciembre del 2023
Acta Parcial 3	5	21 de diciembre del 2023
Acta prorroga 2	6	09 de mayo del 2024
Acta Parcial 4	7	01 de junio del 2024
Acta de Inicio de Interventoría	1	05 de septiembre del 2023
Acta parcial 1	2	12 de octubre del 2023
Acta Parcial 2	3	09 de noviembre del 2023
Acta prorroga 1	4	02 de diciembre del 2023
Acta prorroga 2	5	09 de mayo del 2024
Acta parcial 3	6	21 de diciembre del 2023
Acta parcial 4		01 de junio del 2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... $ 715.214.130,00

VALOR DEL ANTICIPO.....$ 00,00

PORCENTAJE DE ANTICIPO..... 0%

AVANCE FISICO REAL

Avance Físico Mensual.....**5.00 %**

Avance Físico Acumulado.....**100%**



AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

De acuerdo con la reprogramación presentada contratista y aprobada, el avance físico a la fecha debería ser del **100,00%**

PORCENTAJE DE AVANCE O ATRASO SEGÚN CRONOGRAMA

En el presente periodo se presenta la ejecución en **100%, cumpliendo todas las actividades programadas.**

El contratista ha concentrado la ejecución en los tramos; N°5 (Alto Granadillo) y N°7 (Vereda La Cumbre)

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Total de Obra inicial.....91 días
Tiempo Adicional.....53 días
Tiempo Total de Obra final.....144 días

Tiempo Total Transcurrido .....143 días
Tiempo Total que les queda.....0 días
Avance Porcentual según plazo final.....100%

AVANCE FINANCIERO

Inversión Contratada..... **$ 715.214.130,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo.....**$ 35.747.233,30**
Porcentaje Ejecutado en el Periodo.....5.00%
Inversión Total Ejecutada.....$ 715.214.130,00
Porcentaje Total Ejecutado.....100.00%

1.3.1 Estado y Avance Presupuestal del Proyecto INTERVENTORIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO..... **$ 52.335.346,00**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... **$ 52.335.346,00**

VALOR DEL ANTICIPO..... $ 00.00

PORCENTAJE DE ANTICIPO..... 0%

AVANCE FISICO REAL

Avance Físico Mensual.....5.00%

Avance Físico Acumulado..... 100.00%

1.4. Recomendaciones y Conclusiones
*El contratista de obra para el presente periodo, ha ejecutado en la totalidad los costos directos del proyecto.
1.5. Estado de Cronograma de obra
La supervisión de parte de la Administración Municipal para compensar la ola invernal y cambio de administración pública avaló prorroga No. 2 adicionando un (1) mes al contrato de obra e interventoría, donde el contratista de obra presenta una nueva reprogramación que es aprobada por la interventoría, el cual permitirá realizar un buen seguimiento durante el desarrollo de la obra.



Según la reprogramación de obra presentado por el contratista de obra se debería haber ejecutado obras por valor de:

El % de avance programado es de 100.00% = $ 715.214.130
El % de avance ejecutado es de 100.00% = $ 715.214.130

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato de Obra

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Acta Parcial No. 1	28/09/2023	$ 214.320.330,00	$ 00	$ 214.320.330,00
Acta Parcial No. 2	31/10/2023	$ 183.761.158,00	$ 00	$ 183.761.158,00
Acta Parcial No. 3	20/12/2023	$ 223.503.078,70	$ 00	$ 223.503.078,70
Acta Parcial No. 4	24/05/2024	$ 57.882.330.00	$ 00	TRAMITE
Acta Final		$ 35.747.233,30	$00	Liquidación
TOTALES		**$ 715.214.130,00**	**$ 00**	**$ 679.466.896,70**

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 715.214.130,00	$ 00,00	$ 715.214.130,00	$ 715.214.130,00	$ 0.00

2.1.1. Estado Financiero del Contrato de Interventoría

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Acta Parcia No. 1	28/09/2023	$ 15.679.670,00	$ 00	$ 15.679.670,00
Acta Parcia No. 2	31/10/2023	$ 13.444.950,00	$ 00	$ 13.444.950,00
Acta Parcia No. 3	20/12/2023	$ 17.977.191,00	$ 00	EN TRAMITE
Acta Final		$ 5,233,535.00	$00	Liquidación



TOTALES		$ 52.335.346,00	$ 0	$ 29.124.620,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 52.335.346,00	$ 00,00	$ 52.335.346,00	$ 52.335.346,00	$ 00.00

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

Personal Administrativo:

1. Diego Camilo Segura Morales (director Obra)
2. Ana Carolina González Rodríguez (Residente obra)
3. Claudia Catalina Guasca Cano (Especialista Pavimentos)
4. Lina María Peralta Cifuentes (Residente SISOMA)
5. Cesar Jefferson Martínez Castro (Topógrafo)

Equipo:

Una (1) Moto niveladora.
Una (1) retro cargador llantas.
Dos (2) Volquetas.
Tres (3) Mezcladora de concreto.
Un (1) Vibro compactador 2.0 Ton.
Un (1) Equipos topográficos completos

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

PRORROGA CONTRATO 142 DEL 2023: Continua acuerdo con la alcaldía del municipio de Paicol, en representación de supervisión de obra ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS prorroga #2 de 30 días calendario para subsanar el atraso de actividades por inconvenientes de lluvias y cambio administración pública.

De acuerdo con la necesidad manifestada por la comunidad y las condiciones topográficas, se suprimió la construcción de dos alcantarillas ya que las existentes se encontraban en óptimas condiciones y se aumentó en 70m el tramo de placa huella en la Vereda el Chaparro.

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

*Presente periodo, se verificaron cada uno de los tramos, en las longitudes contratadas y fueron entregadas al municipio de Paicol.
*Se supera las condiciones invernales y se logra ejecutar los tramos pendientes.

3.3. Cumplimiento de las condiciones del pliego de condiciones

*Las actividades adelantadas cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y los pliegos de condiciones.
*La obra se lleva a cabo con el personal idóneo y calificado para la ejecución de los trabajos.
*El personal presente en obra cuenta su respectiva afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales.
*Se ha cumplido con los pagos al personal en campo.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

- Ø Compresión simple al concreto
- Ø Ensayo porcentajes de compactación, conformación subbase.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Compresión simple al concreto: Anexos
Ensayo de densidad: Anexos

4.3. Comentarios y Conclusiones

1.El contratista realiza los respectivos controles en la preparación de concreto 3000psi in-situ, tomando asentamientos cono abrams y muestras frescas para compresión.
2. El contratista toma respectivos densidades de campo para verificar el porcentaje de compactación en la conformación de la subbase.
3. Contratista protege adecuadamente el concreto en proceso de curado, aplica antisol.

5. INFORME AMBIENTAL

5.1 Identificación de situaciones Ambientales

Se cumple con todas las normas ambientales, sin presentar perjuicio alguno

5.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

No se presentan ningún tipo de daño y/o perjuicio a terceros al cierre del presente informe.

5.3 Descripción de Actividades Desarrolladas en el Periodo

El contratista cumplió con todas las normas y requisitos exigidos para la seguridad industrial y salud ocupacional del personal.

6. PAGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Cumplimiento de las normas de seguridad Industrial

Esta Interventoría solicita al contratista de obra, adoptar las medidas necesarias para que todo el personal de obra utilice los elementos de seguridad y protección personal antes de iniciar y durante la ejecución de las actividades, según lo establecido en la parte de seguridad industrial y salud ocupacional. Al cierre de cada jornada se coloca la cinta de señalización en toda el área afectada.
6.2. Pagos de la Seguridad Integral y Otros
El contratista viene presentando dentro de los plazos establecidos, las planillas, mensuales de pago de la seguridad social de sus trabajadores.

JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal SOTA LTDA


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Excavación mecánica km000+050 a Km000+030. Tramo #5. Vereda Alto Granadillo.



Finalizacion conformacion subbase km000+050 a km000+080. Tramo #7. Vereda La Cumbre.

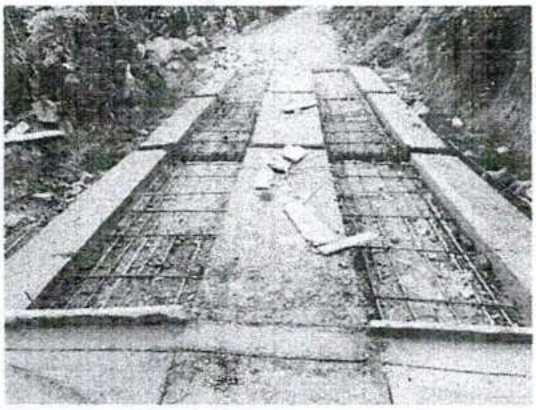

Finalización Instalación aceros km000+050 a km000+080. Tramo #7. Vereda La Cumbre.

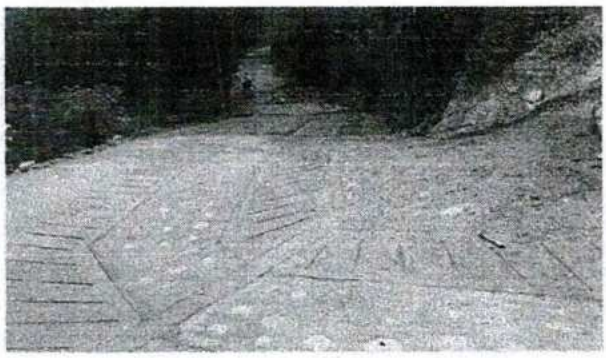

Finalización Fundicion de concretos km000+050 a km000+080. Tramo #7. Vereda La Cumbre.



Finalización km000+000 a Km000+030. Tramo #5. Vereda Alto Granadillo.



Finalización Fundicion de concretos km000+050 a Km000+070. Tramo #5. Vereda Alto Granadillo.

INFORMES SEMANALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INFORME SEMANAL

mipg

FECHA: 12 (Día) | 5 (Mes) | 2024 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETE: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA

TRAMO Y/O SECTOR(ES): Vereda Peña Negra Tramo 1, Vereda Peña Negra Tramo 2, Vereda La Mesa (El Chaparro) Tramo 3, Vereda La Laja Tramo 4, Vereda Alto Granadillo Tramo 5, Vereda La Reforma Tramo 6, Vereda La Cuchilla Tramo 7.

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO: HUILA

SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 6/05/2024 al 11/05/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL ALBERTO URITAN SALAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DE INICIO: 8/05/2023

KM A MEJORAR: 0,58 | KM A REHABILITAR: N/A | KM A CONSTRUIR: 0,58 | No. PUENTES: N/A | OTROS: N/A

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: GRUPO MSG S.A.S.

INTEGRANTES: R/L. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

CONTRATO No. 143 DE 2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS

VALOR INICIAL: $ 715.214.130,00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 715.214.130,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA BOTA LTDA

INTEGRANTES: R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No. 149 DE 2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS

VALOR INICIAL: $ 92.316.948
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 92.316.948

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ATRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA				
RECURSOS POR VIGENCIA	2023			$ 747.647.880,00
EJECUTADO	NO			
(Indicar valores en pesos)	NO		$ -	$ -

OBRA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (A):	$ 715.214.130,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 472.846.053,00	66,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 641.466.115,23	89,69% 33,51%
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	89,69%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 641.466.115,23	

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [X] NO [ ]

MES FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $313.593.879
FECHA FACTURA: 22/12/2023

PAGOS ACUMULADOS: $ 621.593.243

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 49.306.442,16

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [X] NO [ ]

MES FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $17.877.181,40
FECHA FACTURA: 29/12/2023

PAGOS ACUMULADOS REPORTE 68ª NACION: $29.124.699,00

III. AVANCE FISICO

	TRAMO Y/O SECTOR(S):	LONGITUD (KM)	PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN Y REPLANTEO (M+)	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANADO) (EXI) M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SEC O M3	SUBBASE GRANULAR M3	ACERO DE REFUERZO 4.000PSI/C M*pie.DMP KG	CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 K OFICMZO(3.000 PSI) M3	CONCRETO CICLOPEO DE 1160KG/CSP(3.000PSI) M3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO CLASE F (F'C=140 KGF/CM2), PARA OBRAS DE ARTE.	CONCRETO CLASE F PARA CONSTRUCCION DE MUROS ATALAYA AR.	TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=130, ESP. M/3 2.5 INV.	ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLA,BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	GRANULAR FILTRANTE ESP. 475.13 mm.	TERRAPLEN CON MATERIAL SELECCIONADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Vereda Peña Negra Tramo 1	0,04	0,04	12,33	0,51	34,36	3634,70	24,05	9,14							6,64%
2	Vereda Peña Negra Tramo 2	0,04	0,04	12,33	1,75	34,36	3453,65	23,47	4,39							6,64%
3	Vereda La Mesa (El Chaparro) Tramo 3.	0,16	0,16	130,83	7,43	112,80	8456,10	102,38	40,34	0,92	7,06	6,00	88,00		11,52	28,07%
4	Vereda La Laja, Tramo 4.	0,08	0,08	124,47	3,85	58,40	3221,50	51,18	20,14							14,09%
5	Vereda Alto Granadillo Tramo 5.	0,08	0,08	42,21	3,85	58,40	3688,20	80,42	16,99							11,13%
6	Vereda La Reforma Tramo 6.	0,10	0,10	232,26	4,40	70,50	4014,80	63,84	25,22							18,25%
7	Vereda La Cuchilla Tramo 7.	0,08	0,08	42,21	3,63	58,40	2688,20	43,83	14,78	0,45	0,04	5,00	40,46	14,75	8,50	13,37%
	TOTAL PROYECTO	0,58	0,58	616,64	25,61	487,45	33930,30	353,37	130,45	1,37	11,10	11,00	128,20	14,75	20,02	86,96%

TRAMO Y/O SECTOR(S):	VEREDA PEÑA NEGRA TRAMO 1	VEREDA PEÑA NEGRA TRAMO 2	VEREDA LA MESA (EL CHAPARRO), TRAMO 3	VEREDA LA LAJA TRAMO 4	VEREDA ALTO GRANADILLO TRAMO 5	VEREDA LA REFORMA TRAMO 6	VEREDA LA CUCHILLA TRAMO 7
VOLQUETA					2		2
MEZCLADORA					1		1
RETRO EXCAVADORAS							1
MOTONIVELADORAS							
RETROCARGADORES							1
VIBROCOMPACTADORES							1
COMISION TOPOGRAFICA					1		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: MASSEQ, MUNICIPIO DE TERALIA

UBICACIÓN: MASSEQ, MUNICIPIO DE TERALIA

PERMISO MINERO: SI [X] NO [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [X] NO [ ]

PERMISO MINERO: SI [X] NO [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [X] NO [ ]

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESION DE AGUAS	SI		NO		N/A	X
OCUPACION DE CAUCE	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Los materiales son suministrados por empresas con todos los permisos y licencias.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INFORME SEMANAL

FECHA: 12 (Día) | 5 (Mes) | 2024 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETE: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA

TRAMO Y/O SECTOR(S): Vereda Peña Negra Tramo 1, Vereda Peña Negra Tramo 2, Vereda La Mesa (El Chaparral) Tramo 3, Vereda La Laja Tramo 4, Vereda Alto Granadillo Tramo 5, Vereda La Reforma Tramo 6, Vereda La Cumbre Tramo 7.

UNIDAD EJECUTORIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO: HUILA

SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 05/30/2024 al 11/06/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL ALBERTO DUSAN SALAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DE INICIO: 04/06/2023

KM A MEJORAR: 0,58 | KM A REHABILITAR: N/A | KM A CONSTRUIR: 0,58 | No. PUENTES: N/A | OTROS: N/A

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: GRUPO MSG S.A.S.

INTEGRANTES: RL. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

CONTRATO No: 148 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 718.214.130,00
PLAZO INICIAL: 3 MESES | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS | VALOR ACUMULADO: $ 718.214.130,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA ROTA LTDA

INTEGRANTES: R.L. JAVIER BARRERO MOSQUS

CONTRATO No: 149 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 53.336,546
PLAZO INICIAL: 3 MESES | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS | VALOR ACUMULADO: $ 53.336,546

P.M.A. (PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL)

ESTADO: El actual Plan de Manejo Ambiental se esta llevando de acuerdo a los alcances y progresos proyectados.

OBSERVACIONES:

V. GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/P
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/P
AVALUOS APROBADOS:	N/P
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/P

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	27
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12
OTROS:	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A
Horario de Atención al Usuario:	HORAS HABILES EN EL RESTAURANTE "COMIDAS Y HELADERIA WILL" CENTRO PAICOL

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRA:
Vereda Peña Negra, Tramo 1: 100% ejecutado. Pendiente entrega tramo a la interventoría.
Vereda Peña Negra, Tramo 2: 100% ejecutado. Pendiente entrega tramo a la interventoría.
Vereda La Mesa (El Chaparral), Tramo 3: 100% ejecutado. Pendiente entrega tramo a la interventoría.
Vereda La Laja, Tramo 4: 100% ejecutado. Pendiente entrega tramo a la interventoría.
Vereda Alto Granadillo, Tramo 5: Continua fundicion de concretos 3000psi y ciclopeas. Arme e instalacion de aceros. Km000+050 a Km000+030.
Vereda La Reforma, Tramo 6: 100% ejecutado. Pendiente entrega tramo a la interventoría.
Vereda La Cumbre, Tramo 7: Continua fundicion de concretos 3000psi y ciclopeas. Arme e instalacion de aceros. Km000+050 a Km000+093.

INTERVENTORIA:
Vereda Peña Negra, Tramo 1: Pendiente de recibir tramo ejecutado del contratista.
Vereda Peña Negra, Tramo 2: Pendiente de recibir tramo ejecutado del contratista.
Vereda La Mesa (El Chaparral), Tramo 3: Pendiente de recibir tramo ejecutado del contratista.
Vereda La Laja, Tramo 4: Pendiente de recibir tramo ejecutado del contratista.
Vereda Alto Granadillo, Tramo 5: Verificacion disposicion diseño de malla, verificacion relacion A/C y verificacion instalacion aceros .
Vereda La Reforma, Tramo 6: Pendiente de recibir tramo ejecutado del contratista.
Vereda La Cumbre, Tramo 7: Verificacion, notificacion diseño de malla, verificacion relacion A/C y verificacion instalacion aceros .

RELACION DE OFICIOS :

VIII. ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA SIGUIENTE SEMANA

OBRA
Vereda Peña Negra Tramo 1: Entregar tramo 40m de placa huella, a la interventoria.
Vereda Peña Negra Tramo 2: Entregar tramo 40m de placa huella, a la interventoria.
Vereda La Mesa (El Chaparral), Tramo 3: Entregar tramo 150m de placa huella, a la interventoria.
Vereda La Laja, Tramo 4: Entrega tramo de 60m de placa huella, a la interventoria.
Vereda Alto Granadillo, Tramo 5: Finalizacion fundicion de concretos e instalacion de aceros.
Vereda La Reforma, Tramo 6: Entrega tramo de 100m de placa huella, a la interventoria.
Vereda La Cumbre, Tramo 7: Finalizacion fundicion de concretos e instalacion de aceros.

INTERVENTORIA
A INTERVENTORIA CONTINUA VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN Y CRONOGRAMA DE OBRAS VIGENTE, PARA EN CASO DE HABER UN ATRASO, EMITIR EL CORRESPONDIENTE REQUERIMIENTO Y NOTIFICAR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

EN LA PRESENTE SEMANA HAY AVANCE DE 23,56%. DE ACUERDO A LA NUEVA REPROGRAMACION APROBADA POR INTERVENTORIA.

TRAMOS EN LOS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL -HUILA.

AVANCE PROGRAMADO	1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Vereda Peña Negra Tramo 1	0,04%	0,00%	0,07%	0,08%	0,10%	0,11%	0,25%	0,00%	1,05%	2,30%	2,64%	3,49%	4,14%	4,78%	5,43%	6,08%	6,58%	6,58%				
Vereda Peña Negra Tramo 2	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,10%	0,10%	0,76%				
Vereda La Mesa (El Chaparral), Tramo 3.	0,10%	1,76%	3,42%	5,08%	6,73%	8,38%	10,05%	11,71%	13,37%	15,08%	17,03%	18,87%	20,62%	22,68%	24,81%	26,75%	28,59%	20,69%				
Vereda La Laja, Tramo 4.	0,05%	0,06%	1,87%	3,78%	3,69%	4,50%	5,51%	6,42%	7,33%	8,23%	9,14%	10,05%	10,96%	11,87%	12,78%	13,69%	13,89%	13,85%				
Vereda Alto Granadillo, Tramo 5.	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%				
Vereda La Reforma, Tramo 6.	3,07%	1,08%	2,09%	3,11%	4,13%	5,13%	6,15%	7,16%	8,17%	9,18%	10,20%	11,21%	12,22%	13,24%	14,25%	15,26%	16,25%	16,25%				
Vereda La Cumbre, Tramo 7.	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%				
	0,36%	3,06%	7,59%	11,16%	14,72%	18,26%	22,11%	26,24%	29,87%	34,60%	39,36%	43,93%	48,41%	53,03%	57,45%	61,97%	65,47%	66,13%				

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INFORME SEMANAL

mipg

FECHA: (Día) 12 | (Mes) 5 | (Año) 2024

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETE: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA

TRAMO Y/O SECTOR(S): Vereda Peña Negra Tramo 1, Vereda Peña Negra Tramo 2, Vereda La Mesa (El Chaparro) Tramo 3, Vereda La Laja Tramo 4, Vereda Alto Granadillo Tramo 5, Vereda La Reforma Tramo 6, Vereda La Cumbre Tramo 7.

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO: HUILA

SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 6/05/2024 al 11/05/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

KM A MEJORAR: 0,50 | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,52 | No. PUENTES: N/A | OTROS: N/A | FECHA DE INICIO: 8/09/2023

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: GRUPO MSG S.A.S.

REPRESENTANTE: RL. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

CONTRATO No.: 143 DE 2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS

VALOR INICIAL: $ 711.214.193,00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 711.214.193,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA ROTA LTDA

INTEGRANTES: R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS
CONTRATO No.: 149 DE 2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS


VALOR INICIAL: $ 82.336.346
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 82.336.346

AVANCE EJECUTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Vereda Peña Negra Tramo 1	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	1,06%	1,50%	2,00%	6,22%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%				
Vereda Peña Negra Tramo 2	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,36%	1,53%	6,54%	6,54%	6,54%			
Vereda La Mesa (El Chaparro) Tramo 3.	0,16%	3,36%	6,46%	9,87%	11,06%	13,07%	12,56%	12,69%	14,22%	14,83%	13,06%	15,68%	17,28%	20,28%	22,39%	23,43%	27,95%	28,07%				
Vereda La Laja Tramo 4.	0,15%	2,64%	4,05%	9,12%	9,40%	9,86%	10,81%	11,69%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%				
Vereda Alto Granadillo Tramo 5.	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,56%	0,56%	0,56%	0,91%	8,61%	11,13%			
Vereda La Reforma Tramo 6.	0,16%	2,51%	6,67%	11,75%	12,46%	12,86%	13,00%	13,78%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%			
Vereda La Cumbre Tramo 7.	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,73%	2,36%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	3,33%	3,33%	3,33%	5,27%	6,18%	13,37%			
	1,01%	0,96%	17,03%	21,35%	24,42%	27,35%	40,15%	49,13%	54,81%	55,43%	52,65%	59,43%	59,44%	62,69%	65,07%	70,03%	80,42%	95,00%				


X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo 6 Vereda Alto Granadillo. Terminado bordillos. Abscisa Km000+080 a Km000+060.



Tramo 6 Vereda Alto Granadillo. Continuacion fundicion ciclopeo. Abscisa Km000+040 a Km000+060.

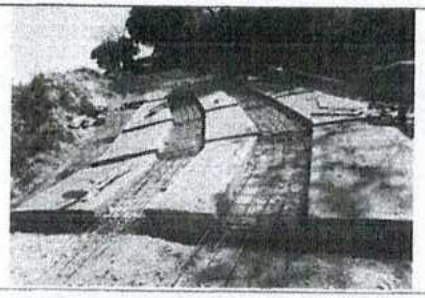

Trama7 Vereda La Cumbre. Fundicion de concretos huellas principal. Abscisa Km000+080 a Km000+050.



Trama7 Vereda La Cumbre. Fundicion de bordillos. Abscisa Km000+080 a Km000+060.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A INTERVENTORIA REALIZA ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION CONSTANTE A EN CADA UNO DE LOS TRAMOS DEL CONTRATO DEL MUNICIPIO DE PAICOL QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.
CONTINUA EQUIPO DE LA INTERVENTORIA PERNOTANDO EN OBRA.

De acuerdo a solicitud de reinicio del contratista de obra, la interventoria aprueba reiniciar el 08 de mayo 2024.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS
No. MAT: 15303-42555 CND

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INFORME SEMANAL

mipg

FECHA: 16 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, MUNICIPIO DEL HUILA

TRAMO Y/O SECTOR(ES): Vereda Peña Negra Tramo 1, Vereda Peña Negra Tramo 2, Vereda La Mesa (El Chaparro) Tramo 3, Vereda La Laja Tramo 4, Vereda Alto Granadillo Tramo 5, Vereda La Reforma Tramo 6, Vereda La Cuchilla Tramo 7.

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO: HUILA

SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 13/05/2024 al 19/05/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DE INICIO: 8/05/2023

KM A MEJORAR: 0,50 | KM A REHABILITAR: N/A | KM A CONSTRUIR: 0,50 | No. PUENTES: N/A | OTROS: N/A

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: GRUPO MSG S.A.S.

INTEGRANTES: RL. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

CONTRATO No.: 142 DE 2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS

VALOR INICIAL: $ 715.214.130,00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 715.214.130,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA BOTA LTDA

INTEGRANTES: R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No.: 149 DE 2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS

VALOR INICIAL: $ 32.330.340
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 32.330.340

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA				$ 747.647.690,00
RECURSOS POR VIGENCIA	2023			
EJECUTADO	NO		$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (A):	$ 715.214.130,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 570.133.035,20	79,72%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 649.967.324,20	90,83%	16,73%
AVANCE DE OBRA EN % (B/A)	90,83%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 649.967.324,20		

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI X | NO

MES FACTURADO: abr-23
VALOR FACTURA: $223.663.279
FECHA FACTURA: 23/10/2023

PAGOS ACUMULADOS: $ 621.889.143

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 67.933.870,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI X | NO

MES FACTURADO: abr-23
VALOR FACTURA: $17.877.193,40
FECHA FACTURA: 23/10/2023

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $29.124.620,00

III. AVANCE FÍSICO

	TRAMO Y/O SECTOR(ES):	LONGITUD (KM)	PREPARADOS Y LOCALIZACIÓN N-V REPLANTEO (km)	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACI ON) M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL M3	SUBBASE GRANULAR M3	ACERO DE REFUERZO fy 60000PSI Y/O fy=420MPA KG	CONCRETO CICLÓPEO 3.000 PSI M3	CONCRETO CICLÓPEO 210KG/CM2 (F'C=210K G/CM2)(3.000 PSI) M3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO CLASE(F'C=140 KG/CM2), PARA OBRAS DE ARTE,	CONCRETO CLASE D-PARACENTRO DE ALCANTARILLAS.	TUBERIA EN CONCRETO F=0,4 L=1,50, ESP. 0,05-13 TMV.	ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLAS,BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPOR TE	GRANULAR FILTRANTE, ESP. 0,25-13 mm.	TERRAPLEN CON MATERIAL SELECCION ADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Vereda Peña Negra Tramo 1	0,04	0,04	22,68	2,01	39,20	1934,70	28,05	9,94							6,64%
2	Vereda Peña Negra Tramo 2	0,04	0,04	22,36	1,76	34,30	1651,60	27,67	9,80							6,54%
3	Vereda La Mesa (El Chaparro) Tramo 3	0,19	0,19	180,83	7,42	312,83	6458,20	102,38	45,24	0,82	7,06	5,00	466,00		11,50	28,57%
4	Vereda La Laja Tramo 4,	0,05	0,05	29,47	2,63	56,40	2121,50	51,68	20,24							14,09%
5	Vereda Alto Granadillo Tramo 5,	0,09	0,09	42,27	3,83	52,60	3112,90	45,52	16,09							11,72%
6	Vereda La Reforma Tramo 6,	0,10	0,10	102,20	4,40	75,50	4014,80	63,84	25,23							16,55%
7	Vereda La Cuchilla Tramo 7,	0,05	0,09	42,21	3,85	54,65	3066,30	45,41	16,69	0,82	8,04	5,00	466,00	14,79	9,50	13,50%
	TOTAL PROYECTO	0,58	0,59	466,49	26,61	687,45	32243,80	368,05	537,80	1,37	13,10	11,00	949,20	18,79	20,00	97,51%

TRAMO Y/O SECTOR(ES):	VEREDA PEÑA NEGRA TRAMO 1	VEREDA PEÑA NEGRA TRAMO 2	VEREDA LA MESA (EL CHAPARRO) TRAMO 3	VEREDA LA LAJA, TRAMO 4	VEREDA ALTO GRANADILLO TRAMO 5	VEREDA LA REFORMA TRAMO 6	VEREDA LA CUCHILLA TRAMO 7
VOLQUETA					2		2
MEZCLADORA					1		1
RETRO EXCAVADORAS							1
MOTONIVELADORAS							
RETROCARGADORES							1
VIBROCOMPACTADORES							1
COMISION TOPOGRAFICA					1		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: MASSEQ, MUNICIPIO DE TERUEL
PERMISO MINERO: SI X | NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X | NO

UBICACIÓN: MASSEQ, MUNICIPIO DE TERUEL
PERMISO MINERO: SI X | NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X | NO

OBSERVACIONES: Los materiales son suministrados por empresas con todos los permisos y licencias.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESION DE AGUAS	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCE	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INFORME SEMANAL

mipg

FECHA: 10 (Día) | 5 (Mes) | 2024 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETE: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA

TRAMO Y/O SECTOR(ES): Vereda Peña Negra Tramo 1, Vereda Peña Negra Tramo 2, Vereda La Mesa (El Chaparral) Tramo 3, Vereda La Laja Tramo 4, Vereda Alto Granadillo Tramo 5, Vereda La Reforma Tramo 6, Vereda La Cumbre Tramo 7.

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO: HUILA

SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 13/05/2024 al 19/05/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL ALBERTO DURAN BALAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DE INICIO: 5/9/2023

KM A MEJORAR: 0,52 | KM A REHABILITAR: N/A | KM A CONSTRUIR: 0,52 | No. PUENTES: N/A | OTROS: N/A

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: GRUPO MSO S.A.S.

INTEGRANTES: RL. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

CONTRATO No.: 113 DE 2023
PLAZO INICIAL: 5 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS

VALOR INICIAL: $ 715.214.190,00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 715.214.190,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES: R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No.: 149 DE 2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS

VALOR INICIAL: $ 82.336.349
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 82.336.349

P.M.A. (PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL)

ESTADO: El actual Plan de Manejo Ambiental se esta llevando de acuerdo a los alineamientos y procesos propuestos.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/P	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/P	
AVALUOS APROBADOS:	N/P	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/P	

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	27	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A
OTROS:		Horario de Atención al Usuario:	HORAS HABILES EN EL RESTAURANTE "COMIDAS Y HELADERIA WILL" CENTRO PAICO

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRA:
Vereda Peña Negra, Tramo 1: 100% ejecutado. Pendiente entrega tramo a la interventoría.
Vereda Peña Negra, Tramo 2: 100% ejecutado. Pendiente entrega tramo a la interventoría.
Vereda Mesa (El Chaparral, Tramo 3: 100% ejecutado. Pendiente entrega tramo a la interventoría.
Vereda La Laja, Tramo 4: 100% ejecutado. Pendiente entrega tramo a la interventoría.
Vereda Alto Granadillo, Tramo 5: Continua fundicion de concretos 3000psi y ciclopeos. Arme e instalacion de aceros. Km000+000 a Km000+020.
Vereda La Reforma, Tramo 6: 100% ejecutado. Pendiente entrega tramo a la interventoría.
Vereda La Cumbre, Tramo 7: Continua fundicion de concretos 3000psi y ciclopeos. Arme e instalacion de aceros. Km000+050 a Km000+070.

INTERVENTORIA:
Vereda Peña Negra, Tramo 1: Pendiente de recibir tramo ejecutado del contratista.
Vereda Peña Negra, Tramo 2: Pendiente de recibir tramo ejecutado del contratista.
Vereda La Mesa (El Chaparral), Tramo 3: Pendiente de recibir tramo ejecutado del contratista.
Vereda La Laja, Tramo 4: Pendiente de recibir tramo ejecutado del contratista.
Vereda Alto Granadillo, Tramo 5: Verificacion dosificacion diseño de mezcla, verificacion relacion A/C y verificacion instalacion aceros.
Vereda La Reforma, Tramo 6: Pendiente de recibir tramo ejecutado del contratista.
Vereda La Cumbre, Tramo 7: Verificacion dosificacion diseño de mezcla, verificacion relacion A/C y verificacion instalacion aceros.

EJECUCION DE OBRAS:

VIII. ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA SIGUIENTE SEMANA

OBRA:
Vereda Peña Negra Tramo 1: Entregar tramo 40m de placa huella, a la interventoria.
Vereda Peña Negra Tramo 2: Entregar tramo 40m de placa huella, a la interventoria.
Vereda La Mesa (El Chaparral, Tramo 3: Entregar tramo 150m de placa huella, a la interventoria.
Vereda La Laja, Tramo 4: Entrega tramo de 80m de placa huella, a la interventoria.
Vereda Alto Granadillo, Tramo 5: Finalizacion fundicion de concretos e instalacion de aceros.
Vereda La Reforma, Tramo 6: Entrega tramo de 100m en placa huella, a la interventoria.
Vereda La Cumbre, Tramo 7: Finalizacion fundicion de concretos e instalacion de aceros.

INTERVENTORIA
LA INTERVENTORIA CONTINUA VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN Y CRONOGRAMA DE OBRAS VIGENTE, PARA EN CASO DE HABER UN ATRASO, EMITIR EL CORRESPONDIENTE REQUERIMIENTO Y NOTIFICAR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

EN LA PRESENTE SEMANA HAY AVANCE DE 16.70%. DE ACUERDO A LA NUEVA REPROGRAMACION APROBADA POR INTERVENTORIA.

TRAMOS EN LOS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA.

AVANCE PROGRAMADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Vereda Peña Negra, Tramo 1	0,04%	0,05%	0,07%	0,09%	0,10%	0,11%	0,25%	0,00%	1,59%	2,30%	2,94%	3,40%	4,14%	4,78%	5,43%	6,08%	6,58%	6,58%	6,58%			
Vereda Peña Negra Tramo 2	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,10%	0,10%	0,76%	2,40%			
Vereda La Mesa (El Chaparral, Tramo 3.	0,10%	1,76%	3,42%	5,08%	6,73%	8,39%	10,05%	11,71%	13,37%	15,04%	17,53%	18,97%	20,92%	22,84%	24,81%	26,79%	28,59%	28,59%	36,68%			
Vereda La Laja, Tramo 4.	0,05%	0,06%	1,67%	2,78%	3,89%	4,00%	5,51%	6,42%	7,33%	8,23%	9,14%	10,05%	10,06%	11,67%	12,78%	13,89%	13,89%	13,89%	13,89%			
Vereda Alto Granadillo, Tramo 5.	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,06%	3,22%			
Vereda La Reforma, Tramo 6.	0,07%	1,08%	2,09%	3,11%	4,12%	5,13%	6,15%	7,16%	8,17%	9,18%	10,20%	11,21%	12,22%	13,24%	14,25%	15,26%	16,25%	16,25%	16,25%			
Vereda La Cumbre, Tramo 7.	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	3,22%			
	0,39%	3,06%	7,39%	11,18%	14,74%	18,38%	22,11%	26,34%	30,57%	34,96%	39,36%	43,96%	48,41%	52,93%	57,48%	61,97%	66,47%	66,13%	74,12%			

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INFORME SEMANAL

mipg

FECHA: 10 (Día) | 5 (Mes) | 2024 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETE: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA

TRAMO Y/O SECTOR(S): Vereda Peña Negra Tramo 1, Vereda Peña Negra Tramo 2, Vereda La Mesa (El Chaparro) Tramo 3, Vereda La Loja Tramo 4, Vereda Alto Granadillo Tramo 5, Vereda La Palorma Tramo 6, Vereda La Cumbre Tramo 7.

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO: HUILA

SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 13/05/2024 al 18/05/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL ALBERTO DURAN BALAO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DE INICIO: 01/09/2023

KM A MEJORAR: 0,50 | KM A REHABILITAR: N/A | KM A CONSTRUIR: 0,50 | No. PUENTES: N/A | OTROS: N/A

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: GRUPO MSQ S.A.S.

INTEGRANTES: RL. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

CONTRATO No.: 143 DE 2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS

VALOR INICIAL: $ 716.214.132,00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 716.214.132,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA BOYA LTDA


INTEGRANTES: R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No.: 145 DE 2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS


VALOR INICIAL: $ 53.336.544
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 53.336.544

AVANCE EJECUTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Vereda Peña Negra Tramo 1	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	1,06%	1,06%	2,80%	0,22%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%			
Vereda Peña Negra Tramo 2	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,39%	1,53%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%			
Vereda La Mesa(El Chaparro) Tramo 3.	0,15%	3,35%	5,48%	8,57%	11,06%	12,57%	12,65%	13,84%	14,22%	14,93%	15,36%	15,98%	17,29%	20,20%	22,38%	22,43%	27,95%	28,07%	28,07%			
Vereda La Loja. Tramo 4.	0,15%	2,84%	4,05%	9,12%	9,62%	9,99%	10,81%	11,66%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%			
Vereda Alto Granadillo Tramo 5.	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,95%	0,95%	0,95%	8,81%	11,18%	11,72%			
Vereda La Palorma. Tramo 6.	0,15%	2,91%	9,07%	11,75%	12,46%	12,66%	13,03%	13,78%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%			
Vereda La Cumbre. Tramo 7.	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,75%	2,39%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	3,33%	3,33%	3,33%	8,22%	9,16%	13,37%	13,93%			
	1,01%	9,66%	17,03%	31,26%	34,42%	37,26%	40,15%	43,19%	54,81%	55,48%	55,95%	56,46%	58,64%	62,69%	65,07%	79,02%	89,42%	96,20%	97,11%			


X. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Tramo 5 Vereda Alto Granadillo. Terminado bordillos.
Abscisa Km000+080 a Km000+070.



Tramo 5 Vereda Alto Granadillo. Continuacion funticion huelle principal.
Abscisa Km000+060 a Km000+069.



Tramo7 Vereda La Cumbre. Fundicion de concretos huellas principal.
Abscisa Km000+080 a Km000+060.



Tramo7 Vereda La Cumbre. Fundicion de bordillos.
Abscisa Km000+060 a Km000+050.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A INTERVENTORIA REALIZA ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION CONSTANTE A EN CADA UNO DE LOS TRAMOS DEL CONTRATO DEL MUNICIPIO DE PAICOL QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.
CONTINUA EQUIPO DE LA INTERVENTORIA PERNOTANDO EN OBRA.

continuan actividades en obra. Contratista finalizando actividades en los tramos de Alto Granadillo y la Cumbre.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS
No. MAT: 2520242095 CND

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INFORME SEMANAL

mipg

FECHA: 8 (Día) / 8 (Mes) / 2024 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETE: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA

TRAMO Y/O SECTOR(ES): Vereda Peña Negra Tramo 1, Vereda Peña Negra Tramo 2, Vereda La Mesa (El Chaparro) Tramo 3, Vereda La Loja Tramo 4, Vereda Alto Granadillo Tramo 5, Vereda La Reforma Tramo 6, Vereda La Cumbre Tramo 7.

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO: HUILA

SEMANA No.: 32 (Numeración consecutiva) del 3/06/2024 al 8/06/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DE INICIO: 6/06/2023

KM A EJECUTAR: 0,58

KM A REHABILITAR: NA

KM A CONSTRUIR: 0,58

No. PUENTES: NA

OTROS: NA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: GRUPO WSG S.A.S.

INTEGRANTES: R.L. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

CONTRATO No.: 148 DE 2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS

VALOR INICIAL: $ $715.214.122,00

ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ $715.214.122,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA BOTA LTDA

INTEGRANTES: R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No.: 149 DE 2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 27 DIAS


VALOR INICIAL: $ 52.335.348

ADICIONES: $ -


VALOR ACUMULADO: $ 52.335.348

AVANCE EJECUTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Vereda Peña Negra Tramo 1.	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	1,06%	1,06%	2,60%	6,22%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%
Vereda Peña Negra Tramo 2	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,36%	1,53%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%
Vereda La Mesa (El Chaparro) Tramo 3.	0,15%	3,39%	8,46%	9,87%	11,06%	12,03%	12,09%	13,86%	14,22%	14,63%	15,06%	15,96%	17,38%	20,25%	22,38%	23,40%	27,95%	28,07%	28,07%	28,07%	28,07%	28,07%
Vereda La Loja Tramo 4.	0,15%	2,84%	4,55%	8,12%	9,40%	9,66%	10,81%	11,69%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%
Vereda Alto Granadillo Tramo 5.	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,95%	0,95%	0,95%	5,91%	8,01%	11,13%	11,72%	12,29%	12,95%	13,56%
Vereda La Reforma Tramo 6.	0,15%	2,91%	8,07%	11,75%	12,45%	12,66%	13,09%	15,78%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%
Vereda La Cumbre Tramo 7.	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,75%	2,36%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	3,33%	3,33%	3,33%	5,27%	9,16%	13,37%	13,90%	14,55%	14,93%	14,62%
	1,01%	9,68%	17,01%	31,25%	34,42%	37,95%	40,15%	49,15%	54,61%	55,48%	55,92%	56,48%	59,44%	62,03%	65,07%	78,02%	86,47%	95,00%	97,11%	98,32%	98,96%	100,00%

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo 5 Vereda Alto Granadillo. Acabado huellas y bordillos. Abscisa Km000+060 a Km000+040.



Tramo 6 Vereda Alto Granadillo. Acabado huellas y bordillos. Abscisa Km000+030 a Km000+010.



Tramo7 Vereda La Cumbre. Terminado final. Abscisa Km000+080 a Km000+040.



Tramo7 Vereda La Cumbre. Terminado final. Abscisa Km000+050 a Km000+000.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUTAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A INTERVENTORIA REALIZA ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION CONSTANTE A EN CADA UNO DE LOS TRAMOS DEL CONTRATO DEL MUNICIPIO DE PAICOL QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.
CONTINUA EQUIPO DE LA INTERVENTORIA PERNOTANDO EN OBRA.

Inician actividades en obra. Contratista entrega actividades en los tramos de Alto Granadillo y la Cumbre.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS
No. MAT: 25202-82005 CND

CORRESPONDENCIA

Neiva, 05 de junio de 20234 **Int.Paicol – 025**

Señores

GRUPO MSG S.A.S.
ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
Representante legal
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato de obra 142 del 2023, que tiene por objeto el **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Asunto: Observaciones planos récord o Asbuilt.

Cordial saludo respetados contratista de obra,

Por medio de la presente SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA en calidad de interventor del contrato de obra en asunto, se permite hacer las siguientes observaciones, a los planos récord o asbuilt:

1. Faltan la cuadricula de coordenadas, además referenciando el inicio y final en cada uno de los siete tramos intervenidos, coordenadas correspondientes.
2. Se requiere la topografía y secciones cada 10m de los siete tramos intervenidos.
3. Se deben referenciar y ubicar las alcantarillas que se hicieron en los dos tramos intervenidos. (La mesa El Chaparro y La Cumbre)

Por lo anterior la interventoría solicita subsanar a más tardar el 06 de junio 2024.

Atentamente;

JAVIER BARRERO MOSSOS.
REP. LEGAL SOTA LTDA.

Copia: Supervisión de obra.

GRUPO MSG

Bogotá, 28 de abril de 2024

Paicol-MSG-026/2024

Señores
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Atn. Javier Barrero Mossos
Representante Legal
Neiva

Referencia: Contrato de obra 142-2023

Asunto: ALCANCE REANUDACION DEL CONTRATO Y SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que ya se superaron las situaciones que motivaron la suspensión del contrato, solicitamos respetuosamente a través de su interventoría acudir a la Alcaldía Municipal de Paicol para que se adelante el acto administrativo que corresponda para reanudar el contrato de la referencia y de esta forma dar culminación al proyecto que nos ocupa en términos de tiempo, alcance y costo.

A la fecha se encuentra una ejecución correspondiente al 87% con actividades pendientes por ejecutar excavaciones, rellenos granulares y ciclópeos, amarre de acero, vaciado de concreto y tendido de tubería.

De igual manera y no menos importante solicitar una prórroga por UN (1) MES para dar culminación al alcance final del proyecto y para adelantar los procesos administrativos que conlleva la entrega y la liquidación de este.

Quedando atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Ana C Gonzalez R.

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO MSG SAS
901.110.550 - 1

Bogotá, 19 de junio de 2024

Paicol-MSG-029/2024

Señores
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Atn. Javier Barrero Mossos
Representante Legal
Neiva

Referencia: Contrato de obra 142-2023

Asunto: CORTE 4 Y CORTE 5

Cordial Saludo,

Mediante la presente nos permitimos allegar el corte #4 que corresponde al 95% y #5 que corresponde a la liquidación del contrato 142-2023

Cordialmente,

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO MSG SAS
901.110.550 - 1

GRUPO MSG

Bogotá, 20 de mayo de 2024

Paicol-MSG-030/2024

Señores
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Atn. Javier Barrero Mossos
Representante Legal
Neiva.

Referencia: Contrato de obra 142-2023

Asunto: INFORME FINAL AMBIENTAL

Cordial Saludo,

Mediante la presente me permito radicar el informe final del componente ambiental del contrato 142-2023.

Cordialmente,

Ana C González L.

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO MSG SAS
901.110.550 - 1

BITACORA

* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continua figurado y armes de aceros. Km000+060 a Km000+050. Interventoria verifica calibres y espaciamientos.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, Continua figurado y armado de aceros. Km000+055 a Km000+045. Interventoria verifica calibres y espaciamientos.
• Interventoria aprueba Solicitud suspension de obra por ola invernal Solicitada 20 de diciembre 2023 por el contratista de obra.
• Clima: Lluvias fuertes.

Diego J.
Director de obra

Juan Carlos Vizcaíno
Residente Interventoria

08 MAYO 2024 - MIERCOLES.

Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros contratista obra, (6) Ayudantes obra, (1) Ing. residente interventoria.

Equipo en obra: (2) Mezcladora Concreto, Herramienta menor, (1) Retrocargadora llantas, (2) Volquetas.

Horario trabajo: 07:00 AM a 05:00 PM.

• Charlas HSEQ, charlas preoperacionales y calistenia.
• Se aprueba y se firma acta de Reinicio N°1 y otro SI N2 prorroga por 30 dias calendario.
• Continuan actividades de obra en los siguientes tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, reinician fundiciones concretos 3000PSI en huella principal Km000+060 a Km000+050 Interventoria verifica dosificación Mezcla y relacion A/C.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, reinicia fundicion de concretos 3000 PSI en huellas principal interventoria verifica dosificacion y contenido de agua. Km000+060 a Km000+50
• Clima: Lluvias aisladas

Diego J.
Residente de obra

Juan Carlos Vizcaíno
Residente Interventoria

09 Mayo 2024 - JUEVES.

Personal: (9) residente obra, (1) Inspector obra, (9) SISO obra, (2) Maestros contratista obra, (8) Ayudantes obras, (1) Ing residente interventoria

Equipo Obra: (2) Mezcladora Concreto, Herramienta Menor (1) Retroexcavadora llanta, (2) volquetas,

Horario de trabajo: 07:00 AM a 05:00 PM.

- Charlas HSEQ, Charlas precoparacionales y Calistenia.
- Continuan actividades en obra, Siguientes tramos:

* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continua instalacion, figurado, Arme y amarre acero transversal y longitudinal Abscisa Km000+050 a km000+040. Interventoria verifica calibres, espaciamientos y Cantidades.
* TRAMO 7, LA COMBRE, Continua figurado y amarre aceros. Abscisa Km000+045 a Km000+035. Interventoria verifica calibres, espaciamientos y Cantidades.

- Clima: Lluvias aislados. Moderados.

Diego [illegible]
Residente de obra

Juan Carlos Noguera
Residente Interventoria

10 Mayo 2024 - VIERNES.

Personal en obra: (9) Ing residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros contratista Obra, (8) Ayudantes obras, (1) Ing residente interventoria.

Equipo en obra: (2) Mezcladora Concreto, Herramienta menor, (1) retroexcavadora llanta, (2) volquetas.

Horario de trabajo: 07:00 AM a 05:00 PM.

- Charlas HSEQ, Charlas precoparacionales, y Calistenia.
- Continuan actividades en obra, Siguientes tramos:

* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, reanudan fundicion y vaciado concretos 3000 psi. Abscisa km000+050 a Km000+045. Interventoria verifica dosificacion diseño de Mezcla y relacion A/c.
* TRAMO 7, LA COMBRE, Continua instalacion aceros, amarres y figurado Abscisa km000+035 a km000+030

Interventoria verifica calibre e instalacion según diseños.
Clima: Lluvias aislados.

Diego A.
Residente de obra

Juan Carlos Argueta
Residente Interventoria.

11 MAYO 2024 - SABADO.
Personal en obra: (1) Ing Residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) maestros contratista obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing. residente interventoria.
Equipo en obra: (2) Mezcladora Concreto, Herramienta Menor, (1) Retroexcavadora llantas, (2) volquetas.
Horario de trabajo: 07:00 AM - 12:00 M y.
• Charlas HSEQ, Charlas preoperacionales y Calistenia.
• Continuan actividades en obra, siguientes tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continua instalación de aceros km000+040 a km000+035. Interventoria verifica diseños.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, Continua arme, figurado e instalacion aceros km000+030 a km000+025. Interventoria chequea diseños.
• Clima: Lluvias aislados. Soleado.

Ana Gonzalez R
Residente de obra

Juan Carlos Argueta
Residente Interventoria.

12 MAYO 2024 - DOMINGO.
Personal descansando. No hay avance actividades en obra.

Ana Gonzalez R
Residente de obra

Juan Carlos Argueta
Residente Interventoria.

13 MAYO 2024 - LUNES.
DIA FESTIVO, personal en descanso. No hay avance de actividades en obra.

Ana Gonzalez R.
Residente de obra

Juan Carlos Argueta
Residente Interventoria.

14 MAYO 2024 - MARTES.

PERSONAL EN OBRA: (1) Ing. residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros Contratista Obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing. Residente Interventoria.

Equipo en obra: (2) Mezcladora concreto, Herramienta menor, (1) retroexcavadora llanta, (2) volquetas.

Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM

- Charlas HSEQ, Charlas preoperacionales y calistenia.
- Continuan actividades de obra, Siguientes tramos:

* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, reanudan fundicion y vaciado de concretos ciclopeos eje Km000+080 a Km000+070, Interventoria verifica porcentaje de canto rodado.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, continuan fundicion y vaciado de concretos ciclopeos eje Km000+080 a Km000+025. Interventoria verifican proporcion canto rodado.

Clima: Lluvias aisladas.

Ana Gonzalez R
Residente de obra

Juan Carlos Pinzon
Residente Interventoria.

15 MAYO 2024 - MIERCOLES.

Personal en obra: (1) Ing. residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros contratista obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing. Residente Interventoria.

Equipo en obra: (2) Mezcladora Concreto, Herramienta Menor, (1) Retroexcavadora llantas, (2) volquetas,

Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM.

- Charlas HSEQ, Charlas preoperacionales y calistenia.
- Continuan actividades en obra, siguientes tramos:

* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continua fundición Concretos ciclopeos Km000+070 a Km000+060. Interventoria verifica proporcionalidad canto rodado y dimensiones.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, Siguen fundicion concreto ciclopeo Km000+075 a Km000+065. Interventoria verifica.

- Clima: Dia soleado.

Ana Gonzalez R
Res. Residente de obra

Juan Carlos Pinzon
Residente Interventoria

16 MAYO 2024 - JUEVES.
Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros Contratista obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing. residente Interventoría
Equipo en obra: (2) Mezcladora Concreto, Herramienta menor, (1) Retroexcavadora llantas, (2) volquetas
Horario trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM.
• Charlas HSEQ, Charlas preoperacionales y Calistenia.
• Continua actividades en obra, siguientes tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, continua fundicion ciclopeos abscisas KM000+060 a KM000+050., Interventoria verifica dimensiones.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, Continuan fundicion de Concretos Ciclopeos, KM000+065 a KM000+055. Interventoria Chequea Espesores.
• Clima: Nublado Sin Lluvias.

Andrés Gonzalez R
Residente de obra

Ivan Carlos Nyguenta
Residente Interventoria.

17 MAYO 2024 - VIERNES.
Personal en obra: (1) Ing. residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros Contratista obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing. residente Interv.
Equipo en obra: (2) Mezcladora Concreto, Herramienta menor, (1) Retroexcavadora llanta, (2) volquetas.
Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM
• Charlas HSEQ, Charlas preoperacionales y calistenia.
• Continuan actividades en obra, siguientes tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continuan fundición Concretos 3000 PSI huellas Principales, Abscisas KM000+050 a KM000+040, Interventoria verifica diseño mezcla y Controla agua de produccion.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, Continuan fundicion Concretos 3000PSI en huellas principales abscisas KM000+060 a KM000+050.
Interventoria verifica espesores, dimensiones y dosificaciones
• Clima: Lluvias Aislada

Ivan Carlos Nyguenta
Residente Interventoria

Andrés Gonzalez R
Residente de obra

18 MAYO 2024 - SABADO.
Personal en obra: (1) Ing. residente obra, (1) inspector obra, (1) SISO obra, (2) Contratista maestro obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing residente interventoria.
Equipo en Obra: (2) Mezcladora Concreto, Herramienta menor, (1) retroexcavadora llanta, (2) volquetas.
Horario de trabajo: 07:00 AM - 12:00 M
• Charlas HSEQ, Charlas preoperacionales y Calistenia.
• Continuan actividades en obra, Siguientes tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continuan fundición de concretos 3000PSI huellas principales km00+040 a km00+035, Interventoria Verifica dimensiones y alineamientos.
* TRAMO 7, LA COMBRE, Continua fundicion concreto 3000PSI km00+050 a km00+045 huellas principal. Interventoria verifica espesores y dimensiones.
• Clima: Lluvias aisladas.

Ing. C. González R.
Residente de obra

Juan Carlos Delgadillo
Residente Interventoria

19 MAYO 2024 - DOMINGO.
Personal en descanso, no hay avance de actividades en obra.

Ing. C. González R.
Residente de obra

Juan Carlos Delgadillo
Residente Interventoria

20 MAYO 2024 - LUNES.
Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) inspector obra, (1) SISO obra, (2) maestro obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing Residente interventoria.
Equipo en obra: (2) Mezcladoras de Concretos, herramienta menor, (1) retroexcavadora llantas, (2) volqueta.
• Charla HSEQ y calistenia.
• Continuan actividades de obra, siguientes tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continua extendida, cons-

instalación y amarrado acero 60.000PSI. Abscisa KM000+010 a KM000+030. Interventoria chequea y verifica calibres, espaciamiento y cantidades.
* TRAMO 7, LA CUMBRE Continua Figurado, arme y amarre aceros 60.000 PSI. Huella pricipal, cunetas y bordillos, abscisa KM000+050 a KM000+045. Interventoria verifica calibres, espaciamientos y cantidades.
• Clima: Lluvias aisladas.

Ana C Gonzalez R
Residente de obra

Jhon Carlos Zapata
Residente Interventoria.

21 MAYO 2024 - MARTES.
Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestro obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing residente interventoria.
Equipo en obra: (2) Mezcladoras concretos, Herramienta menor (1) retro excavadora llantas, (2) volquetas.
• Charlas HSEQ, charlas preoperacionales y Calistenia.
• Continua actividades en obra, siguientes tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, continua extendido, figurado, arme y amarre, acero 60.000 PSI Abscisa KM000+030 a KM000+020, Interventoria verifica Calibres, espaciamientos y cantidades.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, inicia figurado y arme acero 60.000 PSI cabezotes de encole y descole alcantarilla KM000+000. Se fundan Solados concreto pobre de limpieza.
Clima: Lluvia aislados

Ana C Gonzalez R
Residente de obra

Jhon Carlos Zapata
Residente Interventoria.

22 MAYO 2024 - MIERCOLES
Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) maestro obra, (8) Ayudantes obra, (1) residente Interv
Equipo en obra: (2) Mezcladoras, Herramienta menor, —

(1) Retroexcavadora, (2) volquetes, juego formaletas
Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM.
• Charlas HSEQ, Charlas preoperacionales y Calistenia.
• Continuan actividades de obra, siguientes TRAMOS:
* TRAMO 5, Alto Granadillo, Continua figurado, amarre e instalacion acero 60.000 PSI. Tm000+020 a Tm000+070
Interventoria verifica calibres, espaciamiento y cantidades.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, continua instalacion aceros 60.000 PSI Cajilla encole y cabezal descole alicantarilla. Abscisa Tm000+000.
• Clima: Nublado sin Lluvias

Ing. Gonzalez R.
Residente de obra

Juan Carlos Argenta
Residente Interventoria

23 MAYO 2024 - JUEVES

PERSONAL EN OBRA: (1) Ing. residente Obra, (1) SISO obra, (1) Inspector obra, (2) Maestros de obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing. residente interventoria

Equipos en obra: (2) Mezcladoras, Herramienta menor, (1) retroexcavadora, (2) volquetes, Formaletas.

Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM.

• Charlas preoperacionales, Charlas HSEQ y calistenia.
• Continua actividades en obra, siguientes Tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, continua armc y amarre aceros 60.000 PSI. Abscisa Tm000+070 a Tm000+020
Interventoria verifica calibres y espaciamientos
* TRAMO 7, LA CUMBRE, Continua armc aceros 60.000 PSI, Cajilla encole y cabezote descole Tm000+000.
Interventoria verifica calibres, espaciamiento y cantidades
• Clima: Lluvias aisladas leves.

Ing. Gonzalez R.
Residente de obra

Juan Carlos Argenta
Residente Interventoria

24 MAYO 2024 - VIERNES.

Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) SISO obra, (1) Inspector obra, (2) Maestros obra, (8) Ayudantes Obra, (1) Ing residente Interventoria.

Equipo en obra: (2) Mezcladoras Concretos, Herramienta menor, (1) retroexcavadora, (2) volquetas, Juegos formaletas.

Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM.

- Charlas Preoperacionales, Chales HSEQ y Calistenia.
- Continuar actividades en obra, siguientes frentes:

* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continua fundición Concretos 3000 PSI en huellas principales. Km000+035 a Km000+030. Interventoria verifica dosificacion diseño de Mezcla y contenidos Agua A/C.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, Se funden PISOS Cajilla en cole y PISO descole alcantarilla Km000+000.

- Clima: Nublado lluvias aisladas.

Andrés González
Residente de obra

Don Carlos Argueta
Residente Interventoria

25 MAYO 2024 - SABADO.

Personal en obra: (1) residente Obra, (1) SISO obra, (1) Inspector obra, (2) Maestro obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing residente Interventoria.

Equipo en obra: (2) Mezcladora Concretos, Herramienta menor, (1) retro-excavadora llantes, (2) volquetas, Juego formaletas.

Horario de trabajo: 07:00 AM - 12:00 M/M.

- Charlas preoperacionales, charlas HSEQ y calistenia.
- Continuar actividades de obra, siguientes frentes:

* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, continua fundicion Concretos 3000 PSI en huellas principales. Abscisa Km000+030 a Km000+025. Interventoria verifica espesores, dimensiones y dosificacion diseño mezclas.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, continua conformacion encofrado, cajilla en cole y Cabezote descole Alcantarilla, Abscisa Km000+000.

- Clima: Lluvia Aislados.

Andrés González

Don Carlos Argueta
Residente Interventoria

26 MAYO 2024 - DOMINGO.
Personal descanso. No hay avance en obra.

Ana Gonzalez R.
Residente de obra

Don Carlos Delgadillo.
Residente interventoría

27 MAYO 2024 - LUNES.
Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) MAESTROS obra, (8) Ayudante obra (1) Ing residente interventoría.
Equipo en obra: (2) Mezcladoras Concreto, Herramienta menor, (1) retroexcavadora llanta, (1) Juego formaletas, (2) volquetas
Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM
• Charlas preoperacionales, Charlas HSEQ y Calistenia.
• Continuan actividades en obra, siguientes tramos:
* TRAMO 5, Alto Granadillo, continua fundicion de concretos ciclopeos. Abscisa Km000+050 a Km000+040. Interventoría verifica espesores, dimensiones y diseño de mezcla
* TRAMO 7, LA CUMBRE, finaliza conformacion de formaletas cabezotes, inician fundicion cajilla en concreto 3000 PSI. Abscisa Km000+000. Interventoría verifica dimensiones y diseño Alcantarillas.
• Clima: dia Nublado sin lluvias

Ana Gonzalez R.
Residente de obra

Don Carlos Delgadillo
Residente Interventoría

28 MAYO 2024 - MARTES.
Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestro obra, (8) Ayudante obra, (1) Ing. Residente interventoría.
Equipo en obra: (2) Mezcladoras Concretos, Herramienta Manual, (1) retroexcavadora llanta, Juego de formaletas, (2) Volquetas.
Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM.
• Charlas preoperacionales, Charlas HSEQ y calistenia

• Continuan actividades en obra en los siguientes frentes:
* TRAMO 5, Alto Granadillo, abscisas km000+040 a km000+035. Interventoria verifica espesores, dimensiones y diseños mezclas.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, continua fundicion cabezote descole concreto 3000 PSI. Abscisa km000+000 Alcantarilla. Interventoria verifica dimensiones, espesores diseño estructural.
• Clima: Lluvias aislados.

Ana C. Gonzalez R
Residente de obra

Juan Carlos Pinzon
Residente Interventoria

29 MAYO 2024 - MIERCOLES.

Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros obra, (8) Ayudantes Obra, (1) Ing. Residente interventoria
Equipo en obra: (2) Mezcladoras concretos, Herramienta menor, (1) retroexcavadora llantas, Juego de formaletas, (2) Volquetas
Horario de trabajo: 07:00 AM - 05 PM.
• Charlas HSEQ, Charlas preoperacionales y Calistenia
• Continuan actividades de obra en los siguientes tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, continua fundicion concreto ciclopeo. Abscisa km000+035 a km000+030, Interventoria verifica espesores, dimensiones y diseños de mezclas.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, Desformaleteo Cabezotes alcantarilla inicia su curado respectivo. Continua fundicion de concreto 3000 PSI huella principal. km000+045 a km000+040. Interventoria continua verificando diseño mezcla, espesores, dimensiones.
• Clima: Lluvias Aislados

Ana C. Gonzalez R
Residente de obra

Juan Carlos Pinzon
Residente Interventoria.

30 MAYO 2024 - JUEVES.

Personal en Obra: (1) Ing residente obra, (1) inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing residente interventoria.
Equipo en obra: (2) Mezcladoras concretos, Herramienta Menor,

(1) retroexcavadora llantas, Juego de formaletas, (2) volquetas.
Horario de trabajo: 07:00AM - 05:00 PM
• Charlas preoperacionales, Charlas HSEQ y Calistenia
• Continuan actividades de Obra en los siguientes tramos:
*TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continuan fundicion de Concretos Ciclopeos. Abscisa. K000+030 a K000+025. Interventoria verifica espesores, dimensiones y diseño de Mezcla.
*TRAMO 7, LA CUMBRE, Continua fundición de Concreto 3000psi huella principal. Abscisa K000+040 a K000+035. Interventoria continua verificando espesores, dimensiones y diseño de Mezclas.
• Clima: Dia Soleado.

Ana C Gonzalez R
Residente de obra

Juan Carlos Pinzon
Residente Interventoria

31 MAYO 2024 - VIERNES

Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros, (8) Ayudantes obra, (1) Ing residente interventoria.
Equipo en Obra: (2) Mezcladoras Concreto, Juego formaletas, Herramienta menor, (1) retro excavadora llanta, (2) volquetas.
Horario de trabajo: 07:00AM - 05:00 PM.
• Charla HSEQ, Charlas preoperacionales y Calistenia.
• Continuan actividades en obra los siguientes tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continua fundicion Concreto 3000 PSI huella principal. K000+025 a K000+020. Interventoria verifica espesores, dimensiones, diseños Mezcla.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, Continua fundición de Concreto 3000psi huella principal. K000+035 a K000+030. Interventoria verifica espesores, dimensiones y diseño de mezcla.
• Clima: Lluvias aisladas Leves.

Ana C Gonzalez R

Juan Carlos Pinzon
Residente Interventoria

01 JUNIO 2024 - SABADO.
Personal en obra: (1) Ing. Residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestro obra, (8) Ayudante obra, (1) Ing residente Interventoria.
Equipo en Obra: (2) Mezcladora Concretos, Juego formaletas, Herramienta menor, (1) retroexcavadora llantas, (2) volquetas.
Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM.
• Charla HSEQ, Charlas Preoperacionales y Calistenia.
• Continuan actividades en obra los siguientes tramos:
* TRAMO 5, ALTO GRANADILLO, Continua fundicion huella principal Concreto 3000 PSI. Abscisa km000+020 a km000+000. Interventoria Vaselca esperores, dimensiones y diseño Mezcla.
* TRAMO 7, LA COMBRE Continua fundicion Concreto 3000 PSI huella principal Abscisa km000+030 a km000+020. Interventoria Vaselca esperores, dimensiones y diseño Mezcla.
• Clima: Soleado sin llovios.

Residente de obra — Juan Carlos Pagalta, Residente Interventoria

02 JUNIO 2024 - DOMINGO
Personal en descanso. No hay avance de actividades.

Residente de obra. — Juan Carlos Pagalta, Residente Interventoria

03 JUNIO 2024 - LUNES
Dia festivo, Personal en descanso. No hay avance de obra.

Residente de obra — Juan Carlos Pagalta, Residente Interventoria

04 JUNIO 2024 - MARTES
Personal en obra: (1) Ing. residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestro obra, (8) Ayudantes Obra, (1) Ing. residente interventoria
EQUIPO EN OBRA: (2) Mezcladora Concretos, Juego formaletas, Herramienta menor, (1) retroexcavadora llanta, (2) volquetos,

Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM
- Charlas HSEQ, Charlas preoperacional y Calistenia.
- Continuan actividades en obra de los Siguiente tramos:

* TRAMO 5, Alto granadillo, Continua fundicion concretos ciclopeos Abscisa km000+025 a km000+105. Interventoria verifica diseño de Mezcla, espesores y dimensiones.
* TRAMO 7, LA CUMBRE, continua fundición de concretos 3000PSI huella principal. Abscisa km000+070 a km000+090. Interventoria verifica espesores, dimensiones, diseño de mezcla.

- Clima: Lluvias aislados

Ana Gonzalez R
Residente de obra

Juan Carlos Pagarita
Residente Interventoria

05 JUNIO 2024 - MIERCOLES.

Personal en obra: (1) ing residente obra, (1) inspector obra, (1) SISO obra, (2) MAESTRO de Obra, (8) Ayudantes obra, (1) ing residente interventoria.
Equipo en obra: (2) Mezcladora Concreto, Juego formaletas, Herramienta menor, (1) retroexcavadora llanta, (2) volquetas
Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM.

- Charlas HSEQ, Charlas preoperacional y Calistenia.
- Continuan actividades en obra de los Siguiente tramos:

* TRAMO 5, Alto Granadillo, Continuan fundición de Concretos Ciclopeos Abscisa km000+075 a km000+090. Interventoria verifica, espesores, dimensiones y diseño Mezcla.
* TRAMO 7, La Cumbre, Continua fundicion de Concreto 3000 psi huella principal. Abscisa km000+070 a km000+090. Interventoria verifica espesores, dimensiones y diseño de mezcla, Finaliza instalacion aceros.

- Clima: Dia nublado.

Juan Carlos Pagarita
Residente Interventoria

Ana Gonzalez R

Powered by CamScanner

06 JUNIO 2024 - JUEVES.

Personal en obra: (1) Ing residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestro de Obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing. residente Interventoria.

Equipo en Obra: (2) Mezcladora Concreto, Juego formaletas, Herramienta menor, (1) retroexcavadora llanta, (2) volquetas.

Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM.

- Charlas HSEQ, Charlas preoperacional y calistenia.
- Continuan actividades en obra de los siguientes tramos:

* TRAMO 5, Alto Granadillo, continua fundicion de cunetas y bordillos pendientes en concreto 3000 PSI. Interventoria verifica dimensiones y especificaciones del diseño.
* TRAMO 7. LACOMBRE, continua fundicion de concretos ciclopeos. Abscisa Km000+055 a Km000+040. Interventoria verifica espesores, dimensiones y diseños Mezclas.

- Clima: Lluvias aisladas.

ANA C Gonzalez R
Residente de obra

Juan Carlos Rojas
Residente Interventoria

07 JUNIO 2024 - VIERNES

Personal en obra: (1) Ing residente Obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing. residente Interventoria.

Equipo en obra: (2) Mezcladora Concreto, Juego formaletas, Herramienta menor, (1) Retroexcavadora llanta, (2) volquetas.

Horario de trabajo: 07:00AM - 05:00PM

- Charlas HSEQ, Charlas preoperacionales y calistenia
- Continuan actividades en obra siguientes tramos:

* TRAMO 5, Alto granadillo, finalizan fundiciones en general. Realiza orden y aseo. Continua con curado ultimas fundiciones.
* TRAMO 7, LA COMBRE. Continua fundicion concretos ciclopeos. Abscisas Km000+040 a Km000+020. Inician fundicion de bordillos y cunetas pendientes.

Powered by CamScanner

- Clima: Nublado Sin lluvias

Ana C González K.
Residente de obra

Don Carlos Delgado
Residente Interventoría

08 Junio 2024 - SABADO.

Personal en obra: (1) Residente obra, (1) Inspector obra, (1) SISO obra, (2) Maestros obra, (8) Ayudantes obra, (1) Ing residente interventoría.

Equipo en Obra: (2) Mezcladora concreto, Juego de formaletas, Herramienta menor, (1) retroexcavadora llantas, (2) volquetas.

Horario de trabajo: 07:00 AM - 05:00 PM.

- Charlas HSEQ, Charlas preoperacionales y Calistenia.
- Continua actividades tramo 7 La cumbre, fundicion de Ciclopeos Abscisa ~~km~~ ~~km~~ ~~km~~ ~~km~~ finaliza fundiciones bordillos y cunetas pendiente Se realiza Jornada de orden y aseo para entrega. Interventoria verifica espesores, dimensiones y diseño de mezcla.
- Clima: lluvias aisladas.

Ana C González K.
Residente de obra

Don Carlos Delgado
Residente Interventoría

9. ACTA DE CIERRE VEEDURIA

Bogotá D.C, 25 de junio de 2024

ACTA DE CIERRE DE LA VEEDURÍA CIUDADA

Siendo las 10:00 horas del martes 25 de junio de 2024, se reunieron la firma constructora GRUPO MSG S.A.S y el comité Veedor del contrato 142-2023, relacionados a continuación, con el objeto de realizar cierre a la veeduría ciudadana correspondiente a la resolución 039 de 2023. Los veedores ciudadanos se relacionan a continuación:

- Leidy Bibiana Rojas Ríos
- Marco Aurelio Diaz Lizarazo

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Objeto de la asamblea
4. Actividades de la veeduría al contrato 142-2023
5. Observaciones, Proposiciones y varios
6. Clausura de la asamblea

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

El objeto de la asamblea es el cierre de la veeduría Ciudadana N° 039 de 2023 del contrato 142-2023

Se da inicio a la reunión de cierre de la veeduría N° 039 de 2023, con la verificación inicial de la asistencia del comité veedor, compuesto por la Sra. Leidy Bibiana Rojas y el Sr. Marco Aurelio Díaz, así como de la firma constructora. El objetivo principal realizar el cierre de la presente veeduría

En primer lugar, se enfatizó que el proyecto se ejecutó según lo planificado, completando todos los metros lineales de infraestructura de transporte propuestos. Este logro representa no solo un avance tangible en términos de desarrollo físico, sino también un compromiso cumplido con las expectativas y necesidades de los residentes locales.

Además, se celebró el hecho de que el presupuesto asignado se administró de manera eficiente y transparente. La gestión responsable de los recursos garantizó que cada peso invertido contribuyera efectivamente a la mejora de la infraestructura y al desarrollo económico de la comunidad.

Durante la reunión, se destacó también el impacto positivo en la economía local, evidenciado por la generación de empleo en Paicol durante la fase de construcción del proyecto. Esta oportunidad laboral no solo benefició a los trabajadores directamente involucrados, sino que también dinamizó la economía local, fortaleciendo las bases comerciales y mejorando la calidad de vida de los residentes.

Finalmente, se concluyó que la implementación exitosa de la infraestructura ha mejorado significativamente la movilidad en las veredas circundantes, facilitando el acceso y promoviendo una mayor integración comunitaria.

En resumen, la clausura de esta reunión no solo marca el final formal del proceso de veeduría, sino también el inicio de una nueva etapa de progreso y desarrollo para Paicol. El compromiso continuo con la transparencia, la eficiencia y el bienestar comunitario refuerza el impacto positivo y duradero de este proyecto en la región.

Ing. Diego Segura Morales

Leidy Bibiana Rojas Ríos

Marco Aurelio Diaz Lizarazo

GRUPO MSG

Bogotá, 2 de octubre de 2024

Paicol-MSG-036/2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL
Atn. Miguel Alberto Durán Salas
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Paicol

Referencia: Contrato de obra 142-2023

Asunto: SOPORTES DE PAGO COMUNIDAD PAICOL

Cordial Saludo,

Atendiendo las solicitudes presentadas por la comunidad, nos permitimos remitir los comprobantes de pago respectivos.

Cordialmente,

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO MSG SAS
901.110.550 - 1

1. PAULA GONZALEZ

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: **14855851389**

(415)7707212489984(8020) 000001485585138 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 0 0 1 8 4 5 9 6 | 6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva 3

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 8 4 5 9 6	2 0 2 1 0 9 0 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Paicol 5 1 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	RAMIREZ	PAULA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Paicol 5 1 8

41. Dirección principal: CL 5 # 8 - 80

42. Correo electrónico: pg340955@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 8 6 3 7 5 2 4 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 2 0 8 2 9						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 0

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos 58 [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2022 - 08 - 29 / 09 : 26 : 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

984. Nombre: GONZALEZ RAMIREZ PAULA ANDREA

985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF 29-08-2022 09 26 22AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Referencia Bancaria

Viernes, 02 de septiembre de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAULA ANDREA GONZALEZ RAMIREZ identificado(a) con CC 1.000.184.596, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84541473181	2022/09/02	ACTIVA

* **Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Claudia Posada Álvarez
Gerente Bancolombia S.A.

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Paicol Huila, 02 octubre 2024

Señores grupo MSG

Yo Paula Andrea Gonzalez Ramirez, identificada con cédula de ciudadanía número 1.000.184.596, teniendo en cuenta el tiempo laborado con la empresa en el municipio de Paicol Huila, acepto el acuerdo de pago que ofrece la entidad por el valor de un millón doscientos noventa mil pesos $ 1'290.000 MCTE.

Junto a este documento se ajunta el certificado bancario de la cuenta a donde será enviado el dinero y copia del RUT personal.

Paula A Gonzalez

CC: 1000184596

Telefono: 3186375242

Dirección: Paicol Huila

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: ISOSTATICA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9011105501
Generado por: ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15104376	**Fecha de Emisión**	2024/10/02

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO5850	**No. Producto**	*****5850
Fecha de Pago	2024/10/02		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1000184586
Beneficiario	PAULA GONZALEZ
Valor a Pagar	$1,290,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	84541473181
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	PH PAICOL
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

2. HENRY LIZCANO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: ISOSTATICA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9011105501
Generado por: ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09523103	**Fecha de Emisión**	2024/10/01

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO5850	**No. Producto**	*****5850
Fecha de Pago	2024/10/01		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1079509945
Beneficiario	LUISA LIZCANO
Valor a Pagar	$2,200,000.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3248858039
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	PH PAICOL HENRY LIZCANO
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

3. DIOGENES VELASCO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
954384805

Destino de pago
BANCOLOMBIA

Motivo
Recarga Nequi PSE

Fecha
02/10/2024

Número de aprobación
00384805

Dirección IP
186.29.243.69

Valor transacción
$ 700.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
3508572656	186.29.243.69	36384058

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

4. WILFOR CASTRO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
953098386

Destino de pago
BANCOLOMBIA

Motivo
Recarga Nequi PSE

Fecha
02/10/2024

Número de aprobación
00098386

Dirección IP
200.119.36.132

Valor transacción
$ 120.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
3182400737	200.119.36.132	1081406384

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

5. ARLEY PERDOMO CEDEÑO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: ISOSTATICA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9011105501
Generado por: ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	07073736	**Fecha de Emisión**	2024/10/02

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO5850	**No. Producto**	*****5850
Fecha de Pago	2024/10/02		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1079508922
Beneficiario	ARLEY PERDOMO CEDENO
Valor a Pagar	$700,000.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	87045571059
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	ARRIENDO PAICOL
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

10. SEGURIDAD SOCIAL

Información general

2 Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información precontractual

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía CO1.WRT.14536054

Referencia de la garantía 33-44-101240822

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A

Número de póliza 33-44-101240822

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Si No

Garantías por ítems, grupos o etapas Si No

Seriedad de la oferta Si No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento Si No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	13/07/2023 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2023 11:59:00 PM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/07/2023 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2023 11:59:00 PM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Pago de salarios

% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13/07/2023 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/08/2026 11:59:00 PM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/07/2023 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/08/2028 11:59:00 PM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Responsabilidad civil extra contractual Si No

No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 15/07/2023 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido (11/6/2023 5:58:02 PM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor

DETALLE DE LA GARANTÍA

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Si No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCONTR.5135034

Proveedor MSG SAS

Creado por

Agregado en

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4 No. 6-82

Ubicación CO-HUI-41518 - Palermo

País COLOMBIA

Departamento Huila

Palermo

Municipio

Dirección CALLE 4 No. 5-63

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

DETALLE DE LA GARANTÍA

Mu

© VORTAL 2019

10 p.m.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	698945451	9467756834	E	2024/06/17	2024/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$2,237,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$314,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$15,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$15,300		$0	$0
1	CC	1012349671	ROJAS EDUARDO	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
2	CC	1018515205	VANEGAS VALERY	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$299,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$299,400		$0	$0
3	CC	1019015582	GONZALEZ ANA	230201	30	$2,150,000	$344,000	EPS017	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$149,700	30	$0	$0
4	CC	1019059198	SEGURA DIEGO	25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS002	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$149,700	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOSA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: BOSA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
5	CC	79988107	ARIAS LUIS		D	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$7,200,000	$1,152,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$405,200		$0	$0

2024/06/19 08:59 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	698945451	9467756834	E	2024/06/17	2024/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$2,237,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,152,000	$0	$0	$1,152,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$344,000	$0	$0	$344,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$344,000	$0	$0	$344,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$405,200	$0	$0	$405,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$405,200	$0	$0	$405,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$340,000	$0	$0	$340,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$340,000	$0	$0	$340,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$340,000	$0	$0	$340,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$194,000	$0	$0	$194,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$86,000	$0	$0	$86,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				5	$2,237,200	$0	$0	$2,237,200

2024/06/19 08:59 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	639320724	9466307741	E	2024/05/15	2024/05/15	BANCO DE BOGOTA	0	$2,237,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$314,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$15,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$15,300		$0	$0
1	CC	1012349671	ROJAS EDUARDO	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
2	CC	1018515205	VANEGAS VALERY	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$299,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$299,400		$0	$0
3	CC	1019615582	GONZALEZ ANA	230201	30	$2,150,000	$344,000	EPS017	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$149,700	30	$0	$0
4	CC	1019059198	SEGURA DIEGO	25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS002	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$149,700	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOSA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: BOSA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
5	CC	79988107	ARIAS LUIS		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**				$7,200,000	$1,152,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$405,200		$0	$0

2024/06/19 08:58 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	639320724	9466307741	E	2024/05/15	2024/05/15	BANCO DE BOGOTA	0	$2,237,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,152,000	$0	$0	$1,152,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$344,000	$0	$0	$344,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$344,000	$0	$0	$344,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$405,200	$0	$0	$405,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$405,200	$0	$0	$405,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$340,000	$0	$0	$340,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$340,000	$0	$0	$340,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$340,000	$0	$0	$340,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$194,000	$0	$0	$194,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$86,000	$0	$0	$86,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				5	$2,237,200	$0	$0	$2,237,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	575912359	9464841961	E	2024/04/11	2024/04/15	BANCO DE BOGOTA	4	$2,245,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$314,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$15,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$15,300		$0	$0
1	CC	1012349671	ROJAS EDUARDO	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
2	CC	1018515205	VANEGAS VALERY	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$299,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$299,400		$0	$0
3	CC	1019015582	GONZALEZ ANA	230201	30	$2,150,000	$344,000	EPS017	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$149,700	30	$0	$0
4	CC	1019059198	SEGURA DIEGO	25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS002	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$149,700	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOSA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: BOSA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
5	CC	79984107	ARIAS LUIS		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$7,200,000	$1,152,000			$6,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$405,200		$0	$0

2024/06/19 08:51 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	575912359	9464841961	E	2024/04/11	2024/04/15	BANCO DE BOGOTA	4	$2,245,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,152,000	$4,000	$0	$1,156,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$464,000	$1,600	$0	$465,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$344,000	$1,200	$0	$345,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$344,000	$1,200	$0	$345,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$405,200	$1,400	$0	$406,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$405,200	$1,400	$0	$406,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$340,000	$1,200	$0	$341,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$340,000	$1,200	$0	$341,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$340,000	$1,300	$0	$341,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$194,000	$700	$0	$194,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$86,000	$300	$0	$86,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$300	$0	$60,300
TOTAL				5	$2,237,200	$7,900	$0	$2,245,100

2024/06/19 08:51 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	512946195	9463480575	E	2024/03/13	2024/03/14	BANCO DE BOGOTA	1	$2,239,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$314,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$15,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$15,300		$0	$0
1	CC	1012349671	ROJAS EDUARDO	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
2	CC	1018515205	VANEGAS VALERY	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$299,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$299,400		$0	$0
3	CC	1019015582	GONZALEZ ANA	230201	30	$2,150,000	$344,000	EPS017	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$149,700	30	$0	$0
4	CC	1019059198	SEGURA DIEGO	25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS002	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$149,700	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOSA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: BOSA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
5	CC	79988107	ARIAS LUIS		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$7,200,000	$1,152,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$405,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	512946195	9463480575	E	2024/03/13	2024/03/14	BANCO DE BOGOTA	1	$2,239,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,152,000	$1,000	$0	$1,153,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$464,000	$400	$0	$464,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$344,000	$300	$0	$344,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$344,000	$300	$0	$344,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$405,200	$400	$0	$405,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$405,200	$400	$0	$405,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$340,000	$300	$0	$340,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$340,000	$300	$0	$340,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$340,000	$400	$0	$340,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$194,000	$200	$0	$194,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$86,000	$100	$0	$86,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$100	$0	$60,100
TOTAL				5	$2,237,200	$2,100	$0	$2,239,300

2024/06/19 08:49 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	452336926	9462909532	E	2024/02/13	2024/02/13	BANCO DE BOGOTA	0	$2,237,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$314,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$15,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$15,300		$0	$0
1	CC	1012349671	ROJAS EDUARDO	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
2	CC	1018515205	VANEGAS VALERY	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$299,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$299,400		$0	$0
3	CC	1019015582	GONZALEZ ANA	230201	30	$2,150,000	$344,000	EPS017	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$149,700	30	$0	$0
4	CC	1019059198	SEGURA DIEGO	25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS002	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$149,700	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOSA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: BOSA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
5	CC	79908107	ARIAS LUIS		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**				$7,200,000	$1,152,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$405,200		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	452336926	9462909533	E	2024/02/13	2024/02/13	BANCO DE BOGOTA	0	$2,237,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,152,000	$0	$0	$1,152,000
COLFONDOS	23100[illegible]	800,227,940	8	2	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$344,000	$0	$0	$344,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$344,000	$0	$0	$344,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$405,200	$0	$0	$405,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$405,200	$0	$0	$405,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$340,000	$0	$0	$340,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$340,000	$0	$0	$340,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$340,000	$0	$0	$340,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$194,000	$0	$0	$194,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$86,000	$0	$0	$86,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				5	$2,237,200	$0	$0	$2,237,200

2024/06/19 08:46 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	396004596	9461608785	E	2024/01/15	2024/01/15	BANCO DE BOGOTA	0	$4,809,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)					$9,720,000	$1,555,200			$9,720,000	$388,800			$9,720,000	$388,800			$9,720,000	$415,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)					$4,060,000	$649,600			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$21,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$4,060,000	$649,600			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$21,400		$0	$0
1	CC	80414387	GONZALEZ MAURICIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1012349671	ROJAS EDUARDO	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
3	CC	1018515205	VANEGAS VALERY	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$5,660,000	$905,600			$5,660,000	$226,400			$5,660,000	$226,400			$5,660,000	$394,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					$5,660,000	$905,600			$5,660,000	$226,400			$5,660,000	$226,400			$5,660,000	$394,000		$0	$0
4	CC	83167965	ALDANA NELSON	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	3234083	ARGUMERO HECTOR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1019015582	GONZALEZ ANA	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
7	CC	1019059198	SEGURA DIEGO	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Sucursal: POPAYAN (2 Afiliados)					$2,660,000	$425,600			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$185,200		$0	$0
Centro de Trabajo: POPAYAN (2 Afiliados)					$2,660,000	$425,600			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$185,200		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$2,660,000	$425,600			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$185,200		$0	$0
8	CC	76306407	BRAVO JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1061743747	OROZCO YENI	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF14	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Sucursal: BOSA (3 Afiliados)					$3,050,667	$488,200			$5,003,817	$200,300			$5,003,817	$200,300			$5,003,817	$348,400		$0	$0
Centro de Trabajo: BOSA (3 Afiliados)					$3,050,667	$488,200			$5,003,817	$200,300			$5,003,817	$200,300			$5,003,817	$348,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$3,050,667	$488,200			$5,003,817	$200,300			$5,003,817	$200,300			$5,003,817	$348,400		$0	$0
10	CC	79988107	ARIAS LUIS		0	$0	$0	EPS017	27	$1,953,150	$78,200	CCF22	27	$1,953,150	$78,200	14-4	27	$1,953,150	$136,900	27	$0	$0
11	CC	80174947	FANDIÑO ANDRES	230301	22	$1,100,000	$176,000	EPS005	22	$1,100,000	$44,000	CCF22	22	$1,100,000	$44,000	14-4	22	$1,100,000	$76,600	22	$0	$0
12	CC	1019077566	QUINTERO ASTRID	25-14	22	$1,950,667	$312,200	EPS005	22	$1,950,667	$78,100	CCF22	22	$1,950,667	$78,100	14-4	22	$1,950,667	$135,800	22	$0	$0
Total	**Afiliados(12)**					$15,430,667	$2,469,000			$17,383,817	$695,500			$17,383,817	$695,500			$17,383,817	$949,000		$0	$0

2024/03/12 01:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	396004596	9461608785	E	2024/01/15	2024/01/15	BANCO DE BOGOTA	0	$4,809,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$2,469,000	$0	$0	$2,469,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$737,800	$0	$0	$737,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$787,200	$0	$0	$787,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$949,000	$0	$0	$949,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$949,000	$0	$0	$949,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$695,500	$0	$0	$695,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$589,100	$0	$0	$589,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$106,400	$0	$0	$106,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$695,500	$0	$0	$695,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$254,200	$0	$0	$254,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$288,500	$0	$0	$288,500
TOTAL				12	$4,809,000	$0	$0	$4,809,000

2024/03/12 01:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	348701289	9460516580	E	2023/12/14	2023/12/19	BANCO DE BOGOTA	5	$4,631,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)					$9,720,000	$1,555,200			$9,720,000	$388,800			$9,720,000	$388,800			$9,720,000	$415,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)					$4,060,000	$649,600			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$21,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$4,060,000	$649,600			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$21,400		$0	$0
1	CC	80414387	GONZALEZ MAURICIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1012349671	ROJAS EDUARDO	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
3	CC	1018515205	VANEGAS VALERY	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$5,660,000	$905,600			$5,660,000	$226,400			$5,660,000	$226,400			$5,660,000	$394,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					$5,660,000	$905,600			$5,660,000	$226,400			$5,660,000	$226,400			$5,660,000	$394,000		$0	$0
4	CC	83167965	ALDANA NELSON	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	3234083	ARGUMERO HECTOR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1019015582	GONZALEZ ANA	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
7	CC	1019059198	SEGURA DIEGO	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: POPAYAN (2 Afiliados)					$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$74,000			$1,848,000	$74,000			$1,848,000	$128,700		$0	$0
Centro de Trabajo: POPAYAN (2 Afiliados)					$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$74,000			$1,848,000	$74,000			$1,848,000	$128,700		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$74,000			$1,848,000	$74,000			$1,848,000	$128,700		$0	$0
8	CC	76306407	BRAVO JOSE	230301	9	$348,000	$55,700	EPS005	9	$348,000	$14,000	CCF14	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
9	CC	1061743747	OROZCO YENI	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF14	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOSA (2 Afiliados)					$4,160,000	$665,600			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$289,600		$0	$0
Centro de Trabajo: BOSA (2 Afiliados)					$4,160,000	$665,600			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$289,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$4,160,000	$665,600			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$289,600		$0	$0
10	CC	80174947	FANDIÑO ANDRES	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
11	CC	1019077566	QUINTERO ASTRID	25-14	30	$2,660,000	$425,600	EPS005	30	$2,660,000	$106,400	CCF22	30	$2,660,000	$106,400	14-4	30	$2,660,000	$185,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					$15,728,000	$2,516,500			$15,728,000	$629,200			$15,728,000	$629,200			$15,728,000	$833,700		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/03/12 01:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	348701289	9460516580	E	2023/12/14	2023/12/19	BANCO DE BOGOTA	5	$4,631,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$2,516,500	$12,500	$0	$2,529,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$464,000	$2,300	$0	$466,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$851,200	$4,200	$0	$855,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$721,300	$3,600	$0	$724,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$480,000	$2,400	$0	$482,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$833,700	$4,100	$0	$837,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$833,700	$4,100	$0	$837,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$629,200	$3,100	$0	$632,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	9	$555,200	$2,700	$0	$557,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$74,000	$400	$0	$74,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$629,200	$3,300	$0	$632,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$176,000	$900	$0	$176,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$300	$0	$60,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$300,400	$1,500	$0	$301,900
TOTAL				11	$4,608,600	$23,000	$0	$4,631,600

2024/03/12 01:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	277354227	9458922724	E	2023/11/15	2023/11/15	BANCO DE BOGOTA	0	$4,190,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)					$9,720,000	$1,555,200			$9,720,000	$388,800			$9,720,000	$388,800			$9,720,000	$244,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (5 Afiliados)					$6,720,000	$1,075,200			$6,720,000	$268,800			$6,720,000	$268,800			$6,720,000	$35,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					$6,720,000	$1,075,200			$6,720,000	$268,800			$6,720,000	$268,800			$6,720,000	$35,400		$0	$0
1	CC	3234083	ARGUMERO HECTOR	230101	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1019015582	GONZALEZ ANA	230101	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
3	CC	80414387	GONZALEZ MAURICIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1012349671	ROJAS EDUARDO	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
5	CC	1018515205	VANEGAS VALERY	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
6	CC	83167965	ALDANA NELSON	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
7	CC	1019059198	SEGURA DIEGO	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: POPAYAN (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
Centro de Trabajo: POPAYAN (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
8	CC	1061743747	OROZCO YENI	230101	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF14	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOSA (2 Afiliados)					$3,710,000	$593,600			$3,710,000	$148,400			$3,710,000	$148,400			$3,710,000	$258,300		$0	$0
Centro de Trabajo: BOSA (2 Afiliados)					$3,710,000	$593,600			$3,710,000	$148,400			$3,710,000	$148,400			$3,710,000	$258,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$3,710,000	$593,600			$3,710,000	$148,400			$3,710,000	$148,400			$3,710,000	$258,300		$0	$0
9	CC	80174947	FANDINO ANDRES	230101	21	$1,050,000	$168,000	EPS005	21	$1,050,000	$42,000	CCF22	21	$1,050,000	$42,000	14-4	21	$1,050,000	$73,100	21	$0	$0
10	CC	1019077566	QUINTERO ASTRID	25-14	30	$2,660,000	$425,600	EPS005	30	$2,660,000	$106,400	CCF22	30	$2,660,000	$106,400	14-4	30	$2,660,000	$185,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**				$14,930,000	$2,388,800			$14,930,000	$597,200			$14,930,000	$597,200			$14,930,000	$606,900		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/03/12 01:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	277354227	9458922724	E	2023/11/15	2023/11/15	BANCO DE BOGOTA	0	$4,190,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,388,800	$0	$0	$2,388,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$851,200	$0	$0	$851,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$593,600	$0	$0	$593,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$606,900	$0	$0	$606,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$606,900	$0	$0	$606,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$597,200	$0	$0	$597,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	9	$537,200	$0	$0	$537,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$597,200	$0	$0	$597,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$176,000	$0	$0	$176,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$268,400	$0	$0	$268,400
TOTAL				10	$4,190,100	$0	$0	$4,190,100

2024/03/12 01:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-09	234338637	9457981860	E	2023/09/13	2023/10/23	BANCO DE BOGOTA	40	$227,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$889,334	$142,300			$889,334	$35,600			$889,334	$35,600			$889,334	$4,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$889,334	$142,300			$889,334	$35,600			$889,334	$35,600			$889,334	$4,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$889,334	$142,300			$889,334	$35,600			$889,334	$35,600			$889,334	$4,700		$0	$0
1	CC	3234083	ARGUMERO HECTOR	230301	23	$889,334	$142,300	EPS010	23	$889,334	$35,600	CCF22	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$4,700	23	$0	$0
Total Afiliados(1)						$889,334	$142,300			$889,334	$35,600			$889,334	$35,600			$889,334	$4,700		$0	$0

2024/03/12 01:22 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	234338637	9457981860	E	2023/09/13	2023/10/23	BANCO DE BOGOTA	40	$227,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$142,300	$6,100	$0	$148,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$142,300	$6,100	$0	$148,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,700	$200	$0	$4,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$4,700	$200	$0	$4,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,600	$1,600	$0	$37,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,600	$1,600	$0	$37,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,600	$1,600	$0	$37,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$35,600	$1,600	$0	$37,200
TOTAL				1	$218,200	$9,500	$0	$227,700

2024/03/12 01:22 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	Z16437003	9457588144	E	2023/10/12	2023/10/13	BANCO DE BOGOTA	1	$3,050,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)					$12,026,668	$1,924,400			$12,026,668	$481,200			$12,026,668	$481,200			$12,026,668	$159,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (7 Afiliados)					$9,026,668	$1,444,400			$9,026,668	$361,200			$9,026,668	$361,200			$9,026,668	$47,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)					$9,026,668	$1,444,400			$9,026,668	$361,200			$9,026,668	$361,200			$9,026,668	$47,600		$0	$0
1	CC	83167965	ALDANA NELSON	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
2	CC	3234083	ARGUMERO HECTOR	230301	5	$193,334	$31,000	EPS010	5	$193,334	$7,800	CCF22	5	$193,334	$7,800	14-4	5	$193,334	$1,100	5	$0	$0
3	CC	80414387	GONZALEZ MAURICIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1061743747	OROZCO YENI	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
5	CC	1019077566	QUINTERO ASTRID	25-14	20	$1,773,334	$283,800	EPS005	20	$1,773,334	$71,000	CCF22	20	$1,773,334	$71,000	14-4	20	$1,773,334	$9,300	20	$0	$0
6	CC	1012349671	ROJAS EDUARDO	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
7	CC	1018515205	VANEGAS VALERY	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 3 (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$7,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$7,900		$0	$0
8	CC	1019015582	GONZALEZ ANA	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
9	CC	1019059198	SEGURA DIEGO	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(9)**				$12,026,668	$1,924,400			$12,026,668	$481,200			$12,026,668	$481,200			$12,026,668	$159,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	216437003	9457588144	E	2023/10/12	2023/10/13	BANCO DE BOGOTA	1	$3,050,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,924,400	$2,100	$0	$1,926,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$464,000	$500	$0	$464,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$709,400	$800	$0	$710,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$271,000	$300	$0	$271,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$480,000	$500	$0	$480,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$159,900	$200	$0	$160,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$159,900	$200	$0	$160,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$481,200	$500	$0	$481,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	9	$481,200	$500	$0	$481,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$481,200	$700	$0	$481,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$7,800	$100	$0	$7,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$176,000	$200	$0	$176,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$100	$0	$46,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$100	$0	$60,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$191,000	$200	$0	$191,200
TOTAL				9	$3,046,700	$3,500	$0	$3,050,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	234332104	9457982528	N	2023/10/12	2023/10/23	BANCO DE BOGOTA	11	$239,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$966,666	$154,600			$966,666	$38,600			$966,666	$38,600			$966,666	$5,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 1 (1 Afiliados)					$966,666	$154,600			$966,666	$38,600			$966,666	$38,600			$966,666	$5,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$966,666	$154,600			$966,666	$38,600			$966,666	$38,600			$966,666	$5,000		$0	$0
1	CC	3234083	ARGUMERO HECTOR	Z30301	5	($193,334)	($31,000)	EPS010	5	($193,334)	($7,800)	CCF22	5	($193,334)	($7,800)	14-4	5	($193,334)	($1,100)	5	$0	$0
2	CC	3234083	ARGUMERO HECTOR	Z30301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$966,666	$154,600			$966,666	$38,600			$966,666	$38,600			$966,666	$5,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	234332104	9457982528	N	2023/10/12	2023/10/23	BANCO DE BOGOTA	11	$239,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$154,600	$1,800	$0	$156,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$154,600	$1,800	$0	$156,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,000	$100	$0	$5,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$5,000	$100	$0	$5,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,600	$500	$0	$39,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$38,600	$500	$0	$39,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,600	$500	$0	$39,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$38,600	$500	$0	$39,100
TOTAL				1	$236,800	$2,900	$0	$239,700

2024/03/12 01:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	234338637	9457981860	E	2023/09/13	2023/10/23	BANCO DE BOGOTA	40	$227,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$889,334	$142,300			$889,334	$35,600			$889,334	$35,600			$889,334	$4,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$889,334	$142,300			$889,334	$35,600			$889,334	$35,600			$889,334	$4,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$889,334	$142,300			$889,334	$35,600			$889,334	$35,600			$889,334	$4,700		$0	$0
1	CC 3234083	ARGUMERO HECTOR	230301	23	$889,334	$142,300	EPS010	23	$889,334	$35,600	CCF22	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$4,700	23	$0	$0
Total Afiliados(1)					$889,334	$142,300			$889,334	$35,600			$889,334	$35,600			$889,334	$4,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	234338637	9457981860	E	2023/09/13	2023/10/23	BANCO DE BOGOTA	40	$227,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$142,300	$6,100	$0	$148,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$142,300	$6,100	$0	$148,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,700	$200	$0	$4,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$4,700	$200	$0	$4,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,600	$1,600	$0	$37,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,600	$1,600	$0	$37,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,600	$1,600	$0	$37,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$35,600	$1,600	$0	$37,200
TOTAL				1	$218,200	$9,500	$0	$227,700

2024/03/12 01:22 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900708668-4	CJMC INGENIERIA SAS		CL 6 C 82 A 78 TO 5 AP 1202	3124713178	cjmcsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	25/06/2024	77871473	$313.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	6	300	0	52.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	6	1.000	0	209.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	0				0	0	0	0			0	0	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	6	300	52.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.300
Pensión	1	208.000	209.000
Riesgos Laborales	1	0	0
CCF	1	52.000	52.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	312.000	313.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900708668-4	CJMC INGENIERIA SAS		CL 6 C 82 A 78 TO 5 AP 1202	3124713178	cjmcsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	25/06/2024	77671473	$313.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sustitut	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IRET	TDE	TAE	TDP	EXT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	75891792	MARTINEZ CASTRO CESAR JEFFERSON	1	0			0											X					25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	0	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LINA MARIA PERALTA CIFUENTES identificado(a) con CC 1010232399 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

										Novedades															
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9457280019	197664925	E	2024-06-24	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	
9457280019	197664925	E	2024-06-24	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	
9457280019	197664925	E	2024-06-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	
9457280019	197664925	E	2024-06-24	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	
9456011697	143185131	E	2024-05-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	
9456011697	143185131	E	2024-05-23	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	
9456011697	143185131	E	2024-05-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	
9456011697	143185131	E	2024-05-23	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	

Este certificado se expide el día 2024-06-24 a las 19:10.

11. CERTIFICACION CONTADOR

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ identificado con C.C **1.019.015.582** en mi condición de representante legal de **GRUPO MSG S.A.S** identificada con el **NIT 901.110.550 – 1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983).

YULY PAOLA MONDRAGON SEGURA identificado con C.C **80.738.186**, y con tarjeta profesional **No. 220934- T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **GRUPO MSG S.A.S** identificada con el **NIT 901.110.550 – 1,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), este certificado tiene vigencia de 6 meses a partir de su expedición.

Ana Carolina González Rodríguez
Representante legal **GRUPO MSG S.A.S**

Yuly Paola Mondragón Segura
Contador Público **GRUPO MSG S.A.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.020.714.520

MONDRAGON SEGURA

APELLIDOS

YULY PAOLA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1986

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-MAY-2004 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00368994 F-1020714520 20120401 0029597416A 1 1151785415

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

220934-T



YULY PAOLA
MONDRAGON SEGURA
C.C. 1020714520

RESOLUCION INSCRIPCION 1130 **FECHA 14/10/2016**

UNIVERSIDAD FUND. UNIV. AGRARIA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 236434

224447

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 668 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7C518Z814B0DH8B9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YULY PAOLA MONDRAGON SEGURA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020714520 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 220934-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

12. PARAFISCALES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

[redacted] No. Radicado: 08SE2024904139600004196
Fecha: 2024-07-23 08:27:24 am
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen:INSPECCIÓN LA PLATA
Destinatario GRUPO MSG SAS
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2024904139600004196

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	05EE2024904139600003059
Nombre y/o Razón Social	GRUPO MSG SAS
Identificación	901110550-1

En el periodo comprendido entre el 23/07/2023 al 22/07/2024 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** NO Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo. De conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Neiva Huila, martes, 23 de julio de 2024

Camilo Chacue Collazos
CAMILO CHACUE COLLAZOS
Director Territorial del Huila

Elaboro: mandradel
Reviso/ Aprobó: cchacue

13. IMPREVISTOS DE OBRA

Neiva, 22 de julio de 2024

Int.Paicol -- 028

GRUPO MSG S.A.S.
ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
Representante legal
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato de obra 142 del 2023, que tiene por objeto el **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Asunto: Aprobación imprevistos de obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA en calidad de interventor del contrato de obra en asunto, cumpliendo con sus obligaciones contractuales se permite informar que una vez realizada la respectiva revisión de las justificaciones a los imprevistos presentados por el contratista de obra Grupo MSG S.A.S mediante el comunicado Paicol-MSG-031/2024, emite **AVAL** a estos imprevistos toda vez que fueron situaciones extraordinarias presentadas durante la ejecución del proyecto.

Atentamente;

JAVIER BARRERO MOSSOS.
REP. LEGAL SOTA LTDA.

Bogotá, 20 de junio de 2024

Paicol-MSG-031/2024

Señores
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Atn. Javier Barrero Mossos
Representante Legal
Neiva

Referencia: Contrato de obra 142-2023

Asunto: ALCANCE JUSTIFICACION IMPREVISTOS

Cordial Saludo,


Durante el periodo comprendido entre el 5 de septiembre de 2023 y 27 de diciembre de 2023, hemos enfrentado condiciones climáticas adversas durante la ejecución de la obra, particularmente días de lluvia intensa que han llevado a la suspensión temporal de las labores diarias en el lugar de la obra. A pesar de estas circunstancias, mantuvimos el cumplimiento de las obligaciones laborales y legales en relación con nuestro equipo de trabajo, incluyendo el pago de la seguridad social y nómina de los empleados, en estricto apego a la legislación vigente. De igual manera se realizaron los pagos correspondientes al stand by de la maquinaria como lo es la retroexcavadora, vibro compactador y motoniveladora.

Con el fin de transparentar y formalizar los costos adicionales incurridos debido a la suspensión de las obras por motivos climáticos, adjuntamos un desglose detallado de las fechas de ejecución de la obra y los gastos derivados de esta situación.

Durante el transcurso del mes de noviembre y diciembre, nos hemos enfrentado a condiciones climáticas excepcionales, caracterizadas por lluvias intensas y prolongadas que han impactado significativamente nuestro cronograma de trabajo.

Las severidades meteorológicas que hemos experimentado han generado dificultades para llevar a cabo las labores planificadas en el proyecto. Estas lluvias han causado inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en varias áreas donde se lleva a cabo la construcción de la infraestructura vial, impidiendo así el avance y desarrollo normal de las obras.

Como resultado directo de estos eventos climáticos imprevistos, nos hemos visto obligados a detener temporalmente diversas actividades, lo que ha impactado de forma negativa el avance de obra y ha imposibilitado cumplir con los plazos estipulados en el contrato original.

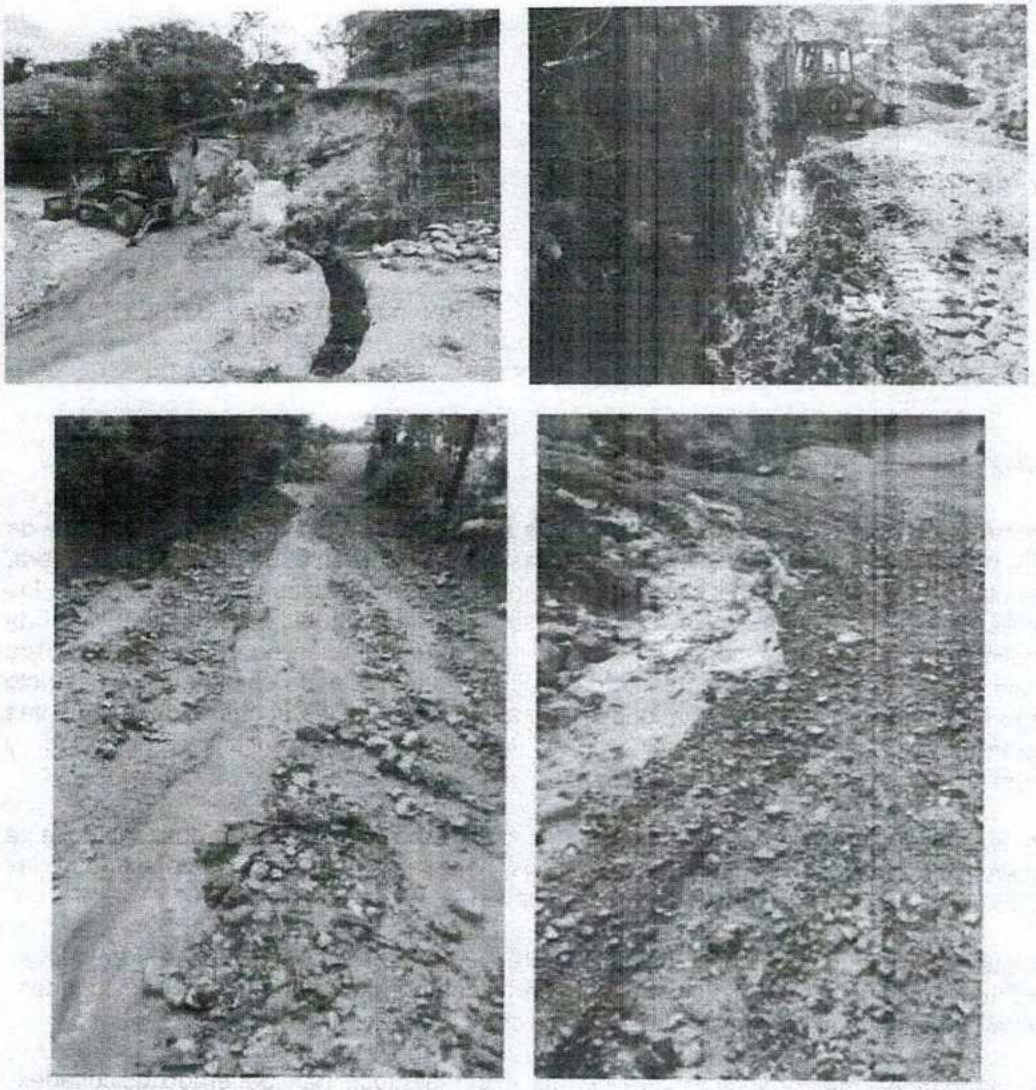

FRENTE DE TRABAJO VEREDA LA CUMBRE

Hemos calculado los costos asociados al stand by de la maquinaria, a pesar de la interrupción de las actividades productivas. Dicha información se presenta a continuación:

COSTO STAND BY RETRO EXCAVADORA					
MES	DIAS LLUVIA	VALOR MES	DIAS LABORADOS	VALOR DIA	VALOR TOTAL
SEPTIEMBRE	0	$ 7.200.000,00	25	$ 288.000,00	$ -
OCTUBRE	5	$ 7.200.000,00	30	$ 240.000,00	$ 1.200.000,00
NOVIEMBRE	15	$ 7.200.000,00	30	$ 240.000,00	$ 3.600.000,00
TOTAL					**$ 4.800.000,00**

1/1/111
1,2,3,14,15,16,17,19,19
20,21,22

COSTO STAND BY VIBRO COMPACTADOR					
MES	DIAS LLUVIA	VALOR MES	DIAS LABORADOS	VALOR DIA	VALOR TOTAL
SEPTIEMBRE	0	$ 3.600.000,00	25	$ 144.000,00	$ -
OCTUBRE	5	$ 3.600.000,00	30	$ 120.000,00	$ 600.000,00
NOVIEMBRE	15	$ 3.600.000,00	30	$ 120.000,00	$ 1.800.000,00
TOTAL					**$ 2.400.000,00**

COSTO STAND BY MOTONIVELADORA					
MES	DIAS LLUVIA	VALOR MES	DIAS LABORADOS	VALOR DIA	VALOR TOTAL
SEPTIEMBRE	0	$ 7.200.000,00	25	$ 288.000,00	$ -
OCTUBRE	5	$ 7.200.000,00	30	$ 240.000,00	$ 1.200.000,00
NOVIEMBRE	15	$ 7.200.000,00	30	$ 240.000,00	$ 3.600.000,00
TOTAL					**$ 4.800.000,00**

TOTAL	**$ 12.000.000,00**


Este desglose se ha elaborado teniendo en cuenta las obligaciones contractuales aplicables, con el objetivo de mantener la equidad, así como de cumplir con las normativas vigentes en materia comercial.

Agradecemos de antemano su atención a este asunto y quedamos a disposición para cualquier aclaración o información adicional que pueda requerir.


Cordialmente,

Ana C González R.

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO MSG SAS
901.110.550 - 1

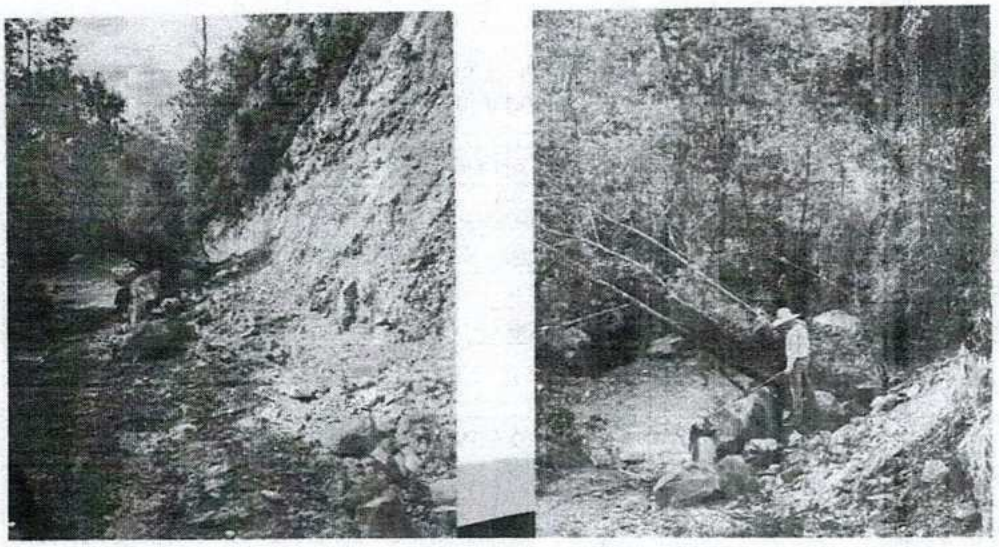



FRENTE DE TRABAJO VEREDA PEÑA NEGRA

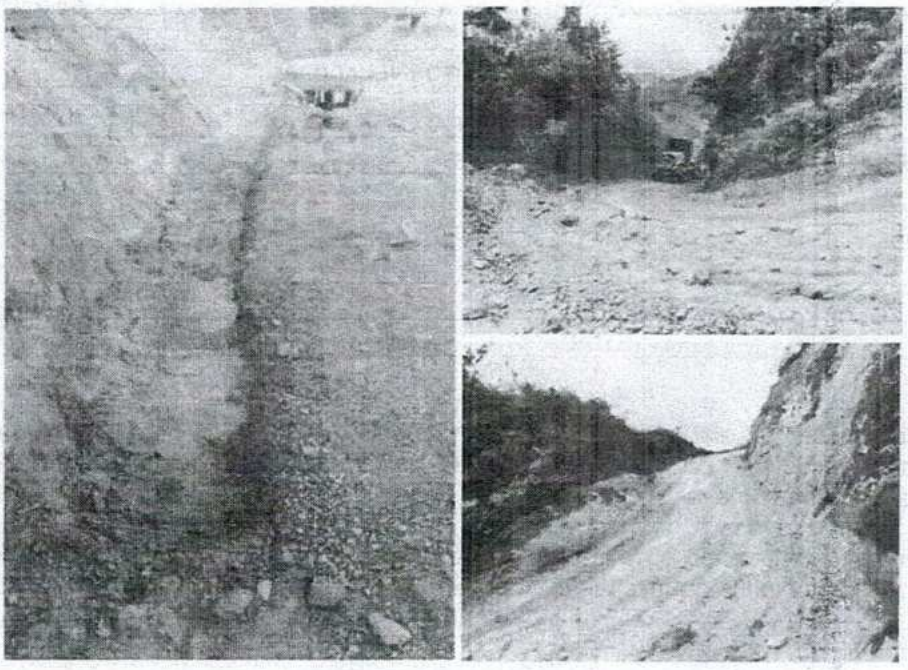

FRENTE DE TRABAJO VEREDA ALTO GRANADILLO

ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:

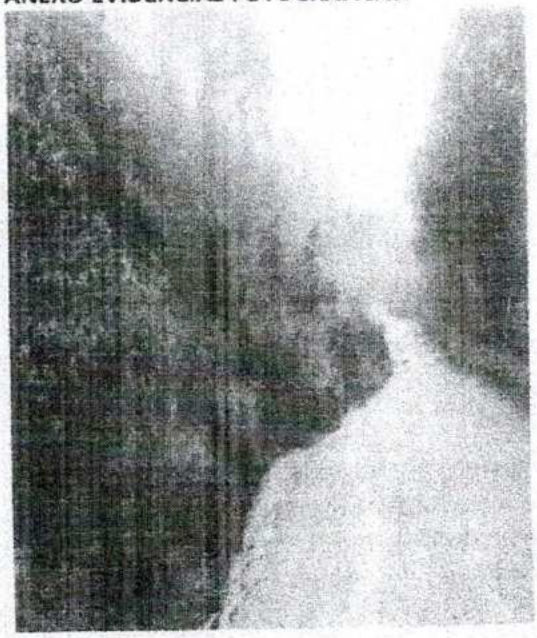

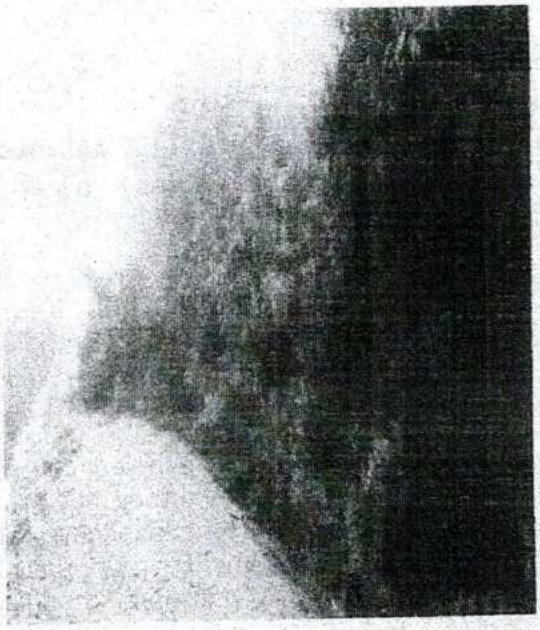



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAICOL
PERSONERIA JURÍDICA RESOLUCIÓN 063 DE 2007
Nit. 900148626-1
(Ley 1575/2012)
Carrera 7 No. 5-66 Telefono: 3214903114

Paicol Huila, 21 de Noviembre de 2023

Señora
SHAROON LORENA GONZALEZ VALENZUELA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Paicol- Huila

22 11 23 9.30am
Faiber C
Monica C
1521

Asunto: Informe de inspección en la Vereda La Cumbre afectada por fuertes lluvias.

Cordial saludo

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentarle un informe de la inspección que se realizó el día de ayer, en la Vereda La Cumbre donde por las fuertes lluvias de la noche anterior se presentó un deslizamiento de tierra que afecto parte de la vía principal impidiendo el paso de vehículos, Esperamos se tenga en cuenta dicha información para que se adelante las medidas necesarias referentes a este caso ya que se pueden seguir presentando deslizamientos por las lluvias que se lleguen a presentar.

Agradecemos su colaboración.


Atentamente,


Sg. FAIBER CABRERA CERQUERA
Comandante Bomberos Paicol
CC. 97.447.421 Puerto Leguizamo – P.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol.

Yuberica Vargas Son


Bro. YUBERICA VARGAS SON
Secretaria Consejo de Dignatarios
CC.1.079.508.202 de Paicol – Huila.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol

ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:

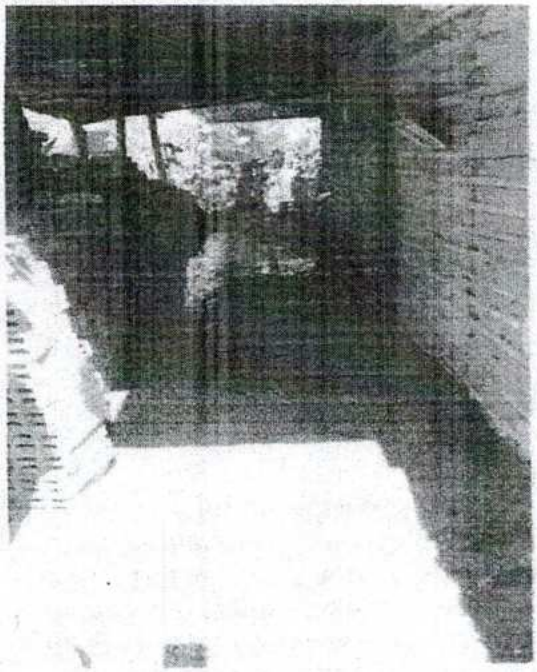

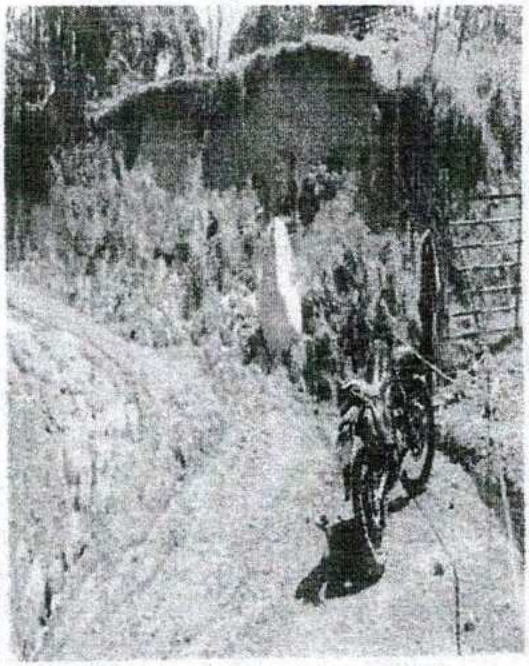



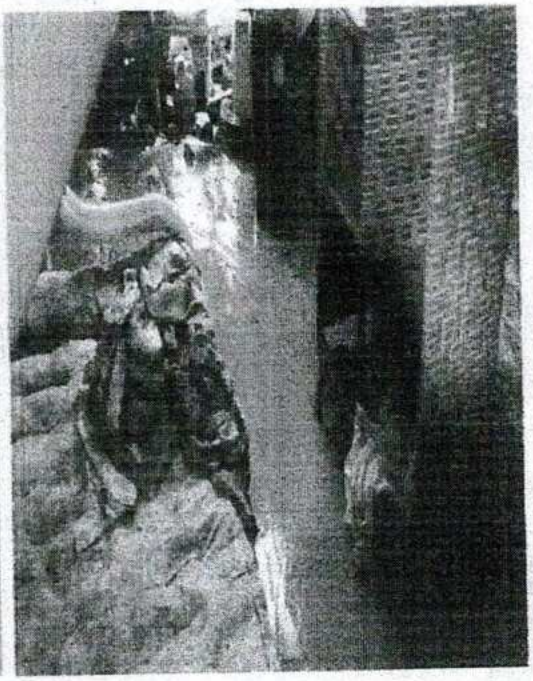

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAICOL
PERSONERIA JURÍDICA RESOLUCIÓN 063 DE 2007
Nit. 900148626-1
(Ley 1575/2012)
Carrera 7 No. 5-66 Teléfono: 3214963114

Paicol Huila, 22 de Noviembre de 2023

Señora
SHAROON LORENA GONZALEZ VALENZUELA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Paicol- Huila

Dia 22 11 23 9:30Am
Faiber C.
Monica C
1524

Asunto: Informe de inspección en la Vereda San Marcos afectada por fuertes lluvias.

Cordial saludo

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentarle un informe de la inspección que se realizó el día de ayer, en la Vereda San Marcos donde se pudo evidenciar que por motivo de las fuertes lluvias el material que fue utilizado para realizar una placa huella la lluvia lo arrastro hasta la vivienda del señor con cedula de ciudadanía 76.006.740 de Páez Cauca donde hay una afectación del 80% de la casa llena del lodo del material que arrastro la lluvia, y por ende genera riesgo para los 4 habitantes de la misma, dentro de los cuales habita 2 menores de edad Esperamos se tenga en cuenta dicha información para que se adelante las medidas necesarias referentes a este caso.

Agradecemos su colaboración.


Atentamente,


Sg. FAIBER CABRERA CERQUERA
Comandante Bomberos Paicol
CC. 97.447.421 Puerto Leguizamo – P.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol.


Yuberica Vargas Son

Bro. YUBERICA VARGAS SON
Secretaria Consejo de Dignatarios
CC.1.079.508.202 de Paicol – Huila.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol

ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:

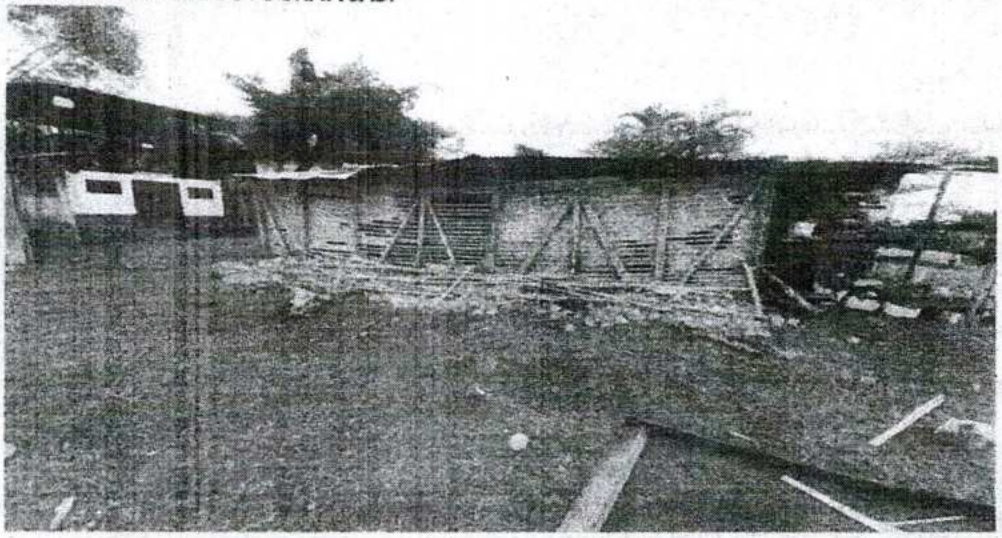

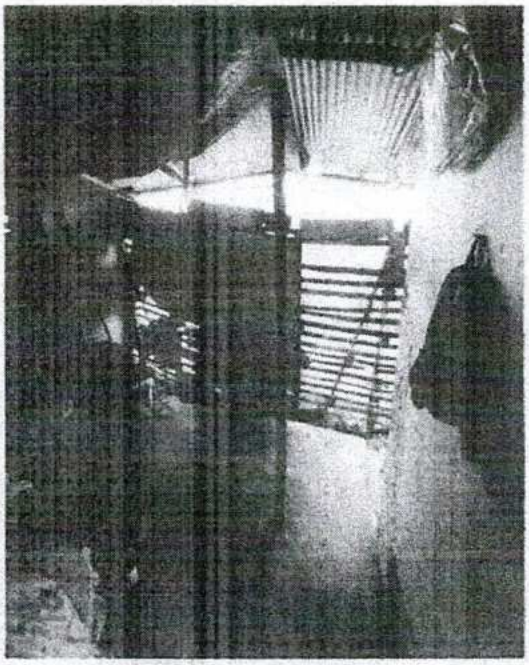

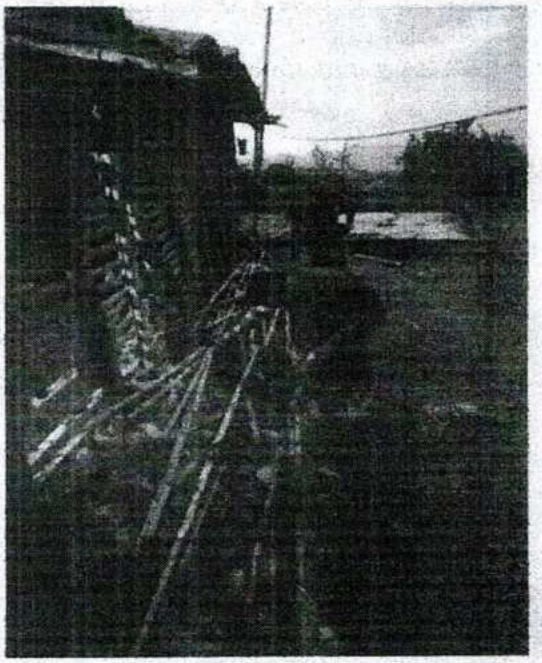

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAICOL
PERSONERIA JURIDICA RESOLUCIÓN 063 DE 2007
Nit. 900148626-1
(Ley 1575/2012)
Carrera 7 No. 5-66 Telefono: 3214863114

Paicol Huila, 22 de Noviembre de 2023

Señora
SHAROON LORENA GONZALEZ VALENZUELA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Paicol- Huila

Dia 22 11 23 9:30Am
Faiber C.
Monica C
7523

Asunto: Informe de inspección en la Vereda Alto Caloto afectada por fuertes lluvias.

Cordial saludo

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentarle un informe de la inspección que se realizó el día de ayer, en la Vereda Alto Caloto finca Los Nogales propiedad del señor Sergio Andrés Montealegre con Cedula de Ciudadanía 1.081.415.973 donde por las fuertes lluvias se presentó un vendaval que afecto parte de la estructura de la vivienda, Esperamos se tenga en cuenta dicha información para que se adelante las medidas necesarias referentes a este caso ya que la estructura de la vivienda quedo deteriorada en un 70% y por ende genera riesgo para los 4 habitantes de la misma, dentro de los cuales habita 2 menores de edad.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,


Sg. FAIBER CABRERA CERQUERA
Comandante Bomberos Paicol
CC. 97.447.421 Puerto Leguizamo – P.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol.


Yuberica Vargas SON

Bro. YUBERICA VARGAS SON
Secretaria Consejo de Dignatarios
CC.1.079.508.202 de Paicol – Huila.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol

ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



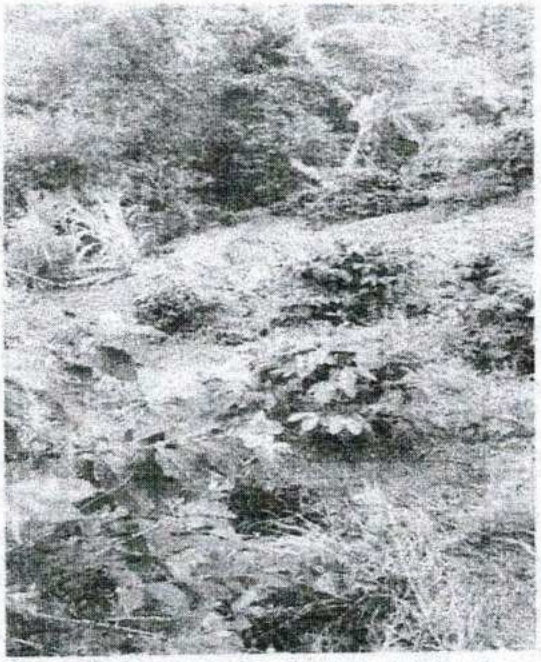

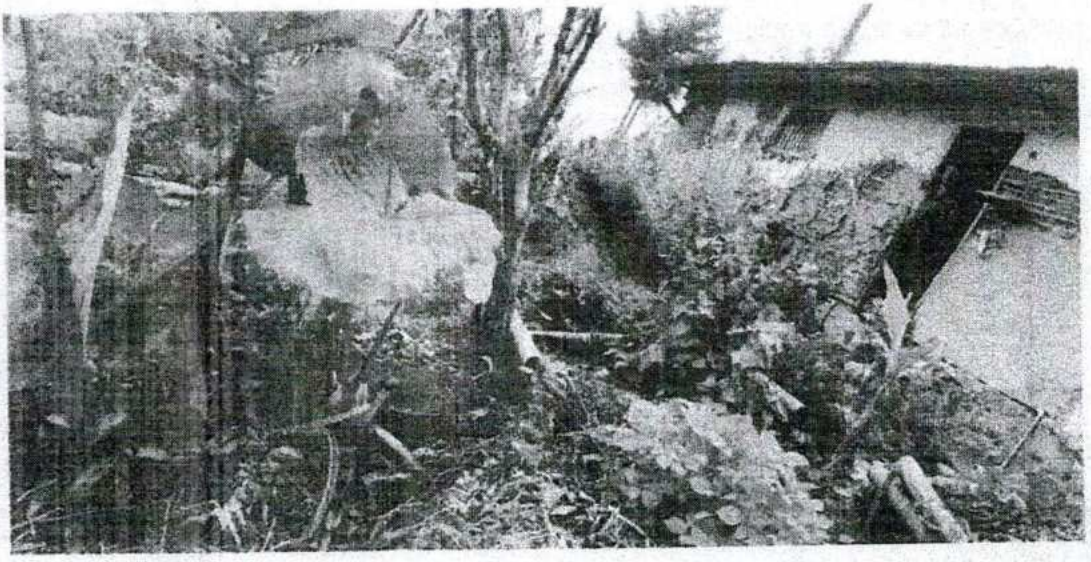

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAICOL
PERSONERIA JURIDICA RESOLUCION 063 DE 2007
Nit. 900148626-1
(Ley 1575/2012)
Carrera 7 No. 5-66 Teléfono 3214963114

Paicol Huila, 22 de Noviembre de 2023

Señora
SHAROON LORENA GONZALEZ VALENZUELA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Paicol- Huila

Dia 22 11 23 9:30Am
Faiber C
Monica C
1522

Asunto: Informe de inspección en la Vereda Santa Rita afectada por fuertes lluvias.

Cordial saludo

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentarle nuevamente informe de la inspección que se realizó el día de ayer, en la Vereda Santa Rita vivienda de la señora Maria Liliana Guaracas Villegas con cedula de ciudadanía 26.471.200 de Tesalia donde debido a las fuertes lluvias de la noche anterior se presentó otro deslizamiento de tierra donde sigue estando en riego latente la vivienda y por ende genera riesgo para los 4 habitantes de la misma, dentro de los cuales habita 3 personas en condición de discapacidad, Esperamos se tenga en cuenta dicha información para que se adelante las medidas necesarias referentes a este caso.

Agradecemos su colaboración.


Atentamente,


Sg. FAIBER CABRERA CERQUERA
Comandante Bomberos Paicol
CC. 97.447.421 Puerto Leguizamo – P.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol.

Yuberica Vargas Son

Bro. YUBERICA VARGAS SON
Secretaria Consejo de Dignatarios
CC.1.079.508.202 de Paicol – Huila.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol

ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:

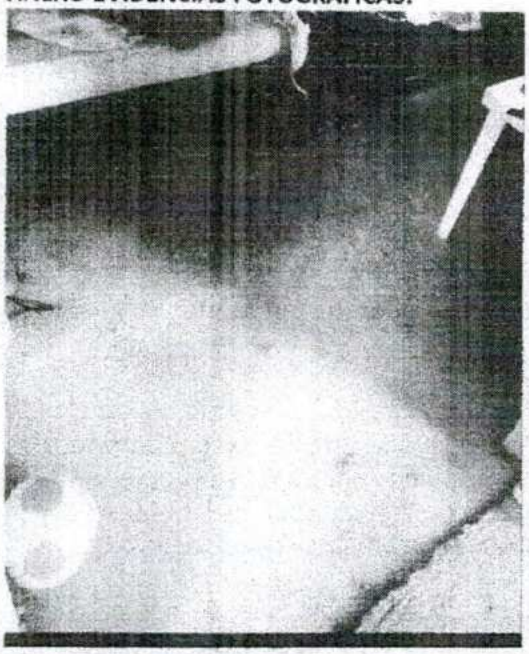

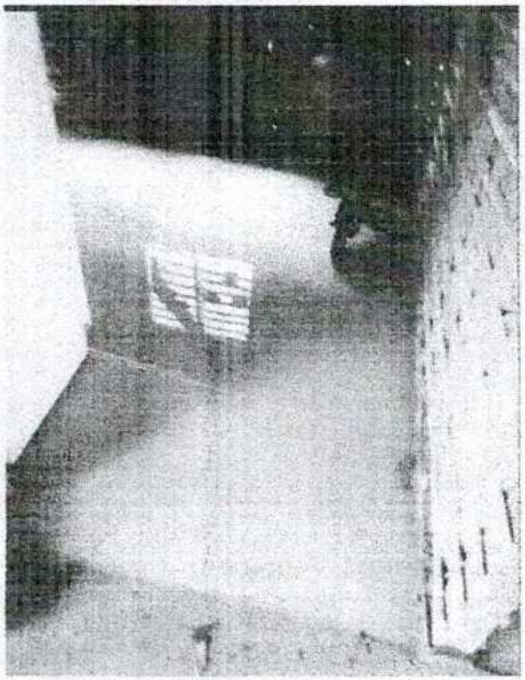


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAICOL
PERSONERIA JURÍDICA RESOLUCIÓN 063 DE 2007
Nit. 900148626-1
(Ley 1575/2012)
Carrera 7 No. 5-66 Teléfono: 3214963114

Paicol Huila, 23 de Noviembre de 2023

Señora
SHAROON LORENA GONZALEZ VALENZUELA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Paicol- Huila

Asunto: Informe de inspección en la Vereda Alto Caloto afectada por fuertes lluvias.

Cordial saludo

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentarle un informe del reporte que realizaron el día de hoy, en la Vereda Alto Caloto finca Santa Rosa propiedad del señor José Dilmer Manrique Ramírez con Cedula de Ciudadanía 1.079.509.962 Paicol donde por las fuertes lluvias se presentó un deslizamiento que afecto parte de la vivienda haciendo que el agua y el barro del derrumbe se entrara a toda la vivienda, Esperamos se tenga en cuenta dicha información para que se adelante las medidas necesarias referentes a este caso ya que si el deslizamiento se sigue presentando puede afectar la estructura de la vivienda y por ende genera riesgo para los 4 habitantes de la misma, dentro de los cuales habita 2 menores de edad.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

23 11 23 2:30pm
Faiber C
Monica C
7535


Sg. FAIBER CABRERA CERQUERA
Comandante Bomberos Paicol
CC. 97.447.421 Puerto Leguizamo – P.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol.

Yuberica Vargas Son

Bro. YUBERICA VARGAS SON
Secretaria Consejo de Dignatarios
CC.1.079.508.202 de Paicol – Huila.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol

ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



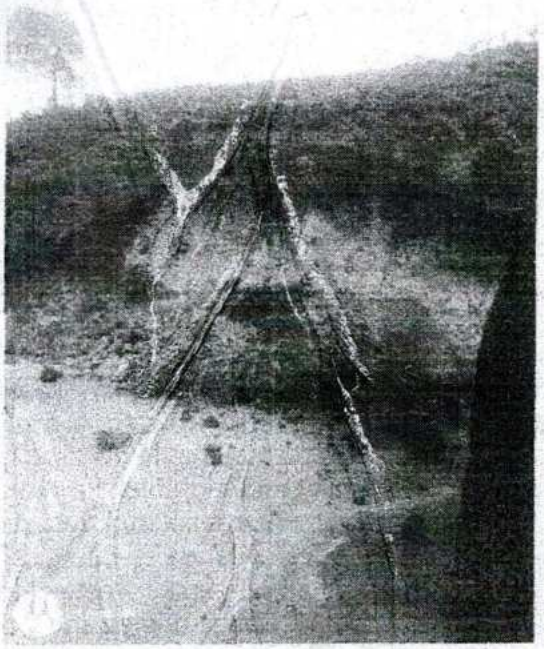



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAICOL
PERSONERIA JURÍDICA RESOLUCIÓN 063 DE 2007
Nit. 900148626-1
(Ley 1575/2012)
Carrera 7 No. 5-66 Telefono: 3214963774

Paicol Huila, 22 de Noviembre de 2023

Señora
SHAROON LORENA GONZALEZ VALENZUELA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Paicol- Huila

Dia 22 11 23 9:30Am
Faiber C
Monica C
4520

Asunto: Informe de inspección en la Vereda Alto Caloto afectada por fuertes lluvias.

Cordial saludo

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentarle un informe de la inspección que se realizó el día de ayer, en la Vereda Alto Caloto finca San Miguel propiedad del señor Abel Piedrahita con Cedula de Ciudadanía 12.279.591 donde por las fuertes lluvias se presentó un deslizamiento de tierra que cayó en parte de la vivienda, Esperamos se tenga en cuenta dicha información para que se adelante las medidas necesarias referentes a este caso ya que se puede seguir presentando deslizamientos por las lluvias que se lleguen a presentar y afectar completamente la vivienda.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

Faiber Cabrera Cerquera

Sg. FAIBER CABRERA CERQUERA
Comandante Bomberos Paicol
CC. 97.447.421 Puerto Leguizamo – P.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol.

Yuberica Vargas Son

Bro. YUBERICA VARGAS SON
Secretaria Consejo de Dignatarios
CC.1.079.508.202 de Paicol – Huila.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol

ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAICOL
PERSONERIA JURÍDICA RESOLUCIÓN 063 DE 2007
Nit. 900148626-1
(Ley 1575/2012)
Carrera 7 No. 5-66 Telefono: 3214663114

Paicol Huila, 22 de Noviembre de 2023

Señora
SHAROON LORENA GONZALEZ VALENZUELA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Paicol- Huila

Dia 22 11 23 9:30Am
Faiber C
Monica C
1525

Asunto: Informe de inspección en la Vereda Alto Caloto afectada por fuertes lluviaś:

Cordial saludo

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentarle un informe del reporte que realizaron el día de ayer, en la Vereda Alto Caloto finca El Guamo propiedad del señor Wilmer Leonardo Lemus Muñoz con Cedula de Ciudadanía 12.283.466 La Plata donde por las fuertes lluvias se presentó un deslizamiento que afecto parte del terreno donde se encuentra la vivienda, Esperamos se tenga en cuenta dicha información para que se adelante las medidas necesarias referentes a este caso ya que si el deslizamiento se sigue presentando puede afectar la base donde se encuentra la vivienda y por ende genera riesgo para los habitantes de la misma.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

Sg. FAIBER CABRERA CERQUERA
Comandante Bomberos Paicol
CC. 97.447.421 Puerto Leguizamo – P.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol.

Yuberica Vargas Son

Bro. YUBERICA VARGAS SON
Secretaria Consejo de Dignatarios
CC.1.079.508.202 de Paicol – Huila.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paicol

14. CERTIFICADO BANCARIO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 17/05/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRUPO MSG SAS** con NIT **901.110.550-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 001669995787

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

15. ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE OBRA NO. 142 DE 2023

1. DATOS GENERALES	
MUNICIPIO	PAICOL – HUILA.
CONTRATO No.	142 DE 2023.
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA	GRUPO MSG S.A.S.
CC. NO. / NIT.	901.110.550-1.
REPRESENTANTE LEGAL	ANA COROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ.
C.C.	1.019.015.582 de Bogotá D.C.
VALOR DEL CONTRATO	El valor del Contrato es la suma de SETECIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA PESOS ($715.214.130,oo) M/CTE., equivalentes a 616 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera. El contratista, con la Suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.
CDP N°	2023000204 DEL 15 DE MARZO DE 2023
RP N°	2023000634 DEL 25 DE JULIO DE 2023
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL BIEN	**Contrato:** 33-44-101240822 ANEXO 0 **Inicio:** 33-44-101240822 ANEXO 2 **Prorroga N° 01:** 33-44-101240822 ANEXO 3 **Suspensión N° 1:** 33-44-101240822 ANEXO 4 **Reinicio:** 33-44-101240822 ANEXO 5 **Anexo causa prima:** 33-44-101240822 ANEXO 6 **Otrosí N° 2 - Prorroga N° 02:** 33-44-101240822 ANEXO 7
PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**Contrato:** 33-40-101075700 ANEXO 0 **Inicio:** 33-40-101075700 ANEXO 2 **Prorroga N° 01:** 33-40-101075700 ANEXO 3 **Suspensión N° 1:** 33-40-101075700 ANEXO 4 **Reinicio:** 33-40-101075700 ANEXO 5 **Anexo causa prima:** 33-40-101075700 ANEXO 6 **Otrosí N° 2 - Prorroga N° 02:** 33-40-101075700 ANEXO 7
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	**Contrato:** 15 AGOSTO DE 2023 **Inicio:** 25 OCTUBRE DE 2023 **Prorroga N° 01:** 14 DICIEMBRE DE 2023 **Suspensión N° 01:** 16 DE MAYO DE 2023 **Reinicio:** 16 DE MAYO DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA

La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

	Anexo causa prima: 16 DE MAYO DE 2023 **Otrosí N° 2 - Prorroga N° 02:** 16 DE MAYO DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES contados a partir del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
PRORRROGA N° 01	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023 a partir de las suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
PRORRROGA N° 02	UN (01) MES, a partir del vencimiento de la prorroga N° 01.
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS.
FORMA DE PAGO.	La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
FECHA DE INICIO	CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE 2023.
FECHA PRÓRROGA N° 01 – OTRSÍ N° 1	DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA ACTA SUSPENSIÓN N° 01	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA REINICIO	NUEVE (09) DE MAYO DE 2024.
FECHA PRÓRROGA N° 01 – OTRSÍ N° 2	NUEVE (09) DE MAYO DE 2024.
FECHA TERMINACIÓN	OCHO (08) DE JUNIO DE 2023.
INTERVENTOR	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, R.L. Javier Barrero Mossos.
SUPERVISOR	MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS, Secretario de Planeación y Obras Públicas.

CONSTANCIAS:

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Paicol Huila, el día ocho (08) de junio de 2024, se reunieron el Señor **ANIBAL CHAVARRO CHANTRE**, mayor de edad, domiciliado en Paicol Huila, identificado con cedula de ciudadanía N° 4.920.467 expedida en Paicol Huila, obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE PAICOL HUILA, en su condición de Alcalde Municipal, según Acta de Posesión del día veintinueve (29) de Diciembre de 2023, ante la Notaria Única del Circulo de Tesalia, Paicol y Nátaga Huila, para el periodo constitucional 2024 – 2027 a partir del 01 de enero de 2024, el Ingeniero **MIGUEL ALBERTO DURÀN SALAS**, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.731.259 expedida en Neiva Huila, Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de **SUPERVISOR** del Contrato, el señor **JAVIER BARRERO MOSSOS** identificado con cedula de ciudadanía N° 7.685.694 expedida en Neiva Huila, Representante Legal de la **SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA** identificada con NIT. 891.101.100-5 en calidad de **INTERVENTOR** y la Señora **ANA COROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.019.015.582 expedida en Bogotá D.C., Representante Legal de **GRUPO MSG S.A.S.**, identificado con NIT 901.110.550-1 en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de firmar la presente Acta de Terminación Bilateral del Contrato de Obra N° 142 de 2023, que tiene por objeto el "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

El contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato.

Para constancia de la presente firman los que en ella intervinieron, el día ocho (08) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

ALCALDE

ANIBAL CHAVARRO CHANTRE
c.c. N° 4.920.467 Paicol Huila

SUPERVISOR

MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS.
Secretario de Planeación y Obras Públicas.
7.731.259 de Neiva Huila.

CONTRATISTA

GRUPO MSG S.A.S.
R.L. Ana Carolina Gonzalez Rodríguez.
Contratista.
901.110.550-1.

INTERVENTOR

SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
R.L. Javier Barrero Mossos.
Interventor.
891.101.100-5.

Proyectó: ***Yesica Lorena Manrique Ipuz***
Apoyo Profesional Secretaría de Planeación

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA
La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso inde bido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

FE DE ERRATAS

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 142 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL, HUILA, Y GRUPO MSG S.A.S.

Se procede a realizar la presente fe de erratas al acta de terminación del CONTRATO DE OBRA No. 142 DE 2023, suscrito entre EL MUNICIPIO DE PAICOL, HUILA Y GRUPO MSG S.A.S., identificado con NIT 901.110.550-1, Representado Legalmente por la Señora ANA COROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía N° 1.019.015.582 expedida en Bogotá D.C., que tiene por objeto el "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA", teniendo en cuenta que por error humano se presentó inconsistencia en el año de terminación del contrato, el cual es 2024 y por error se digitó 2023 en la información establecida en el cuadro resumen al inicio del documento.

Siendo esta la corrección a realizar, los demás aspectos del acta de terminación del contrato de Obra No. 142 de 2023, no sufren modificación alguna.

Se firma en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Paicol Huila, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2024.

Atentamente,

MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

17. POLIZAS FINALES

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101240822	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	06	2024	05	09	2023	00:00	06	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO MSG SAS	NIT: 901.110.550-1	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6016454103

DIRECCIÓN: CL 171 NRO. 55 B - 05

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PAICOL	NIT: 891.180.194-4	PAICOL, HUILA	

DIRECCIÓN: PAICOL

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS Y DIRECTAS DEL OBJETO DEL CONTRATO No 142 DEL 2023, CUYO OBJETO ES:
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/09/2023	11/10/2024	$143,042,826.00	$143,042,826.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/09/2023	11/06/2027	$35,760,707.00	$35,760,707.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/06/2024	06/12/2028	$143,042,826.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE TERMINACION DEL 08 DE JUNIO DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA No. 142 DE 2023, SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, QUEDANDO DEL 08/06/2024 AL 08/06/2029.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******321,846,359.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARCA SEGUROS LTDA	113230	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101240822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101240822	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	06	2024	05	09	2023	00:00	06	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GRUPO MSG SAS			NIT: 901.110.550-1
DIRECCIÓN: CL 171 NRO. 55 B - 05	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6016454103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PAICOL			NIT: 891.180.194-4
DIRECCIÓN: PAICOL	**CIUDAD:** PAICOL, HUILA	**TELÉFONO:**	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101240822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF113230B

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101240822, anexo 9, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de JUNIO de 2024

33-44-101240822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Información general
2 Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proceso
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía CO1.WRT.14536702

Referencia de la garantía 33-44-101240822

Estado Aprobada

Justificación
- [ ] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [ ] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A

Número de póliza 33-44-101240822

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	Sí No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	Sí No			
Seriedad de la oferta	Sí No			
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	Sí No			
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	13/07/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	Cumplimiento del contrato			
	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/07/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	Pago de salarios			
	% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13/07/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/08/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	Estabilidad y calidad de la obra			
	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/07/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/08/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Responsabilidad civil extra contractual	Sí No			

No. de SMMLV 200

Fecha tasa

para entrega de garantías: 13/07/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido (14-06-2023 11:55:02 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor

DETALLE DE LA GARANTÍA

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Si No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Cbo

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5135034

Proveedor MSG SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4 No. 8-00

Ubicación CO-HUI-41518 - Paicol

País COLOMBIA

Departamento Huila

Paicol

Municipio

Dirección CALLE 4 No. 6-58

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

DETALLE DE LA GARANTÍA

Mu

© VORTAL 2012 Términos de uso Normativa

10 p.m.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101240822	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	06	2024	05	09	2023	00:00	08	06	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO MSG SAS	NIT: 901.110.550-1	CL 171 NRO. 55 B - 05	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6016454103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PAICOL	NIT: 891.180.194-4	PAICOL	PAICOL, HUILA	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS Y DIRECTAS DEL OBJETO DEL CONTRATC No.142 DEL 2023, CUYO OBJETO ES:
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/09/2023	11/10/2024	$143,042,826.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/09/2023	11/06/2027	$35,760,707.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/06/2024	08/06/2029	$143,042,826.00	$143,042,826.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE TERMINACION DEL 08 DE JUNIO DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA No. 142 DE 2023, SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, QUEDANDO DEL 08/06/2024 AL 08/06/2029.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******321,846,359.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARCA SEGUROS LTDA	113230	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101240822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101240822	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	06	2024	05	09	2023	00:00	08	06	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GRUPO MSG SAS			NIT: 901.110.550-1
DIRECCIÓN: CL 171 NRO. 55 B - 05	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6016454103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PAICOL			NIT: 891.180.194-4
DIRECCIÓN: PAICOL	**CIUDAD:** PAICOL, HUILA	**TELÉFONO:**	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101240822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101240822, anexo 10, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de JUNIO de 2024

33-44-101240822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
