Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
1			**SALONES COMUNALES**	**126,75 días**	**$ 309.430.040**	**lun 12/02/24**	**jue 11/07/24**		
2			**INICIO DE OBRA**	**0 días**	**$ 0**	**lun 12/02/24**	**lun 12/02/24**		
3			REVISIÓN DE ESPACIOS Y DOCUMENTACIÓN	10 días	$ 0	lun 12/02/24	jue 22/02/24		113;61CC
4			**SALON COMUNAL PORTAL**	**56,75 días**	**$ 81.358.519**	**sáb 4/05/24**	**jue 11/07/24**		
5		**1**	**PRELIMINARES**	**46,88 días**	**$ 4.442.732**	**sáb 4/05/24**	**sáb 29/06/24**		
6		1,1	ABERTURA VANO PUESTA VENTANA	14 días	$ 50.450	mié 8/05/24	sáb 29/06/24		
7		1,2	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS TODO TAMAÑO-MADERA-METALICAS INCLUIDO MARCO(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION)	3 días	$ 471.255	sáb 4/05/24	mié 8/05/24		12
8		1,3	DEMOLICION DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE CARFGUE Y RETIRO DE ESTRUCTURA Y PLACA)	5 días	$ 847.120	mar 21/05/24	sáb 25/05/24		
9		1,4	DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	8 días	$ 3.073.907	sáb 4/05/24	mié 15/05/24		16FC-5 días
10		**2**	**PINTURA**	**43,88 días**	$ 16.258.811	**mié 8/05/24**	**sáb 29/06/24**		
11		2,2	LIMPIEZA RESANE Y PINTURA INTERIOR TRES MANOS M2 (INCLUYE FILOS Y ANDAMIOS)	34,88 días	$ 13.940.256	lun 20/05/24	sáb 29/06/24	14CC+12 días	30

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
12	✓		2,3	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. (INCLUYE ANTICORROSIVO Y LIMPIEZA CON GRATA Y LIJA O SIMILAR.CR)	15 días	$ 2.318.555	mié 8/05/24	lun 27/05/24	7	
13	✓		**4**	**PAÑETE**	**15 días**	$ 14.266.966	**sáb 4/05/24**	**mié 22/05/24**		
14	✓		4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	15 días	$ 14.266.966	sáb 4/05/24	mié 22/05/24		11CC+12 d
15	✓		**6**	**CUBIERTA**	**26 días**	$ 32.218.430	**sáb 4/05/24**	**mar 4/06/24**		
16	✓		6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA , (INCLUYE ANCLAJES, TORNILLERIA,FABRICACION, SUMINISTRO, MONTAJE ANDAMIO Y ACCESORIOS)(PERFIL C 150X50X2.0 MMX6M NEGRO)	15 días	$ 9.452.743	mié 8/05/24	lun 27/05/24	9FC-5 días	21
17	✓		6,2	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS(CIELO RASO BAÑOS)	10 días	$ 5.720.470	vie 10/05/24	mié 22/05/24	20	
18	✓		6,3	CONEXIÓN A TANQUE ELEVADO PVC 1/2"INCLUYE VALVULA Y REGISTRO Y CAMBIO DE FLOTADOR	3 días	$ 428.435	jue 23/05/24	lun 27/05/24	19	

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesc	Sucesoras
19	✓		6,4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE TEJA(REVISION DE CANALETAS)INCLUYE LAVADO PARA VERIFICACION DE FISURAS, APLICACION DE SIKA FLEX O SIMILAR EN UNIONES Y FLANCHES.	15 días	$ 3.639.220	sáb 4/05/24	mié 22/05/24		18
20	✓		6,5	SUMINSTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS=50	5 días	$ 535.574	sáb 4/05/24	vie 10/05/24		17
21	✓		6,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA SIMILAR A LA CANALETA 90 DE 6MTS (FIBRA DE VIDRIO O ACRILICO 3M)	8 días	$ 10.756.401	lun 27/05/24	mar 4/06/24	16	
22	✓		6,7	SUMINISTRO E INTALACION CANAL PAVCO RAINGO	5 días	$ 1.685.587	sáb 4/05/24	vie 10/05/24		
23	✓		**7**	**PISOS**	**15 días**	$ 6.931.547	**sáb 4/05/24**	**mié 22/05/24**		
24	✓		7,1	LIMPIEZA CON PULIDA SENCILLA Y SELLADO DE PISO BALDOSIN EN GRANITO	15 días	$ 6.931.547	sáb 4/05/24	mié 22/05/24		
25	✓		**8**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**5 días**	$ 47.098	**sáb 4/05/24**	**vie 10/05/24**		
26	✓		8,1	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO TRANSPARENTE 5MM PELDAR CRUDO	5 días	$ 47.098	sáb 4/05/24	vie 10/05/24		
27			**9**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**32 días**	$ 2.730.011	**lun 27/05/24**	**jue 4/07/24**		

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesc	Sucesoras
28	✓		9,1	SALIDA LAMPARA EMT COMPLETA CON APARATO (INCLUYE CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12 THHN Y TUBERIA EMT 3/4 HSTA 4 MTS CAJA, CONECTORES, ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION)	8 días	$ 1.445.463	lun 27/05/24	mar 4/06/24		
29	✓		9,2	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA LED HERMETICA 2X 32W	8 días	$ 908.646	mar 11/06/24	jue 20/06/24		
30	✓		9,3	REVISION ELECTRICA, (INCLUYE , ESTUDIO DE CARGAS,REGATEO TOMACORRINTES E INTERRUPTORES)	10 días	$ 151.272	sáb 15/06/24	mié 26/06/24	11	
31			9,4	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA	3 días	$ 224.630	mar 2/07/24	jue 4/07/24		
32	✓		**10**	**CARPINTERIA METALICA**	**8 días**	$ 226.079	**sáb 4/05/24**	**mié 15/05/24**		
33	✓		10,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	8 días	$ 226.079	sáb 4/05/24	mié 15/05/24		
34			**12**	**ASEO Y LIMPIEZA**	**2,75 días**	$ 4.236.845	**mar 9/07/24**	**jue 11/07/24**		
35	✓		12,1	ASEO GENERAL (LIMPIEZA PARA ENTREGA, ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS) VIRDIOS PISOS MUROS FACHADA ANDENES	11 días	$ 1.893.514	mié 8/05/24	mar 21/05/24		

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
36			DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL)	1 día	$ 189.526	mar 9/07/24	mié 10/07/24		
37			LIMPIEZA DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO E IMPERMEABILIZACION EN SIKA TRANSPARENTE INCLUYE LINEALES	1 día	$ 1.794.530	mar 9/07/24	mié 10/07/24		
38			SUMINISTRO E INSTALACION BIG PANEL O LAMPARA LED 60X 60 48 W LUZ BLANCA (MODUARES)ECOLITE O SIMILAR INCLUYE MARCO DE ENSAMBLE.	1 día	$ 359.275	mar 9/07/24	mié 10/07/24		
39			**SALON COMUNAL AYACUCHO**	**118 días**	**$ 84.298.054**	**lun 12/02/24**	**mar 2/07/24**		
40		**1**	**PRELIMINARES**	**15 días**	**$ 4.696.247**	**vie 10/05/24**	**mar 28/05/24**		
41		1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	15 días	$ 4.696.247	vie 10/05/24	mar 28/05/24	45CC+15 días	47;43
42		**2**	**PINTURA**	**52,38 días**	$ 6.970.128	**mar 28/05/24**	**mar 30/07/24**		
43		2,2	LIMPIEZA RESANE Y PINTURA INTERIOR TRES MANOS M2 (INCLUYE FILOS Y ANDAMIOS)	52,38 días	$ 6.970.128	mar 28/05/24	mar 30/07/24	41	
44		**3**	**DEMOLICIONES**	**58 días**	$ 3.266.432	**mar 23/04/24**	**mar 2/07/24**		
45		3,1	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H 0.04MM,INCLUYE TRACIEGO DE MATERIAL (SALON SEGUNDO PISO, BAÑOS 2DO PISO Y COCINA)	58 días	$ 3.266.432	mar 23/04/24	mar 2/07/24	3CC+60 días	50;41CC+ días
46		**4**	**CUBIERTA**	**47,38 días**	$ 42.691.361	**mar 28/05/24**	**jue 25/07/24**		

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesc	Sucesoras
47			4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA , (INCLUYE ANCLAJES, TORNILLERIA,FABRICACION, SUMINISTRO, MONTAJE ANDAMIO Y ACCESORIOS)(PERFIL C 150X50X2.0 MMX6M NEGRO)	39,38 días	$ 24.211.123	mar 28/05/24	lun 15/07/24	41	48FF+8 días
48			4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	22,25 días	$ 18.480.238	vie 14/06/24	jue 25/07/24	47FF+8 días	
49			**5**	**PISOS**	**15 días**	$ 10.973.345	**vie 10/05/24**	**mar 28/05/24**		
50			5,1	CERÁMICA PISO TRAFICO 5 (O DUROPISO), CALIDAD PRIMERA (TERCER PISO) INCLUYE ALISTADO Y JUNTAS DE DILATACION	15 días	$ 10.973.345	vie 10/05/24	mar 28/05/24	45	
51			**6**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**11 días**	$ 5.713.139	**lun 12/02/24**	**vie 23/02/24**		
52			6,1	SALIDA LAMPARA EMT COMPLETA CON APARATO (INCLUYE CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12 THHN Y TUBERIA EMT 3/4 HSTA 4 MTS CAJA, CONECTORES, ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION)	10 días	$ 1.927.284	lun 12/02/24	jue 22/02/24		54CC+3 días
53				SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA LED HERMETICA 2X 32W	1 día	$ 3.634.583	lun 12/02/24	mar 13/02/24		

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
54		6,2	REVISION ELECTRICA, (INCLUYE , ESTUDIO DE CARGAS,REGATEO TOMACORRINTES E INTERRUPTORES)	8 días	$ 151.272	mié 14/02/24	vie 23/02/24	52CC+3 días	56
55		**7**	**ASEO Y LIMPIEZA**	**16 días**	$ 9.987.402	**lun 12/02/24**	**jue 29/02/24**		
56		7,1	ASEO GENERAL (LIMPIEZA PARA ENTREGA, ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS) VIRDIOS PISOS MUROS FACHADA ANDENES	5 días	$ 1.011.463	vie 23/02/24	jue 29/02/24	54	
57			AFINADO DE MORTERO ENDURECIDO 1:3 H=4	1 día	$ 7.785.774	lun 12/02/24	mar 13/02/24		
58			SUMINSTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS=50	1 día	$ 1.190.165	lun 12/02/24	mar 13/02/24		
59			**SALON COMUNAL COMUNEROS**	**109 días**	**$ 46.662.602**	**lun 12/02/24**	**vie 21/06/24**		
60		**1**	**PRELIMINARES**	**12 días**	**$ 4.359.327**	**jue 11/04/24**	**mié 24/04/24**		
61		1,1	DEMOLICION DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE CARFGUE Y RETIRO DE ESTRUCTURA Y PLACA)	12 días	$ 4.359.327	jue 11/04/24	mié 24/04/24	3CC+50 días	66;64CC+ días
62		**2**	**PINTURA**	**15 días**	$ 14.367.525	**vie 19/04/24**	**mié 8/05/24**		
63		2,1	LIMPIEZA RESANE Y PINTURA INTERIOR TRES MANOS M2 (INCLUYE FILOS Y ANDAMIOS)	15 días	$ 14.367.525	vie 19/04/24	mié 8/05/24	64CC	76;70FC-1 días

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24




Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesc	Sucesoras
64	✓		2,2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. (INCLUYE ANTICORROSIVO Y LIMPIEZA CON GRATA Y LIJA O SIMILAR.CR)	0 días	$ 0	vie 19/04/24	vie 19/04/24	61CC+8 días	63CC
65	✓		**6**	**CUBIERTA**	**47 días**	$ 10.895.554	**mié 24/04/24**	**vie 21/06/24**		
66	✓		6,1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS(CIELO RASO BAÑOS)	22 días	$ 10.895.554	mié 24/04/24	mié 22/05/24	61	
67	✓		6,2	CONEXIÓN A TANQUE ELEVADO PVC 1/2"INCLUYE VALVULA Y REGISTRO Y CAMBIO DE FLOTADOR	0 días	$ 0	vie 21/06/24	vie 21/06/24	78FF	
68	✓		6,3	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIPEX PLACA, INCLUYE LIMPIEZA ANTES DE LA IMPRIMACION	0 días	$ 0	mar 21/05/24	mar 21/05/24	70	
69	✓		**7**	**PISOS**	**35 días**	$ 7.050.319	**jue 25/04/24**	**jue 6/06/24**		
70	✓		7,1	AFINADO DE MORTERO ENDURECIDO 1:3 H=4	20 días	$ 2.879.691	jue 25/04/24	mar 21/05/24	63FC-10 días	71;68
71	✓		7,2	CERÁMICA PISO TRAFICO 5 (O DUROPISO), CALIDAD PRIMERA (TERCER PISO) INCLUYE ALISTADO Y JUNTAS DE DILATACION	15 días	$ 4.170.628	mar 21/05/24	jue 6/06/24	70	

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesc	Sucesoras
72		**8**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**31 días**	$ 5.625.370	**mié 8/05/24**	**sáb 15/06/24**		
73		8,1	SUMINISTRO E INSTALACION BIG PANEL O LAMPARA LED 60X 60 48 W LUZ BLANCA (MODUARES)ECOLITE O SIMILAR INCLUYE MARCO DE ENSAMBLE.	8 días	$ 2.035.891	mar 4/06/24	sáb 15/06/24	75CC	
74		8,2	SALIDA LAMPARA EMT COMPLETA CON APARATO (INCLUYE CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12 THHN Y TUBERIA EMT 3/4 HASTA 4 MTS CAJA, CONECTORES, ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION)	8 días	$ 2.529.561	lun 27/05/24	mar 4/06/24	76	75
75		8,3	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA LED HERMETICA 2X 32W	8 días	$ 908.646	mar 4/06/24	sáb 15/06/24	74	73CC;78
76		8,4	REVISION ELECTRICA, (INCLUYE , ESTUDIO DE CARGAS,REGATEO TOMACORRINTES E INTERRUPTORES)	15 días	$ 151.272	mié 8/05/24	lun 27/05/24	63	74
77		**9**	**ASEO Y LIMPIEZA**	**109 días**	$ 4.364.507	**lun 12/02/24**	**vie 21/06/24**		
78		9,1	ASEO GENERAL (LIMPIEZA PARA ENTREGA, ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS) VIRDIOS PISOS MUROS FACHADA ANDENES	5 días	$ 2.608.349	sáb 15/06/24	vie 21/06/24	75	67FF
79			DEMOLICION BALDOSA DE PISO H 0.04MM,INCLUYE TRACIEGO DE MATERIAL (SALON SEGUNDO PISO, BAÑOS 2DO PISO Y COCINA)	6 días	$ 1.241.470	lun 19/02/24	sáb 24/02/24		

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24



Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesc	Sucesoras
80	✓			DESMONTE DE APARATO SANITARIO	2 días	$ 116.208	lun 12/02/24	mar 13/02/24		
81	✓			PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	4 días	$ 398.480	lun 12/02/24	jue 15/02/24		
82	✓			**SALON COMUNAL QUIROGA**	**62 días**	**$ 80.558.326**	**lun 12/02/24**	**mié 24/04/24**		
83	✓		**1**	**PRELIMINARES**	**0 días**	**$ 0**	**jue 21/03/24**	**jue 21/03/24**		
84	✓		1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	0 días	$ 0	jue 21/03/24	jue 21/03/24	3CC+35 días	88FC-15 días;86
85	✓		**2**	**MAMPOSTERIA**	**0 días**	$ 0	**jue 21/03/24**	**jue 21/03/24**		
86	✓		2,1	VIGAS AEREAS DE 3000 PSI INCLUYE FORMALETA, TABLERO LISO AGLOMERADO, BORDES AFLANCHADOS	0 días	$ 0	jue 21/03/24	jue 21/03/24	84	
87	✓		**3**	**CUBIERTA**	**42 días**	$ 67.386.694	**mar 5/03/24**	**mié 24/04/24**		
88	✓		3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA , (INCLUYE ANCLAJES, TORNILLERIA,FABRICACION, SUMINISTRO, MONTAJE ANDAMIO Y ACCESORIOS)(PERFIL C 150X50X2.0 MMX6M NEGRO)	30 días	$ 34.761.465	mar 5/03/24	jue 11/04/24	84FC-15 días	89FF+12 días
89	✓		3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	27 días	$ 32.625.229	jue 21/03/24	mié 24/04/24	88FF+12 días	
90	✓		**4**	**ASEO Y LIMPIEZA**	**20,5 días**	$ 13.171.632	**lun 12/02/24**	**mar 5/03/24**		

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
91		4,1	ASEO GENERAL (LIMPIEZA PARA ENTREGA, ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS) VIRDIOS PISOS MUROS FACHADA ANDENES	7 días	$ 2.931.949	lun 12/02/24	lun 19/02/24		
92			DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL)	11 días	$ 689.873	lun 12/02/24	vie 23/02/24		
93			SUMINSTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS=50	6 días	$ 2.579.682	lun 12/02/24	sáb 17/02/24		
94			LIMPIEZA RESANE Y PINTURA INTERIOR TRES MANOS M2 (INCLUYE FILOS Y ANDAMIOS)	8 días	$ 6.970.128	lun 26/02/24	mar 5/03/24		
95			**SALON COMUNAL SANTA BARBARA**	**20 días**	**$ 1.142.520**	**sáb 1/06/24**	**mié 26/06/24**		
96		**1**	**PINTURA**	**12 días**	**$ 711.780**	**sáb 1/06/24**	**mar 18/06/24**		
97		1,1	LIMPIEZA RESANE Y PINTURA INTERIOR TRES MANOS M2 (INCLUYE FILOS Y ANDAMIOS)	12 días	$ 711.780	sáb 1/06/24	mar 18/06/24	100CC	
98		**2**	**DEMOLICIONES**	**0 días**	$ 0	**sáb 1/06/24**	**sáb 1/06/24**		
99		2,1	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H 0.04MM,INCLUYE TRACIEGO DE MATERIAL (SALON SEGUNDO PISO, BAÑOS 2DO PISO Y COCINA)	0 días	$ 0	sáb 1/06/24	sáb 1/06/24	100	104
100		2,2	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	0 días	$ 0	sáb 1/06/24	sáb 1/06/24	3CC+94 d	99;102CC
101		**3**	**CUBIERTA**	**0 días**	$ 0	**sáb 15/06/24**	**sáb 15/06/24**		

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesc	Sucesoras
102		3,1	CONEXIÓN A TANQUE ELEVADO PVC 1/2"INCLUYE VALVULA Y REGISTRO Y CAMBIO DE FLOTADOR	0 días	$ 0	sáb 15/06/24	sáb 15/06/24	100CC+1 días	
103		**4**	**PISOS**	**0 días**	$ 0	**sáb 1/06/24**	**sáb 1/06/24**		
104		4,1	CERÁMICA PISO TRAFICO 5 (O DUROPISO), CALIDAD PRIMERA (TERCER PISO) INCLUYE ALISTADO Y JUNTAS DE DILATACION	0 días	$ 0	sáb 1/06/24	sáb 1/06/24	99	
105		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**2 días**	$ 0	**vie 21/06/24**	**lun 24/06/24**		
106		5,1	SALIDA LAMPARA EMT COMPLETA CON APARATO (INCLUYE CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12 THHN Y TUBERIA EMT 3/4 HSTA 4 MTS CAJA, CONECTORES, ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION)	0 días	$ 0	vie 21/06/24	vie 21/06/24	108	107CC+2 días
107		5,2	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA LED HERMETICA 2X 32W	0 días	$ 0	lun 24/06/24	lun 24/06/24	106CC+2 días	110
108		5,3	REVISION ELECTRICA, (INCLUYE , ESTUDIO DE CARGAS,REGATEO TOMACORRINTES E INTERRUPTORES)	0 días	$ 0	vie 21/06/24	vie 21/06/24	100CC+1 días	106
109		**6**	**ASEO Y LIMPIEZA**	**3 días**	$ 430.740	**lun 24/06/24**	**mié 26/06/24**		
110		6,1	ASEO GENERAL (LIMPIEZA PARA ENTREGA, ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS) VIRDIOS PISOS MUROS FACHADA ANDENES	3 días	$ 430.740	lun 24/06/24	mié 26/06/24	107	

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
111	✓	📌		**SALON COMUNAL EL TRIUNFO**	**37 días**	**$ 15.410.019**	**vie 8/03/24**	**lun 22/04/24**		
112	✓	📌	**1**	**PRELIMINARES**	**5,13 días**	**$ 0**	**vie 8/03/24**	**mié 13/03/24**		
113	✓		1,1	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS TODO TAMAÑO-MADERA-METALICAS INCLUIDO MARCO(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION)	0 días	$ 0	vie 8/03/24	vie 8/03/24	3	114CC+2 días;118;1 días
114	✓		1,2	DEMOLICION DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE CARFGUE Y RETIRO DE ESTRUCTURA Y PLACA)	0 días	$ 0	lun 11/03/24	lun 11/03/24	113CC+2 días	115CC+2 días;121C
115	✓		1,3	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL)	0 días	$ 0	mié 13/03/24	mié 13/03/24	114CC+2 días	117
116	✓		**2**	**PINTURA**	**24 días**	$ 10.375.690	**vie 8/03/24**	**lun 8/04/24**		
117	✓		2,1	LIMPIEZA RESANE Y PINTURA INTERIOR TRES MANOS M2 (INCLUYE FILOS Y ANDAMIOS)	20 días	$ 10.005.270	mié 13/03/24	lun 8/04/24	115	119CC;12
118	✓		2,2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. (INCLUYE ANTICORROSIVO Y LIMPIEZA CON GRATA Y LIJA O SIMILAR.CR)	11 días	$ 370.420	vie 8/03/24	mié 20/03/24	113	

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras
119	✓		2,3	LIMPIEZA DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO E IMPERMEABILIZACION EN SIKA TRANSPARENTE INCLUYE LINEALES	0 días	$ 0	mié 13/03/24	mié 13/03/24	117CC	
120	✓		**3**	**DEMOLICIONES**	**0 días**	$ 0	**lun 11/03/24**	**lun 11/03/24**		
121	✓		3,1	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H 0.04MM,INCLUYE TRACIEGO DE MATERIAL (SALON SEGUNDO PISO, BAÑOS 2DO PISO Y COCINA)	0 días	$ 0	lun 11/03/24	lun 11/03/24	114CC	
122	✓		**4**	**CUBIERTA**	**16 días**	$ 3.901.626	**lun 18/03/24**	**lun 8/04/24**		
123	✓		4,1	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIPEX PLACA, INCLUYE LIMPIEZA ANTES DE LA IMPRIMACION	16 días	$ 3.901.626	lun 18/03/24	lun 8/04/24	113CC+8 días	125CF
124	✓		**5**	**PISOS**	**0 días**	$ 0	**lun 18/03/24**	**lun 18/03/24**		
125	✓		5,1	AFINADO DE MORTERO ENDURECIDO 1:3 H=4	0 días	$ 0	lun 18/03/24	lun 18/03/24	123CF	
126	✓		**6**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**2 días**	$ 0	**mié 13/03/24**	**jue 14/03/24**		
127	✓		6,1	SALIDA LAMPARA EMT COMPLETA CON APARATO (INCLUYE CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12 THHN Y TUBERIA EMT 3/4 HSTA 4 MTS CAJA, CONECTORES, ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION)	0 días	$ 0	mié 13/03/24	mié 13/03/24	129	128CC+2 días
128	✓		6,2	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA LED HERMETICA 2X 32W	0 días	$ 0	jue 14/03/24	jue 14/03/24	127CC+2 días	131FF+1 día


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesc	Sucesoras
129	✓		6,3	REVISION ELECTRICA, (INCLUYE , ESTUDIO DE CARGAS,REGATEO TOMACORRINTES E INTERRUPTORES)	0 días	$ 0	mié 13/03/24	mié 13/03/24	117CC	127
130	✓		**7**	**ASEO Y LIMPIEZA**	**6 días**	$ 1.132.703	**sáb 9/03/24**	**vie 15/03/24**		
131	✓		7,1	ASEO GENERAL (LIMPIEZA PARA ENTREGA, ASEO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS) VIRDIOS PISOS MUROS FACHADA ANDENES	6 días	$ 1.132.703	sáb 9/03/24	vie 15/03/24	128FF+1 día	


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

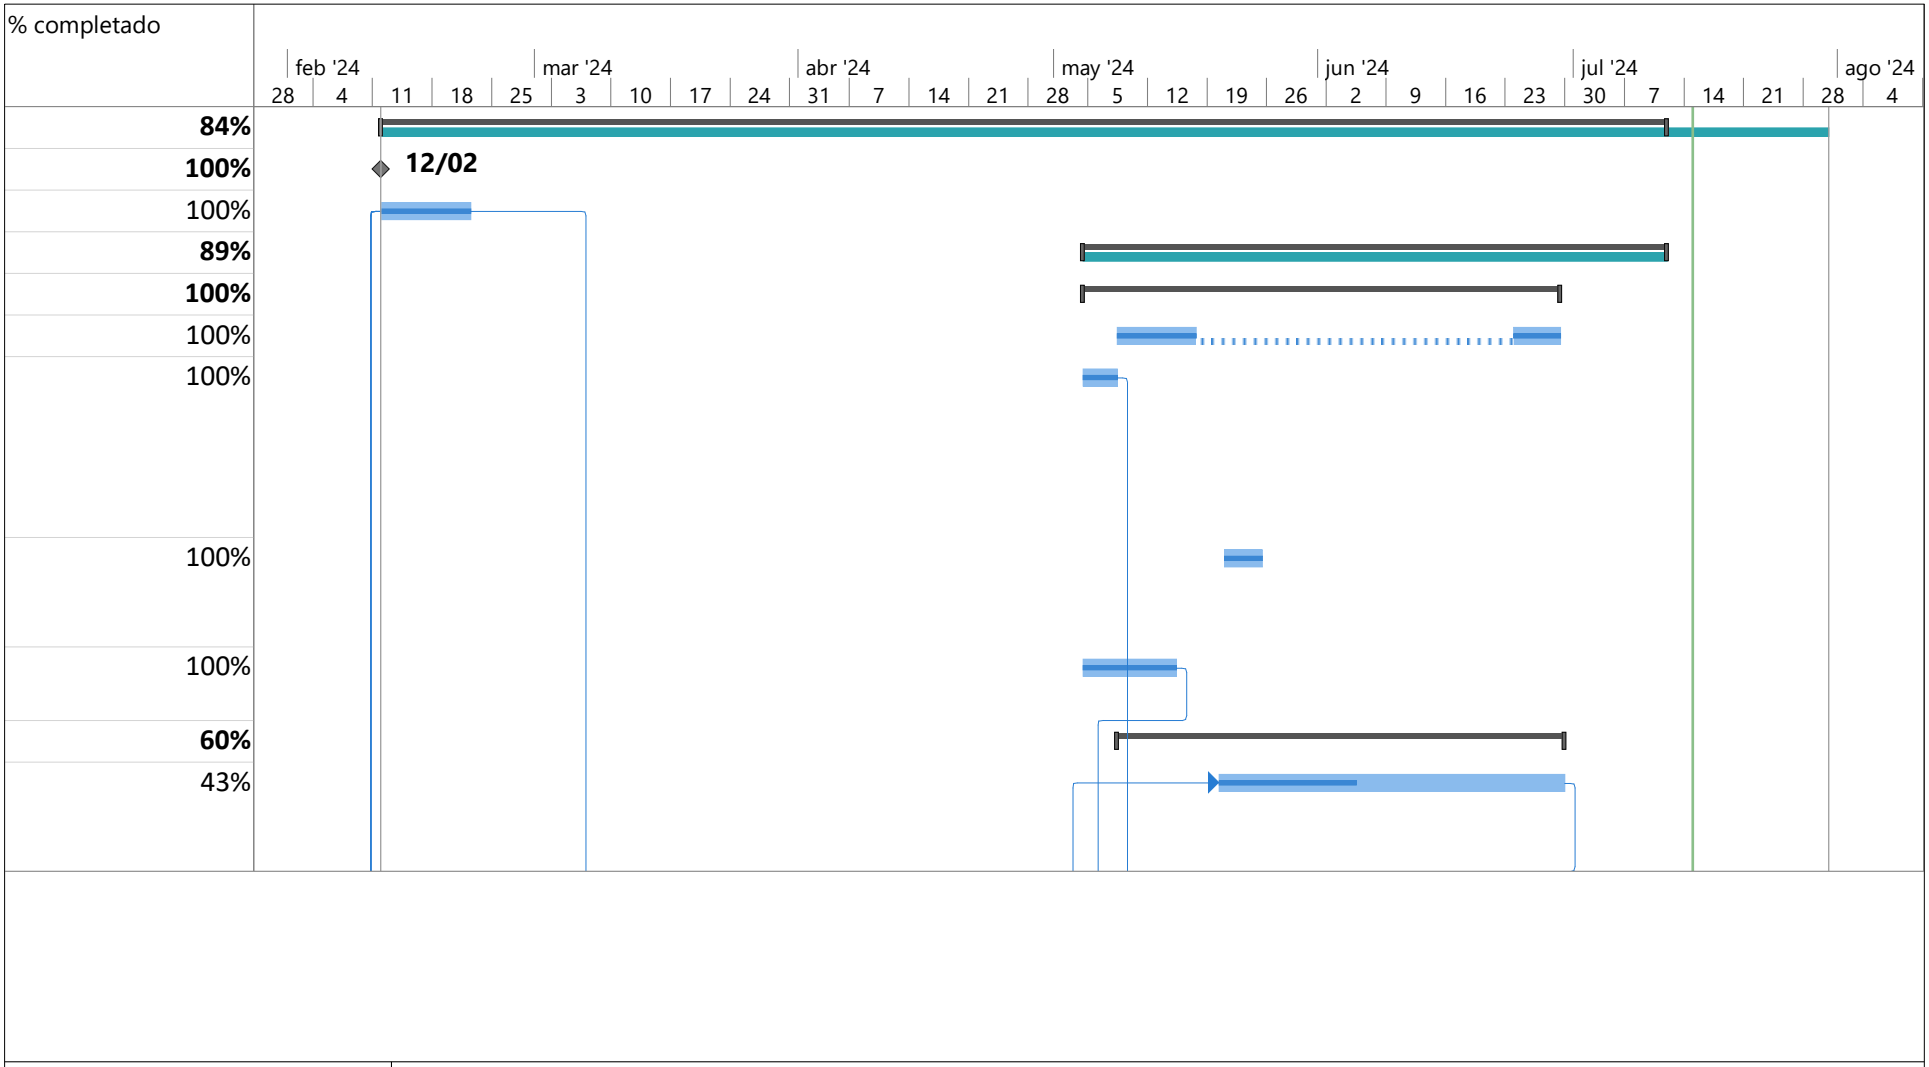


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

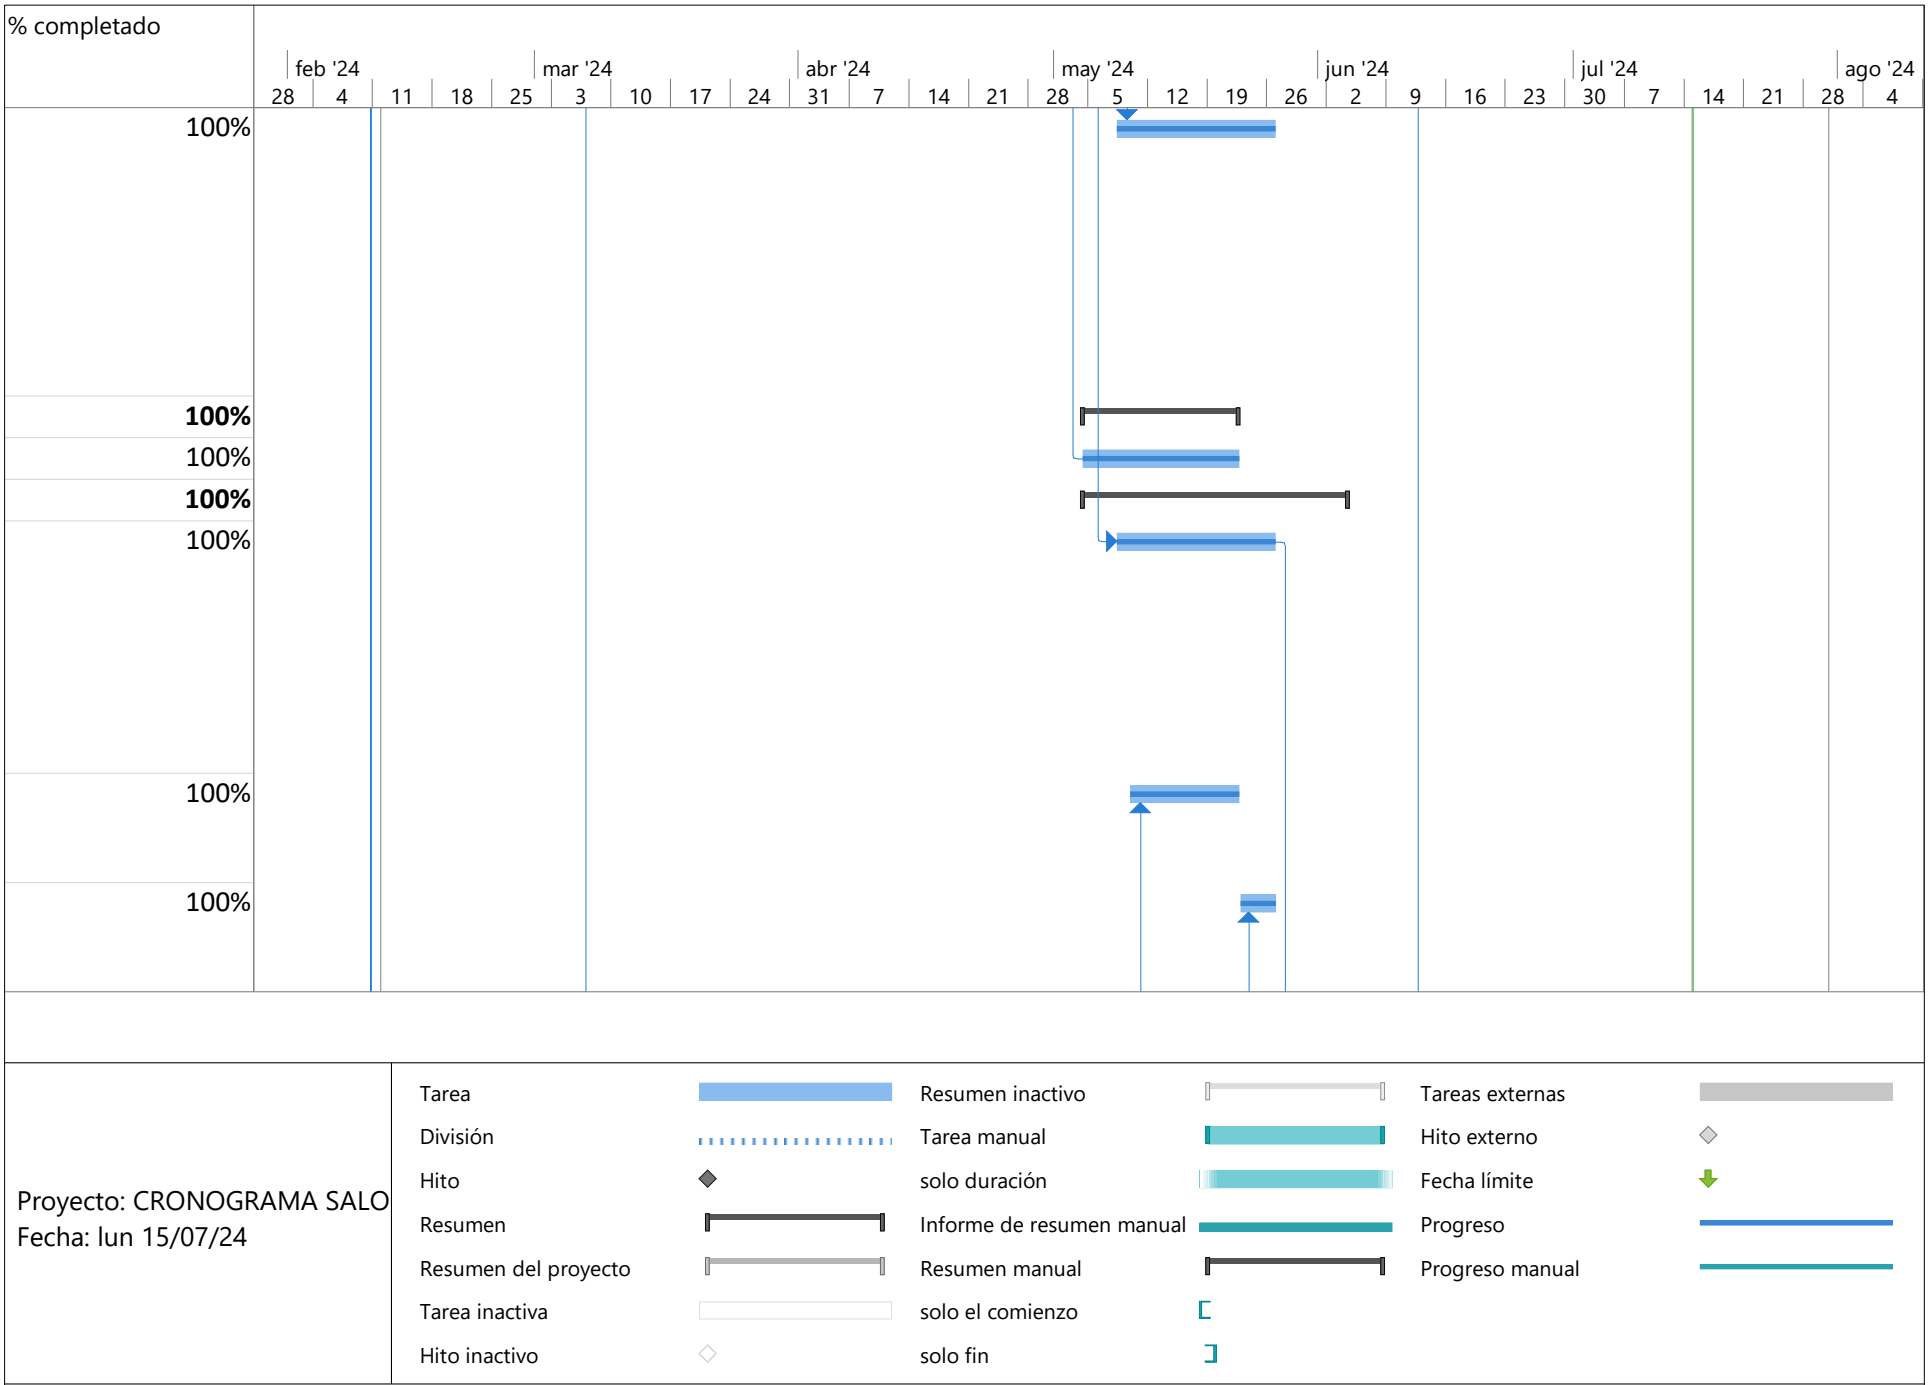


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

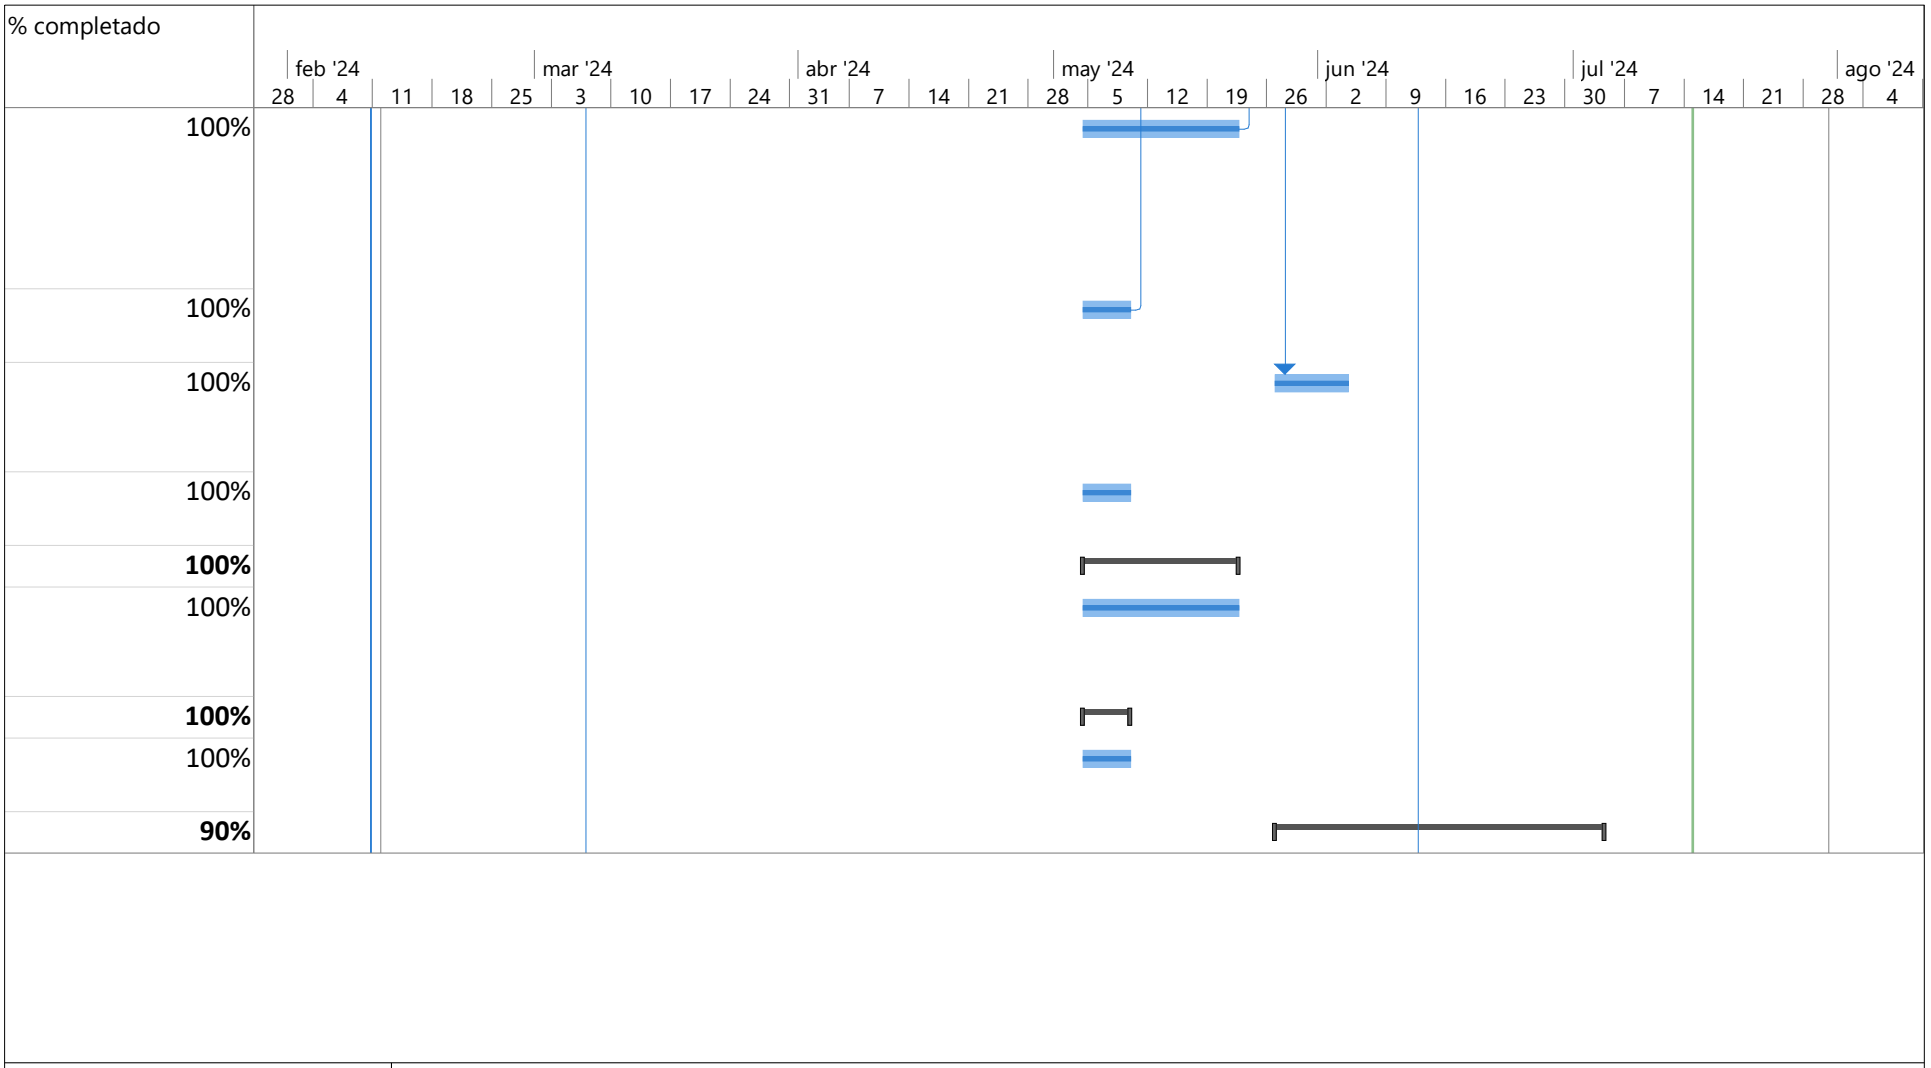

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

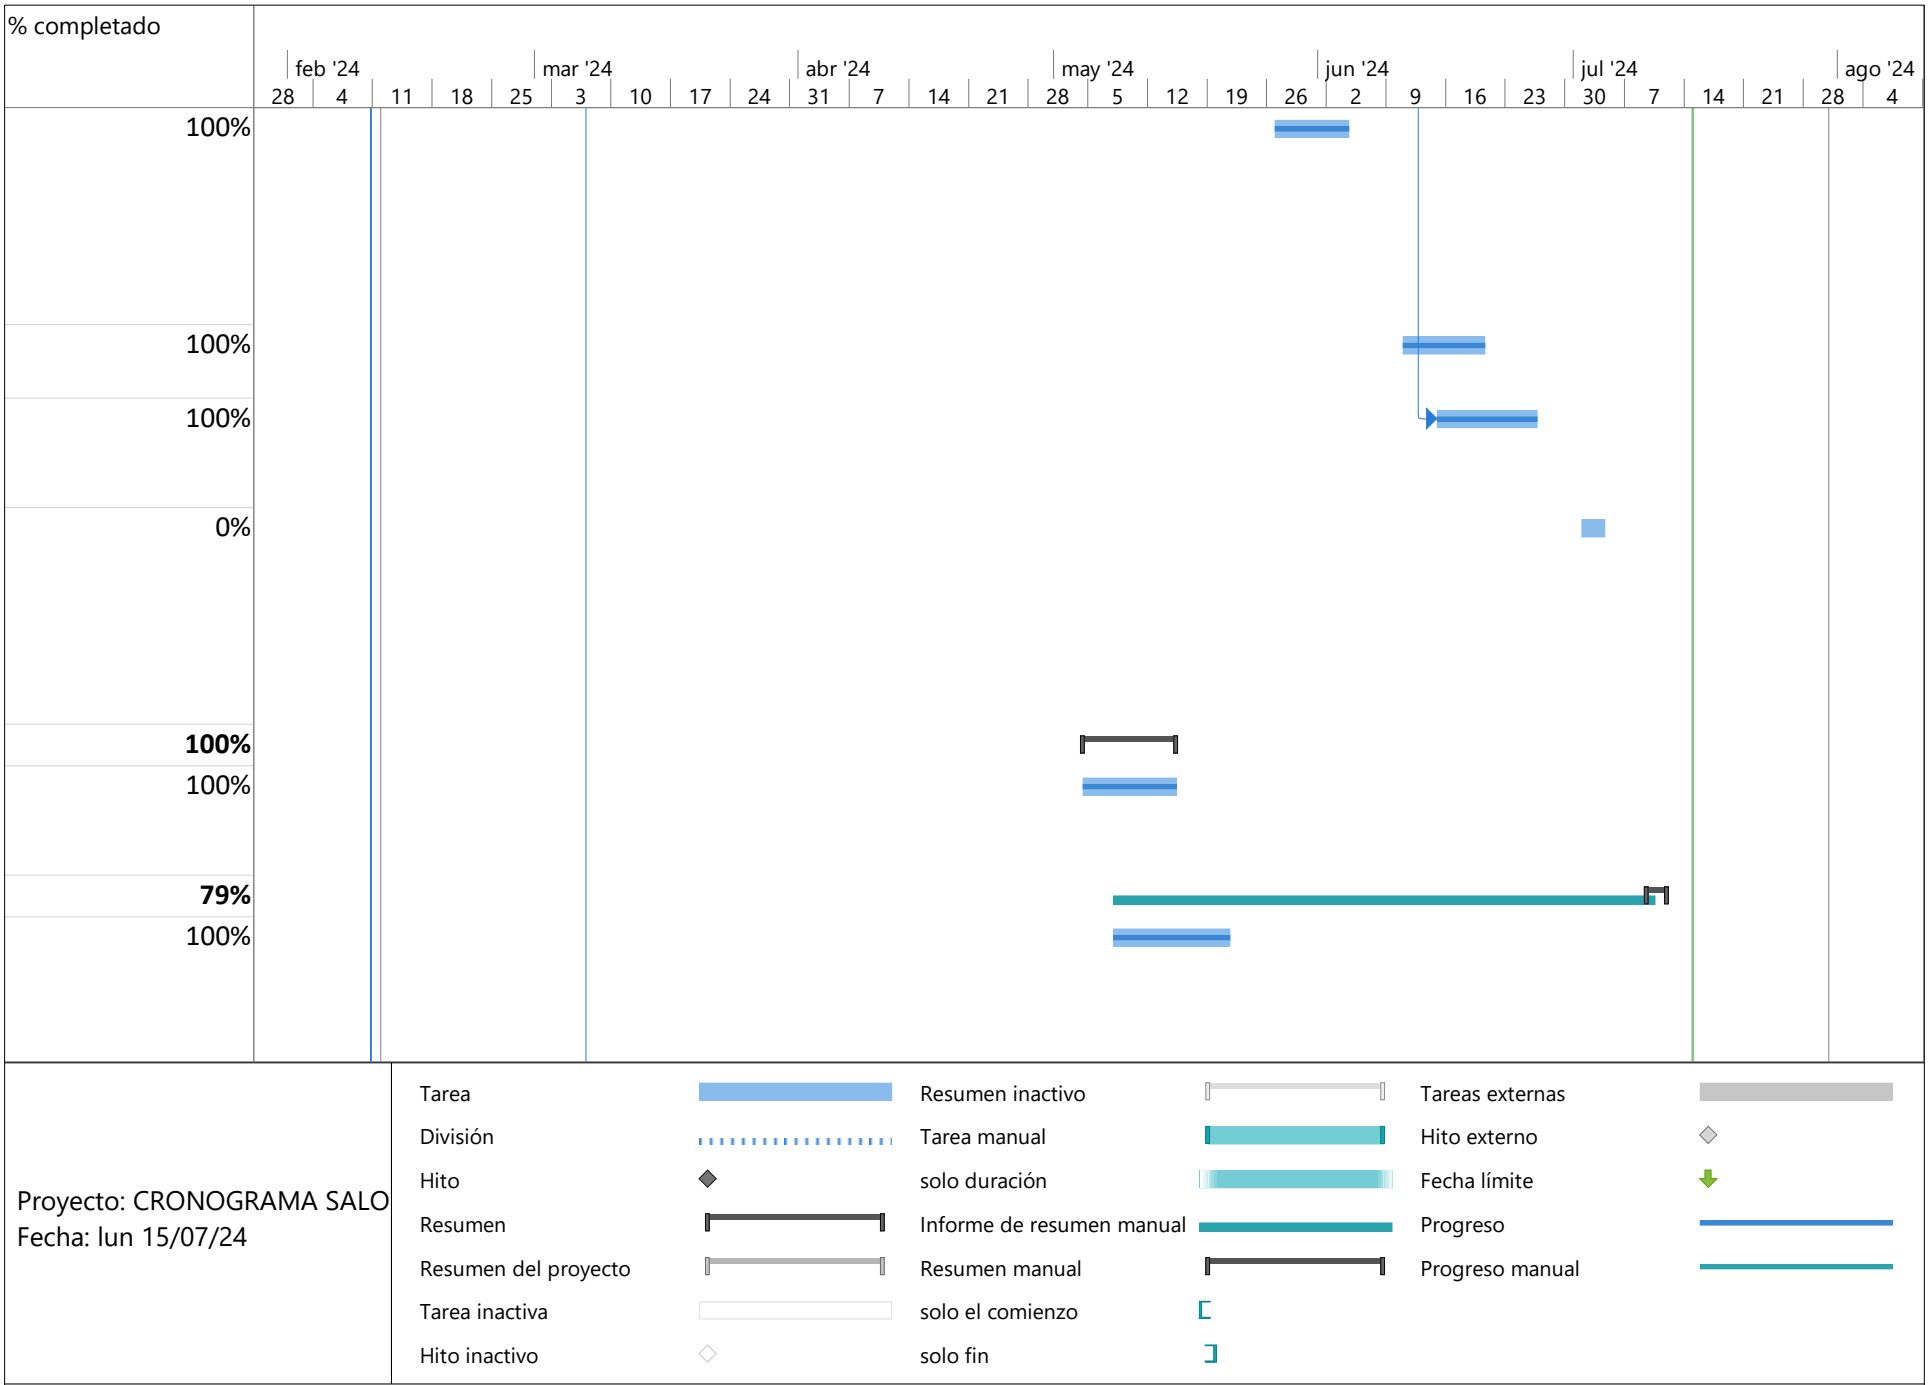
% completado
feb '24
mar '24
abr '24
may '24
jun '24
jul '24
ago '24
28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4
100%
100%
100%
0%
100%
100%
79%
100%
Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

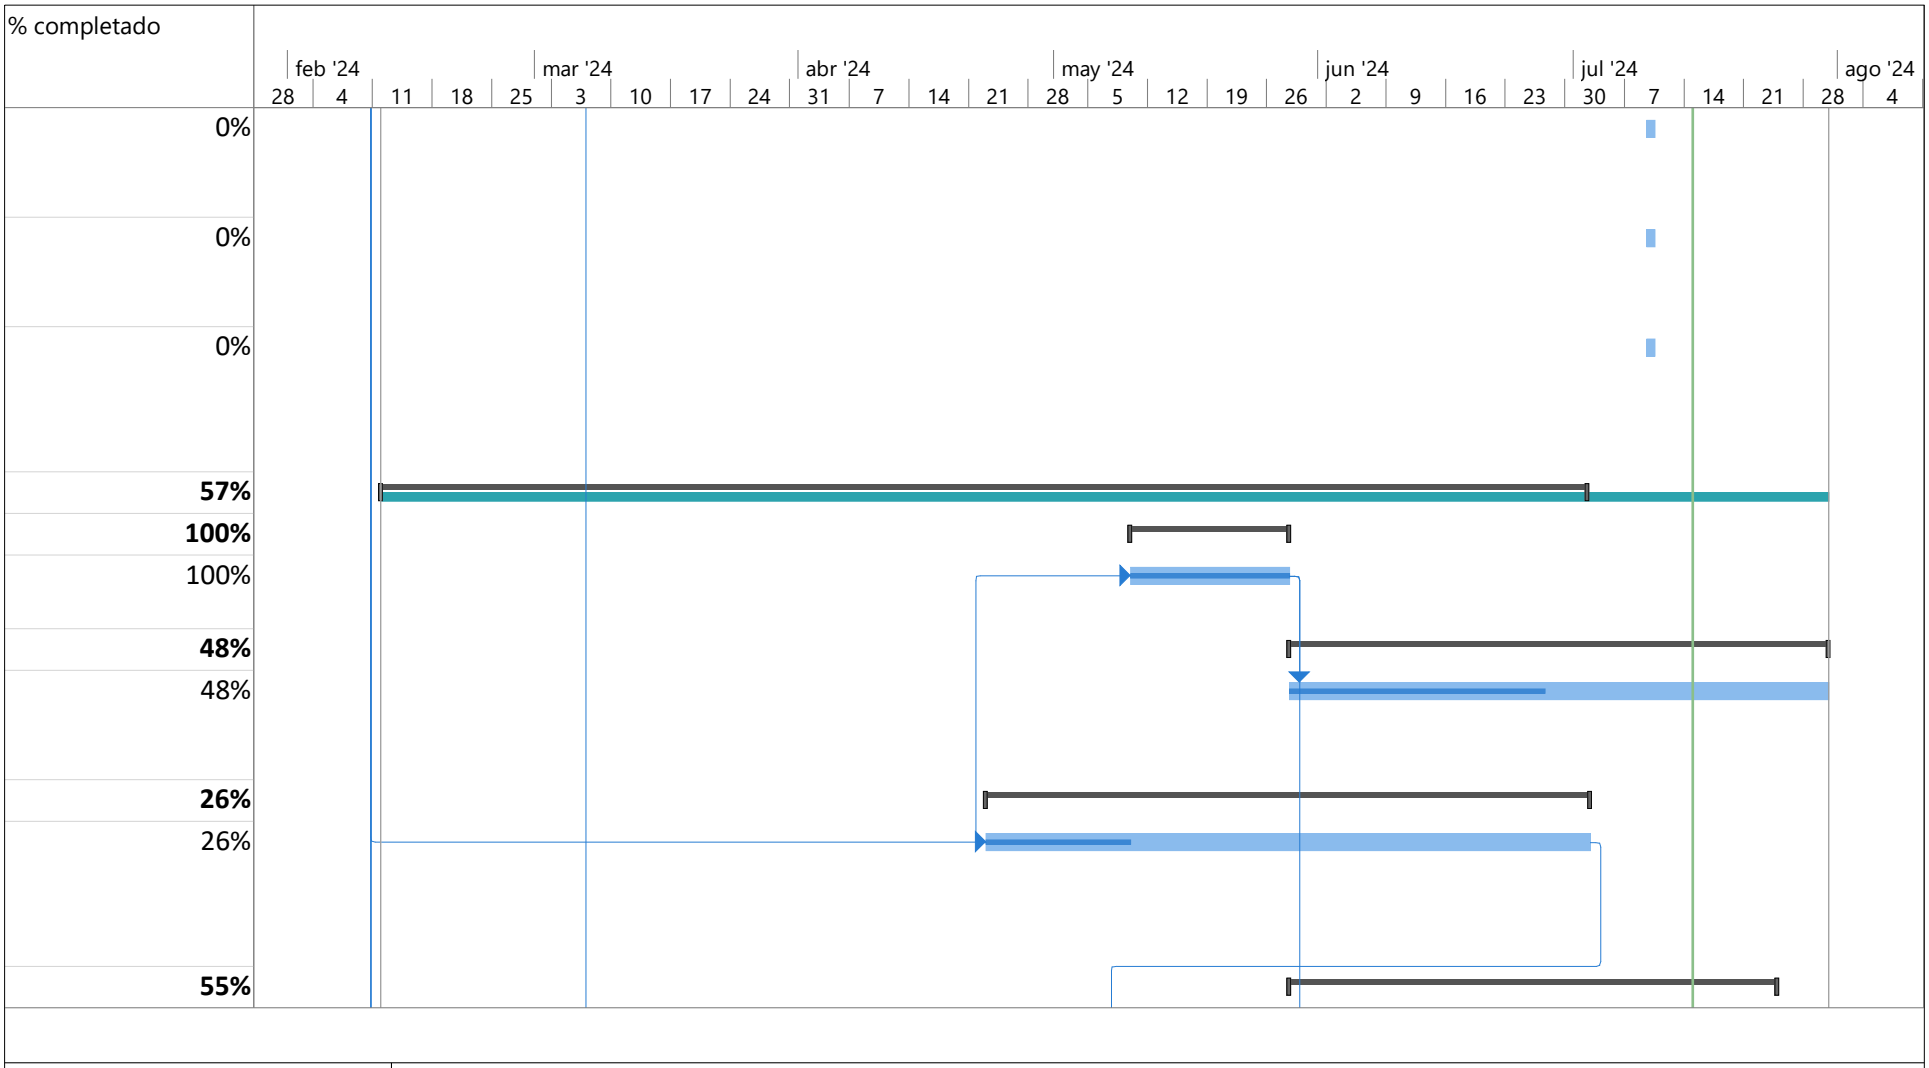


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

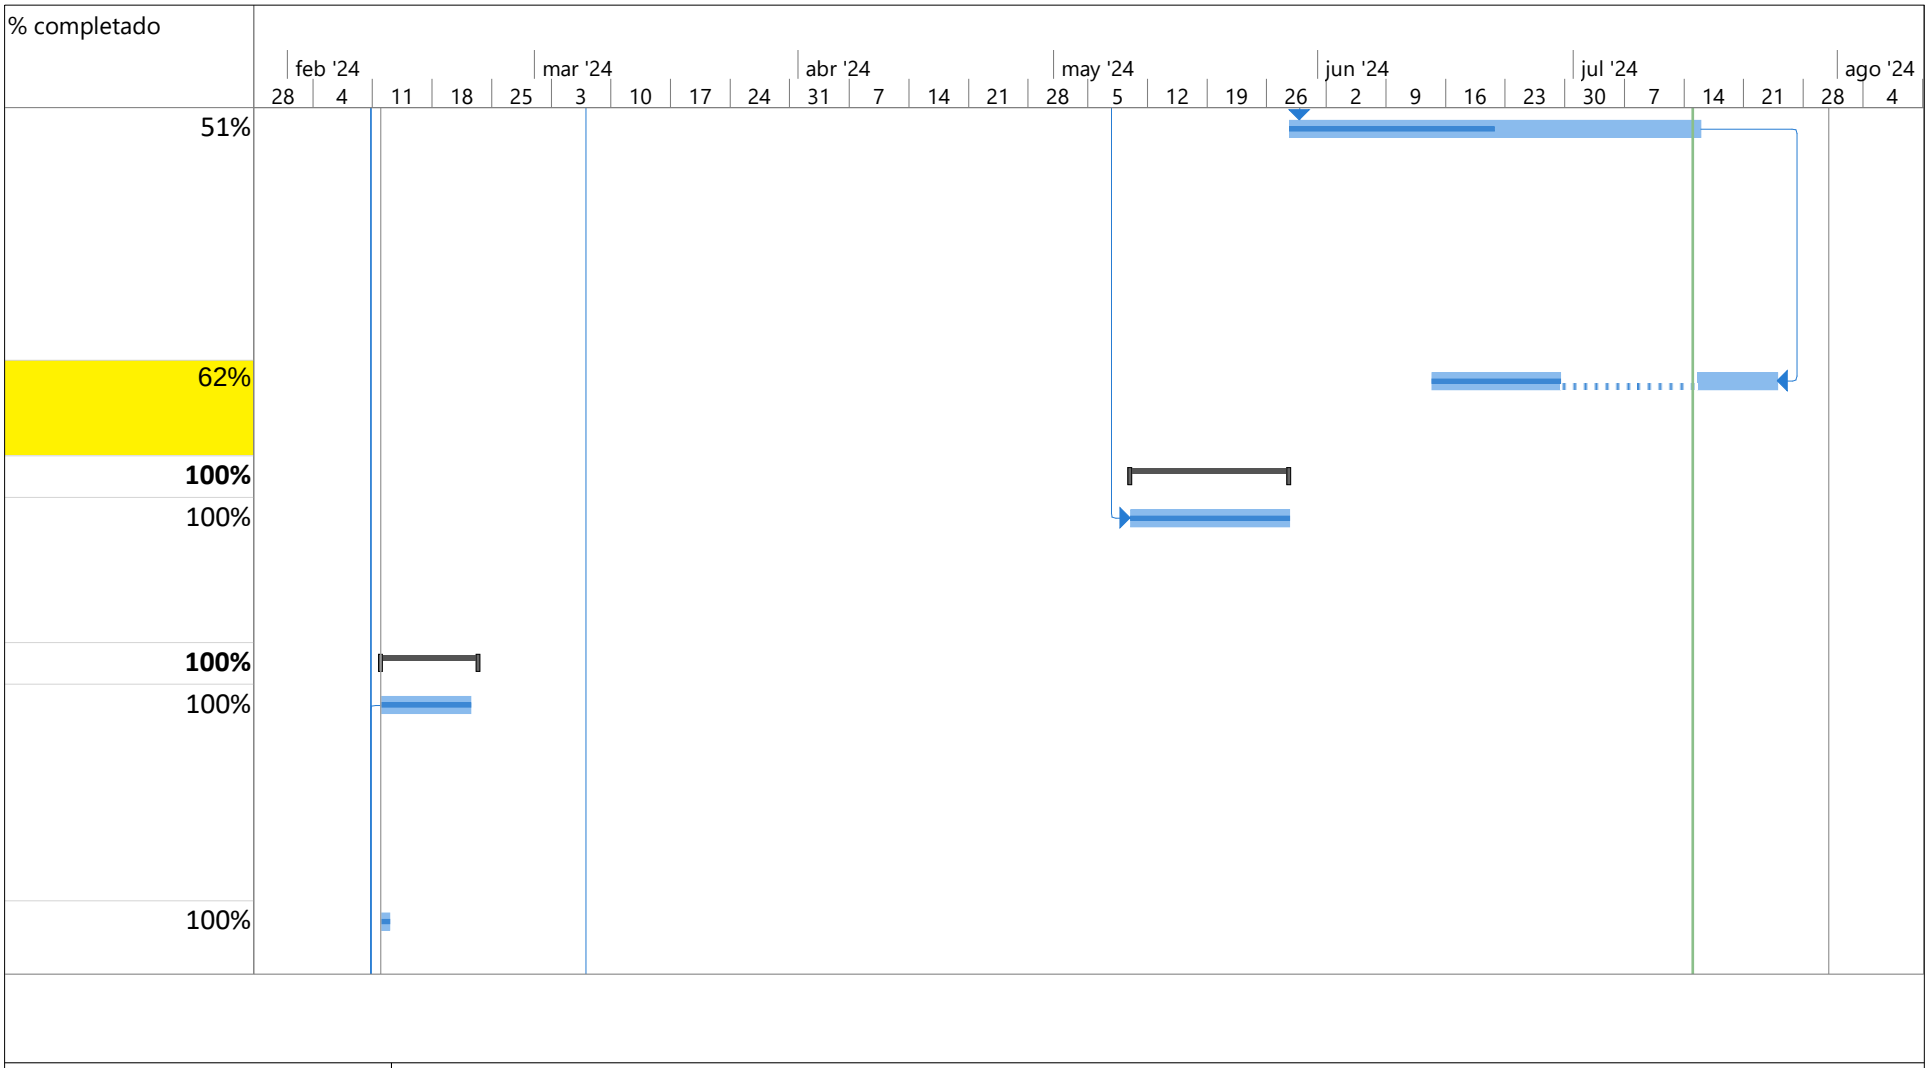


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

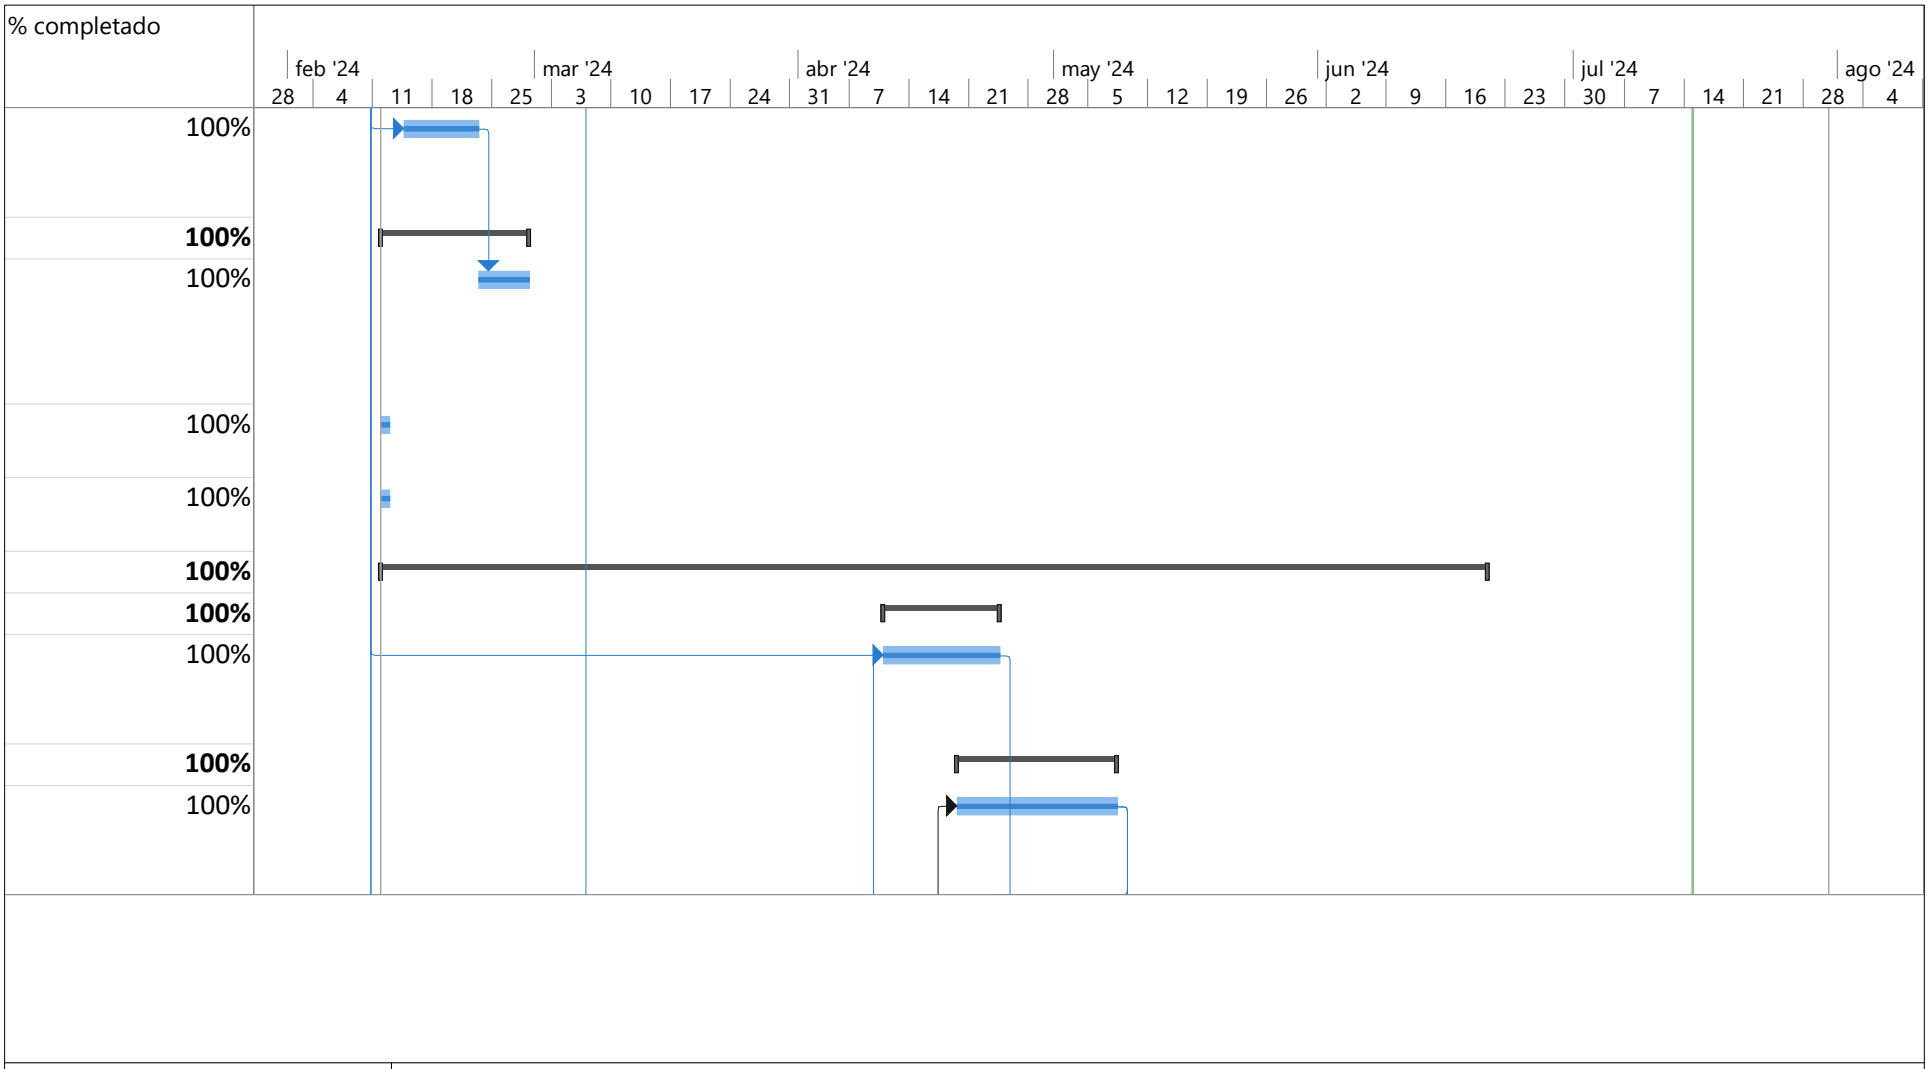


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

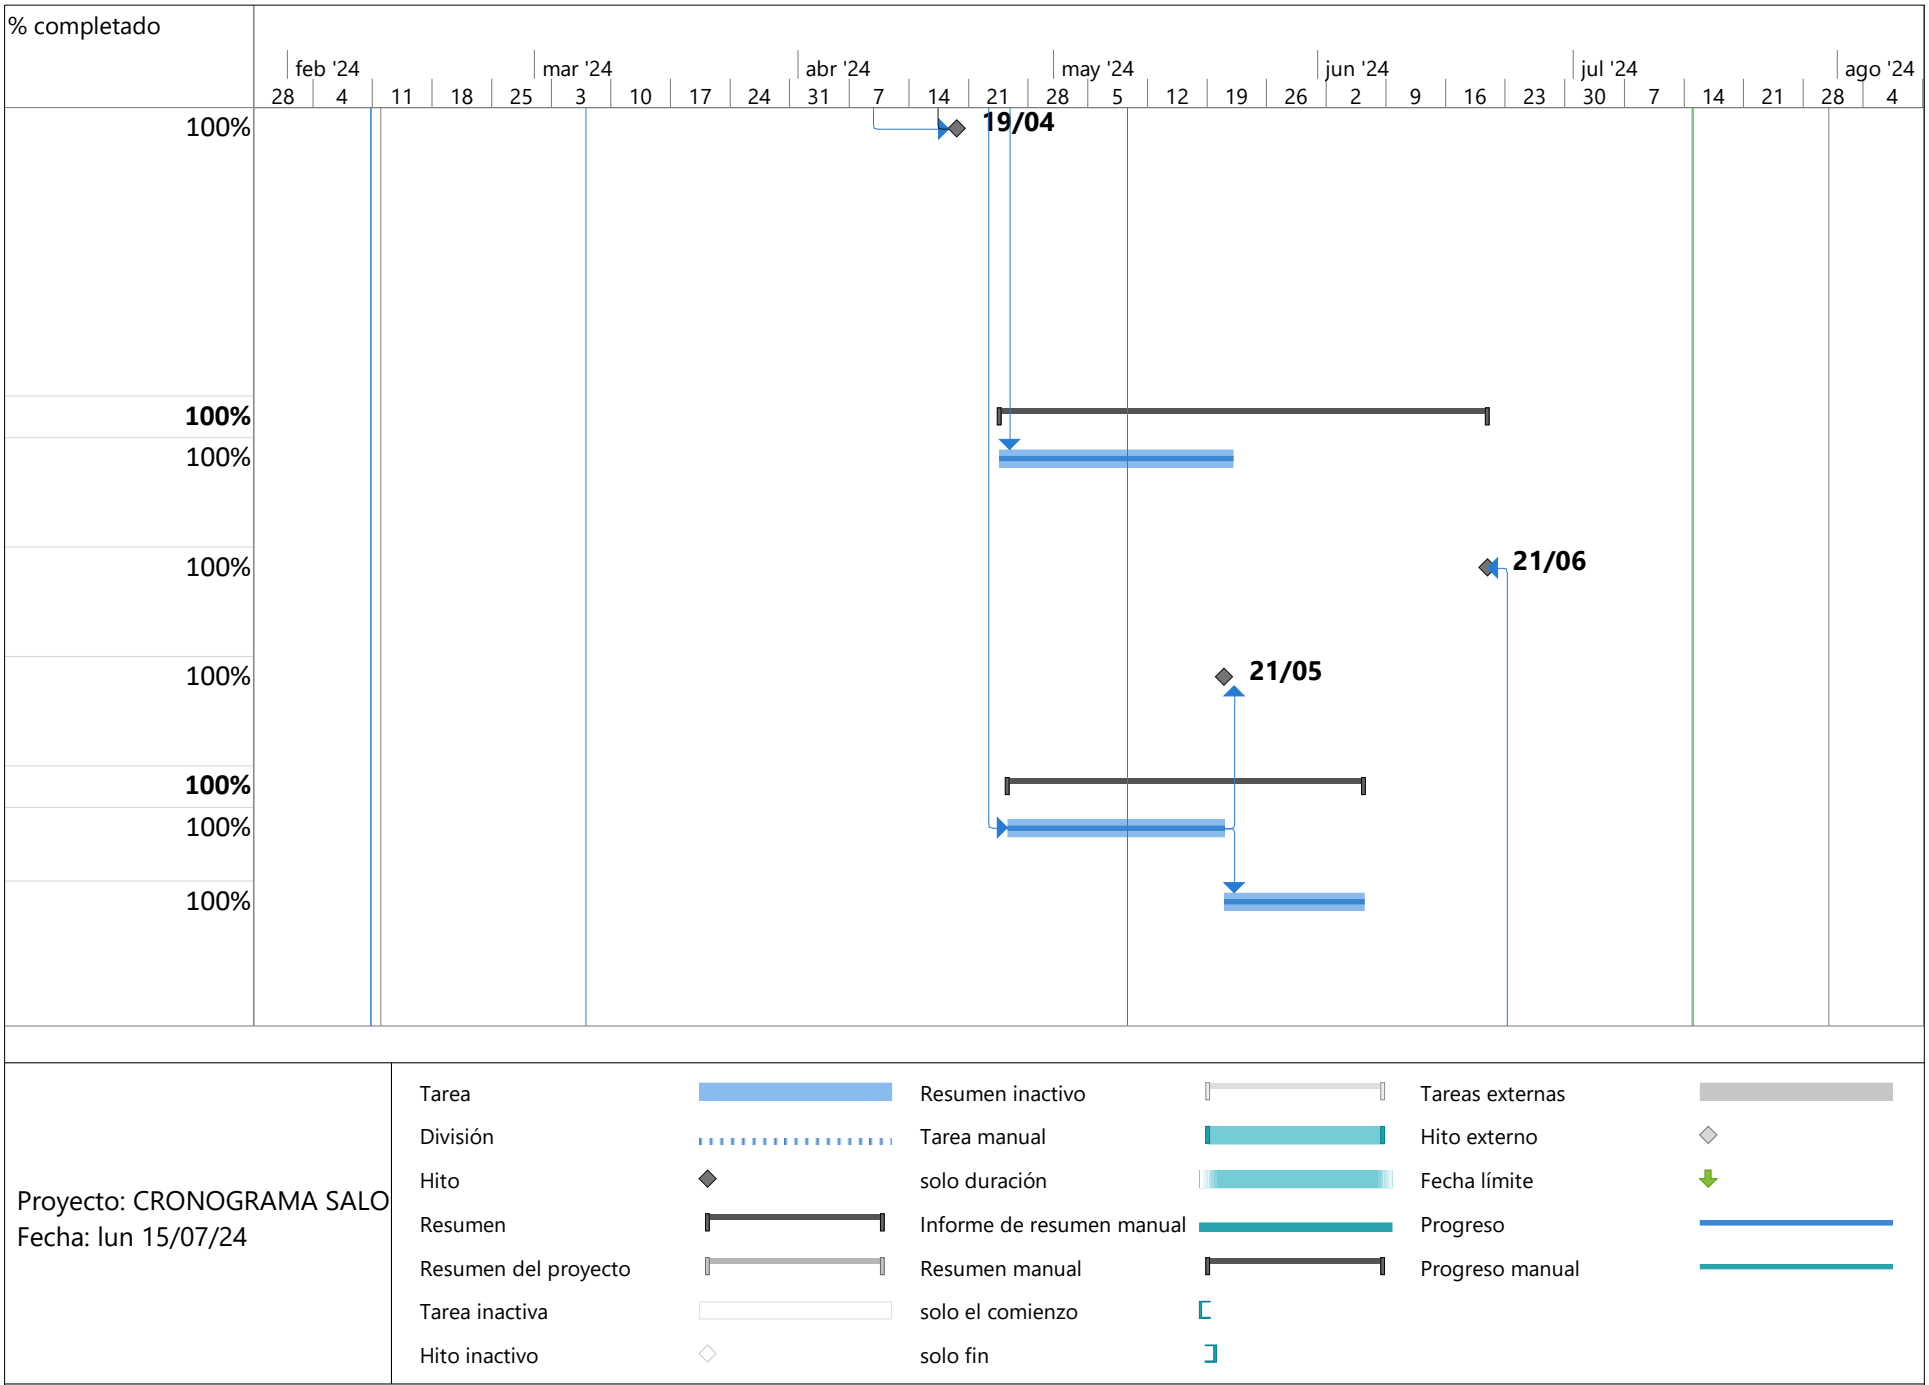


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

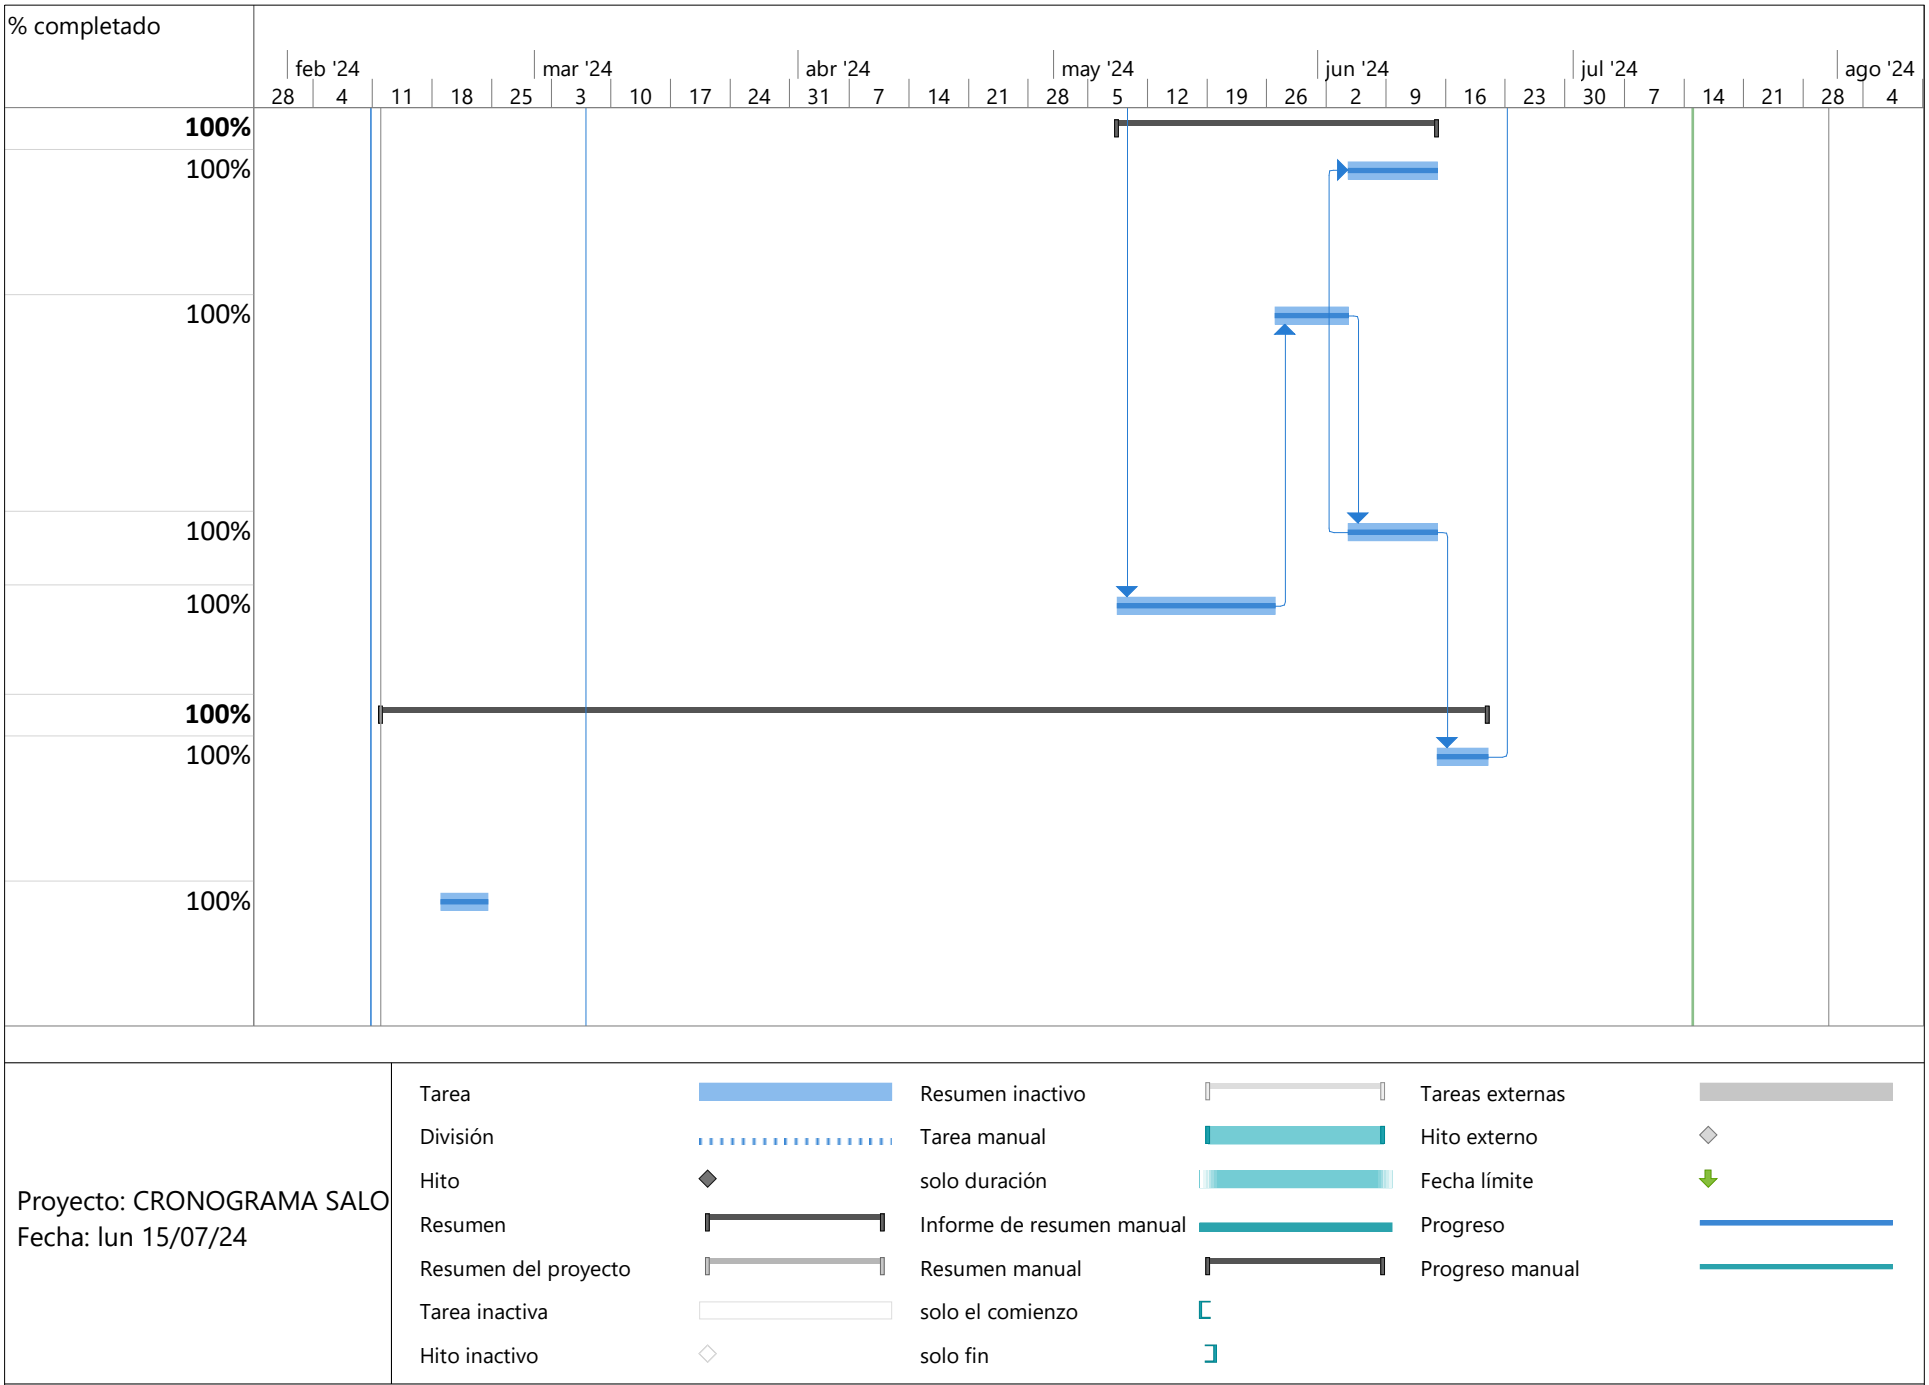


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

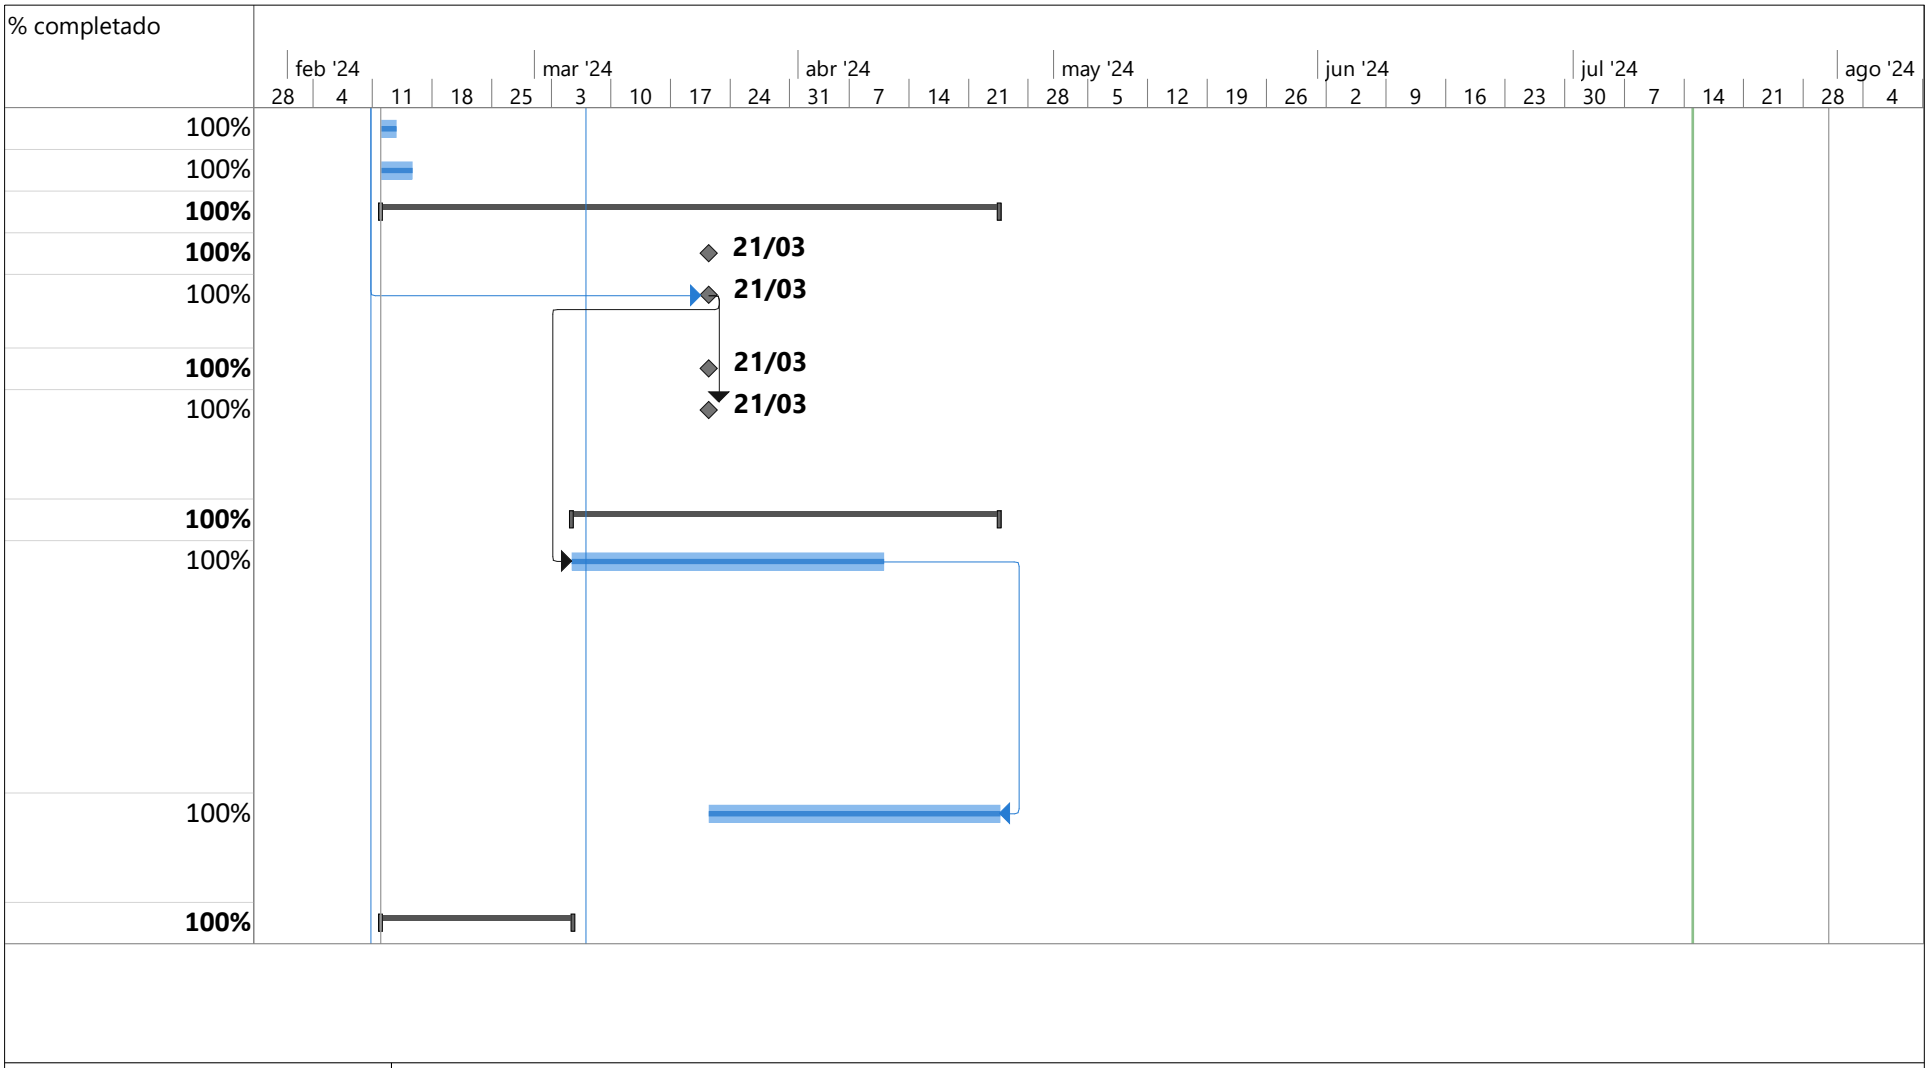


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

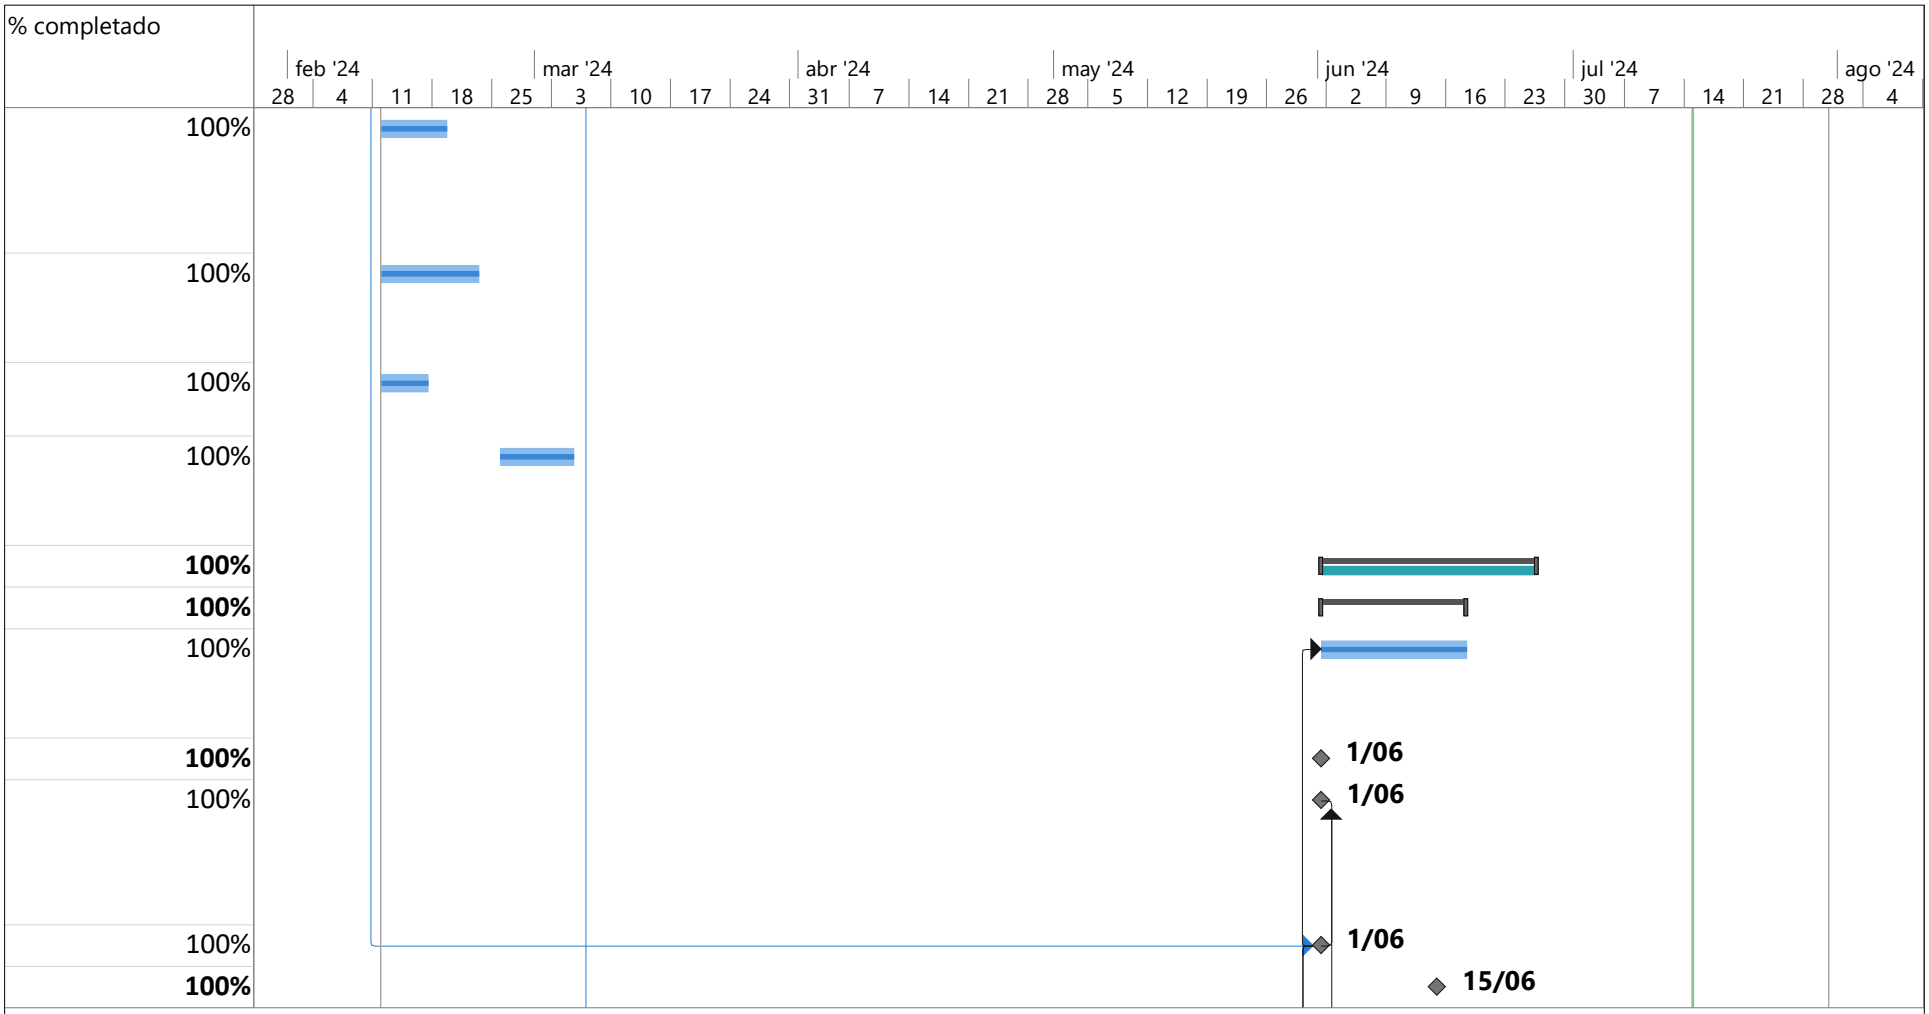


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

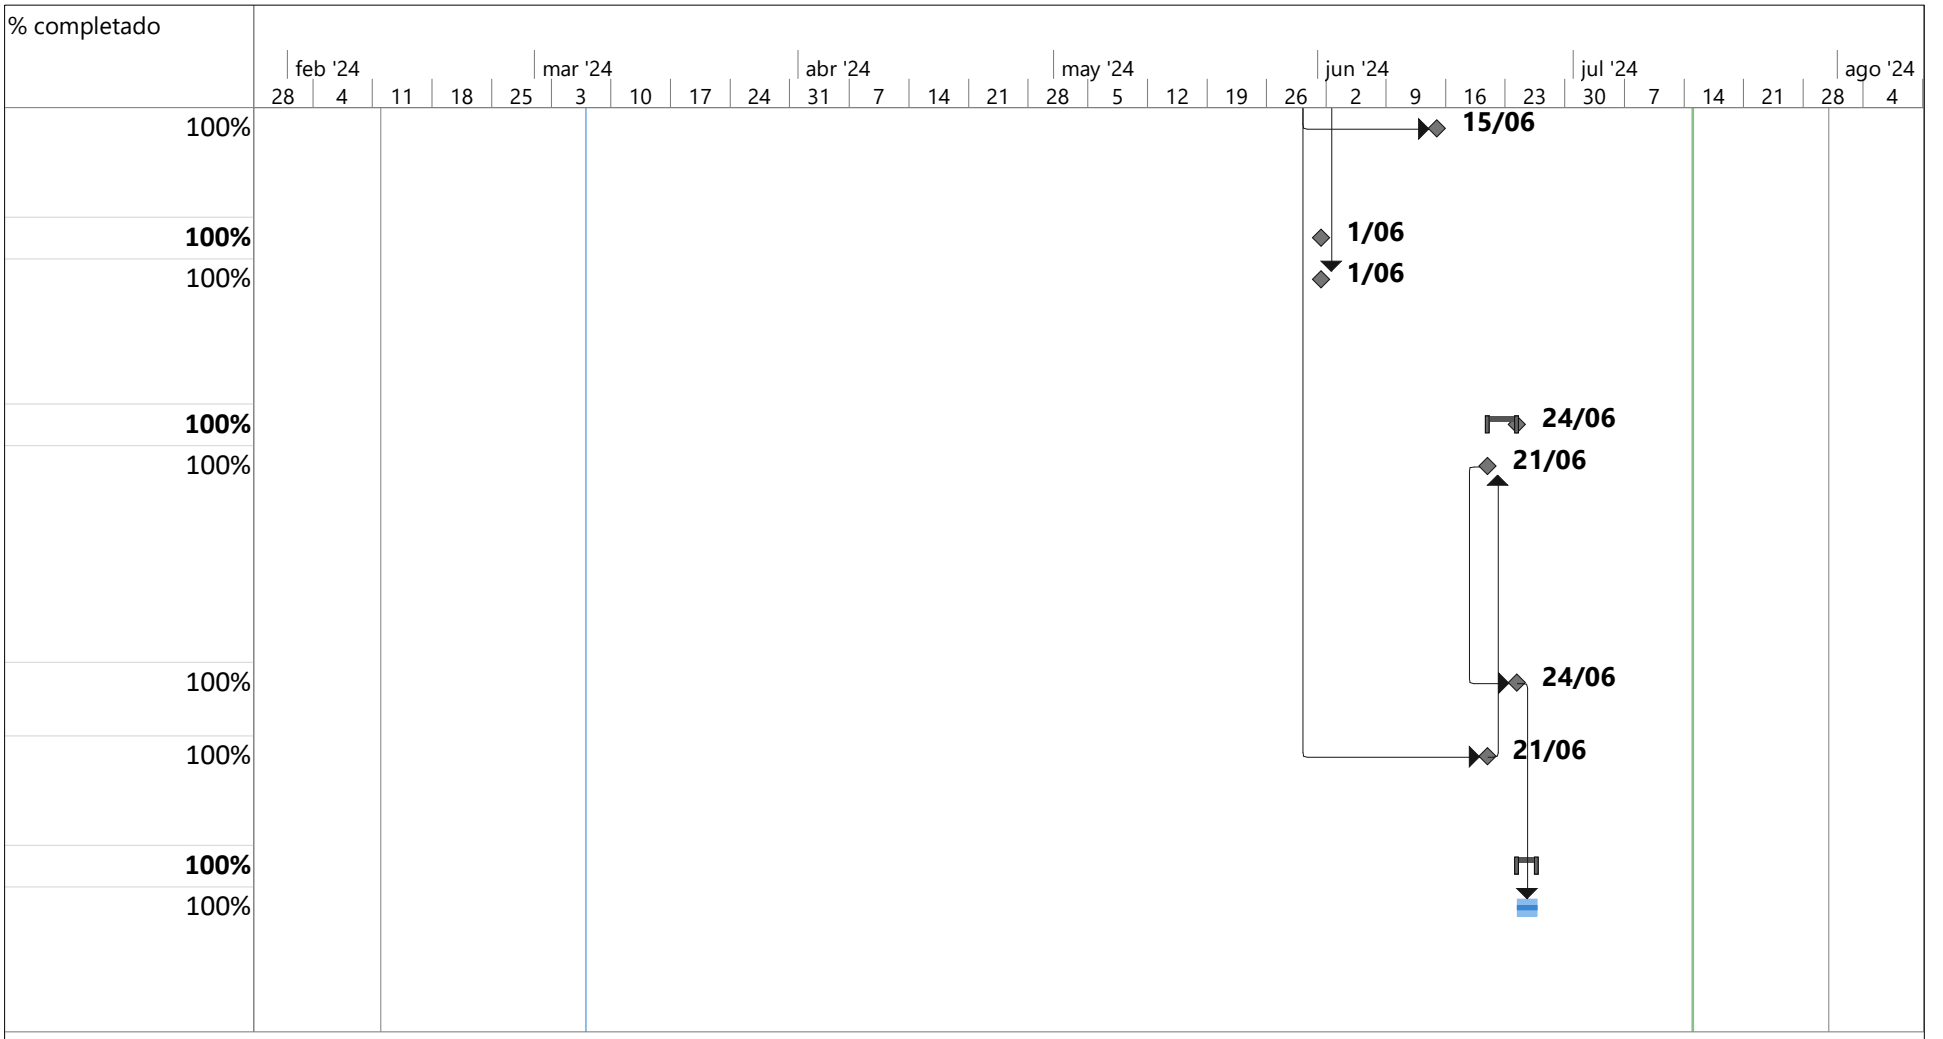


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

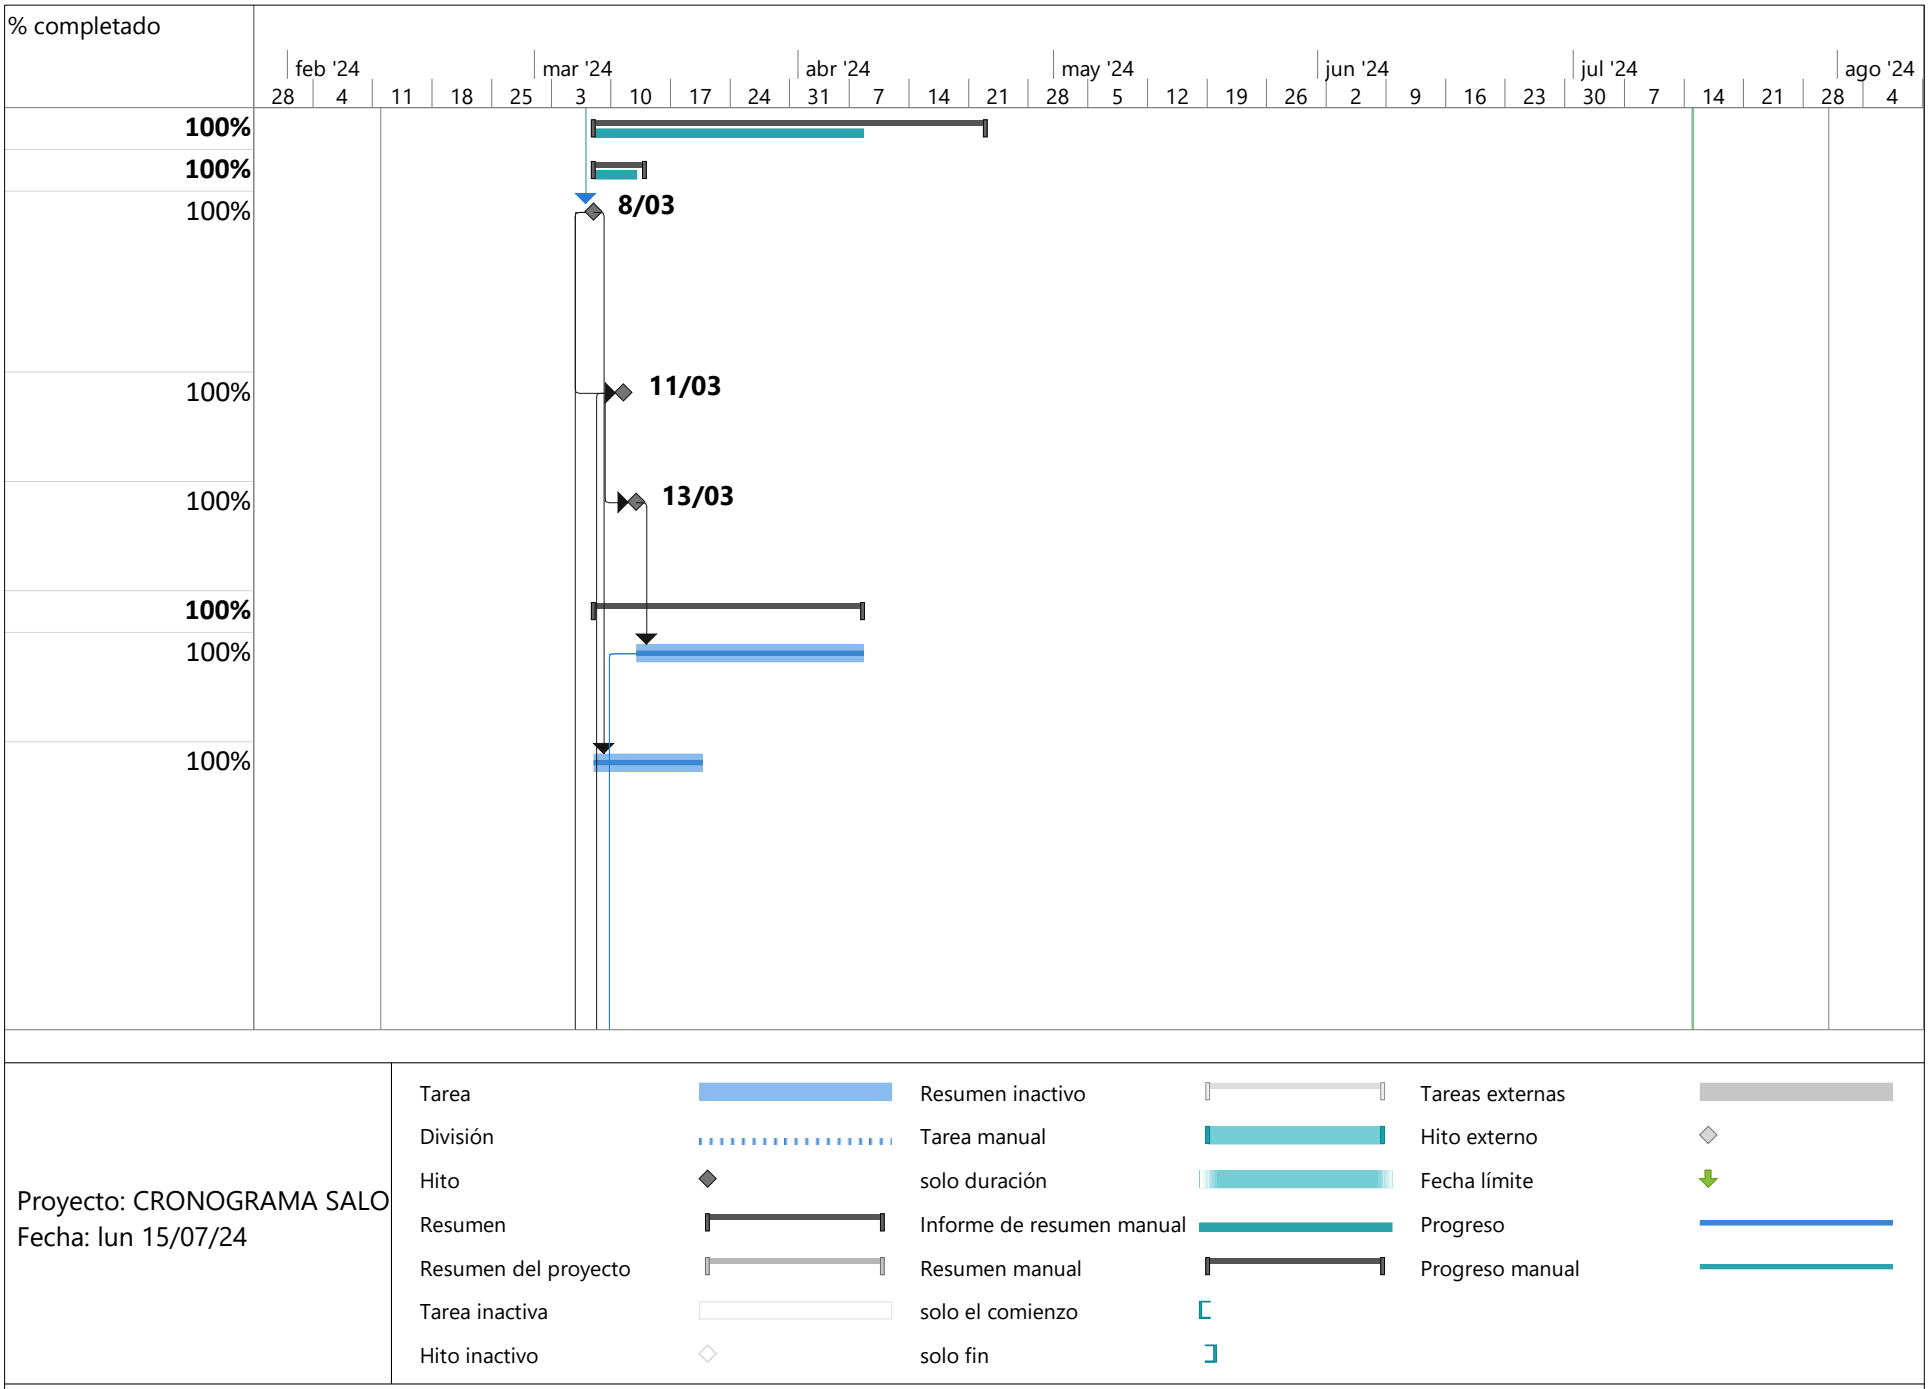


Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

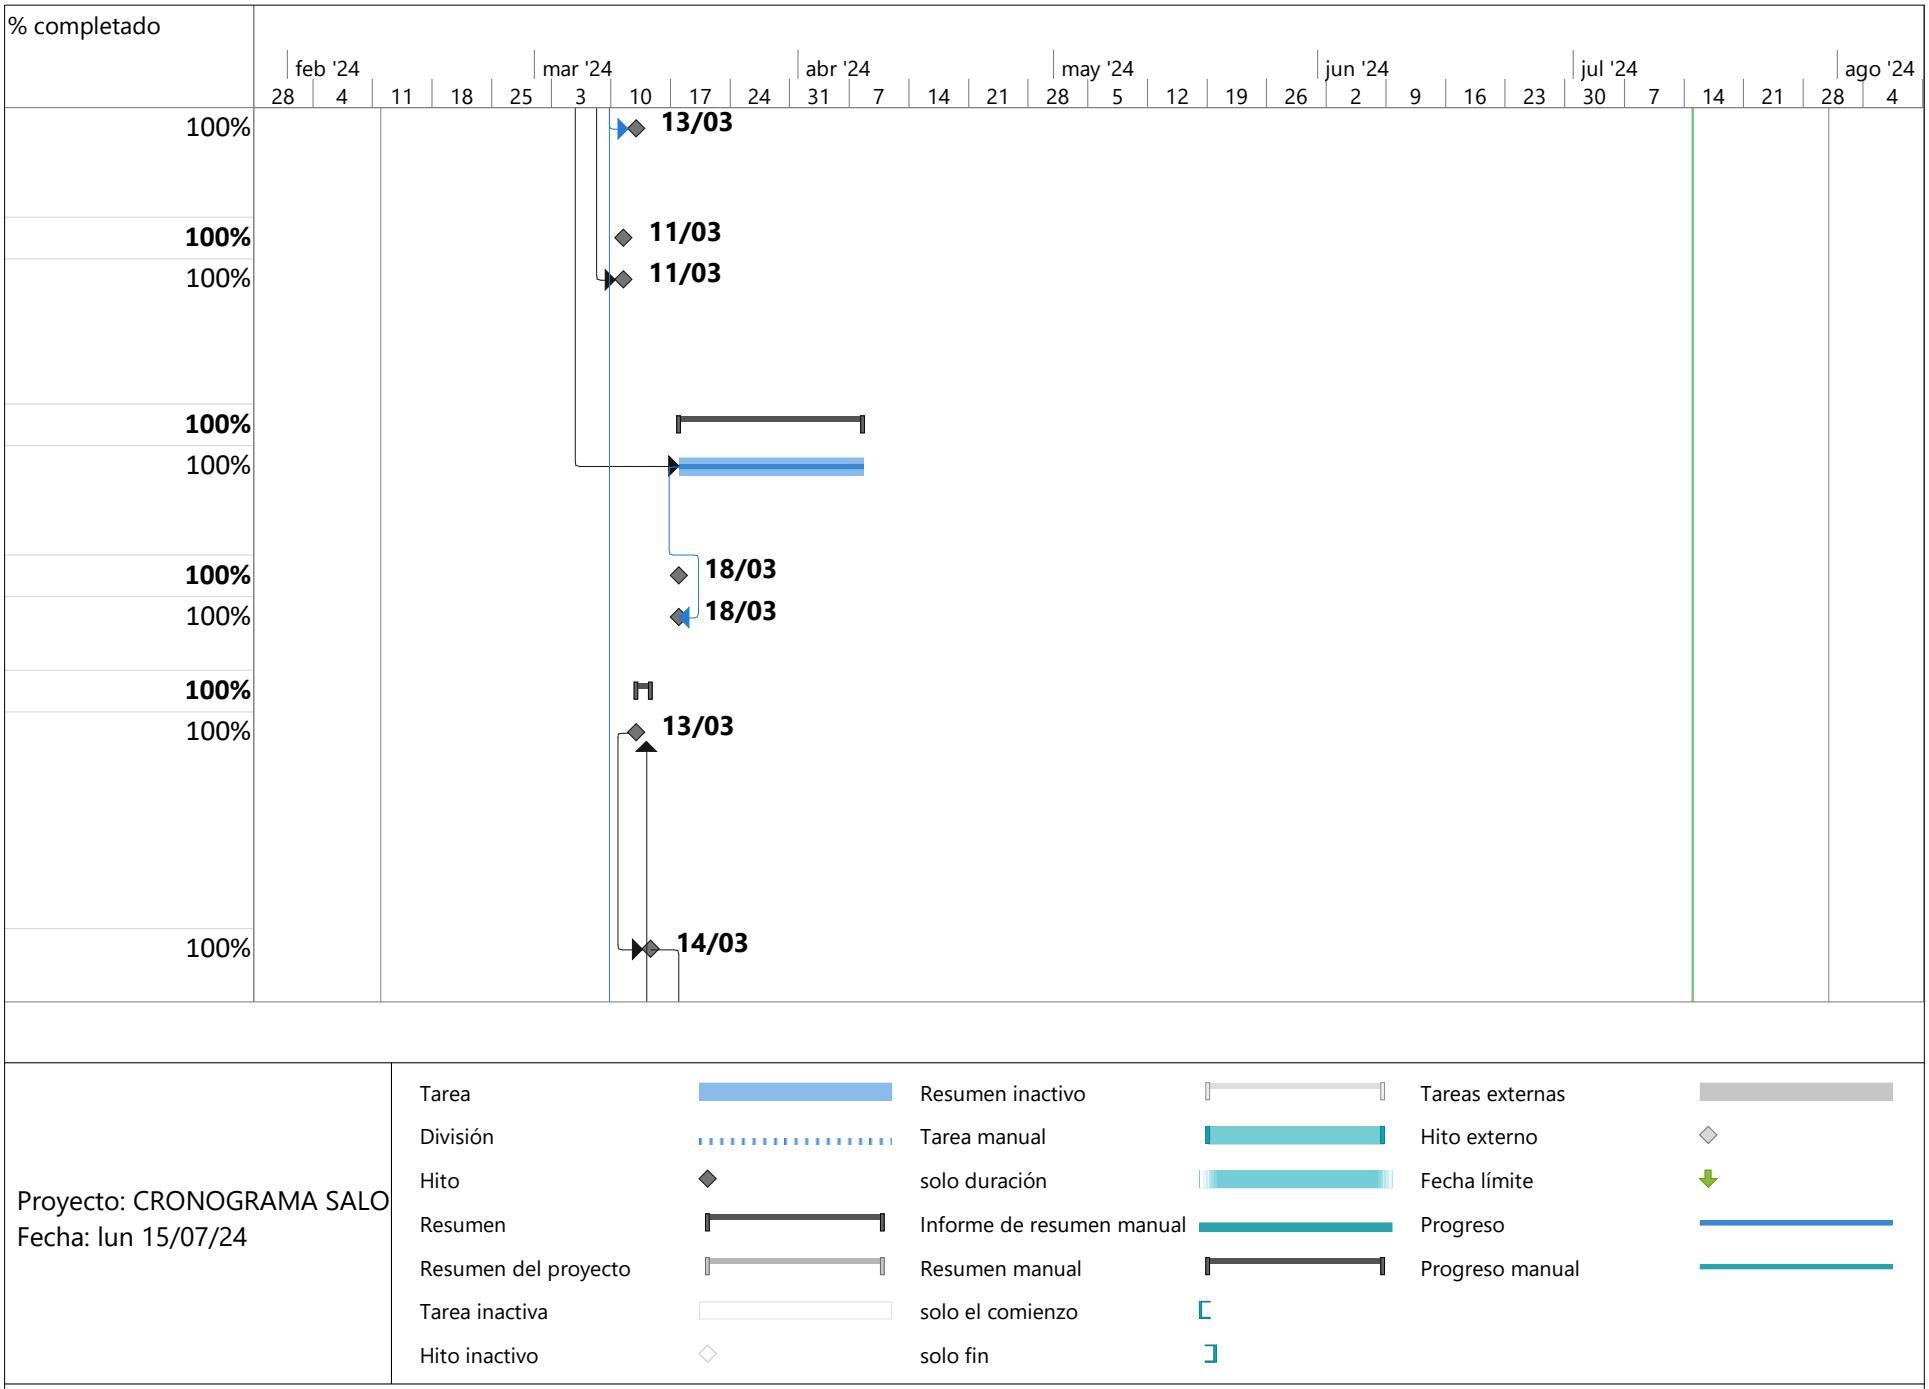

Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

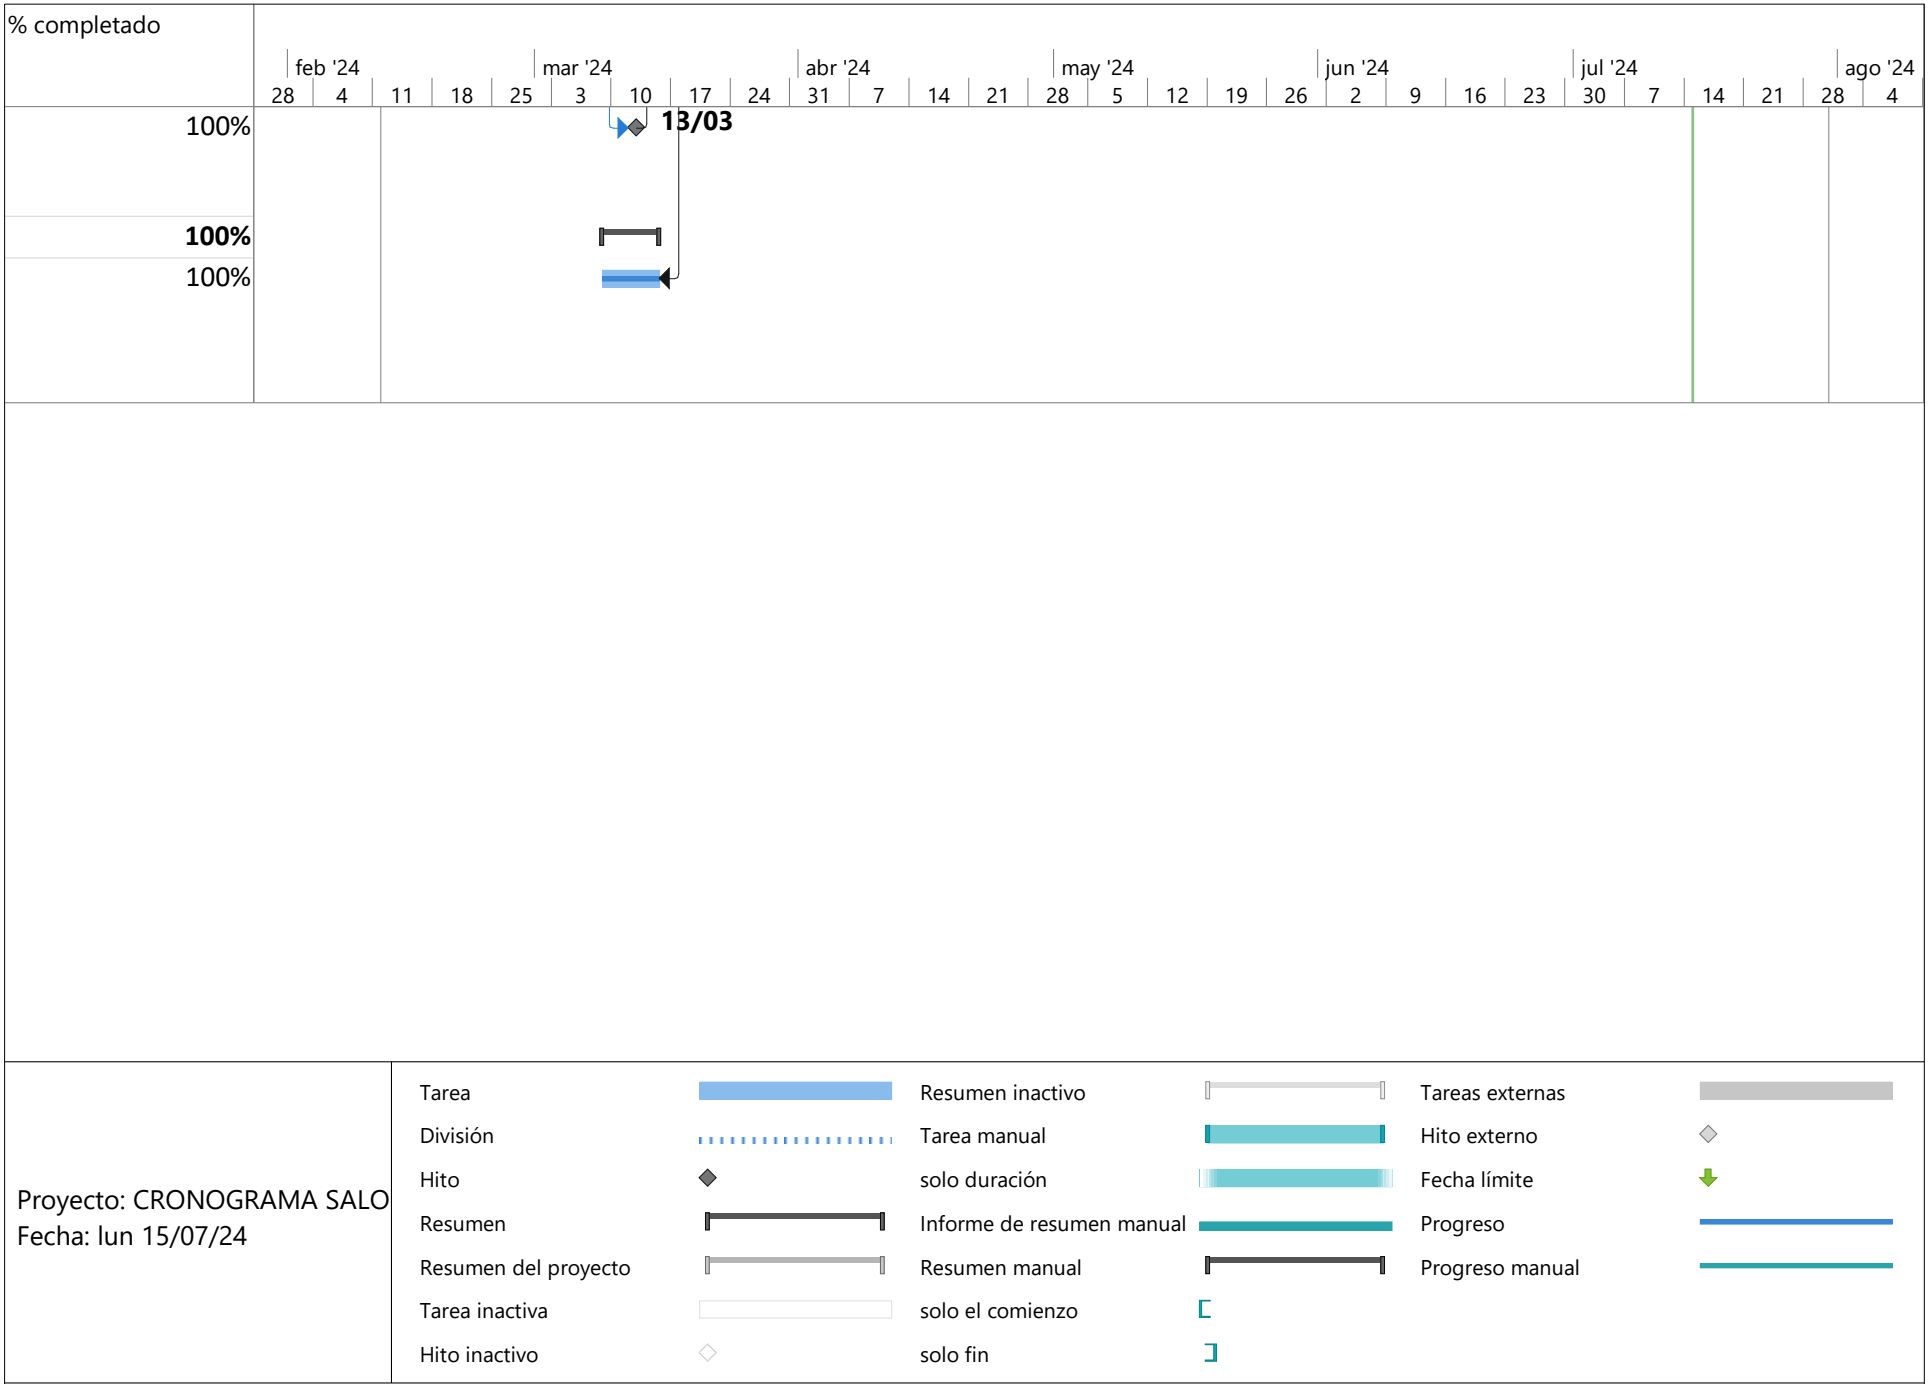
% completado
feb '24
mar '24
abr '24
may '24
jun '24
jul '24
ago '24
28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4
100%
13/03
100%
100%
Proyecto: CRONOGRAMA SALO
Fecha: lun 15/07/24
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
