ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES MENSUAL DE OBRA

JUNIO DE 2024


DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAGÓN GTD

INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES MENSUAL DE OBRA No. 05

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	Contrato: 382-2023
	Tipo de contrato: obra
CONSORCIO ARAGÓN GTD	Fecha: 01 al 30 de junio de 2024
INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES MENSUAL DE OBRA N°5 MES DE JUNIO DE 2024	

APROBACIÓN DE DOCUMENTO CONTRATISTA DE OBRA		
DIRECTOR DE OBRA	GINA MARCELA ROJAS	
RESIDENTE DE OBRA	HUGO ANDRES ROJAS	
INSPECTOR DE OBRA	EDISON ANTONIO ROJAS TORO	



APROBACIÓN DE DOCUMENTO INTERVENTORIA		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FABIAN RADA SEGURA	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARLOS MARQUEZ FEDUYO	
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JOSÉ PAEZ PAYARES	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 4
2. ANTECEDENTES 5
3. GENERALIDADES 6
   3.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 6
   3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8
   3.3 CONTROL TÉCNICO DE OBRA 9
      3.3.1 PERSONAL CALIFICADO 9
4. LOCALIZACIÓN 10
   4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 11
5. BALANCE PRESUPUESTAL 13
6. PORCENTAJES DE OBRA 14
7. RESUMEN DE ACTIVIDADES 15
   7.1 SALON COMUNAL EL PORTAL 15
   7.2 SALON COMUNAL DIANA TURBAY AYACUCHO 16
   7.3 SALON COMUNAL DIANA TURBAY COMUNEROS 17
   7.4 SALON COMUNAL QUIROGA 17
   7.5 SALON COMUNAL CALLEJON DE SANTA BARBARA 18
   7.6 SALON COMUNAL EL TRIUNFO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 18
9. MESAS DE TRABAJO. 20
10. CONCLUSIONES 21
11. ANEXOS 21

1. INTRODUCCIÓN.

El objeto del presente contrato es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.".

Este documento contiene el análisis y estudio de la información inicial y las condiciones existentes para cada uno de los Salones Comunales incluidos dentro de la ejecución del contrato de Obra No. 382 de 2023, según los requerimientos del pliego de condiciones y sus anexos técnicos. Así mismo se resumen las novedades y particularidades de cada una de los frentes y las necesidades encontradas durante la visita preliminar realizada de manera conjunta con los representantes de la alcaldía de Rafael Uribe Uribe e Interventoría JVM INGENIERÍA S.A.S BIC para presentar finalmente las conclusiones y recomendaciones de la intervención.

2. ANTECEDENTES

Dentro de los criterios de priorización para la asignación de recursos y atención a los salones comunales en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 54 Marruecos y 55 Diana Turbay, se consideran varios aspectos fundamentales. Primero, se toman en cuenta los requerimientos específicos expresados por cada Junta de Acción Comunal al alcalde Local. Estos requerimientos pueden variar, pero suelen incluir aspectos relacionados con la titularidad de los salones comunales, su registro en el RUPI (Registro Único del Patrimonio Inmobiliario), matrícula inmobiliaria, y diagnósticos de sus condiciones actuales, priorizando las necesidades de cada uno de ellos.

Además, se presta especial atención a la población vulnerable que reside en estas áreas, donde se concentra una alta cantidad de personas en situación de vulnerabilidad. Los salones comunales seleccionados para recibir atención en esta vigencia son: Portal II, Diana Turbay Ayacucho, Diana Turbay Comuneros, Quiroga Central, Callejón de Santa Bárbara y El Triunfo. Estos salones fueron escogidos conforme a la autonomía otorgada al alcalde Local según el Decreto 734 de 2019.

Los salones priorizados se basan en la información recopilada de la base de datos de la localidad, considerando aspectos como la demanda de la comunidad, el estado de las instalaciones y la necesidad de intervención urgente. Estos salones son: Salón Comunal El Portal, Salón Comunal Diana Turbay Ayacucho, Salón Comunal Diana Turbay Comuneros, Salón Comunal Central Quiroga, Salón Comunal El Triunfo y Salón Comunal Callejón de Santa Bárbara.

Es importante destacar que estos espacios no solo son utilizados para actividades comunitarias, sino que también sirven como centros de capacitación para jóvenes, líderes y la población en general. Estas capacitaciones tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas áreas, especialmente aquellos con bajos niveles de escolaridad y que forman parte de la población vulnerable de la zona.

3. GENERALIDADES

3.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
CONTRATO No.:	CTO-382-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAGÓN GTD
PLAZO EJECUCIÓN PREVISTA:	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE FEBRERO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PREVISTA:	11 DE JULIO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 309.430.040,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTA", DEL PROCESO DERIVADO DE SELECCIÓN ABREVIDA SAMC 006-2023C"
CONTRATO No.:	CTO-383-2023
INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC
PLAZO EJECUCIÓN PREVISTA:	CINCO (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE FEBRERO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PREVISTA:	11 DE JULIO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 112.500.000,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El contrato de obra pública No. COP-382-2023 de 2023 busca ejecutar el control técnico, administrativo, financiero, ambiental y de seguridad para el mantenimiento de este contrato, que tiene como objeto: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ." El contratista debe efectuar el mantenimiento y reparaciones locativas para salones Comunales según especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO TÉCNICO del presente proceso y en toda la Normatividad vigente, la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR/10 Ley 400 de 1997 Decreto 926 de 2010, el Decreto 523 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Microzonificación Sísmica de Bogotá Distrito Capital) o el que se encuentre vigente, o las que se encuentren vigentes a la ejecución de los diseños, Normas técnicas colombianas referentes a la accesibilidad de las personas al medio físico, Espacios urbanos y rurales, entre otras. A continuación, se relacionan los salones que hacen parte para la ejecución de obras y cumplir con el objeto del contrato:

Tabla 1. Oferta económica por frente. Fuente: Propia

PRESUPUESTO CONSOLIDADO				
Nº	NOMBRE	COSTO DIRECTO	VALOR AIU =32% A=26%, I=1%, U=5%	TOTAL +AIU
1	SALON COMUNAL EL PORTAL	$ 68.832.714,00	$ 22.026.468,00	$ 90.859.182,00
2	SALON COMUNAL DIAN TURBAY AYACUCHO	$ 51.591.044,00	$ 16.509.134,00	$ 68.100.178,00
3	SALON COMUNAL DIANA TURBAY COMUNEROS	$ 45.454.354,00	$ 14.545.393,00	$ 59.999.747,00
4	SALON COMUNAL QUIROGA	$ 42.318.510,00	$ 13.541.923,00	$ 55.860.433,00
5	SALON COMUNAL CALLEJON DE SANTA BARBARA	$ 13.037.584,00	$ 4.172.027,00	$ 17.209.611,00
6	SALON COMUNAL EL TRIUNFO	$ 13.182.492,00	$ 4.218.397,00	$ 17.400.889,00
COSTO TOTAL (DIRECTO + INDIRECTO)				$ 309.430.040,00

Tabla 2. Balance presupuestal del mes de junio. Fuente: Propia

PRESUPUESTO CONSOLIDADO				
Nº	NOMBRE	COSTO DIRECTO	VALOR AIU =32% A=26%, I=1%, U=5%	COSTO TOTAL
1	SALON COMUNAL EL PORTAL	$ 52.407.210,00	$ 16.770.307,00	$ 69.177.517,00
2	SALON COMUNAL DIAN TURBAY AYACUCHO	$ 60.970.324,00	$ 19.510.504,00	$ 80.480.828,00
3	SALON COMUNAL DIANA TURBAY COMUNEROS	$ 54.507.813,00	$ 17.442.500,00	$ 71.950.313,00
4	SALON COMUNAL QUIROGA	$ 59.825.638,00	$ 19.144.204,00	$ 78.969.842,00
5	SALON COMUNAL CALLEJON DE SANTA BARBARA			
6	SALON COMUNAL EL TRIUNFO	$ 17.743.560,50	$ 5.677.939,00	$ 23.421.500,00
COSTO TOTAL (DIRECTO + INDIRECTO)				$ 324.000.000,00

Pág

3.3 CONTROL TÉCNICO DE OBRA

3.3.1 PERSONAL CALIFICADO

Para el presente se cuenta con el Representante Legal, director de Obra, Ingeniero Residente de obra, Ingeniera Residente SST-MA, Asesores Técnicos, Inspector de obra, Maestros de obra y personal operativo.
El personal técnico aportará sus conocimientos con el único fin de cumplir con el objeto del contrato. Se presenta a continuación el listado de personal calificado (cargo, nombre y cédula) de acuerdo con los cargos establecidos en el contrato para el personal mínimo de obra:

NOMBRE	CÉDULA	CARGO
GUSTAVO ADOLFO TORRES	19.321.988	REP. LEGAL CONSORCIO
GINA MARCELA ROJAS ALBARRACIN	53.072.531	DIRECTORA DE OBRA
HUGO ANDRES ROJAS	79981217	RESIDENTE DE OBRA
VALENTINA ORTIZ LEAL	1.094.280.114	RESIDENTE DE OBRA
EDISON ANTONIO ROJAS TORO	80.895.045	INSPECTOR DE OBRA
MARYLUZ MORALES ACEVEDO	2.486.951	RESIDENTE STMA
ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	1.030.526.438	RESIDENTE SOCIAL
LUISA FERNANDA RINCÓN RIVEROS	1.030.632.688	RESIDENTE STMA
JOSÉ DARIO CASTRO.	4.198.494	CONDUCTOR
EDGAR MARQUEZ	98.457.274	OFICIAL
CRISTIAN CAMILO TUNJANO GARCIA	1.031.420.792	OFICIAL
DIEGO ACOSTA	1.010.024.425	OFICIAL
JHON EVER ZAYAS LAZARO	1.052.217.828	OFICIAL

4. LOCALIZACIÓN

De acuerdo a los frentes de trabajos contractuales, se anexan los datos de los salones comunales.

LOCALIDAD	SALON COMUNAL	DIRECCIÓN	ALTURA (M.S.N.M)	BARRIO
RAFAEL URIBE URIBE	SALON COMUNAL EL PORTAL	DG. 51A SUR #5B-48,	2.589	DIANA TURBAY
RAFAEL URIBE URIBE	SALON COMUNAL DIANA TURBAY AYACUCHO	CARRERA 2 #49-02 SUR	2.663	DIANA TURBAY
RAFAEL URIBE URIBE	SALON COMUNAL DIANA TURBAY COMUNEROS	CALLE 48X SUR 2 – 13 ESTE	2.646	DIANA TURBAY
RAFAEL URIBE URIBE	SALON COMUNAL QUIROGA	CALLE 43 SUR #11B - 77	2.563	QUIROGA CENTRAL
RAFAEL URIBE URIBE	SALON COMUNAL CALLEJON DE SANTA BARBARA	TRANSVERSAL 5R BIS #48W–03 SUR	2.592	SANTA BARBARA
RAFAEL URIBE URIBE	SALON COMUNAL EL TRIUNFO	CARRERA 21B #32-12 SUR	2.614	EL TRIUNFO

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO



Ilustración 1 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. RAFAEL URIBE URIBE. FUENTE: GOOGLE MAPS.

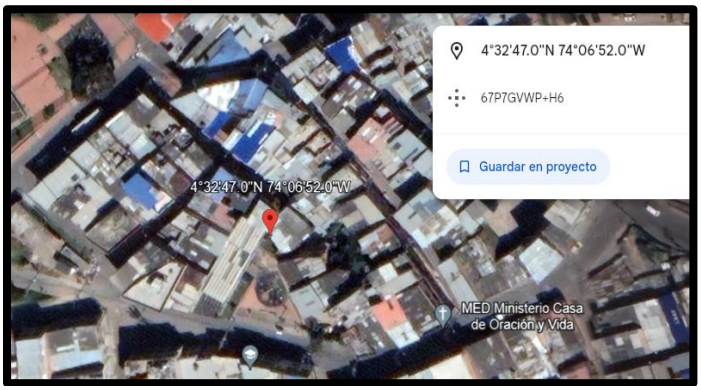


Ilustración 2 SALON COMUNAL EL PORTAL. FUENTE: GOOGLE EARTH.

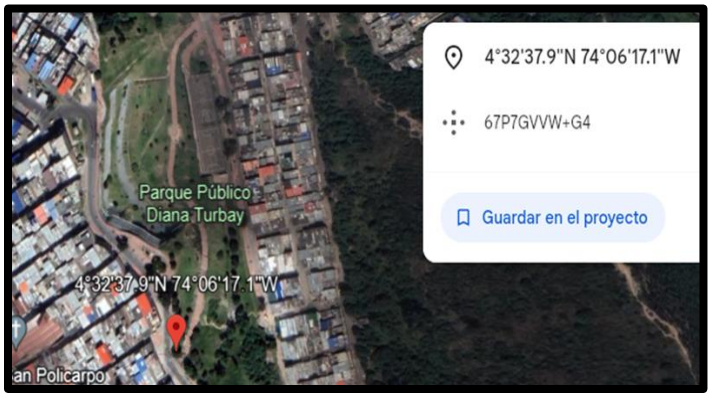


Ilustración 3 SALON COMUNAL DIANA TURBAY AYACUCHO.FUENTE: GOOGLE EARTH.

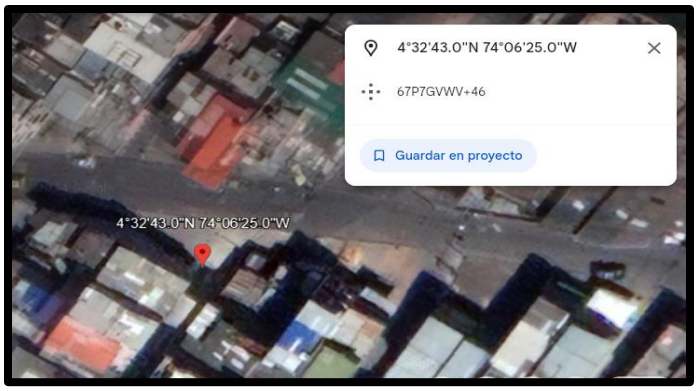


Ilustración 4 SALON COMUNAL DIANA TURBAY COMUNEROS.FUENTE: GOOGLE EARTH.

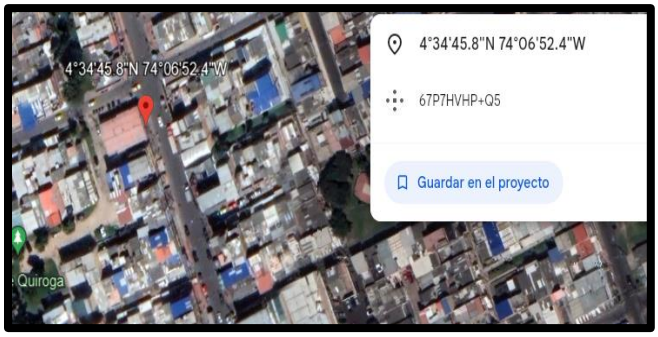


Ilustración 5 SALON COMUNAL QUIROGA. FUENTE:GOOGLE EARTH.



Ilustración 6 SALON COMUNAL CALLEJON DE SANTA BARBARA. FUENTE: GOOGLE EARTH.




Ilustración 7 SALON COMUNAL EL TRIUNFO. FUENTE: GOOGLE EARTH.

5. BALANCE PRESUPUESTAL

Durante el periodo que comprende al informe mensual N°05 de obra, no se presentara acta de cobro para las actividades ejecutadas en los distintos frentes intervenidos (Salón comunal el Portal y Ayacucho). A continuación se relacionan las actas de cobro anteriormente radicadas ante la entidad. Es de anotar que, el acta N°01 y el acta N°02 se radicaron a la entidad en el mes de junio dándole alcance a las observaciones emitidas por la entidad, hasta la fecha estos pagos no han sido desembolsadas por la entidad y estamos a la espera de que se efectué el pago de estas.

ACTAS DE CORTE MENSUAL	VALOR EJECUTADO (INCLUYE A.I.U.)	PORCENTAJE	FECHA	ESTADO DEL PAGO
Acta N°01	$ 144.734.990,00	46,77%	12/06/2024	Proceso

Hasta la fecha del presente informe, se han ejecutado un valor financiero de $ 263.120.400,00; lo cual es equivalente al 85,03% del valor inicial del contrato de obra **No. COP-382-2023,** adjudicado por un valor de $ 309.430.040,00.

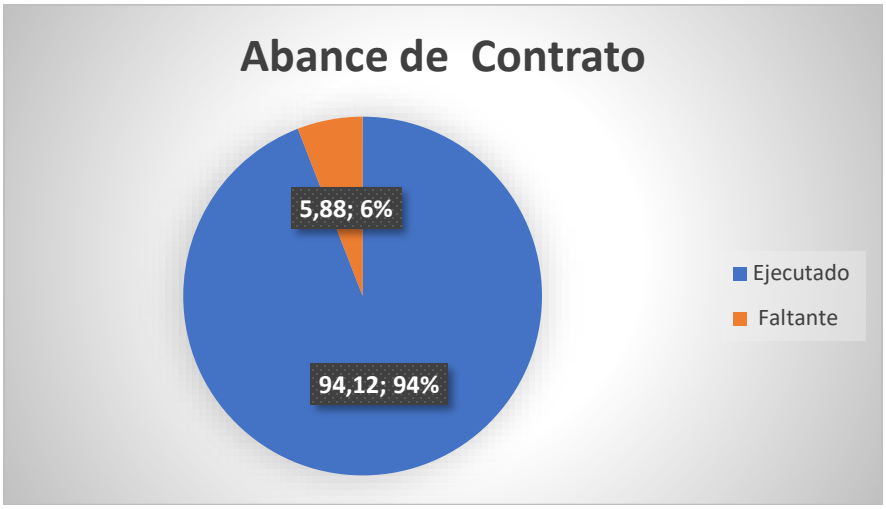

Gráfica 1 Porcentaje total del proyecto (Incluye contrato inicial).

6. PORCENTAJES DE OBRA

De acuerdo a las actividades realizadas durante el periodo que comprende al presente informe mensual (01/06/2024 al 30/06/2024) se presenta el avance acumulado de los frentes, donde se evidencia el porcentaje programado que se deriva a partir del flujo generado por las programaciones en el software Project, versus el porcentaje ejecutado, obtenido a partir de las cantidades de las actividades realizadas.


% PROGRAMADO	%EJECUTADO FINANCIERO	%EJECUTADO REAL
92%		94.12%

De acuerdo con los porcentajes anteriormente relacionados, se evidencia un delta positivo con respecto al porcentaje ejecutado del 2.12% .

7. RESUMEN DE ACTIVIDADES

7.1 SALON COMUNAL EL PORTAL

ACTIVIDADES SALON COMMUNAL PORTAL	
	
➢ Se aplica pintura en aceite a tres manos en los muros de las oficinas salón principal.	➢ Limpieza, brillado y secado de pisos en salón principal y oficinas
	
➢ Instalación de estructura metálica en salón principal (con pintura de acabado)	➢ Instalación de luminaria cuadrada de 0.60x060 en oficina.
	
➢ Instalación de flanche metálico en cubierta.	➢ Ajuste de lavamanos existente en baterías sanitarias.

  **(Actividad en ejecución)** **(Actividad terminada)**	  
➢ Desmonte de cubierta existente.	➢ Reparaciones a observaciones entregadas por la interventoría relacionadas en la correspondencia enviada.

7.2 SALON COMUNAL DIANA TURBAY AYACUCHO

ACTIVIDADES SALON COMMUNAL AYACUCHO	
	 
➢ Suministro de tejas (A-360)	➢ Suministro de tejas (A-360)

	
➢ Suministro de estructura (Tubos 100mm x 100mm x 3mm y tubos 100mm x 50mm x 3mm).	➢ Instalación de estructura metálica
	
➢ Aplicación de anticorrosivo	

7.3 SALON COMUNAL DIANA TURBAY COMUNEROS

- Las actividades ya se finalizaron en este frente, del cual se hizo entrega el día 23 de Mayo de 2024.

7.4 SALON COMUNAL QUIROGA

- Durante este periodo no se han ejecutado actividades relacionadas a este frente.

7.5 SALON COMUNAL EL TRIUNFO

- Las actividades ya se finalizaron en este frente, del cual se hizo entrega el día 21 de Mayo de 2024.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME CONSORCIO ARAGÓN GTD		
INFORME NO.	5	
CONTRATO No.:	COP-382-2023	
REGISTRO FOTOGRÁFICO - TÉCNICO- SALON COMUNAL EL PORTAL		
		
Fotografía 1: Remates de Flanche	**Fotografía 2:** Aseo final	**Fotografía 3:** Instalación de vidrio
		
Fotografía 4: Pulida y sellado de piso	**Fotografía 5:** Instalación de lámparas Led 60 x 60	**Fotografía 6:** Remates en estructura metálica
INFORME CONSORCIO ARAGÓN GTD		
INFORME NO.	5	
CONTRATO No.:	COP-382-2023	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - TÉCNICO- SALON COMUNAL AYACUCHO

		
Fotografía 7: Cerramiento en plástico	**Fotografía 8:** Acta de vecindad	**Fotografía 9:** Cerramiento provisional en Drywall
		
Fotografía 10: Demolición de enchape	**Fotografía 11:** Demolición de enchape	**Fotografía 12:** Acopio de escombros RCD
		
Fotografía 13: Limpieza y aplicación de anticorrosivo a tubos	**Fotografía 14:** Retiro de teja asbesto	**Fotografía 15:** Aplicación de anticorrosivo a tubos

9. MESAS DE TRABAJO.

MESAS DE TRABAJO			
FECHA	**OBJETO**	**LUGAR**	**NOMBRE**
05-06-2024	SE REALIZA REUNION DE REVISION DEL ACTA PARA TRAMITE DE PAGO, EN LA ALCALDIA CON ACOMPAÑAMIENTO DEL AREA CORRESPONDIENTE.	ALCALDIA	REUNION REVISION
06-06-2024	SE REALIZA REUNION CON LA ENTIDAD, LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA. PARA EXPLICARLE A LA SEÑORA XIOMARA PRESIDENTA DEL SALON COMUNAL EL PORTAL, LAS ACTIVIDADES FALTANTES Y CUALES FUERON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SEGÚN EL BALANCE DE OBRA.	QUIROGA	REUNION
06-06-2024	SE REALIZA ACTA DE COMITÉ N. 12.	EL PORTAL	ACTA COMITE
14-06-2024	SE REALIZA REUNION EN SALON COMUNAL DE AYACUCHO PARA REALIZAR APERTURA EL DIA LUNES 17-06-2024, NOMBRANDO ACTIVIDADES A REALIZAR Y PRESENTANDO EL PERSONAL TECNICO DE OBRA.	SALON COMUNAL AYACUCHO	REUNION
17-06-2024	ACTA DE VECINDAD COMPLEMENTANDO LA INCIAL, SE REALIZA LISTADO DE ELEMENTOS Y ESTADO ACTUAL DEL SALON COMUNAL AYACUCHO.	SALON COMUNAL AYACUCHO	ACTA DE VECINDAD
20-06-2024	SE REALIZA ACTA DE COMITÉ N. 14	SALON COMUNAL QUIROGA	ACTA DE COMITÉ
26-06-2024	SE REALIZA REVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PORTAL.	EL PORTAL	REUNION

10. CONCLUSIONES.

- El avance porcentual del proyecto a la fecha del periodo del informe es del 94.12%, contra un programado del 92%. De lo anterior se puede extraer, que se lleva un delta positivo con respecto al porcentaje ejecutado del 2.12% respecto a lo programado hasta el 30 de junio de 2024.
- El día 22 de junio del 2024 mes en el que se realiza el presente informe se ha recibe la aprobación del segundo paquete de NP radicados durante este periodo.
- Hasta este periodo se ha recibido el pago del acta N1 radicadas ante la entidad. Es de anotar que, la entidad realizó algunas observaciones que ya fueron atendidas por la entidad.
- Mediante le oficio CONS – ARAG - GGC146 – OBR 77, se radica la hoja de vida del nuevo residente Ingeniero Hugo Rojas, el cual es aprobado por la interventoría mediante el oficio JVM- FDLRUU-383-096-2024.
- Mediante el oficio JVM- FDLRUU-383-30-2024. La interventoría da aprobación a la hoja de vida de la profesional SISOMA.

11. ANEXOS.

1. Bitácora del mes de junio
2. Actas de comités de seguimiento
3. Actas de reunión
4. Pólizas del contrato No. 382 del 2023
5. Fichas técnicas de los materiales empleados en el mes de junio
6. Cronograma de obra en el mes de junio
7. Balance de obra del mes de junio
8. Correspondencia mes de junio
