JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A Nº 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

SEÑORES

SENA REGIONAL TOLIMA

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES MÓVILES DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y NUTRICIÓN ANIMAL DEL CENTRO. SEGÚN CONTRATO No. 6636022 de 2024

1-DESPULPADORA DE 500L 110 VOLTIOS 2 hp. 1.700 RPM: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo que debe incluir mano de obra, repuestos, accesorios, insumos y demás, que garanticen el correcto funcionamiento del equipo. Despulpador de 500 L; Marca Javar; 110 v, 2 hp, 1700 rpm





2-MESA DE TRABAJO REFRIGERADA: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo que debe incluir mano de obra, repuestos, accesorios, insumos y demás, que garanticen el correcto funcionamiento del equipo. Mesa de trabajo refrigerada (4-8 C); Largo 1,50 cm; Fondo 65 cm; Alto 70 cm




3-ESTUFA ENANA DE UN PUESTO: Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración a todo costo que debe incluir mano de obra, repuestos, accesorios, insumos y demás, que garanticen el correcto funcionamiento del equipo. Estufa enana de un puesto 60cm x 60 cm x 60 cm, acero calibre 16, Marca Javar

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es





4-MARMITA MARCA JAVAR: Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración a todo costo que debe incluir mano de obra, repuestos, accesorios, insumos y demás, que garanticen el correcto funcionamiento del equipo. Marmita Marca Javar; Serial 779-05, Modelo M1T 50, Funciona a Gas, 0.5 o, 87 kg, 28 rpm





5-EMPACADORA AL VACIO: Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración a todo costo que debe incluir mano de obra, repuestos, accesorios, insumos y demás, que garanticen el correcto funcionamiento del equipo. Empacador a al vacío Marca Javar Serial 853E 20, VA 400





6-LAVAMANOS DE PEDAL: Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración a todo costo que debe incluir mano de obra, repuestos, accesorios, insumos y demás, que garanticen el correcto funcionamiento del equipo. Lavamanos de pedal dimensión 1 x 0.48 x 0.53 mt. en acero inoxidable

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es





7-EMPACADORA DE BANDEJAS: Correctivo. Equipo averiado es Necesario restaurar la carcasa. Empacador a de bandejas EB 450, marca Javar y serial 91237648. Máquina para envolver manualmente bandejas de icopor para rollo de vinipel hasta 50 cm. Con control de temperatura y





8-MEZCLADORA: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo que debe incluir mano de obra, repuestos, accesorios, insumos y demás, que garanticen el correcto funcionamiento del equipo. Mezcladora Marca: ABS; serial: n/a; modelo: ABS 15; observaciones: mezclador horizontal. De paletas de volteo fijas para materia. Prima cap. De 50 kg por bache. Fabricada en lamina cal 14 ac. Inox.304. Tova de entrada. Y salida. Montada en rodamientos y chumaceras tipo flanche. Movimiento mediante moto reductor de 2hp






9-BASCULA MARCA OHAUS: Mantenimiento y calibración. Bascula Marca: OHAUS; serial:0019306- 6CL; modelo: N/A; observaciones: bascula electrónica

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es



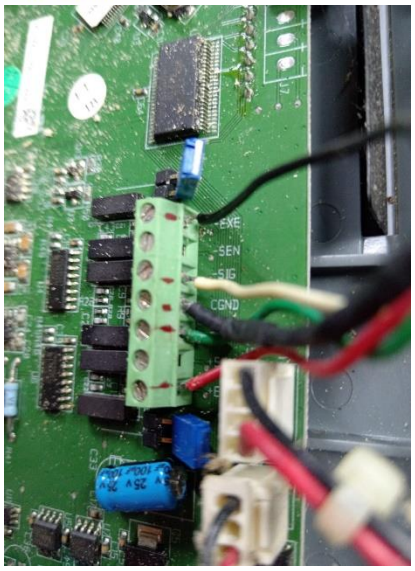



Cordialmente

JHONESTIL URIBE MAPE

C.C. 93370226 de Ibague
