INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°05

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3979 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*
Fecha: *31 de AGOSTO de2024*	***Fecha:*** *31 de AGOSTO de2024*	***Fecha:*** *31 de AGOSTO de2024*

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3979 de 2023 **Contratista:** VEREDA ARENOSA, ASOJUNTAS

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		6-7
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9-11
2.4	Características técnicas del proyecto		11-13
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		13-
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15-19
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	19-20
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	20-24
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	25
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	26
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	26-27
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	27-38
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	38-40
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		41-
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	41
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	42
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	42-46
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	48
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	50
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	51-52
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	53
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	54
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		54-
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	55
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	55
7	**Conclusiones y recomendaciones**		55
8	**Anexos**		55
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		55
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		55-56
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		55
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		57-66

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ **de fecha** _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que la vereda el ARENOSA ya tienen un avance físico y financiero del 85,2% de obra.

PROCESO MI: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — DIRECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — INVENTORÍA OBRA PÚBLICA — FORMATO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 | VERSION: 1 | PAGINA | FECHA: 31/08/2024 (DD-Mes-AAA)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — PERIODO MES: AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 3979 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS ALBANIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 — INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Leidy Carolina Bermeo Castro

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/09/2024
PLAZO DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.398.806,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PLACA HUELLAS	ML	177
	Construcción		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuáles)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
PLACA HUELLAS	Construcción	ML	67,2%	85,2%
	Construcción			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuáles)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	150.409.446,00	28.577.794,74	178.987.240,74
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS SABBAS Y DIAS DE LA			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			178.987.240,74

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	140.075.565,29	32.857.231,37	172.932.796,66	172.932.796,66
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS SABBAS Y DIAS DE LA				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
VALOR EJECUTADO				172.932.796,66

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 172.932.796,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 169.932.796,66
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 85,2%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO CICLOPEDO

Foto 2



INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLA Y CICLOPEDO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 252237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

2.1. LOCALIZACIÓN 7

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023 11

3.1INFORMACION DEL PROYECTO

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 12

3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12

4.1. INFORME SEMANAL 12

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 19

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 23

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 23

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 24

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 26

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 33

4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 33

4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 34

4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 35

4.12. ACTAS DE REUNIÓN 37

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 21

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO……21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ELINTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……..22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA…….22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL…….22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS…….24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.05 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**"." hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas del siguiente convenio:

Convenio No. 3979 de 2023, con número de proceso SPSC-CD-CS-612-2023-2023y que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Curilllo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.
La vía San José del Guaviare – Calamar hace parte de la tan soñada ruta nacional 75. Es una carretera que busca atravesar la amazonia y unir los municipios de Puerto Leguizamón (Putumayo) y Puerto Gaitán (Meta), la idea de dicho proyecto surgió a mediados del siglo XX con la idea de conectar los llanos orientales con la amazonia.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en la vereda arenosa se localizan en las siguientes coordenadas:
Punto 1 (PLACA HUELLA): 1°57'17,6752"N 72°37'32,3680"W

FUENTE DE MATERIALES:

LA RAYA municipio del Albania “contrato de concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de materiales de construcción, según contrato de concesión No. IJH-10531, ubicado en la vereda de morelia

ÁREA TOTAL: 8 HECTÁREAS Y 4395 MT2

MINERALES: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PLANCHA IGAC: 350

ALINDERACIÓN FUENTE DE MATERIALES

COORDENADA NORTE	*COORDENADA ESTE*
671727,0000	*1255870,0000*
671727,0000	*1255870,0000*

671727,0000	*1255870,0000*
781500,0000	*1166150,0000*

Tabla 1. alinderación fuente de materiales

Figura 2-2 Ubicación del tramo a mejorar en la vereda La arenosa.



Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en la vereda arenosa
Fuente: TOPOGRAFIA REALIZADA POR ASOJUNTAS, ALBANIA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), vereda las delicias, florida del municipio de Currillo y la vereda iglesias del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

.

CONVENIO 3979 – 2023:

OBJETO **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”**

La vereda arenosa del Municipio de Albania está ubicada aproximadamente a 5 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas san isidro la samaria y alto castañal, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 20 km.

El tramo a intervenir está ubicado cerca a la escuela la arenosa el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Esta vía cuenta con una alcantarilla de 36 “.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE*

	Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 3979 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA 156 ML MAS 3 METROS LINEALES DE TRANSICION PARA UN TOTAL DE 159 ML DE PLACA HUELLA. LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES. LA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON TUBOS DE 24" DE CONFIGURACIÓN TIPO POCETA-ALETA LA CUAL ES APTA PARA RECOLECTAR Y EVACUAR A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA DE VÍA, LA ESCORRENTÍA DE ORIGEN SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL, APORTANTE POR LAS CUNETAS Y/O FILTROS.* ***ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:*** ***-CONCRETO: F'C 21MPA*** ***-ACERO CORRUGADO: FY 420MPA***

Tabla 2. Características técnicas del proyecto

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA ARENOSA

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPSC-CD-CS-612-2023*
CONVENIO NO.	*3979 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	***AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”***
CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASOJUNTAS, ALBANIA*
NIT	*NIT. 900.468.237-2.*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$ 199.398.806*
APORTE EN ESPECIE OAC	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 199.398.806*
ADICIONES	*$ 0.00*
FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 02	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

Tabla 3. Información general convenio 3979 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizó corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas, bordillos y cunetas.

- **CONCRETO 21 MPA:** Vaciado de concreto para las huellas y ciclópeo

Se figuró y cortó el hierro de los bordillos y cunetas, se fundieron los ciclopedo de 90 cm y 45 cm y se armaron los cajones para los bordillos. El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 85,2% correspondiente a un valor de $169.932.796,66

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- ✓ Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto

3. REPORTES EJECUCIÓN SEMANAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Agosto 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	7/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 16 del 1/08/2024 al 7/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal no.

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No.	3979 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.398.806,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.398.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 111.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 88.398.806			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.590.242,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119.000.000,00	60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 117.000.000,00	58,7%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.000.000,00	1,0%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.716.398,33	33%
PAGA	$ 4.460.860,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 120.000.000,00	60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111.000.000,00	56%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.000.000,00	5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.500.000,00	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.000.000,00	3,3%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	38,4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 60% — Avance o Atraso Físico % 5%
Meta Física Ejecutada % 56%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	177
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	placa huella			$ 120.000.000,00	60%
Ejec				$ 111.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA ARENOSA — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO: SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:SE ESTÁ ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL; ADICIONAL SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZO POR EL PMA

OBSERVACIONES:SE ESTA ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se vacia concreto para las vigas transversales a la losa

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las vigas y cunetas

0+00 — 0+177

PROGRAMADO

EJECUTADO

MAN.: MANTENIMIENTO — CONSTRUCCION — MEJORAMIENTO — SEÑALIZACION

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vaciado de concreto de 3000 psi reforzado para huellas



VACIADO DE VIGAS REFORZADAS



VACIADO DE VIGAS REFORZADAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matricula Profesional No.: 252025647CND

Agosto 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	1
FECHA	14/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 17 del 8/08/2024 al 14/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal no

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No.	3979 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.398.806,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.398.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 120.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 79.398.806			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.590.242,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 125.000.000,00	63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 123.000.000,00	61,7%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.000.000,00	1,0%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.716.388,33	33%
PAGA	$ 4.460.860,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 122.000.000,00	61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120.000.000,00	60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.000.000,00	1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.500.000,00	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.000.000,00	3,3%

Observaciones: la obra presenta un avance del 60 % se estan ejecutando el vaciado de concreto para cunetas y bordillos. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 33%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.625.000,00	40,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 61% — Avance o Atraso Físico %: 1%
Meta Física Ejecutada %: 60%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	177
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	placa huella			$ 122.000.000,00	61%
Ejec				$ 120.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:SE ESTÁ ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, ADICIONAL SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES:SE ESTA ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con el vaciado de las vigas transversales de de la placa huella, se instaló refuerzo y se vació concreto de 3000 psi

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las vigas y cunetas



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada ve meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vaciado de concreto de 3000 psi reforzado para huellas, ciclopéo y vigas transversales



vaciado de concreto de 3000 psi reforzado para huellas, ciclopéo y vigas transversales



ciado de concreto de 3000 psi reforzado para huellas, ciclopéo y vigas transversal

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 352025647CND

AGOSTO 3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 18 del 15/08/2024 al 22/08/2024 — Ultimo Informe Semanal no (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No.	3979 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.398.806,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.398.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 150.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 49.398.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 78.750.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 30.553.594		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.590.242,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 165.000.000,00	83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 155.000.000,00	77,7%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 10.000.000,00	5,0%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.716.398,33	33%
PAGA	$ 4.460.860,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 155.000.000,00	78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 150.000.000,00	75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.000.000,00	3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.500.000,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.500.000,00	4,3%

Observaciones: la obra presenta un avance del 75 % se estan ejecutando el vaciado de concreto para huellas. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 33%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a dispones para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.750.000,00	72,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 78% — Avance o Atraso Físico %: 3%
Meta Física Ejecutada %: 75%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	177
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	placa huella			$ 155.000.000,00	75%
Ejec				$ 150.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA ARENOSA — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con el vaciado de las vigas transversales de de la placa huella, se instaló refuerzo y se vació concreto de 3000 psi

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las vigas y cunetas



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vaciado de concreto de 3000 psi reforzado para huellas, ciclopéo y vigas transversales

vaciado de concreto de 3000 psi reforzado para huellas, ciclopéo y vigas transversales

ciado de concreto de 3000 psi reforzado para huellas, ciclopéo y vigas transversal

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 252025647 4CND

AGOSTO 4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 19 del 23/08/2024 al 31/08/2024 — Último Informe Semanal si ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No.	3979 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.398.806,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.398.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 169.932.797		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 29.466.009		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 78.750.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 30.553.594		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.590.242,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 143.500.000,00	72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140.500.000,00	70,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.000.000,00	1,5%
ADMINISTRACIÓN	$ 29.432.796,66	14,8%
PAGA	$ 4.460.860,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 172.932.796,66	86,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169.932.796,66	85,2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.000.000,00	2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.500.000,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.500.000,00	4,3%

Observaciones: la obra presenta un avance del 85,2 %se esta haciendo concreto para ciclopedo de 45 cm. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 14,8%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a dispones para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.750.000,00	72,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 87%
Meta Física Ejecutada % 85%
Avance o Atraso Físico % 2%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	177
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	placa huella			$ 172.932.796,66	85,2%
Ejec				$ 169.932.796,66	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA	1	1
PLANTA ELECTRICAA	1	1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO: SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FECHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con el vaciado de concreto ciclopedo de 45 cm

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las bordillos y cunetas

0+00 — 0+177

PROGRAMADO
EJECUTADO

MAN MANTENIMIENTO — CONSTRUCCIÓN — MEJORAMIENTO — SEÑALIZACION

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vaciado de concreto de 3000 psi para ciclopedo



vaciado de concreto de 3000 psi para ciclopedo



vaciado de concreto de 3000 psi para ciclopedo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 252025647CND

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se relacionó la maquinaria y los equipos que estuvieron activos, inactivos en el periodo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3979-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS ALBANIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO COMPACTADOR	CAT-420 D	2896 KG	ARENOSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PAJARITA	CAT-420 D	1875 KG	ARENOSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TROMPO MEZCLADOR	BAUKER	1 BULTO	ARENOSA	A	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I	I
GENERADOR ELECTRICO	BAUKER	110V/220V	ARENOSA	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I
PULIDORA ELECTRICA	DRIWALL	6500 RPM	ARENOSA	A	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTOBOMBA	HUMBOLT	1 HP	ARENOSA	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO				4			1	1	2		2				1						1			1	1				1	1		2	
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO					6	6	5	5	4	6	4	6	6	6	5	6	6	6	6	6	5	6	6	5	5	6	6	6	5	5	6	4	6	6

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	18	18%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	165	165%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA MAQUINARIA QUE SE REPORTA EN EL CUADRO COMO INACTIVA, SE ENCUENTRAN EN BUES ESTADO, SOLO QUE NO SE REQUIERE UTILIZAR TODOS LOS DIAS

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-119996 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional N·2520256474 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se relaciona el personal que laboro para la obra durante el periodo de AGOSTO de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MIN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3979-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS DE ALBANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2024 **PROYECTO:** ### PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

NOMBRE ARL: POSITIVA ARL **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RAMON ANTURY	97.357.389	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KSOJUNTAS-ALBANIA	$ 1.082.667	$ 75.400	V	NUEVA EPS	30325495	$ 135.400	COLFONDOS	30325495	$ 173.300	$ 43.400	$ 21.700	$ 32.500	
2	DAUD YAGUE URQUINA	98.257.369	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMET-SALUD	30325495	$ 75.900	PROTECCION	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
3	GEOVANI ARCILA JARAMILLO	15.987.070	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMET-SALUD	30325495	$ 75.900	COLPENSIONES	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
4	JHON FABER ALVARADO CAMPUZANO	1.117.541.171	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMET-SALUD	30325495	$ 75.900	PORVENIR	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
5	JUAN CARLOS ZAMBRANO	1.117.786.696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	ASMET-SALUD	30325495	$ 75.900	PROTECCION	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
6	NELSON GALLEGO	98.257.607	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	NUEVA EPS	30325495	$ 75.900	PROTECCION	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
7	RAMON ANTONIO DE HOYOS	98.257.465	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KSOJUNTAS-ALBANIA	$ 606.667	$ 42.300	V	NUEVA EPS	30325495	$ 75.900	COLPENSIONES	30325495	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/08/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: No. 25202 - 119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Certificación del pago seguridad social mes de AGOSTO de 2024

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS
DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA
PERSONARÍA JURÍDICA N° 421 DE 31 DE DICIEMBRE DE 1990
NIT. 900.468.237-2

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, SIXTO JAVIER PARRA RAMIEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.785.524 de Albania-Caquetá -Caquetá, en mi condición de Representante Legal DE LA SOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA**, con identificación tributaria NIT. 900.468.237-2, durante el periodo comprendido del 01 al 31 del mes de JULIO de 2024, realizo el pago de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior dando cumplimiento a la ejecución del CONVENIO 3979 DE 2023.

Según la planilla de pago No. 30555794 en estado pagada a través del operador ASOPAGOS S.A.

Dada en San José del Fragua Caquetá, a los cinco (05) días del mes de agosto de 2024.

Cordialmente,

SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ
C.C. 1.117.785.524 de Albania-Caqueta
Representante Legal ASOJUNTAS

Página 1 | 1

Planilla pagada mes de AGOSTO JAC arenosa

RESUMEN PLANILLA PAGADA


ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
8[illegible]7	7	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS ELEVADORES DEL NARAN	N	25	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7711	Juridica
MUNICIPIO *		UBICACION			DEPTO/PAIS		EMAIL	CORREO DE NOTIFICACIONES
15-29		CALI-VIEJ			32[illegible]0		ADULTO ASALARIADO EL NACIONAL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PLANILLA	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	3[illegible]4	E	22/[illegible]/2024	1 CLASE CLASE CLASE	CLASE	76 CLASE	4.662.200	0	BANCOLOMBIA
N° AUTORIZACION	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LISTA PAGO	USUARIO PLANILLA							
5 4 L V	3[illegible]4	2024-08-12	Pagada							



RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
8[illegible]7	7	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS ELEVADORES DEL NARAN	N	25	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7711	Juridica
MUNICIPIO *		UBICACION			DEPTO/PAIS		EMAIL	CORREO DE NOTIFICACIONES
15-29		CALI-VIEJ			32[illegible]0		ADULTO ASALARIADO EL NACIONAL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PLANILLA	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	3[illegible]4	E	22/[illegible]/2024	1 CLASE CLASE CLASE	CLASE	76 CLASE	4.662.200	0	BANCOLOMBIA
N° AUTORIZACION	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LISTA PAGO	USUARIO PLANILLA							
5 4 L V	3[illegible]4		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PLANILLA	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC PAGAR
19.120.001	19.120.001	19.120.001	19.120.001	19.120.001

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
APP(Administradoras: 4)				8	1.618.300	0	0	0	1.618.300
PROTECCION	230301	800256769	3	3	634.000	0	3	0	634.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	111.000	0	3	0	111.300
COLFONDOS	230301	800227940	9	1	371.200	0	3	0	371.200
COLPENSIONES	25-4	900336004	7	3	513.100	0	3	0	513.100
EPS(Administradoras: 2)				8	1.265.100	0	0	0	1.265.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	650.900	0	3	0	650.900
ESSC ASMET SALUD	ESS062	900935126	7	4	614.200	0	3	0	614.200
ARP(Administradoras: 1)				8	724.600	0	0	0	724.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	724.600	0	3	0	724.900
CCF(Administradoras: 1)				8	404.600	0	0	0	404.600
COMFACA	CCF 3	891190047	2	8	404.900	0	3	0	404.900
SENA(Administradoras: 1)				8	302.600	0	0	0	302.600
SENA	FASENA	899999034	1	8	302.600	0	3	0	302.900
CBF(Administradoras: 1)				8	303.600	0	0	0	303.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	8	303.600	0	3	0	303.900
Gran Total					4.550.200	0	0	0	4.550.200

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se anexo formato del avance financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3979-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS ALBANIA

MES INFORME MENSUAL: 3 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.398.806,00	N/A
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.398.806,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 121.328.888,21	$ 28.459.863	$ **149.788.751**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 116.235.000,00	$ 27.265.000	$ **143.500.000,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 113.805.000,00	$ 26.695.000	$ **140.500.000,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.430.000,00	$ 570.000	$ **3.000.000,00**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 140.075.565,29	$ 32.857.231	$ **172.932.796,66**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 137.645.565,29	$ 32.287.231	$ **169.932.796,66**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.430.000,00	$ 570.000	$ **3.000.000,00**
-			$ -
VALOR TOTAL			$ **169.932.796,66**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
residente de Obra Jhon Jairo Garcia Calderon
Matrícula Profesio 25202-119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional N.252223743OCND

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el transcurso del mes de AGOSTO en la vereda hizo buen tiempo, no se presentaron lluvias y se cumplió con la programación de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3979 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		240
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
EN EL TRANSCURSO DEL MES SE PRESENTÓ BUEN CLIMA EN LOS PUNTOS DE INTERVENCION

Firma
Nombre: Jhon Jairo Garcia Calderon
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0553973 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.


Registro pluviométrico del IDEAM

CodigoEstac	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperati	Departamen	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspe	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAproba
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/01/2024 0:00	11	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/01/2024 0:00	1	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/01/2024 0:00	0	50		900
31015010	EL TRUENO [31015010]	2.372.777.778	-72.64	150	ClimÃ¡tica O	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operati	Guaviare	El Retorno	15/05/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃa pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/01/2024 0:00	3	50		900

4.6. **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**

En el transcurso del mes de agosto se tomaron muestras de concreto en cilindros, después de que cumplieron los 28 días de fraguado se llevaron a laboratorio para practicar la resistencia a la comprensión. El formato presentado evidencia que el

concreto utilizado obtuvo los PSI requeridos por el proyecto para la construcción de las obras

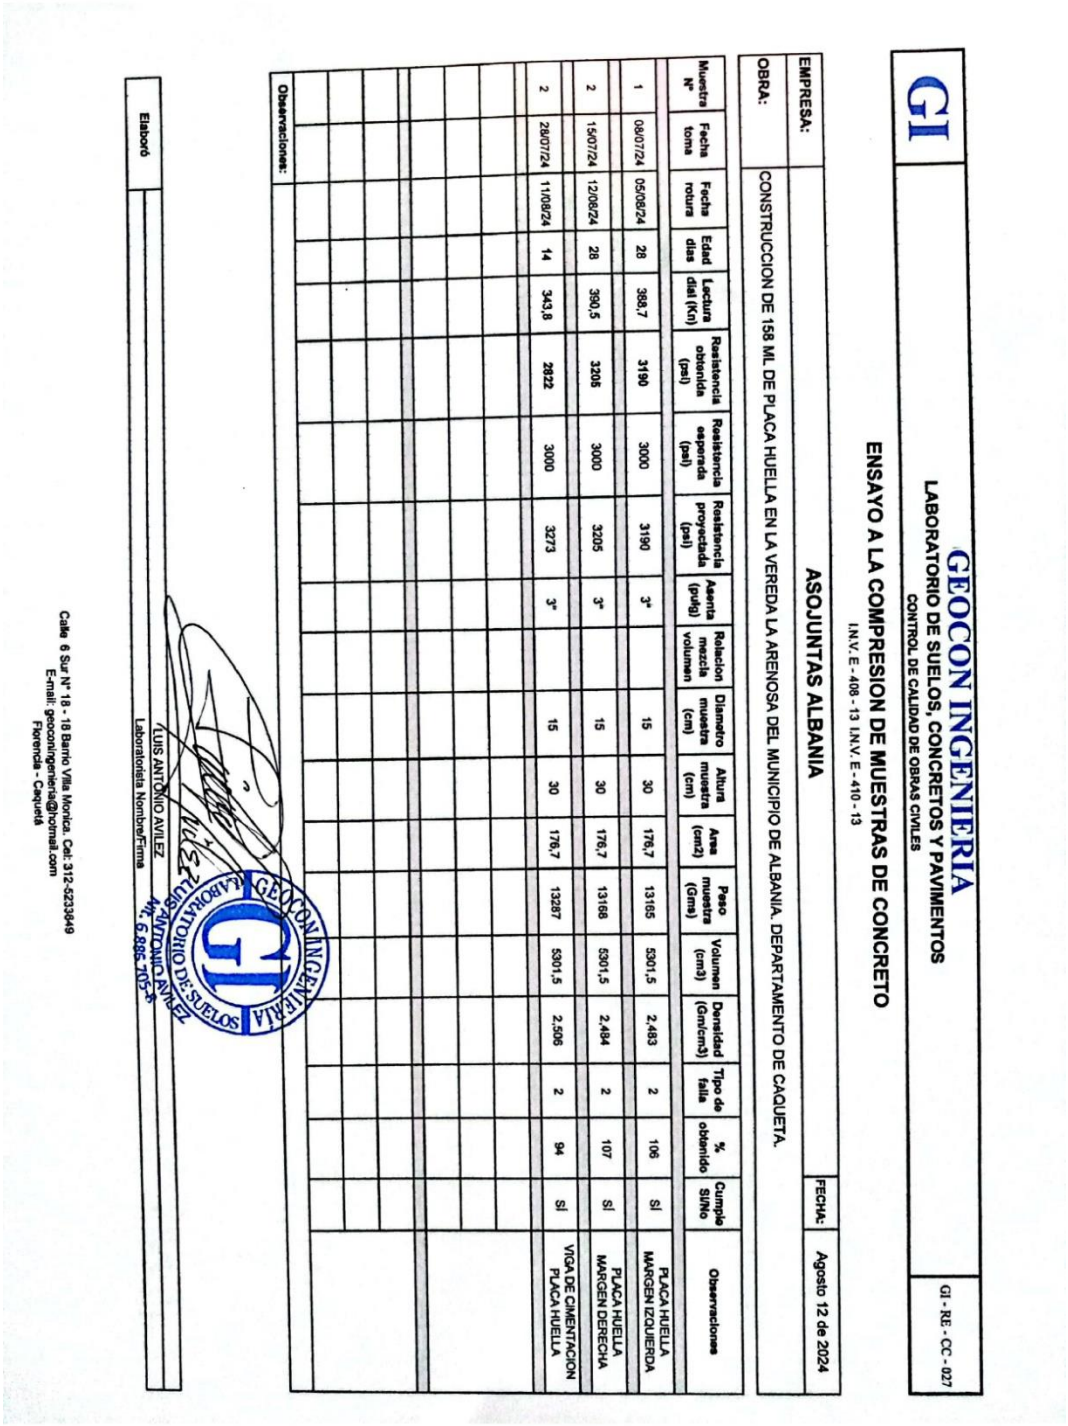

GI

GEOCON INGENIERIA
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES

GI - RE - CC - 027

ENSAYO A LA COMPRESION DE MUESTRAS DE CONCRETO
I.N.V. E - 408 - 13 I.N.V. E - 410 - 13

EMPRESA: ASOJUNTAS ALBANIA — **FECHA:** Agosto 12 de 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 158 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA. DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

Muestra Nº	Fecha toma	Fecha rotura	Edad días	Lectura dial (Kn)	Resistencia obtenida (psi)	Resistencia esperada (psi)	Resistencia proyectada (psi)	Asenta (pulg)	Relacion mezcla volumen	Diametro muestra (cm)	Altura muestra (cm)	Area (cm2)	Peso muestra (Gms)	Volumen (cm3)	Densidad (Gm/cm3)	Tipo de falla	% obtenido	Cumplio SI/No	Observaciones
1	08/07/24	05/08/24	28	368,7	3190	3000	3190	3"		15	30	176,7	13165	5301,5	2,483	2	106	SI	PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA
2	15/07/24	12/08/24	28	390,5	3205	3000	3205	3"		15	30	176,7	13168	5301,5	2,484	2	107	SI	PLACA HUELLA MARGEN DERECHA
2	28/07/24	11/08/24	14	343,8	2822	3000	3273	3"		15	30	176,7	13287	5301,5	2,506	2	94	SI	VIGA DE CIMENTACION PLACA HUELLA

Observaciones:

Elaboró

LUIS ANTONIO AVILEZ
Laboratorista Nombre/Firma

LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ M.P. 6.886.705-5

GEOCON INGENIERIA GI

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-6233849
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el transcurso del mes no fue necesario solicitar más póliza, debido a que estamos en los tiempos establecidos por el convenio y no se le va a dar trámite a ningún adicional en recursos, Se anexan pólizas del convenio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 3979-2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 3 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199.398.806,00
VALOR ACUMULADO: $ 199.398.806,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.879.761,00	18	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	31/12/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.969.940,00	18	10	2023	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.819.642,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3765008-2
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	18	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0934431-1 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: NA
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** 1 Y 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.909.750,60	5	10	2023	30/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.977.438,65	5	10	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.864.631,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100289628
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	18	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0934431-1 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO PENDIENTE EN SECOP

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 24 DE OCTUBRE DE 2023	3765008-2	15357042
Intermediario	**Código**	**Oficina**
PORVENIR ASESORES	54327	2514

Referencia de Pago: 01215357042

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

Dirección: CR 3A # A – 17 VILLA AMAZONICO — Ciudad: ALBANIA — Teléfono:

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
899215072	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-OCT-2023	31-OCT-2024	39.879.761,00	124.228,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31-DIC-2023	31-DIC-2028	59.819.642,00	898.278,60
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-OCT-2023	31-DIC-2026	9.969.940,00	95.875,60

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
18-OCT-2023	31-DIC-2028	1901	18-OCT-2023	31-DIC-2028	$1.118.381	$212.492	$1.330.873

VALOR A PAGAR EN LETRAS
UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/I

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA	$109.669.363	$329.008	$109.669.363,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 009961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	1.118.381

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo a cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/09/2017	13 - 18	P	06	F-06-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCION DE LA COMPAÑIA ES: CRA 5 # 21A - 12 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 778659795

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS: REGIMEN COMUN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. – CLIENTE – www.suramericana.com Página 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3765008-2	15763421
Intermediario	**Código**	**Oficina**
PORVENIR ASESORES	54327	2514

Referencia de Pago: 01215763421

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

Dirección: CR 3 A # 4 17 VILLA AMAZONICO — Ciudad: ALBANIA — Teléfono:

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
900468272	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
899215072	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-OCT-2023	28-ABR-2025	39.879.761,00	19.339,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-JUN-2024	30-JUN-2029	59.819.641,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-OCT-2023	30-JUN-2027	9.969.940,00	4.999,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
18-OCT-2023	30-JUN-2029	1950	06-JUN-2024	30-JUN-2029	$24.338	$4.624	$28.962

VALOR A PAGAR EN LETRAS
VEINTI OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$329.008	$109.669.363,30

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 009961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	91975	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	24.338

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/09/2017	13 - 18	P	06	F-06-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCION DE LA COMPAÑIA ES: CRA 5 # 21A - 12 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 778659795

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS: REGIMEN COMUN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. – CLIENTE – www.suramericana.com Página 1

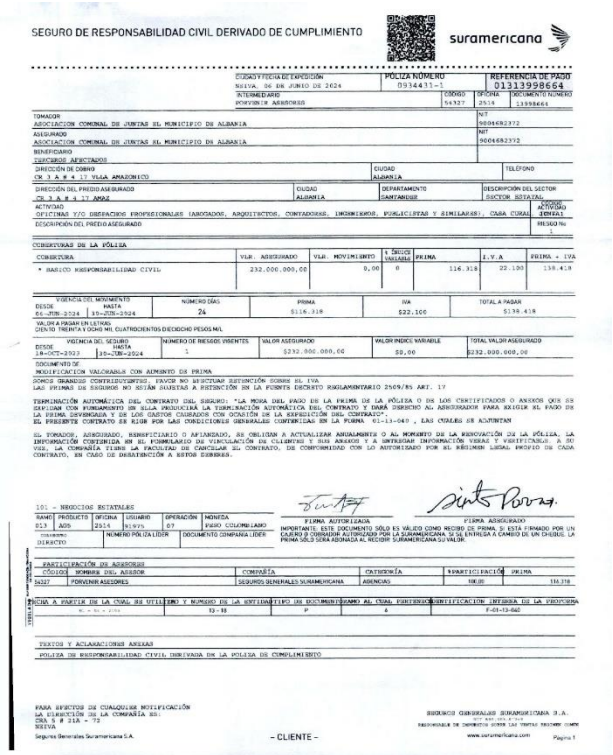

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	01313998664

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	13998664

TOMADOR
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 900468237-2

ASEGURADO
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 900468237-2

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 A # 4 17 VILLA AMAZONICO	ALBANIA	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 3 A # 4 17 ANAZ	ALBANIA	SANTANDER	SECTOR ESTATAL

ACTIVIDAD — CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA
OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES); CASA CURAL — 9411

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — ESTRATO No. 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	116.318	22.100	138.418

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
06-JUN-2024	30-JUN-2024	24	$116.318	$22.100	$138.418

VALOR A PAGAR EN LETRAS:
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR ÍNDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
19-OCT-2023	30-JUN-2024	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIJE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PRIMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
813	A09	2514	91975	07	PESO COLOMBIANO

NÚMERO DIRECTO — NÚMERO PÓLIZA LÍDER — DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA Y SI LE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54227	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	116.318


FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZARÁ	NÚMERO DE LA ESTIPULACIÓN DEL CLAUSULADO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROPUESTA
03-05	P 4	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Seguros Generales Suramericana S.A. — – CLIENTE – — www.suramericana.com — Página 1

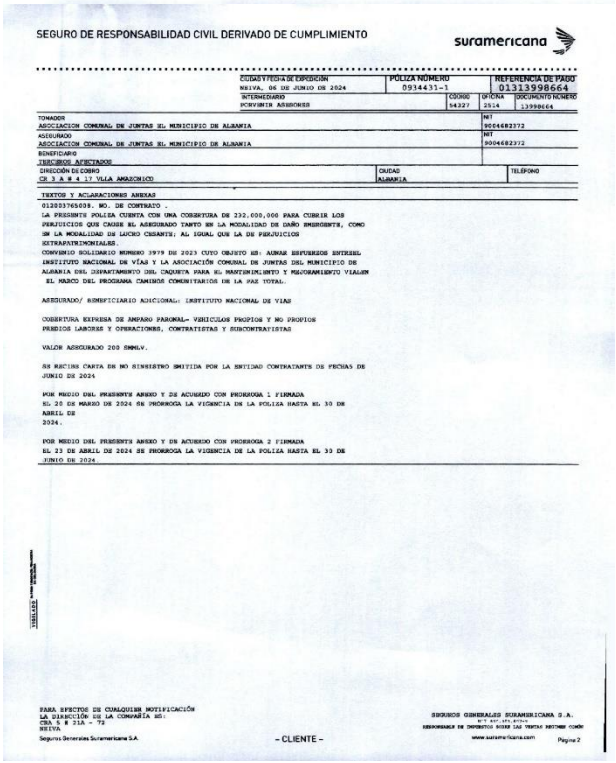

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	01313998664

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
PORVENIR ASESORES	54227	2514	13998664

TOMADOR
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 900468237-2

ASEGURADO
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 900468237-2

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 A # 4 17 VILLA AMAZONICO	ALBANIA	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
012203765038. NO. DE CONTRATO .
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232.000.000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO PATRIMONIAL, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRESL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALSN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL- VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
PERDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

VALOR ASEGURADO 200 SMMLV.

SE RECIBE CARTA DE NO SINIESTRO EMITIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE DE FECHAS DE JUNIO DE 2024


POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 1 FIRMADA EL 20 DE MARZO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 2 FIRMADA EL 23 DE ABRIL DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Seguros Generales Suramericana S.A. — – CLIENTE – — www.suramericana.com — Página 2

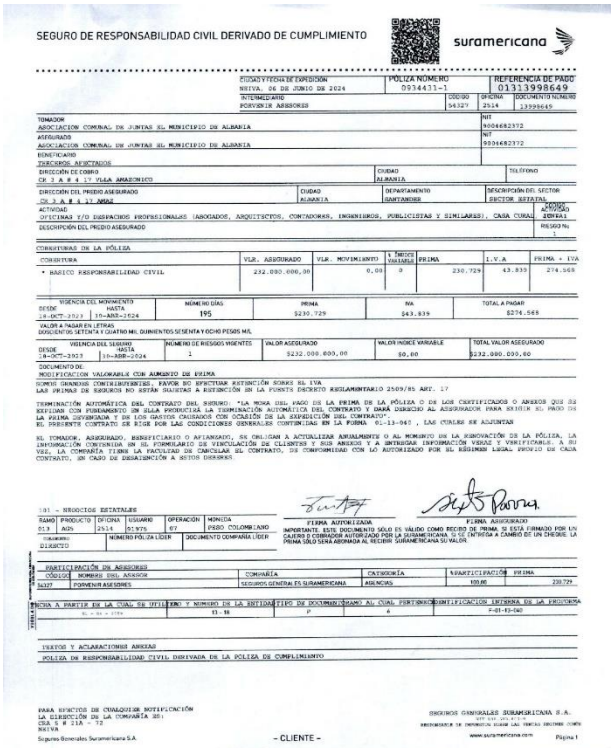

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	03313998649

INTERMEDIARIO	CODIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
FORVENIR ASESORES	54327	2514	13998649

TOMADOR
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

ASEGURADO
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: CR 3 A # 4 17 VILA AMAZONICO — CIUDAD: ALBANIA — TELÉFONO

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO: CR 3 A # 4 17 ANAZ — CIUDAD: ALBANIA — DEPARTAMENTO: SANTANDER — DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: SECTOR ESTATAL

ACTIVIDAD: OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES); CASA CUNA — CÓDIGO ACTIVIDAD: 2599A1

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No: 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
• BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	230.729	43.839	274.568

DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
10-OCT-2023	10-ABR-2024	195	$230.729	$43.839	$274.568

VALOR A PAGAR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
10-OCT-2023	10-ABR-2024	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALOR&IVA CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-940 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL ESQUEMA LEGAL. ENVÍO DE CARTA CONTRATO, EN CASO DE DESAVENENCIA A ESTOS DESCRITOS.

191 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AOS	2514	91975	67	PESO COLOMBIANO

CONSECUTIVO DIGITO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA O SE CANCELA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

FIRMA ASEGURADO

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	FORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	230,729


FECHA A PARTIR EN LA CUAL SE UTILIZARÁ	NÚMERO DE LA EDITO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PRODUCCIÓN
	03-16	P	4	F-01-03-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com
Página 1

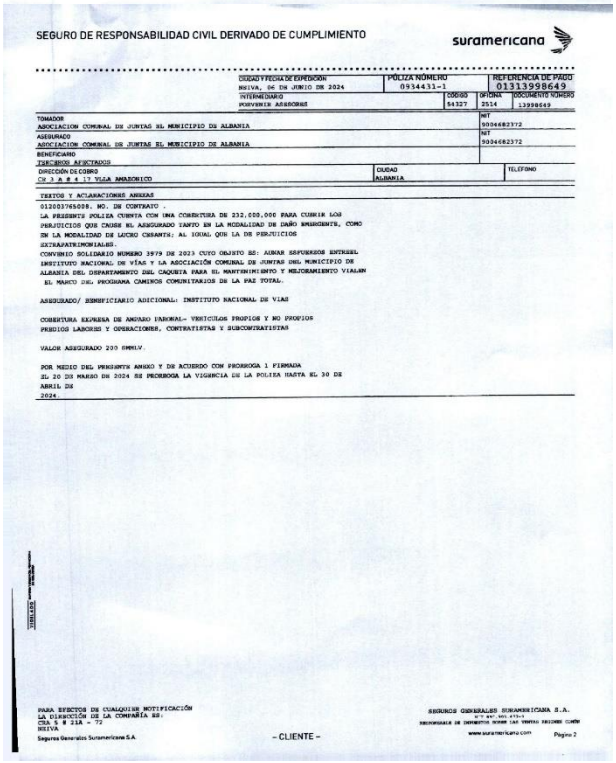

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0934431-1	03313998649

INTERMEDIARIO	CODIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
FORVENIR ASESORES	54327	2514	13998649

TOMADOR
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

ASEGURADO
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA — NIT 9004682372

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: CR 3 A # 4 17 VILA AMAZONICO — CIUDAD: ALBANIA — TELÉFONO

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
012003765008. NO. DE CONTRATO .
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO IANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRESL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALAN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURA EXPRESA DE AMPARO LABORAL- VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS


VALOR ASEGURADO 200 SMMLV.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 1 FIRMADA EL 20 DE MARZO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com
Página 2

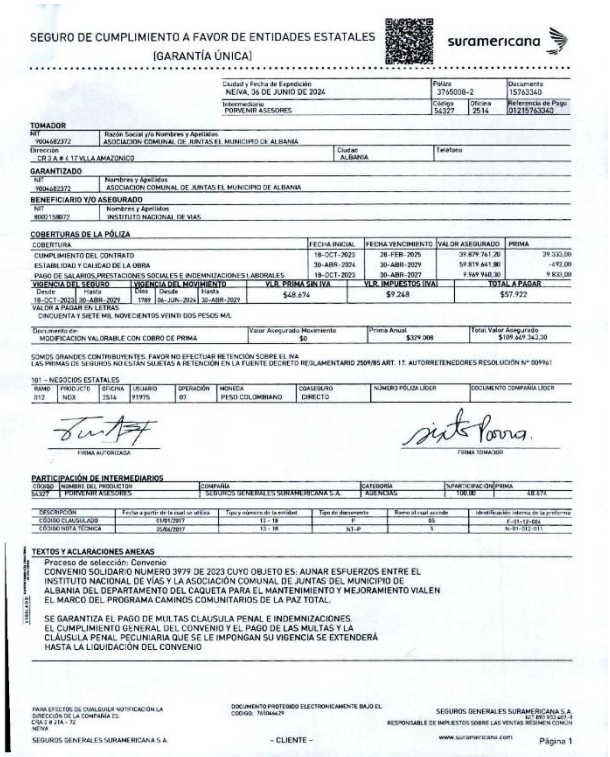

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3765008-2	15763340

Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215763340

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	Ciudad	Teléfono
9004682372	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA	ALBANIA	

Dirección: CR 3 A # 4 17 VLLA AMAZONICO

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9004682372	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8001158072	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-OCT-2023	28-FEB-2025	$9 879 761,20	29 330,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-ABR-2024	30-ABR-2029	$9 879 441,80	492,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-OCT-2023	30-ABR-2027	$ 969 948,30	$ 830,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta		
18-OCT-2023	30-ABR-2029	1789	06-JUN-2024	30-ABR-2029	$48.674	$9.248

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$329.008	$109.669.343,30

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 00961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	91975	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	48.674

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la preforma
CÓDIGO CLAUSULADO	19/01/2017	13 - 18	F	55	F-01-12-054
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/04/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-212-017

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Convenio
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES. EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 765344429


SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE -

www.suramericana.com

Página 1

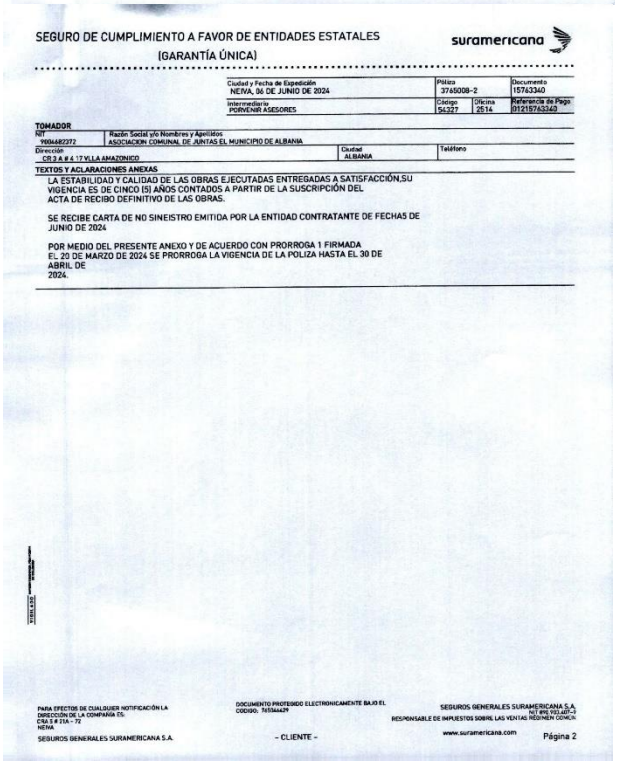

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3765008-2	15763340

Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215763340

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	Ciudad	Teléfono
9004682372	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS EL MUNICIPIO DE ALBANIA	ALBANIA	

Dirección: CR 3 A # 4 17 VLLA AMAZONICO

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN,SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

SE RECIBE CARTA DE NO SINEISTRO EMITIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE DE FECHAS DE JUNIO DE 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON PRORROGA 1 FIRMADA EL 20 DE MARZO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 765344429

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE -

www.suramericana.com

Página 2



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD/FECHA DE EXPEDICION: NEIVA, 24 DE OCTUBRE DE 2023 | POLIZA NUMERO: 0934431-1 | REFERENCIA DE PAGO: 013139117774

INTERMEDIARIO: 64327 PROVEEDS ASESORES | CODIGO: 64327 | OFICINA: 3514 | DOCUMENTO NUMERO: 13911774

TOMADOR: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANTA | NIT: 9004682372

ASEGURADO: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANTA | NIT: 9004682372

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

DIRECCION DE COBRO: CR 3A # 4 - 17 VILLA AMAZONICO | CIUDAD: ALBANTA | TELEFONO:

DIRECCION DEL PREDIO ASEGURADO: CR 3A # 4 - 17 ANAS | CUPAO: ALBANTA | DEPARTAMENTO: CAQUETA | DESCRIPCION DEL SECTOR: SECTOR ESTATAL

ACTIVIDAD: OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, SICOLOGOS Y SIMILARES), CASA CIRAL | CODIGO ACTIVIDAD: 1

DESCRIPCION DEL PREDIO ASEGURADO | RIESGO No: 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A.	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	232.000.000,00	0	141.107	26.810	167.917

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NUMERO DIAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
18-OCT-2023	31-DIC-2023	74	$141.107	$26.810	$167.917

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NUMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
18-OCT-2023	31-DIC-2023	1	$232.000.000,00	00,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE: POLIZA NUEVA

SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES , FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2009/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y UNAS DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-1-648 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL REGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE ABSTENCIÓN A ESTOS DEBERES.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	ESTADO	OPERACIÓN	MONEDA
813	A05	3514	EMISO:	01	PESO COLOMBIANO

FIRMA AUTOR PARA DEBITO DIRECTO | NUMERO POLIZA LIDER | DOCUMENTO COMPAÑIA LIDER

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VALIDO CUNO RECIBO DE PRIMA, SU PUTA FIRMADO POR UN CAJERO O CORREDOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA, O SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE LA PRIMA SOLICITADA GIRADO A SEGUROS SURAMERICANA S.A. VALIDO

PARTICIPACIÓN DE ASEGURE

CÓDIGO	NOMBRE DEL AGENTE	COMPARTA	CATEGORIA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
64327	PROVEEDS ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	141.107

PARA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZARÁ Y MEDIO DE LA ENTREGA DEL DOCUMENTO: AMO AL CUAL PREFIERE: IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROPUESTA

31 - 10 - 2023	15:38	P	A	P-20-13-849

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD/FECHA DE EXPEDICION: NEIVA, 24 DE OCTUBRE DE 2023 | POLIZA NUMERO: 0934431-1 | REFERENCIA DE PAGO: 013139117774

INTERMEDIARIO: 64327 PROVEEDS ASESORES | CODIGO: 64327 | OFICINA: 3514 | DOCUMENTO NUMERO: 13911774

TOMADOR: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANTA | NIT: 9004682372

ASEGURADO: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANTA | NIT: 9004682372

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

DIRECCION DE COBRO: CR 3A # 4 - 17 VILLA AMAZONICO | CIUDAD: ALBANTA | TELEFONO:

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
0120017568000, NO. DE CONTRATO
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE $30,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE, AL TENER QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 1979 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANTA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIALES EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA
Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

Página 2

4..8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Se solicitó un estudio de suelos con el fin de saber cuál fue la capacidad portante por medio del CBR
- Se solicitó un estudio de topografía con el fin de localizar y replantear lo niveles de la vía.
- Se solicitó realizar los cilindros de concreto, con el fin de llevarlos al laboratorio y saber cuál es la resistencia a la comprensión.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO

JUNTA DE ACCION COMUNAL ASOJUNTAS MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA

PRESUPUESTO DE OBRA | **CRONOGRAMA DE OBRA**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (ML)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	UBICACIÓN: KILOMETRO 2 VIA ALBANIA - CURILLO, 3 KILOMETROS DEL KILOMETRO 2 HASTA LA ESCUELA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
CAQUETA	ALBANIA	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA	158,00	CAQUETÁ	15/05/2024	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUNIO DE 2024 DEL 01 AL 09	JUNIO DE 2024 DEL 10 AL 16	JUNIO DE 2024 DEL 17 AL 23	JUNIO DE 2024 DEL 24 AL 30	JULIO DE 2024 DEL 01 AL 07	JULIO DE 2024 DEL 08 AL 14	JULIO DE 2024 DEL 15 AL 21	JULIO DE 2024 DEL 22 AL 28	JULIO DE 2024 DEL 29 AL 04	AGOSTO DE 2024 DEL 05 AL 11	AGOSTO DE 2024 DEL 12 AL 18	AGOSTO DE 2024 DEL 19 AL 25	AGOSTO DE 2024 DEL 26 AL 01
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																					
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 198.509,00	$ 198.509,00	198.509												
							SUB-TOTAL	$ 198.509,00													
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																					
2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	308,88	$ 52.100,00	$ 16.092.422,00	5.364.140	5.364.140	5.364.140										
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	132,96	$ 105.392,00	$ 14.012.604,00		4.670.868	4.670.868	4.670.868									
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	89,56	$ 871.159,00	$ 78.017.515,00			7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501	7.092.501
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	40,49	$ 346.742,00	$ 14.040.971,00					2.340.162	2.340.162	2.340.162	2.340.162	2.340.162	2.340.162			
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.272,23	$ 6.321,00	$ 27.004.761,00			2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978	2.454.978
7		1.978,00		Desmonte e instalacion de cercos paralelos a la placa huella	MI	150,00	$ 6.951,00	$ 1.042.664,00	521.332	521.332,00											
							SUB-TOTAL	$ 150.210.937,00													
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 150.409.446,00	6.093.362	10.556.341	19.582.488	14.218.349	11.887.641	11.887.641	11.887.641	11.887.641	11.887.641	11.887.641	9.547.480	9.547.480	9.547.480
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) PLAN DE INVERSION SOCIAL	$ 2.200.000,00	4%	7%	13%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	6%	6%	6%
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.789.360,00													
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 198.398.806,00													

EL ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO EQUIVALE A 158 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202- 119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202- 119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
Nombre: FAB Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3979-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00		$ 71.400.000,00	35,99%
2	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00		$ 9.000.000,00	4,54%
3	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.266.648,00	$ 2.266.648,00	$ 2.266.648,00		$ 6.799.944,00	3,43%
4	TRANSPORTE	$ 4.450.000,00	$ 4.450.000,00	$ 4.450.000,00		$ 13.350.000,00	6,73%
5	COSTO DE PERSONAL	$ 17.353.167,33	$ 17.353.167,33	$ 17.353.167,33		$ 52.059.502,00	26,24%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 15.263.120,00	$ 15.263.120,00	$ 15.263.120,00		$ 45.789.360,00	23,08%
N							%
TOTAL						$ 198.398.806,00	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **SIXTO JAVIER PARRA RAMIEZ**
Representante Legal o su Apoderado
ASOJUNTAS
C.C 1.117.785.524

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
DIRECTOR DE ITERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma:
Nombre: **Jhon Jairo Garcia Calderon**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-119996 CND**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Se anexa el acta de comité operativo

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No:	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETÁ	Fecha: 06-05-2024

Vereda – Municipio - Departamento: ASOJUNTAS – ALBANIA CAQUETA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3979-2023
Ejecutor(es): MUNICIPIO DE ALBANIA

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
SIXTO JAVEIR PARRA RAMIREZ	ASOJUNTAS	PRESIDENTE
ING JHON JAIRO GARCIA	ASOJUNTAS	INGENIERO RESIDENTE
EUCARIS PENNA CEBALLOS	ASOJUNTAS	CONTADOR
ALBA ADIELA ZAMBRANO	ASOJUNTAS	VEEDURIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros participantes del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Análisis de cotizaciones presentadas
4. Elección de proveedores.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*


1- Análisis de precios .
2- Elección de proveedores.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
4- Elección de uniformes.
5- Proposiciones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen

1

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

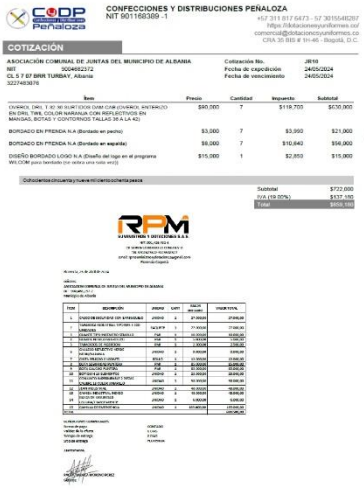1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los cuatro (4) miembros principales, el presidente, el ingeniero residente, contador y un representante de la veeduría.
2.	Presentación de cotizaciones: MATERIALES EPP: En consigna quedo que los uniformes y el botiquín se compraran a CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES PEÑALOZA y el restante de la dotación con la empresa RPM . 

CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES PEÑALOZA
NIT 901168389 -1

COTIZACIÓN

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT 900469272
CL 5 7 67 BRR TURBAY, Albania
3227483676

Cotización No. JR10
Fecha de expedición 24/05/2024
Fecha de vencimiento 24/05/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
CHAQUETA, CAMISA Y SOMBRERO DRIL T 30/34 SOMBRERO CON CHAQUETA, ENTERIZO EN DRIL TIPO, COLOR NARANJA CON REFLECTIVOS EN MANGAS, BOTAS Y CONTORNOS TALLAS 28 A LA 42)	$80.000	7	$119.700	$639.300
BORDADO EN PRENDA N.A (Bordado en pecho)	$3.000	7	$3.990	$21.000
BORDADO EN PRENDA N.A (Bordado en espalda)	$9.000	7	$10.640	$56.000
DISEÑO BORDADO LOGO N.A (Diseño del logo en el programa WILCOM (para bordado (se vende a una sola vez))	$15.000	1	$2.850	$15.000

Cotizaciones cincuenta y nueve mil ciento ochenta pesos

Subtotal	$722.000
IVA (19.00%)	$137.180
Total	$859.180

RPM ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE S.A.S.

2

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Se determinó elaborar la topografía con el señor LUIS ALBERTO NAVARRO DIAZ, el cual ofertó su servicios por valor de $ 900.000

COTIZACION TOPOGRAFICA

3.

Se determinó seleccionar la empresa GI DICON INGENIERIA para la elaboración de laboratorios.

4.

5. Se aprobó adquirir la madera a la empresa MADERAS Y MACHIMBRES de San José del Fragua, quienes cuentan con la certificación y salvoconducto respectivo.

3

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



Se Realizó la consulta con la ferretería de la ciudad de Florencia FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S y el precio incluye transporte hasta el sitio de la obra. Por lo tanto, se toma la decisión de adquirir los materiales a FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S.

6.

FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S

NIT 901429482-0

COTIZACIÓN 00003476

4

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

En el proceso de cotización de materiales pétreos se recaudó dos cotizaciones: playa la raya del municipio de Albania y la trituradora de Morelia, se tomo la decisión de comprar el material a la playa la raya debido a que está ubicada en el Municipio de Albania y el trayecto de transporte es menor.

7.

MAEXCA S.A.S
Materiales y Excavaciones del Caquetá

De las cotizaciones presentadas para el alquiler de maquinaria se escogió la que tenia los precios mas favorables para la junta.

8.

COTIZACION

5

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Cotización de exámenes pre-ocupacionales se recibieron dos cotizaciones: CLIP SALUD Y LA DOCTORA MARTHA LUZ ALTAMAR , después de realizada el análisis de precios, se toma la decisión de realizarlos

9.

PRECIOS 2024 _Juntas de acción comunal

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	VALOR UNITARIO
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos- (realizados en jornada de salud, en las instalaciones de la empresa)	$ 50.000
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos-(TELEMEDICINA)	$ 40.000
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular (Ingreso, periódicos, egreso) Realizados en Florencia	$ 25.000

Martha Luz Altamar de los Reyes
Médico especialista SST. Lic. 0245

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se analizaron cada una de las cotizaciones y se tomó la decisión de elegir los proveedores que realizaran los suministros de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____

6

INVIAS

3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI____	NO ___X_	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI____	NO _X___	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
REMITIR LAS ACTAS DEL COMITÉ OPERATIVO	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
ELABORAR EL PLAN DE INVERSION	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
PRESENTAR LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES	CONTADOR	10-05-2024
ENVIAR EXAMENES LABORALES DE INGRESO.	CONTADOR	10 05 2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director de interventoría

Nombre: SIXTO JAVIER PARRA
Cargo: Presidente OAC

Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: Residente de interventoría


Nombre: ALBA ADIELA ZAMBRANO
Cargo: VEEDURIA

7


4.12. ACTAS DE REUNIÓN

Se anexa el acta de socialización



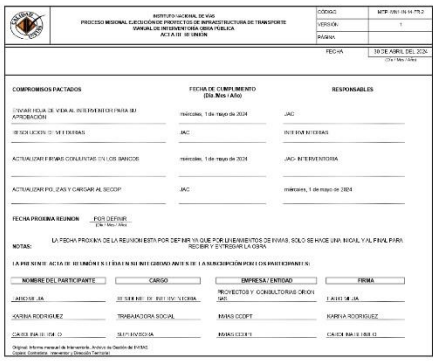

Anexo listado de asistencia

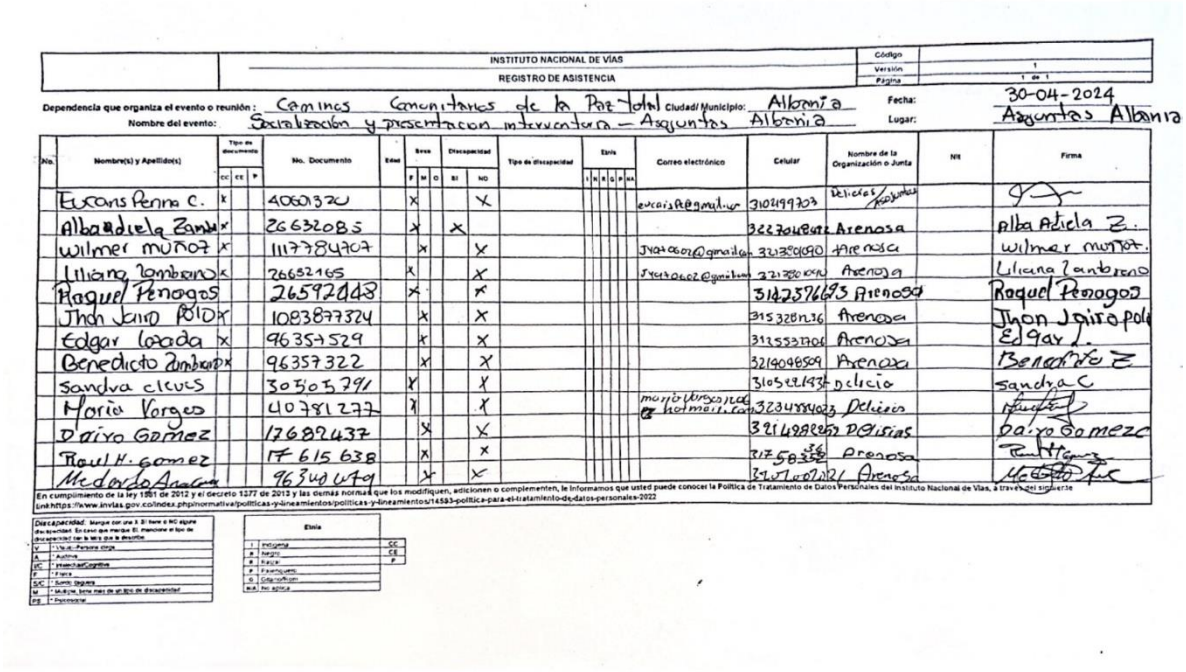

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Dependencia que organiza el evento o reunión: Caminos Comunitarios de la Paz Total Ciudad/ Municipio: Albania Fecha: 30-04-2024
Nombre del evento: Socialización y presentacion interventoria – Asquntos Albania Lugar: Asquntos Albania

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	G	P	RA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIt	Firma
1	Elcans Penna C.	X			4060320		X				X								3102497203	Delicias/Asquntos		
2	Albadiela Zamb	X			26632085		X			X									3227048982	Arenosa		Alba Adiela Z.
3	Wilmer muñoz	X			1117784707		X				X							JVatacoz@gmail.co	3213901090	Arenosa		Wilmer muñoz.
4	Liliana Zambrano	X			26652165		X				X							Svera0402@gmail.com	3213801049	Arenosa		Liliana Zambrano
5	Raquel Penagos				26592048		X				X								3142576693	Arenosa		Raquel Penagos
6	Jhon Jairo Polo	X			1083877324			X			X								3153281736	Arenosa		Jhon Jairo Polo
7	Edgar Lozada	X			96354529			X			X								3115537706	Arenosa		Edgar
8	Benedicto Zambra	X			96357322			X			X								3214048589	Arenosa		Benedicto Z
9	Sandra cleves				30303791		X				X								3105421937	Delicia		Sandra C
10	Maria Vargas				40781277		X				X							mariavargas1cc@hotmail.com	3234884023	Delicias		Maria
11	Daiva Gomez				17689437			X			X								3214882652	Delicias		Daiva Gomez
12	Raul H. gomez				TI 615 638			X			X								317583[illegible]	Arenosa		Raul
13	Medardo Acosta				96340479			X			X								3147607021	Arenosa		Medardo

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14583-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, marcone el tipo de discapacidad con la letra que le describe
V. - Visual - Persona ciega
A. - Auditiva
DC. - Intelectual/Cognitiva
F. - Física
SC. - Sordo- Ciega
M. - Multiple, tiene mas de un tipo de discapacidad
PS. - Psicosocial

Etnia
1 Indígena CC
2 Negro CE
3 Raizal P
4 Palenquero
5 Gitano/Rom
6 No aplica

Powered by CamScanner

1. **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

1.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*
CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*

VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	9 MESES Y 16 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

*Tabla **2**. Información general contrato 4647 de 2023*

1.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- Durante este periodo la interventoría realizo visitas a campo y realizo seguimiento desde la oficina central.
- Se realizó control de calidad a los materiales y agregados para las mezclas de concreto
- Se hizo seguimiento a los desembolsos hechos por las JAC

El porcentaje de avance físico y financiero de interventoría es de 72% correspondiente a $78.750.000

2. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato donde hace referencia el vehículo utilizado por el residente

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS-FLORIDA-DELCIAS-ASOJUNTAS ALBANIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firma
Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo el personal que laboró para PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Anexos planilla paga del mes de AGOSTO de 2024

Anexo certificación del pago de seguridad social del mes de AGOSTO de 2024

ORION 901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoría 4647 de 2023 firmado entre el I**NVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social **(SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de AGOSTO de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 31 días del mes de AGOSTO del 2024

Mabel Perez

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo el avance financiero y presupuestal de interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/8/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: ago-24 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
				TOTAL		$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
4	jul-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2026	$ 109.303.594,00	$ 67.303.594,00		
5	ago-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2027	$ 109.303.594,00	$ 56.803.594,00		
TOTALES		$ 42.525.000,00	$ 9.975.000,00	$ 52.500.000,00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 42.525.000,00	$ -	$ 42.525.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 9.975.000,00	$ 9.975.000,00
VALOR TOTAL	$ 42.525.000,00	$ 9.975.000,00	**$ 52.500.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-37430CND

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato de garantías

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma


Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas

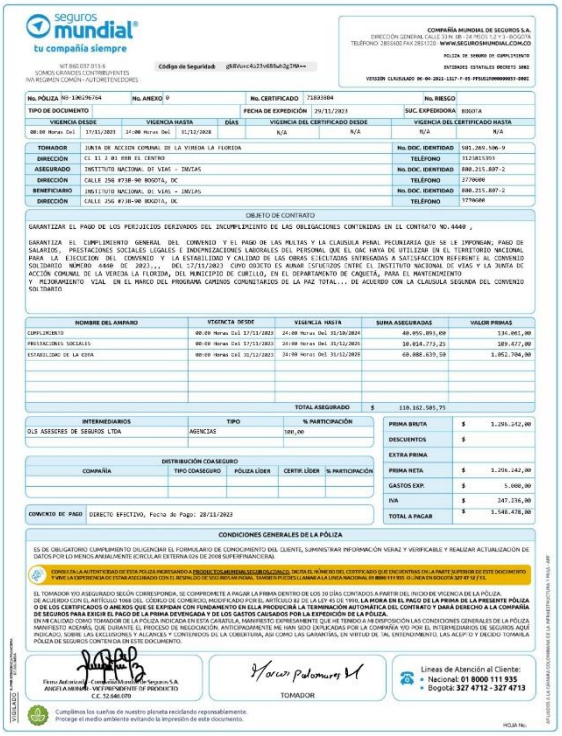

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100196764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	Cl 11 2 81 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770400
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770400

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMINTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023.,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.095.093,60	134.061,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	10.014.773,25	189.477,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.088.639,50	1.052.704,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 110.162.505,75

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.296.242,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.296.242,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	247.236,00
TOTAL A PAGAR	$	1.548.478,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 13 #13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGIE A MIRANDA VICTORIO GERENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.666.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CAL. 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - SOCOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100196764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	300378

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506 9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

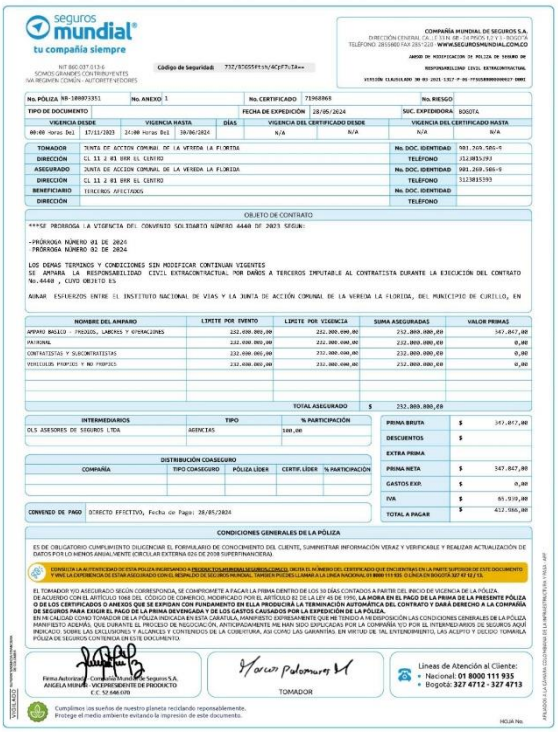

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL 72 NO 10 - 71 PISOS 1 Y 5 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUS0000000027-D001

Código de Seguridad: 732/8C05Sfrsh/4CpF7cIA==

No. PÓLIZA NB-100073351	No. ANEXO 1	No. CERTIFICADO 71960868		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN 28/05/2024		SUC. EXPEDIDORA BOGOTA	
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 30/05/2024		N/A	N/A	N/A N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3124815193
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815193
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRORROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NUMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CIRILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 252.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$ 347.047,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 347.047,00
GASTOS EXP.	$ 0,00
IVA	$ 65.939,00
TOTAL A PAGAR	$ 412.986,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROVEEDOR.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE, ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUPUS - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.680.039

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N.6A - 24 PISOS 1 Y 5 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA NB-100073351	No. ANEXO 1	No. CERTIFICADO 71960868		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN 28/05/2024		SUC. EXPEDIDORA BOGOTA	
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 30/05/2024		N/A	N/A	N/A N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 - Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9. - TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.1 DEL CONVENIO SOLIDARIO. - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

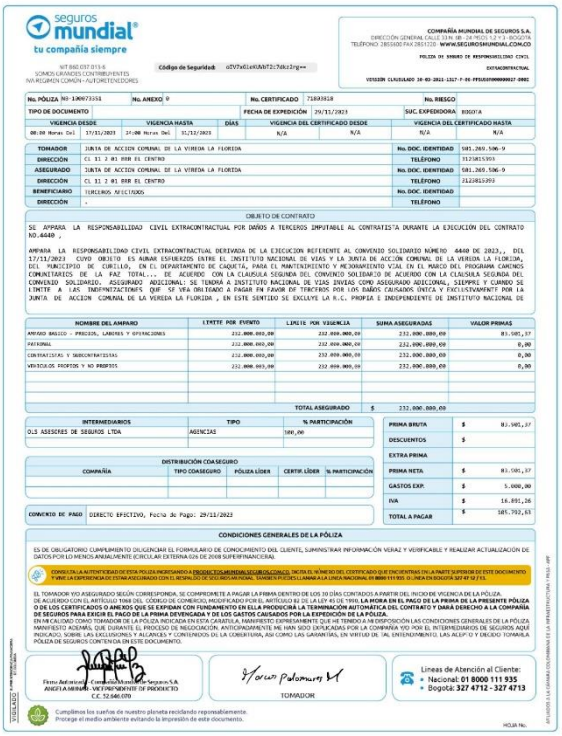

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALL 33 N. 6B-24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851200 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71803818	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 RRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123015393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 RRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123015393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.4640 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,.. DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.505,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
O.S ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	83.505,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.505,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.792,63

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, INCLUYA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRIAM - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CAL. 33 N. 6B-24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851200 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71803818	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADOS IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPURACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:NO.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

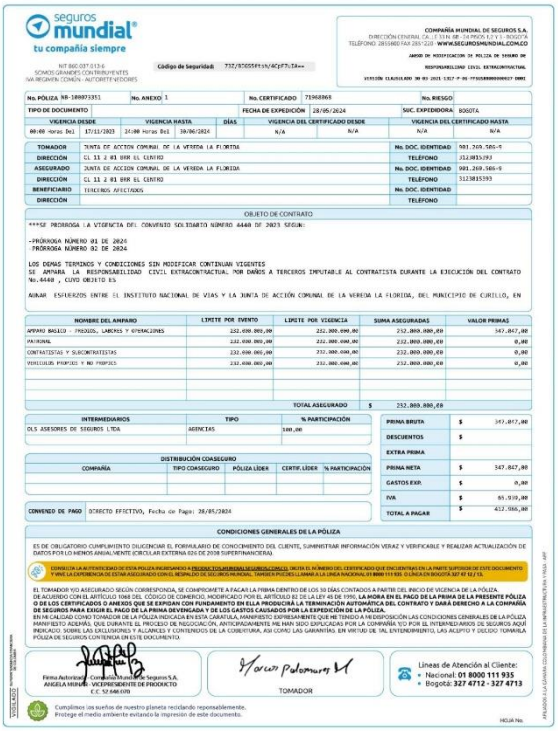

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 732/8C05Ffs3/4CpF7cIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL: CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSU0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3124815192
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815193
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRORROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 252.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$ 347.847,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 347.847,00
GASTOS EXP.	$ 0,00
IVA	$ 65.970,00
TOTAL A PAGAR	$ 412.966,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROVEER TU AMBIENTE EN SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE, ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.600.039

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL: CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSU0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9. , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , – ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

2.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

2.5.1 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Anexo plan de cargas

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-0-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑ — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 7 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva) — PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 16 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 109.303.594,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): —
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 109.303.594,00

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 3230 — DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal	Prima Regional	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha ____: Participación (h-mes)	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		0,50	$ 2.500.000										$ -	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000			1,50	$ 7.500.000
	3	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.000.000		4,00	$ 16.000.000										$ -	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	0,37	$ 1.475.593	0,63	$ 2.000.000			4,9	$ 19.475.593
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 560.000			0,60	$ 1.120.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000										$ -		$ -	0,40	$ 1.120.000		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 560.000			0,60	$ 1.680.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (confirman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00																										$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.500.000																													
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.500.000																													
		Especialista en Estructuras	$ 5.500.000																													
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.500.000																													
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.500.000																													
	1	Inspector	$ 1.200.000		6,00	$ 6.600.000										$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ 600.000	0,00	$ 600.000		$ -			1,0	$ 1.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 574.000										$ -		$ -		$ -	0,24	$ 288.000		$ -		$ -		$ -			0,48	$ 576.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.916.000,00										$ -		$ 5.250.000		$ 6.370.000		$ 6.098.000		$ 5.850.000		$ 3.325.593		$ 4.658.000				$ 34.551.593
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36										0,00		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36				2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.760										$ -		$ 12.390.000,0		$ 15.033.200,0		$ 14.391.280,0		$ 13.806.000,0		$ 7.848.399,7		$ 10.992.880,0				$ 81.541.760

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 110.000	Dia	4,00	$ 440.000										$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 110.000	1	$ 110.000	2	$ 220.000			4,00	$ 440.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 300.000	Mes	13,00	$ 3.900.000										$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000			9,00	$ 2.400.000
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000	Segun comprobante por obra	2,00	$ 5.600.000										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 5.600.000			2,00	$ 5.600.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Segun comprobante por obra	4,00	$ 1.200.000										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 1.200.000			4,00	$ 1.200.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ -	Segun comprobante por obra	-	$ -										$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -			0,00	$ -
	1	Tiquetes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Segun comprobante por obra	2,00	$ 350.000										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 175.000	1	$ 175.000			2,00	$ 350.000
	1	Papeleria (Internet, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos,	$ 80.000,00	Segun comprobante por obra	-	$ -										$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, iip,correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Segun comprobante por obra	4,00	$ 320.000										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 80.000	3	$ 240.000	1	$ 80.000			4,00	$ 320.000
	1	Vivienda Tecnica Comunitaria	$ 38.500,00	Segun comprobante por obra	-	$ -										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00										$ -		$ 300.000		$ 300.000		$ 600.000		$ 965.000		$ 1.045.000						$ 10.310.000
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) = (D)				$ 91.851.760,00										$ -		$ 12.690.000		$ 15.333.200		$ 14.991.280		$ 14.771.000		$ 8.893.400		$ 10.992.880				$ 91.851.760
		* IVA = 19% * (D) = (E)				$ 17.451.834,00										$ -		$ 2.411.100		$ 2.913.308		$ 2.848.343		$ 2.806.400		$ 1.689.746		$ 2.088.647				$ 17.451.834
		* COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594										$ -		$ 15.101.100		$ 18.246.508		$ 17.839.623		$ 17.577.400		$ 10.583.146		$ 13.081.527				$ 109.303.594
		*																														
		*																														

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS														

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se consideraró necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras; sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoria. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma: Leyd Perez
Nombre: LEIYD MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
NOMBRE: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ la vereda arenosa, desarrolla las actividades programadas a la fecha, sin presentar atrasos en las obras contratadas.

3.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

En el mes de agosto no se generó correspondencia

3.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

	
Vaciado de concreto reforzado	**Vaciado de concreto reforzado**
	
Vaciado de concreto reforzado	**Vaciado de concreto reforzado**

	
Vaciado de concreto reforzado y ciclópeo	**Vaciado de concreto reforzado y ciclópeo**
	
Vaciado de concreto reforzado y ciclópeo	**Vaciado de concreto reforzado y ciclópeo**





Vaciado de concreto reforzado y ciclópeo

3.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

A la fecha no se han presentado actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad

3.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

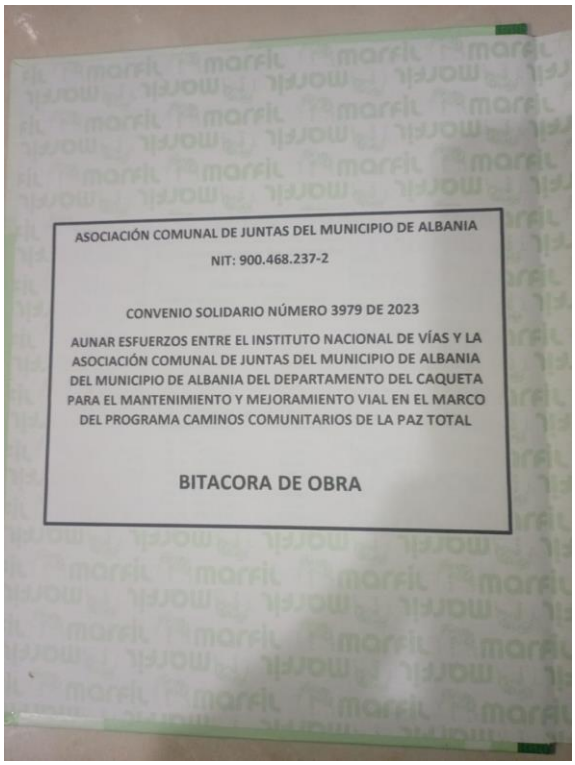

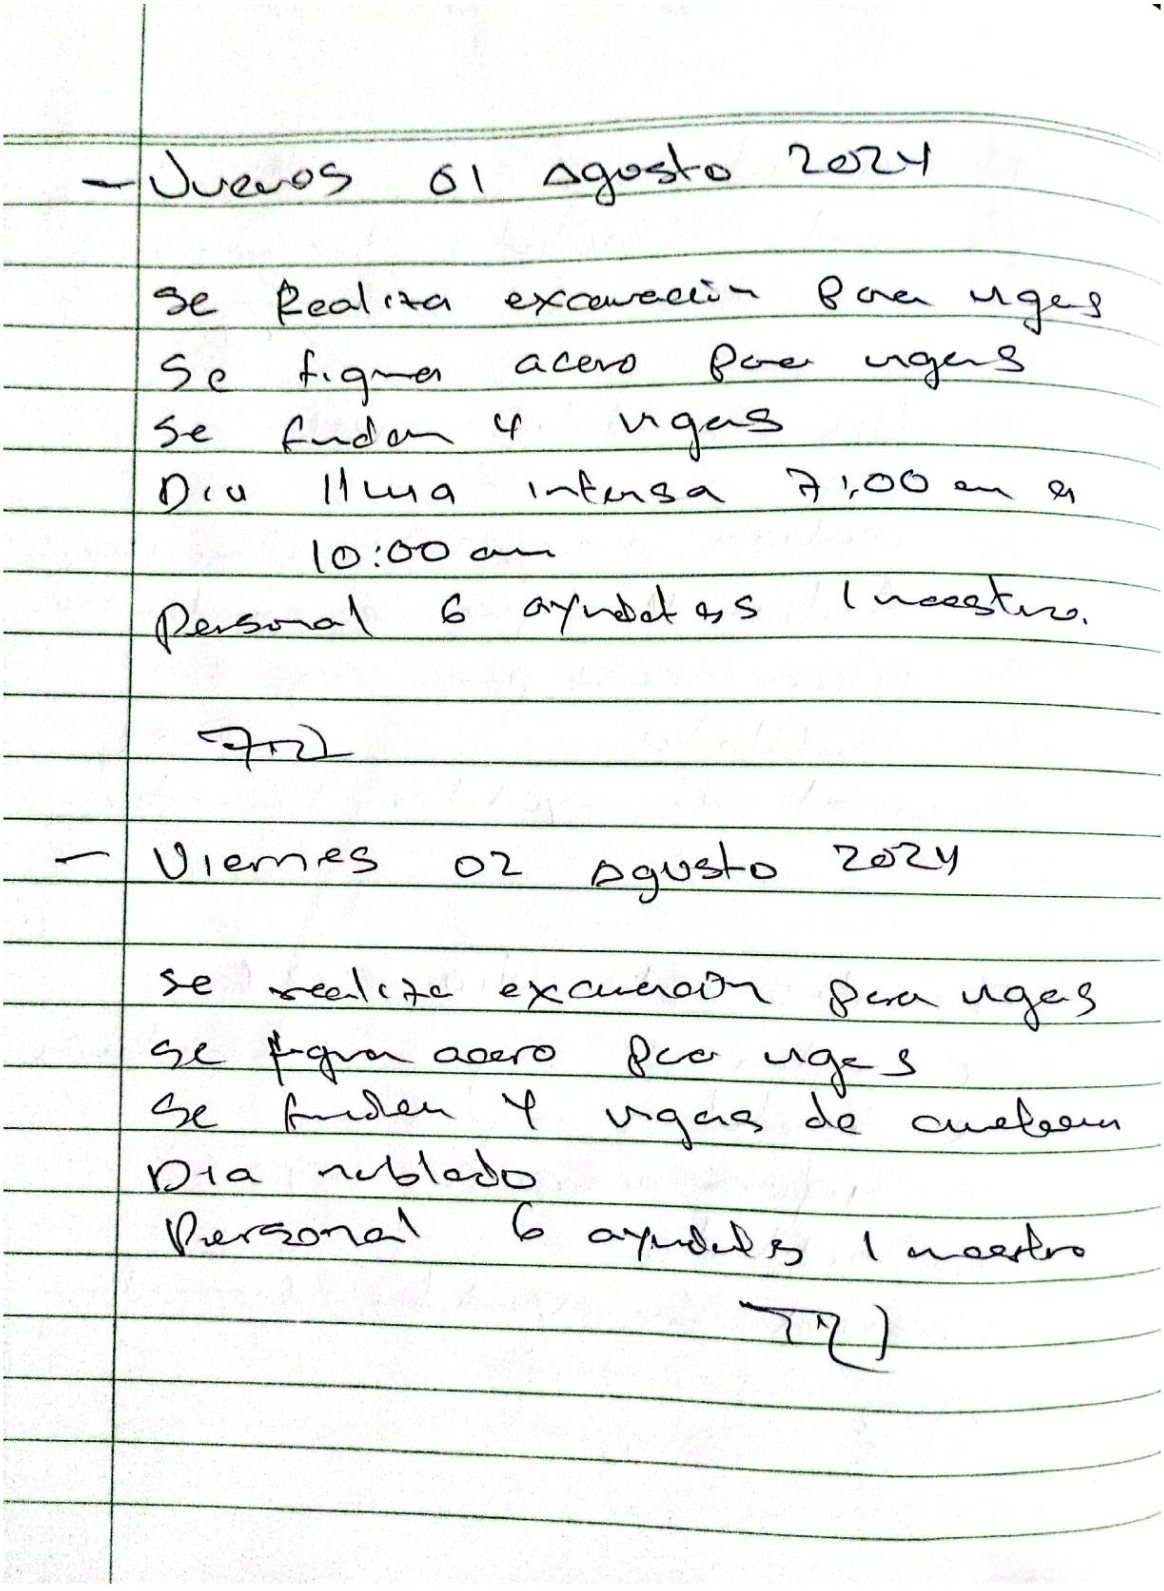


- Jueves 01 agosto 2024

Se Realiza excavación para vigas
Se figura acero para vigas
Se funden 4 vigas
Día lluvia intensa 7:00 am a 10:00 am
Personal 6 ayudantes 1 maestro.

- Viernes 02 agosto 2024

se realiza excavación para vigas
se figura acero para vigas
Se funden 4 vigas de cimentación
Día nublado
Personal 6 ayudantes 1 maestro

Powered by CamScanner

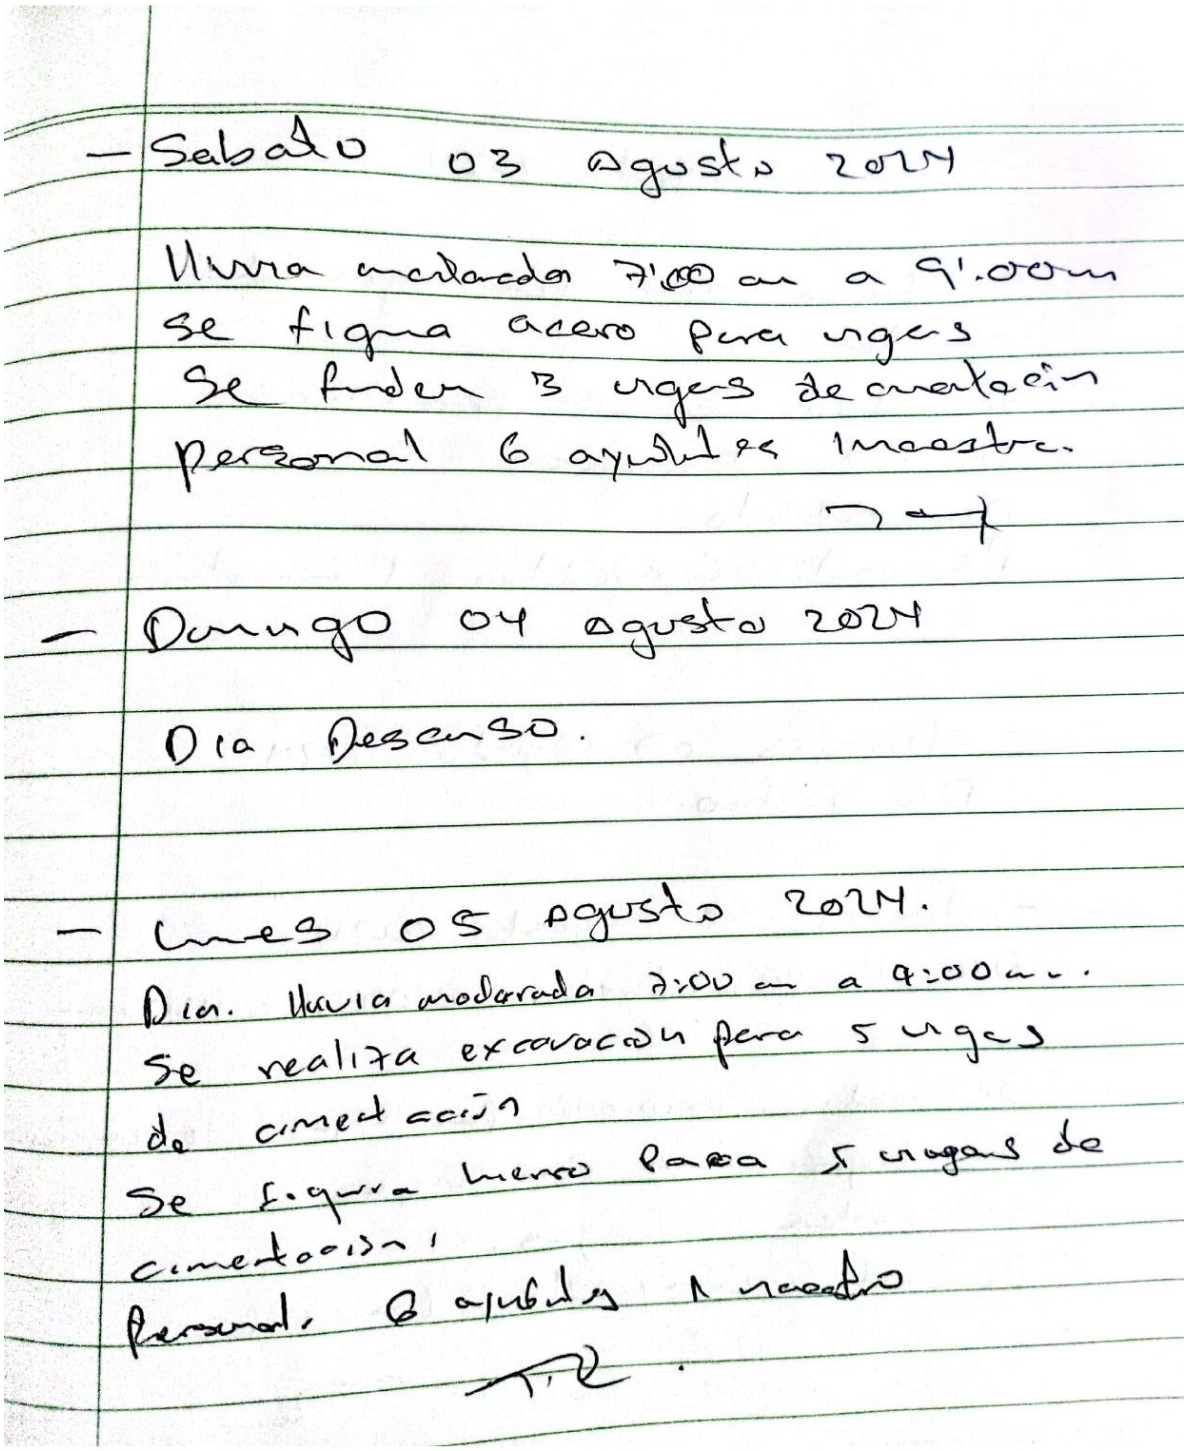

— Sabado 03 agosto 2024

Lluvia moderada 7:00 am a 9:00 am
se figura acero para vigas
Se funden 3 vigas de cimentacion
personal 6 ayudantes 1 maestro.


— Domingo 04 agosto 2024

Dia Descanso.

— Lunes 05 agosto 2024.

Dia. lluvia moderada 7:00 am a 9:00 am.
Se realiza excavacion para 5 vigas
de cimentacion
Se figura hierro para 5 vigas de
cimentacion.
Personal. 6 ayudas 1 maestro

Powered by CamScanner

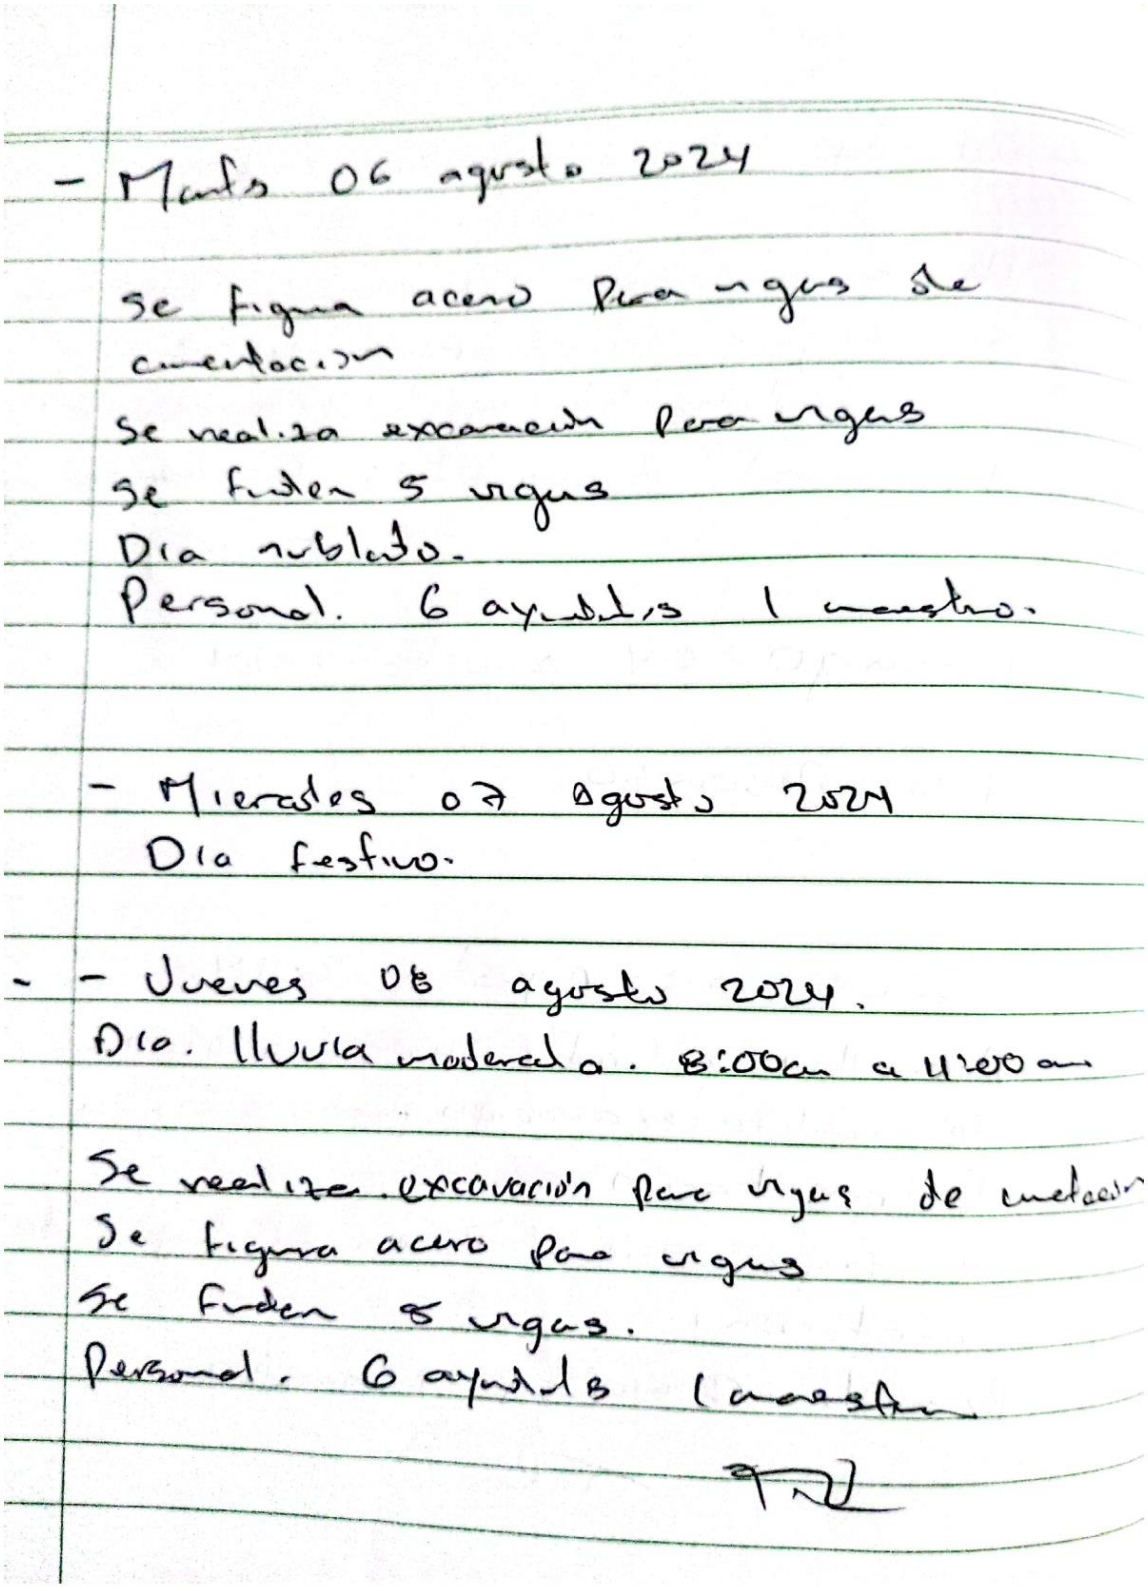

- Martes 06 agosto 2024


Se figura acero para vigas de cimentacion
Se realiza excavacion para vigas
Se funden 5 vigas
Dia nublado.
Personal. 6 ayudas 1 maestro.

- Miercoles 07 Agosto 2024
Dia festivo.

- - Jueves 08 agosto 2024.
Dia. lluvia moderada. 8:00am a 11:00 am

Se realiza excavación para vigas de cimentacion
Se figura acero para vigas
Se funden 8 vigas.
Personal. 6 ayudas 1 maestro.

Powered by CamScanner

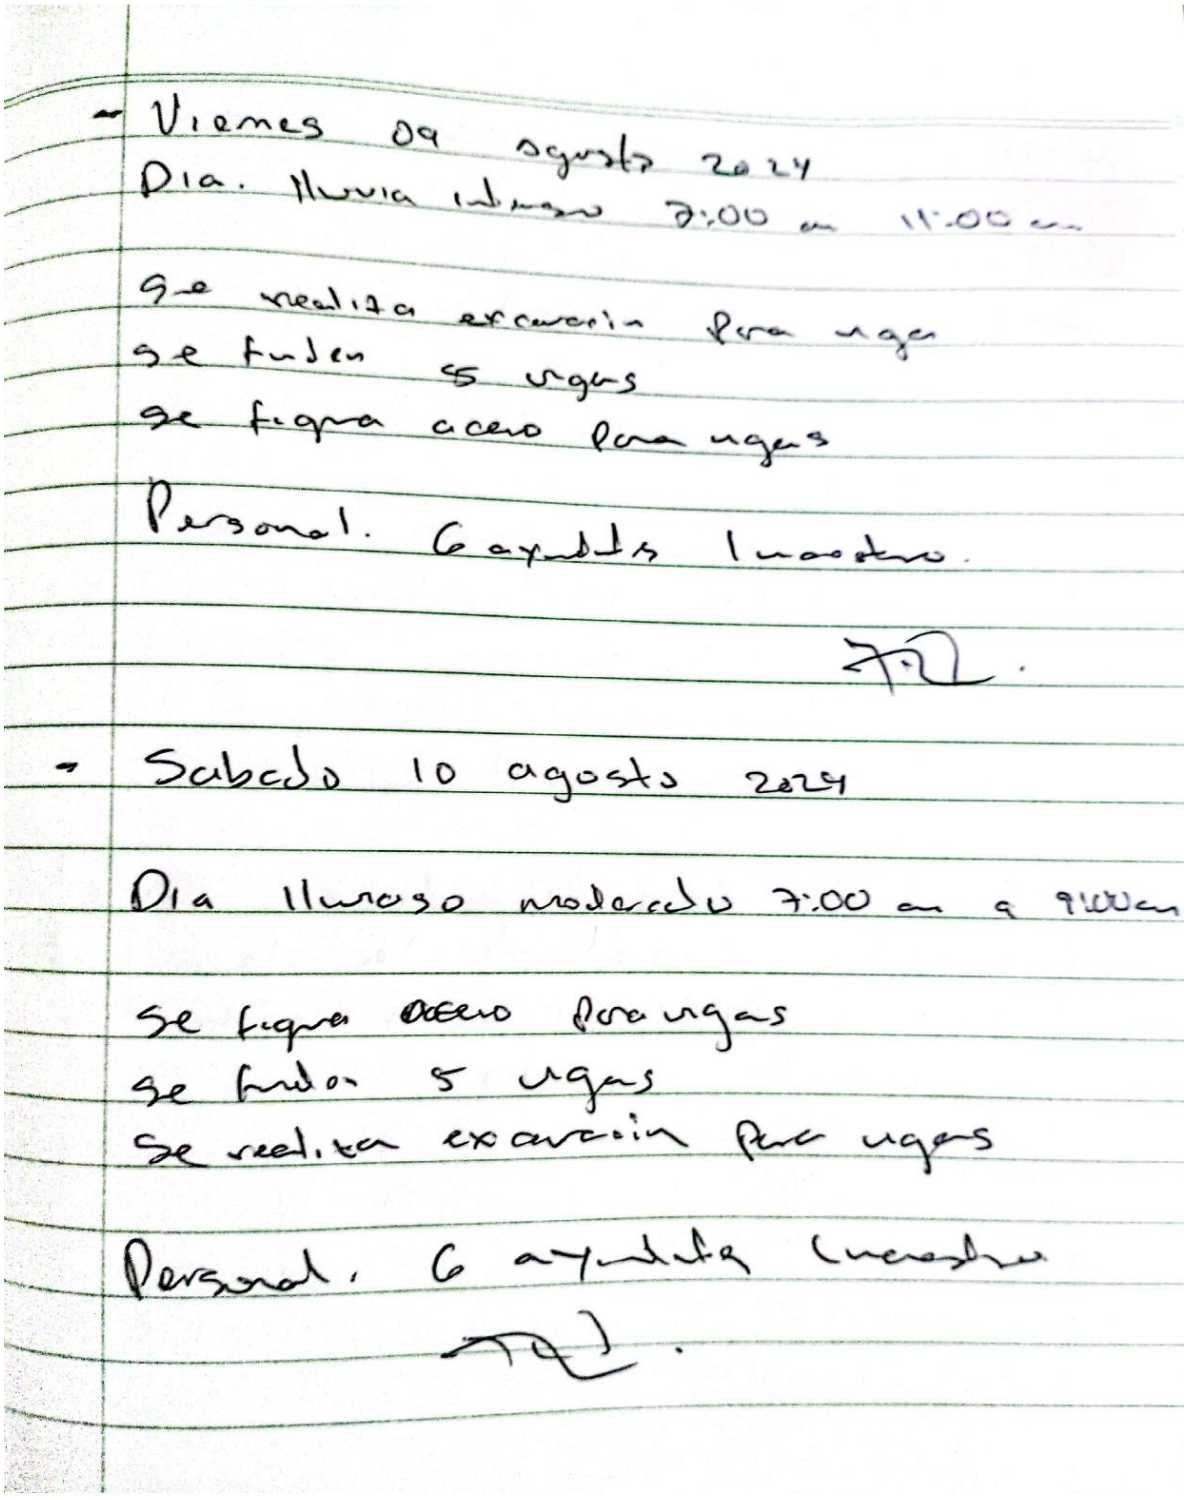

- Viernes 09 agosto 2024
Dia. lluvia intenso 7:00 am 11:00 am

se realiza excavacion para vigas
se funden 5 vigas
se figura acero para vigas

Personal. 6 ayudas 1 maestro.


- Sabado 10 agosto 2024

Dia lluvioso moderado 7:00 am a 9:00 am

se figura acero para vigas
se funden 5 vigas
se realiza excavacion para vigas

Personal. 6 ayudas 1 maestro

Powered by CamScanner

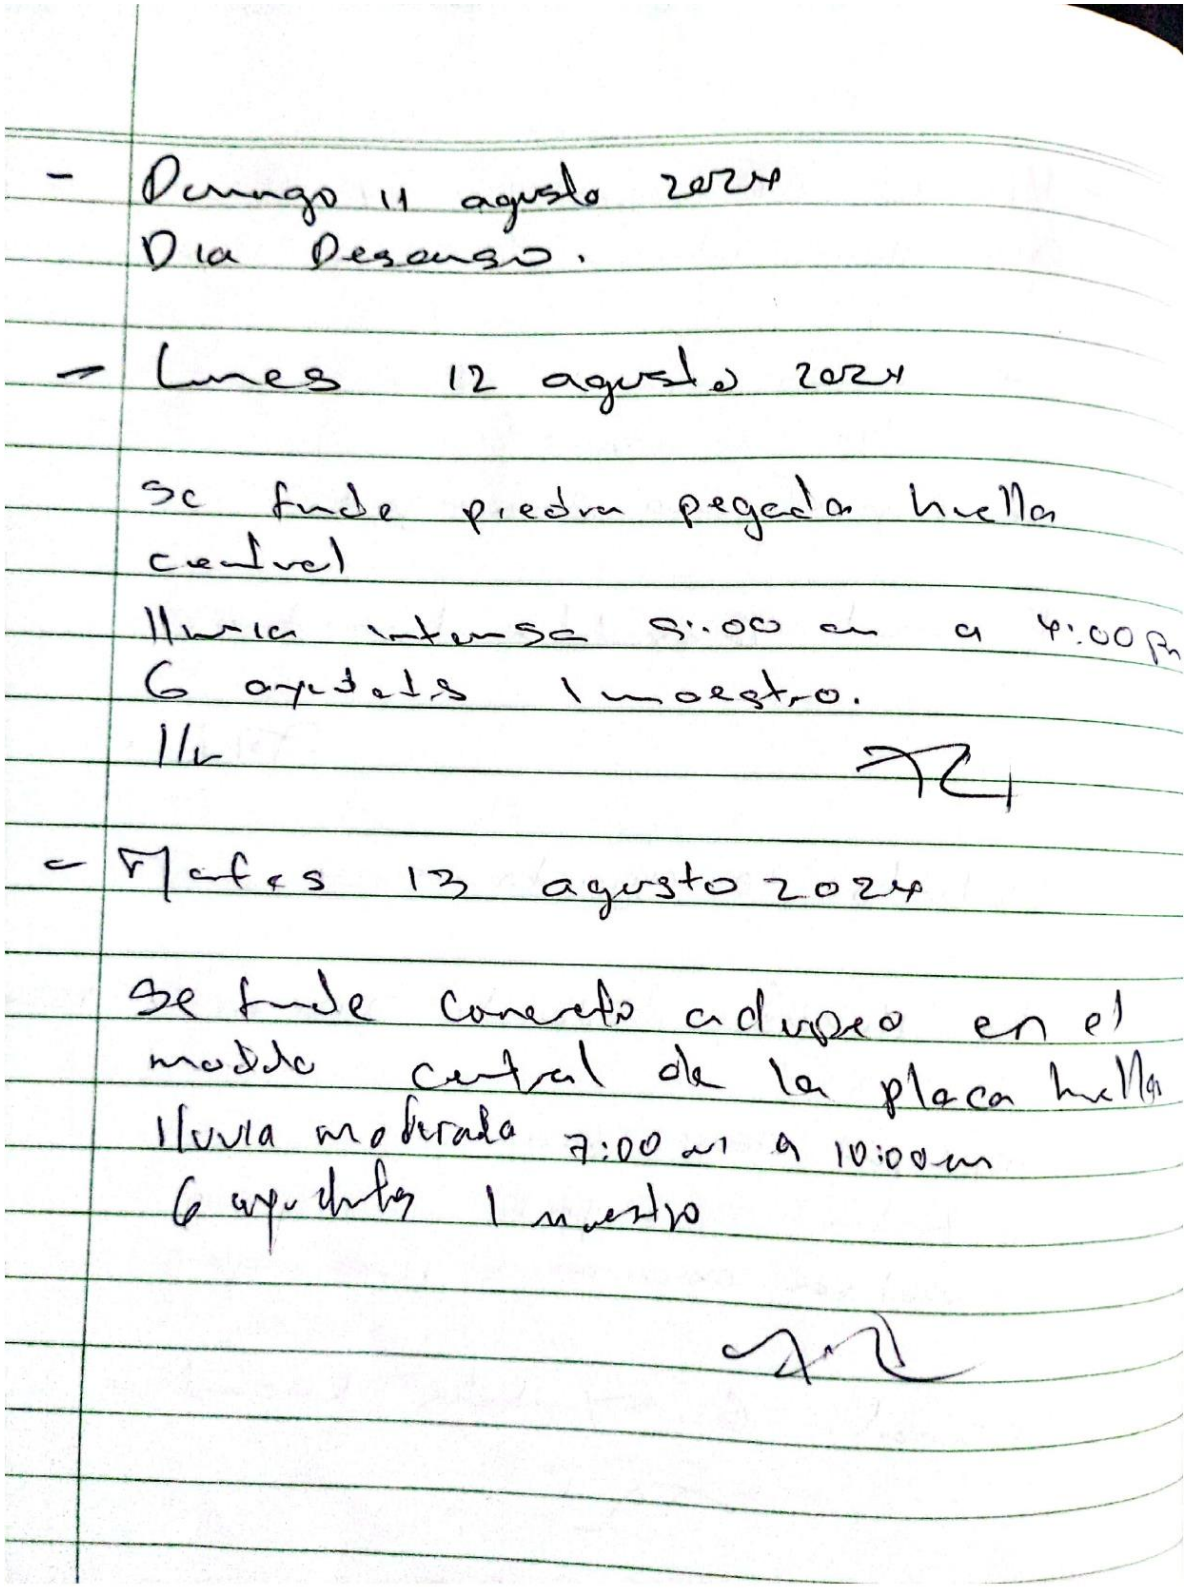

- Domingo 11 agosto 2024
Dia Descanso.


- Lunes 12 agosto 2024

Se funde piedra pegada huella central
Lluvia intensa 9:00 am a 4:00 pm
6 ayudas 1 maestro.
HL

- Martes 13 agosto 2024

Se funde concreto adicional en el modulo central de la placa huella
Lluvia moderada 7:00 am a 10:00 am
6 ayudantes 1 maestro

Powered by CamScanner

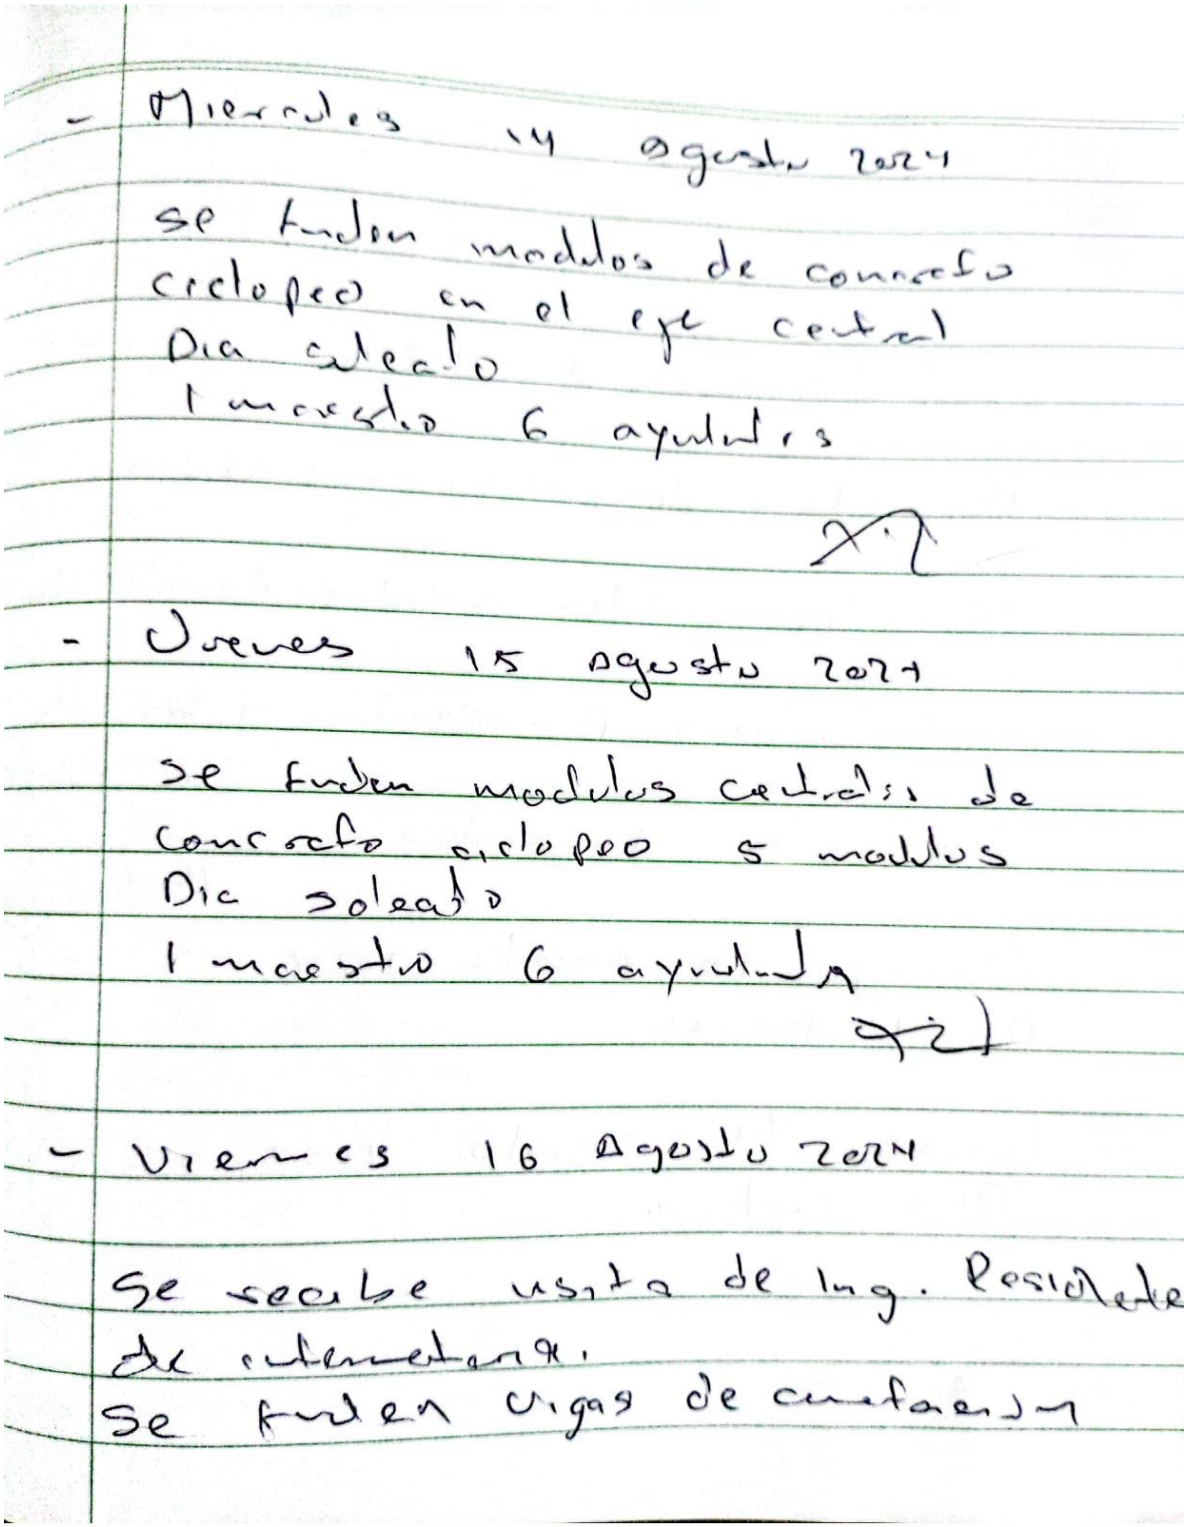

- Miercoles 14 agosto 2024

se funden modulos de concreto ciclopeo en el eje central
Dia soleado
1 maestro 6 ayudantes


- Jueves 15 agosto 2024

se funden modulos centrales de concreto ciclopeo 5 modulos
Dia soleado
1 maestro 6 ayudantes

- Viernes 16 Agosto 2024

Se recibe visita de Ing. Residente de interventoria.
Se funden vigas de cimentacion

Powered by CamScanner

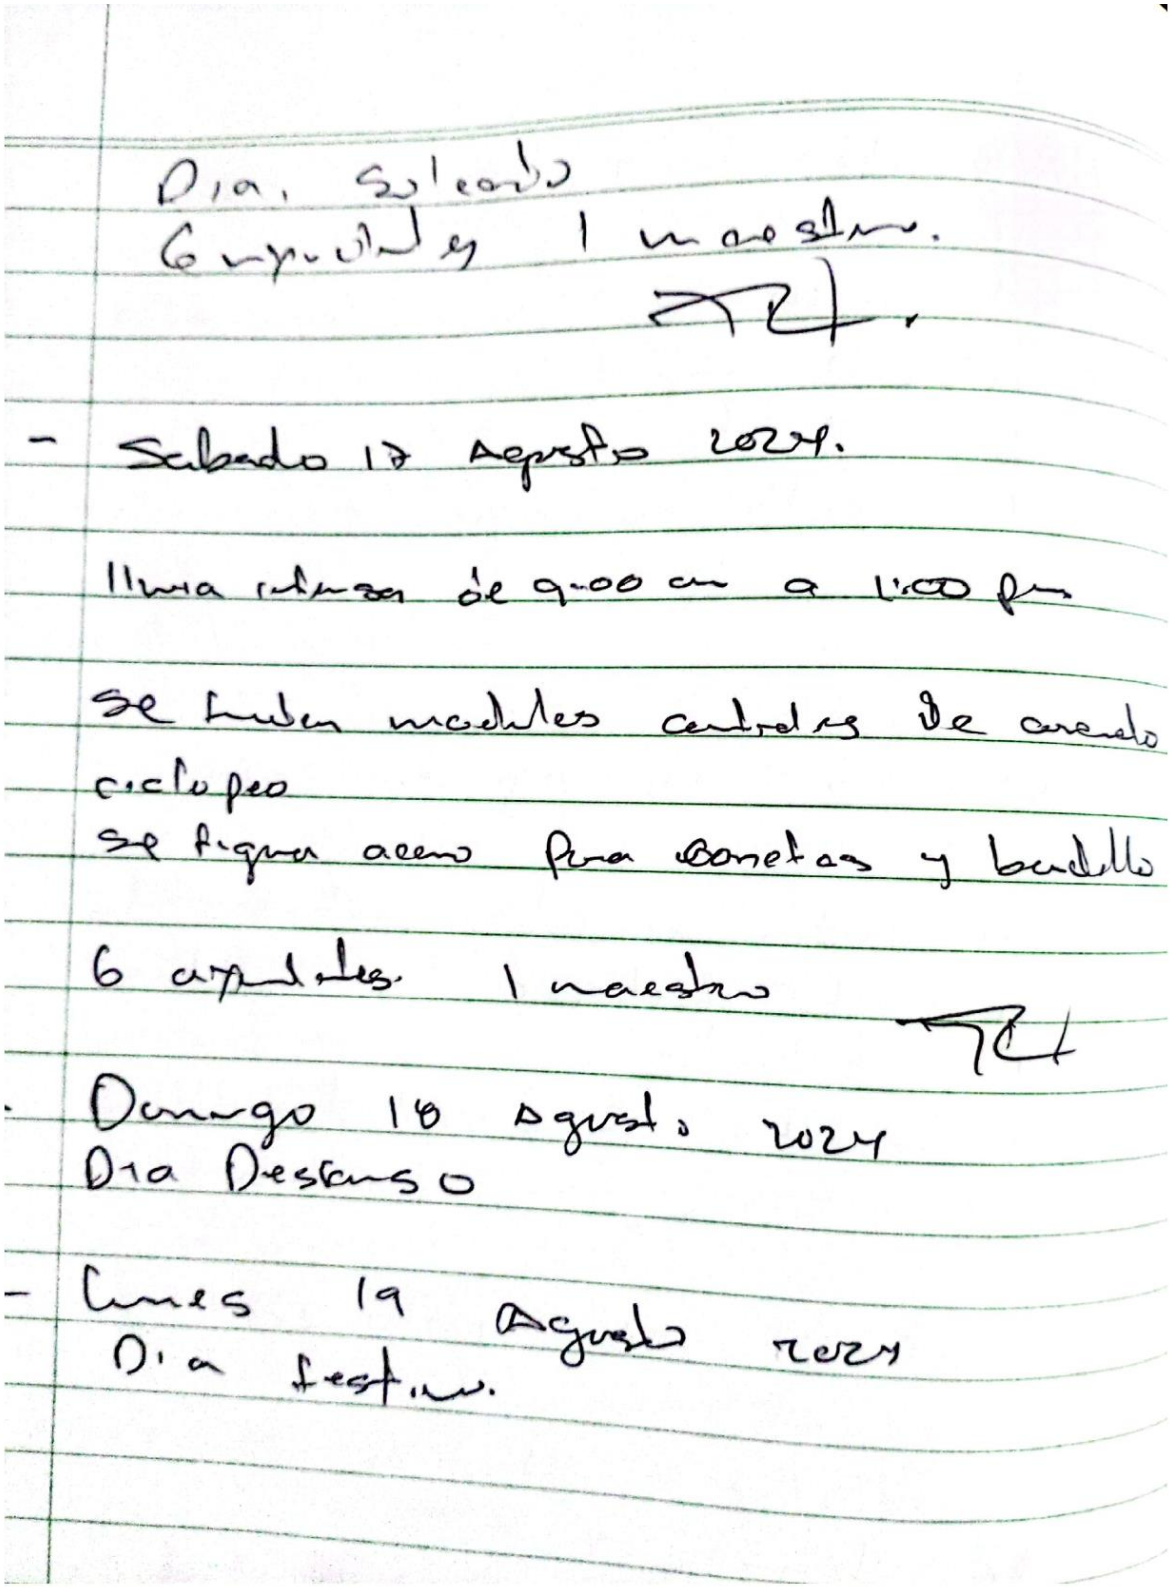

Dia. Sabado
6 ayudantes 1 maestro.

- Sabado 17 Agosto 2024.

lluvia intensa de 9:00 am a 1:00 pm


se hacen modulos centrales de concreto ciclopeo
se figura acero para bonetas y bordillo

6 ayudantes. 1 maestro

- Domingo 18 Agosto 2024
Dia Descanso

- Lunes 19 Agosto 2024
Dia festivo.


Powered by CamScanner

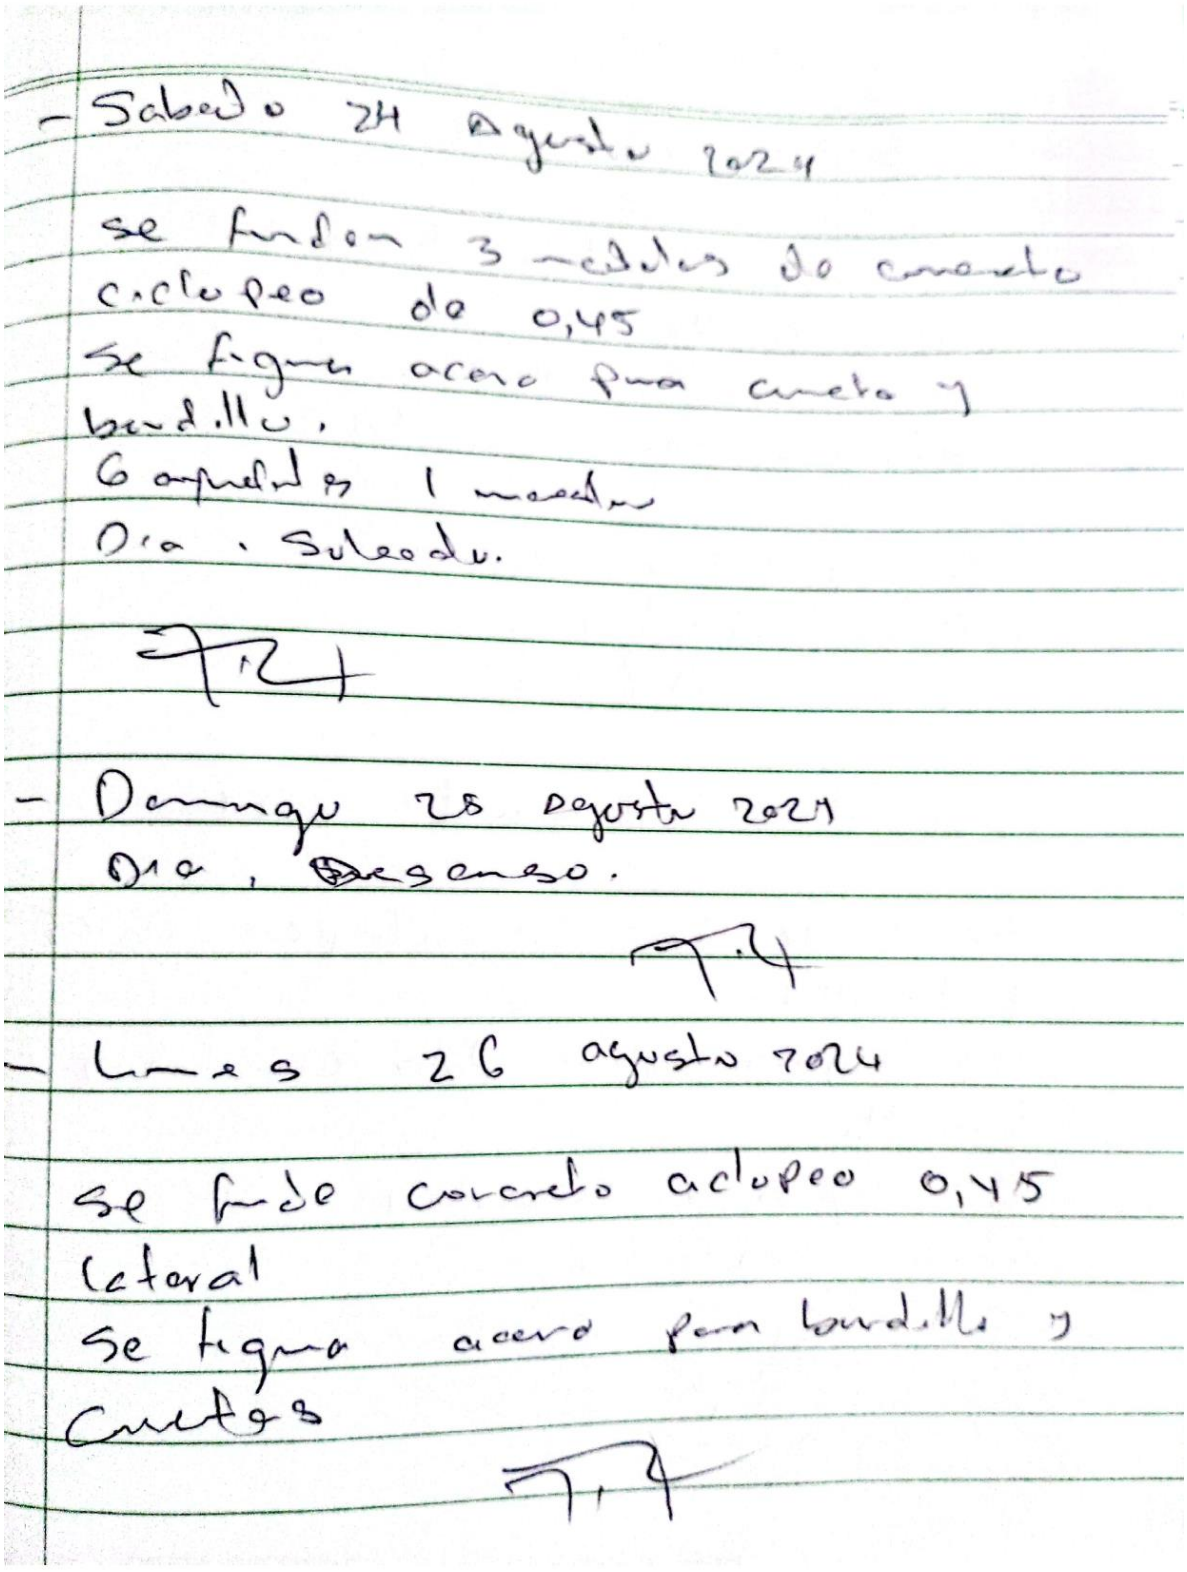
- Sabado 24 Agosto 2024
se funden 3 cubos de concreto ciclopeo de 0,45
se figura acero para cuneta y bordillo.
6 empleados 1 maestro
Dia . Sabado.

- Domingo 25 Agosto 2024
Dia . descanso.

- Lunes 26 agosto 2024
se funde concreto ciclopeo 0,45 lateral
se figura acero para bordillo y cunetas

Powered by CamScanner

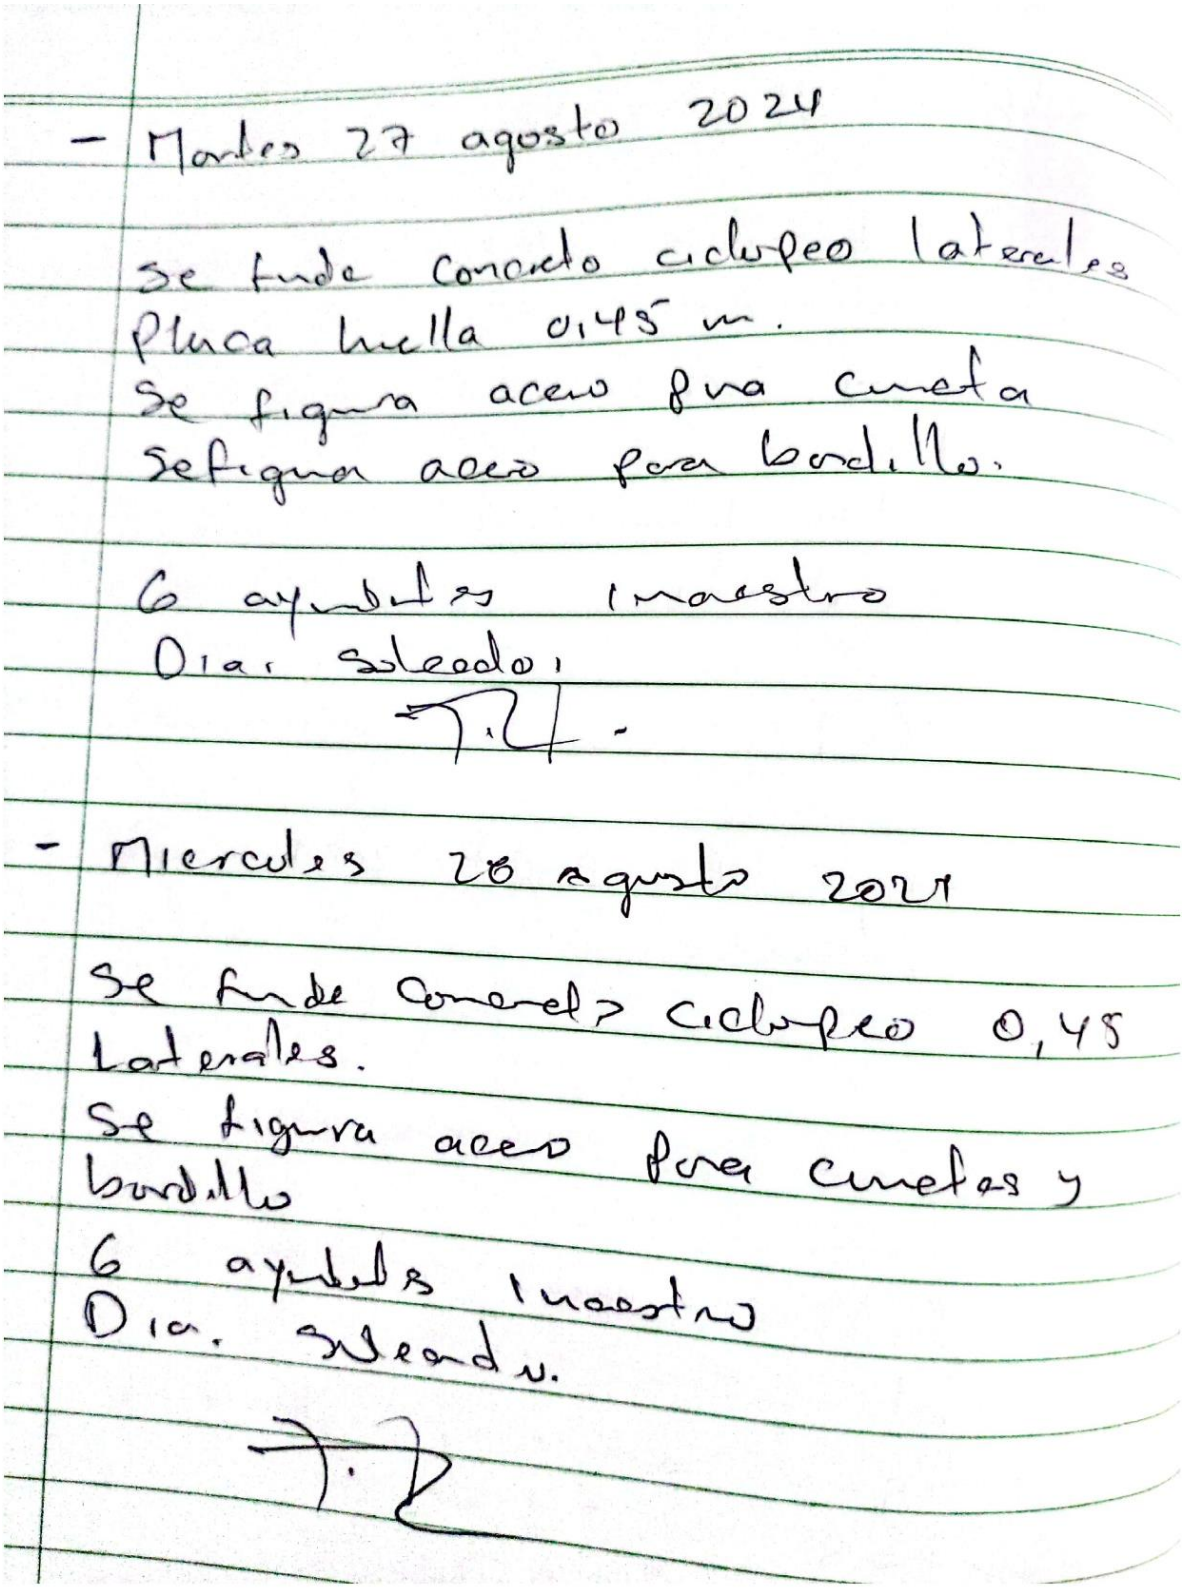

- Martes 27 agosto 2024

Se funde concreto ciclopeo laterales
Placa huella 0,45 m.
Se figura acero pra cuneta
Se figura acero para bordillo.

6 ayudantes 1 maestro
Dia. Soleado.

7.2.

- Miercoles 28 agosto 2024

Se funde concreto ciclopeo 0,45
Laterales.
Se figura acero para cunetas y
bordillo
6 ayudantes 1 maestro
Dia. soleado.

7.2

Powered by CamScanner


- Jueves 29 agosto 2024

Se funde concreto ciclopeo lateral 0,45
Se figura acero para cunetas y bordillo.
6 ayudantes 1 maestro
Dia. Soleado.

- Viernes 30 agosto 2024.

Se formaleta bordillo y cunetas
Se instalan aceros para bordillos y cunetas
se recibe visita del ing. residente de interventoria
Dia. soleado
6 ayudantes 1 maestro.

Powered by CamScanner

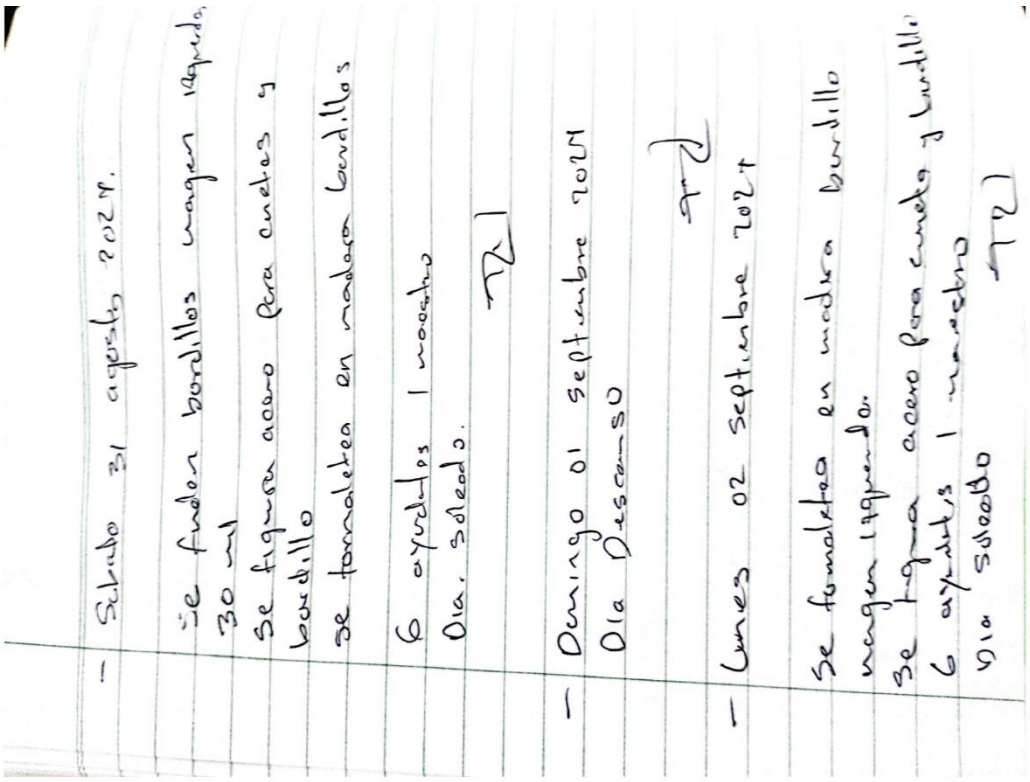

Firma:_
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°05

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3674 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *Supervisor del contrato*
Fecha: *31 de AGOSTO de 2024*	***Fecha:*** *31 de AGOSTO de 2024*	***Fecha:*** *31 de AGOSTO de 2024*

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3674 de 2023 **Contratista:** JAC VEREDA DELICIAS

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	69
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	70
1	**INTRODUCCIÓN**		73
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		73-75
2.1	Localización		75
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		76
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		76-77
2.4	Características técnicas del proyecto		78-79
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		80
3.1	Información general del contrato		80
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		81
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		81
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		81
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		82
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	82-85
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	86
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	86
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	86
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	86
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	86-88
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	88-89
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		90
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	90
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	90
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	90
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		90
5.1	Información general del contrato		90-91
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		91
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	91
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	91
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	91
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	91-92
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		92
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	92
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		92
8	**Anexos**		93
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		93
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		93
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		93
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		93

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que el contratista ya inicio obra. Y presenta un avance físico y financiero del 80,34%

NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 3674- 2023

OBJETO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/04/2024
PLAZO DE VENCIMIENTO ACTUAL 16/10/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.548.773,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): 0
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 0
ANTICIPO CONCEDIDO: 0
ANTICIPO AMORTIZADO: 0

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	161
	ALCANTARILLA DE 36"	UNIDAD	1
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML		
	ALCANTARILLA	UND	23,64%	80,34%
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 121.420.500,03	28.481.562,97	$ 149.902.063,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALI			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEM			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 123.433.098,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 120.433.098,66
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	80,34%

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 91.530.000,00	21.470.000,00	$ 113.000.000,00	
AJUSTES				$ 0,80
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SE				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 113.000.000,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VACIADO DE CONCRETO CICLPEDO







VACIADO DE CONCRETO REFORZADO Y ADECUACION DE BORDILLOS Y CUNETA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoria
Matricula Profesional No 252237430CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. LOCALIZACIÓN 7
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3674 de 2023 11
3.1INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 12
3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
4.1. INFORME SEMANAL 12
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 19
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 23
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 23
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 24
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 26
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 33
4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 33
4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 34
4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 35
4.12. ACTAS DE REUNIÓN 37
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 21
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL……22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS……24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.06** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

2.1.2 hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **Convenio No. 3674 con número de proceso SPSC-CD-CS-419-2023, ID de contrato y que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Currillo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.
.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en la vereda DELICIAS se localizan en las siguientes coordenadas:

PUNTO 1 ALCANTARILLA (ANTIGUA ESCUELA): 2° 04' 40,3168" N 72° 43' 05,7711" W

PUNTO 2 PLACA HUELLA (ANTIGUA ESCUELA): 2° 04' 02,9242" N 72° 42' 07,1726" W



Figura 2-2 Ubicación del tramo a mejorar en la vereda Las delicias.

Ilustración 4 - Localización del tramo a intervenir en la vereda Delicias
Fuente: TOPOGRAFIA VEREDA DELCIAS

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), **vereda las delicias**, florida del municipio de Currillo y la vereda iglesias del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

CONVENIO 3674 – 2023:

OBJETO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

La vereda Delicias del Municipio de Albania está ubicada aproximadamente a 8 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas la unión, Berlín y la 76, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 13 km.

El tramo a intervenir está ubicado cerca al puente quebrada grande el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

En la vía no hay obras de arte

Ilustración 5 – Inventario y estado inicial de la vía
Fuente: FICHA VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO DE VÍAS – INVIAS

3.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE*

	DRENAJE Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 3674 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLAS DE 36".Y 156 ML DE PLACA HUELLA LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.* *LA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON TUBOS DE 36" DE CONFIGURACIÓN TIPO ALETA-ALETA LA CUAL PERMITE, ADEMÁS DE RECIBIR Y EVACUAR LA ESCORRENTÍA APORTANTE POR LAS CUNETAS Y FILTROS, DAR CONTINUIDAD A CAUCES CON FLUJOS INTERMITENTES O EFÍMEROS.*

Tabla 4. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3674 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA LAS DELICIAS

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 3674 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPSC-CD-CS-419-2023*
CONVENIO NO.	*3674 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*

CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS*
NIT	*901.648.219-6.*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$198.548.773*
APORTE EN ESPECIE OAC	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 199.548.773*
ADICIONES	*$ 0.00*
FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 2	*16 DE OCTUBRE DEL 2024*

Tabla 5. Información general convenio 3674 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizó corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas

- **CONCRETO 21 MPA:** Vaciado de concreto para las huellas de las vías

En el transcurso del mes se vaciaron concreto para las huellas reforzadas y concretas ciclópeas, El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 80,34%correspondiente a un valor de $120.433.098,66

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y

procesos constructivos del proyecto

Control de calidad en los materiales y agregados para las mezclas de concreto

Toma de muestras de concretos para los cilindros

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Semana 1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

Código | Versión | Página 1 | Fecha 7/08/2024 (dia/ mes / año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 16 del 1/08/2024 al 7/08/2024 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 161 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE F'Y=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS	INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.		
		INTEGRANTES:	UNICO		
CONVENIO No.	3674 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.548.773,00	CONTRATO No.	4647 DE 2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.548.773,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024

VALOR INICIAL:	$	109.303.594,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	109.303.594,00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 85.466.549			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 114.082.224			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.902.063,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 100.000.000,00	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 90.000.000,00	45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 10.000.000,00	5%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.716.549,33	33%
PASA	$ 4.497.062,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 55.000.000,00	37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 85.466.549,33	57,01%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 30.466.549,33	20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.000.000,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.500.000,00	5%

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	38,4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 37% Avance o Atraso Físico % -20,3%
Meta Física Ejecutada % 57,0%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Alcatarillas 36"	Unidad	1
P.LACA HUELLA	ML	161

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla-placa huella			$ 55.000.000,00	57,0%
Ejec				$ 85.466.549,33	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DELICIAS
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: SE ESTÁ ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, ADICIONAL SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FECHA PAGA SE REEMPLAZO POR EL PMA

OBSERVACIONES: ¡¡SE ESTA ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL
SE INSTALO LA CAJA DE PQRS EN EL CAMPAMENTO DE LAS DELICIAS

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

despues de vaciar las huellas de concreto reforzado, se le da inicio a las vigas transversales de de la placa huella, se instalo refuerzo y se vacio concreto de 3000 psi

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las vigas y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE LAS HUELLAS Y VIGAS



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE LAS HUELLAS Y VIGAS TRANSVERSALES



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE LAS HUELLAS Y VIGAS TRANSVERSALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202164774CND

Semana 2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	1
FECHA	14/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 17 del 8/08/2024 al 14/08/2024 Ultimo Informe Semanal NO ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 161 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONVENIO No.	3674 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.548.773,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.548.773,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 93.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 106.548.773			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.902.063,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 105.000.000,00	53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 95.000.000,00	48%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 10.000.000,00	5%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.716.549,33	33%
PAGA	$ 4.497.062,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.000.000,00	69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.000.000,00	62,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 10.000.000,00	7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.000.000,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.500.000,00	5%

Observaciones: la obra presenta un avance del 62,04 % se esta ejecutando el vaciado de vigas transversales a la via. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 33%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.625.000,00	40,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VEREFICACIÓN DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 69% Avance o Atraso Físico %: 6,7%
Meta Física Ejecutada %: 62,0%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
alcalatarillas 36"	Unidad	1
PLACA HUELLA	ML	161

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla- placa huella			$ 103.000.000,00	62,0%
Ejec				$ 93.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DELICIAS TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN	PERMISO MINERO	DISPONIBLE	LICENCIA AMBIENTAL	DISPONIBLE
CAQUETA	SI	NO	SI	NO
MAEXCA SAS	SI X	NO	SI X	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:
SE ESTÁ ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, ADICIONAL SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES: ¡SE ESTA ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 30 DE ABRIL
SE INSTALÓ LA CAJA DE PQRS EN EL CAMPAMENTO DE LAS DELICIAS

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con el vaciado de las vigas transversales de de la placa huella, se instaló refuerzo y se vació concreto de 3000 psi

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las vigas y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE LAS HUELLAS Y VIGAS



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE LAS HUELLAS Y VIGAS TRANSVERSALES



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE LAS HUELLAS Y VIGAS TRANSVERSALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 252056474CND

Semana 3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	1
FECHA	22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALE: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 18 del 15/08/2024 al 22/08/2024 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 161 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICION DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONVENIO No.	3674 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.548.773,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.548.773,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 105.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 94.548.773		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000	$ 78.750.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594	$ 30.553.594		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.902.063,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 108.000.000,00	54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 103.000.000,00	52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.000.000,00	3%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.716.549,33	33%
PAGA	$ 4.497.062,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.000.000,00	71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105.000.000,00	70,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.000.000,00	1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.000.000,00	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.000.000,00	6%

Observaciones: la obra presenta un avance del 70,05% se esta ejecutando el vaciado de vigas transversales a la via y el vaciado del ciclopado. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 33%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.750.000,00	72,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VEREIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 71% Avance o Atraso Físico %: 1,3%

Meta Física Ejecutada %: 70,0%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
alcaltarillas 36"	Unidad	1
PLACA HUELLA	ML	161

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla- placa huella			$ 107.000.000,00	70,0%
Ejec				$ 105.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DELICIAS TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES: ; EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14 CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 1G DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con el vaciado de las vigas transversales de de la placa huella, se instaló refuerzo y se vació concreto de 3000 psi, tambien se vacio concreto ciclopeo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las vigas y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE CICLOPEDO Y VIGAS



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE CICLOPEDO Y VIGAS TRANSVERSALES



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE CICLOPEDO Y VIGAS TRANSVERSALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Semana 4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | SEMANA No.: 19 del 23/08/2024 al 31/08/2024 | Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCIÓN DE 161 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 36", CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONVENIO No. 3874 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.548.773,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO
CONTRATO No. 4647 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.548.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 120.433.099		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 79.115.674		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000	$ 88.934.531		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594	$ 20.369.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.902.063,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.000.000,00	47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91.000.000,00	46%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.000.000,00	2%
ADMINISTRACIÓN	$ 29.433.098,66	14,7%
PAGA	$ 4.497.062,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 123.433.098,66	82,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120.433.098,66	80,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.000.000,00	2,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.000.000,00	8,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.000.000,00	6,0%

Observaciones: la obra presenta un avance del 80,34% se esta ejecutando el vaciado de concreto ciclopedo. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 14,7%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a dispones para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 88.934.531,00	81,4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO

VALOR FACTURA: $ 10.184.531,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VEREFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 82% | Avance o Atraso Físico %: 2,0%
Meta Física Ejecutada %: 80,3%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
alcatarillas 36"	Unidad	1
PLACA HUELLA	ML	161

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla-placa huella			$ 123.433.098,66	80,3%
Ejec				$ 120.433.098,66	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA		
VIBRO COMPACTADOR		
MEZCLADORA	1	1
PLANTA ELECTRICA	1	1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA DELICIAS | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZO POR EL PMA

OBSERVACIONES: : EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CAMPAMENTO VEREDA DELICIAS

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con el vaciado de concreto ciclopeado de 45 cm

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa el corte y figurado del acero para las bordillos y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE CICLOPEDO



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE CICLOPEDO



REFUERZO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE CONCRETO DE CICLOPEDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 252025647-CND

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo formato

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3674-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 — **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO COMPACTADOR	CAT-420 D	2896 KG	ARENOSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PAJARITA	CAT-420 D	1875 KG	ARENOSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TROMPO MEZCLADOR	BAUKER	1 BULTO	ARENOSA	A	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A
GENERADOR ELECTRICO	BAUKER	110V/220V	ARENOSA	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I
PULIDORA ELECTRICA	DRIWALL	6500 RPM	ARENOSA	A	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOBOMBA	HUMBOLT	1 HP	ARENOSA	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO				6			1	2	2	2	2				1						2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	4	3	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO					6	6	5	4	4	4	4	6	6	6	5	6	6	6	6	6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	33	33%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	51	51%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA MAQUINARIA QUE SE REPORTA EN EL CUADRO COMO INACTIVA, SE ENCUENTRAN EN BUES ESTADO, SOLO QUE NO SE REQUIERE UTILIZAR TODOS LOS DIAS

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JHON JAIRO GARCIA CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-119996 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional N:2520256474 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato de la nómina mes de AGOSTO de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPUMN1-04-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3674 -2023
MES Y AÑO DEL INFORME MENS 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023
NOMBRE ARL: POSITIVA ARL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION VEREDA LAS DELICIAS
ALIANZ ESPUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL
PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
INTERVENTOR: POYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACION DEL CAQUETA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALIRO LUNA DIAZ	17.681.950	MAESTRO DE CONSTRUCCION	$ 2.320.000	x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 2.320.000	$ 141.598	V	ASMETSALUD	30837692	$ 290.000	PORVENIR	30837692	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	
2	DANIEL LUNA GUALTERO	1.006.507.316	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	30837692	$ 162.500	PORVENIR	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	SERGIO PARRA STERLING	17.676.089	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMETSALUD	30837692	$ 162.500	PROTECCON	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	ARNOL FABIAN BERNAL LUNA	1.118.470.844	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	30837692	$ 162.500	PROTECCON	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	ERMINSON VARGAS RUIZ	17.616.170	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMETSALUD	30837692	$ 162.500	PORVENIR	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	JAUN PABLO LEON	1.006.549.106	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMETSALUD	30837692	$ 162.500	PORVENIR	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
7	MANUEL ANTONIO PINEDA VEL	1.118.470.328	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LAS DELICIAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMETSALUD	30837692	$ 162.500	PORVENIR	30837692	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 2/09/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JAIDI JAIRO GARCI CALDERON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: No. 25202 - 119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 252237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Anexo planilla pagada mes de AGOSTO de 2024

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901648219	6	JAC LAS DELICIAS	N	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
16-910	VEREDA LAS DELICIAS		3102169703		JACLASDELICIASALBANIA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30837692	E	2024-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.496.530	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PILA)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
7	30837692	2024-09-05	Pagada							

N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
						AFP	NOMBRE	IBC	Cot.	FNS/S.	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ATEP	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1 7681670	VARGAS RUIZ ERMINSON	1.300.000	F		30	PROTECCION 236201	1.300.000	208.000	0		ESSC ASMET SALUD E.S.S.C.C.	1.300.000	162.500	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.00960	1.300.000	26.000	39.000	0	0	01	0	578.000	N	5411001
2	CC 1 0718089	PARRA STERLING SERGIO	1.300.000	F		30	PROTECCION 236201	1.300.000	208.000	0		ESSC ASMET SALUD E.S.S.C.C.	1.300.000	162.500	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.00960	1.300.000	26.000	39.000	0	0	01	0	578.000	N	5411001
3	CC 1 7681950	LUNA DIAZ ALIRO	2.320.000	F		30	PORVENIR 236101	2.320.000	371.200	0		ESSC ASMET SALUD E.S.S.C.C.	2.320.000	290.000	COMFACA-CCF13	2.320.000	92.800	2.320.000	161.500	0.00960	2.320.000	46.400	69.600	0	0	01	0	1.031.500	N	5411001
4	CC 1 0965507115	LUNA GUALTERO DANIEL	1.300.000	F		30	PORVENIR 236101	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A. ESP 937	1.300.000	162.500	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.00960	1.300.000	26.000	39.000	0	0	01	0	578.000	N	5411001
5	CC 1 0965490196	LEON CRUZ JUAN PABLO	1.300.000	F		30	PORVENIR 236101	1.300.000	208.000	0		ESSC ASMET SALUD E.S.S.C.C.	1.300.000	162.500	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.00960	1.300.000	26.000	39.000	0	0	01	0	578.000	N	5411001
6	CC 1 1118470838	PINEDA VEGA MANUEL ANTONIO	1.300.000	F		30	PORVENIR 236101	1.300.000	208.000	0		ESSC ASMET SALUD E.S.S.C.C.	1.300.000	162.500	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.00960	1.300.000	26.000	39.000	0	0	01	0	578.000	N	5411001
7	CC 1 1118470844	BERNAL LUNA ARNOL FABIAN	1.300.000	F		30	PROTECCION 236201	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A. ADVV 879641	1.300.000	162.500	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.00960	1.300.000	26.000	39.000	0	0	01	0	578.000	N	5411001

PAGADO

Página 1 2024-09-02

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 901616219	6	JACLAS DELICIAS	0	0	POSITIVA 14 23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-910	VEREDA LAS DELICIAS		3102169703		JACLASDELICIASALBANIA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30837892	E	2024-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.499.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
7	30837892	2024-09-05	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.120.000	10.120.000	10.120.000	10.120.000	10.120.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.619.200	0	0	0	1.619.200
PROTECCION	230201	800229739	0	3	624.000	0	0	0	624.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	995.200	0	0	0	995.200
EPS(Administradoras: 3)				7	1.265.000	0	0	0	1.265.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	5	940.000	0	0	0	940.000
ARP(Administradoras: 1)				7	704.500	0	0	0	704.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	704.500	0	0	0	704.500
CCF(Administradoras: 1)				7	404.800	0	0	0	404.800
COMFACA	CCF13	891190047	2	7	404.800	0	0	0	404.800
SENA(Administradoras: 1)				7	202.400	0	0	0	202.400
SENA	PASENA	899999034	1	7	202.400	0	0	0	202.400
ICBF(Administradoras: 1)				7	303.600	0	0	0	303.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	303.600	0	0	0	303.600
Gran Total					4.499.500	0	0	0	4.499.500

Página 2 2024-09-02

Anexo certificación JAC vereda delicias

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA LAS DELICIAS
PERSONERIA JURIDICA No. 035 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002
NIT: 901.648.219-6

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, DAIRO GOMEZ CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.682.437 de Belén de los Andaquies Caquetá, en mi condición de Representante Legal de LA JAC DE LA VEREDA LAS DELICIAS DE ALBANIA Caquetá, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que **LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA**, con identificación tributaria NIT. 901.648.219-6, durante el periodo comprendido del 01 al 31 del mes de AGOSTO de 2024, realizo el pago de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior dando cumplimiento a la ejecución del CONVENIO 3674 DE 2023.

Según la planilla de pago No. 30837692 en estado pagada a traves del operador ASOPAGOS S.A.

Dada en San José del Fragua Caquetá, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Dairo Gomez.c

DAIRO GOMEZ CARDENAS
C.C. No. 17.682.437 de Belén de los Andaquies
REPRESENTANTE LEGAL
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

Email: jaclasdeliciasalbania@gmail.com
Cel: 3214282252

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3674-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS DELICIAS

MES INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 198.548.773,00	N/A
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.548.773,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 121.420.671,00	$ 28.481.391,97	**$ 149.902.063**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 76.140.000,00	$ 17.860.000	**$ 94.000.000,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 73.710.000,00	$ 17.290.000	**$ 91.000.000,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.430.000,00	$ 570.000	**$ 2.430.000,00**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 99.980.809,91	$ 23.452.289	**$ 123.433.098,66**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 97.550.809,91	$ 22.882.289	**$ 120.433.098,66**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.430.000,00	$ 570.000	**$ 3.000.000,00**
*			**$** -
VALOR TOTAL			**$ 120.433.098,66**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
residente de Obra Jhon Jairo Garcia Calderon
Matrícula Profesio 25202-119996 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N:252223430CND

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la zona se presentan lluvias leves, pero esto impide el cese de actividades, y por ende no se altera la programación de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DELICIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		240
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
EN EL TRANSCURSO DEL MES SE PRESENTÓ BUEN CLIMA EN LOS PUNTOS DE INTERVENCION

Firma
Nombre: Jhon Jairo Garcia Calderon
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0553973 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el transcurso del mes de agosto se tomaron muestras de concreto en cilindros, después de que cumplieron los 28 días de fraguado se llevaron a laboratorio para practicar la resistencia a la comprensión. El formato presentado evidencia que el concreto utilizado obtuvo los PSI requeridos por el proyecto para la construcción de las obras



GEOCON INGENIERIA

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES

GI - RE - CC - 027

ENSAYO A LA COMPRESION DE MUESTRAS DE CONCRETO

INV. E - 406 - 13 INV. E - 410 - 13

FECHA: Agosto 13 de 2024

EMPRESA: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS**

OBRA: CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA DE 150 ML Y UNA ALCANTARILLA DE 36" TIPO INVIAS, EN LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

Muestra N°	Fecha toma	Fecha rotura	Edad días	Lectura dial (Kn)	Resistencia obtenida (psi)	Resistencia esperada (psi)	Resistencia proyectada (psi)	Asenta miento (pulg)	Relacion mezcla volumen	Diametro muestra (cm)	Altura muestra (cm)	Area (cm2)	Peso muestra (Grms)	Volumen (cm3)	Densidad (Grs/cm3)	Tipo de falla	% obtenido	Cumple Si/No	Observaciones
1	23/06/24	21/07/24	28	385.7	3166	3000	3166	3"		15	30	176.7	12978	5301.5	2,448	2	106	SI	CAJILLA DE ALCANTARILLA
2	03/07/24	31/07/24	28	385.7	3166	3000	3166	3"		15	30	176.7	12978	5301.5	2,448	2	106	SI	PLACA HUELLA MARGEN DERECHA
3	10/07/24	07/08/24	28	368.8	3191	3000	3191	3"		15	30	176.7	12988	5301.5	2,450	2	106	SI	PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA
4	30/07/24	13/08/24	14	342.8	2813	3000	3264	3"		15	30	176.7	12976	5301.5	2,448	2	94	SI	VIGAS DE CIMENTACION DE PLACA HUELLA

Observaciones:

Elaboró

LUIS ANTONIO AVILEZ

Laboratorista NombreFirma

LUIS ANTONIO AVILEZ M.P. 6.886.705-8

LABORATORIO DE SUELOS GEOCON INGENIERIA GI

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649

E-mail: geoconingenieria@hotmail.com

Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexan pólizas del convenio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: JAC VEREDA DELICIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 3674 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 26/12/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO 30/06/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUAL 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 198.548.773,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.548.773,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.499.400,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.909.750,60	5	10	2023	31/12/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	31/12/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.977.438,65	5	10	2023	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.864.631,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100289628

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070966 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: NA
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/11/2023

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** 1 Y 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.909.750,60	5	10	2023	30/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.977.438,65	5	10	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.864.631,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100289628

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070966 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SRGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUN SE ENCUENTRAN EN ESTADO PENDIENTE EN SECOP

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.24 10:33:11 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUIS

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 4UMDQg2021+AgTFyQY/AA==

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
90-100070066	0	71773887	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC.EXPEDIDORA
	24/10/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	CL 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	CL 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 3674

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DERIVENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DEL 03/10/2023 CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	169.709,59
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	169.709,59
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	169.709,59
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	32.194,82
TOTAL A PAGAR	$	207.904,41

CONVENIO DE PAGO: DERECHO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

[redacted]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, AQUÉ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRIAM - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.046.070

[redacted]
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

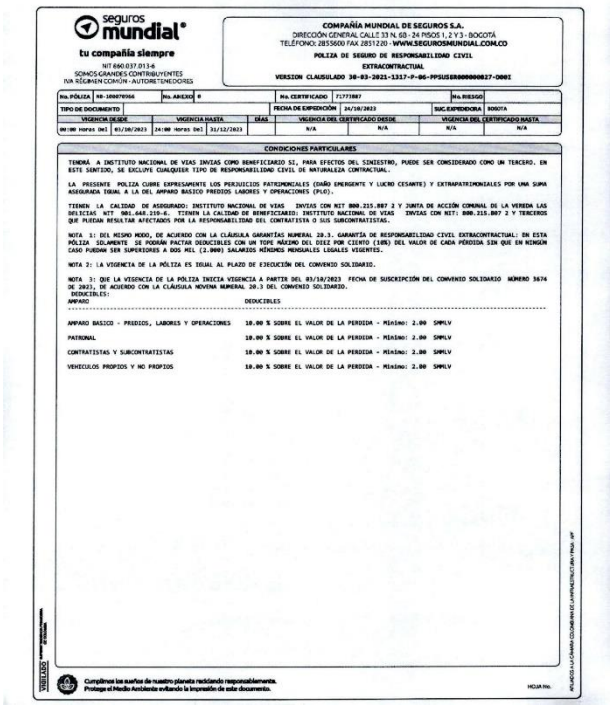

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUISER800000827-0001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
90-100070066	0	71773887	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC.EXPEDIDORA
	24/10/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONCALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT 901.648.219-6. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS.

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.


NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

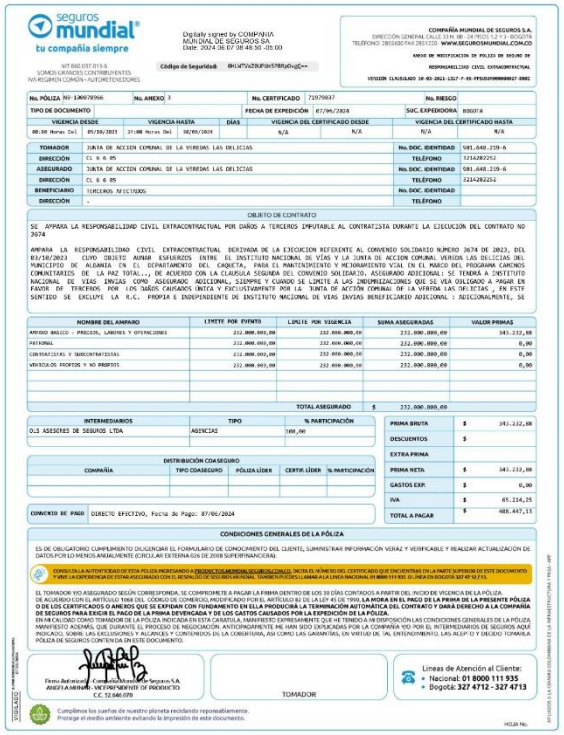

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.07 08:48:50 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B-24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2551220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100070966	3	71979037	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	07/06/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	30/09/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	CL 6 6 85	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	CL 6 6 85	TELÉFONO	3214282252
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 3674

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DEL 03/10/2023 CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.,, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	343.232,88
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	343.232,88
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	343.232,88
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.214,25
TOTAL A PAGAR	$	408.447,13

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2018 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, INGRESA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VINE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O...NEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA [illegible] VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.640.070


TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

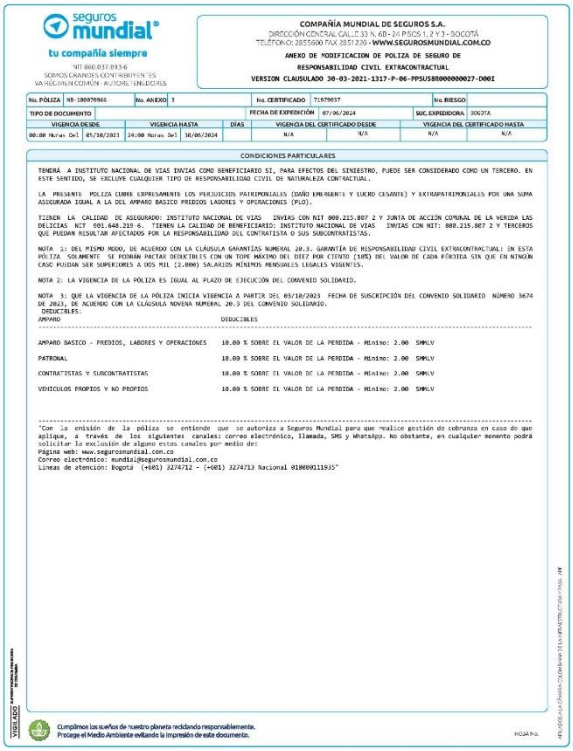

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CAL..E 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2551220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100070966	3	71979037	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	07/06/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	30/09/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT 901.648.219-6. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS.

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:


AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 2274712 - (+601) 2274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

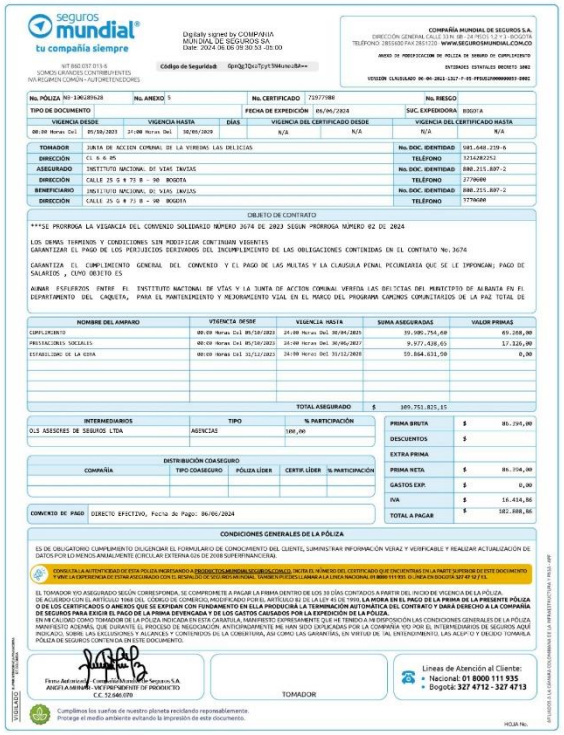

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.06 09:30:53 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2551220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100189628	5	71977988	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	05/06/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/09/2029		N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	Cl 5 A # 85	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 75 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	2770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	2770600

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGANCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023 SEGUN PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.3674

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/04/2025	39.509.754,60	69.288,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/06/2027	9.977.428,65	17.326,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 30/12/2028	10.864.631,90	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 360.751.815,15	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OJS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	86.294,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	86.294,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	16.414,86
TOTAL A PAGAR	$	102.888,86

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2018 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O...NEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA [illegible] VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.640.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2551220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100189628	5	71977988	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	05/06/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 30/09/2029		N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT. 901.648.219-6.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.


NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/0/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 202, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

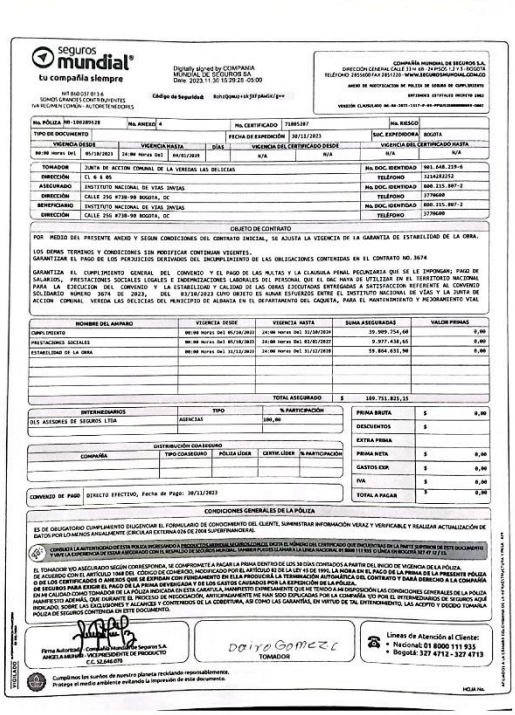

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855500 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 3082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU5280000059-0002

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100209528	4	71095207	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	30/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	04/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAS LAS DELICIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.648.219-6
DIRECCIÓN	CL 6 6 05	TELÉFONO	3214282252
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #738-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #738-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 3674

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL ONG HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3674 DE 2023, DEL 03/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 31/10/2029	39.909.754,68	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/10/2023	24:00 Horas Del 03/01/2027	9.977.438,65	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2025	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.864.631,98	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.751.825,15	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COA-SEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 SUPERFINANCIERA.

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS ASEGURAR, SELECCIONA EL RAMO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y LUEGO LA EXISTENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESGUARDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARNOS A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 931 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

El TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA DURANTE EL TIEMPO QUE HAYA DURADO POR LA TERMINACIÓN.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada: Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MEDINA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.046.070


TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 931
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Powered by CamScanner

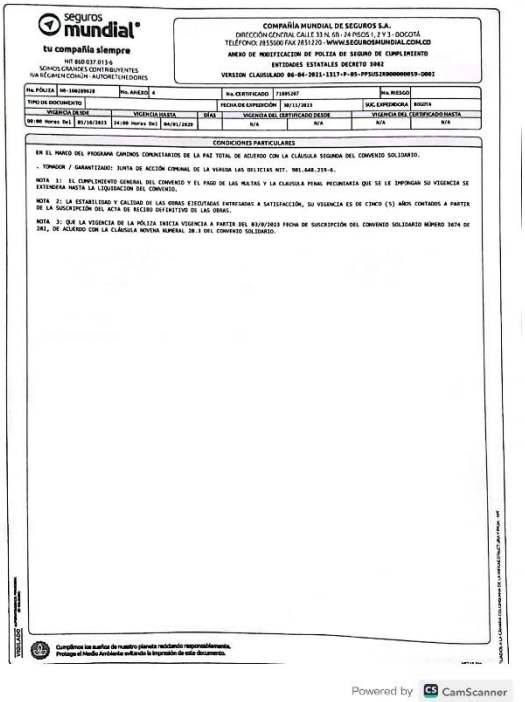

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855500 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 3082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU5280000059-0002

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100209528	4	71095207	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	30/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	04/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

- TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS NIT. 901.648.219-6.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.

NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/8/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 202, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Se solicitó un estudio de suelos con el fin de saber cuál fue la capacidad portante por medio del CBR
- Se solicitó un estudio de topografía con el fin de localizar y replantear lo niveles de la vía.
- Se solicitó realizar los cilindros de concreto, con el fin de llevarlos al laboratorio y saber cuál es la resistencia a la comprensión.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Anexo programación de obra y presupuesto

JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS DELICIAS MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

CRONOGRAMA DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (ML)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	UBICACIÓN: KILOMETRO 2 VIA ALBANIA - CURILLO, 15 KILOMETROS DEL KILOMETRO 2 HASTA LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
CAQUETA	ALBANIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DELICIAS	150,00	CAQUETÁ	15/05/2024	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUNIO DE 2024 DEL 03 AL 09	JUNIO DE 2024 DEL 10 AL 16	JUNIO DE 2024 DEL 17 AL 23	JUNIO DE 2024 DEL 24 AL 30	JULIO DE 2024 DEL 01 AL 07	JULIO DE 2024 DEL 08 AL 14	JULIO DE 2024 DEL 15 AL 21	JULIO DE 2024 DEL 22 AL 28	JULIO DE 2024 DEL 29 AL 04	AGOSTO DE 2024 DEL 05 AL 11	AGOSTO DE 2024 DEL 12 AL 18	AGOSTO DE 2024 DEL 19 AL 25	AGOSTO DE 2024 DEL 26 AL 01
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																					
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 184.533,00	$ 184.533,00	184.533												
							SUB-TOTAL	$ 184.533,00													
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																					
2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	270,06	$ 33.932,00	$ 9.163.772,00	3.054.591	3.054.591	3.054.591										
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	126,23	$ 87.254,00	$ 11.013.636,00		3.671.212	3.671.212	3.671.212									
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	85,86	$ 852.216,00	$ 73.174.505,00			6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228	6.652.228
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	38,84	$ 329.746,00	$ 12.807.862,00					2.134.644	2.134.644	2.134.644	2.134.644	2.134.644	2.134.644			
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.079,86	$ 6.311,00	$ 25.747.979,00			2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725	2.340.725
		1.978,00		Desmonte e instalacion de cercos paralelos a la placa huella	Ml	140,00	$ 6.951,09	$ 973.153,00	486.577	486.576,50											
							SUB-TOTAL	$ 132.880.907,50													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																					
7	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50	$ 25.797,00	$ 1.197.701,00	598.851	598.851											
8	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	8,20	$ 66.207,00	$ 542.897,00		542.897											
10	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50	$ 464.689,06	$ 232.345,00		232.345											
11	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60	$ 852.216,42	$ 8.181.297,00			4.090.649	4.090.649									
12	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90	$ 6.311,12	$ 3.653.509,00			1.826.755	1.826.755									
13	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,40	$ 47.013,89	$ 1.194.153,00				1.194.153									
14	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 509.134,38	$ 3.054.806,00				3.054.806									
							SUB-TOTAL	$ 18.056.708,00													
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 151.122.148,00	4.324.551	8.586.472	21.836.159	22.830.527	11.127.597	11.127.597	11.127.597	11.127.597	11.127.597	11.127.597	8.992.953	8.992.953	8.992.953
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) PLAN DE INVERSION SOCIAL	$ 2.200.000,00	3%	6%	14%	15%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.226.624,41													
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 198.548.773													

EL ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO EQUIVALE A 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202-119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 25202- 119996 CND

Revisó: Firma PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional: 2520256474CND

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Anexo plan de inversión

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3674 - 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 28.943.000,00	$ 28.943.000,00	$ 28.943.000,00		$ 86.829.000,00	43,73%
2	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00		$ 9.000.000,00	4,53%
3	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 6.000.000,00	3,02%
4	TRANSPORTE	$ 4.307.963,00	$ 4.307.962,00	$ 4.307.962,00		$ 12.923.887,00	6,51%
5	COSTO DE PERSONAL	$ 12.856.420,67	$ 12.856.420,67	$ 12.856.420,67		$ 38.569.262,00	19,43%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 15.075.541,33	$ 15.075.541,33	$ 15.075.541,33		$ 45.226.624,00	22,78%
N							%
TOTAL						$ 198.548.773,00	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **Dairo Garcia Cardenas**
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 17,682,437

Firma:
Nombre: **Jhon Jairo Garcia Calderon**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-119996 CND**

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Anexo comité operativo

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No:	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETA	Fecha: 06-05-2024

Vereda – Municipio - Departamento: VEREDA LAS DELICIAS – ALBANIA CAQUETA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3674-2023
Ejecutor(es): VEREDA LAS DELICIAS – ALBANIA

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
DAIRO GARCIA CARDENAS	DELICIAS	PRESIDENTE
ING JHON JAIRO GARCIA	DELCIAS	INGENIERO RESIDENTE
EUCARIS PENNA CEBALLOS	DELICIAS	CONTADOR
OLGA MACIAS FIERRO	DELCIAS	VEEDURIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros participantes del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Análisis de cotizaciones presentadas
4. Elección de proveedores.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Análisis de precios .
2- Elección de proveedores.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
4- Elección de uniformes.
5- Proposiciones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen

1

1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los cuatro (4) miembros principales, el presidente, el ingeniero residente, contador y un representante de la veeduría.
2.	Presentación de cotizaciones: MATERIALES EPP: En consigna quedo que los uniformes y el botiquín se compraran a AMAZONIAN ZAFETY y el restante de la dotación con la empresa EXTINTORES Y DOTACIONES CAQUETA. **AMAZONIAN SAFETY** NIT: XXXX PRESUPUESTO  **EXTINTORES Y DOTACIONES CAQUETA** 
3.	Se determinó elaborar la topografía con el señor LUIS ALBERTO NAVARRO DIAZ, el cual oforto su servicios por valor de $ 900.000 **COTIZACION TOPOGRAFICA**

2

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

4.	Se determinó seleccionar la empresa GEOCON INGENIERIA para la elaboración de laboratorios.
5.	Se aprobó adquirir la madera a la empresa MADERAS Y MACHIMBRES de San José del Fragua, quienes cuentan con la certificación y salvoconducto respectivo.

GEOCON INGENIERIA

MADERAS Y MACHIMBRES LA Y
CLARET FERNANDA POLANCO COLLAZOS
FACTURA DE VENTA Nº 255

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

6.	Se Realizó la consulta con la ferretería de la ciudad de Florencia FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S y el precio incluye transporte hasta el sitio de la obra. Por lo tanto, se toma la decisión de adquirir los materiales a FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S.
7.	En el proceso de cotización de materiales pétreos se recaudó dos cotizaciones: playa la raya del municipio de Albania y la trituradora de Morelia, se tomo la decisión de comprar el material a la playa la raya debido a que está ubicada en el Municipio de Albania y el trayecto de transporte es menor.

FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S
N.I.T 901429462-0
Florencia-Caquetá
Venta de materiales obra negra blanca (Comertos Argos, Sika, Tormium, Corona, Multicentro)

COTIZACIÓN 00003539
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS DELICIAS
Fecha Doc: 7 Mayo 2024
Vendedor: FABIAN MURCIA CRUZ
Fecha de vencimiento: 07 May 2024

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

8.	De las cotizaciones presentadas para el alquiler de maquinaria se escogió la que tenia los precios mas favorables para la junta.
9.	Cotización de exámenes pre-ocupacionales se recibieron dos cotizaciones: CLIP SALUD Y LA DOCTORA MARTHA LUZ ALTAMAR , después de realizada el análisis de precios, se toma la decisión de realizarlos

MAEXCA S.A.S
Materiales y Excavaciones del Caquetá
Explotación – Elaboración – Transporte

Florencia 24 de abril de 2024

Señores
JUNTAS DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS

Ref: COTIZACION DE MATERIALES PETREO.

Cordial saludo

Cordialmente nos permitimos ruguedir cotización de materiales dirigida para la vereda las delicias del municipio de Albania Caquetá

LA GRAVILLA $ 70.000CL METRO MAS IVA
LA ARENA $60.000 METRO MAS IVA
PIEDRA $60.000 METRO MÁS IVA

Atentamente,
YENNIS FERNANDA POLANCO
Administradora

COTIZACION

SAN JOSE DEL FRAGUA, 24 DE ABRIL DE 2024

SEÑORES
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS
NIT: 901440279-0
ALBANIA CAQUETÁ

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VARGAS
NIT: 1.125.2677-1

ITEM	TIEMPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	1,00 MES	RANA COMPACTADORA 20 HP 4 MAN	UNO	1	$ 600.000	$ 600.000
2	1,00 MES	MEZCLADORA EN CONCRETO DE 1,5 PIE	UNO	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
4	1,00 HORA	PIN TROBOLARGADORA CAUCHOS	UNO	1	$ 180.000	$ 180.000
3	1,00 MES	VIBRO DE CONCRETO	UNO	1	$ 500.000	$ 500.000

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VARGAS

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PRECIOS 2024_Juntas de acción comunal

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	VALOR UNITARIO
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos- (realizados en jornada de salud, en las instalaciones de la empresa)	$ 50.000
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular de ingreso Egreso, Periódicos-(TELEMEDICINA)	$ 40.000
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular (Ingreso, periódicos, egresos) Realizados en Florencia	$ 25.000

Martha Luz Altamar de los Reyes
Médico especialista SST. Lic. 0245

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se analizaron cada una de las cotizaciones y se tomó la decisión de elegir los proveedores que realizaran los suministros de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO ___X_	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO _X___	No. Folios: _____

6

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
REMITIR LAS ACTAS DEL COMITÉ OPERATIVO	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
ELABORAR EL PLAN DE INVERSION	CONTADOR / INGENIERO	10-05-2024
PRESENTAR LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES	CONTADOR	10-05-2024
ENVIAR EXAMENES LABORALES DE INGRESO.	CONTADOR	10-05-2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
N/A		

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director de interventoría

Dairo Gomez.c
Nombre: DAIRO GOMEZ C.
Cargo: Presidente OAC

Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: Residente de interventoría

NO SABE FIRMAR

Nombre: OLGA LUCIAS FIERRO

Cargo: veedora ciudadana

7

4.9.4. ACTAS DE REUNIÓN

Anexo acta de socialización



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MNV-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30 DE ABRIL DEL 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION No. 1 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DELICIAS — DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 3674 del 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS. ALBANIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4647 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS RL LEIDY MABEL PEREZ

OBJETIVOS DE LA REUNION
SOCIALIZACION DEL CONVENIO Y PRESENTACION DE LA INTERVENTORIA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
PRESENTACION DEL PERSONAL TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
INDICACIONES TECNICAS
INQUIETUDES
COMPROMISOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1 SIENDO LAS 12: 00 AM SE DA INICIO A LA REUNION DE SOCIALIZACION, PRESENTACION DE DEL INTERVENTOR RESIDENTE FABIO MEJIA DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS Y LA DE LEYDI KARINA RODRIGUEZ DEL PCDT. PARA INICIA EXPLICANDO EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL SE DA CLARIDAD DEL EQUIPO QUE ACOMPAÑARA EL PROCESO EN LA DIRECCION TERRITORIAL - CAQUETÁ. ESTO CON EL FIN DE QUE NO FACILITEN INFORMACIÓN A TERCERAS PERSONAS AJENAS AL PROGRAMA QUE TENGA UNAS INTENCIONES CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL.
2. SE SOCIALIZA LA LEY 850 DE VEEDURIAS Y SE AVISA A LA COMUNIDAD DE CONFORMAR EL COMITÉ DE VEEDURIAS CON EL FIN DE QUE ACOMPAÑEN, VIGILEN LA EJECUCION DE ESTAS OBRAS DE MENOR DIMENAJE (PLACA HUELLAS- ALCANTARILLAS)
3 LA SUPERVISORA ING CAROLINA BERMEO EXPONE LA PARTE TECNICA DEL CONVENIO.
CONTRATOS Y ACTUACIÓN DEL PERSONAL
MIS TROS LINEALES A INTERVENIR Y SOLICITAN BALACE ACTUALIZADO CON PRECIOS DEL AÑO 2024
ACTUALIZACION DE POLIZAS — ENTRE
OTRAS ESPECIFICACIONES — 4. INCIA R. ING
FABIO MEJIA RESIDENTE DE INTERVENTORIA EL CUAL MANIFIESTA A LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL TODA SU DISPOSICION PARA APOYARLAS Y ORIENTARLES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS — 5 POR OTRA PARTE
LA PROFESIONAL SOCIAL DE INVIAS KARINA RODRIGUEZ RECUERDA A LA COMUNIDAD QUE SE VAN A CONTAR CON UNOS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, COMO LO SERIAN R. BUZON DE SUGERENCIAS, LA VEREDUNAS Y UN CORREO ELECTRONICO PARA LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS. A CONTINUACIÓN SE LEVANTA EL ACTA DE CONFORMACION DE VEEDURIAS Y SE ENCARGA A LA PRESIDENTA DE RADICAR EL ACTA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DONDE TENGA JURISDICCIÓN LA VEREDA, ANEXA LAS CEDULAS DE CIUDADANIA DE LAS 3 PERSONAS QUE ESCOGIO LA COMNIDAD PARA ESTA LABOR. — 6. POR ULTIMO SE COMPARTE UN REFRIGERIO QUE ENVIA LA TERRITORIAL INVAS Y SE ATIENDEN, SE RESUELVEN DUDAS QUE TENGA LA COMUNIDAD .

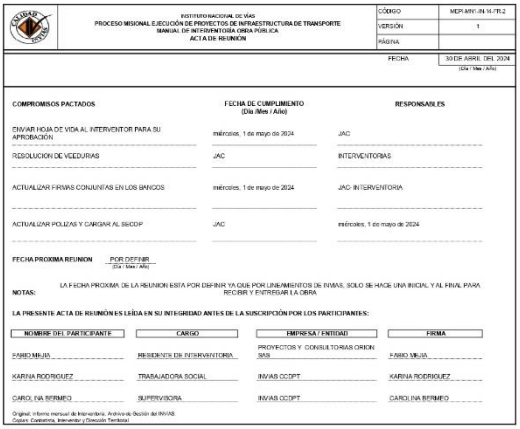

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MNV-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30 DE ABRIL DEL 2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENVIAR HOJA DE VIDA AL INTERVENTOR PARA SU APROBACION	miércoles, 1 de mayo de 2024	JAC
RESOLUCION DE VEEDURIAS	JAC	INTERVENTORIAS
ACTUALIZAR FIRMAS CONJUNTAS EN LOS BANCOS	miércoles, 1 de mayo de 2024	JAC- INTERVENTORIA
ACTUALIZAR POLIZAS Y CARGAR AL SICOP	JAC	miércoles, 1 de mayo de 2024

FECHA PROXIMA REUNION: POR DEFINIR (Día / Mes / Año)


NOTAS: LA FECHA PROXIMA DE LA REUNION ESTA POR DEFINIR YA QUE POR LINEAMIENTOS DE INVIAS, SOLO SE HACE UNA INICIAL Y AL FINAL PARA RECIBIR Y ENTREGAR LA OBRA

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
FABIO MEJIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	FABIO MEJIA
KARINA RODRIGUEZ	TRABAJADORA SOCIAL	INVAS CCPT	KARINA RODRIGUEZ
CAROLINA BERMEO	SUPERVISORA	INVAS CCPT	CAROLINA BERMEO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivado: Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Listado de asistencia

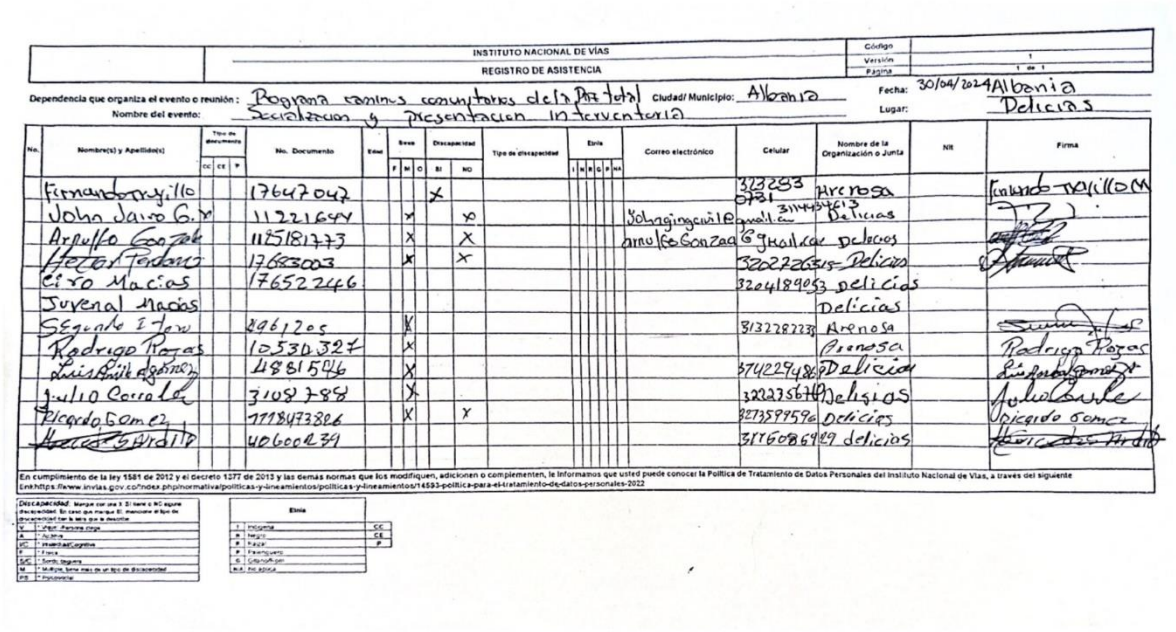

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Dependencia que organiza el evento o reunión: Programa caminos comunitarios de la Paz total — Ciudad/ Municipio: Albania — Fecha: 30/04/2024
Nombre del evento: Socialización y presentación Interventoría — Lugar: Albania Delicias

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento	No. Documento	Edad	Sexo	Discapacidad	Tipo de discapacidad	Etnia	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIT	Firma
	Fernando Trujillo		17647042			X				3223283	Arenosa		
	John Jairo G.		11221644		X		X		Johngingeniero	3114857613	Delicias		
	Arnulfo Gonzalez		11518177 3		X		X		arnulfoGonzaq	Gmail.com	Delicias		
	Hector Tordoya		17683003		X		X			3202226515	Delicias		
	Ciro Macias		17652246							3204189053	delicias		
	Juvenal Macias										Delicias		
	Segundo Tafur		896205		X					3132287238	Arenosa		
	Rodrigo Rozas		10530327		X						Arenosa		
	Luis Anibal Gomez		4881506		X					3142294880	Delicias		
	Julio Corrales		3108788		X					3202356470	Delicios		
	Ricardo Gomez		1118473886		X		X			3173589596	Delicias		
	Hector Giraldo		40660239							3176086989	delicios		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente Link https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO sufre discapacidad. En caso que marque SI, marcar el tipo de discapacidad con la letra que la describe
V: Visual, Persona ciega
A: Auditiva
DC: Mental/Cognitiva
F: Física
SC: Sordo, Sequera
M: Múltiple, Tiene más de un tipo de discapacidad
PS: Psicosocial

Etnia
1: Indígena — CC
2: Negro — CE
3: Raizal — P
4: Palenquero
5: Gitano/Rom
6,7: No aplica

Powered by CamScanner

5. **INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*
CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*

VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	9 MESES Y 16 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

*Tabla **2**. Información general contrato 4647 de 2023*

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- Durante este periodo la interventoría realizo visitas a campo y realizo seguimiento desde la oficina central.

El porcentaje de avance físico y financiero de interventoría es de 81,4% correspondiente a $88.934.531,00

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato relación de vehículos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-5 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS-FLORIDA-DELCIAS-ASOJUNTAS ALBANIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firma
Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa el personal que labora para PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
Se anexa planilla pagada mes de julio de 2024
Se anexa certificación pago de seguridad social

ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoría 4647 de 2023 firmado entre el I**NVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social (**SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de AGOSTO de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 31 días del mes de AGOSTO del 2024

Mabel Perez

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/8/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: agos-24 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
				TOTAL		$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
4	jul-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2026	$ 109.303.594,00	$ 67.303.594,00		
5	ago-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2027	$ 109.303.594,00	$ 56.803.594,00		
	TOTALES	**$ 42.525.000,00**	**$ 9.975.000,00**	**$ 52.500.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 42.525.000,00	$ -	$ 42.525.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 9.975.000,00	$ 9.975.000,00
VALOR TOTAL	$ 42.525.000,00	$ 9.975.000,00	**$ 52.500.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
JUAN CARLOS SAAVEDRA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-37430CND

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato de garantías

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024
VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexos pólizas

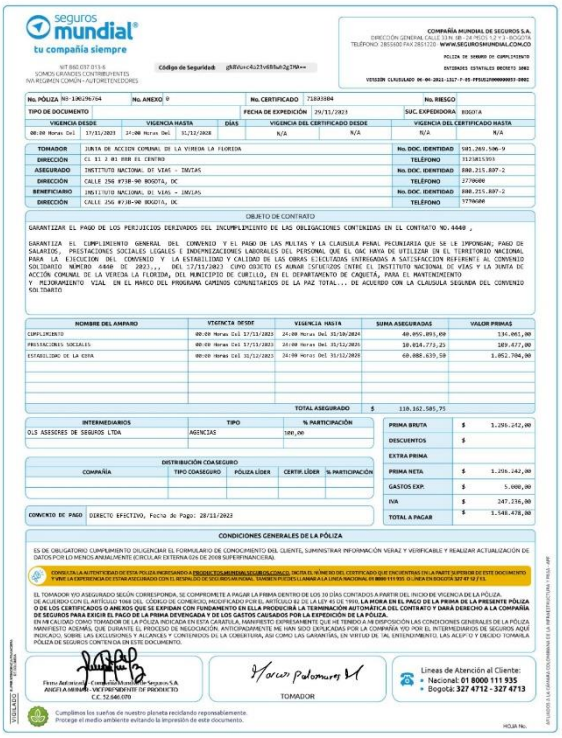

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 20 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100296764	0	71803884	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 3 81 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023,,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.095.893,00	134.061,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2025	10.814.771,25	189.477,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2029	60.888.839,50	1.052.704,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.162.505,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACION

PRIMA BRUTA	$	1.296.242,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.296.242,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	247.236,00
TOTAL A PAGAR	$	1.548.478,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM/CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA VIETO NIEVES DE PROVIDENTO
C.C. 52.646.009

Maria Palomares M
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 20 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100296764	0	71803884	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


- TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO

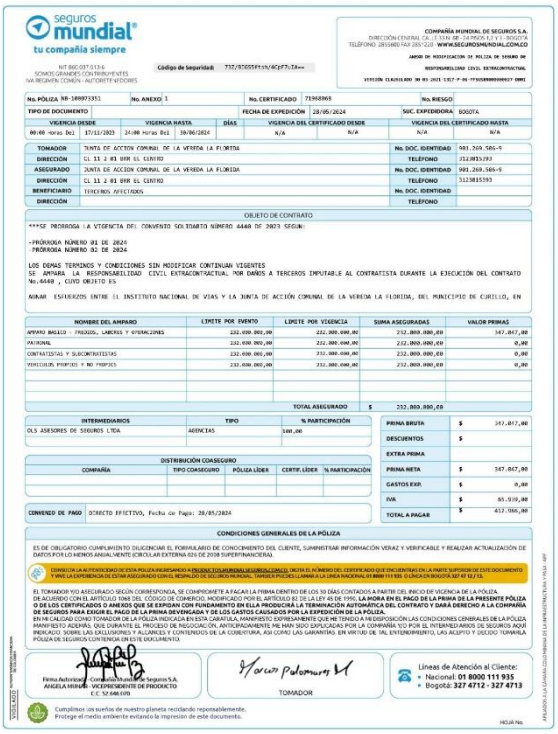

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2853720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968865	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 81 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 81 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$ 347.047,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 347.047,00
GASTOS EXP.	$ 0,00
IVA	$ 65.919,00
TOTAL A PAGAR	$ 412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PROTOCOLO MUNDIAL DE SEGUROS CONSULTA, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y ANEXO LA CONTRASEÑA DE ESTAS ASEGURADO CON EL RECIBO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARLA A LA LINEA NACIONAL 018000111935 - BOGOTA 307 47 47.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENGO A DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA HIGUERA- VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2853720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968865	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 28.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 28.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. . .- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

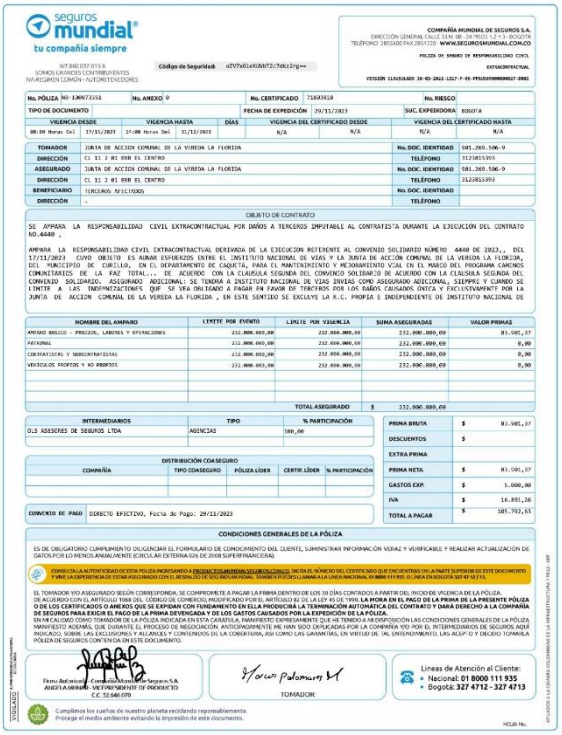

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851200 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU5R0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71885818		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023		SUC. EXPEDIDORA	30037A
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023	N/A	N/A		N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VIREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 81 000 EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VIREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 81 000 EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4640 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUBILLA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL; SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.505,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
O.S ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	83.505,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.505,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.792,63

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO (LO ENCONTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO ENTREGADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRIAM - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.040.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CAL..E 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - SOCOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851200 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU5R0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71885818		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023		SUC. EXPEDIDORA	30037A
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023	N/A	N/A		N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TENDRÁ LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.596-9, , TENDRÁ LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

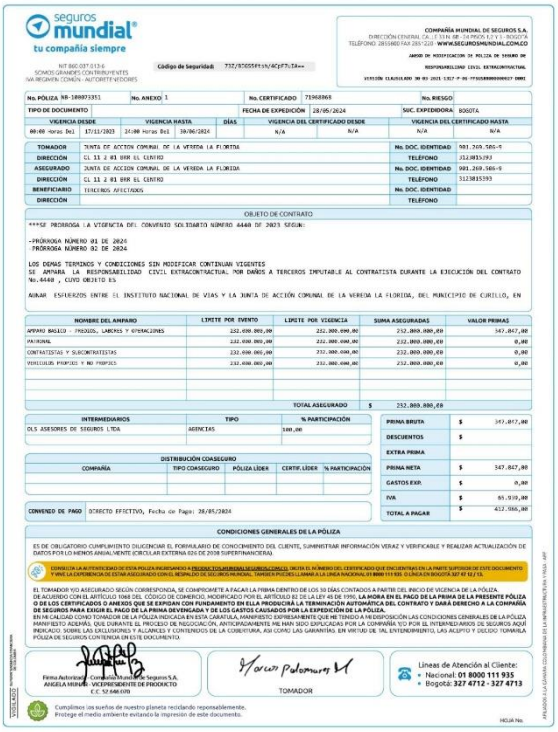

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 69 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
RR-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 83 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128935393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 83 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128935393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUBILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 252.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRIMERO TOMAREMOS EL NÚMERO CONSULTA, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARA LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA HIRUELA VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070


TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

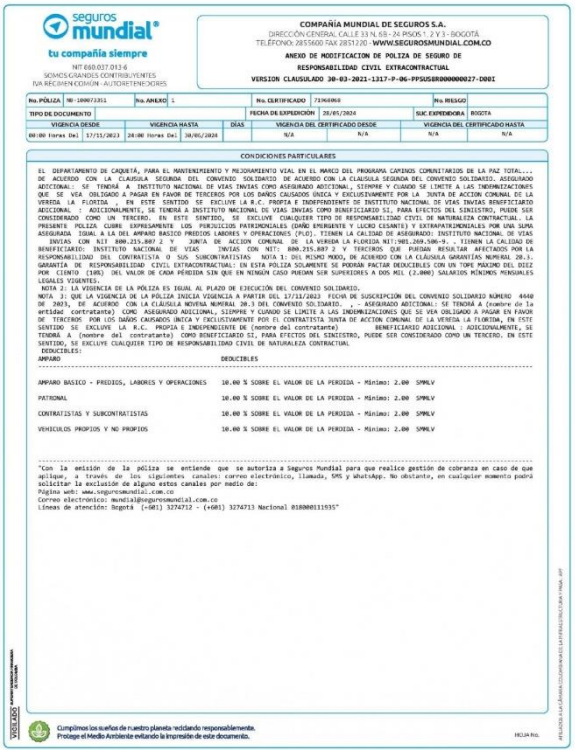

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 69 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
RR-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9 , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. _ - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamado, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Anexo formato plan de cargas

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 7 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 109.303.594,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 109.303.594,00

PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 16 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.__ de fecha _____		2023				2024												TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)			MES		MES		MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		MES			
													H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		0,50	$ 2.500.000												$ -	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000					1,50	$ 7.500.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.000.000		4,00	$ 16.000.000												$ -	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	0,37	$ 1.475.000	0,63	$ 2.500.000			4,6	$ 19.475.000
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000												$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 560.000					0,60	$ 1.120.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000												$ -		$ -		$ 1.120.000		$ -		$ -	0,20	$ 560.000					0,60	$ 1.680.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00																												$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000																															
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000																															
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000																															
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.000.000																															
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.000.000																															
	1	Inspector	$ 1.200.000		8,00	$ 9.600.000												$ -		$ -		$ -		$ -	0,66	$ 800.000	0,50	$ 600.000		$ -			1,0	$ 1.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 576.000												$ -		$ -		$ -		$ -	0,24	$ 288.000		$ -		$ -			0,48	$ 576.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.916.000,00												$ -		$ 5.250.000		$ 6.370.000		$ 6.098.000		$ 5.850.000		$ 3.325.593		$ 4.658.000				$ 34.551.593
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36												0,00		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36				2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.760												$ -		$ 12.390.000,0		$ 15.033.200,0		$ 14.391.280,0		$ 13.806.000,0		$ 7.846.399,7		$ 10.992.880,0				$ 81.541.760

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES		2023 MES		2024 MES		2024 ABRIL		2024 MAYO		2024 JUNIO		2024 JULIO		2024 AGOSTO		2024 SEPTIEMBRE		2024 MES		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 110.000	Dia	4,00	$ 440.000												$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 110.000	1	$ 110.000	2	$ 220.000			4,00	$ 440.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 300.000	Mes	13,00	$ 3.900.000												$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000			8,00	$ 2.400.000
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 5.600.000												$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 5.600.000			2,00	$ 5.600.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según comprobante por ensayo	4,00	$ 1.200.000												$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 1.200.000			4,00	$ 1.200.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ -	Según comprobante por mes	$ -	$ -												$ -		$ -		$ -	0	$ -		$ -	0	$ -		$ -			0,00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Según comprobante por viaje	2,00	$ 350.000												$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 175.000	1	$ 175.000		$ -			2,00	$ 350.000
	1	Copias de mapoteca, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, videos,	$ 80.000,00	Según comprobante por mes	$ -	$ -												$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -			0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 320.000												$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 80.000	2	$ 160.000	1	$ 80.000			4,00	$ 320.000
	1	Vinculcha Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	$ -	$ -												$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																																
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00												$ -		$ 300.000		$ 300.000		$ 600.000		$ 985.000		$ 1.045.000						$ 10.310.000
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) + (D)				$ 91.851.760,00												$ -		$ 12.690.000		$ 15.333.200		$ 14.991.280		$ 14.771.000		$ 8.893.400		$ 10.992.880				$ 91.851.760
	*	IVA = 19% * (D) = (E)				$ 17.451.834,00												$ -		$ 2.411.100		$ 2.913.308		$ 2.848.343		$ 2.806.490		$ 1.689.746		$ 2.088.647				$ 17.451.834
	*	COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594												$ -		$ 15.101.100		$ 18.246.508		$ 17.839.623		$ 17.577.490		$ 10.583.146		$ 13.081.527				$ 109.303.594
	-																																	
	-																																	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS																																		

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
con el fin de dar cumplimiento a nuevas funciones, se considera necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras; sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: LEIYD MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
NOMBRE: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


La vereda delicias, desarrolla las actividades programadas a la fecha, sin presentar atrasos en las obras contratadas.

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

A la fecha no se ha remitido correspondencia

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

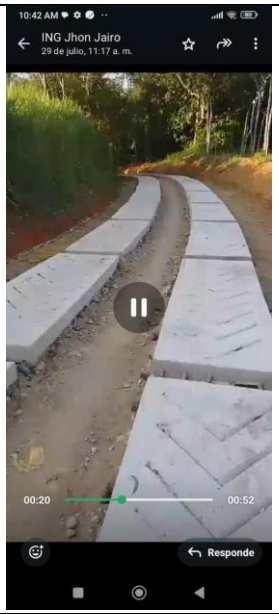	
Vaciado de concreto para huelllas	**Vaciado de concreto para huelllas**
	
Vaciado de concreto para huellas	**Vaciado de concreto para huelllas**
	
Huelle y ciclópeo	**Huelle y ciclópeo**

	
Huelle y ciclópeo	**Huelle y ciclópeo**


8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS


Anexo fotos de la socialización

	
SOCIALIZACION VEREDA DELICIAS, 29-04-2024	**SOCIALIZACION VEREDA DELICIAS, 29-04-2024**

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Anexo bitácora del mes de agosto

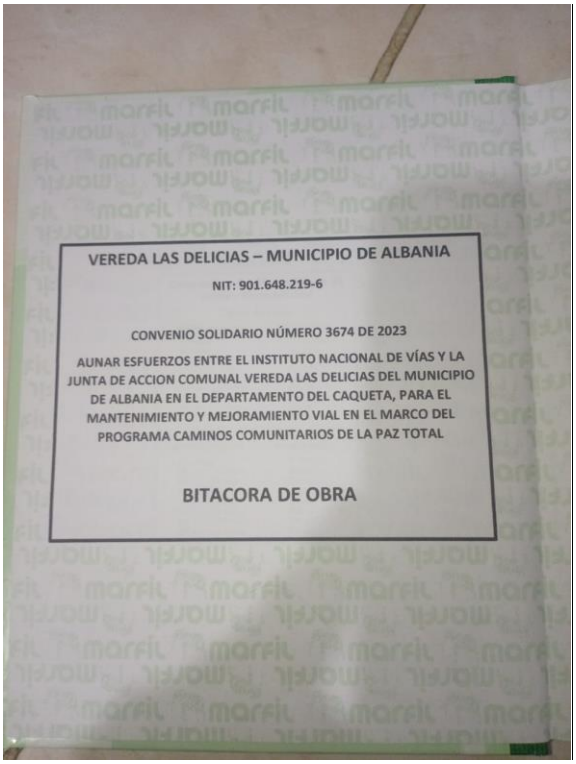
VEREDA LAS DELICIAS – MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT: 901.648.219-6
CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3674 DE 2023
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
BITACORA DE OBRA

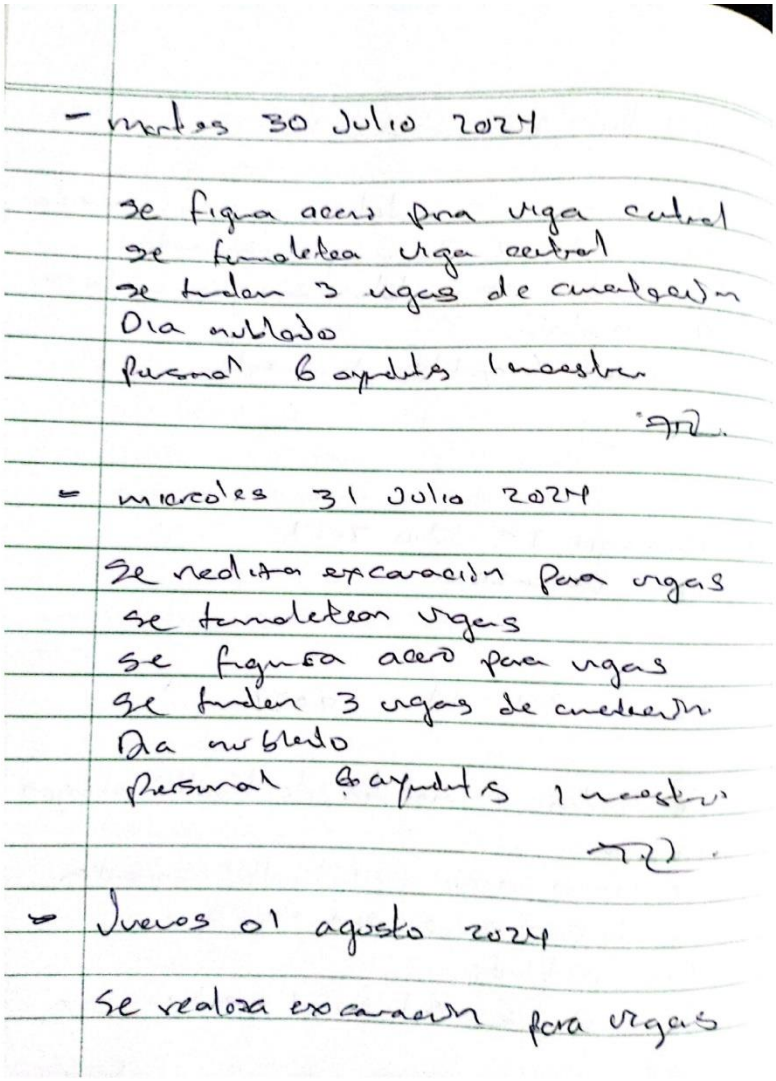

- martes 30 Julio 2024

Se figura acero para viga central
Se termoletea viga central
Se funden 3 vigas de cimentación
Dia nublado
Personal 6 ayudantes 1 maestro


- miercoles 31 Julio 2024

Se realiza excavación para vigas
Se termoletean vigas
Se figura acero para vigas
Se funden 3 vigas de cimentación
Dia nublado
Personal 6 ayudantes 1 maestro

- Jueves 01 agosto 2024

Se realiza excavación para vigas

Powered by CamScanner

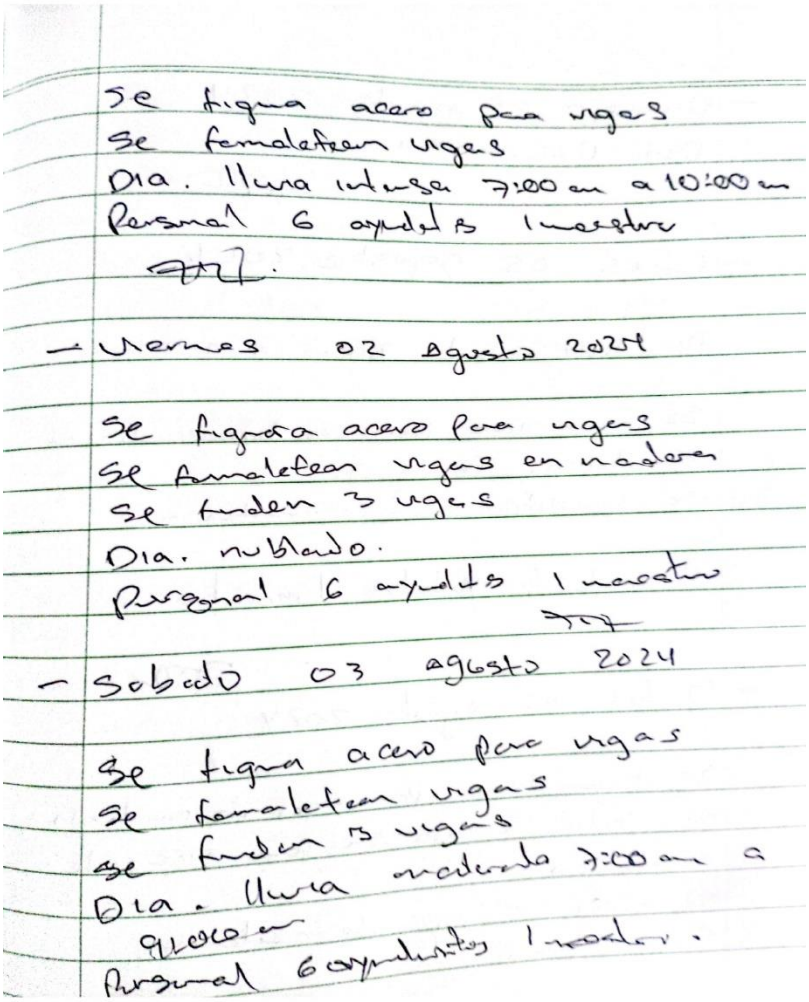

Se figura acero para vigas
Se formaletean vigas
Dia. lluvia intensa 7:00 am a 10:00 am
Personal 6 ayudts 1 maestro


- Viernes 02 Agosto 2024

Se figura acero para vigas
Se formaletean vigas en madera
Se funden 3 vigas
Dia. nublado.
Personal 6 ayudts 1 maestro

- Sabado 03 agosto 2024

Se figura acero para vigas
Se formaletean vigas
se funden 5 vigas
Dia. lluvia moderada 7:00 am a 9:00 am
Personal 6 ayudantes 1 maestro.

Powered by CamScanner

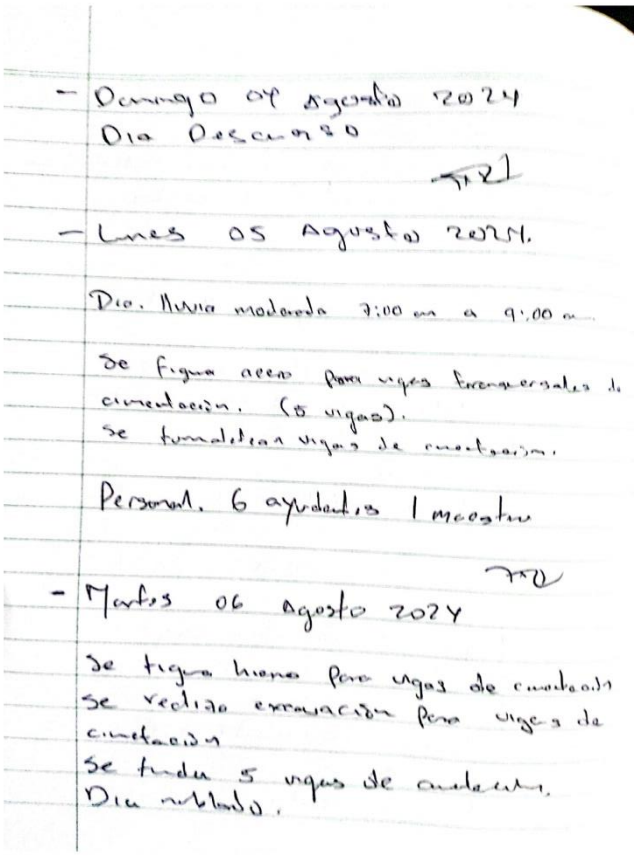

- Domingo 04 Agosto 2024
Dia Descanso

- Lunes 05 Agosto 2024.

Dia. Lluvia moderada 7:00 am a 9:00 am.


Se fragua acero para vigas transversales de cimentacion. (5 vigas).
Se formaleteo vigas de cimentacion.

Personal. 6 ayudantes 1 maestro


- Martes 06 Agosto 2024

Se fragua losa para vigas de cimentacion
Se realizo excavacion para vigas de cimentacion
Se fundio 5 vigas de cimentacion.
Dia nublado.


Powered by CamScanner

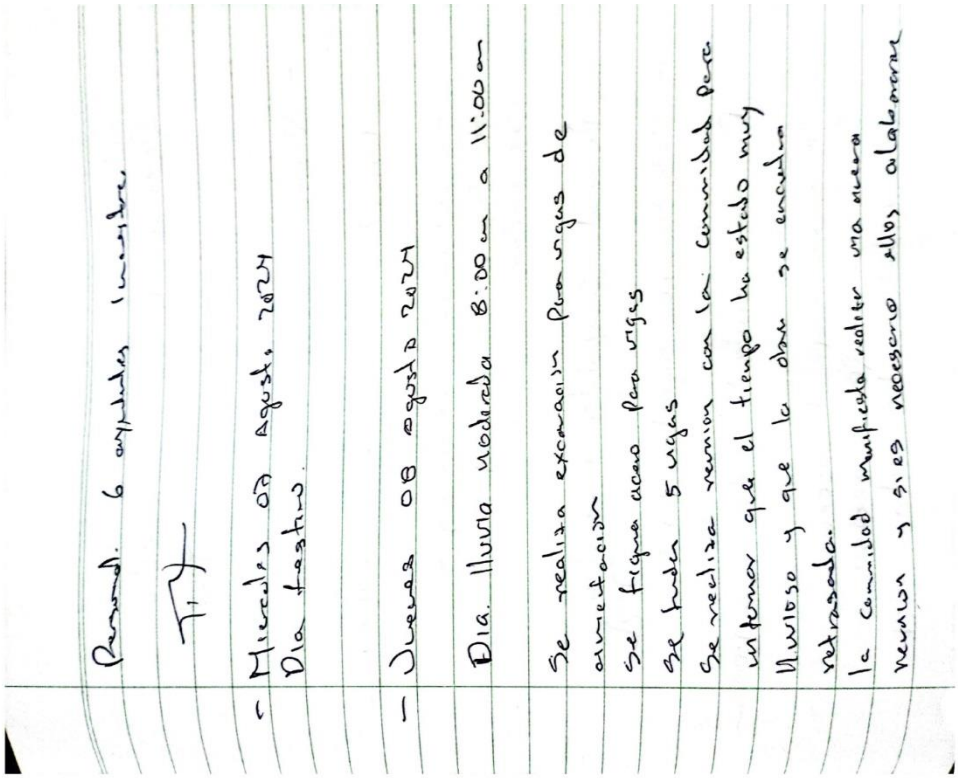
Personal. 6 auxiliares 1 residente
TRL
- Miercoles 07 agosto 2024
Dia festivo
- Jueves 08 agosto 2024
Dia. Lluvia moderada 8:00 am a 11:00 am
Se realiza exposicion protocolos de
autocuidado
Se fijan avance para viges
Se fueron 5 viges
Se realizo reunion con la comunidad pero
un poco el tiempo ha estado muy
lluvioso y que le dan se encuentra
retrasada.
La comunidad manifiesta realizar una mesa
reunion y si es necesario ellos colaboran


Powered by CamScanner

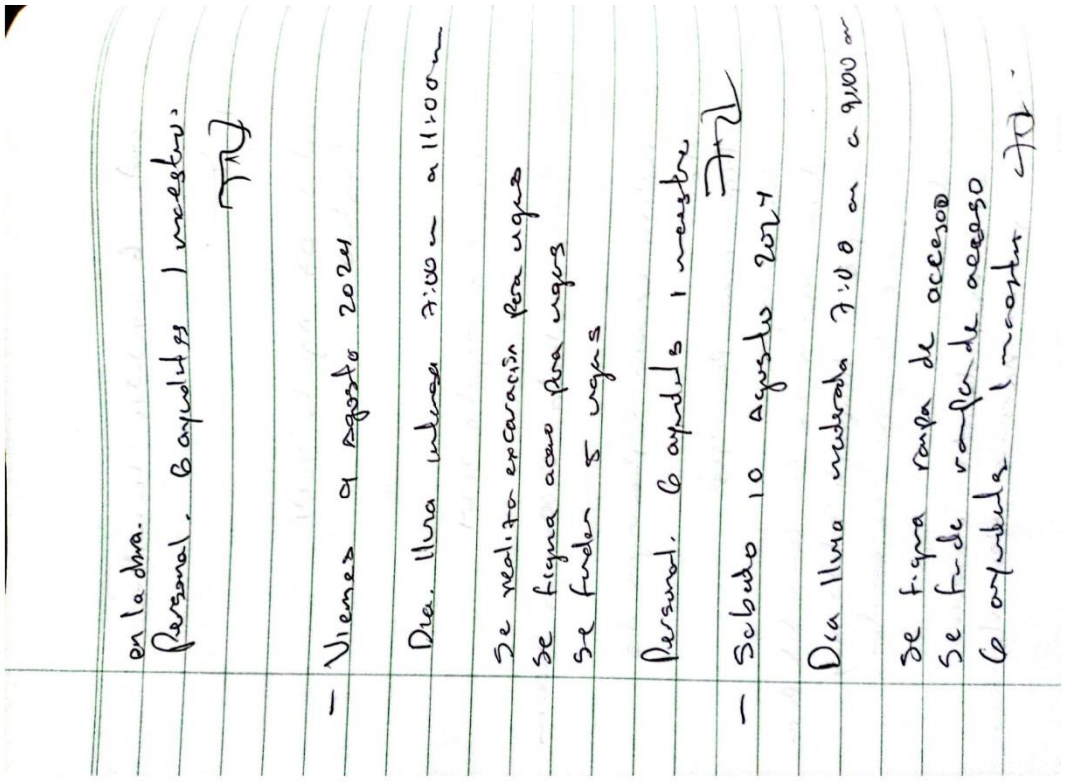
en la obra.
Personal. 6 auxiliares 1 residente
TRL
- Viernes 09 agosto 2024
Dia. Lluvia moderada 7:00 am a 11:00 am
Se realizo excavacion para vigas
Se fijaron avance para vigas
Se fueron 5 vigas
Personal. 6 auxiliares 1 residente
TRL
- Sabado 10 agosto 2024
Dia lluvia moderada 7:00 am a 9:00 am
Se fijara rampa de acceso
Se fue por falta de acceso
6 auxiliares 1 residente TRL


Powered by CamScanner

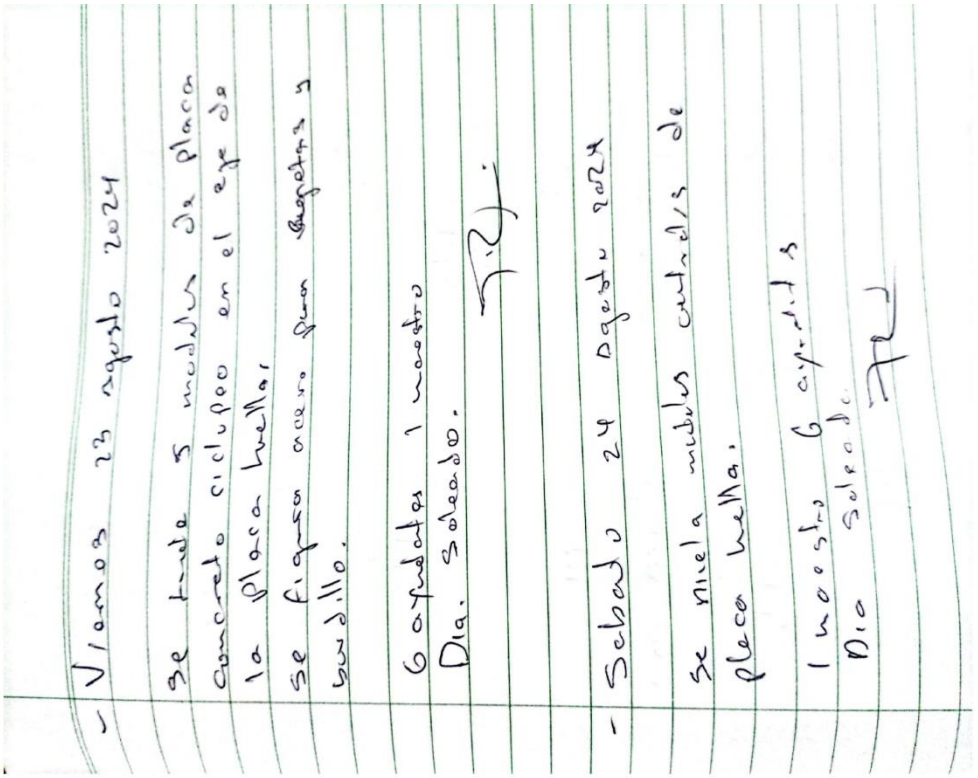

Powered by CamScanner

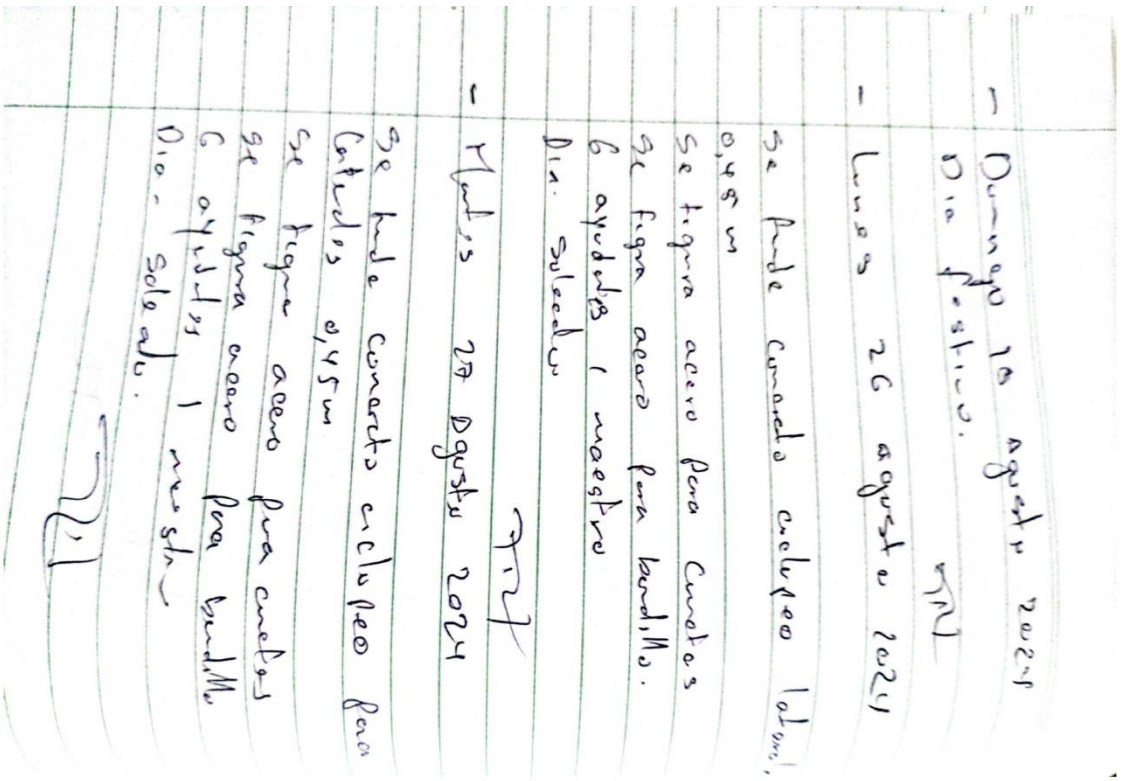


Powered by CamScanner

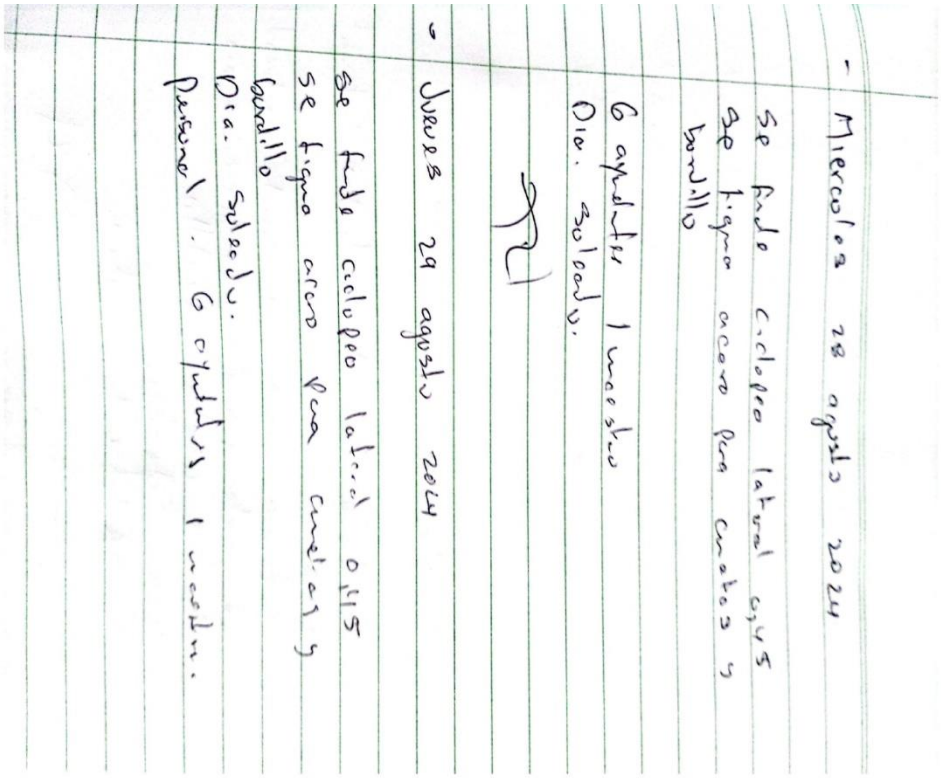

- Miercoles 28 agosto 2024
Se fundo ciclopeo lateral 0,45
se figuro acero para cunetas y bordillo
6 ayudantes 1 maestro
Dio. 30 bolsas.

- Jueves 29 agosto 2024
Se fundo ciclopeo lateral 0,45
se figuro acero para cunetas y bordillo
Dio. Salsedo.
Personal. 6 ayudantes 1 maestro.

Powered by CamScanner

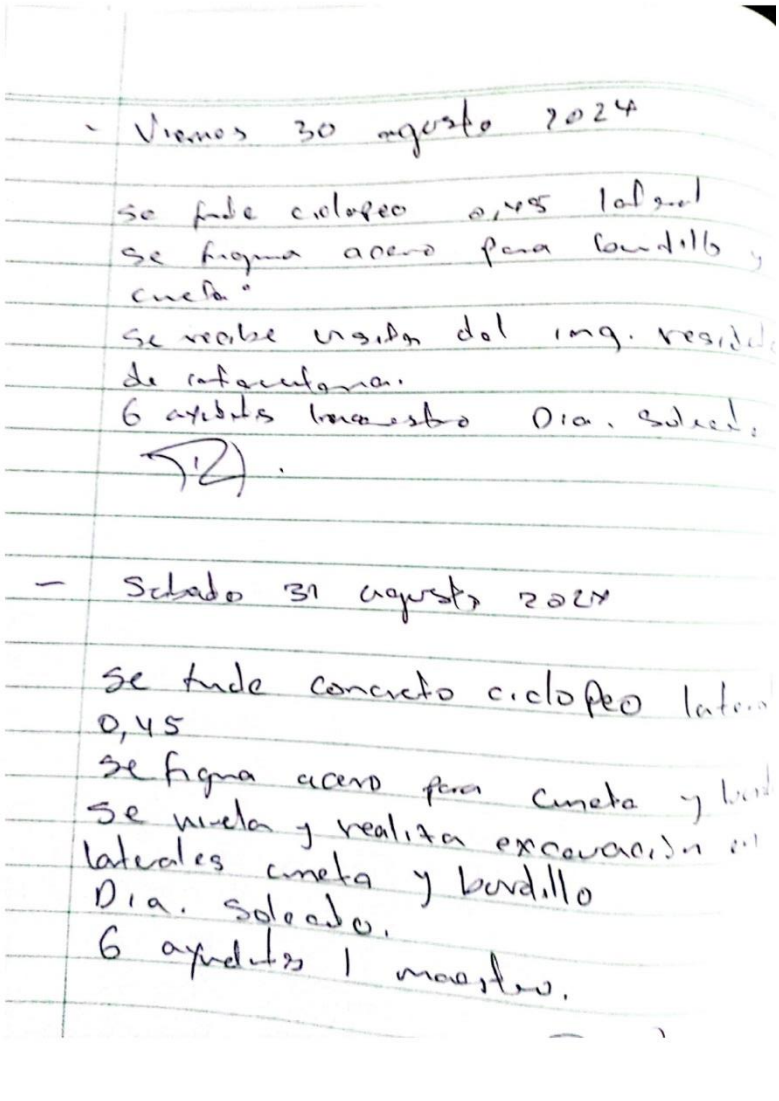

- Viernes 30 agosto 2024

se fundo ciclopeo 0,45 lateral
se figura acero para bordillo y cuneta.
se recibe visita del ing. residente de interventoria.
6 ayudas hasta este Dia. Soleado.

- Sabado 31 agosto 2024

se funde concreto ciclopeo lateral 0,45
se figura acero para cuneta y bordillo
se nivela y realiza excavacion en laterales cuneta y bordillo
Dia. soleado.
6 ayudas 1 maestro.

Powered by CamScanner

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°05

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:4440 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	*Ing. Juan Carlos anabria* *Mat: 2520237430 CND*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *Supervisor del contrato*
Fecha: *31 de AGOSTO de 2024*	***Fecha:*** *31 de AGOSTIO de 2024*	***Fecha:*** *31 de AGOSTO de 2024*

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4440 de 2023 **Contratista:** JAC VEREDA FLORIDA

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORIN SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	95
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	96
1	**INTRODUCCIÓN**		99-100
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		100-101
2.1	Localización		100-101
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		101-103
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		103-106
2.4	Características técnicas del proyecto		107
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		107
3.1	Información general del contrato		108
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		108
3.3	Seguimiento ítems no previstos		108
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		108
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		108
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	108-112
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	113
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	113
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	114
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	115
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	115
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	16-122
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	121
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		122
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		123
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	124
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	125
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	126-128
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	129-134
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		135
5.1	Información general del contrato		135
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		136
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		136
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	136
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	136
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	137
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	137
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	137-138
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		138
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	139
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	139
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	139
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		139
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		139-141
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		141
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		141
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		142

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ **de fecha** _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que el contratista de obra ya inicio obra, presentando un avance físico y financiero del 85,1%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 4440 de 2023

OBJETO: **ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE L**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
PLAZO DE VENCIMIENTO PRORROGA 1 30/04/2024
PLAZO DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/10/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.295.465,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): 0
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.295.465,00
ANTICIPO CONCEDIDO: 0
ANTICIPO AMORTIZADO: 0

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	161
	ALCANTARILLA DE 36"	UNIDAD	1
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
Mantenimiento	Pontones		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	44,66%	
	ALCANTARILLA	UND	0%	85,1%
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
Mantenimiento	Pontones			
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 121.420.500,03	28.481.562,97	$ 149.902.063,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 149.902.063,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 148.000.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141.000.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	$ 7.000.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 138.053.589,30	32.382.940,70	$ 170.436.530,00	
AJUSTES				$ 170.436.530,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SE				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 170.436.530,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Instalacion de acero para la huella






instalacion de acero para la huella


vaciado concreto ciclopeo e instaalcion de acero de refuerzo para las cunetas y sardineles

Firma

Nombre JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. LOCALIZACIÓN 7
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4440 de 2023 11
3.1INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 12
3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
4.1. INFORME SEMANAL 12
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 19
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 23
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 23
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 24
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 26
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 33
4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 33
4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 34
4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 35
4.12. ACTAS DE REUNIÓN 37
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 21
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL……22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS……24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

2. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.05** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**. Hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **Convenio No. 4440 de 2023 con número de proceso SPSC-CD-CS-886-2023, y que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Currillo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente,

proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en la florida se localizan en las siguientes coordenadas:

PLACA HUELLA PUNTO INICIAL 1° 5'26.50"N, 76° N 2'51.68"O
PLACA HUELLA PUNTO FINAL 1° 5'28.60"N, 76°2'48.32"O



Figura 2-2 Ubicación del tramo a mejorar en la vereda La Florida.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), vereda las delicias, florida del municipio de Currillo y la vereda iglesias del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.
.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

CONVENIO 4440 – 2023:

OBJETO "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**."

La vereda florida del Municipio de currillo está ubicada aproximadamente a 45 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas cerrito, vergel y palizada, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 50 km.

El tramo a intervenir lleva por nombre subida de la laguna de la florida" y subida la camangucha, el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Estas vías no cuentan con obras de artes.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.*
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 4440 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA DE 120 ML Y LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.* *LA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON TUBOS DE 36" DE CONFIGURACIÓN TIPO ALETA-ALETA LA CUAL PERMITE, ADEMÁS DE RECIBIR Y EVACUAR LA ESCORRENTÍA APORTANTE POR LAS*

	CUNETAS Y FILTROS, DAR CONTINUIDAD A CAUCES CON FLUJOS INTERMITENTES O EFÍMEROS. *ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:* *-CONCRETO: F'C 21MPA* *-ACERO CORRUGADO: FY 420MPA*

Tabla 6. Características técnicas del proyecto

3. NFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4440 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA FLORIDA

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 4440 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPSC-CD-CS-886-2023*
CONVENIO NO.	*4440 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..*
CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA*
NIT	*:901.269.506- 9*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$199.295.465*
RECURSOS PROPIOS	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$ 200.295.465*
ADICIONES	*$ 0.00*
FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACION ATUALIZADA	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

Tabla 7. Información general convenio 4440 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizó corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas

En el transcurso del mes se realizaron actividades como: instalación de acero de refuerzo para las huellas, bordillos y cuneta. Se vaciaron concretos de 3000 psi. El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 85,1% correspondiente a un valor de $170.436.530

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto


Se le hizo control de calidad a los materiales y agregados utilizados para las mezclas

Se tomaron muestras de mezclas para los cilindros

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Semana 1 agosto de 2024

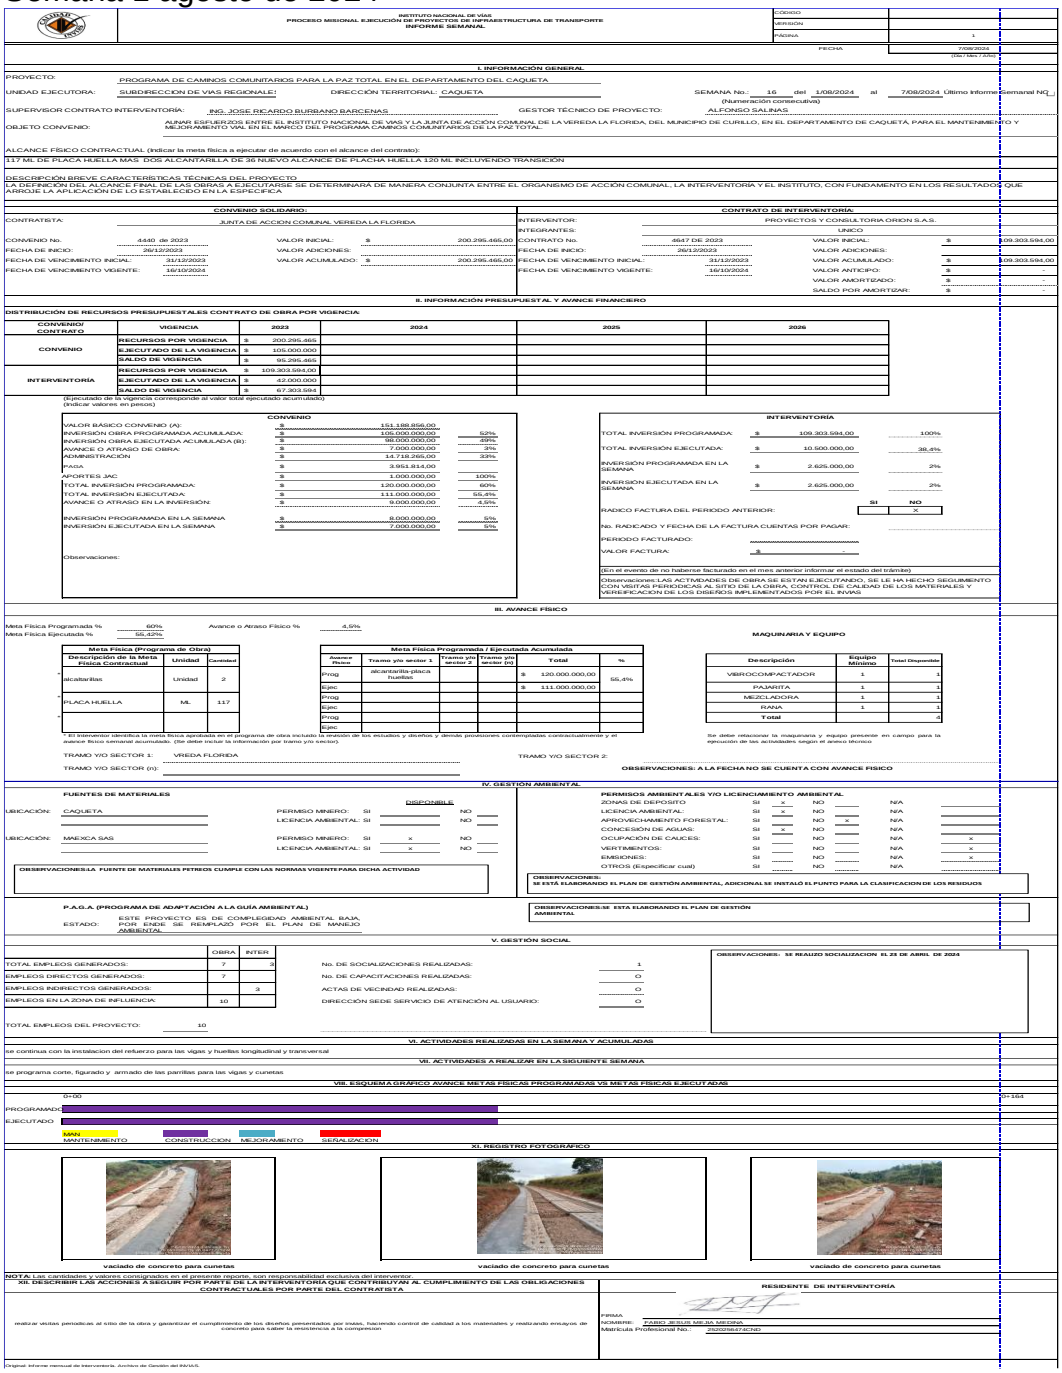

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO
VERSION
PAGINA
FECHA 7/08/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA
SEMANA No.: 16 del 1/08/2024 al 7/08/2024 Último Informe Semanal NO_ (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
117 ML DE PLACA HUELLA MAS DOS ALCANTARILLA DE 36 NUEVO ALCANCE DE PLACHA HUELLA 120 ML INCLUYENDO TRANSICIÓN
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECÍFICA

CONVENIO SOLIDARIO:
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA
CONVENIO No. 4440 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.295.465,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.295.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO
CONTRATO No. 4647 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 105.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 95.295.465			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.188.856,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 105.000.000,00	52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 98.650.000,00	49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.000.000,00	3%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.718.265,00	33%
PAGA	$ 3.951.814,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 120.000.000,00	60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111.000.000,00	55,4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.000.000,00	4,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.000.000,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.000.000,00	5%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	38,4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI X NO
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 60% — Avance o Atraso Físico % 4,5%
Meta Física Ejecutada % 55,42%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	alcatarillas	Unidad	2
2	PLACA HUELLA	ML	117
3			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla-placa huellas			$ 120.000.000,00	55,4%
Ejec				$ 111.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VREDA FLORIDA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI x	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A x	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A x	
EMISIONES:	SI	NO	N/A x	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:
SE ESTÁ ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, ADICIONAL SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: ESTE PROYECTO ES DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL BAJA, POR ENDE SE REMPLAZO POR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

OBSERVACIONES:SE ESTA ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	10	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 23 DE ABRIL DE 2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con la instalacion del refuerzo para las vigas y huellas longitudinal y transversal

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa corte, figurado y armado de las parrillas para las vigas y cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0+00 — 0+164
PROGRAMADO
EJECUTADO
MAN MANTENIMIENTO — CONSTRUCCIÓN — MEJORAMIENTO — SEÑALIZACIÓN

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

vaciado de concreto para cunetas

vaciado de concreto para cunetas

vaciado de concreto para cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por ines, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 252036474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Semana 2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	14/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALE! DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 17 del 8/08/2024 al 14/08/2024 Último Informe Semanal NO_ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
117 ML DE PLACA HUELLA MAS DOS ALCANTARILLA DE 36 NUEVO ALCANCE DE PLACHA HUELLA 120 ML INCLUYENDO TRANSICIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA

CONVENIO No.	4440 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.295.465,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.295.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 110.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 90.295.465			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.188.956,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 110.000.000,00	55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 105.000.000,00	52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.000.000,00	2%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.718.265,00	33%
PASA	$ 3.951.814,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 123.000.000,00	61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 121.000.000,00	60,4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.000.000,00	1,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.000.000,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.000.000,00	5%

Observaciones: la obra presenta un avance del 60,4 % se estan ejecutando el vaciado de concreto para cunetas y bordillos. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 33%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.625.000,00	40,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 61% Avance o Atraso Físico %: 1,0%
Meta Física Ejecutada %: 60,41%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcatarillas	Unidad	2
*	PLACA HUELLA	ML	117
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla-placa huellas			$ 123.000.000,00	60,4%
Ejec				$ 121.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
PANA	1	1
Total	4	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VREDA FLORIDA TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	x
EMISIONES:	SI	NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:
SE ESTÁ ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, ADICIONAL SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE PROYECTO ES DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL BAJA, POR ENDE SE REMPLAZÓ POR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBSERVACIONES:SE ESTA ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 23 DE ABRIL DE 2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con la instalacion del refuerzo para las vigas y huellas longitudinal y transversal y se vacia cuneta en concreto, se instala refuerzos para bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa corte, figurado y armado de las parrillas para las vigas y cunetasy bordillos

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vaciado de concreto para huellas reforzada



vaciado de concreto para huellas reforzada



vaciado de concreto para huellas reforzada

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25205594174CND

Semana 3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	1
FECHA	22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES! DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 18 del ######## al 22/08/2024 Ultimo Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

117 ML DE PLACA HUELLA MAS DOS ALCANTARILLA DE 36 NUEVO ALCANCE DE PLACHA HUELLA 120 ML INCLUYENDO TRANSICIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA			INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.		
				INTEGRANTES:	UNICO		
CONVENIO No.	4440 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.295.465,00	CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.295.465,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 157.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 43.295.465		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 78.750.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 30.553.594		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.188.856,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 163.000.000,00	81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 161.000.000,00	80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.000.000,00	1%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.718.265,00	33%
PAGA	$ 3.951.814,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 162.000.000,00	81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 157.000.000,00	78,4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.000.000,00	2,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.000.000,00	5,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.000.000,00	4,6%

Observaciones: la obra presenta un avance del 78,4 % se estan ejecutando el vaciado de concreto huellas y vigas transversales. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 33%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.750.000,00	72,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTÁN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VEREFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 81% Avance o Atraso Físico % 2,5%

Meta Física Ejecutada % 78,38%

Meta Física Programada (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	alcatarillas	Unidad	2
2	PLACA HUELLA	ML	117
3			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla-placa huellas			$ 162.000.000,00	78,4%
Ejec				$ 157.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VREDA FLORIDA TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI x	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI x	NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE PROYECTO ES DE COMPLEGIDAD AMBIENTAL BAJA, POR ENDE SE REMPLAZO POR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 10 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con la instalacion del refuerzo para las vigas y huellas longitudinal y transversal , se instala refuerzos para bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa corte, figurado y armado de las parrillas para las vigas y cunetas y bordillos

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vaciado de concreto para huellas reforzada



vaciado de concreto para huellas reforzada



vaciado de concreto para huellas reforzada

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA

Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Semana 4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALE! DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 19 del ######### al 31/08/2024 Último Informe Semanal NO_ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
117 ML DE PLACA HUELLA MAS DOS ALCANTARILLA DE 36 NUEVO ALCANCE DE PLACHA HUELLA 120 ML INCLUYENDO TRANSICIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA

CONVENIO No.	4440 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.295.465,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.295.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.295.465			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 170.436.530		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 29.858.935		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 88.934.531		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 20.369.063		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.188.856,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 148.000.000,00	74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141.000.000,00	70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.000.000,00	3%
ADMINISTRACIÓN	$ 29.436.530,00	14,7%
PAGA	$ 4.478.492,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 177.436.530,00	88,6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170.436.530,00	85,1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7.000.000,00	3,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.000.000,00	5,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.000.000,00	4,6%

Observaciones: la obra presenta un avance del 85,1 % se instalo refuerzo para cuneta y bordillos y posterios se hizo el vaciado de las cunetas. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 14,7%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a dispones para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 88.934.531,00	81,4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 10.184.531,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 89% Avance o Atraso Físico % 3,5%
Meta Física Ejecutada % 85,09%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	alcantarillas	Unidad	2
2	PLACA HUELLA	ML	117
3			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla-placa huellas			$ 177.436.530,00	85,1%
Ejec				$ 170.436.530,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCOMPACTADOR		
PAJARITA		
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás proyecciones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA FLORIDA TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	x	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO	########	N/A	########
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	########	NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	########	NO	########	N/A	x
EMISIONES:	SI	########	NO	########	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE PROYECTO ES DE COMPLEGIDAD AMBIENTAL BAJA, POR ENDE SE REMPLAZO POR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con la instalacion del refuerzo cunetas y bordillos y posterior se esta vaciando concreto de 3000 psi

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa corte, figurado y armado de las parrillas para las cunetasy bordillos

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE META FÍSICAS PROGRAMADAS VS META FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vaciado de concreto para huellas reforzada



vaciado de concreto para huellas reforzada



vaciado de concreto para huellas reforzada

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25070764774CND

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo formato de la maquinaria y equipos utilizados.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Agosto **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO No. 4440-2023 **CONTRATISTA:** JAC LA FLORIDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTOIRIAS ORION SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA	MASTER	1 BULTO	CURILLO		2	2						3							4	2			4	4	4	2			4	4	4	2		
VIBROCONCRETO	MASTER		CURILLO		2	2						3							4	2			4	4	4	2			4	4	4	2		
RANA																4	4	4																
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO					4	4						6				2	2	2	8				8	8	8	4			8	8	8	4		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO					1	1						1				4	4	4	1				1	1	1	1			1	1	1	1		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Gerardo Quintero
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato donde se relaciona todo el personal

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MEPI-MAN-1-IN-15-FR-6
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	20/8/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 4440-2023 **CONTRATISTA:** vereda florida

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes de Agosto de 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ABEL RIVERA JIMENEZ	17631651	MAESTRO	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AC VEREDA LA FLORIDA	$ 2.320.000	$ 161.500	V	SANITAS	30848583	$ 290.000	COLPENSIONES	30848583	$ -	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	
2	ORLANDO MUÑOZ ARCOS	17703734	OBRERO 1	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AC VEREDA LA FLORIDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	30848583	$ 162.500	PORVENIR	30848583	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	YEISON ANDRES PALOMARES MONSALVE	1118209487	OBRERO 2	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AC VEREDA LA FLORIDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD	30848583	$ 162.500	PORVENIR	30848583	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	LEONAR MARIN FAJARDO	1117965571	OBRERO 3	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X	AC VEREDA LA FLORIDA	$ 739.667	$ 51.300	V	ASMET SALUD	30848583	$ 92.100	PORVENIR	30848583	$ 117.900	$ 29.539	$ 14.800	$ 22.200	
5	YEISON ANDRES CARVAJAL HUACA	1118202130	OBRERO 4	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AC VEREDA LA FLORIDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD	30848583	$ 162.500	PORVENIR	30848583	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	DUVERNEY MARIN GARCIA	1117973849	OBRERO 5	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AC VEREDA LA FLORIDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD	30848583	$ 162.500	PORVENIR	30848583	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
7	MARLON YESID YALANDA BETANCOUR	1117262574	OBRERO 6	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AC VEREDA LA FLORIDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD	30848583	$ 162.500	PORVENIR	30848583	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 02 de septiembre de 2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0569412 TLM

Firma
JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo certificación del pago de seguridad social

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORIDA
PERSONARÍA JURÍDICA No 0015 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988
NIT. 901.269.506-9

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY. En mi condición de representante legal de LA JAC DE LA VEREDA LA FLORIDA de Curillo Caquetá, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

Certifico:

Que LA JAC DE LA VEREDA LA FLORIDA de Curillo Caquetá, con identificación tributaria NIT.901.269.506-9, durante el periodo comprendido del 01 al 31 del mes de AGOSTO de 2024, realizo el pago de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior dando cumplimiento a la ejecución del CONVENIO 4440 DE 2023.

Según las planilla de pago verificadas 30848583 del operador Asopagos s.a.

Dada en Curillo Caquetá, a los dos (03) días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
C.C. 17.705.058 de Curillo-Caquetá
Representante Legal JAC La Florida Curillo Caquetá

Dirección: VEREDA LA FLORIDA
Celular: 3208412572

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Anexo planilla paga del mes de agosto

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901266506	9	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	5	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
18-205	VD LA FLORIDA		3208412572		JACVEREDALAFLORIDA08@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30848583	E	2024-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.878.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	30848583	2024-09-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN			Tarifa	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRL	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	VST	SUS	INAP	CLM	AVP	VTE	AFP	AFC	APVP	NOMBRE	IBC	Cot.	FUNDS	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1581881	RIVERA JIMENEZ ABEL	2.320.000	F													0	30	30	30	RECAP SIAAPP	0	0	0	0	SANITAS EPS001	2.320.000	790.000	COMFACA-CCF13	2.320.000	97.800	2.320.000	161.500	0,00960	2.320.000	46.400	69.600	0	0	01	0	668.300	N	5479001
2	CC 1770734	MUÑOZ ARCOS ORLANDO	1.360.000	F													0	30	30	30	PORVENIR-230301	1.360.000	326.400	0	0	SANITAS-EPS001	1.360.000	163.200	COMFACA-CCF13	1.360.000	52.000	1.360.000	90.500	0,00960	1.360.000	26.000	39.000	0	0	01	0	378.000	N	5479001
3	CC 1116703158	CASTAÑAL HUACA YEISON ANDRES	1.360.000	F													0	30	30	30	PORVENIR-230301	1.360.000	326.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.360.000	163.200	COMFACA-CCF13	1.360.000	52.000	1.360.000	90.500	0,00960	1.360.000	26.000	39.000	0	0	01	0	378.000	N	5479001
4	CC 1116209187	SALOMARES MOSQUERA YEISON ANDRES	1.360.000	F													0	30	30	30	PORVENIR-230301	1.360.000	326.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.360.000	163.200	COMFACA-CCF13	1.360.000	52.000	1.360.000	90.500	0,00960	1.360.000	26.000	39.000	0	0	01	0	378.000	N	5479001
5	CC 1117707574	YALANDA BETANCOUR MARLON YESID	1.360.000	F													0	30	30	30	PORVENIR-230301	1.360.000	326.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.360.000	163.200	COMFACA-CCF13	1.360.000	52.000	1.360.000	90.500	0,00960	1.360.000	26.000	39.000	0	0	01	0	378.000	N	5479001
6	CC 1117986573	MARIN PAJARDO LEIDMAR	1.360.000	F	X												0	17	17	17	PORVENIR-230301	770.667	117.900	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	736.667	92.100	COMFACA-CCF13	736.667	29.500	736.667	51.300	0,00960	736.667	14.800	22.200	0	0	01	0	327.800	N	5479001
7	CC 1117973849	MARIN GARCIA DOBERNEY	1.360.000	F													0	30	30	30	PORVENIR-230301	1.360.000	326.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.360.000	163.200	COMFACA-CCF13	1.360.000	52.000	1.360.000	90.500	0,00960	1.360.000	26.000	39.000	0	0	01	0	378.000	N	5479001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901266506	9	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	5	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
18-205	VD LA FLORIDA		3208412572		JACVEREDALAFLORIDA08@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30848583	E	2024-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.878.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	30848583	2024-09-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.236.667	9.556.667	9.556.667	9.556.667	9.556.667

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				6	1.157.900	0	0	0	1.157.900
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.157.900	0	0	0	1.157.900
EPS(Administradoras: 2)				7	1.194.600	0	0	0	1.194.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	452.500	0	0	0	452.500
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900835126	7	5	742.100	0	0	0	742.100
ARP(Administradoras: 1)				7	665.300	0	0	0	665.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	665.300	0	0	0	665.300
CCF(Administradoras: 1)				7	382.300	0	0	0	382.300
COMFACA	CCF13	891180047	2	7	382.300	0	0	0	382.300
SENA(Administradoras: 1)				7	191.200	0	0	0	191.200
SENA	PASENA	899999034	1	7	191.200	0	0	0	191.200
ICBF(Administradoras: 1)				7	286.800	0	0	0	286.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	286.800	0	0	0	286.800
Gran Total					3.878.100	0	0	0	3.878.100

PAGADO

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 4440-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA FLORIDA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.295.465,00	N/A
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.295.465,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 122.462.973,36	$ 28.725.882,64	**$ 151.188.856**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119.880.000,00	$ 28.120.000	**$ 148.000.000,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 114.210.000,00	$ 26.790.000	**$ 141.000.000,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.670.000,00	$ 1.330.000	**$ 7.000.000,00**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 143.723.589,30	$ 33.712.941	**$ 177.436.530,00**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 138.053.589,30	$ 32.382.941	**$ 170.436.530,00**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.670.000,00	$ 1.330.000	**$ 7.000.000,00**
*			$ -
VALOR TOTAL			**$ 170.436.530,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
residente de Obra GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Matrícula Profesio 161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N:2522237430CND

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo estado general del tiempo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 4440 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION LA FLORIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto de 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	8	8	8			8	8	8	8			8	8	8	4	8	8			8	8	8	8			8	8	8	8		8	172
Lluvias moderadas										8					4																	12
Lluvias intensas					8														8											8		24
Total horas	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	8	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:161037-0593412 TLM

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el transcurso del mes de agosto se tomaron muestras de concreto en cilindros, después de que cumplieron los 28 días de fraguado se llevaron a laboratorio para practicar la resistencia a la comprensión. Estamos a la espera de que el laboratorio contratado envié lo informes de los cilindros fallados.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexan pólizas del convenio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 4440-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA FLORIDA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 23/09/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.295.465,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3.300.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.059.093,00	17	11	2023	31	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.014.773,23	17	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.088.639,50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296764

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000,00	17	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073351 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.059.093,00	17	11	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.014.773,23	17	11	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.088.639,50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296764

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000,00	17	11	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073351 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas del convenio

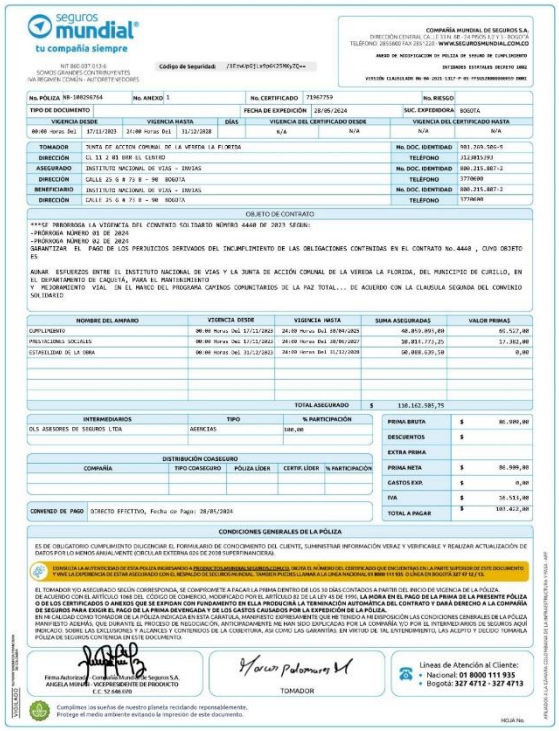

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

No. PÓLIZA NB-100256764 | No. ANEXO 1 | No. CERTIFICADO 71967759 | No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICIÓN 28/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-6
DIRECCIÓN	CL 11 2 03 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128915193
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:
-PRORROGA NUMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NUMERO 02 DE 2024
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 30/04/2025	60.859.895,00	65.527,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 30/06/2027	30.851.772,25	17.382,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	50.860.630,50	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 138.162.585,75

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	86.909,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	86.909,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	16.511,00
TOTAL A PAGAR	$	103.422,00

CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRENDE TU SEGUROS MUNDIAL SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE, ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada — Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRANDA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.078

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2851600 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71967759	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC.EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9


NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 28.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

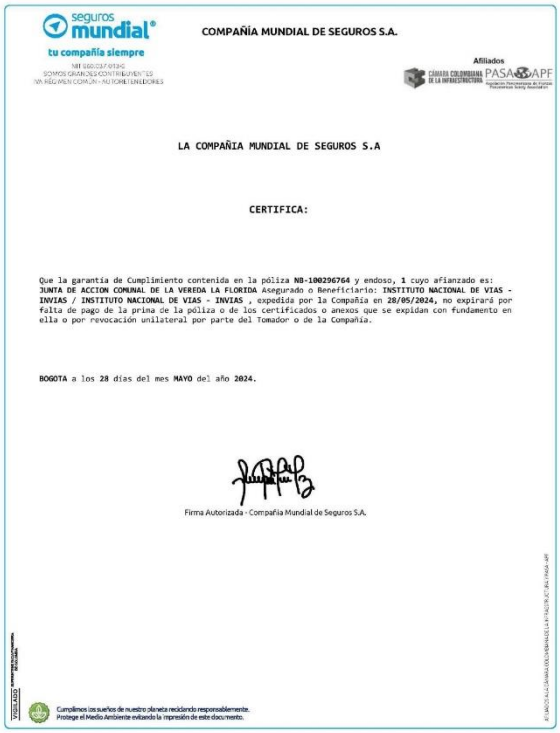

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:


Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100296764** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **28/05/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **28** días del mes **MAYO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

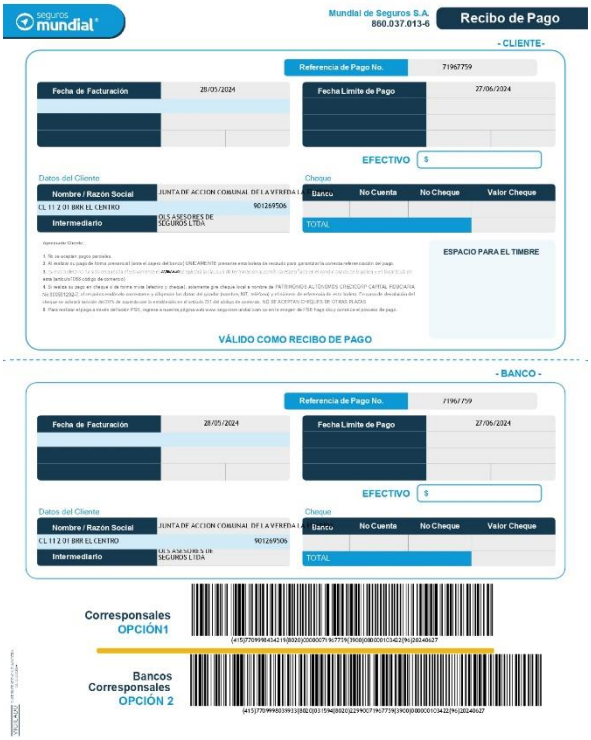

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 71967759

Fecha de Facturación	Fecha Limite de Pago
28/05/2024	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	901269506
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 71967759

Fecha de Facturación	Fecha Limite de Pago
28/05/2024	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	901269506
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL 7 SUR 48 - 54 PISOS 12 Y 13 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2856660 FAX 285 7228 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO RETENEDORES DE RENTA - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 732/87055#1h/4Cp7?cZA==

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968965	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4648 DE 2023 SEGUN:

-PRORROGA NUMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NUMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4648 , CUYO OBJETO ES:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$ 347.847,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 347.847,00
GASTOS EXP.	$ 0,00
IVA	$ 69.569,00
TOTAL A PAGAR	$ 417.416,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUAL MENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PÓLIZAS TOTALMENTAL SEGUROS.COM.CO, DIGITE EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.


EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRANDA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

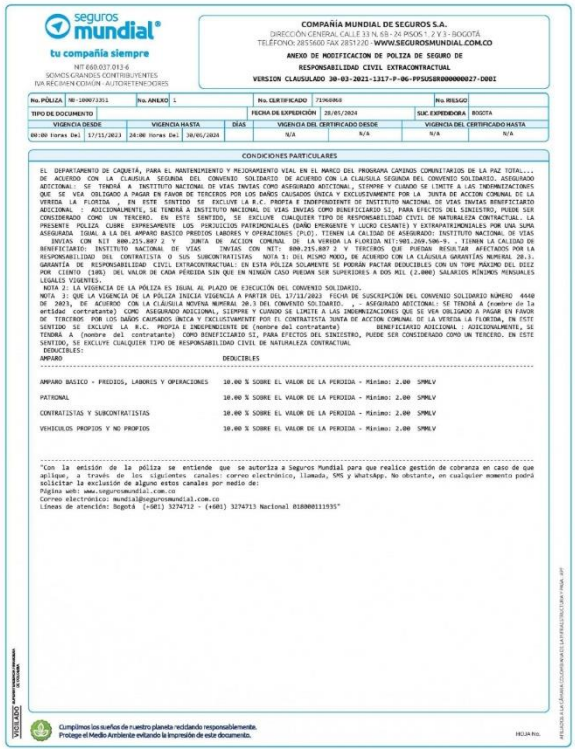

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2851660 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968068	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC.EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (P.O). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9 , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4648 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111535"

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
HOJA No.

|1

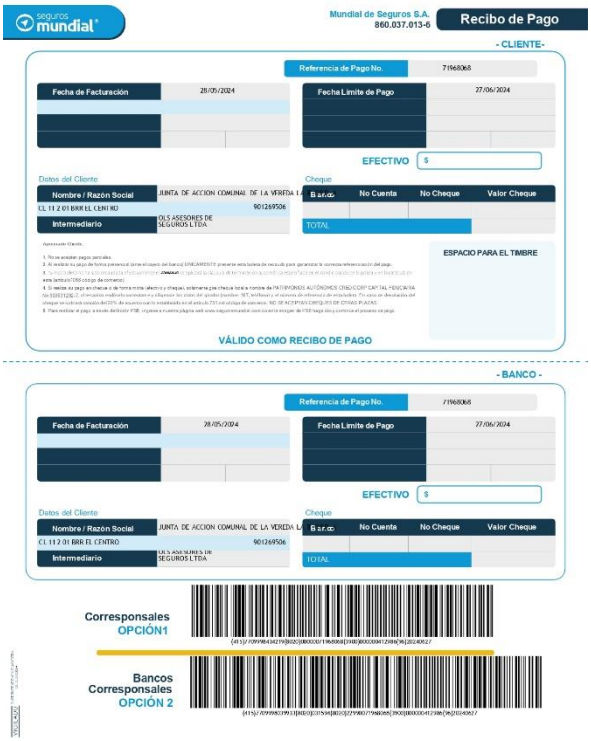

seguros mundial®
Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6
Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 71968068

Fecha de Facturación	28/05/2024	Fecha Límite de Pago	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA L	901269506
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO		
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	

Cheque

B.a.n.c.o.	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 71968068

Fecha de Facturación	28/05/2024	Fecha Límite de Pago	27/06/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente


Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA L	901269506
CL 11 2 01 BRR EL CENTRO		
Intermediario	OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	

Cheque

B.a.n.c.o.	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

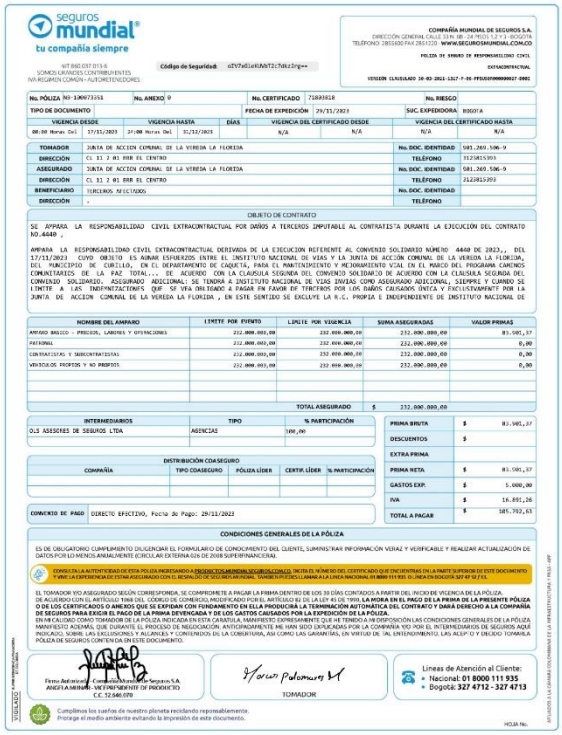

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	0	71893818	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	Cl 11 2 03 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	Cl 11 2 03 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4640 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUBILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.505,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OJS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	83.505,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.505,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.792,63

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2018 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O...NEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA [illegible]
VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.660.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALL..E 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851 220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100073351	0	71893818	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	29/11/2023	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTEITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT. 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT: 901.269.506-9. TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENTO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minino: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

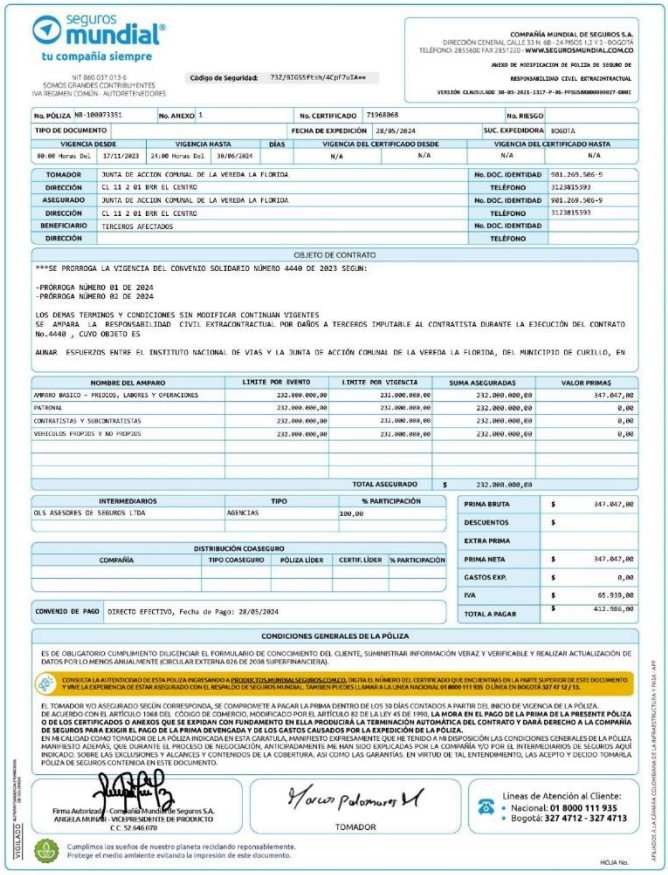

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 73Z/RIG55FtsN/4CpF7uIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2853400 FAX 2857210 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.939,00
TOTAL A PAGAR	$	412.986,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO. SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MENDIETA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASA - AFP



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 660.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2831220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960068	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:


AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111035"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

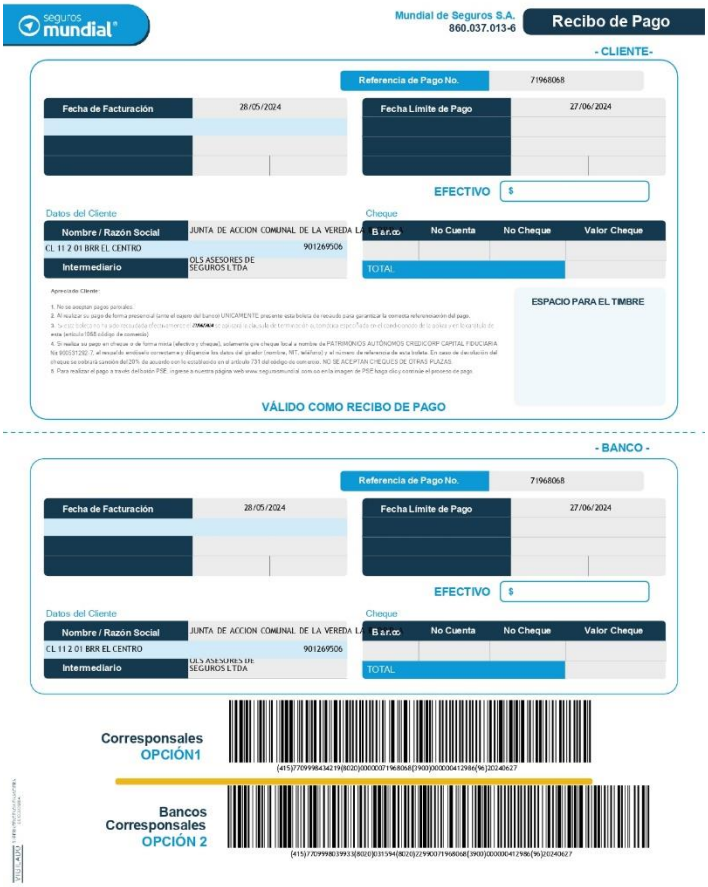

4.8SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA


Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Para los estudios topográficos se exigió a la JAC, los certificados de calibración de los equipos con los cuales se realizaron los levantamientos topográficos. Se ANEXA certificado de mantenimiento y calibración de los equipos usados en el levantamiento topográfico.
- Ficha técnica de los materiales utilizados

4.9 **OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL**

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se anexa programación de obra

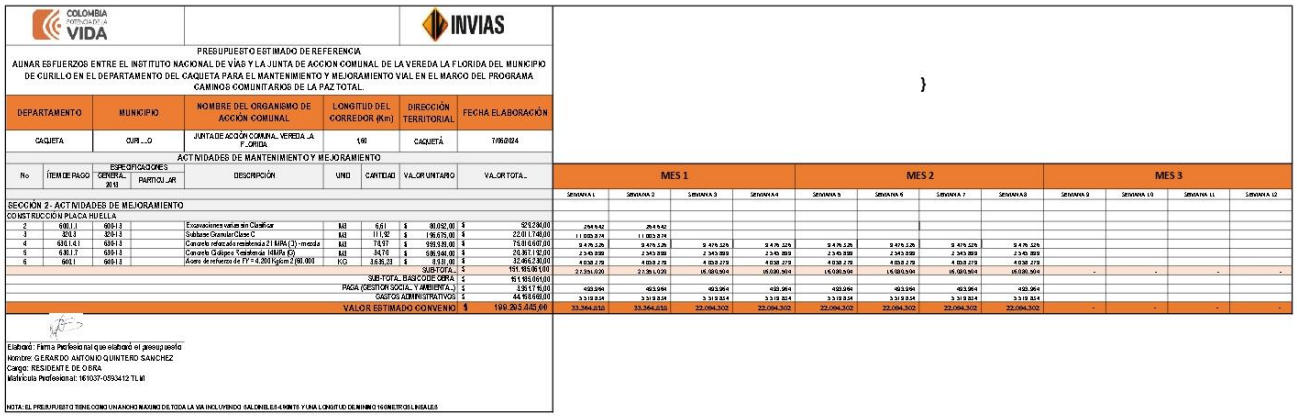

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CURILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	CURI ...O	JUNTA DE ACCIÓN COMUNA.. VEREDA ..A F..ORIDA	1,60	CAQUETÁ	7/06/024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTA..	MES 1				MES 2				MES 3			
									SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																				
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																				
2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,61	$ 80.052,00	$ 529.284,00	264.642	264.642										
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	111,92	$ 196.675,00	$ 22.011.748,00	11.005.874	11.005.874										
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla	M3	78,97	$ 959.939,00	$ 75.810.607,00	9.476.326	9.476.326	9.476.326	9.476.326	9.476.326	9.476.326	9.476.326	9.476.326				
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34,70	$ 586.944,00	$ 20.367.192,00	2.545.899	2.545.899	2.545.899	2.545.899	2.545.899	2.545.899	2.545.899	2.545.899				
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000	KG	3.635,23	$ 8.931,00	$ 32.466.230,00	4.058.279	4.058.279	4.058.279	4.058.279	4.058.279	4.058.279	4.058.279	4.058.279				
							SUB-TOTAL	$ 151.185.061,00	27.351.020	27.351.020	16.080.504	16.080.504	16.080.504	16.080.504	16.080.504	16.080.504	-	-	-	-
							SUB-TOTAL, BASICO DE OBRA	$ 151.185.061,00												
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL.)	$ 3.951.715,00	493.964	493.964	493.964	493.964	493.964	493.964	493.964	493.964				
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.158.669,00	5.519.834	5.519.834	5.519.834	5.519.834	5.519.834	5.519.834	5.519.834	5.519.834				
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 199.295.445,00	33.364.818	33.364.818	22.094.302	22.094.302	22.094.302	22.094.302	22.094.302	22.094.302	-	-	-	-

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 161037-0593412 TLM

NOTA: EL PRESUPUESTO TIENE COMO UN ANCHO MAXIMO DE TODA LA VIA INCLUYENDO SALDINELES 4 MTS Y UNA LONGITUD DE MINIMO 16 METROS LINEALES

Se anexa presupuesto actualizado

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA DEL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	CURILLO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORIDA	1,60	CAQUETÁ	7/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	6,61	$ 80.052,00	$ 529.284,00
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	111,92	$ 196.675,00	$ 22.011.748,00
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla	M3	78,97	$ 959.939,00	$ 75.810.607,00
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34,70	$ 586.944,00	$ 20.367.192,00
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000	KG	3.635,23	$ 8.931,00	$ 32.466.230,00
							SUB-TOTAL	$ 151.185.061,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 151.185.061,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.951.715,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.158.669,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 199.295.445,00

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO SANCHEZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Matricula Profesional: 161037-0593412 TLM

Revisó: Firma Líder Zona Programa
Nombre: MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
Cargo: PRESIDENTE JAC LA FLORIDA
C.C : 51.975.533

NOTA: EL PRESUPUESTO TIENE COMO UN ANCHO MAXIMO DE TODA LA VIA INCLUYENDO SALDINELES 5 MTS Y UNA LONGITUD DE MINIMO 137 METROS LINEALES


4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se anexa plan de inversión



4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Anexo actas comité operativo

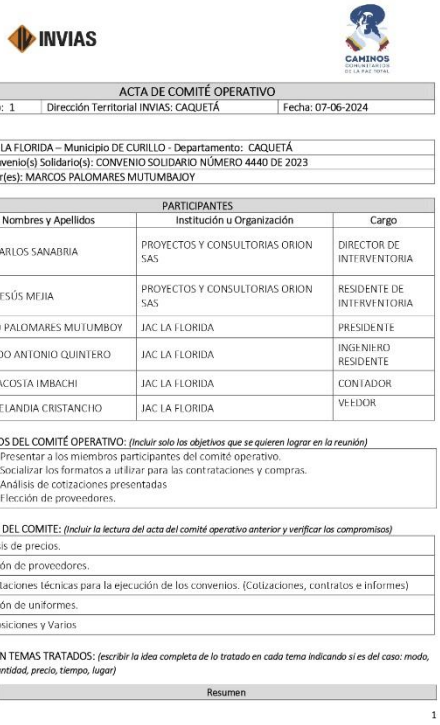

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO

Acta No: 1	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETÁ	Fecha: 07-06-2024

Vereda LA FLORIDA – Municipio DE CURILLO - Departamento: CAQUETÁ
No. Convenio(s) Solidario(s): CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023
Ejecutor(es): MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY

PARTICIPANTES

Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MARCO PALOMARES MUTUMBOY	JAC LA FLORIDA	PRESIDENTE
GERARDO ANTONIO QUINTERO	JAC LA FLORIDA	INGENIERO RESIDENTE
JADER ACOSTA IMBACHI	JAC LA FLORIDA	CONTADOR
RAUL VELANDIA CRISTANCHO	JAC LA FLORIDA	VEEDOR

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros participantes del comité operativo.
2. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
3. Análisis de cotizaciones presentadas
4. Elección de proveedores.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1-Análisis de precios.
2- Elección de proveedores.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
4- Elección de uniformes.
5- Proposiciones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen

1



1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los cuatro (4) miembros principales, el presidente, el ingeniero residente, contador y un representante de la veeduría.
2.	**Socialización de formatos a utilizar:** Se socializa a los participantes del comité operativo el formato a usar con referencia al análisis de los proveedores oferentes en términos de precio, disponibilidad de materiales, tiempo de entrega, facilidades de entrega, transporte en materiales, entre otros aspectos importantes para el suministro de los bienes y servicios requeridos para la placa huella-
3	**Presentación de cotizaciones:** A continuación se detallarán las cotizaciones de los proveedores seleccionados.
3.1	MATERIALES EPP: Se consigna que la dotación se comprara con la empresa **RPM**, ya que la empresa nos ofrece los artículos requeridos dando cumplimiento a las necesidades establecidas por INVIAS. El pago se realiza pagando el 100% al proveedor.

2

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.2	**Topografía:** Para la topografía se recibieron varias cotizaciones de las cuales, la única persona que quiso continuar y sostener su oferta es el Sr Daniel Arias, estas cancelaciones de las ofertas se debe por las situaciones de conflicto que vive la zona a realizar el trabajo topográfico. Es así, como el comité determinó elaborar la topografía con el señor Daniel Felipe Arias Gonzales, el cual oferto sus servicios por valor de $ 1´600.000 y fue el único que estaba de disponible para ingresar a la zona del servicio. El servicio se debe cancelar 50% inicial para el acceso a la zona y el saldo 50% se paga a la entrega del informe en transferencia directa al proveedor. Por otra parte, se indica que el pago inicial se realiza en efectivo mediante dinero prestado al presidente de la junta. DANIEL FELIPE ARIAS GONZALEZ TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA Florencia,07 de junio de 2024 Señores JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA LA FLORIDA Nit. 901269506-9 Jacveredalafloridad@gmail.com Florencia, Caquetá. Asunto: propuesta de trabajo levantamiento topográfico tramo vial 150 m lineales aprox. Respetuosamente me permito presentar propuesta formal para llevar a cabo el levantamiento topográfico de 150 m lineales aproximadamente de un tramo vial sobre vía terciarias con fines de proyección de plata huella, donde se desarrollarán las siguientes actividades - Levantamiento topográfico con sistema GNSS (RTK). - Levantamiento topográfico del inventario físico de cercas, postes, construcciones existentes en todo lo relacionado para involucrar y sustanciar expediente técnico físico. - Nivelaciones curvas de nivel cada 50 cm - Localización general, ciudad, vereda, sector Tiempo: el tiempo estimado del trabajo de campo, procesamiento de la información y entrega de productos es de 20 días calendario Equipos: La comisión de topografía cuenta con GNSS RTK I50 Valor: El valor de los servicios profesionales ofrecidos es de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS (1.600.000) MCTE, los cuales se cancelarán en un 50% para inicios de la actividad y un 50 % cuando se entreguen los productos. Cordialmente. DANIEL FELIPE ARIAS GONZALEZ C.C 1113810674 DE SEVILLA VALLE Tecnólogo en topografía

3

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.3	**Estudio de suelos:** Para el estudio de suelos, se recibieron varias cotizaciones de las cuales, la única empresa que quiso continuar y sostener su oferta fue Ingesueios para la elaboración de estudios de laboratorio, estas cancelaciones de las ofertas se deben por las situaciones de conflicto que vive la zona a realizar el trabajo. Es así, como el comité determinó elaborar el estudio de suelos con Ingesuelos, el cual oferto sus servicios por valor de $ 1´700.000 más IVA, para un total de $2.100.000; fue el único que estaba de disponible para ingresar a la zona a prestar el servicio. El servicio se debe cancelar 50% inicial para el acceso a la zona y el saldo 50% se paga a la entrega del informe en transferencia directa al proveedor. Por otra parte, se indica que el pago inicial se realiza en efectivo mediante dinero prestado al presidente de la junta. INGSUELOS www.ingsuelos.com.co CL-S-01-2024-v0 Florencia, Caquetá 29/04/2024 **VEREDA LA FLORIDA. ZONA RURAL DE CURILLO.** **Asunto:** Propuesta económica –estudio de suelos mediante apiques y CBR sobre muestra inalterada. Respetados, A continuación, se presenta la propuesta económica. **ITEM** | **Parámetro o Ensayo** | **Unidad** | **VR PARCIAL** 1 | Apique hasta 1.50m con toma de muestras para ensayos de clasificación y CBR inalterado. (Incluye ensayo de cono dinámico) | Global | $1.700.000 **TOTAL ANTES DE IMPUESTOS** | **$1.700.000** **NOTAS** - Los precios para estudio de suelos mediante apiques incluyen viáticos y transporte de personal, muestras y equipos. - Los precios son antes de IVA del 19%. **FORMA DE PAGO** - 50% anticipo. - 50% contra entrega del informe de resultados. **TIEMPOS DE ENTREGA** - 10 días hábiles o a definir con el cliente según requerimientos. **DATOS PARA CONSIGNACIONES** Tipo de Cuenta: Ahorros Entidad: Bancolombia No.: 466-12542-69 Nombre: INGSUELOS S.A.S. NIT: 900.648.551-3 Cordial Saludo, **GERMAN GARCIA DIAZ** **GERENTE** Ing. Civil, M. Sc. Geotecnia.

4

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PROSPERIDAD

3.4

Materiales de Ferreteria:
Se Realiza la cotizacion en tres ferretenas y con la ferreteria de la ciudad de Florencia, ALMACENES CORAL ofercio los precios más bajos que en belén de los Andaquies y San Jose de Fragua. Por lo tanto, se toma la decisión de adquirir los materiales en ALMACENES CORAL. Se pagara 50% inicial por transferencia al tercero y el saldo en un segundo pago para la entrega final de materiales, transferencia directa al proveedor.

CORAL
construye con inteligencia

WILMER MONTAÑA LONDOÑO
NIT: 1.117.814.578-1 RÉGIMEN COMÚN
CRA 11 # 15-58 BARRIO LA ESPERANZA - FLORENCIA CAQUETÁ
NO RESPONSABLES DE IVA

Fecha Cotización: 06/06/2024

COTIZACION N° 4406

CLIENTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA — NIT: 901285506 — TEL: 3.10.85.5592 — CIUDAD: CURILLO
NOTAS: — CONTACTO: CURILLO

Item	Codigo	Descripción	unidad	Cantidad	V/ Unitario	Valor Total
1	90000006	CEMENTO CEMEX GRIS X 50 KILOS	UND	15,000	$ 25,000	$ 375,000,000
2	10301027	VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.5MM.)	UND	750	$ 15,000	$ 11,500,200
3	10301151	ALAMBRE NEGRO # 18/19	UND	182	$ 5,000	$ 1,095,000
4	10308005	PUNTILLAS CON CABEZA 2 1/2 " PUNA	UND	10	$ 600	$ 36,000
5	10302008	CANDELILLA REFRENTADO PLASTICA BELLOTA	UND	3	$ 195,000	$ 585,000
6	10408023	GRAPA FORJADA DE 1.00MTS	UND	2	$ 99,500	$ 199,000
7	10408076	PALA HOJARASCA N2.2	UND	6	$ 16,000	$ 108,000
8	10408023	PALIN HOYADOR CAL. 16 HERRAJADO	UND	3	$ 17,057	$ 51,172
9	10201347	CARO PALA	UND	9	$ 8,000	$ 72,000
10	10301302	ALMADANA HERRAJADO CON CARO Y PALETA GRANDE DE 1.00MTS	UND	1	$ 195,000	$ 195,000
11	10308009	CUALLA PROFESIONAL CEMENTA 50"	UND	1	$ 198,000	$ 198,000
12	10308009	MALLAS PARA CONSTRUCCION	UND	24	$ 5,750	$ 138,000
13	10308246	SEMBRADO EN METAL MADERA 50" LEGUAS	UND	2	$ 16,000	$ 32,000
14	10308438	PANTALLA PULIDO 25 MM	UND	3	$ 16,750	$ 67,000
15	10308222	PALLETTIN PL PLASTICO CEMENTA #5	UND	2	$ 8,000	$ 16,000
16	10308221	PALLETTIN PL PLASTICO CEMENTA #5	UND	1	$ 7,000	$ 7,000
17	10302061	PLASTICO NEGRO 3000 4MLS 4 MTS	UND	190	$ 8,000	$ 780,000
18	10302074	...FLEJE EN 5 G.26 X 5.00 EN 3.00	UND	1,000	$ 1,000	$ 1,000,000
19	10302074	...FLEJE METABALLAR 100 MM EN 3.00	UND	500	$ 2,000	$ 1,115,000
20	10302343	TELA PP 2" 100M DOBLADA (VERDE RALADA	UND	30	$ 2,000	$ 84,000
21	10308040	CINTA PELIGRO ROLLO X 500 MT	UND	2	$ 30,000	$ 59,000
22	10302074	...CANECA PLASTICA 55 GL	UND	3	$ 128,000	$ 384,000

Nota:
Forma de Pago: EFECTIVO
Validez oferta: 30 DIAS
Garantia:
Tiempo de entrega: 1 DIAS
Lugar de entrega: EN PANGUITA, LIBRE DE DESCARGUE Y ENTREGAS PARC

CUENTAS A CONSIGNAR
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE: 84700000041 A NOMBRE DE Wilmer montaña Londoño. CC:1.117.814.578

Subtotal	$ 36,996,329.00
Descto	$ 0.00
Gravado 19%	$ 36,996,329.00
Iva 19%	$ 7,029,302.51
Ipo 10%	$ 3,962,649.00
Ina 0%	$ 14,610.00
Total	$ 43,972,172.00

Digitalizar: 3104821572

Página 1 de 2 Nota Siguiente... 4:00:25PM

5

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PROSPERIDAD

3.5

Materiales Pétreo:
En el proceso de cotización de materiales pétreos se recaudó dos cotizaciones: playa la raya del municipio de Albania y la trituradora de Morelia, se tomó la decisión de comprar el material pétreo con Multimezclas y agregados ubicada en el Municipio de Morelia, quien oferta todo el material requerido y al mejor precio. Por las condiciones de pagos se decide pagar el 50% anticipado inicial en efectivo y el saldo 50% se paga a la entrega final de los materiales en transferencia directa al proveedor. Por otra parte, se indica que el pago inicial se realizara en efectivo mediante dinero prestado al presidente de la junta.

MULTIMEZCLAS & AGREGADOS
VENTA DE MATERIALES
CALIDAD, PROFESIONALES Y CUMPLIMIENTO

Fecha	Mayo 2024
Empresa	VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CURILLO
Nit	901285506-9
Contacto	3208412572
Celular	
Ubicación	Morelia

Material	Precio/m3 antes de IVA	Cantidad Requerida	Total
Gravilla 1/2"- 1 viaje de 6m3	$ 83.333	6	$ 500.000
Gravilla 3/4"- 1 viaje de 6m3	$ 83.333	6	$ 500.000
Base Granular*-1 viaje de 6m3	$ 60.000	6	$ 360.000
Arena triturada 1/2*-1 viaje de 6m3	$ 58.333	6	$ 350.000
Arena triturada3/8 * -1 viaje de 6m2	$ 30.000	6	$ 180.000
		SUBTOTAL	
		IVA	$
		TOTAL	
Nota	*Material cargado en planta **Material cargado en playa		

Cordialmente: Daniel Alberto Corrales arcil.

Para consignaciones o transferencias bancarias

Banco	Cuenta	No. cuenta
Banco Bogotá	Ahorros	244-074-878
Bancolombia	Corriente	465-30500-787

https://grupomultimezclas.com/

6

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PROSPERIDAD

3.6

Materiales Pétreo:
De las cotizaciones presentadas para el alquiler de maquinaria se escogió la que tenía los precios más favorables para la junta, el menor tiempo de Standby y que ofrece las facilidades de pago. Se paga 50% inicial y 50% al final del servicio con transferencia directa al proveedor.

ALQUILER DE MAQUINARIA
ZM

Belén de los Andaquíes, 22 de mayo de 2024

Cotización: **BA-0015-2024**

Señores
Junta de Acción Comunal de la Vereda la Florida

Asunto: **Cotización Alquiler de equipos para IAC del municipio de Curillo Caquetá**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, se realiza la cotización de las maquinarias relacionadas en la solicitud.

Términos de cotización:

- Precios sin IVA.
- Precios fijos (no incluye transporte).
- Los días de trabajo son de Lunes a Sábado.
- Standby de 3 horas para los días que no se trabaje.
- Se relaciona precio del transporte de la maquinaria
- Se incluye servicio de volqueta para el transporte de materiales.

Item	Equipo / Maquinaria	Unidad	Cantidad	Standby	V/ Unitario	V/ Total
1	Retroexcavadora	Hora	50	3	$170.000	$ 8.500.000
2	Motoniveladora	Hora	80	3	$200.000	$ 16.000.000
3	Vibro Compactador	Hora	50	3	$160.000	$ 8.000.000
4	Transporte de Maquinaria	Servicio	3		$1.600.000	$ 4.800.000
						$ 31.300.000

Item	Equipo / Maquinaria	Unidad	Cantidad	Standby	V/ Unitaria	V/ Total
5	Volqueta	Trayecto	1		$1.000.000	$ 1.000.000

Forma de pago: 50% anticipado – 30% parcial – 20% al finalizar.

Sin otro particular,

CARLOS ZAMBRANO
CARLOS ZAMBRANO CORTES
CC. 1.081.362.496
Belén de los Andaquíes

7

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PROSPERIDAD

3.7

Examen médico ocupacional:
Después del análisis de las cotizaciones se eligió en comité que LABOREMOS SAS, sea el que realice los respectivos exámenes de pre ingreso ya que nos ofrece el servicio de examen médico ocupacional virtual y con buen precio. Se decide realizar este pago en efectivo para adelantar los procesos ya que tuvimos retrasos al inicio de estos procesos.

Laboremos
Seguridad, Salud y Ambiente — Medicina Laboral y Salud Ocupacional

Florencia, 07 de mayo de 2024

Señores: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA**
NIT: 901285506 - 9
Ciudad

Asunto: Cotización Examenes Médicos Ocupacionales.

Cordialmente me permito presentar el listado de servicios y precios de los laboratorios especializados en Salud Ocupacional, que hacen parte de nuestra red de diferentes clínicas y centros de nuestro proyecto **LABOREMOS** para la prestación de los servicios

A continuación, relaciono los exámenes con su respectivo valor.

Tarifas para toma de exámenes en IPS laboremos Florencia

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	VALOR UNITARIO Type I
Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular. (ingreso, periódico, retiro por tercerizado)	$ 60.000

* Se prorata día y se cobra acompañamiento desde el área de medicina laboral.

Atentamente,

JORGE ANDRES BOLIVAR GOMEZ
Representante Legal
C.C 79.987.207
Cel: 3118881843 - 3053828732

8

3.8

Examen médico ocupacional:
De las cotizaciones presentadas para el alcuiler de maquinaria de equipos menores y se escogió la que tenía los precios más favorables para la junta, el cual se pagará 50% inicial y 50% al finalizar el servicio, con transferencia directa al proveedor.

H&D CONSTRUEQUIPOS
Herramientas Y Diseño
Nit. 17.689.556-2

Florencia 07 JUNIO 2024

Señores: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA**
NIT: 901260506-9
Ciudad

Asunto: Cotización Alquiler Herramientas.

Cordial saludo

En atención a la invitación de cotizar, me permito relacionar a continuación detalles:

OBJETO	VR ALQUILER MES
VIBRO DE CONCRETO ELECTRICO O A GASOLINA	$550.000
MEZCLADORA DIESEL 1 BULTO	$800.000
PLANTA ELECTRICA 9500W DIESEL	$1.000.000
MOTOBOMBA A GASOLINA 3" CON GUIOS	$600.000

La anterior cotización no incluye IVA. Detalles y cantidades se especifican en el momento de la entrega, el pago se realiza por anticipado.

Agradezco su amable atención a la presente cotización esperando una positiva respuesta.

CORDIAL SALUDO

LUIS EDWIN CARDOSO CAICEDO
NIT. 17.689.556-2
Cra 30 # 24-93 ciudadela habitacional
Tel. 3123042267

9

3.9

Transporte Material Ferretería:
De las cotizaciones presentadas para transporte de materiales de ferretería se escogió la que tenía los precios más favorables para la junta y el que nos realiza la entrega en la obra.

Florencia, junio 06 de 2024

Señores
Junta de Acción Comunal Vereda La Florida
Curillo - Caquetá

En respuesta a su solicitud de cotización nos permitimos ofrecerle el siguiente servicio:

	Descripción del Producto	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	TRANSPORTE MATERIALES DE FERRETERIA FLORENCIA – VEREDA LA FLORIDA OBRA	5	$1.000.000	$5.000.000
	TOTAL			**$ 5.000.000**

Condiciones:
Validez de la oferta: 15 días calendario.
Forma de pago: 50% anticipo y el otro 50% al finalizar los viajes de transporte.
Lugar de entrega: Vereda La Novia Curillo Caquetá

Dado en Florencia, Caquetá a los 06 días del mes de junio 2024.


Sin otro particular, me suscribo

Camila Andrea Álvarez Arrigui
Representante Legal

10

3.10

Maderas:
Después del análisis de las cotizaciones se eligió en comité que: Edgar Aldana es la persona seleccionada para suministrar la madera. El pago se realiza el 100% en transferencia al tercero.

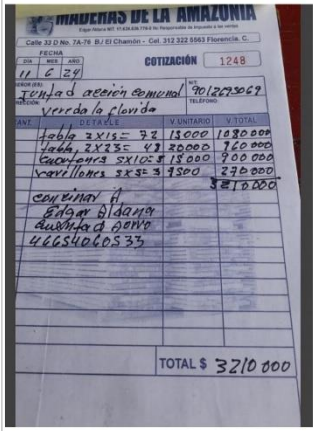

11

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se analizaron cada una de las cotizaciones y se tomó la decisión de elegir a los proveedores que realizaran los suministros de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto y por ende se eligieron a las siguientes empresas: ✓ Cotización Para Dotación: RPM SUMINISTROS Y DOTACIONES - VALOR $ **3.225.000 +IVA.** **SELECCIONADA** ✓ Topografía: DANIEL FELIPE ARIAS GONZALEZ VALOR $ **1.600.000** **SELECCIONADA** ✓ Laboratorio: ING. SUELOS VALOR $ **1.700.000 MAS IVA** **SELECCIONADA** ✓ Materiales de ferretería: ALMACENES CORAL LTDA **SELECCIONADA** ✓ Material Pétreo: MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS, **según los metros requeridos** **SELECCIONADA** ✓ Maquinaria Amarilla Alquiler: CARLOS ZAMBRANO CORTEZ **SELECCIONADA** ✓ Transporte de Material Pétreo: CARLOS ZAMBRANO CORTEZ **SELECCIONADA** ✓ Exámenes Médicos: LABOREMOS VALOR **30.000** **SELECCIONADA** ✓ Alquiler Equipos Menores: H&D CONSTRUEQUIPOS **SELECCIONADA** ✓ Transporte de materiales de ferretería: Camila Andrea Álvarez Arrigui **SELECCIONADA** ✓ Madera: **Edgar Aldana** **SELECCIONADA**

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI	NO X	No. Folios:
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO ___X__	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI	NO X	No. Folios:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(Se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

12

INVIAS

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
RUBRICAR LAS ACTAS DEL COMITÉ OPERATIVO	CONTADOR / INGENIERO	08-06-2024
ELABORAR EL PLAN DE INVERSION	CONTADOR / INGENIERO	08-06-2024
PRESENTAR LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES	CONTADOR	08-06-2024
ENVIAR EXAMENES LABORALES DE INGRESO.	CONTADOR	08-06-2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director Interventoria

Nombre: MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY
Cargo: Presidente OAC La Florida

Nombre: FABIO JESÚS MEJIA
Cargo: Residente Interventor

Nombre: JADER ACOSTA IMBACHI
Cargo: Contador OAC La Florida

Nombre: RAUL VELANDIA CRISTANCHO
Cargo: presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: GERARDO ANTONIO QUINTERO S.
Cargo: Residente de Obra.


<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

13

4.9.4. ACTAS DE REUNIÓN

Se anexa acta de socialización



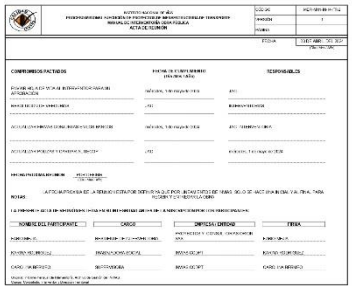

1. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1 Información general del contrato

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*

OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*
CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*
VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	9 MESES Y 16 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

*Tabla **2**. Información general contrato 4647 de 2023*

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Se hizo control de calidad en los materiales utilizados y se verificó que estos cumplan con las especificaciones técnicas

Se hizo seguimiento a las obras por medio de visitas periódicas al sitio, donde se verificó que se utilizaron los diseños requeridos por el Invias

Se le hizo seguimientos a los desembolsos realizadas para la ejecución de las obras

2. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS-FLORIDA-DELCIAS-ASOJUNTAS ALBANIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firma
Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato relación de empleado

Anexo planialla pagada del mes de julio

Anexo certificación del pago de seguridad social

ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoría 4647 de 2023 firmado entre el I**NVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social (**SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de AGOSTO de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 31 días del mes de AGOSTO del 2024

Mabel Perez

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/8/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
				TOTAL		$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
4	jul-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2026	$ 109.303.594,00	$ 67.303.594,00		
5	ago-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2027	$ 109.303.594,00	$ 56.803.594,00		
TOTALES		**$ 42.525.000,00**	**$ 9.975.000,00**	**$ 52.500.000,00**	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 42.525.000,00	$ -	$ 42.525.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 9.975.000,00	$ 9.975.000,00
VALOR TOTAL	$ 42.525.000,00	$ 9.975.000,00	**$ 52.500.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. :25202-37430CND

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma


Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo polizas de interventoria

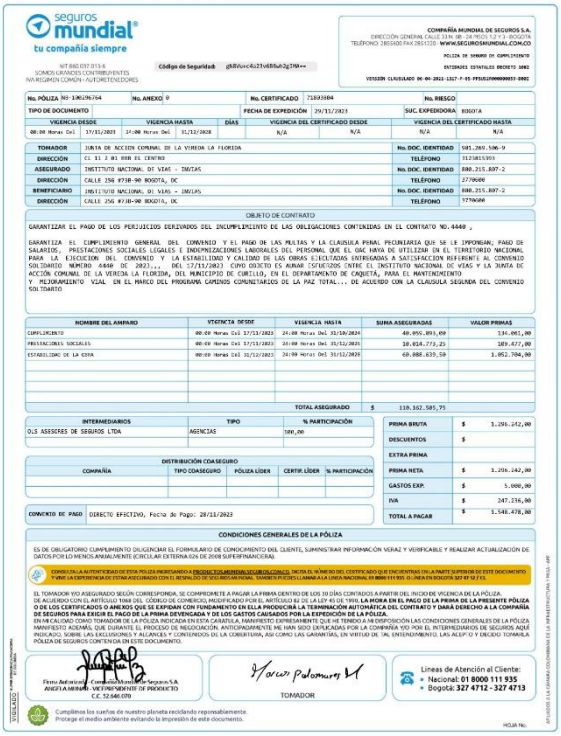

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851230 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No.DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 000 EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRETORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023,... DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	44.095.093,69	134.063,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	10.014.773,25	189.677,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.088.639,50	1.052.704,00
			TOTAL ASEGURADO $	110.162.505,75

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.206.142,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.206.142,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	247.236,00
TOTAL A PAGAR	$	1.548.478,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROTECTOSMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MORAN - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.685.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851230 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100296764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

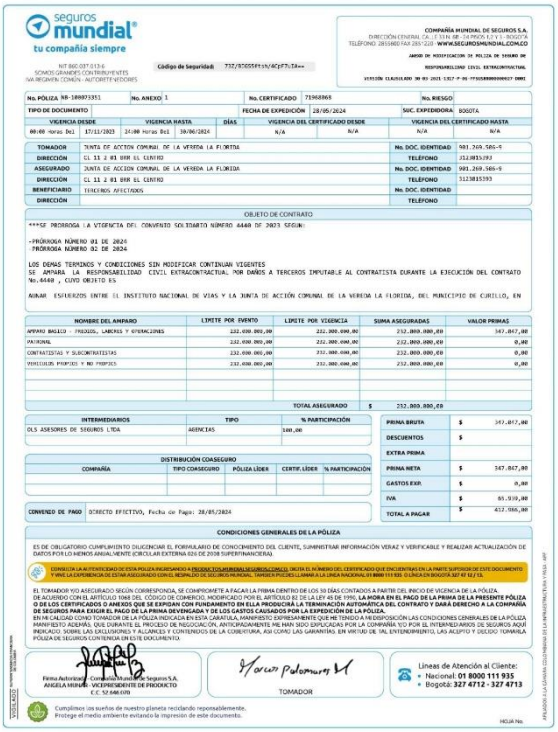

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

Código de Seguridad: 732/E5055F41h/ACyF7cIA==

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	252.000.000,00	347.847,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	252.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	252.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	252.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 252.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.847,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.847,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.939,00
TOTAL A PAGAR	$	413.986,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935, CLÍNICAS EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRAN - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.046.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO APLICADO A LA CLÁUSULA COLOMBIANA DE LA IMPRESIÓN DE LA PÓLIZA - APP



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9 . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS. NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:


AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electronico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO APLICADO A LA CLÁUSULA COLOMBIANA DE LA IMPRESIÓN DE LA PÓLIZA - APP

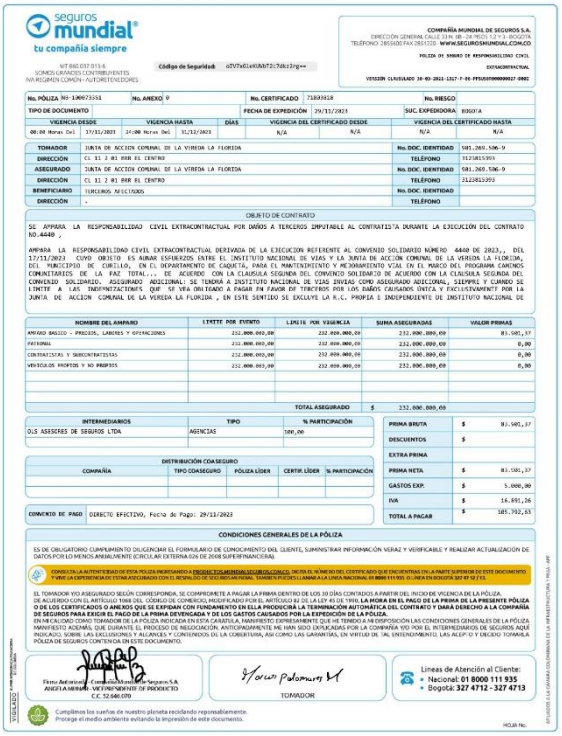

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851200 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71803818		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023		SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 RRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 RRR EL CENTRO	TELÉFONO	2120810393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4640 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023,,: DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.,, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO, ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.505,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	83.505,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.505,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.792,63

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROSEGUR.COM.PE/CONSULTA. INGRESA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE ESTAS ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE LAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRANDA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.660.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851200 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71803818		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023		SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, ES ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TENDRÁ LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT/NRC.260.000-9 , TENDRÁ LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4640 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

HOJA No.

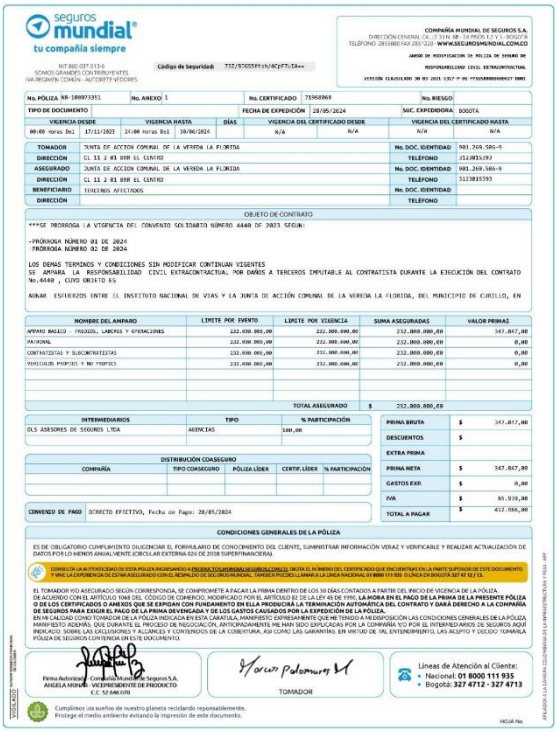

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 7JZ/BC65Ftsh/4CpF7cIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CL. 33 N.6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	2128815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	5123815393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	N/A

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGÚN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.047,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROVEEDOR.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARA LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ACEPTAR, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE, ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.680.039

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL: CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71960868	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9. . TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INDICA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

HOJA No.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Anexo formato plan de cargas

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 7 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 3230 DE: 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GLESIAS

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 109.303.594,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 109.303.594,00
PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 16 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal	Prima Regional	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha _____: Participación (h-mes)	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		0,60	$ 2.300.000											0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000			1,50	$ 7.500.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000		4,00	$ 16.000.000											1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	0,37	$ 1.473.594	0,10	$ 2.000.000			4,9	$ 19.473.594
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000																					0,20	$ 560.000			0,40	$ 1.120.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000															0,40	$ 1.120.000									0,80	$ 1.680.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00																										$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.500.000																													
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.500.000																													
		Especialista en Estructuras	$ 5.500.000																													
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.500.000																													
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.500.000																													
	1	Inspector	$ 1.200.000		9,00	$ 9.600.000																			0,50	$ 600.000	0,50	$ 600.000			1,0	$ 1.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 576.000																							0,24	$ 288.000			0,48	$ 576.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.916.000,00											$ -	$ 5.250.000	$ -	$ 6.370.000	$ -	$ 6.098.000	$ -	$ 5.850.000	$ -	$ 3.325.593	$ -	$ 4.658.000			$ -	$ 34.551.593
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36											0,00	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36				2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.760											$ -	$ 12.390.000,0	$ -	$ 15.033.200,0	$ -	$ 14.391.280,0	$ -	$ 13.806.000,0	$ -	$ 7.848.399,7	$ -	$ 10.992.880,0			$ -	$ 81.541.760

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 110.000	Dia	$ 4,00	$ 440.000																	1	$ 110.000	2	$ 220.000			4,00	$ 440.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 300.000	Mes	$ 13,00	$ 3.900.000											1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000			8,00	$ 2.400.000
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000	Según comprobante por ítem	$ 2,00	$ 5.600.000																						$ 5.600.000			2,00	$ 5.600.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según comprobante por ítem	$ 4,00	$ 1.200.000																						$ 1.200.000			4,00	$ 1.200.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ -	Según comprobante por ítem	$ -	$ -											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Según comprobante por ítem	$ 2,00	$ 350.000																			1	$ 175.000	$ -	$ -			2,00	$ 350.000
	1	Papeleria, fotocopias, ingeneria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, videos, etc	$ 80.000,00	Según comprobante por ítem	$ -	$ -											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Según comprobante por ítem	$ 4,00	$ 320.000											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 80.000	2	$ 160.000	1	$ 80.000			4,00	$ 320.000
	1	Vivienda Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por ítem	$ -	$ -											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00											$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ 600.000	$ -	$ 905.000	$ -	$ 1.045.000			$ -	$ 10.310.000
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) + (D)				$ 91.851.760,00											$ -	$ 12.690.000	$ -	$ 15.333.200	$ -	$ 14.991.280	$ -	$ 14.771.000	$ -	$ 8.893.400	$ -	$ 10.992.880			$ -	$ 81.851.760
	*	IVA = 19% * (D) + (E)				$ 17.451.834,00											$ -	$ 2.411.100	$ -	$ 2.913.309	$ -	$ 2.848.343	$ -	$ 2.806.490	$ -	$ 1.689.746	$ -	$ 2.088.647			$ -	$ 17.451.834
	*	COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594											$ -	$ 15.101.100	$ -	$ 18.246.509	$ -	$ 17.839.623	$ -	$ 17.577.490	$ -	$ 10.583.146	$ -	$ 13.081.527			$ -	$ 109.303.594
	*																															
	*																															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
Con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se consideraría necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras, sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoria. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: LEIVD MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
NOMBRE: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se le recomienda al contratista utilizar materiales de buena calidad pétreos y de ferreterías que cumpla con las especificaciones técnicas

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

A la fecha no se ha recibido correspondencia

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

	
VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO	VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO
	
VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO	VACIADO DE CUNETA REFORZADA

	
INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS Y CUNETAS	LOSA DE TRANSICIÓN

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Se anexan foto de la socialización

	
Socialización vereda florida acompañamiento INVIAS	**Socialización vereda florida acompañamiento INVIAS**

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

34

Jueves 1 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra: Mezcladora:
Vibro concreto:

Actividades realizadas:

- Se continua con las actividades del día anterior.

33

Viernes 2 Agosto 2024


Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Mezcladora: 2 horas
Vibroconcreto: 2 horas

Actividades realizadas:

- Se Funden 24 metros lineales de cuneta, costado Izq.

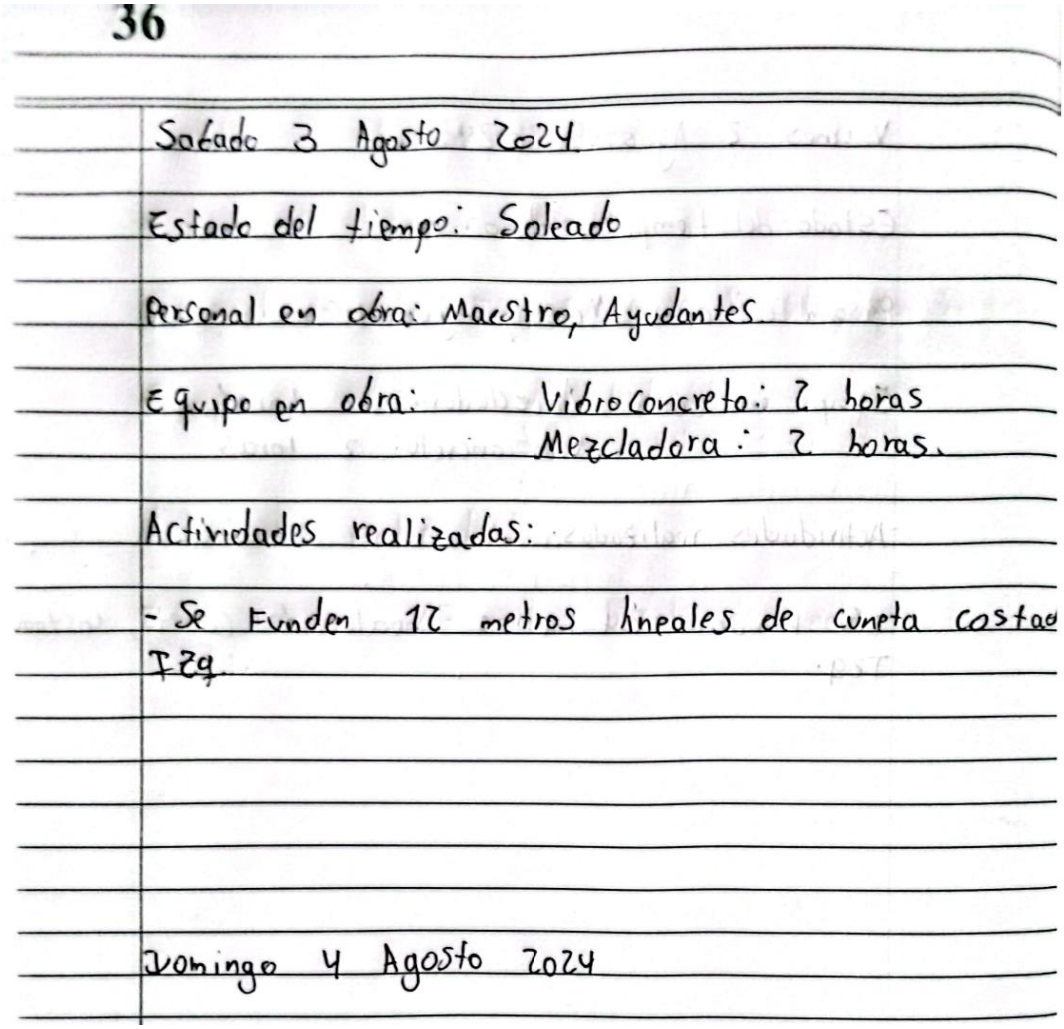

36

Sabado 3 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Vibroconcreto: 7 horas
Mezcladora: 7 horas.

Actividades realizadas:

- Se Funden 12 metros lineales de cuneta costado Izq.

Domingo 4 Agosto 2024

37

Lunes 5 Agosto 2024.

Estado del tiempo: Lluvia

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra:

Actividades realizadas:

- Se continua el encofrado de cuneta costado Izq
- Se instalan las parrillas de cuneta y viga riostra

Martes 6 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado

personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra: Mezcladora: 3 horas
Vibroconcreto: 3 horas.

Actividades realizadas:

- Se Funden 27 metros lineales de cuneta costado Izq.

Miercoles 7 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra: Vibroconcreto: 2 horas
Mezcladora: 2 horas.

Actividades realizadas:

- Se Funden 15 metros lineales de cuneta
- Se continua cortando y Figurando acera.

Jueves 8 Agosto 2024.

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra: Mezcladora: 3 horas
Vibroconcreto: 3 horas.

Actividades realizadas:

- Se Funden 30 metros lineales de cuneta costado Izq.

41

Viernes 9 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Vibro concreto: 3 horas
Mezcladora: 3 horas.

Actividades realizadas:

- Se Funden 8 metros de cuneta costado Izq.
- Se continua el cortado y Figurado de acero.

42

Sabado 10 Agosto 2024.

Estado del tiempo: Lluvia

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra:

Actividades realizadas:

- Se continua el corte y Figurado de acero

Domingo 11 Agosto

43

Lunes 12 Agosto. 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra:

Actividades realizadas:

- Se Funden panelitas para elevar el concreto
- Se continua cortando y figurando acero.

44

Martes 13 Agosto 2024.

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Rana : 4 horas

Actividades realizadas:

- Se inicia a instalar el acero de la huella en ambos sentidos.

47

Viernes 16 Agosto 2024.

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra: Mezcladora: 4 horas
Vibroconcreto: 4 horas.

Actividades realizadas:

- Se Funden 15 metros lineales de huella en ambos sentidos junto a viga riostra.

48

Sabado 17 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra: Vibro concreto: 2 horas
Mezcladora: 2 horas

Actividades realizadas:

- Se Funden 9 metros lineales de huella en ambos Sentidos.

Domingo 18 Agosto 2024

49

Lunes 19 Agosto 2024

Estado del tiempo: Fuertes lluvias.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra:

Actividades realizadas:

- Se detienen actividades debido a las fuertes lluvias.
- Se retira un trabajador de la obra.

50

Martes 20 Agosto. 2024

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudante

Equipo en obra: Mezcladora: 4 horas
Vibroconcreto: 4 horas

Actividades realizadas:

- Se Funden 12 metros lineales de huella por ambos lados.

51

Miercoles 21 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes

Equipo en obra: Mezcladora : 4 horas
Vibroconcreto: 4 horas.

Actividades realizadas:

- Se Funden 72 metros lineales de huella por ambos lados.

52

Jueves 22 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Mezcladora: 4 horas
Vibrocancreto: 4 horas.

Actividades realizadas:

- Se funden 72 metros lineales de huella en ambos sentidos.

53

Viernes 23 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en Obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Mezcladora: 2 horas
Vibroconcreto: 2 horas.

Actividades realizadas:

- Se Funden 6 metros de huella en ambos sentidos
- Se trabaja hasta medio día para recuperar el lunes Festivo.

Sabado 24 Agosto 2024

Domingo 25 Agosto 2024

Scanned with CamScanner

55

Martes 27 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en Obra: Vidroconcreto: 4 horas
Mezcladora: 4 horas.

Actividades realizadas:

- Se Funden 15 metros lineales de huella en ambos sentidos.

54

Lunes 26 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Vidroconcreto: 4 horas
Mezcladora: 4 horas.

Actividades realizadas:

- Se Funden 15 metros lineales de huella en ambos sentidos.

56

Miercoles 28 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Mezcladora: 4 horas
Vibro concreto: 4 horas

Actividades realizadas:

- Se Funden 75 metros lineales de huella en ambos sentidos.

57

Jueves 29 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra: Mezcladora: 2 horas
Vibroconcreto: 2 horas.

Actividades realizadas:

- Se terminan de Fundir la huella en ambos sentidos
- se inicia a organizar el terreno para la otra cuneta.

58

Viernes 30 Agosto 2024

Estado del tiempo: Lluvia

Personal en obra: Maestro, Ayudante.

Equipo en obra:

Actividades realizadas:

- Se Inicia a encofrar Cuneta costado derecho.

59

Sabado 31 Agosto 2024

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en Obra: Ing Residente, Maestro, Ayudantes.

Equipo en obra:

Actividades realizadas:

- Se continua el encofrado de la Cuneta costado derecho.

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°05

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3714 de 2023

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Ing. FABIO JESUS MEJIA *Mat: 2520256474 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*	*Ing. Juan Carlos Sanabria* *Mat: 2520237430 CND*
CARGO: *Residente de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*	***CARGO:*** *director de interventoría*
Fecha: *31 de AGOSTO de 2024*	***Fecha:*** *31 de AGOSTO de 2024*	***Fecha:*** *31 de AGOSTOIO de 2024*

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3714 de 2023 **Contratista:** JAC VEREDA LAS IGLESIAS

Contrato de Interventoría No. 4647 de 2023 **Interventoría:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORIN SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	141-142
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	143
1	**INTRODUCCIÓN**		144
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		145
2.1	Localización		146
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		147
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		148-151
2.4	Características técnicas del proyecto		152-155
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		156
3.1	Información general del contrato		157-160
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		161
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		162-166
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		167
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		168
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	169-177
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	178
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	179
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	180
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	181
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	182
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	183
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	184
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		185
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	186
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	187
	• Seguimiento Programa de Obra		188
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	189
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	190
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	191-193
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	193-210
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		210-215
5.1	Información general del contrato		215-230
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		230-240
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	241
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	242
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	243
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	245
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	246
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	248
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		249
8	**Anexos**		250-257
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		258
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		259
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		260
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		260-262

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona adjunto el formato diligenciado del resumen del estado general del proyecto, se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto, en el cual se evidencia que el contratista de obra ya inicio obra, presentando un avance físico y financiero del 36,3%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 3714 de 2023

OBJETO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
PLAZO DE VENCIMIENTO PRORROGA 1 30/04/2024
PLAZO DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.908.738,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): 0
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO: 0
ANTICIPO AMORTIZADO: 0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	158
	ALCANTARILLA DE 36"	UNIDAD	1
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
Mantenimiento	Pontones		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	PLACA HUELLA	ML	5,00%	5%
	ALCANTARILLA	UND	35%	85%
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
Mantenimiento	Pontones			
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 120.919.289,94	28.363.784,06	$ 149.283.074,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 149.283.074,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 58.500.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 56.500.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	$ 2.000.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 58.494.736,44	13.720.987,56	$ 72.215.724,00	$ 72.215.724,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SE				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 72.215.724,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1
Descole margen 1 alcantarilla de 36" , instalacion de refuerzo y separación de parrilla







Foto 2
vaciado de concreto 3000 psi descole



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. LOCALIZACIÓN 7
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 3714 de 2023 11
3.1INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 12
3.3SEGUIMIENTO ITEN NO PREVISTO
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
4.1. INFORME SEMANAL 12
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 15
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 19
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 23
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 23
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 24
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 26
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 33
4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 33
4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 34
4.11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 35
4.12. ACTAS DE REUNIÓN 37
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 21
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 21

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR……21

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA22

6.1 EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA……22

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……22

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..22

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL……22

6.5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS……22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..23

8. ANEXOS……24

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO……24

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS……24

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS……..24

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE……24

4. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.05** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**. Hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **Convenio No. 4440 de 2023 con número de proceso SPSC-CD-CS-886-2023, y que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS IGLESIAS, DEL MUNICIPIO DESAN JOSE DEL FRAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.

ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Curillo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente,

proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

Los puntos a intervenir en las iglesias se localizan en las siguientes coordenadas:

Sector Tramo de vìa 1 01°21’ 43.96” N - 075° 56’ 0.70” W 1.50 m 2 01°21’ 36.01” N - 075° 55’ 58.40” W 1.50 m
Alcantarilla S1 01°21’ 36.71” N - 075° 55’ 58.92” W 3.00 m



2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), vereda las delicias, florida del municipio de Currillo y la **VEREDA IGLESIAS** del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.
.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

CONVENIO 3714 – 2023:

OBJETO "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS IGLESIAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**."

La vereda Iglesias del Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA está ubicada aproximadamente a 10 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas los guacharos, , dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 40 km.

El tramo a intervenir lleva por nombre subida la cueva de los guacharos" , el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Estas vías no cuentan con obras de artes.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	
ALCANCE DEL PROYECTO	*LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL INVIAS, EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL - OAC, EN DONDE SE REALIZÓ UNA CONCERTACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, UTILIZANDO LOS DISEÑOS TIPO ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURALES VIALES, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONVENIO Y PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR.*
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CONVENIO 3714 – 2023	*CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA DE 158 ML Y LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.* *UNA ALCANTARILLA CIRCULAR, COMO ELEMENTO DE DRENAJE TRANSVERSAL SE TRABAJARÁ CON TUBOS DE 36" DE CONFIGURACIÓN TIPO ALETA-ALETA LA CUAL PERMITE, ADEMÁS DE RECIBIR Y EVACUAR LA ESCORRENTÍA APORTANTE POR LAS*

	CUNETAS Y FILTROS, DAR CONTINUIDAD A CAUCES CON FLUJOS INTERMITENTES O EFÍMEROS. *ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:* *-CONCRETO: F'C 21MPA* *-ACERO CORRUGADO: FY 420MPA*

Tabla 8. Características técnicas del proyecto

5. NFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No.3714 de 2023

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VEREDA IGLESIAS

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 3714 de 2023

TIPO DE PROCESO	*CONTRATACIÓN DIRECTA*
NÚMERO DE PROCESO	*SPCS-CD-CS-438-2023*
CONVENIO NO.	*3714 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*
OBJETO	*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA IGLESIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..*
CONTRATISTA	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA IGLESIA*
NIT	*: 8280016751.*
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – PGN	*$197.908.738,00*
RECURSOS PROPIOS	*$1.000.000*
VALOR TOTAL	*$198.908.738,00*
ADICIONES	*$ 0.00*
FECHA DE INICIO	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 01	*30 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE TERMINACION ATUALIZADA	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

Tabla 9. Información general convenio 3714 de 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200MPA:** Se realizó corte y doblado de barras corrugadas permitiendo obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño de las huellas

En el transcurso del mes se hicieron actividades como vaciado de concreto y vibrado para zarpas de la alcantarilla, instalación de refuerzo en acero El porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 36,3% correspondiente a un valor de $72.215.724

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Realizar visitas periódicas para seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando medidas y que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto

Se le hizo control de calidad a los materiales y agregados utilizados para las mezclas

Se tomaron muestras de mezclas para los cilindros

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Semana 1 agosto de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	7/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 16 del 1/08/2024 al 7/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA DE 36" - NUEVO ALCANCE 130 ML Y UNA PLACA HUELLA DOBLE DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARA DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS		
CONVENIO No.	3714 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.908.738,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.908.738,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.738	$ -		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 48.715.724			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 150.193.014			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.283.074,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 51.000.000,00	34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47.000.000,00	31,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.000.000,00	2,7%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.715.724,00	33%
PAGA	$ 4.478.492,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 53.000.000,00	26,6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 48.715.724,00	24,5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.284.276,00	2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.000.000,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.000.000,00	4%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	38,4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 26,6% — Avance o Atraso Físico %: 2,2%
Meta Física Ejecutada %: 24,5%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACA HUELLA	ML	130
ALCANTARILLA 36" DOBLE	UND	1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla-placa huella			$ 53.000.000,00	26,6%
Ejec	alcantarilla-placa huella			$ 48.715.724,00	24,5%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LAS IGLESIAS — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES: la obra inició con la excavacion de las alcantarillas, instalacion de anillos y vaciado de solado para piso de nivelacion, tambien ingresó la maquinaria amarilla para hacer los cortes laterales de via

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONE:SLA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTEPARA DICHA ACTIVIDAD :

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES:SE ESTÁ ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, ADICIONAL SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE DOCUMENTO SE REEMPLAZO POR EL PGA

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 29 DE ABRIL,

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se instalaron las arpas del piso y se vacieron los concretos para la alcantarilla se hizo conformacion de la via

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa para la proxima semana el material petreo sub-base para su debida instalacion

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO
EJECUTADO

MAN MANTENIMIENTO — CONSTRUCCION — MEJORAMIENTO — SEÑALIZACION

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



corte de la banca y vaciado del solado



vaciado del solado para nivel de anillos figurado y corte del refuerzo



instalacion de anillos de 36"

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25205547 ICND

Semana 2 de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	14/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 17 del 8/08/2024 al 14/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA DE 36" - NUEVO ALCANCE 130 ML Y UNA PLACA HUELLA DOBLE DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARA DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

CONVENIO No.	3714 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.908.738,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.908.738,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	16/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.738	$ -		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 55.500.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 143.408.738			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 76.125.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 33.178,594			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.283.074,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 63.000.000,00	42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 58.000.000,00	38,9%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.000.000,00	3,3%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.715.724,00	33%
PAGA	$ 4.478.492,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 58.000.000,00	29,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.500.000,00	27,9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.500.000,00	1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.000.000,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.000.000,00	4%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.625.000,00	40,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 29,2% — Avance o Atraso Físico %: 1,3%
Meta Física Ejecutada %: 27,9%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	PLACA HUELLA	ML	130
2	ALCANTARILLA 36" DOBLE	UND	1
3			
4			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla-placa huella			$ 58.000.000,00	29,2%
Ejec	alcantarilla-placa huella			$ 55.500.000,00	27,9%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segùn el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LAS IGLESIAS — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES: la obra inició con la excavacion de las alcantarillas, instalacion de anillos y vaciado de solado para piso de nivelacion, tambien ingresó la maquinaria amarilla para hacer los cortes laterales de via

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONE:SLA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTEPARA DICHA ACTIVIDAD :

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES:SE ESTÁ ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, ADICIONAL SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE DOCUMENTO SE REEMPLAZO POR EL PGA

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE REALIZO SOCIALIZACION EL 29 DE ABRIL,

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua vaciando los pisos de la alantarilla, se inicia instalacion de refuerzo para las aletas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa para la proxima semana el material petreo sub-base para su debida instalacion

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



refuerzo arpas para pisos de alcantarilla

vaciado del solado para nivel de anillos figurado y corte del refuerzo

instalacion de anillos de 36"

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por inviás, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202564774CND

Semana 3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	1
FECHA	22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORAL: CAQUETA — SEMANA No.: 18 del ######### al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO.: _

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA DE 36" - NUEVO ALCANCE 130 ML Y UNA PLACA HUELLA DOBLE DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA DEFINICION DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARA DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORIA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

CONVENIO No. 3714 de 2023 — FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 198.908.738,00 — VALOR ADICIONES: $ — VALOR ACUMULADO: $ 198.908.738,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO
CONTRATO No. 4647 DE 2023 — FECHA DE INICIO: 26/12/2023 — FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00 — VALOR ADICIONES: $ — VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 — VALOR ANTICIPO: $ - — VALOR AMORTIZADO: $ - — SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.738	$ -		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 59.500.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 139.408.738		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00	$ -		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 78.750.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 30.553.594		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos.)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.283.074,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 64.000.000,00	43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 60.000.000,00	40,2%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.000.000,00	2,7%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.715.724,00	10%
PASA	$ 4.478.492,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 61.000.000,00	30,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 59.500.000,00	29,9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.500.000,00	1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.000.000,00	7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.000.000,00	5%

Observaciones: la obra presenta un avance del 29,9 % la obra no presenta un avance ya que por las condiciones climáticas se estan soltando cedimientos de los talud . De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 33%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, ese dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.750.000,00	72,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO , SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 30,7% — Avance o Atraso Físico %: 0,8%
Meta Física Ejecutada %: 29,9%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACA HUELLA	ML	130
ALCANTARILLA 36" DOBLE	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla-placa huella			$ 61.000.000,00	30,7%
Ejec	alcantarilla-placa huella			$ 59.500.000,00	29,9%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás previsiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LAS IGLESIAS — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:en la obra se estan presentado fuertes lluvias y no se a podido avanzar como se tiene progamado.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN: MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	NA	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	NA	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	NA	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO	NA	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	NA X	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	NA X	
EMISIONES:	SI	NO	NA X	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	NA X	

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE DOCUMENTO SE REEMPLAZÓ POR EL PGA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

esta obra no presenta un avance significativo, ya que donde se esta ejecutando la alcantarilla doble de 36" es un material arcilloso y el talud se suelta y tapa el sitio de trabajo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa para la proxima semana el material petreo sub-base para su debida instalacion

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



refuerzo para aletas de alcantarilla



retiro de sedimento



retiro de sedimento

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimento de los diseños presentados por invias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25220158172CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Semana 4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	1
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 19 del ######## al 31/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal si

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

158 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA DE 36" - NUEVO ALCANCE 130 ML Y UNA PLACA HUELLA DOBLE DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICION DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARA DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORIA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS		INTERVENTOR:	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.	
			INTEGRANTES:	UNICO	
CONVENIO No.	3714 de 2023	VALOR INICIAL: $ 198.908.738,00	CONTRATO No.	4647 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.908.738,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/10/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.908.738	$ -			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 72.215.724			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 126.693.014			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 88.934.531			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 20.368.063			$ 6.789.688

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.283.074,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 58.500.000,00	39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 56.500.000,00	37,9%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.000.000,00	1,3%
ADMINISTRACIÓN	$ 15.715.724,00	8%
PAGA	$ 4.478.492,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 74.215.724,00	37,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.215.724,00	36,3%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.000.000,00	1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.500.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.000.000,00	5%

Observaciones: la obra presenta un avance del36,3 % Se instalo acero de refuerzo en las dos aletas y se encofró el descole para el vaciado de concreto. De igual manera la administración del proyecto tiene un avance del 33%, el aporte de la jac esta al 100% y el documento PAGA se reemplazó por un plan de gestión ambiental, este dinero se va a disponer para obra social o integración por parte de la comunidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 88.934.531,00	81,4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: AGOSTO

VALOR FACTURA: $ 10.184.531,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VERIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 37,3% — Avance o Atraso Físico % 1,0%
Meta Física Ejecutada % 36,3%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	130
*	ALCANTARILLA 36" DOBLE	UND	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	alcantarilla			$ 74.215.724,00	37,3%
Ejec	alcantarilla-			$ 72.215.724,00	36,3%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás previsiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA		
Total		3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LAS IGLESIAS — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES:en la obra se estan presentado fuertes lluvias y no se a podido avanzar como se tiene progamado.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONE:LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES EN EL SITIO SE DISPUSO DE ZONAS PARA DEPOSITOS

P.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTE DOCUMENTO SE REEMPLAZÓ POR EL PGA

OBSERVACIONES: EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL YA FUE PRESENTADO A LA SUPERVISION DEL INVIAS

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0

OBSERVACIONES: SE ESTIMA ENTREGAR OBRA EL 16 DE OCTUBRE, POR ENDE SE TIENE PORGRAMADO CON EL INVIAS SOCIALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se realizó encofrado de muros, instalacion de barra No. 3 en muros de encole y amarre de acero para placa huella, cuneta y bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa para la proxima semana el material petreo sub-base para su debida instalacion

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



refuerzo para aletas de alcantarilla y encofrado



refuerzo para aletas de alcantarilla



refuerzo para aletas de alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

realizar visitas periodicas al sitio de la obra y garantizar el cumplimiento de los diseños presentados por insias, haciendo control de calidad a los materiales y realizando ensayos de concreto para saber la resistencia a la compresion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202158477CND

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo formato de la maquinaria y equipos utilizados.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE AGOSTO

CONTRATO No. 3714 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS IGLESIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S
RETROCARGADOR	CASE		Vereda las Iglesias	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROCARGADOR	JCB-214S	680 KG	Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA CONCRETO DIESEL 3600 RPM	KAMA/2020	2 BLT/390LT	Vereda las Iglesias	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	I
PLANTA ELÉCTRICA	DIESEL TOYAMA/DTG 7000	N/A	Vereda las Iglesias	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VIBRO ELÉCTRICO	BOSCH GVC 22 EX		Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TRONZADORA	MAKITA		Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2 PLG			Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
MOTOBOMBA DE 2 PLG			Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I
PULIDORA	MAKITA		Vereda las Iglesias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
TOTAL ACTIVO				3	3	2	0	2	2	2	2	3	2	0	3	4	5	6	6	6	0	6	6	5	6	6	5	0	5	5	4	5	5	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				6	6	7	9	7	7	7	7	6	7	9	6	5	4	3	3	3	9	3	3	4	3	3	4	9	4	4	5	4	4	9

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	109	8,26%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	170	5,29%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.


Firma:
Nombre: EINER OLVAN ERASO BUSTOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0619316 CND

Firma
Nombre: FABIO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520256474CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato donde se relaciona todo el personal

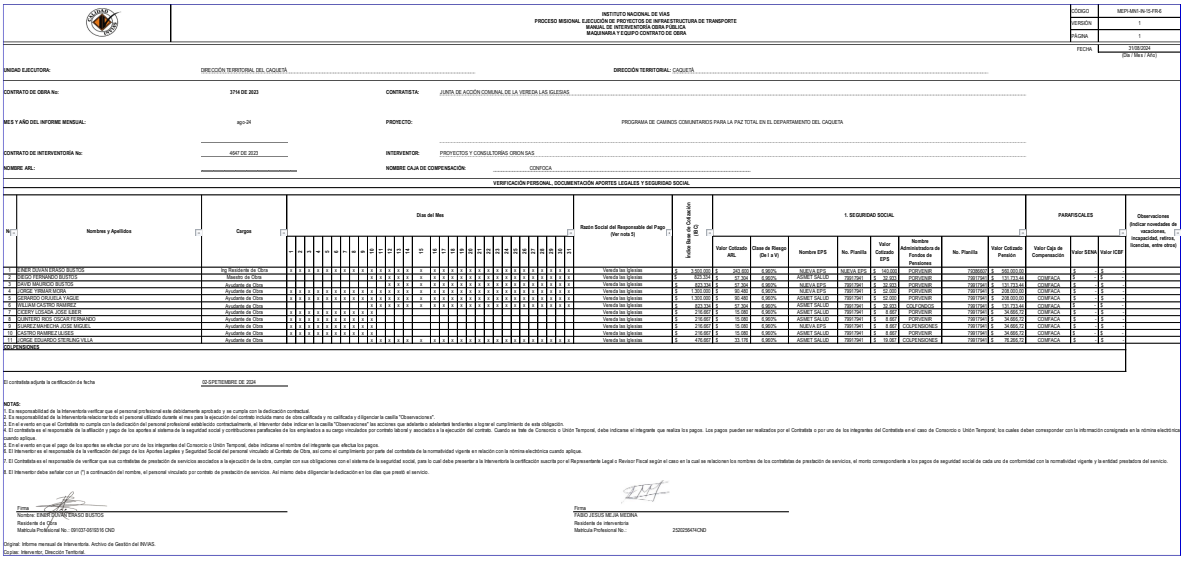

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO: MEPI-MAN-IN-IS-FR-6
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1
FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL CAQUETÁ — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 3716 DE 2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS IGLESIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 — PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 DE 2023 — INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION SAS

NOMBRE ARL: — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFOCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	Cargos	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
						Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	PINER DUVAN ERASO BUSTOS	Ing Residente de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 3.600.000	$ 245.880	5,962%	NUEVA EPS	NUEVA EPS	$ 140.400	PORVENIR	73088920	$ 485.000,00		$ -	$ -	
2	DIEGO FERNANDO BUSTOS	Maestro de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 823.529	$ 57.304	6,962%	ASMET SALUD	7897341	$ 32.000	PORVENIR	73073461	$ 131.713,46	COMFACA	$ -	$ -	
3	JAIRO ALEXANDER SOTO	Ayudante de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 823.529	$ 57.304	6,962%	NUEVA EPS	7897341	$ 32.000	PORVENIR	73073461	$ 131.713,46	COMFACA	$ -	$ -	
4	CRUZ PABLO ROJAS	Ayudante de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 1.300.000	$ 90.480	6,962%	ASMET SALUD	7897341	$ 32.000	PORVENIR	73073461	$ 208.000,00	COMFACA	$ -	$ -	
5	GERARDO ORJUELA YAGUE	Ayudante de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 1.300.000	$ 90.480	6,962%	ASMET SALUD	7897341	$ 32.000	PORVENIR	73073461	$ 208.000,00	COMFACA	$ -	$ -	
6	WILVAS CASTRO RAMIREZ	Ayudante de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 823.529	$ 57.304	6,962%	ASMET SALUD	7897341	$ 32.000	COLPENSIONES	73073461	$ 131.713,46	COMFACA	$ -	$ -	
7	JULIAN CAMILO JOSE EDER	Ayudante de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 823.529	$ 57.304	6,962%	ASMET SALUD	7897341	$ 32.000	PORVENIR	73073461	$ 131.713,46	COMFACA	$ -	$ -	
8	JUANITO ROS OSCAS HERNANDO	Ayudante de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 216.667	$ 15.080	6,962%	ASMET SALUD	7897341	$ 8.667	PORVENIR	73073461	$ 34.664,72	COMFACA	$ -	$ -	
9	JUANITO MANUEL JOSE MIGUEL	Ayudante de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 216.667	$ 15.080	6,962%	NUEVA EPS	7897341	$ 8.667	COLPENSIONES	73073461	$ 34.664,72	COMFACA	$ -	$ -	
10	CASTRO RAMIREZ LILIBES	Ayudante de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 216.667	$ 15.080	6,962%	ASMET SALUD	7897341	$ 8.667	PORVENIR	73073461	$ 34.664,72	COMFACA	$ -	$ -	
11	JORGE EDUARDO OSORJNO VILLA	Ayudante de Obra	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Vereda las Iglesias	$ 476.857	$ 33.176	6,962%	ASMET SALUD	7897341	$ 19.057	COLPENSIONES	73073461	$ 76.269,12	COMFACA	$ -	$ -	
COLPENSIONES																	

El contratista adjunta la certificación de fecha: 05-SPETIEMBRE DE 2024

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ENER DUVAN ERASO BUSTOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-067835 6 CND

Firma
PABLO JESUS MEJIA MEDINA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 252025547 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo certificación del pago de seguridad social

ORDEN DE COMPRA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
personería jurídica N.º 360 DE 14-12-73
NIT. 828.001.675-1

San José Del Fragua 02 De Septiembre del 2024

Señores
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
LEYDI MABEL PEREZ CHUD

ASUNTO: CERTIFICADO SSSI Y PARAFISCALES mes de Agosto

Cordial saludo,

La suscrita DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ identificada con cédula de ciudadanía número . 26.630.390 representante legal, de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS IGLESIAS** del municipio De San José del fragua Caquetá identificado con NIT 828.001.675-1, ha cumplido y se encuentra al día con las cotizaciones correspondientes a los subsistemas de salud, pensiones y riesgos laborales del Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI); así como con sus obligaciones fiscales, cuando a ellas ha habido lugar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a las Cajas de Compensación Familiar (CCF) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 23 de la Ley 1150 de 2007, 26 de la Ley 1393 de 2010 y demás normas concordantes, y bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,

JULIO CESAR INFANTE GUZMÁN
CC. 1.117.532.760 De Florencia
Contador

DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ
Representante legal J.A.C Vereda LAS IGLESIAS
C.C. 26.630.390

OAC Vereda las Iglesias, Teléfono: 314 3529204 Municipio de San José Del fragua – Departamento del Caquetá

Anexo planilla paga del mes de agosto de 2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	828001675-1	OAC LAS IGLESIAS		VEREDA LAS IGLESIAS	3223819	cempresa095@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CAQUETÁ	SAN JOSÉ DEL FRAGUA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ABOCIADA	FECHA PAGO ABOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	02/09/2024	79917941	$1.933.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	138.800	0		0		0	0	0	0	138.800	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	8.700	0		0		0	0	0	0	8.700	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	102.500	0		0		0	0	0	0	102.500	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	721.300	0	0	0	0	0	0		721.300	8
231001	Colfondos	800227940-4	69.400	0	0	0	0	0	0		69.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.100	0	0	0	0	0	0		208.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	434.800				434.800	0	0	434.800			4.348	434.800	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF13	Comfaca	891190047-2	250.000	0	0	250.000	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	250.000	250.000
Pensión	3	998.800	998.800
Riesgos Laborales	1	434.800	434.800
CCF	1	250.000	250.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.933.600	1.933.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	828001675-1	OAC LAS IGLESIAS		VEREDA LAS IGLESIAS	3223819	cempresa095@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CAQUETÁ	SAN JOSÉ DEL FRAGUA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ABOCIADA	FECHA PAGO ABOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	02/09/2024	79917941	$1.933.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Tarifa	Actividad Económica	Cotización	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Ret a Afiliado	Valor Ret a Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Clase Aportante	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006301634	STERLING VILLA JORGE EDUARDO	1	0		S	X																	25-14	476.967	76.300	0	0	0	0	ESSC62	216.967	19.100	14-11	476.967	9	33.200	CCF13	476.967	6.700	0	0	0	0	0
2	CC	1117316611	CICERY LOSADA JOSE ILSER	1	0		S	X																	230301	216.967	34.700	0	0	0	0	ESSC62	216.967	8.700	14-11	216.967	9	19.100	CCF13	216.967	6.700	0	0	0	0	0
3	CC	16105996	QUINTERO RIOS OSCAR FERNANDO	1	0		S	X																	230301	216.967	34.700	0	0	0	0	EPS017	216.967	8.700	14-11	216.967	9	19.100	CCF13	216.967	6.700	0	0	0	0	0
4	CC	17645936	CASTRO RAMIREZ ULISES	1	0		S	X																	230301	216.967	34.700	0	0	0	0	ESSC62	216.967	8.700	14-11	216.967	9	19.100	CCF13	216.967	6.700	0	0	0	0	0
5	CC	17648382	SUAREZ MANCHA JOSE MIGUEL	1	0		S	X																	230301	216.967	34.700	0	0	0	0	EPS041	216.967	8.700	14-11	216.967	9	19.100	CCF13	216.967	6.700	0	0	0	0	0
6	CC	1006063824	MORA GUERRERO JORGE YIRMAR	1	0		S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	9	99.500	CCF13	1.300.000	92.000	0	0	0	0	0
7	CC	1116472916	ORJUELA YAGUE GERARDO	1	0		S	X																	230301	1.126.967	180.300	0	0	0	0	EPS017	1.126.967	45.100	14-11	1.126.967	9	76.500	CCF13	1.126.967	45.100	0	0	0	0	0
8	CC	1193139796	BUSTOS HURTADO DAVID MAURICIO	1	0		S	X																	230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS017	823.334	33.000	14-11	823.334	9	57.400	CCF13	823.334	33.000	0	0	0	0	0
9	CC	16105996	CASTRO RAMIREZ WILLIAN	1	0		S	X																	25-14	823.334	131.800	0	0	0	0	ESSC62	823.334	33.000	14-11	823.334	9	57.400	CCF13	823.334	33.000	0	0	0	0	0
10	CC	9728503	BUSTOS BARRAGAN DIEGO FERNANDO	1	0		S	X																	230301	823.334	131.800	0	0	0	0	ESSC62	823.334	33.000	14-11	823.334	9	57.400	CCF13	823.334	33.000	0	0	0	0	0

PAGADA

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 3714 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 198.908.738,00	N/A
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 198.908.738,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO DEL CONVENIO	$ 120.919.289,94	$ 28.363.784,06	$ **149.283.074**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 47.385.000,00	$ 11.115.000,00	$ **58.500.000,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 45.765.000,00	$ 10.735.000,00	$ **56.500.000,00**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.620.000,00	$ 380.000,00	$ **2.000.000,00**
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60.114.736,44	$ 14.100.987,56	$ **74.215.724,00**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 58.494.736,44	$ 13.720.987,56	$ **72.215.724,00**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.620.000,00	$ 380.000,00	$ **2.000.000,00**
*			$ -
VALOR TOTAL			$ **72.215.724,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
residente de Obra Einer Duvan Eraso Bustos
Matrícula Profesio 091037-0619316 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 2522237430CND

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo estado general del tiempo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL CAQUETÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 3714 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS IGLESIAS

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4647 de 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	21	23	24	22	22	23	24	24	23	19	24	12	22	23	23	24	24	23	21	24	24	24	22	23	22	22	23	24				629
Lluvias moderadas		1	0	2	2	1	0	0	1	1	0	2	2	1	1	0	0	1	3	0	0	0	2	1	2	2	1	0				26
Lluvias intensas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				19
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: EINER DUVAN ERASO BUSTOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0619316 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se tomarán muestras de concreto en cilindros, que serán llevados para ser analizados mediante resistencia a la comprensión.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexan formato de garantías

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 3714 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTAS DE ACCION COMUNAL VEREDA IGLESIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2024

PLAZO INICIAL: 3 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 197.908.738

VALOR ACUMULADO: $ 197.908.738
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.344.900,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.344.900,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.781.748,00	16	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.945.437,00	6	10	2023	6	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.672.621,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3762504-0

Certificado de modificación o anexo No.: .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	6	10	2023	6	1	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0933945-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: NA

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/10/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 Y 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 Y 2 **SUSPENSIÓN No.:** 1 Y 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.781.748,00	6	10	2023	30/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.945.437,00	6	10	2023	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.672.621,00	30	6	2024	30	6	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3762504-0

Certificado de modificación o anexo No.: .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: POR ACEPTAR

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1Y 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1Y 2 ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	6	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0933945-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: POR ACEPTAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 Y 2 ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1 Y 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.781.748,00	6	10	2023	30	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5	$ 9.945.437,00	6	10	2023	30	9	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.672.621,00	30	9	2024	30	6	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3762504-0

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: POR ACEPTAR

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1Y 2 ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	26	10	2023	30	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0933945-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: POR ACEPTAR

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo pólizas del convenio



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0933945-9	01313998456

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	11998416

TOMADOR
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

ASEGURADO
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: AV 1 # 1 — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO:

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO: VR RES A G A R E S I GLE SOS IAS — CIUDAD — DEPARTAMENTO: CAQUETA — DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: SECTOR ESTATAL — ACTIVIDAD: OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES). CASA CURAL — CÓDIGO: 28041

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No: 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% BASE IMPUESTO	PRIMA	I.V.A.	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	116.519	22.109	138.628
* R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. PATRONAL	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. CRUZADA	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
06-JUN-2024	30-JUN-2024	24	$116.519	$22.109	$138.628

VALOR A PAGAR EN LETRAS:
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
06-OCT-2023	30-JUN-2024	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO"
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-11-046 , LAS CUALES SE ACEPTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	CASEGURO
313	805	2514	43315	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO

NÚMERO PÓLIZA LÍDER — DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA AUTORIZADA

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO EL PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN FUNCIONARIO DE SURAMERICANA Y SE HAYA HECHO LA ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE LA PRIMA SOLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA EL VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	116.519

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0933945-9	01313998456

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	11998416

TOMADOR
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

ASEGURADO
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: AV 1 # 1 — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO:

FECHA A PARTIR DE LA CUAL ES UTILIZADO | NUMERO DE LA ENTIDAD | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE LA ENTIDAD | TIPO DE IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
13 - 18 | P | | F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
912037922564, NO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
LA PRESENTE POLIZA CUMPLE CON UNA COBERTURA DE 232.000.000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA:
SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS:
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTENIDO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

NOTA:
ASEGURADO/ BENEFICIARIO ADICIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 8600156072


MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS:
INDICAR QUE LA PÓLIZA TIENE COBERTURA
EN TODOS LOS AMPAROS DEL DECRETO 1082,
CON COBERTURA DE 200 SMMLV
DEDUCIBLES: CORE MÁXIMO EL 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA,
NO PUDIENDO SUPERAR EN NINGÚN CASO LOS 2.000 SMMLV

SEGÚN OTROSÍ NO. 1 FIRMADO EL 20 DE MARZO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

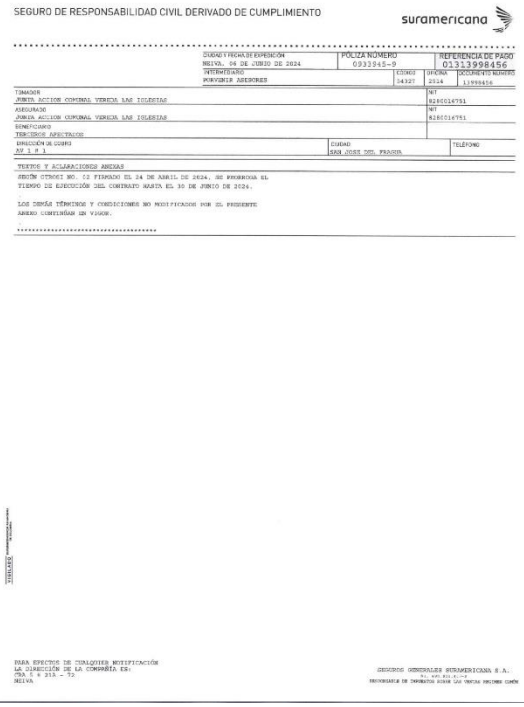

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	0933945-9	01313998456

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	11998416

TOMADOR
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

ASEGURADO
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: AV 1 # 1 — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO:


TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SEGÚN OTROSÍ NO. 02 FIRMADO EL 24 DE ABRIL DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

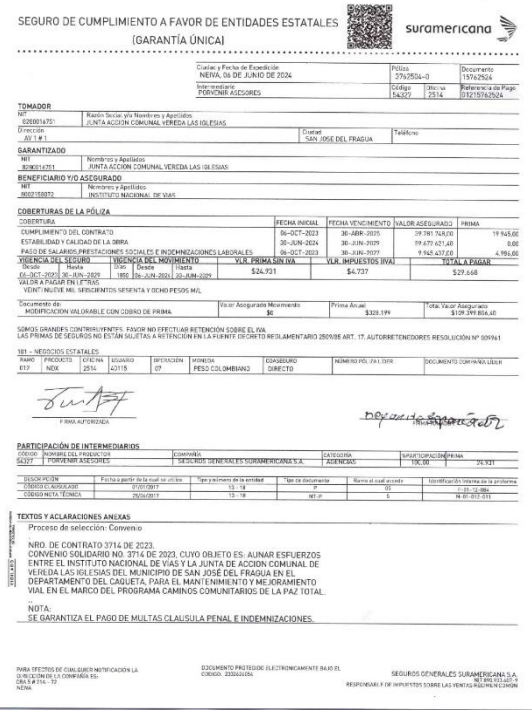

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3742554-0	157625624

Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
PORVENIR ASESORES	54327	2514	01215762624

TOMADOR
NIT 828001670 — Razón Social y/o Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
Dirección: AV 1 # 1 — Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA — Teléfono:

GARANTIZADO
NIT 828016751 — Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
NIT 8600156072 — Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-OCT-2023	30-ABR-2025	29.781.747,00	19.945,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-JUN-2024	30-JUN-2029	99.272.671,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06-OCT-2023	30-JUN-2027	9.945.437,00	4.986,00

VIGENCIA DEL SEGURO Desde	Hasta	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO Días	Desde	Hasta	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS IVA	TOTAL A PAGAR
06-OCT-2023	30-JUN-2029	1850	06-JUN-2024	30-JUN-2029	$24.931	$4.737	$29.668

VALOR A PAGAR EN LETRAS:
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA.	$0	$329.199	$159.299.804,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17, AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 00961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	CASEGURO	NÚMERO POLIZA LIDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
017	NEX	2514	42115	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA AUTORIZADA

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	24.931

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Número al cual acuerda	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLASIFICADO	01/07/2017	13 - 18	P	01	F-01-13-084
CÓDIGO NACIONAL TÉCNICO	25/04/2017	13 - 18	NIT-P	0	N-01-013-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
Proceso de selección: Convenio

NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA:
SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRÓNICAMENTE BAJO EL CÓDIGO: 2202021105

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	7933945-9	01313998448

INTERMEDIARIO: PORVENIR ASESORES | CÓDIGO: 54327 | OFICINA: 2514 | DOCUMENTO NUMERO: 13998448

TOMADOR
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280316751

ASEGURADO
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280316751

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: AV 1 # 1 | CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA | TELEFONO:

VIGENCIA DESDE LAS 24 HORAS DEL DÍA: 11 - 06 - 2024 | HASTA LAS 24 HORAS DEL DÍA: 13 - 10 | CÓDIGO DE MONEDA: P | CÓDIGO DE AMPARO: 4 | CLASE DE RIESGO: F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
8120037625O4. NO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA:
SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS:
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS:
INDICAR QUE LA PÓLIZA TIENE COBERTURA EN TODOS LOS AMPAROS DEL DECRETO 1082, CON COBERTURA DE 200 SMMLV
DEDUCIBLES: TOPE MÁXIMO EL 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, NO PUDIENDO SUPERAR EN NINGÚN CASO LOS 5.000 SMMLV

SEGÚN OTROSÍ NO. 1 FIRMADO EL 20 DE MARZO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.


PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

Seguros Generales Suramericana S.A.

– PI ENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.
NIT 890 903 407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

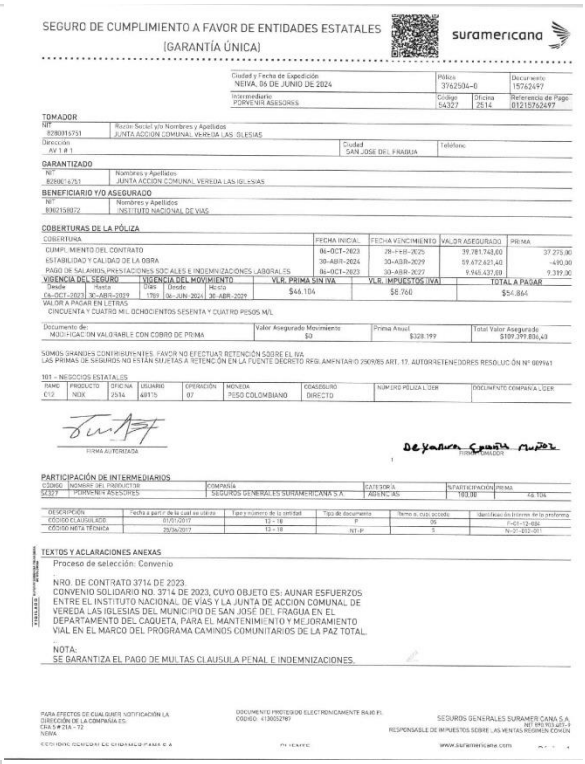

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3762504-6	15762497

Intermediario: PORVENIR ASESORES | Código: 54327 | Oficina: 2514 | Referencia de Pago: 01215762497

TOMADOR
NIT: 8280316751 — Razón Social y/o Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
Dirección: AV 1 # 1 — Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA — Teléfono:

GARANTIZADO
NIT: 828016751 — Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
NIT: 8907518072 — Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-OCT-2023	28-FEB-2025	39.781.743,60	37.275,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-ABR-2024	30-ABR-2029	59.672.631,40	490,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06-OCT-2023	30-ABR-2027	9.945.437,60	9.319,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde / Hasta			
06-OCT-2023	30-ABR-2029	1789	06-JUN-2024 / 30-ABR-2029	$46.104	$8.760	$54.864

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALOR/ABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$328.199	$109.399.806,43

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 000961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO PÓLIZA CEDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA CEDER
012	NGX	2514	48115	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	46.704

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se cobra	Tipo y número de la unidad	Tipo de documento	Ramo o cuja acceso	Identificador interno de la preforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	12 - 18	P	05	F-01-12-032
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	29/06/2017	12 - 18	NT-P	5	N-P-012-01

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
Proceso de selección: Convenio

NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


NOTA:
SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 413003787

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890 903 407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

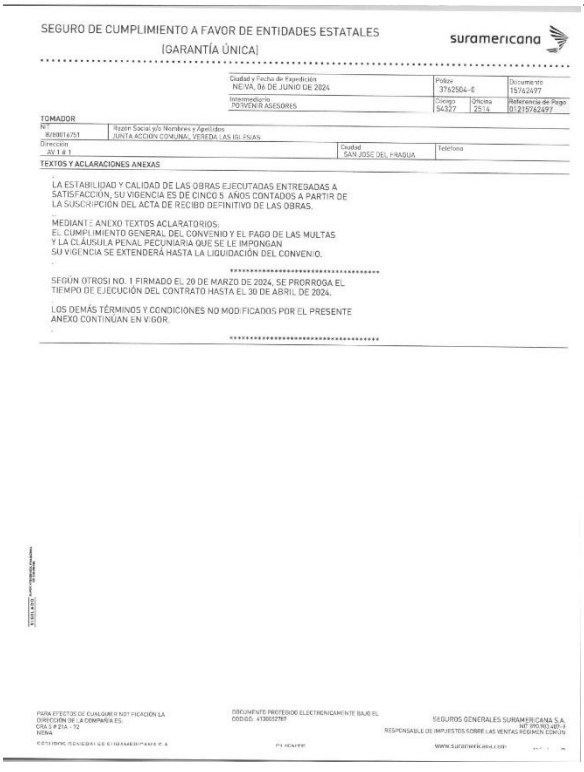

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 06 DE JUNIO DE 2024	3762504-6	15762497

Intermediario: PORVENIR ASESORES | Código: 54327 | Oficina: 2514 | Referencia de Pago: 01215762497

TOMADOR
NIT: 8280316751 — Razón Social y/o Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
Dirección: AV 1 # 1 — Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA — Teléfono:

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS:
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

SEGÚN OTROSÍ NO. 1 FIRMADO EL 20 DE MARZO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.


PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 413003787

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890 903 407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Polizas 2

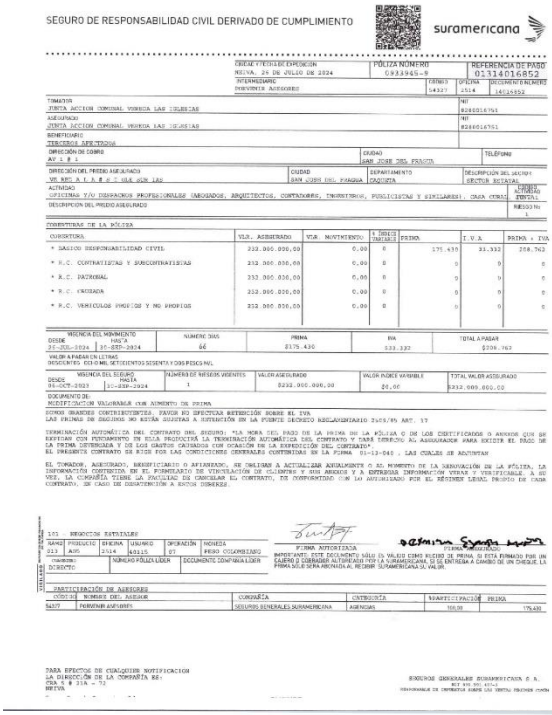

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 26 DE JULIO DE 2024	0933945-9	01314016852

INTERMEDIARIO: PORVENIR ASESORES — CÓDIGO 54327 — OFICINA 2314 — DOCUMENTO NUMERO 14014852

TOMADOR: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

ASEGURADO: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: AV 1 # 1 — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO: VR. RED A 1, 2 # 2 - 01A AUX LAS — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — DEPARTAMENTO: CAQUETA — DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: SECTOR RURAL

ACTIVIDAD: OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES). CASA CUNA — CLASE ASEGURADO: EMPRESA

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MANTENIMIENTO	% DEDUCIBLE	DEDUCIBLE MÍNIMO	T.V.A.	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	175.430	33.332	208.762
* R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. PATRONAL	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. CRUZADA	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	0,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NUMERO DIAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
31-JUL-2024	30-SEP-2024	66	$175.430	$33.332	$208.762

VALOR A PAGAR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NUMERO DE MESES VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
01-OCT-2023	30-SEP-2024	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE: MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2365/95 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y PARA EFECTOS AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO"

EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FIRMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ACEPTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGA A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGARLA DILIGENCIADA A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA POR EL REGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DISMINUCIÓN A ESTOS DISMISOS.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	SUCURSAL	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO POLIZA LIDER	DOCUMENTO COMPAÑIA LIDER
023	A95	2314	48115	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO:		

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VALIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA, SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE LA PRIMA SOLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	175.430

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 26 DE JULIO DE 2024	0933945-9	01314016852

INTERMEDIARIO: PORVENIR ASESORES — CÓDIGO 54327 — OFICINA 2314 — DOCUMENTO NUMERO 14014852

TOMADOR: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

ASEGURADO: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: AV 1 # 1 — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO

PRIMA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZARÁ EL NUMERO DE LA ENTIDAD — TIPO DE DOCUMENTO — NUMERO AL CUAL PERTENECE — IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA

0	13 - 18	0	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
912037750596. NO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA CUANTIA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA:
SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ESTARÁN AMPARADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS
EL CONSENTIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE EN LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

NOTA:
ASEGURADO/ BENEFICIARIO ADICIONAL:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800215807-2


MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS
INDICAN QUE LA PÓLIZA TIENE COBERTURA
EN TODOS LOS AMPAROS DEL DECRETO 1082,
CON CUANTIAS DE 200 SMMLV
DEDUCIBLES: TOPE MÁXIMO EL 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA,
NO PUDIENDO SUPERAR EN NINGÚN CASO LOS 2.000 SMMLV

SEGÚN OTROSÍ NO. 1 FIRMADO EL 30 DE MARZO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

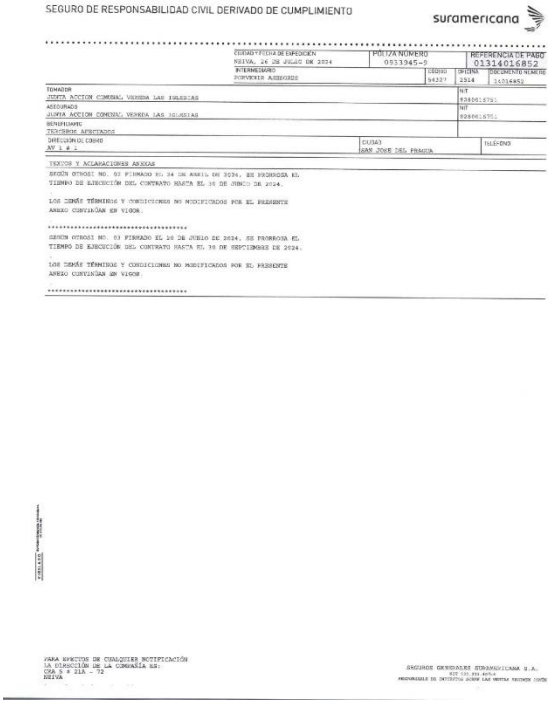

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 26 DE JULIO DE 2024	0933945-9	01314016852

INTERMEDIARIO: PORVENIR ASESORES — CÓDIGO 54327 — OFICINA 2314 — DOCUMENTO NUMERO 14014852

TOMADOR: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

ASEGURADO: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 828016751

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO: AV 1 # 1 — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SEGÚN OTROSÍ NO. 02 FIRMADO EL 26 DE ABRIL DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.


LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.

SEGÚN OTROSÍ NO. 03 FIRMADO EL 26 DE JULIO DE 2024, SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN EN VIGOR.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

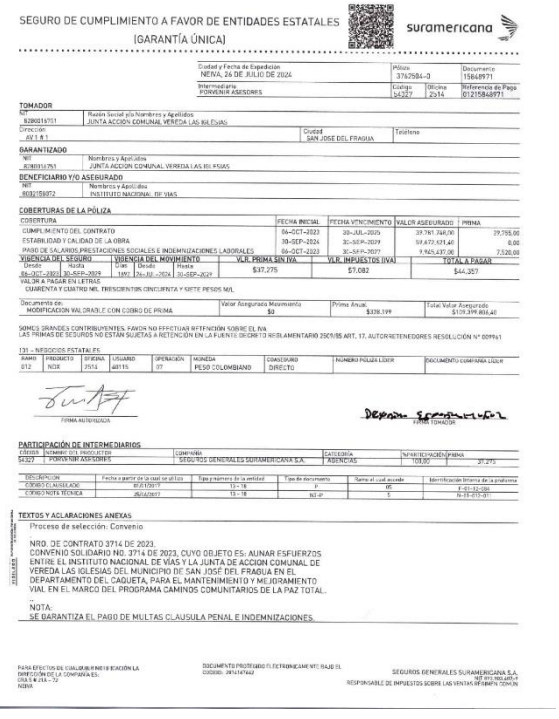

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedicion	Póliza	Documento
NEIVA, 26 DE JULIO DE 2024	3762584-0	15848971

Intermediario: PORVENIR ASESORES — Codigo 54327 — Oficina 2314 — Referencia de Pago 01215848971

TOMADOR
NIT 828016751 — Nombre Social y/o Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
Direccion: AV 1 # 1 — Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA — Telefono

GARANTIZADO
NIT 828016751 — Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
NIT 800215807 — Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-OCT-2023	28-JUL-2025	39.781.748,00	29.755,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-SEP-2024	30-SEP-2029	59.672.621,40	0,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06-OCT-2023	30-SEP-2027	9.945.437,00	7.520,00

VIGENCIA DEL SEGURO Desde	Hasta	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO Dias	Desde	Hasta	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
06-OCT-2023	30-SEP-2029	1892	26-JUL-2024	30-SEP-2029	$37.275	$7.082	$44.357

VALOR A PAGAR EN LETRAS:
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$328.199	$109.399.808,40

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2365/95 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 00996

131 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	SUCURSAL	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO POLIZA LIDER	DOCUMENTO COMPAÑIA LIDER
012	NGE	2314	48115	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑIA	CATEGORIA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	37.275

DESCRIPCION	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo numero de la entidad	Tipo de documento	Serie al cual accede	Identificación interna de la proforma
CODIGO CLAUSULADO	01/10/2017	13 - 18	0	60	F-01-13-040
CODIGO NOTA TECNICA	26/4/2017	13 - 18	167	1	N-01-013-01

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
Proceso de selección: Convenio


NRO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONVENIO SOLIDARIO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA:
SE GARANTIZA EL PAGO DE MULTAS CLAUSULA PENAL E INDEMNIZACIONES.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: CRA 5 # 21A - 72 NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 2814747442

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

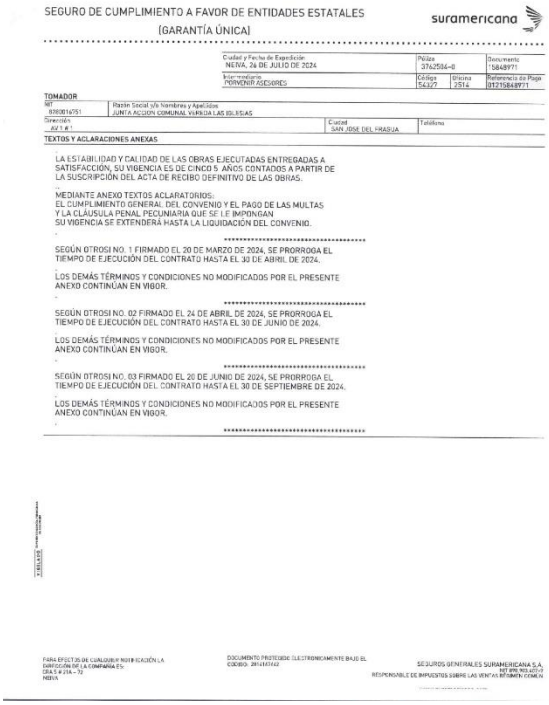

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
NEIVA, 26 DE JULIO DE 2024	3762504-0	15858971
Intermediario	Código	Oficina
PORVENIR ASESORES	54327	2514

Referencia de Pago: 012158858971


TOMADOR
NIT 8280016751 — Razón Social y/o Nombres y Apellidos: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS
Dirección: AV 1 # 1 — Ciudad: SAN JOSE DEL FRAGUA — Teléfono:

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

MEDIANTE ANEXO TEXTOS ACLARATORIOS:
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

***

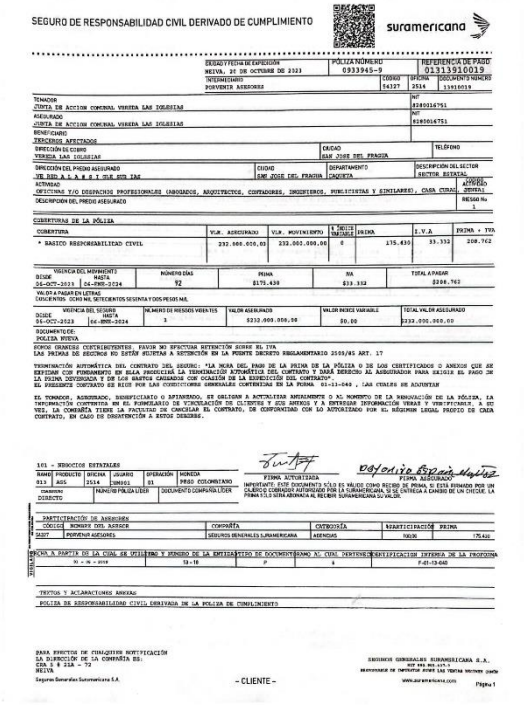

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

EXPEDIDA EN	FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 20 DE OCTUBRE DE 2023		0933945-9	0333910019

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	13910019

TOMADOR
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280016751

ASEGURADO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280016751

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO
VEREDA LAS IGLESIAS

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — DEPARTAMENTO: CAQUETA — DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: SECTOR ESTATAL
VE RED A L A P S I OLE SUR IAS

ACTIVIDAD — CÓDIGO ACTIVIDAD: 2
OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES), CASA CURAL, JUNTA

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No: 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	232.000.000,00	0	175.430	33.332	208.762

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
06-OCT-2023	04-ENE-2024	92	$175.430	$33.332	$208.762

VALOR A PAGAR EN LETRAS
DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VLR DE ASEGURADO
06-OCT-2023	06-ENE-2024	3	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
POLIZA NUEVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA CAUSADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, ES OBLIGADO A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE OBSERVACIÓN A ESTOS DEBERES.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	SUCURSAL	AGENCIA	OPERACIÓN	MONEDA
033	AGS	2514	130001	01	PESO COLOMBIANO

CANALIZADO DIRECTO — FACTURA/POLIZA LÍDER — DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O PERSONA AUTORIZADA POR LA SURAMERICANA, SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL AGENTE	CORRETAJE	CATEGORÍA	REMUNERACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR ASESORES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	10%	175.430

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZARÁ — NÚMERO DE LA ENTIDAD — NÚMERO DE DOCUMENTO — NÚMERO AL CUAL PERTENECE — IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA

M - A - DÍA	19-16	0	0	0	F-01-13-040


TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
SUPERVISADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
www.suramericana.com

Seguros Generales Suramericana S.A. — – CLIENTE – — Página 1

Powered by CamScanner

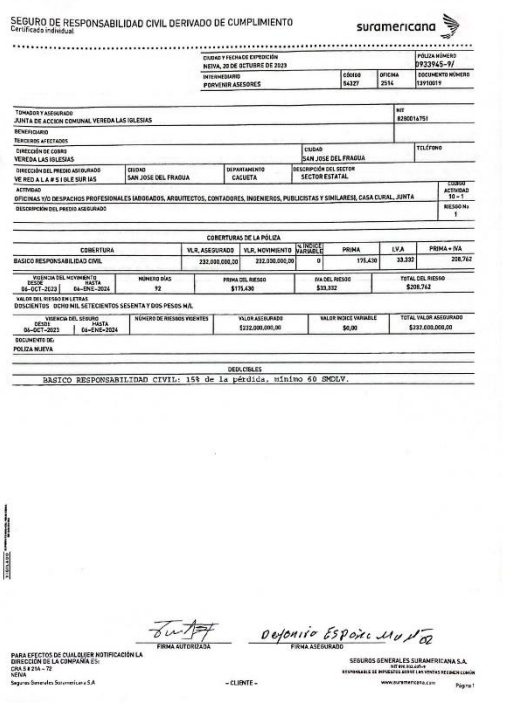

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO
Certificado individual

suramericana

EXPEDIDA EN	FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO
NEIVA, 20 DE OCTUBRE DE 2023		0933945-9/

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	13910019

TOMADOR Y ASEGURADO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280016751

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO
VEREDA LAS IGLESIAS

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — DEPARTAMENTO: CAQUETA — DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: SECTOR ESTATAL
VE RED A L A P S I OLE SUR IAS

ACTIVIDAD — CÓDIGO ACTIVIDAD: 16 - 1
OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES), CASA CURAL, JUNTA

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO — RIESGO No: 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	232.000.000,00	0	175.430	33.332	208.762

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
06-OCT-2023	04-ENE-2024	92	$175.430	$33.332	$208.762

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
06-OCT-2023	06-ENE-2024	3	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
POLIZA NUEVA

DEDUCIBLES
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.


FIRMA AUTORIZADA — FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 #21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES ES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
SUPERVISADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
www.suramericana.com

Seguros Generales Suramericana S.A. — – CLIENTE – — Página 1

Powered by CamScanner

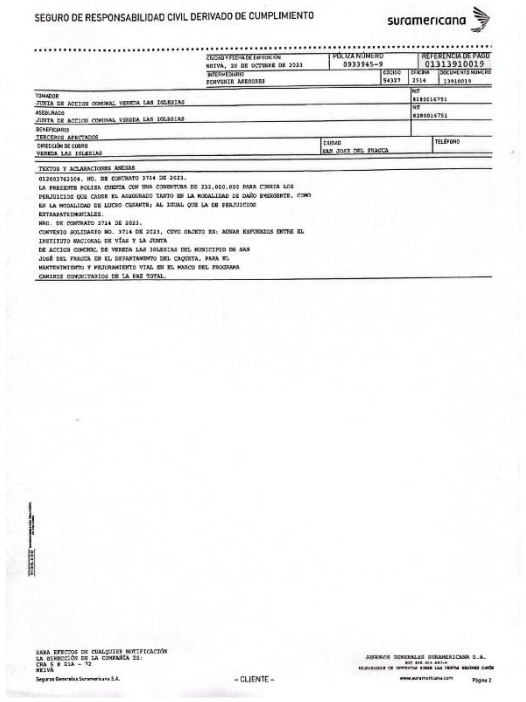

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

EXPEDIDA EN	FECHA DE EXPEDICIÓN	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
NEIVA, 20 DE OCTUBRE DE 2023		0933945-9	0333910019

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
PORVENIR ASESORES	54327	2514	13910019

TOMADOR
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280016751

ASEGURADO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS — NIT 8280016751

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO — CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA — TELÉFONO
VEREDA LAS IGLESIAS


TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
012003792264. NO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000.000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
RNO. DE CONTRATO 3714 DE 2023.
CONTENTO SOLICITADO NO. 3714 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
SUPERVISADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
www.suramericana.com

Seguros Generales Suramericana S.A. — – CLIENTE – — Página 2

Powered by CamScanner

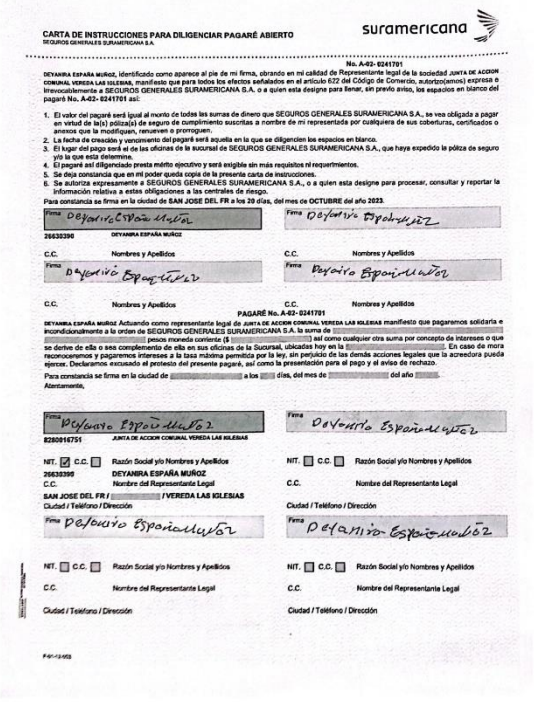

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARÉ ABIERTO
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

suramericana

No. A-02- 0241701

DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante legal de la sociedad JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS, manifiesto que para todos los efectos señalados en el artículo 622 del Código de Comercio, autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. o a quien esta designe para llenar, sin previo aviso, los espacios en blanco del pagaré No. A-02- 0241701 así:

1. El valor del pagaré será igual al monto de todas las sumas de dinero que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., se vea obligada a pagar en virtud de la(s) póliza(s) de seguro de cumplimiento suscritas a nombre de mi representada por cualquiera de sus coberturas, certificados o anexos que la modifiquen, renueven o prorroguen.
2. La fecha de creación y vencimiento del pagaré será aquella en la que se diligencien los espacios en blanco.
3. El lugar del pago será el de las oficinas de la sucursal de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., que haya expedido la póliza de seguro y/o la que esta determine.
4. El pagaré así diligenciado presta mérito ejecutivo y será exigible sin más requisitos ni requerimientos.
5. Se deja constancia que en mi poder queda copia de la presente carta de instrucciones.
6. Se autoriza expresamente a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., o a quien esta designe para procesar, consultar y reportar la información relativa a estas obligaciones a las centrales de riesgo.

Para constancia se firma en la ciudad de SAN JOSE DEL FR a los 20 días, del mes de OCTUBRE del año 2023.

Firma — 26630390 — DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ

C.C. Nombres y Apellidos

Firma — C.C. Nombres y Apellidos

Firma — C.C. Nombres y Apellidos

Firma — C.C. Nombres y Apellidos

PAGARÉ No. A-02- 0241701

DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ Actuando como representante legal de JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS manifiesto que pagaremos solidaria e incondicionalmente a la orden de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. la suma de [ ] pesos moneda corriente ($ [ ]) así como cualquier otra suma por concepto de intereses o que se derive de ella o sea complemento de ella en sus oficinas de la Sucursal, ubicadas hoy en la [ ]. En caso de mora reconoceremos y pagaremos intereses a la tasa máxima permitida por la ley, sin perjuicio de las demás acciones legales que la acreedora pueda ejercer. Declaramos excusado el protesto del presente pagaré, así como la presentación para el pago y el aviso de rechazo.

Para constancia se firma en la ciudad de [ ] a los [ ] días, del mes de [ ] del año [ ].

Atentamente,

Firma — 8280016751 — JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

NIT. ☑ C.C. ☐ Razón Social y/o Nombres y Apellidos
26630390 DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ
C.C. Nombre del Representante Legal
SAN JOSE DEL FR / VEREDA LAS IGLESIAS
Ciudad / Teléfono / Dirección

Firma

NIT. ☐ C.C. ☐ Razón Social y/o Nombres y Apellidos
C.C. Nombre del Representante Legal
Ciudad / Teléfono / Dirección

Firma

NIT. ☐ C.C. ☐ Razón Social y/o Nombres y Apellidos
C.C. Nombre del Representante Legal
Ciudad / Teléfono / Dirección

Firma

NIT. ☐ C.C. ☐ Razón Social y/o Nombres y Apellidos
C.C. Nombre del Representante Legal
Ciudad / Teléfono / Dirección

F-01-13-053

Powered by CamScanner

4.8SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA


Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Para los estudios topográficos se exigió a la JAC, los certificados de calibración de los equipos con los cuales se realizaron los levantamientos topográficos. Se ANEXA certificado de mantenimiento y calibración de los equipos usados en el levantamiento topográfico.
- Ficha técnica de los materiales utilizados

4.9 **OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL**

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se anexa programación de obra

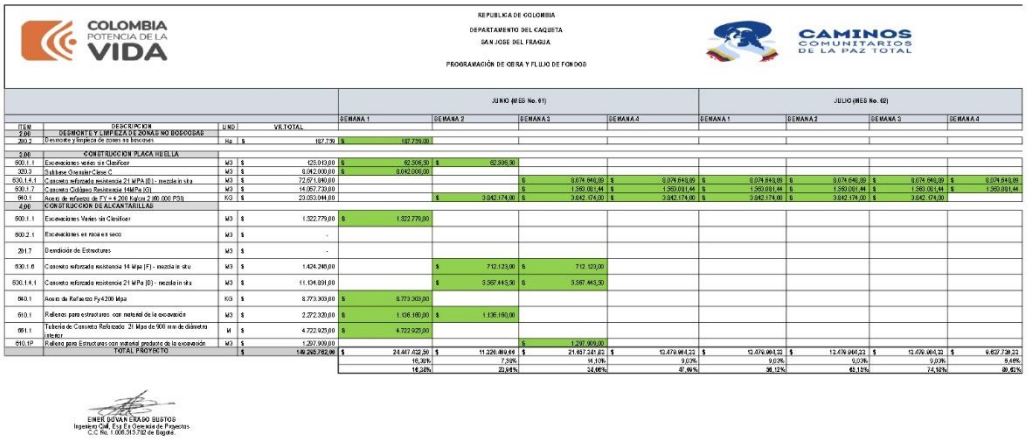

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
SAN JOSE DEL FRAGUA
PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VR.TOTAL	JUNIO (MES No. 01)				JULIO (MES No. 02)			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
2.06	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS										
201.1	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	$ 187.729	$ 187.729,00							
3.06	CONSTRUCCION PLACA HUELLA										
600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	$ 125.010,00	$ 62.505,00	$ 62.505,00						
303.3	Subbase Granular Clase C	M3	$ 6.042.000,00	$ 6.042.000,00							
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (F) - mezcla in situ	M3	$ 72.671.980,00			$ 9.074.845,00	$ 9.074.845,00	$ 9.074.845,00	$ 9.074.845,00	$ 9.074.845,00	$ 9.074.845,00
630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (C)	M3	$ 14.067.720,00			$ 1.560.091,44	$ 1.560.091,44	$ 1.560.091,44	$ 1.560.091,44	$ 1.560.091,44	$ 1.560.091,44
963.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	$ 23.053.044,00		$ 3.842.174,00	$ 3.842.174,00	$ 3.842.174,00	$ 3.842.174,00	$ 3.842.174,00	$ 3.842.174,00	
4.06	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS										
600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	$ 1.522.779,00	$ 1.522.779,00							
600.2.1	Excavaciones en roca en seco	M3	$ -								
201.7	Demolición de Estructuras	M3	$ -								
630.1.6	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	$ 1.424.240,00		$ 712.120,00	$ 712.120,00					
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (F) - mezcla in situ	M3	$ 11.104.891,00		$ 3.367.445,50	$ 3.367.445,50					
963.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	$ 8.773.303,00	$ 8.773.303,00							
610.1	Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	$ 2.272.320,00	$ 1.136.160,00	$ 1.136.160,00						
661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interno	M	$ 4.722.925,00	$ 4.722.925,00							
610.12	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	$ 1.267.909,00			$ 1.267.909,00					
	TOTAL PROYECTO		$ 186.268.752,00	$ 24.467.422,00	$ 11.220.469,44	$ 21.687.245,82	$ 13.479.944,22	$ 13.479.944,22	$ 13.479.944,22	$ 13.479.944,22	$ 9.657.739,22
				16,36%	7,50%	14,50%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	6,46%
				16,36%	23,86%	38,36%	47,36%	56,37%	65,38%	74,39%	80,85%

EINER DORAN ERAZO BUSTOS
Ingeniero Civil, Esp. En Gerencia de Proyectos
C.C. No. 1.006.913.732 de Bogotá.

Se anexa presupuesto actualizado

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				
1,00	**ITEM**	**UND**	**CANT.**	**VR UNITA**	**V. TOTAL**
2,00	**DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS**				
200.2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 187.759,00	$ 187.759,00
	SUBTOTAL LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS				**$ 187.759,00**
3,00	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**				
600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,10	$ 38.125,00	$ 194.437,50
320.3	Subbase Granular Clase C	M3	132,96	$ 91.440,00	$ 12.157.588,08
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	89,56	$ 821.914,00	$ 73.607.330,18
630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	40,49	$ 337.882,00	$ 13.682.193,71
640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4272,23	$ 7.008,00	$ 29.939.782,23
	SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA				**$ 129.581.331,71**
4,00	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**				
600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50	$ 38.124,67	$ 1.772.796,96
600.2.1	Excavaciones en roca en seco	M3	8,20	$ 68.733,43	$ 563.614,11
201.7	Demolición de Estructuras	M3	0,00	$ 232.220,00	$ -
630.1.6	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50	$ 483.427,66	$ 241.713,83
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60	$ 821.913,67	$ 7.890.371,23
640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90	$ 7.007,68	$ 4.056.747,05
610.1	Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	25,40	$ 22.400,71	$ 568.977,98
661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 736.626,94	$ 4.419.761,67
610.1P	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	24,00	$ 22.400,71	$ 537.616,99
	SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA				**$ 19.513.982,83**
	VALOR TOTAL				**$ 149.283.073,53**
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)			**3,00%**	$ 4.478.492,21
	GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 44.147.172,00
	VALOR A PAGAR				**$ 198.908.738**

RESUMEN DEL CONTRATO No…	
VALOR INCIAL DEL CONTRATO =	**$ 198.908.737,74**
VALOR MAYORES CANTIDADES =	
VALOR MENORES CANTIDADES =	
VALOR OBRA ADICIONAL=	**$ 198.908.737,74**
NUEVO VALOR EJECUTADO EN EL ACTA PARCIAL No. 01	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN ARPO 01	**0,00%**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**$ -**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	**0,00%**

ELABORÓ: ING EINER DUVAN ERASO BUSTOS
MP: 091037-0619316 CND
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se anexa plan de inversión

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 12/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3714 - 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** PROYECTOSY CONSULTORIAS ORION SAS

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 14.382.390,67	$ 14.382.390,67	$ 14.382.390,67		$ 43.147.172,01	22%
2	COSTO DE PERSONAL	$ 17.761.605,24	$ 17.761.605,24	$ 17.761.605,24		$ 53.284.815,73	27%
3	MATERIALES	16.054.360	16.054.360	16.054.360		$ 48.163.080,27	24%
4	ALQUILER DE MAQUINARIA / FORMALETA METALICA	$ 9.520.000,00				$ 9.520.000,00	5%
5	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00		$ 6.600.000,00	3%
6	MATERIALES PÉTREOS	$ 5.684.440,00	$ 5.684.440,00	$ 5.684.440,00		$ 17.053.320,00	9%
7	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 6.713.450,00	$ 6.713.450,00	$ 6.713.450,00		$ 20.140.350,00	10%
	TOTAL	**$ 72.316.246,00**	**$ 62.796.246,00**	**$ 62.796.246,00**	**$ -**	**$ 197.908.738,00**	**100%**

NOTAS: $ 197.908.738,00

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **Deyanira Muñoz España**
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 26.630.390

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventor
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma:
Nombre: **Einer Duvan Eraso Bustos**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **091037-0619316 CND**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Anexo actas comité operativo

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 01	Dirección Territorial INVIAS: CAQUETA	Fecha: 4 DE MAYO DEL 2024

Vereda – Municipio - Departamento: JAC LAS IGLESIAS-SAN JOSÉ DEL FRAGUA-CAQUETÁ
No. Convenio(s) Solidario(s): CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3714 DE 2023
Ejecutor(es): JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JUAN CARLOS SANABRIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FABIO JESÚS MEJIA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JULIO CESAR INFANTE GUZMAN	JAC IGLESIAS	CONTADOR
ANDRI YESENIA PERILLA	JAC IGLESIAS	VEEDORA
JEYSONN ANDRES MORA	JAC IGLESIAS	VEEDOR
EDGAR ROJAS	JAC IGLESIAS	MIEMBRO DE LA JAC
EINER DUVAN ERASO BUSTOS	JAC IGLESIAS	INGENIERO RESIDENTE
DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ	JAC IGLESIAS	PRESIDENTA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Presentación de cada uno de los integrantes
2. Socializar Cotizaciones de Dotación, topografía y estudios de suelos.
3. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio mediante actualización de cantidades y presupuesto de obra.


AGENDA DEL COMITE: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Presentar cotizaciones para realizar elecciones
3- Proposiciones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los seis (6) miembros contadores, ingeniero, veeduría y comunidad.
2.	Presentar cotizaciones para realizar elecciones: • **Cotización Para Dotación**: de acuerdo a las invitaciones realizadas vía WhatsApp/ presencial y telefónicamente se presentaron tres cotizaciones para la compra de dotación y elementos de protección personal 1. NEFIN SAS VALOR $ 3.108.005 2. FERRECERAMICAS $ 4.374.800 3. AMAZONIA SAFETY $ 2.802.000 la empresa AMAZONIA SAFETY queda seleccionada por ser la oferta más económica y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el proyecto. entroga los elementos en Florencia y la forma de pago un 100% CONTRAENTREGA 5 DIAS HABILES las otras ofertas son más costosas. • **Cotización Para Estudio De Suelos**: de acuerdo a las invitaciones realizadas vía WhatsApp/ presencial y telefónicamente Se presento un único oferente para la realización de los estudios de suelos ya que en el departamento hay pocos que los realizan: 1. GEOCON INGENERIA VALOR $ 2.334.900 la empresa GEOCON INGENERIA queda seleccionada por ser la oferta más económica y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el proyecto. • **Cotización Para Exámenes Laborales:** de acuerdo a las invitaciones realizadas vía WhatsApp/ presencial y telefónicamente se presenta un único oferente para la realización de exámenes laborales. 1. MARTHA LUZ ALTAMAR VALOR $ 40.000 Por persona. la Sra. MARTHA LUZ ALTAMAR queda seleccionada por ser la oferta más económica y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el proyecto. • **Cotización Para TOPOGRAFIA**: de acuerdo con las invitaciones realizadas vía WhatsApp/ presencial y telefónicamente Se presenta un único oferente para la realización de topografía: 1. GUSTAVO NARNAVAEZ VALOR $ 1.300.000 El señor GUSTAVO HERNANDEZ queda seleccionado por ser la oferta más económica y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el proyecto. • **Cotizaciones Para Materiales Pétreos:** de acuerdo con las invitaciones realizadas vía WhatsApp/ presencial y telefónicamente Se presenta un único oferente para la realización de topografía:

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

3.	1. **MAEXCA SAS** TIPO DE MATERIAL / UNIDAD / VALOR SUMINISTRO DE GRAVILLA — M3 — $75.000 SUMINISTRO DE ARENA TRITURADA — M3 — $90.000 SUMINISTRO DE PIEDRA CICLOPEO — M3 — $70.000 SUMINISTRO DE PIEDRA PARA GAVIONES — M3 — $85.000 SUMINISTRO DE CRUDO DE RIO — M3 — $40.000 SUMINISTRO DE ATRIMACO — M3 — $85.000 SUMINISTRO SUBBASE — M3 — $75.000 2. **MULTIAGREGADOS SAS** Las empresas MAEXCA SAS Con ubicación vía Municipio de Albania y MULTIAGRADADOS SAS con ubicación municipio de Morelia quedan los DOS seleccionados por ser Las ofertas que ofrecen los materiales certificados, con licencia ambiental y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el proyecto. De igual forma se manifiesta que los dos fueron seleccionados ya que se requiere que tengan en acopio los materiales. La empresa Multigrados cotiza por cantidades sin embargo se analiza solo valores unitarios, ya que se espera tener el resultado de los estudios de suelos para determinar cantidades de algunos materiales. COTIZACIÓN JUNTA DE ACCION LAS IGLESIAS BASE GRANULAR — 50 — $ 66.000 — $ 3.000.000,00 Arena 3/8 — 70 — $ 36.000 — $ 2.520.000,00 Gravilla 1/2 — 107 — $ 83.533 — $ 8.914.686,67 VALOR BRUTO — $ 14.919.696,67 Iva — 19% — $ 2.663.186,67 Retefuente — 2,50% — $ 356.413,67 TOTAL A PAGAR — $ 17.030.250,00
3.	**Orientaciones técnicas:** • Teniendo en cuenta el presente comité, se tienen en cuenta los diseños los cuales se llevarán a cabo para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta la ***"cartilla de obras de drenaje del INVIAS"*** la cual cuenta con un ancho de vía de 5,0M, un espesor de subbase de 0,15m y espesor de concreto de 0,15M, de igual forma, se dio claridad a cerca de las obras de drenaje las cuales son en base a los diseños de la anterior cartilla o manual del INVIAS. NOTA: Se anexa foto de guia a utilizar:  • Se oriento a cerca de las actividades en cuanto a los laboratorios de suelo los cuales son importantes para dotorminar el CBR dol suelo existente, por otra parte, se llevaron a cabo apiques

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	para determinar el perfil estratigráfico de la obra de drenaje y así de esta manera determinar la profundidad y los procesos constructivos al momento de realzar la obra.
4.	• **Programación Inicial de Obras:** Para el inicio de las actividades de obra, se inicio con el estudio de suelos realizando dos apiques a una profundidad de 1.5 metros con la finalidad de que estas muestras fuesen llevadas a laboratorio para ser estudiadas y así determinar el CBR o la capacidad portante del suelo, por otra parte se llevó a cabo el levantamiento topográfico en búsqueda de la localización inicial y así tener el alineamiento en el cual se construirá la placa huella al igual que los niveles por medio de cotas para garantizar los espesores requeridos en cuanto a la conformación de la subbase si esta es requerida.
5.	
6.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	**Contratación:** Se toman las siguientes decisiones realizar las compras a las siguientes empresas: 1. AMAZONIA SAFETY – COMPRA DE DOTACIÓN 2. GEOCON INGENIERÍA- ESTUDIOS DE SUELOS 3. MARTHA LUZ ALTAMAR – EXÁMENES LABORALES 4. GUSTAVO NARVÁEZ - TOPOGRAFÍA 5. MAEXCA SAS - MATERIALES PETREO 6. MULTIAGREGADOS SAS – MATERIALES PÉTREO

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X___ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X___ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____

INVIAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Solicitar a los proveedores Disponibilidad para la compra de los mariales y solicitar documentación requerida	CONTADOR/ PRESIDENTA	10/5/2024
Informar a la comunidad sobre las decisiones tomadas en el comité.	PRESIDENTA /VEEDURIA	8/5/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
NA		

FIRMAS DE ASISTENTES:

Jelson A. Mora L.
Nombre: ANDRES MORA LOSADA
Cargo: Representante de veeduria

Deyanira España
Nombre: DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ
Cargo: presidente OAC


Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Cargo: Director de interventoría

Nombre: FABIO JESUS MEJIA
Cargo: Residente de interventoría

5

6.9.4. ACTAS DE REUNIÓN

Se anexa acta de socialización

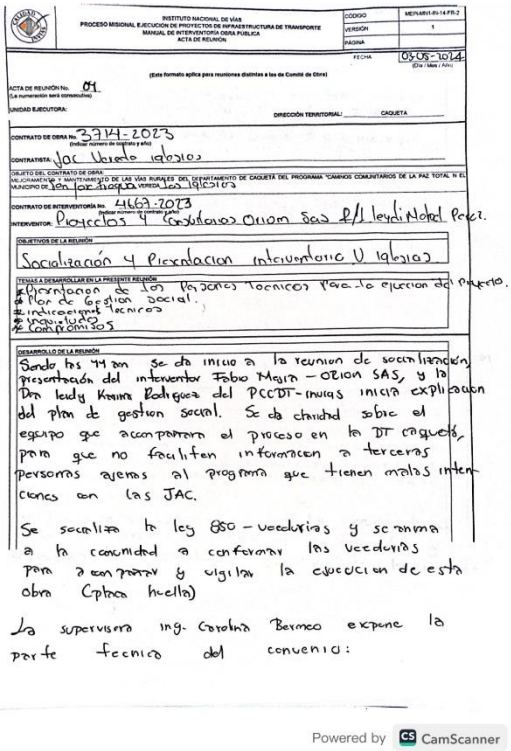

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION

CÓDIGO: MEPLAR11-PI-14-FR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 03-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.: 01 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No.: 3214-2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC Vereda Iglesias

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" EN EL MUNICIPIO DE San Jose del Fragua VEREDA Las Iglesias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Proyectos y Consultorias Orion Sas R/L Leydi Nohel Perez.


OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Socialización y Presentacion Interventoria V Iglesias

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
* Presentacion de los Perfiles Tecnicos Para la ejecucion del Proyecto.
* Plan de Gestion Social.
* Intervenciones Tecnicas
* Inequidad
* Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Siendo las 4 pm se da inicio a la reunion de socializacion, presentación del interventor Fabio Mejia – ORION SAS, y la Dra Leidy Karina Rodriguez del PCCDT-invias inicia explicacion del plan de gestion social. Se da claridad sobre el equipo que acompañara el proceso en la DT caqueta, para que no faciliten informacion a terceras personas ajenas al programa que tienen malas intenciones con las JAC.

Se socializa la ley 850 – veedurias y se informa a la comunidad a conformar las veedurias para acompañar y vigilar la ejecucion de esta obra (Optica huella)

La supervisora Ing. Carolina Bermeo expone la parte tecnica del convenio:

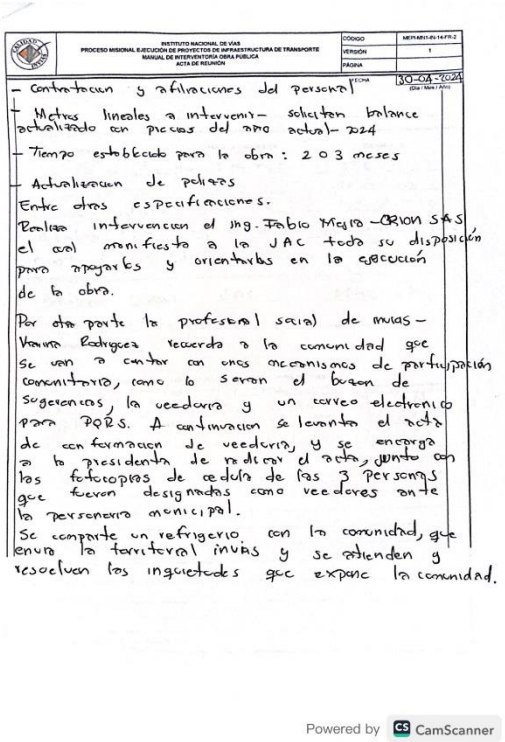

- Contratacion y afiliaciones del personal
- Metros lineales a intervenir – solicitan balance actualizado con precios del año actual – 2024
- Tiempo establecido para la obra: 203 meses
- Actualizacion de precios

Entre otras especificaciones.

Realizo intervencion el Ing. Fabio Mejia – ORION SAS el cual manifiesto a la JAC toda su disposición para apoyarlos y orientarlos en la ejecución de la obra.

Por otra parte la profesional social de invias – Karina Rodriguez recuerda a la comunidad que se van a contar con unos mecanismos de participación comunitaria, como lo seran el buzon de sugerencias, la veeduria y un correo electronico para PQRS. A continuacion se levanta el acta de conformacion de veeduria, y se encarga a la presidenta de radicar el acta, junto con las fotocopias de cedula de las 3 personas que fueron designadas como veedores ante la personeria municipal.

Se comparte un refrigerio con la comunidad, que envia la territorial invias y se atienden y resuelven las inquietudes que expone la comunidad.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: MEPA-IN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día Mes / Año)	RESPONSABLES
* Enviar HV al interventor para su aprobación	05-05-2024 JAC	JAC Interventoria
* Posesion vocal vieja	JAC	05-05-2024
* Actualizar firmas consentas de las cartas bancarias	05-05-2024	JAC interventoria invias
* Actualizar polizas y cargar al secop	JAC	05-05-2024

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jobo Nañez	Profesional Interventoria	Proyecto Orion	Jobo Nañez.
Yenny Rodriguez	T. social	INVIAS-CCDPT	
Carolina Barrios	Ing. civil	INVIAS-CCDPT	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
Versión: 1
Página: 1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Programa Caminos Comunitarios — Ciudad/ Municipio: — Fecha: 3 mayo-2024
Nombre del evento: Socialización y presentación interventoría ORION SAS — Lugar: V/los Iglesias

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento: CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo: F	M	O	Discapacidad: SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia: I	N	R	Q	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIT	Firma
1	Eimer N Tapias B	X			1006515782	25	X				X									3203210084	JAC los Iglesias		
2	Juan Pimentel G	X			176339755	59	X				X									3146946716			
3	Esteban Sanchez	X			1006515882	22	X				X									3103467144	JAC. los iglesias		
4	Sigifredo Rojas				17680575	64	X				X									3214365741			
5	Oliver Arias B.				1764896777		X				X									3132050631			
6	Edgar Tapias C				1268707						X									3132304001			
7	Jessenia Mena				1118421397																		
8	Andrea Perilla B.	X			1118472677	30					X									3112334127	JAC. los Iglesias		
9	Deivis Espitia				76070390						X									3143590401	cell Iglesias		
10	Edier Rodriguez Pertuz	X			6805744			X			X									3124143340			
11	Juvo Sanabria				7715276			X			X												
12	Leete Durán				886 804			X			X												

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna de las opciones. En caso que marque SI, relacione el tipo de discapacidad con la letra que la describe	
V	Visual - Persona ciega
A	Auditiva
I/C	Intelectual/Cognitiva
F	Física
S/C	Sordo ceguera
M	Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PSI	Psicosocial

Etnia		
1	Indígena	CC
2	Negro	CE
3	Raizal	P
4	Palenquero	
5	Gitano/Rrom	
N.A.	No aplica	

Powered by CamScanner

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.5 Información general del contrato

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA *No. 4647 de 2023*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	*4647 DE 2023*
CONTRATANTE	*INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS*
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*
CONTRATISTA	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS*
VALOR TOTAL	*$ 109.303.594*
VALOR ACUMULADO	*$ 109.303.594*
PLAZO INICIAL	*6 MESES*
PLAZO PRORROGA No. 1	6 MESES
PLAZO ACUMULADO	9 MESES Y 16 DIAS
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	9 MESES Y 16 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*26 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	*30 DE JUNIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	*16 DE OCTUBRE DE 2024*

Tabla ***2****. Información general contrato 4647 de 2023*

2.6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Se hizo control de calidad en los materiales utilizados y se verificó que estos cumplan con las especificaciones técnicas

Se hizo seguimiento a las obras por medio de visitas periódicas al sitio, donde se verificó que se utilizaron los diseños requeridos por el Invias

Se le hizo seguimientos a los desembolsos realizadas para la ejecución de las obras

3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4647 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3979 de 2023, 3714 de 2023, 4440 de 2023, 3674 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS-FLORIDA-DELCIAS-ASOJUNTAS ALBANIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MOTOCICLETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

NUMERO DE PLACA:FIF85G MARCA: BENELLI CILINDRAJE 500CC MODELO:2023

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA SE LES REALIZARÁ MANTENIIENTO PREVENTIVO TODO LOS 5 DE CADA MES QUE ESTE EN EJECUCION DEL PROYECTO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firma
Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato relación de empleado
Anexo planialla pagada del mes de julio
Anexo certificación del pago de seguridad social

ORION
901503188-3

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

CERTIFICA

Que para la ejecución del contrato de interventoría 4647 de 2023 firmado entre el I**NVIAS**, y **PROYECTO Y CONSULTORIAS ORION SAS** se realizaron los respectivos pagos de seguridad social (**SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**) durante el periodo de AGOSTO de 2024, estando a paz y salvo en este periodo.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca a los 31 días del mes de AGOSTO del 2024

Mabel Perez

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

3.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo formato financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/8/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

MES INFORME MENSUAL: 800-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1315123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00
TOTAL						$ 109.303.594,00	$ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 109.303.594,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	abr-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2023	$ 109.303.594,00	$ 98.803.594,00		
2	may-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2024	$ 109.303.594,00	$ 88.303.594,00		
3	jun-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2025	$ 109.303.594,00	$ 77.803.594,00		
4	jul-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2026	$ 109.303.594,00	$ 67.303.594,00		
5	ago-24	$ 8.505.000,00	$ 1.995.000,00	$ 10.500.000,00				1315123 de 11 de noviembre de 2027	$ 109.303.594,00	$ 56.803.594,00		
TOTALES		**$ 42.525.000,00**	**$ 9.975.000,00**	**$ 52.500.000,00**	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ - $ -

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 42.525.000,00	$ -	$ 42.525.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 9.975.000,00	$ 9.975.000,00
VALOR TOTAL	$ 42.525.000,00	$ 9.975.000,00	**$ 52.500.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-37430CND

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

3.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 1: 30/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA 2: 16/10/2024

VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.860.720,00	24	11	2023	31	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.930.360,00	24	11	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052020

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430CND

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo polizas de interventoria

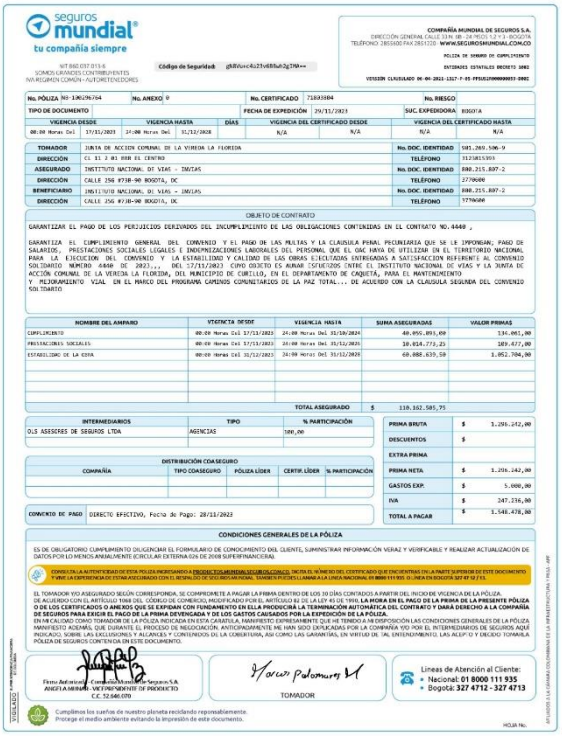

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100396764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.506-9
DIRECCIÓN	Cl 11 2 81 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3123815303
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770400
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	2770400

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMINTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4440 ,

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023.,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.,, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.095.093,60	134.061,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	10.014.773,25	189.477,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.088.639,50	1.052.704,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.162.505,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.296.242,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.296.242,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	247.236,00
TOTAL A PAGAR	$	1.548.478,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE ESTAS ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRANDA VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.666.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CAL...2 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - SOCOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100396764	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893884	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	30637A

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES


. TOMADOR / GARANTIZADO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.506-9

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

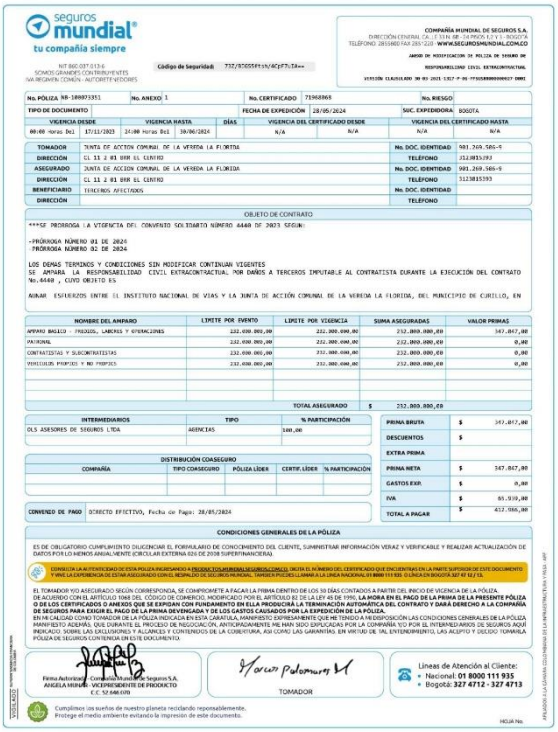

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N.69 - 24 PISOS 1 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSR000000027-D001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 732/8C65Ftsh/4CpF7cIA==

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968865	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	2124835193
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 01 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	5123835193
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRORROGA NUMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.047,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA RED OFICIALIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARA A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ACEPTAR, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE, ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.680.039

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

APLICADO A LA CARÁTULA CLÁUSULADO DE LA MODALIDAD TRUCKS Y PAGO - APP



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N.69 - 24 PISOS 1 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71968865	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 - Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9. - TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV


"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

APLICADO A LA CARÁTULA CLÁUSULADO DE LA MODALIDAD TRUCKS Y PAGO - APP

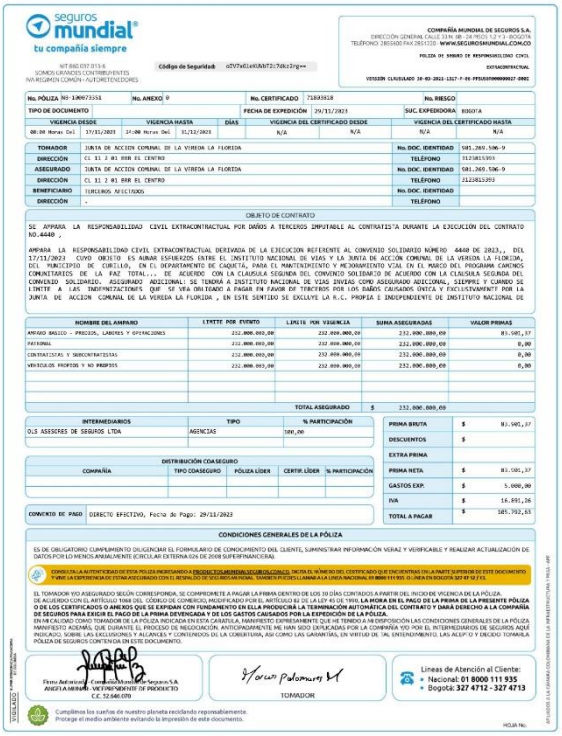

seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855000 FAX 2851720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893818	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 81 000 EL CENTRO	TELÉFONO	3123815393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.596-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 81 000 EL CENTRO	TELÉFONO	2122813393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4440 ,

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023,, DEL 17/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUBILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL... DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE INVITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.505,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	83.505,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.505,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.792,63

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 F33.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.540.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855000 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100073351	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71893818	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL, LA PRESENTE POLIZA CUBRE ESPECIFICAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:NO.269.596-9. , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 -FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

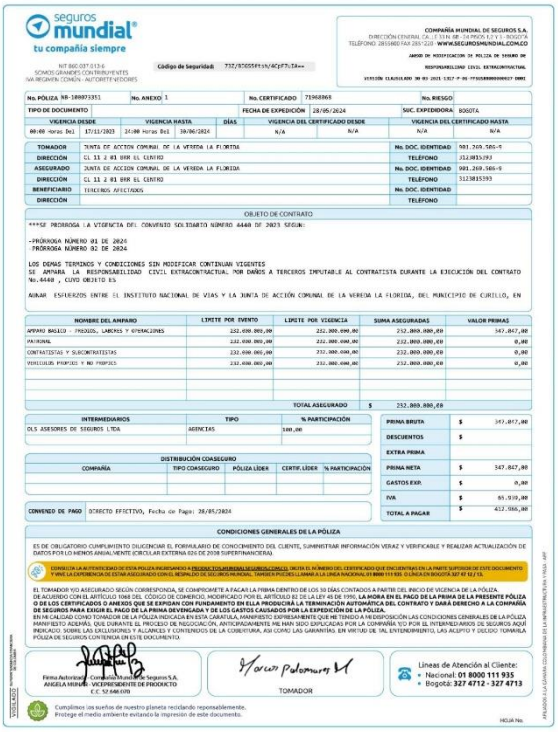

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 737/8C055Ff1h/4CpF7cIA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
RR-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 83 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128835393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA	No. DOC. IDENTIDAD	901.269.586-9
DIRECCIÓN	CL 11 2 83 BRR EL CENTRO	TELÉFONO	3128835393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4440 DE 2023 SEGUN:

-PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024
-PRÓRROGA NÚMERO 02 DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4440 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUBILLO, EN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	347.047,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 252.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	347.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	347.047,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	65.919,00
TOTAL A PAGAR	$	412.966,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRIMERO TOCAR/REVELAR CODIGO QR/QUE ESTA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL REMOLDE DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 (LÍNEA DE BOGOTA 327 47 12 / 13).

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDRÍA A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA HIRUELA VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

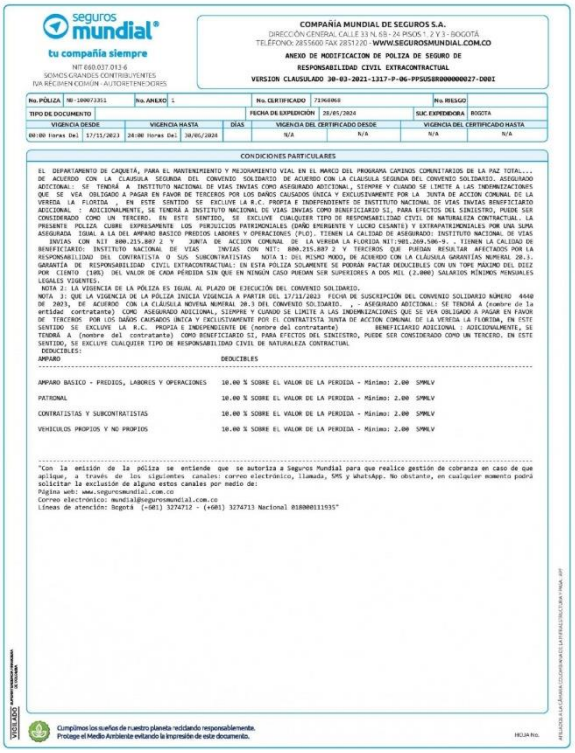

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2853720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
RR-100073351	1	71960868	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	28/05/2024	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO). TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800.215.807 2 Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA NIT:901.269.586-9 , TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT: 800.215.807 2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:- EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4440 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO. _ - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamado, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Anexo formato plan de cargas

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 7 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 3230 DE 15/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

PLAZO INICIAL: 0,6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)
PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 16 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 109.303.594,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 109.303.594,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																															
	1	Director de Interventoria	$ 5.000.000		0,50	$ 2.500.000										0,01	$ 50.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000	0,25	$ 1.250.000			1,52	$ 7.600.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.000.000		4,00	$ 16.000.000										1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	0,37	$ 1.475.593	0,00	$ 2.000.000			4,9	$ 19.475.593
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000														0,20	$ 560.000							0,20	$ 560.000			0,40	$ 1.120.000
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,40	$ 1.120.000														0,40	$ 1.120.000							0,20	$ 560.000			0,60	$ 1.680.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00																											$ 3.000.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.500.000																														
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.500.000																														
		Especialista en Estructuras	$ 5.500.000																														
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.500.000																														
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.500.000																														
	1	Inspector	$ 1.200.000		8,00	$ 9.600.000																				0,50	$ 600.000	0,00	$ 600.000			1,0	$ 1.200.000
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		0,48	$ 576.000																								0,24	$ 288.000			0,48	$ 576.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 33.916.000,00											$ -		$ 5.250.000		$ 6.370.000		$ 6.098.000		$ 5.850.000		$ 3.325.593		$ 4.658.000				$ 34.551.593
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36											0,00		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36				2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 80.041.792											$ -		$ 12.390.000,0		$ 15.033.200,0		$ 14.391.280,0		$ 13.806.000,0		$ 7.848.399,7		$ 10.992.880,0				$ 81.541.760

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2023 MES H-M	2023 MES VALOR	2024 MES H-M	2024 MES VALOR	2024 ABRIL H-M	2024 ABRIL VALOR	2024 MAYO H-M	2024 MAYO VALOR	2024 JUNIO H-M	2024 JUNIO VALOR	2024 JULIO H-M	2024 JULIO VALOR	2024 AGOSTO H-M	2024 AGOSTO VALOR	2024 SEPTIEMBRE H-M	2024 SEPTIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 110.000	Dia	$ 4,00	$ 440.000									$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 110.000	1	$ 110.000	2	$ 220.000			4,00	$ 440.000
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 300.000	Mes	$ 13,00	$ 3.900.000									$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000,0	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000			8,00	$ 2.400.000
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000	Según corresponda por obra	$ 2,00	$ 5.600.000									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 5.600.000	2,00	$ 5.600.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según corresponda por obra	$ 4,00	$ 1.200.000									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 1.200.000	4,00	$ 1.200.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ -	Según corresponda por obra	$ -	$ -									$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 175.000,00	Según corresponda por obra	$ 2,00	$ 350.000									$ -		$ -		$ -	1	$ 175.000	1	$ 175.000	1	$ 175.000		$ -		$ -	2,00	$ 350.000
	1	Copias de planimetria, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc	$ 80.000,00	Según corresponda por obra	$ -	$ -									$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax correo, internet, etc)	$ 80.000,00	Según corresponda por obra	$ 4,00	$ 320.000									$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 80.000	2	$ 160.000	1	$ 80.000		$ -	4,00	$ 320.000
	1	Vivienda Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según corresponda por obra	$ -	$ -									$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 11.810.000,00									$ -		$ 300.000		$ 300.000		$ 600.000		$ 905.000		$ 1.045.000				$ 10.310.000
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+ (B) + (C) + (D)				$ 91.851.760,00									$ -		$ 12.690.000		$ 15.333.200		$ 14.991.280		$ 14.771.000		$ 8.893.400		$ 10.992.880				$ 91.851.760
	*	IVA = 19% * (D) + (E)				$ 17.451.834,00									$ -		$ 2.411.100		$ 2.913.308		$ 2.848.343		$ 2.806.490		$ 1.689.746		$ 2.088.647				$ 17.451.834
	*	COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 109.303.594									$ -		$ 15.101.100		$ 18.246.508		$ 17.839.623		$ 17.577.490		$ 10.583.146		$ 13.081.527				$ 109.303.594
	*																															
	*																															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se consideraná necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 4647 de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras; sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas. surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prorroga al contrato 4647 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones, con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: LEIYD MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
NOMBRE: JOSE RICARDO BURBANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se le recomienda al contratista utilizar materiales de buena calidad pétreos y de ferreterías que cumpla con las especificaciones técnicas



8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

A la fecha no se ha recibido correspondencia

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Instalación de anillos de 36” para la alcantarilla</td><td>Excavación para corte de via 5 m</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Excavación para corte de via 5 m</td><td>Excavación para corte de via 5 m</td></tr>
</table>

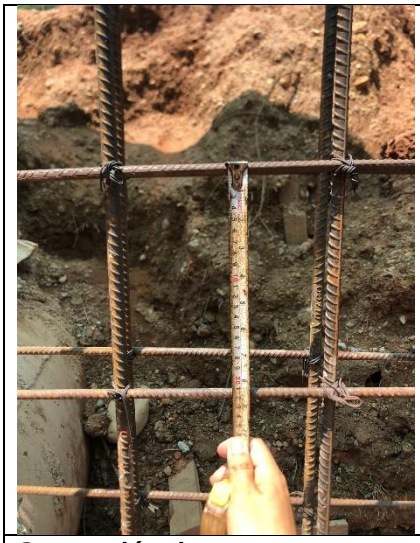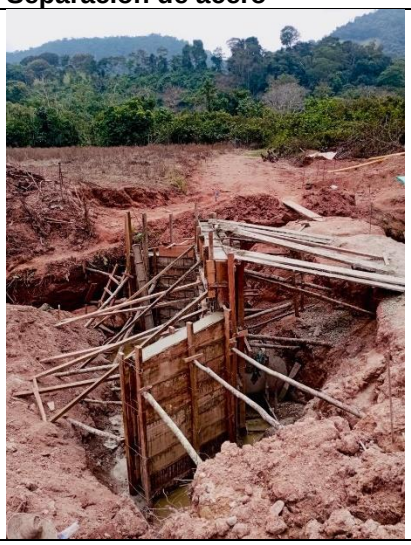
	
Separación de acero	**Separación de acero**
	
Instalación de acero	**Encofrado para el descole**
	
Alcantarilla de concreto de 36”	**Alcantarilla de concreto de 36”**

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Se anexan foto de la socialización

	
Socialización vereda IGLESIAS acompañamiento INVIAS	**Socialización vereda IGLESIAS acompañamiento INVIAS**

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

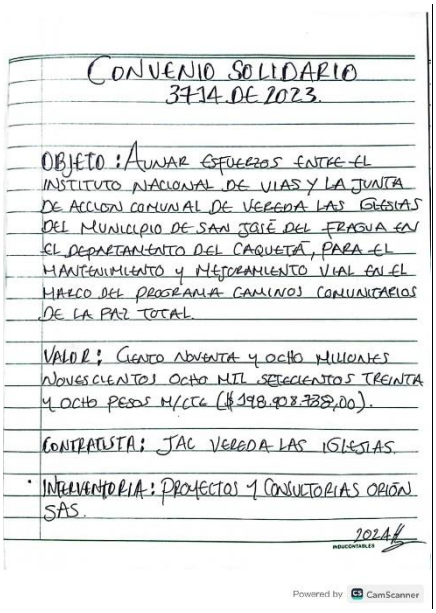

CONVENIO SOLIDARIO
3714 DE 2023.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($198.908.738,00).

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS IGLESIAS.

INTERVENTORIA: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS.

2024

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner


FECHA: 01/08/2024 Clima: Soleada
Lluvias Intensas.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Maestro de obra (1)
Ayudante de obra (5).

MAQUINARIA y EQUIPO. - Mezcladora
- Motobomba Sumergible 2plg. Concreta
- Planta Electrica FORTE 3500 PPM.
- Herramienta Menor.

Actividades Realizadas:
- Se llevo a Cabo el adecuamiento de Acero de Refuerzo transversal y longitudinal en Barra No. 04 para Zampa de encole en alcantarilla
- Se llevo a Cabo adecuamiento de Granzon para estabilizacion de Rasante para Construccion de placa Huella.

firma Ing Residente de obra. firma Ing Residente de Interventoria

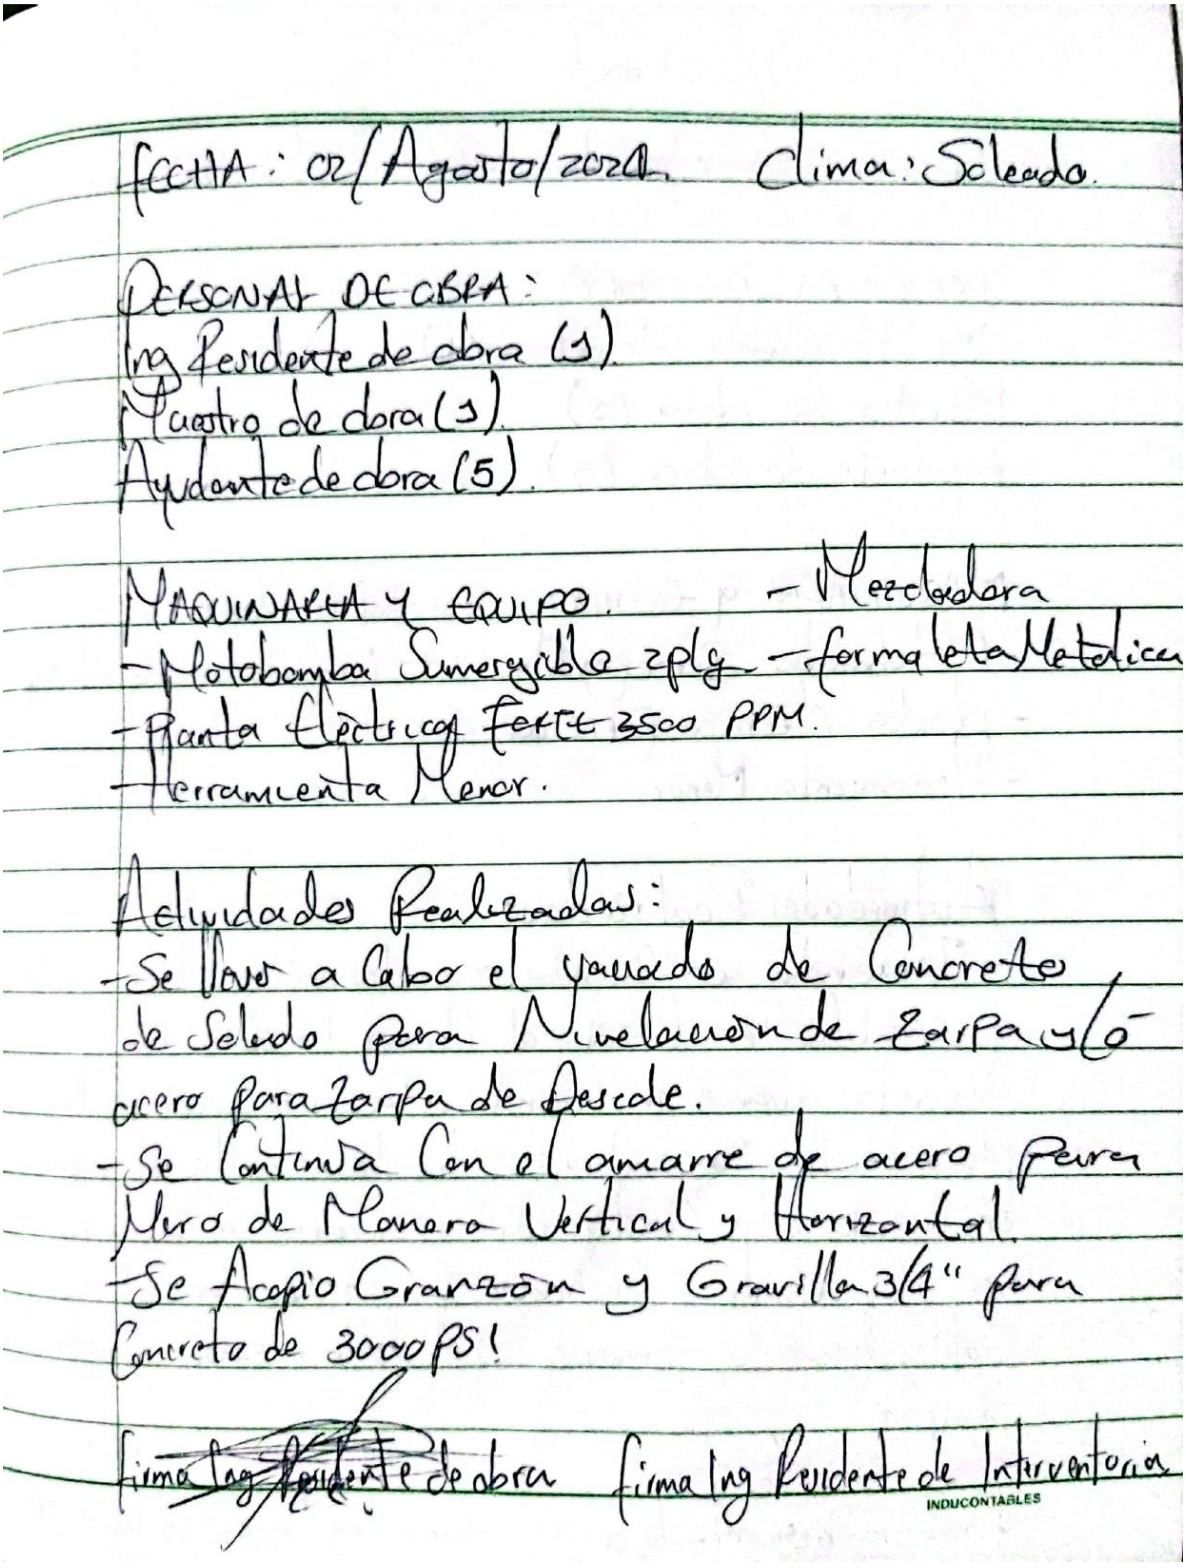

FECHA: 02/Agosto/2024 Clima: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Maestro de obra (1).
Ayudante de obra (5).

MAQUINARIA Y EQUIPO.
- Motobomba Sumergible 2plg
- Planta Eléctrica 7KW FERTE 3500 PPM.
- Herramienta Menor.
- Mezcladora
- formaleta Metalica

Actividades Realizadas:
- Se llevo a Cabo el vaciado de Concreto de Solado para Nivelacion de Zarpa y/o acero para zarpa de descole.
- Se Continua Con el amarre de acero para Muro de Manera Vertical y Horizontal.
- Se Acopio Granzon y Gravilla 3/4" para Concreto de 3000PSI

Firma Ing Residente de obra Firma Ing Residente de Interventoria

INDUCONTABLES


FECHA: 03-Agosto-2024. Clima: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Maestro de obra (1).
Ayudante de obra (5)

MAQUINARIA y EQUIPO:
- Motobomba Sumergible
- Planta Eléctrica FORTE 3500RPM.
- Herramienta Menor.
- Mezcladora
- formaleta Metálica

Actividades Realizadas:
- Teniendo en Cuenta que los días han sido favorables en Cuanto al Clima, la obra no presenta avances en Cuanto a la Construcción de la placa Malla Sin embargo, la alcantarilla avanza en Cuanto a la Construcción y amarre de acero. es importante Mencionar que esta es una obra doble, donde se tomará es el doble a una alcantarilla Simple.

firma Ing Residente de obra firma Ing Residente Interventoría

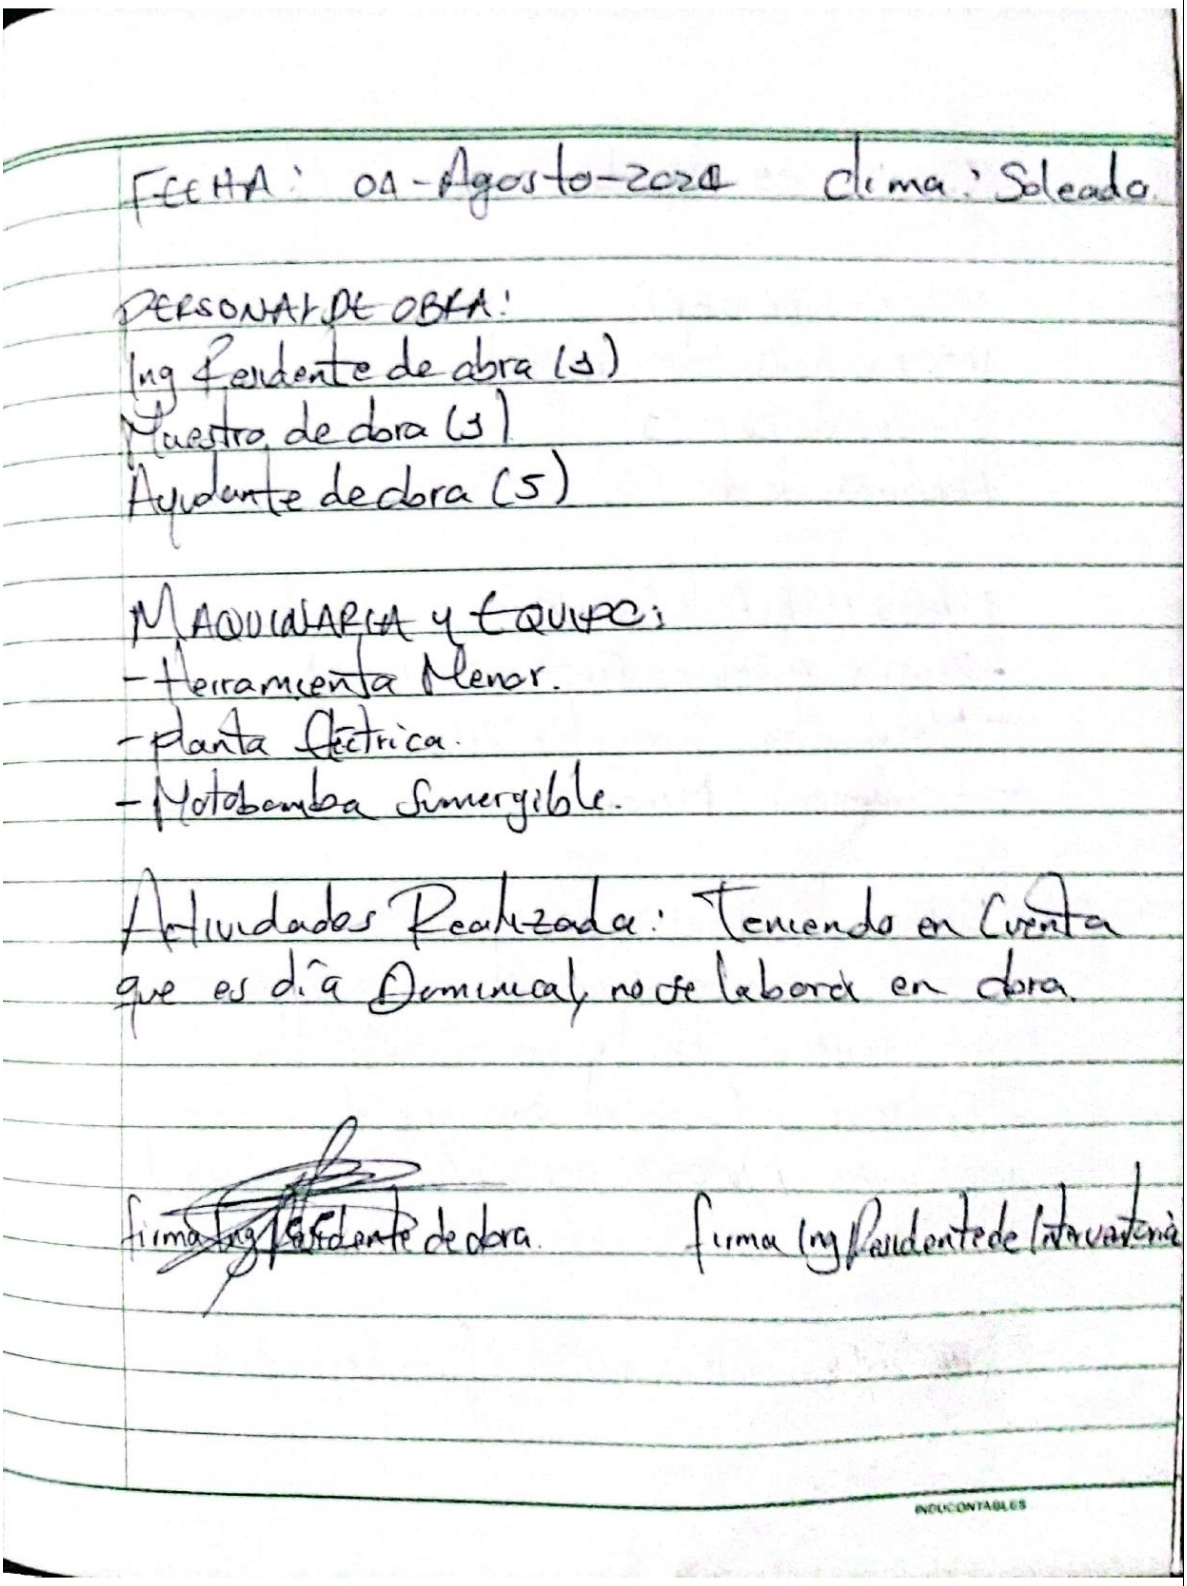

FECHA: 04-Agosto-2024 clima: Soleado


PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1)
Maestro de obra (1)
Ayudante de obra (5)

MAQUINARIA y EQUIPO:
- Herramienta Menor.
- Planta Eléctrica.
- Motobomba Sumergible.

Actividades Realizada: Teniendo en Cuenta que es día Domingo, no se laboro en obra.

Firma Ing Residente de obra. Firma Ing Residente de Interventoría

INDUCONTABLES

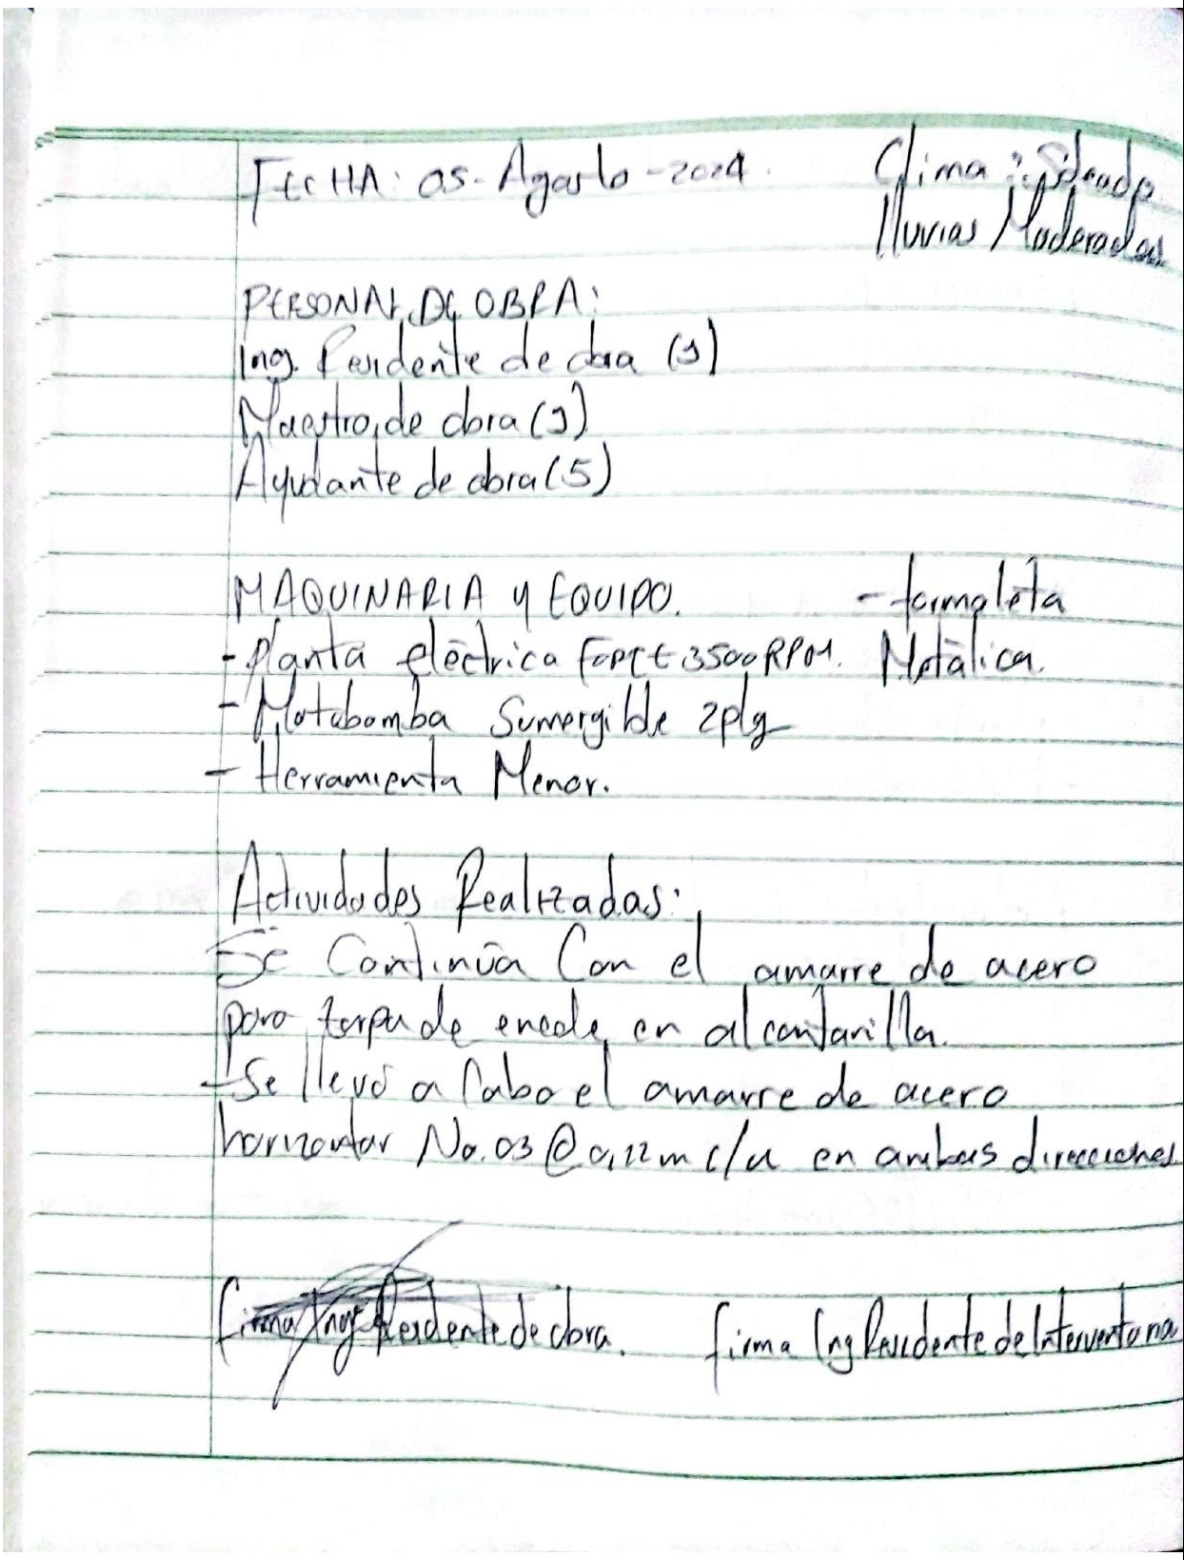

FECHA: 05 Agosto - 2024. Clima: Estado Lluvias Moderadas

PERSONAL DE OBRA:
Ing. Residente de obra (1)
Maestro de obra (1)
Ayudante de obra (5)

MAQUINARIA Y EQUIPO. - formaleta Metálica.
- Planta eléctrica Fepet 3500 RP01.
- Motobomba Sumergible 2plg
- Herramienta Menor.

Actividades Realizadas:
- Se Continúa Con el amarre de acero para terpa de encole en alcantarilla.
- Se lleva a Cabo el amarre de acero horizontal No. 03 @ 0,12 m c/u en ambas direcciones

Firma Ingº Residente de obra. Firma Ing Residente de Interventoria

FECHA: 05-Agosto-2024 Clima: Soleado Lluvias Moderadas.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Maestro de obra (1).
Ayudante de obra (5).


MAQUINARIA Y EQUIPO:
- Planta Electrica FORTE 3500RPM.
- Motobomba Sumergible
- Herramienta Menor.

Actividades Realizadas: Teniendo en Cuenta que los avances de obra no se han visto reflejados de manera ascendente, he decidido hacer reporte de Personal, el dia 09/08/2024
- Esto se hace en busqueda de dar soluciones desde la parte administrativa.
- Se requiere guardar con la alcantarilla. por parte de la Interventoria.

Firma Ayudante de obra

Firma Ing Residente de Interventoria.

INDUCONTABLES

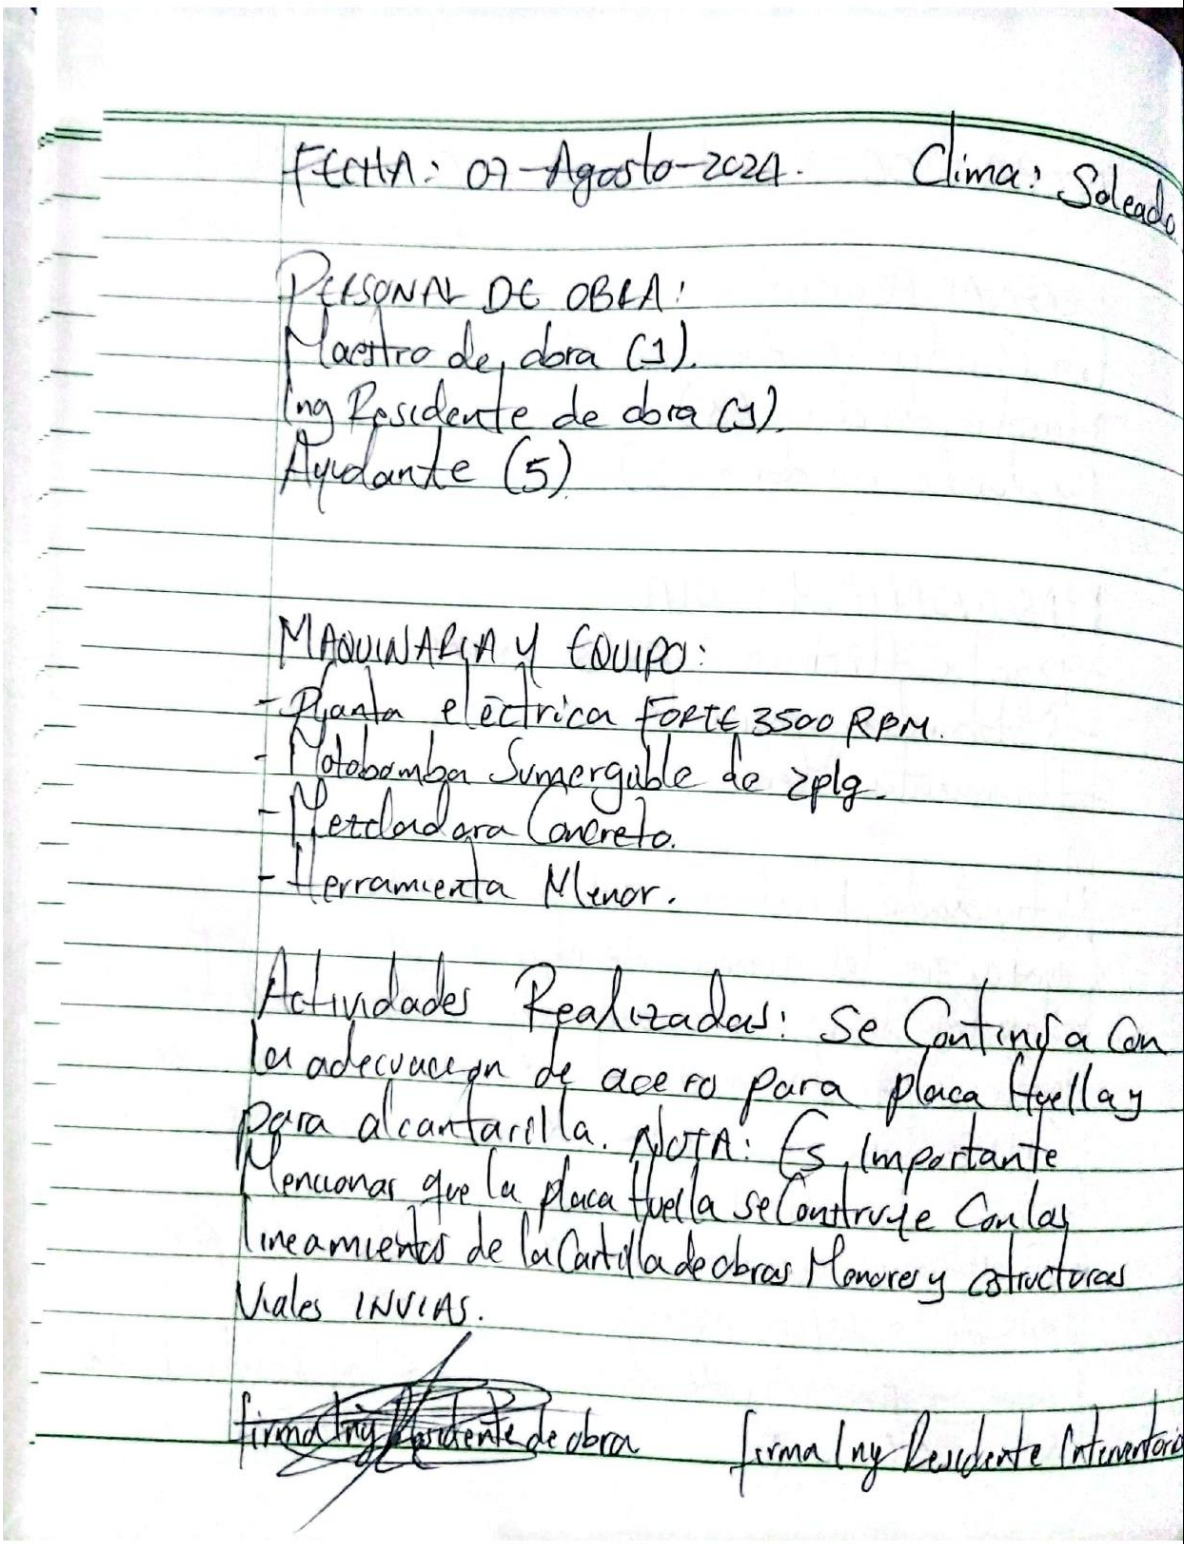

FECHA: 07-Agosto-2024. Clima: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Maestro de obra (1).
Ing Residente de obra (1).
Ayudante (5)

MAQUINARIA Y EQUIPO:
- Planta eléctrica FORTE 3500 RPM.
- Motobomba Sumergible de 2plg.
- Mezcladora Concreto.
- Herramienta Menor.

Actividades Realizadas: Se Continua Con la adecuacion de acero para placa Huella y para alcantarilla. NOTA: Es Importante Mencionar que la placa huella se Construye Con los lineamientos de la Cartilla de obras Menores y estructuras Viales INVIAS.

Firma Ing Residente de obra Firma Ing Residente Interventoría

FECHA: 08-Agosto-2024.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1)
Maestro de obra (1)
Ayudante obra (5).

MAQUINARIA Y EQUIPO:
- Planta eléctrica (1)
- Motobomba (2)
- Mezcladora (1).
- Herramienta Menor (1)

Actividades Realizadas:
Se realizo Cargue de formaleta Metálica para encofrado de placa Huella y Encajuela de Muros de alcantarilla.

- La obra no presenta Inconvenientes en Salud de los trabajadores.

Firma Ing Residente de obra. Firma Ing Residente Interventoría.

INDUCONTABLES

FECHA: 09 Agosto - 2024. Clima: Soleado, lluvias Moderadas

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1)
Maestro (1)
Ayudante de obra (4)

MAQUINARIA y EQUIPO:
- Herramienta Menor.
- Retrocargador.
- Motobomba Sumergible 2 plg.

Actividades realizadas:
- Teniendo en Cuenta las Condiciones Climáticas y la Altura de la excavación fue necesario solicitar la Retrocargador para que esta Realizara la excavación ya que el clima hizo que esta se deslizara a la excavación y dañara el trabajo.

Firma Ing Residente de obra Firma Ing Residente Interventoría

FECHA: 30-Agosto-2024. Clima: Soleado
Lluvia Moderada
Lluvias Intensas.

PERSONAL DE OBRA:
Ing Residente de obra (1).
Maestro de obra (1).
Ayudante (5).

MAQUINARIA Y EQUIPOS:
- Herramienta Menor.
- Mezclador.
- Motobomba Sumergible 2 plg.
- Planta eléctrica.

Actividades Realizadas:
- Las actividades se Centran en la encofrada de Tapa del desarenador.
- amarre de acero para Bordilla.

Firma Ing. Residente obra. Firma Ing Residente Interventoría.

FECHA: 11/Agosto/2024 Clima: Soleado

Actividades Realizadas:

Se llevaron a cabo actividades debida a día Domingo

Firma Ing. Residente de obra

Firma Ing Residente Interventoría

Clima = Lluvioso.

Fecha: 12 / Agosto / 2024

Personal de obra:
- Ing Residente de obra (1)
- oficial de obra (1)
- Ayudante de obra (4)

Maquinaria y Equipo.


—

Actividades Realizadas:
se suspendieron las actividades por motivos de que llovio todo el dia. Y se repondra el siguiente lunes festivo.

firma Ing Residente de obra

firma Ing Residente Interventoría

INDUCONTABLES

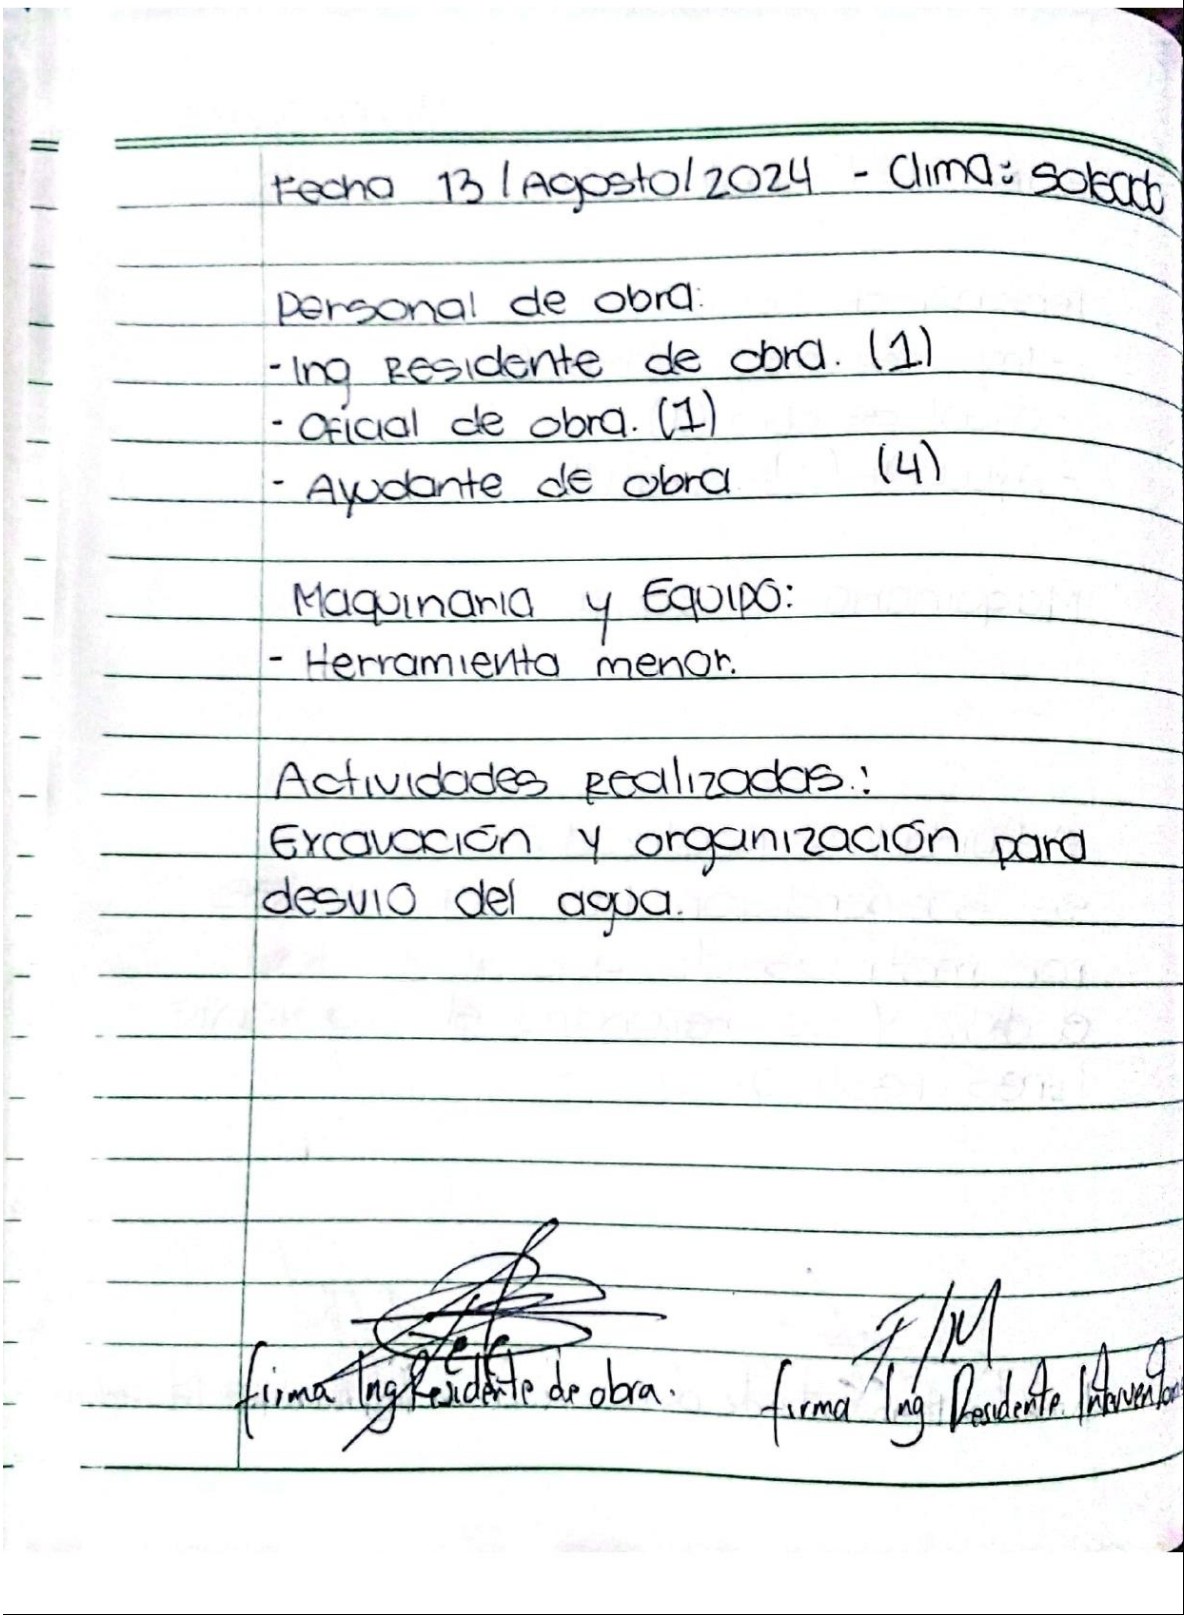

Fecha 13 / Agosto / 2024 - Clima: soleado


Personal de obra:
- Ing Residente de obra. (1)
- Oficial de obra. (1)
- Ayudante de obra (4)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor.

Actividades realizadas.:
Excavación y organización para desvío del agua.

Firma Ing Residente de obra.

Firma Ing Residente Interventoría

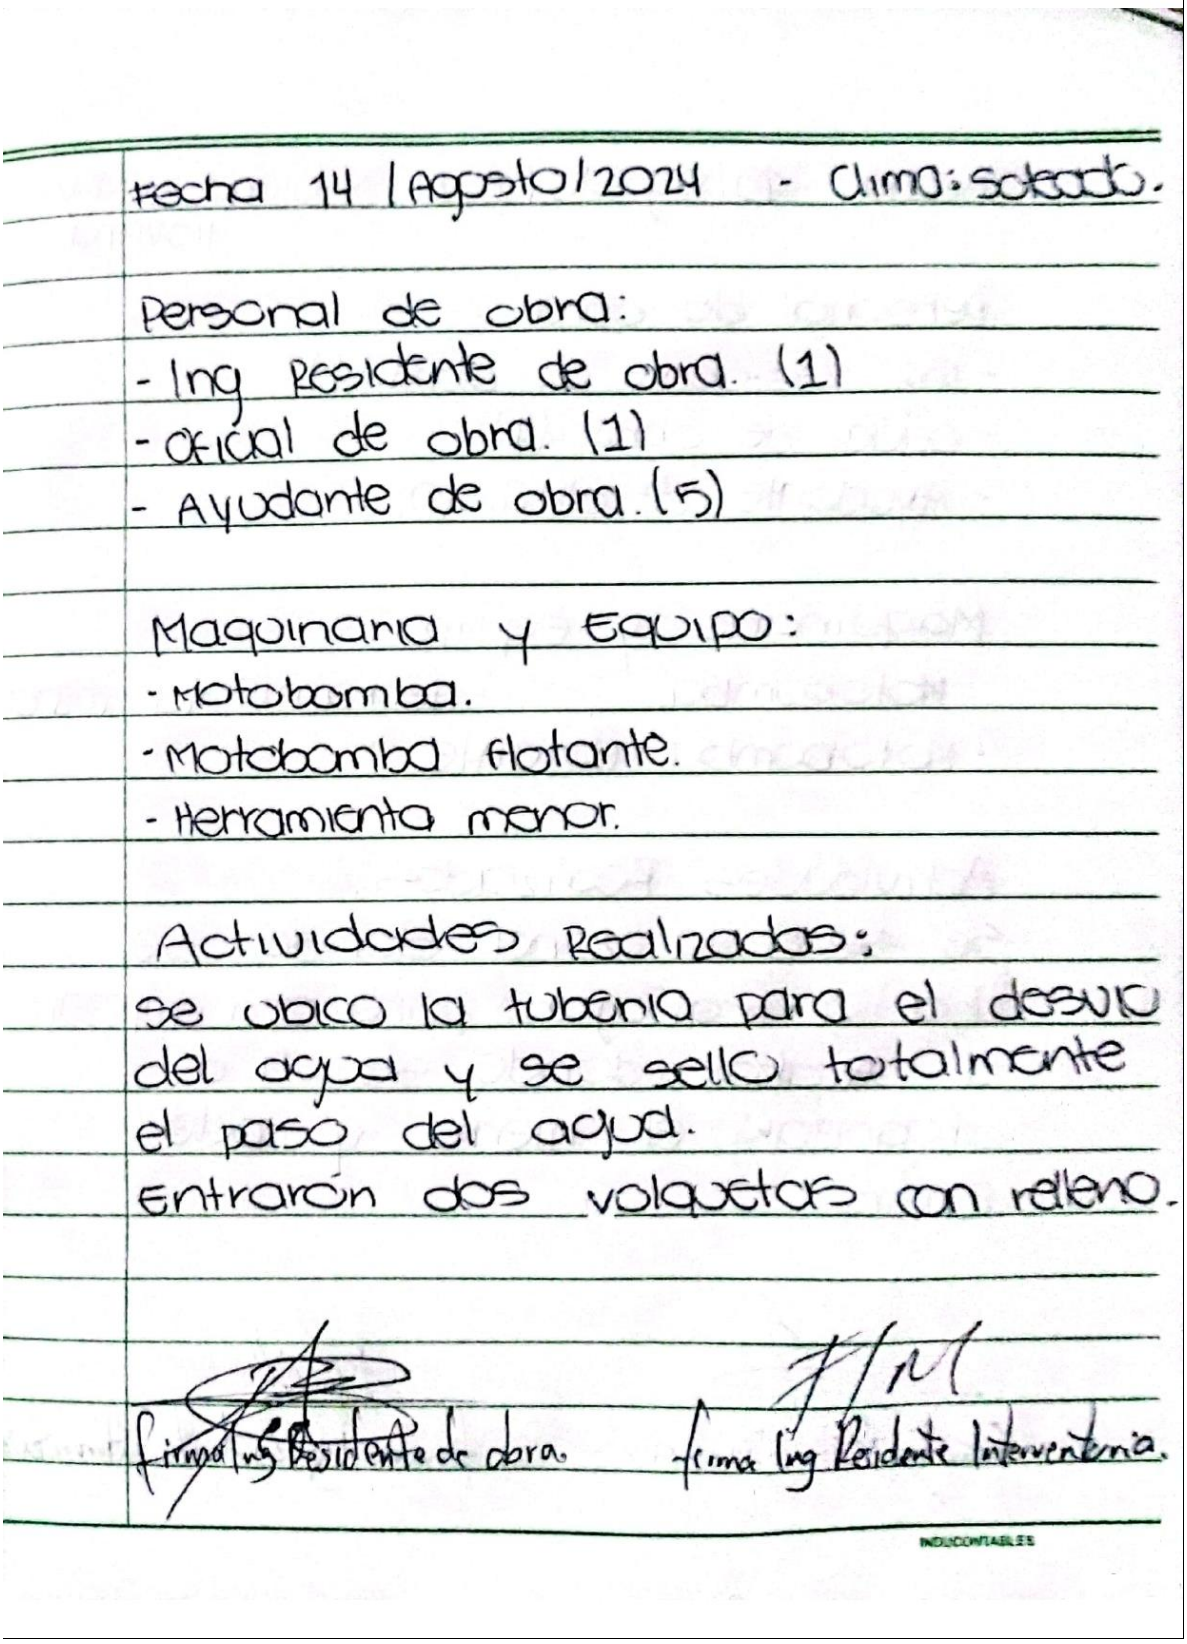

Fecha 14 / Agosto / 2024 - Clima: Soleado.

Personal de obra:
- Ing Residente de obra. (1)
- Oficial de obra. (1)
- Ayudante de obra. (5)

Maquinaria y Equipo:
- Motobomba.
- Motobomba flotante.
- Herramienta menor.

Actividades Realizadas:
se ubico la tubería para el desvío del agua y se sello totalmente el paso del agua.
Entraron dos volquetas con relleno.

Firma Ing Residente de obra.

Firma Ing Residente Interventoría.

INDUSCONTABLES

Fecha 15/Agosto/2024 - Clima: Sol y lluvia.


Personal de obra:
- Ing Residente de obra. (1)
- Oficial de obra. (1)
- Ayudante de obra. (5)

Maquinaria y Equipo:
- Motobomba.
- Herramienta manual
- Motobomba flotante.

Actividades Realizadas:
Se seco la zona donde se iba a trabajar, para asi empezar a excavar donde se va a organizar el hierro y poder fundir.

Firma Ing Residente de obra.

Firma Ing Residente Interventoría

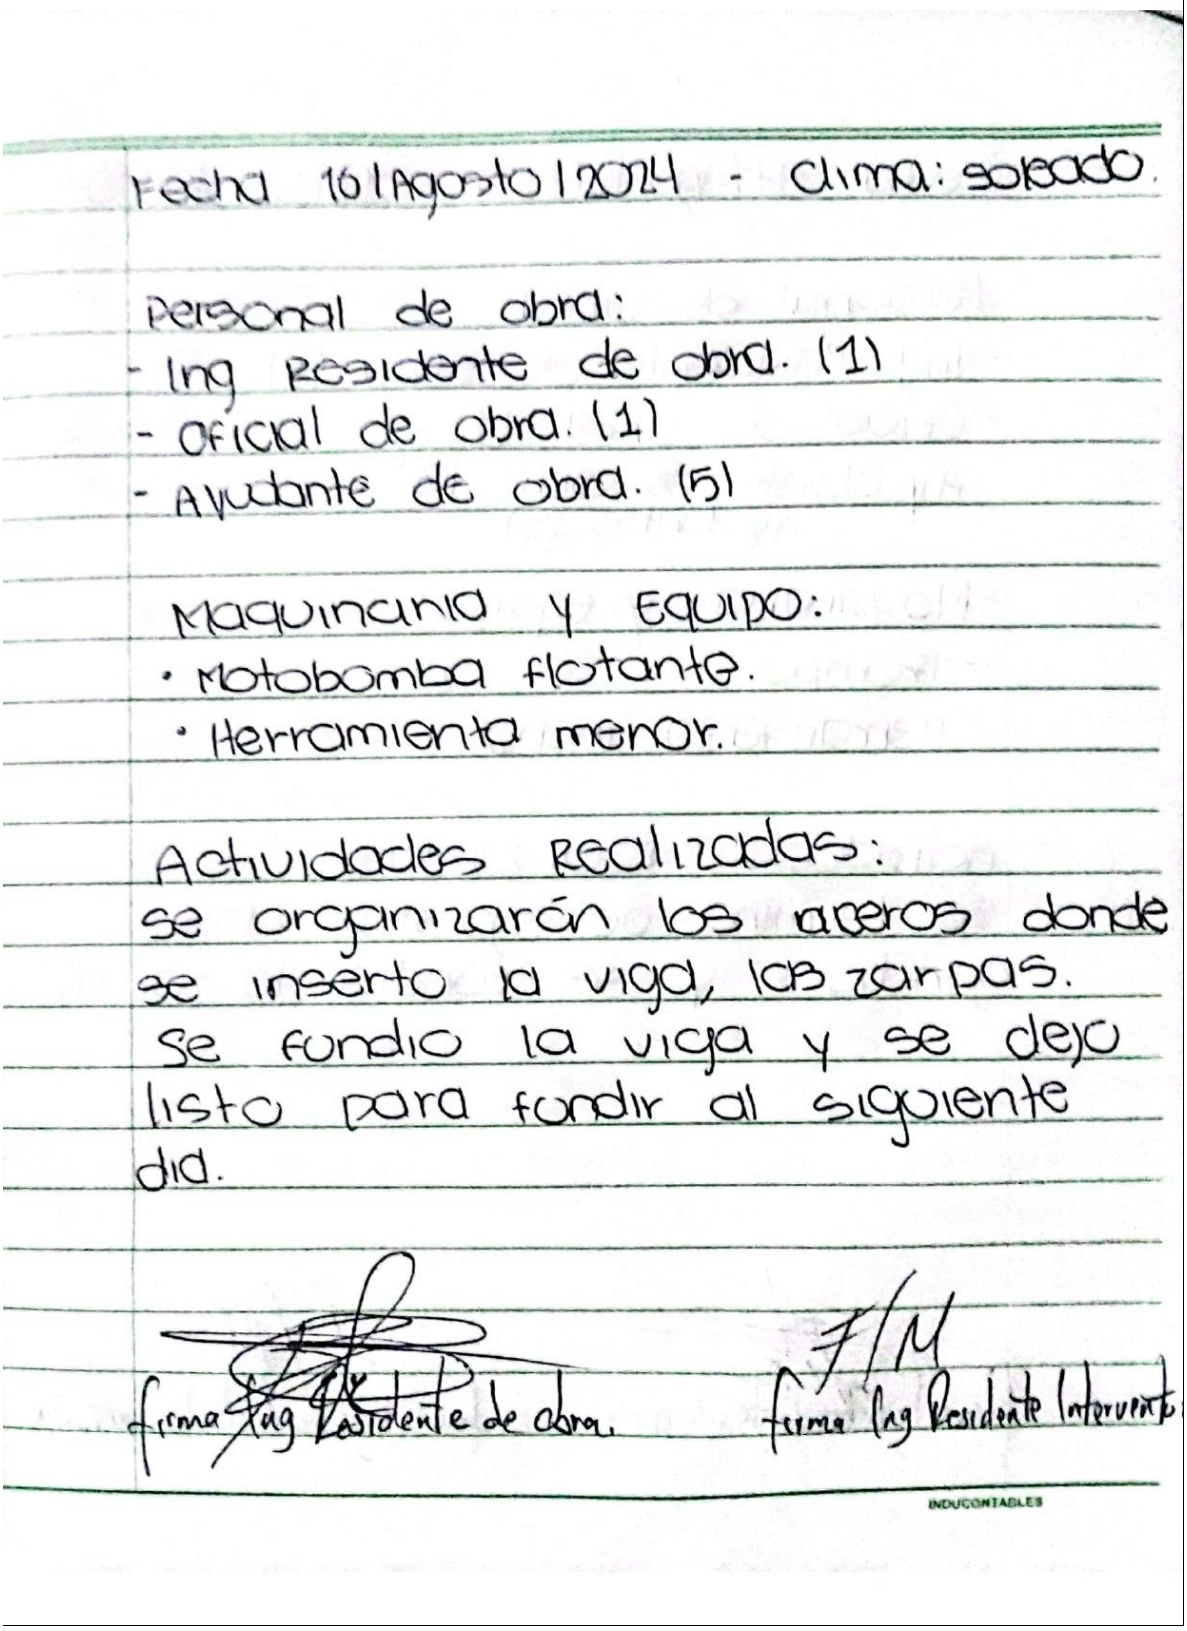

Fecha 16/Agosto/2024 - clima: soleado.

Personal de obra:
- Ing Residente de obra. (1)
- Oficial de obra. (1)
- Ayudante de obra. (5)

Maquinaria y Equipo:
- Motobomba flotante.
- Herramienta menor.

Actividades Realizadas:
se organizarán los aceros donde se inserto la viga, las zarpas.
Se fundio la viga y se dejo listo para fundir al siguiente dia.

firma Ing Residente de obra.

firma Ing Residente Interventoría

INDUCONTABLES

Fecha 17/Agosto/2024 - clima: Soleado.

Personal de obra:
- Ing Residente de obra. (1)
- Oficial de obra. (1)
- Ayudante de obra. (3)
  - Ayudantes: (3)

Maquinaria y Equipo:
- Trompo.
- Herramienta menor.

Actividades Realizadas:
se termino de ajustar los ganchos y se fundio la zarpa.

Firma Ing Residente de obra

Firma Ing. Residente Interventoria

Fecha 18/Agosto/2024 - Clima: soleado


personal de obra:
- Ing Residente de obra.
- Oficial de obra.
- Ayudante de obra.

Maquinaria y Equipo:
-

Actividad de obra:
No se llevo a cabo desarrollo de actividades debido a dia dominical.

Firma Ing Residente de obra

Firma Ing Residente de Interventoría

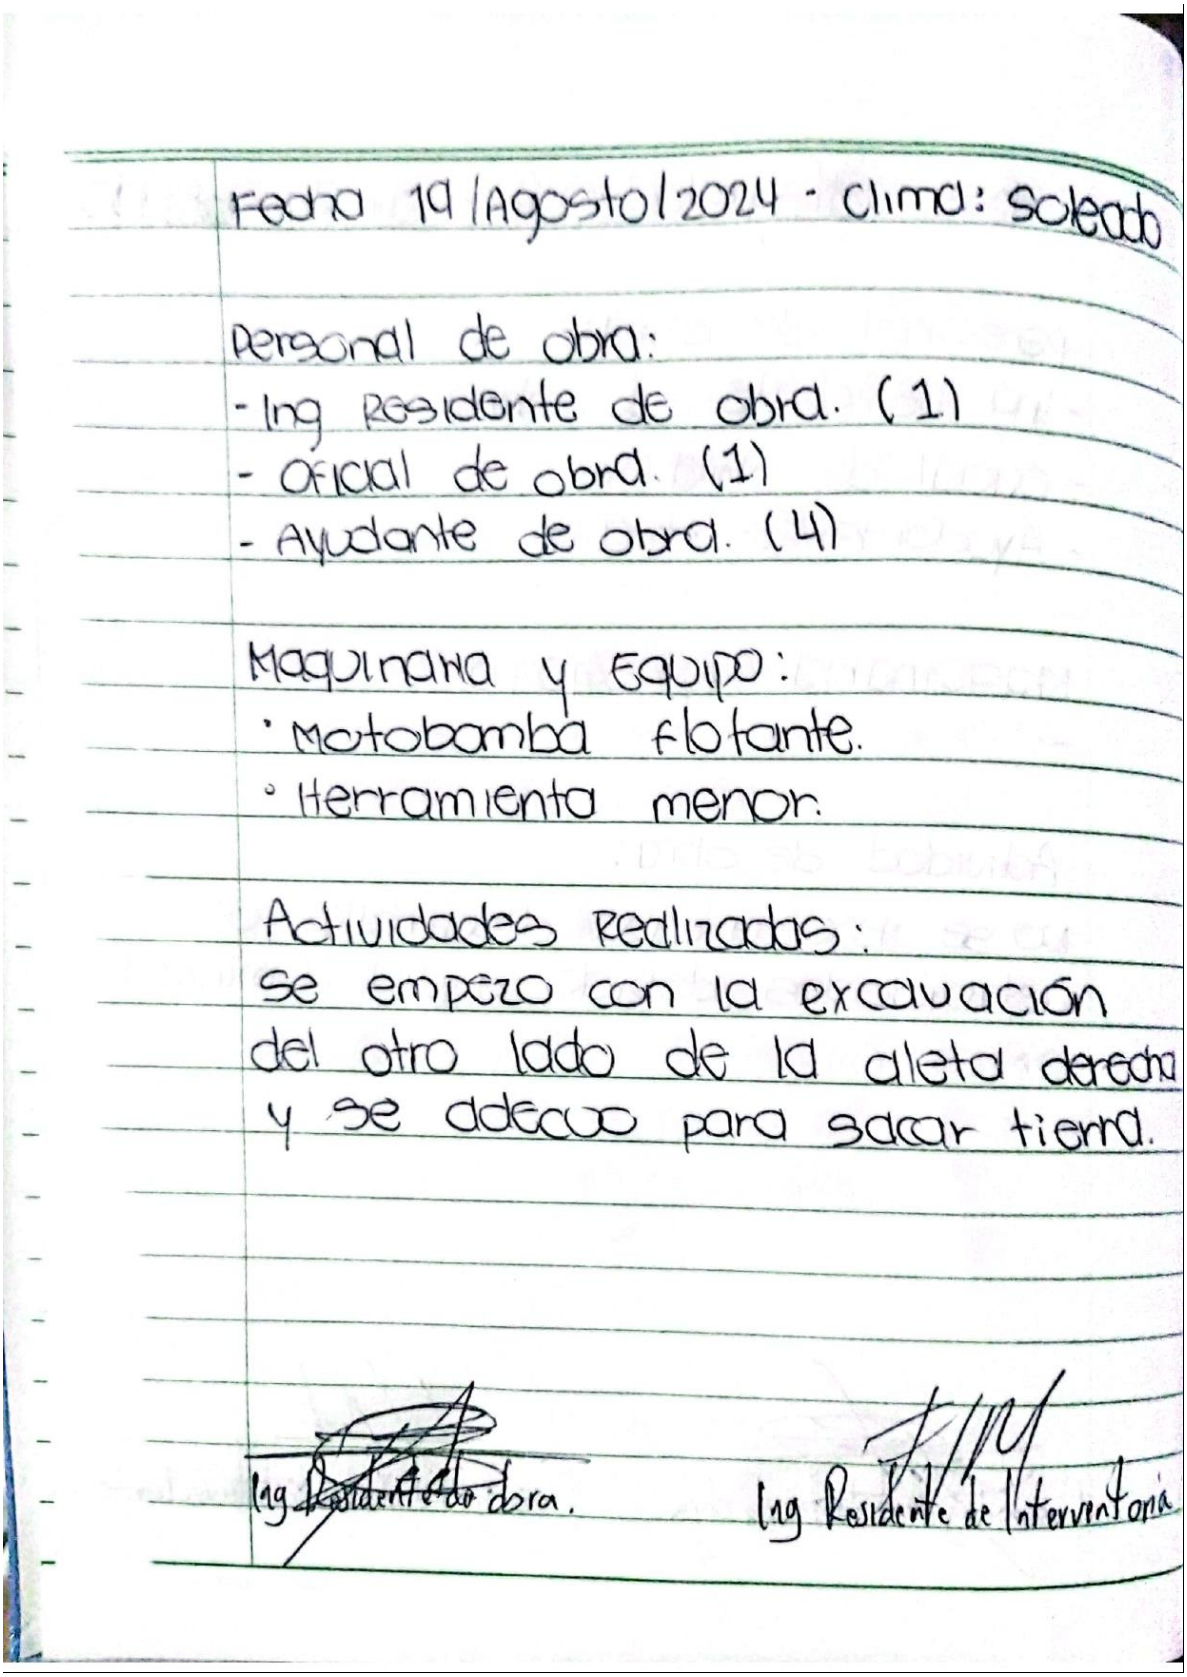

Fecha 19/Agosto/2024 - Clima: Soleado

Personal de obra:
- Ing Residente de obra. (1)
- Oficial de obra. (1)
- Ayudante de obra. (4)

Maquinaria y Equipo:
- Motobomba flotante.
- Herramienta menor.

Actividades Realizadas:
Se empezo con la excavación del otro lado de la aleta derecha y se adecuo para sacar tierra.

Ing Residente de obra.

Ing Residente de Interventoria

Fecha 20 | Agosto | 2024 - clima: soleado

Personal de obra:
- Ing Residente de obra. (1)
- Oficial de obra. (1)
- Ayudante de obra. (5)


Maquinaria y Equipo:
- Motobomba flotante.
- Herramienta menor.

Actividades Realizadas:
se saco la tierra para dejar limpio la zona de los aceros, pero cuando se iba finalizando presento una parte del terreno erosión.

Firma Ing Residente de obra

Firma Ing Residente Interventoría

INDUCONTABLES

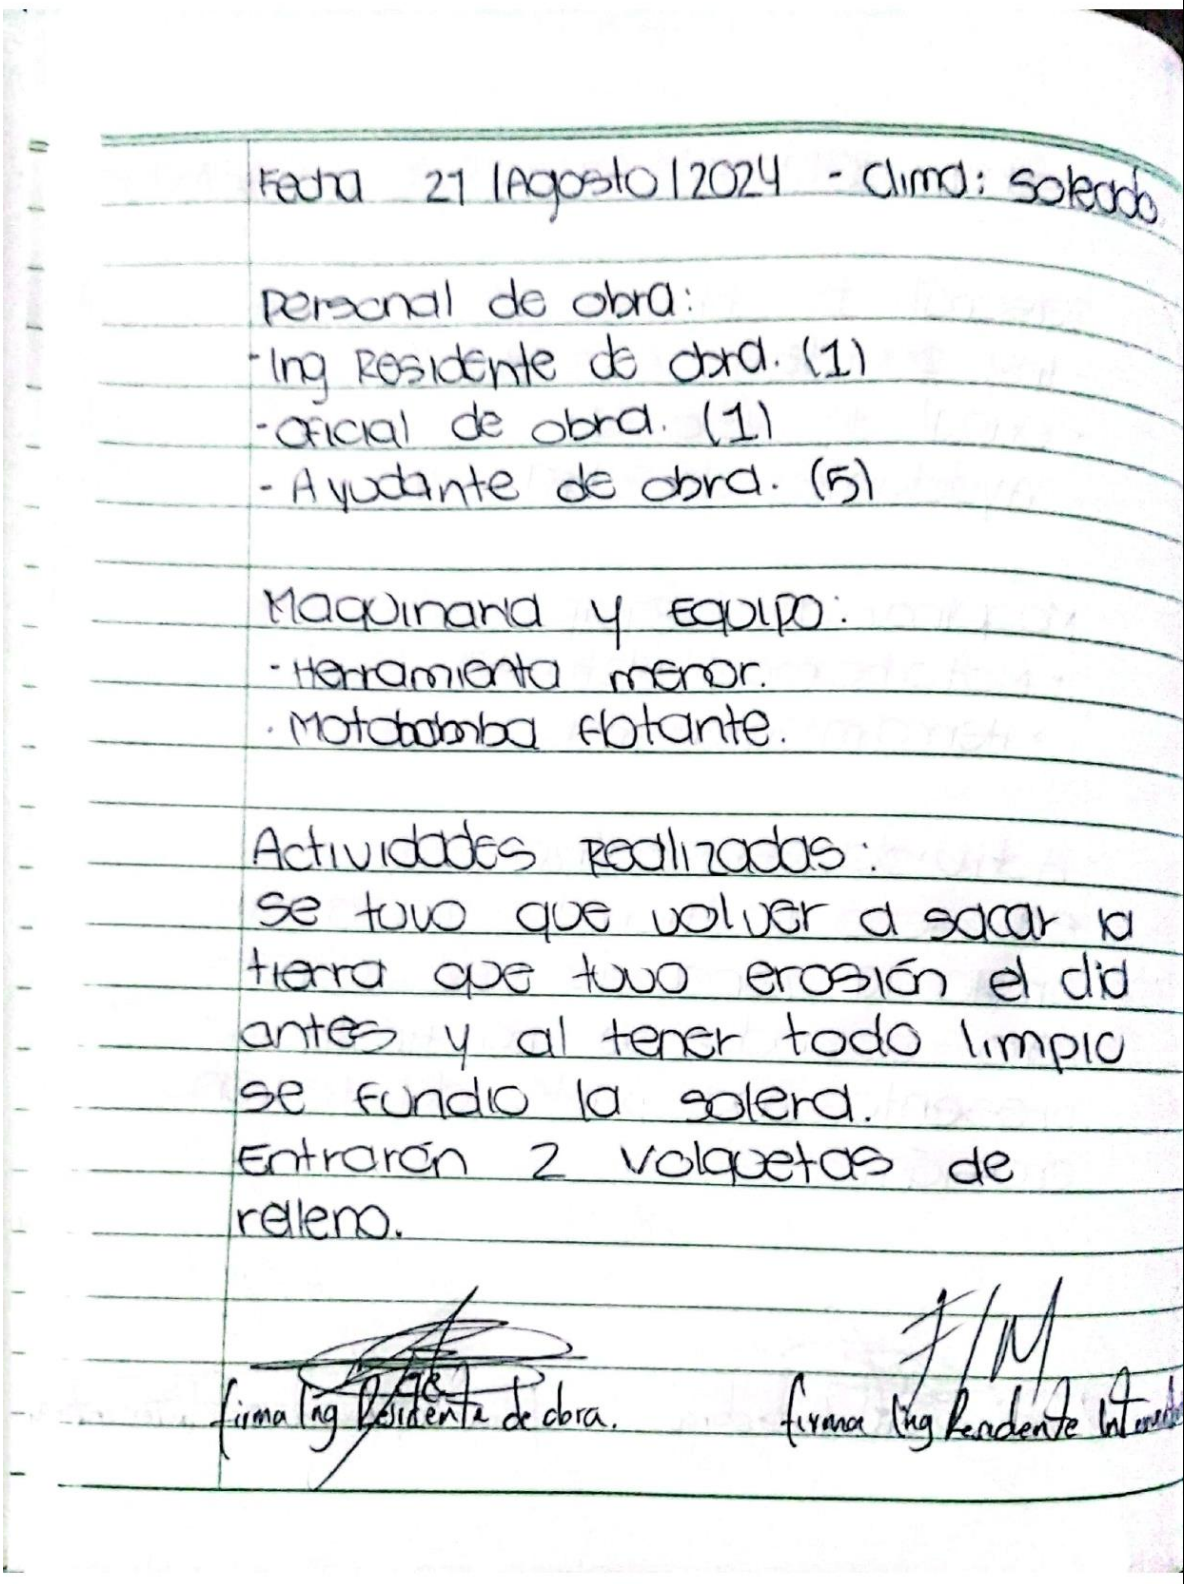

Fecha 21 | Agosto | 2024 - clima: soleado

Personal de obra:
- Ing Residente de obra. (1)
- Oficial de obra. (1)
- Ayudante de obra. (5)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor.
- Motobomba flotante.

Actividades Realizadas:
Se tuvo que volver a sacar la tierra que tuvo erosión el día antes y al tener todo limpio se fundió la solera.
Entraron 2 volquetas de relleno.

firma Ing Residente de obra.

firma Ing Residente Interventoría

clima: soleado.

Fecha 22/Agosto/2024

Personal de obra:
- Ing Residente de obra: (1)
- Oficial de obra: (1)
- Ayudante de obra: (5)

Maquinaria y Equipo:
- Motobomba flotante.
- Trompo.
- Herramienta menor.


Actividades realizadas:
se insertarón los aceros que son: la viga, y los zarpas.
se fundio la viga de amarre.

F/M

firma Ing Residente de obra.

firma Ing Residente Interventoría

INDUCONTABLES

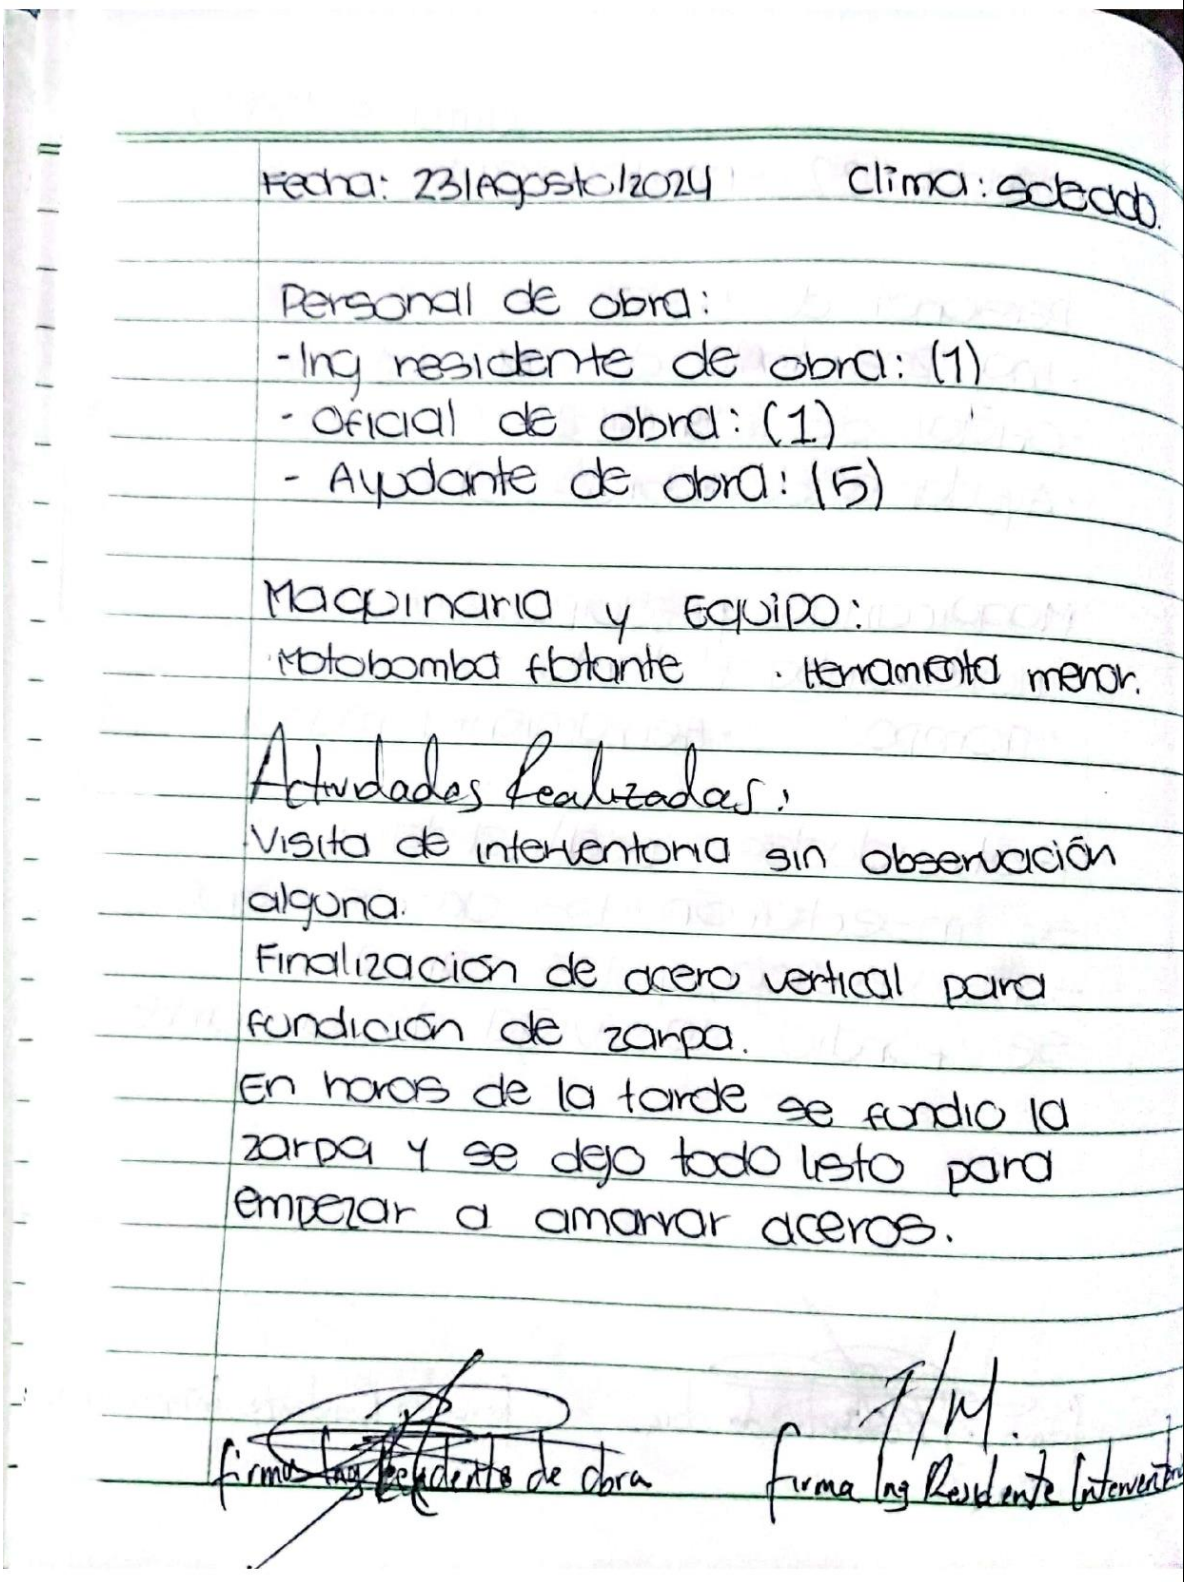

Fecha: 23|Agosto|2024 Clima: Soleado.


Personal de obra:
- Ing residente de obra: (1)
- Oficial de obra: (1)
- Ayudante de obra: (5)

Maquinaria y Equipo:
Motobomba flotante . Herramienta menor.

Actividades Realizadas:
Visita de interventoria sin observación alguna.
Finalización de acero vertical para fundición de zarpa.
En horas de la tarde se fundio la zarpa y se dejo todo listo para empezar a amarrar aceros.

Firma Ing Residente de obra

Firma Ing Residente Interventoría

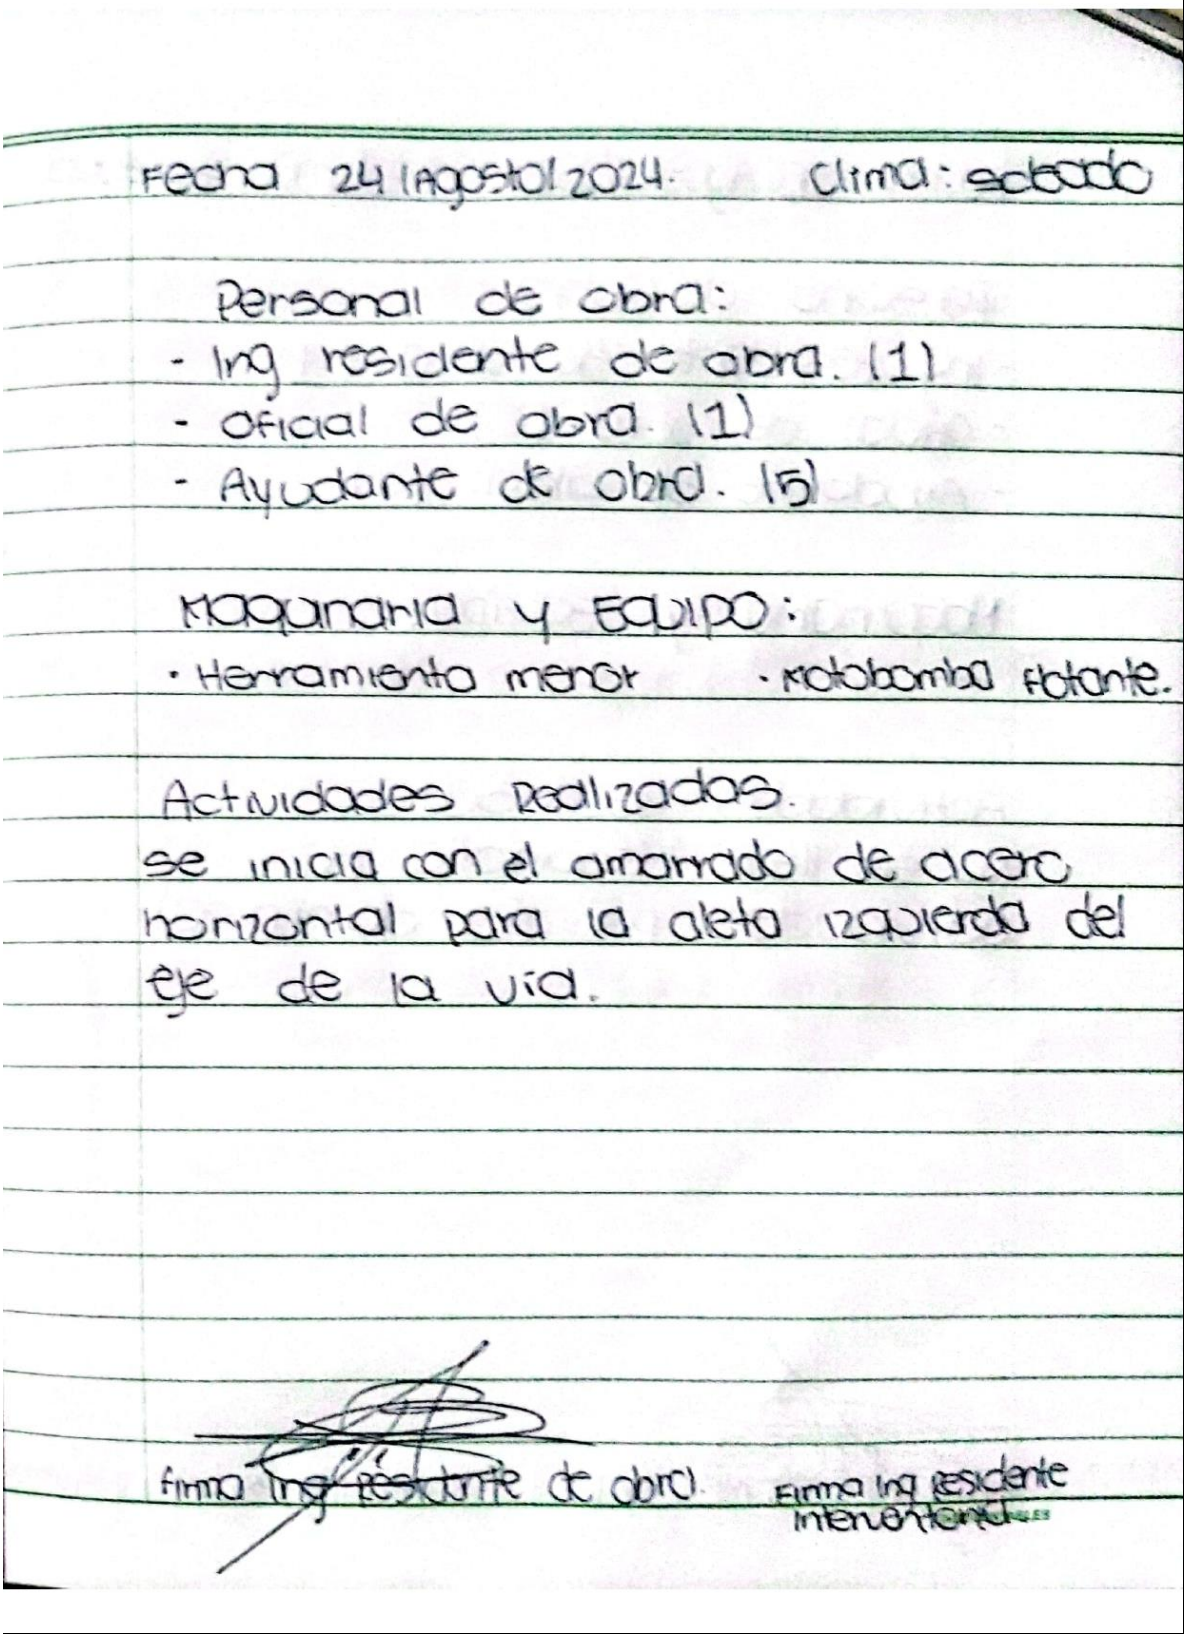


Fecha 24 Agosto 2024. Clima: soleado

Personal de obra:
- Ing residente de obra. (1)
- Oficial de obra. (1)
- Ayudante de obra. (5)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor
- Motobomba flotante.

Actividades Realizadas.
se inicia con el amarrado de acero horizontal para la aleta izquierda del eje de la vía.

Firma Ing residente de obra. Firma Ing residente interventoría

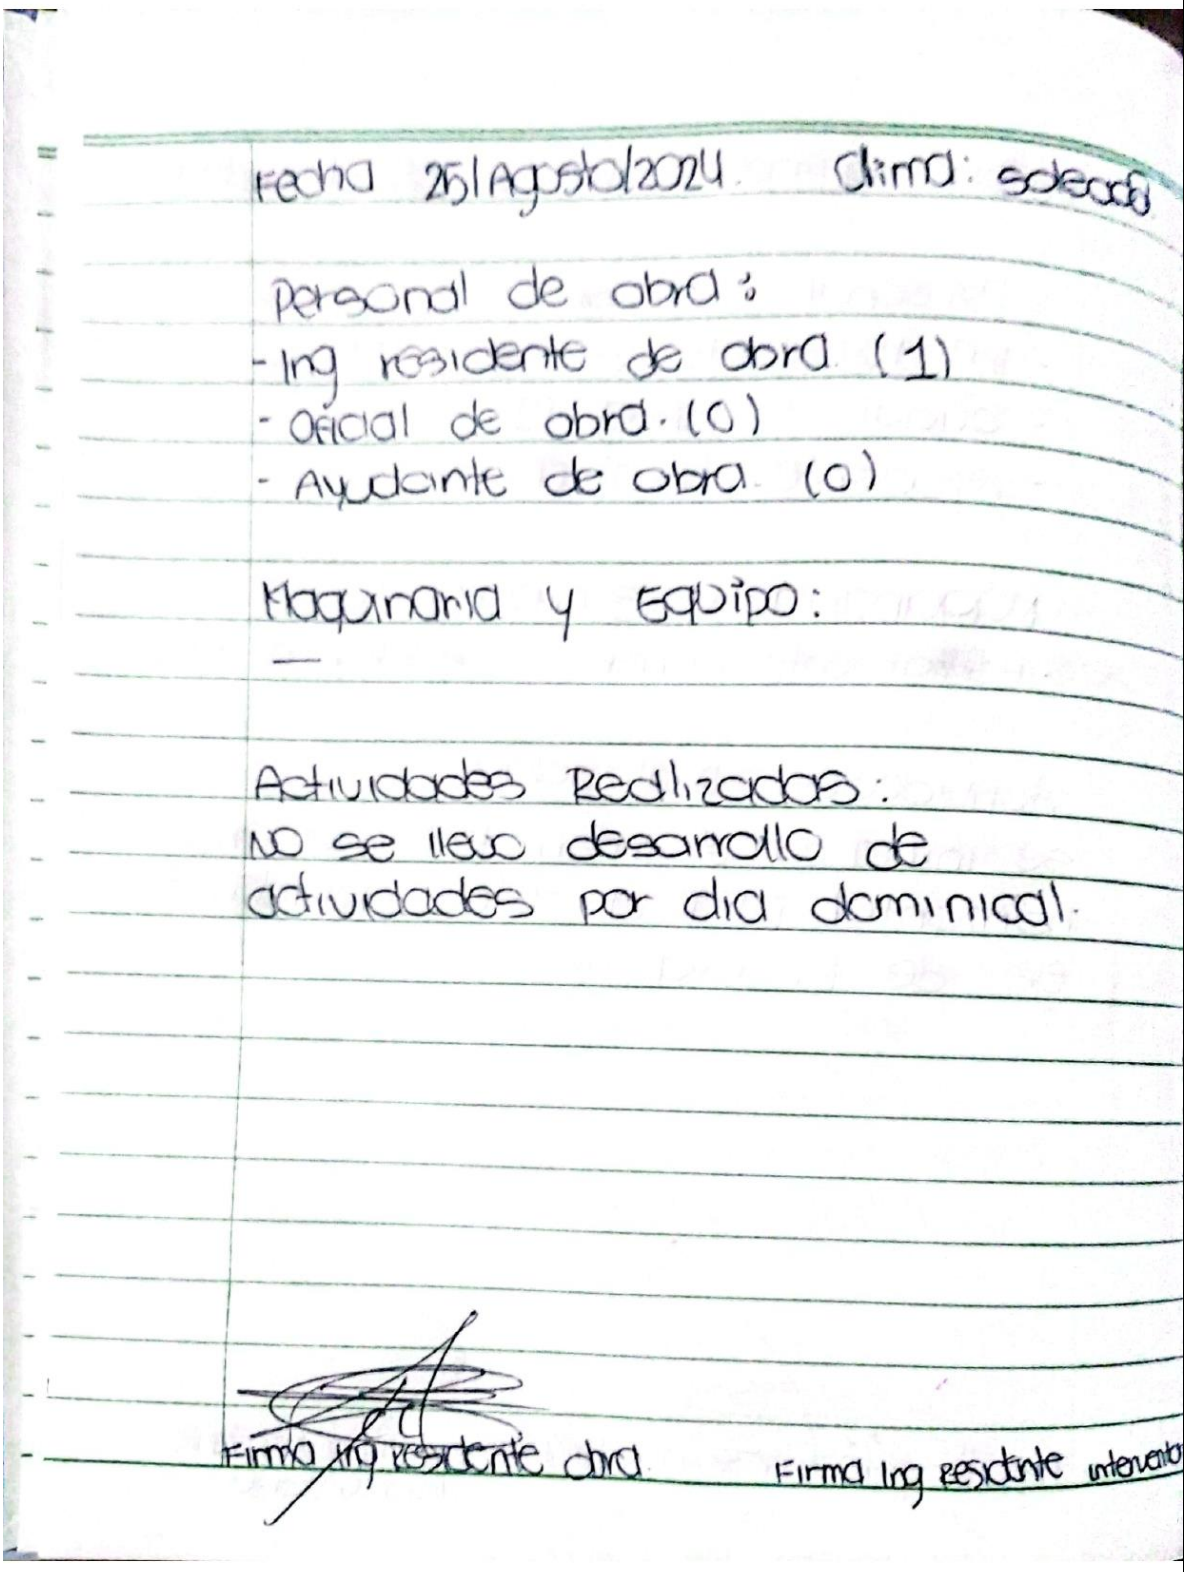

Fecha 25/Agosto/2024 Clima: soleado

Personal de obra:
- Ing residente de obra (1)
- Oficial de obra. (0)
- Ayudante de obra (0)

Maquinaria y Equipo:
—

Actividades Realizadas:
No se lleva desarrollo de actividades por dia dominical.

Firma Ing residente obra

Firma Ing residente interventoria

Fecha 26 | Agosto | 2024. Clima: Soleado.

Personal de obra:
- Ing residente de obra. (1)
- Oficial de obra. (1)
- Ayudante de obra. (3)


Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor · Motobomba flotante.

Actividades Realizadas
se finaliza con el amarrado de acero horizontal y se inicia con el de acero vertical de la aleta.

Firma Ing residente obra

Firma Ing residente interventoría

INDUCONTABLES

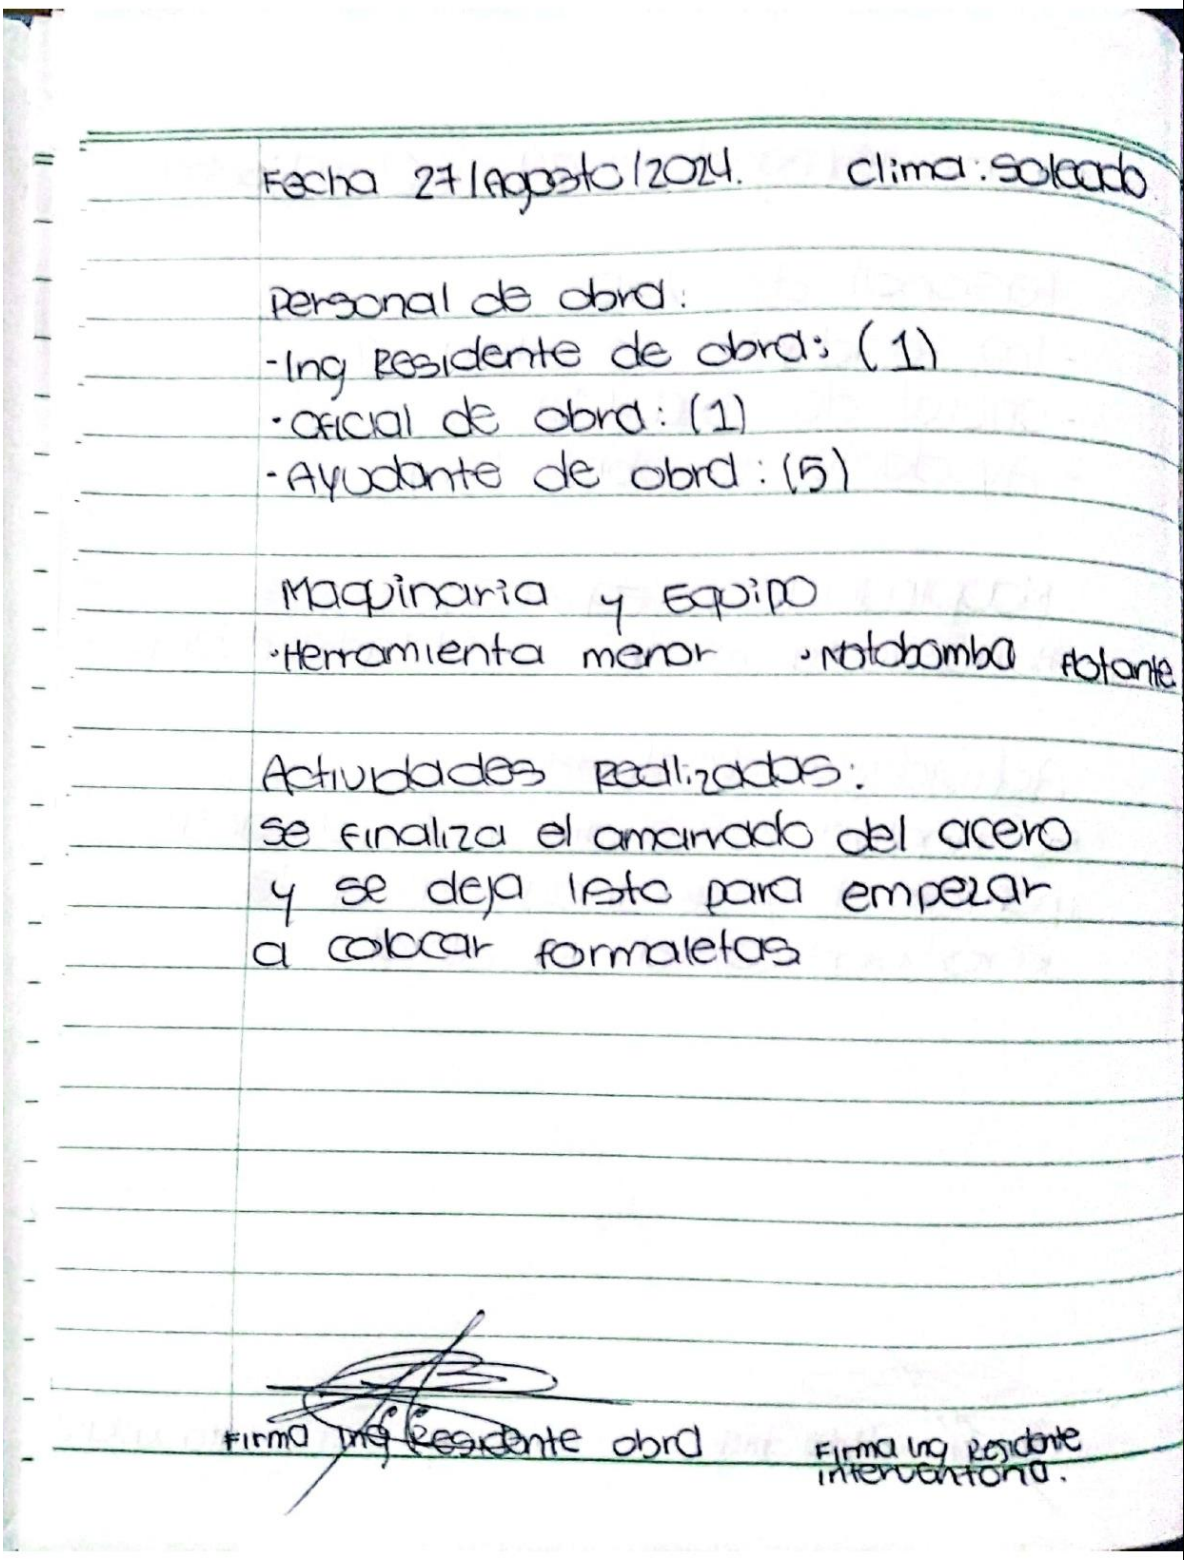

Fecha 27/Agosto/2024. clima: soleado


Personal de obra:
- Ing Residente de obra: (1)
- Oficial de obra: (1)
- Ayudante de obra: (5)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor
- Motobomba Motorite

Actividades Realizadas:
Se finaliza el amarrado del acero y se deja listo para empezar a colocar formaletas

Firma Ing Residente obra

Firma Ing Residente interventoria.

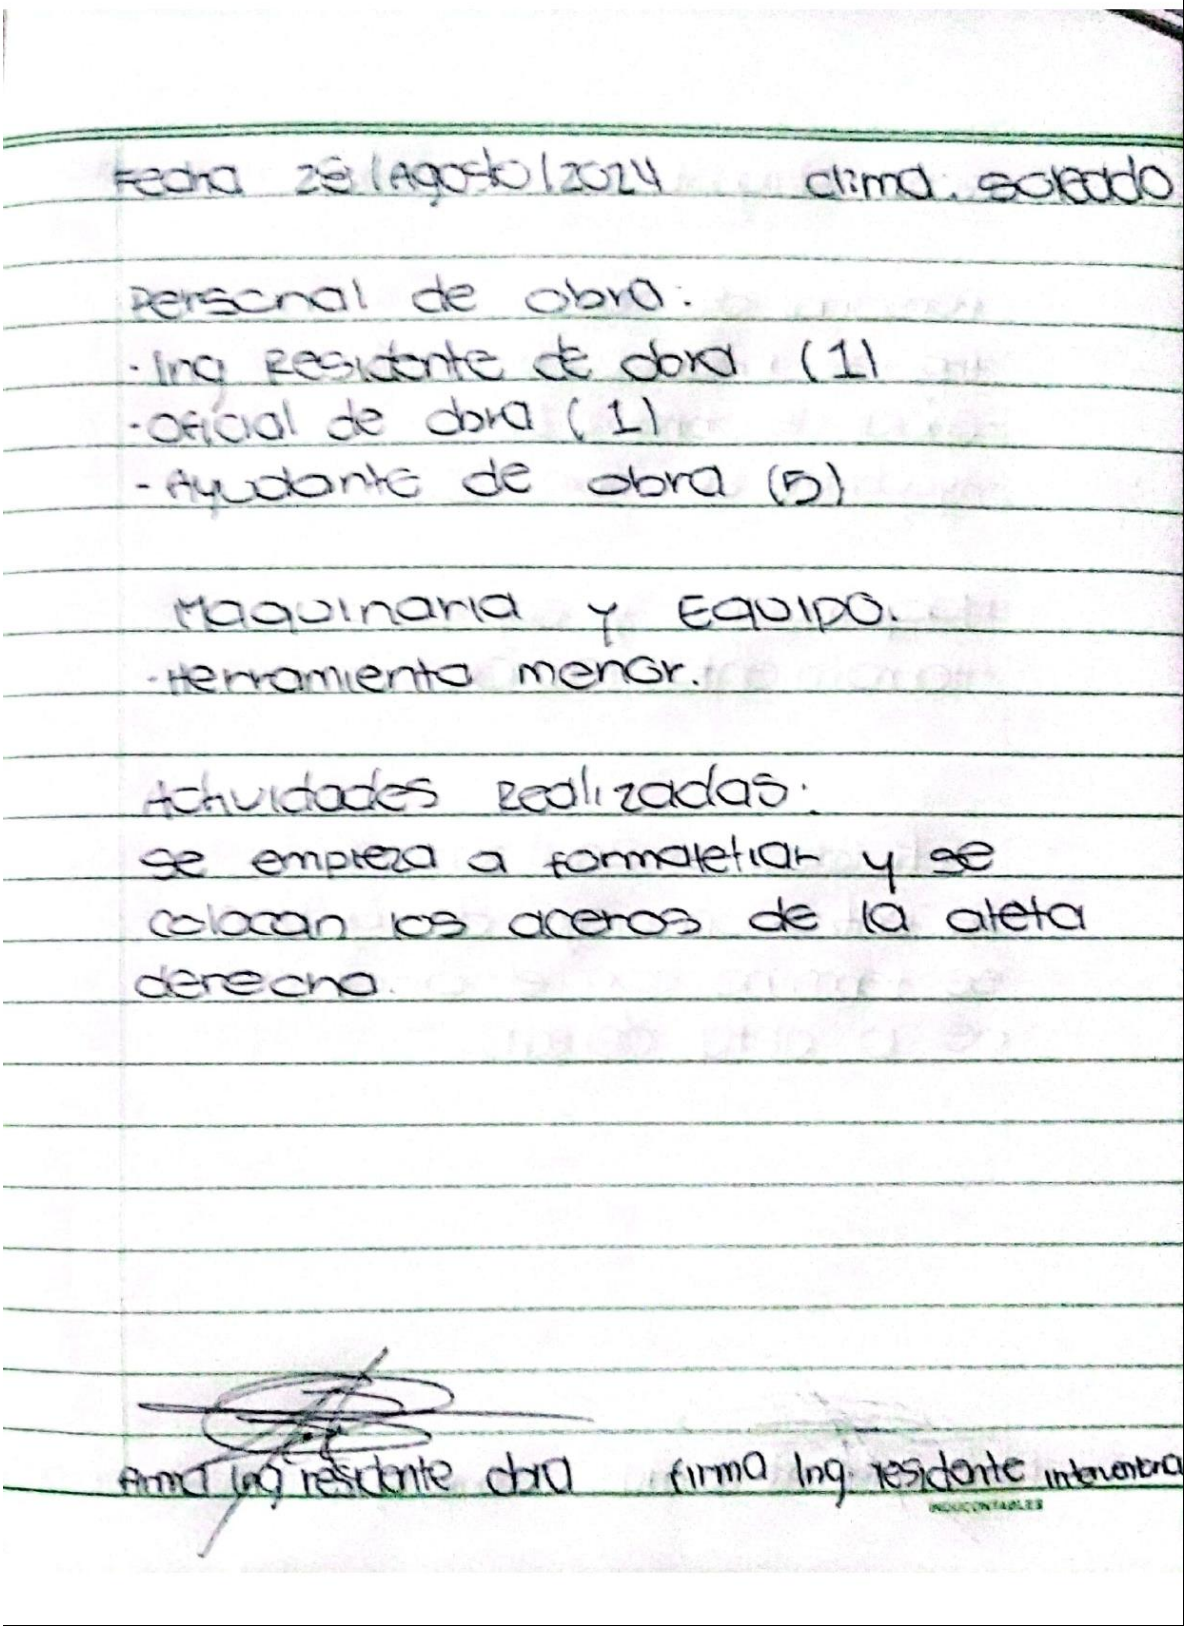


Fecha 28/Agosto/2024 clima: soleado

Personal de obra:
- Ing Residente de obra (1)
- Oficial de obra (1)
- Ayudante de obra (5)

Maquinaria y Equipo.
- Herramienta menor.

Actividades Realizadas:
Se empieza a formaletiar y se colocan los aceros de la aleta derecha.

Firma Ing residente obra Firma Ing. residente interventoría

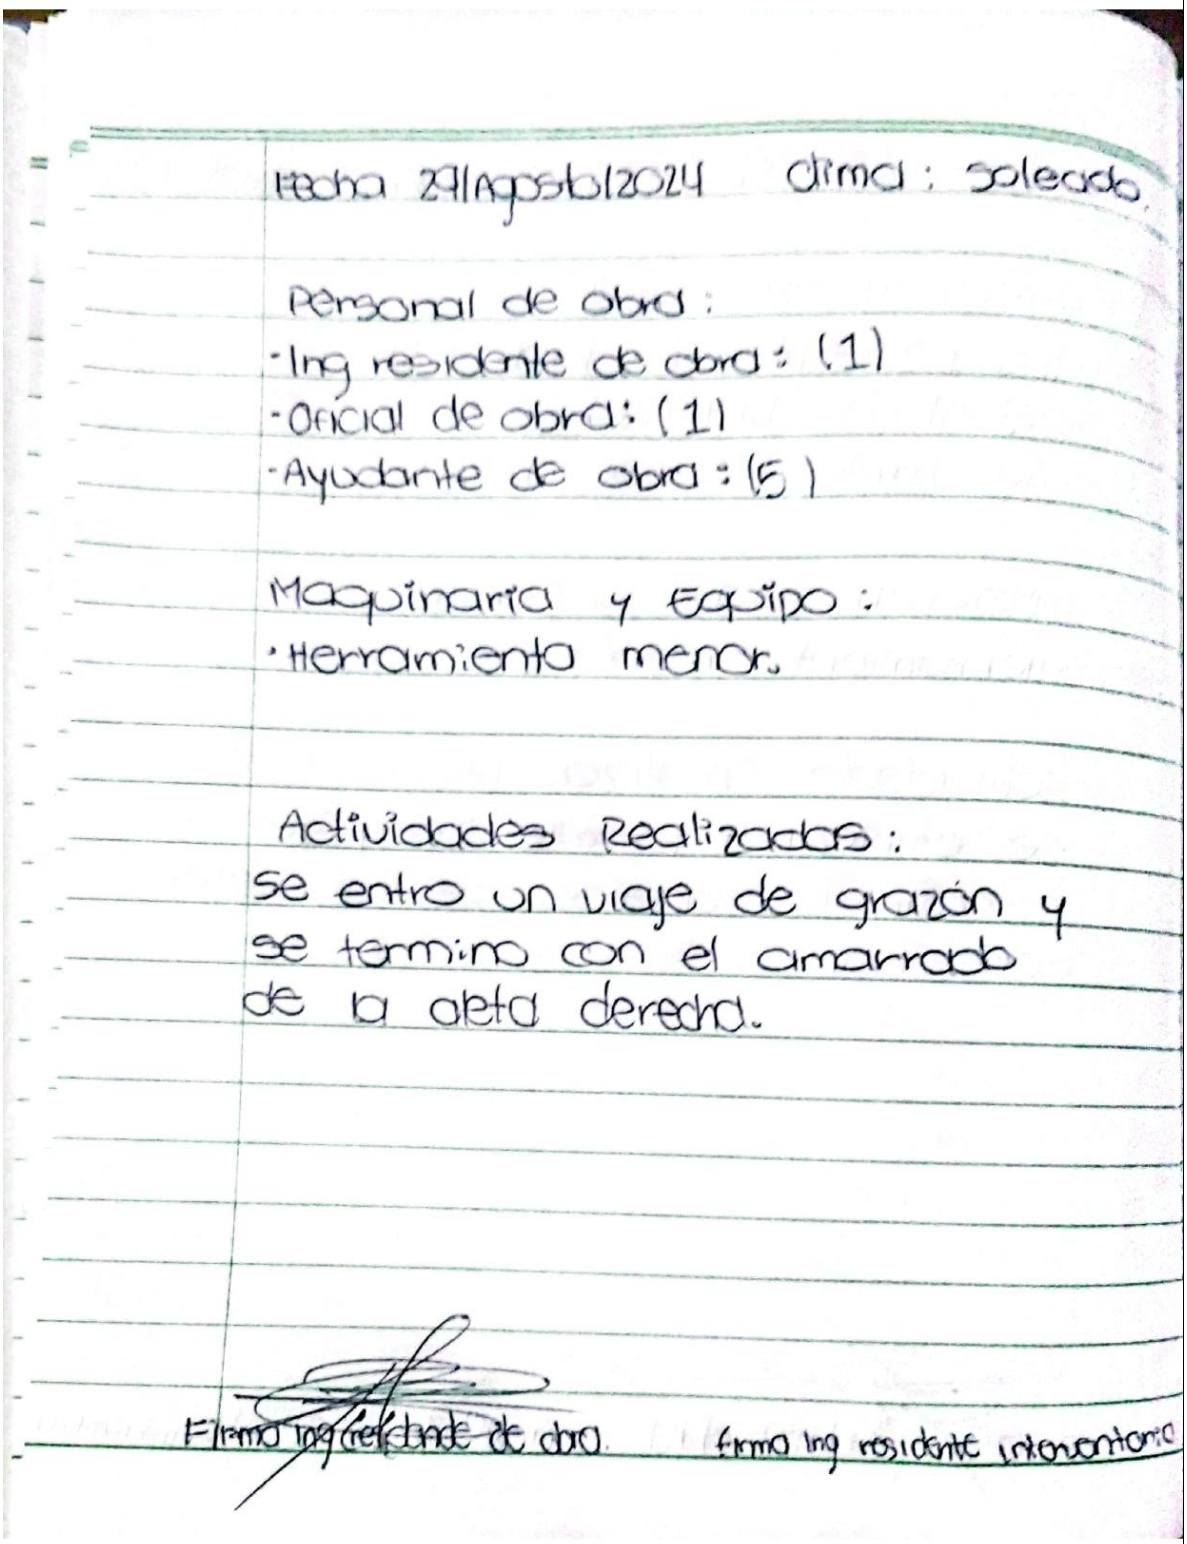


Fecha 29/Agosto/2024 clima: soleado.

Personal de obra:
- Ing residente de obra: (1)
- Oficial de obra: (1)
- Ayudante de obra: (5)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor.

Actividades Realizadas:
Se entro un viaje de grazón y se termino con el amarrado de la aleta derecha.

Firma Ing residente de obra. firma Ing residente interventoria

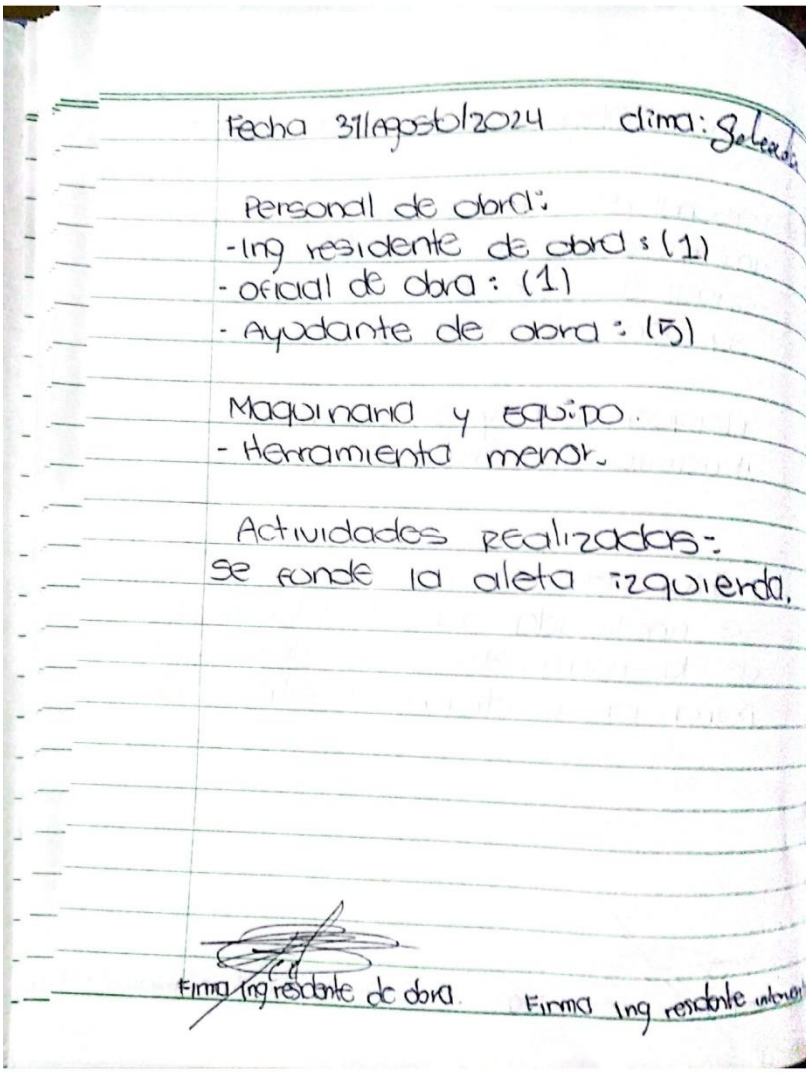

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S
Matricula No. 2520237430CND
