LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4643-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

Contrato de Interventoria No. 4297-2023 **Interventoria:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** abr/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	13
1	**INTRODUCCIÓN**		14
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		14
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		20
3.1	Información general del contrato		20
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		21
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		21
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	26
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	26
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	26
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	26
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	26
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	26
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	29
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		29
	• Seguimiento a la Inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	29
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	29
	• Seguimiento Programa de Obra		29
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	29
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	29
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	29
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	29
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		29
5.1	Información general del contrato		29
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		30
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		30
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	30
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	32
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	33
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	33
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		33
	• Seguimiento a la Inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	33
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	33
7	**Conclusiones y recomendaciones**		33
8	**Anexos**		33
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		33
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		33
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		33

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4053-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

Contrato de Interventoria No. 4297-2023 **Interventoria:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** abr-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	35
1	**INTRODUCCIÓN**		36
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		36
2.1	Localización		36
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		37
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		37
2.4	Características técnicas del proyecto		38
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		41
3.1	Información general del contrato		41
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		42
3.3	Seguimiento ítems no previstos		42
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoria		42
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		42
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	42
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	47
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		50
5.1	Información general del contrato		50
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el interventor		50
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoria		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		51
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	54
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	54
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		54
8	**Anexos**		54
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		54
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitacora del mes correspondiente		N/A

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3809-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA

Contrato de Interventoria No. 4297-2023 **Interventoria:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** abr/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	56
1	**INTRODUCCIÓN**		57
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		57
2.1	Localización		57
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		58
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		58
2.4	Características técnicas del proyecto		59
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		62
3.1	Información general del contrato		62
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		63
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		63
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		63
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		63
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	63
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	68
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		71
5.1	Información general del contrato		71
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		72
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		72
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	75
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	75
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		75
8	**Anexos**		75
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		75
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3980-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoria No. 4297-2023 **Interventoria:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** abr/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	77
1	**INTRODUCCIÓN**		78
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		78
2.1	Localización		78
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		79
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		79
2.4	Características técnicas del proyecto		80
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		80
3.1	Información general del contrato		83
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		83
3.3	Seguimiento ítems no previstos		84
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		84
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		84
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	84
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	89
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		92
5.1	Información general del contrato		92
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		92
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		93
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	93
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	95
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	96
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	99
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		96
8	**Anexos**		96
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		96
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		96
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PROYECTO SANABRIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nº 4297-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONVENIO N.º 4643-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JAPON

CONVENIO N.º 4053-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

CONVENIO N.º 3809-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ATARRAYA

CONVENIO N.º 3980-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA

INFORME MENSUAL N.º 06

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Contenido

I. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 12

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1 12

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2 13

1. INTRODUCCION 14

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 14

2.1. LOCALIZACION 14

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 15

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 15

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 16

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 18

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 18

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 19

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 19

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL 19

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 19

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 19

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 19

4.1. INFORME SEMANAL 19

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 25

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 25

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO 25

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 25

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 26

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 26

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 28

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO 28

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL 28

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 29

4.8.4. ACTAS DE REUNION 29

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 29

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 29

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 29

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 29

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 29

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 29

Relacion de equipos 29

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 32
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 32
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 34
6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 34
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 34
8. ANEXOS 34
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 34
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 34
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 35
II. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 37
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1 37
1. INTRODUCCION 39
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 39
2.1. LOCALIZACION 39
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 40
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 40
2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 40
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 43
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 43
3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 44
3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 44
3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL 44
3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 44
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 44
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 44
4.1. INFORME SEMANAL 44
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 50
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 50
4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO 51
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 51
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 51
4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 51
4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 54
4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO 54
4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL 54
4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 54

4.8.4. ACTAS DE REUNION 54
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 54
5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 54
5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 54
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 54
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 55
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 55
6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 56
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 57
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 57
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 59
6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 59
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 59
8. ANEXOS 59
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 59
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 59
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 60
III. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 62
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1 62
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2 63
1. INTRODUCCION 64
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 64
2.1. LOCALIZACION 64
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 65
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 65
2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 65
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 68
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 68
3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 69
3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 69
3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL 69
3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 69
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 69
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 69
4.1. INFORME SEMANAL 69
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 75
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA ..... ¡Error! Marcador no definido.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO 75
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 75
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 75
4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 75
4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 78
4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO 78
4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL 78
4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 78
4.8.4. ACTAS DE REUNION 78
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 78
5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 78
5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 78
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 79
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 79
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 79
6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 79
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 81
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 82
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 83
6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 83
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 83
8. ANEXOS 83
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 83
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 83
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 84
IV. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 86
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1 86
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2 87
1. INTRODUCCION 88
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 88
2.1. LOCALIZACION 88
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 89
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 89
2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 89
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 92
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 92
3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 93
3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 93

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL 93
3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 93
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 93
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 93
4.1. INFORME SEMANAL 93
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 99
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA ..... ¡Error! Marcador no definido.
4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO 99
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 99
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 99
4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 99
4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 102
4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO 102
4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL 102
4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 102
4.8.4. ACTAS DE REUNION 102
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 102
5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 102
5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 102
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 103
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 103
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 103
6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 103
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 105
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 106
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 107
6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 107
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 107
8. ANEXOS 107
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 107
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 107
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 108

CONVENIO N.º 4643-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JAPON

I. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4643-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

Contrato de Interventoria No. 4297-2023 **Interventoria:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** abr/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	13
1	**INTRODUCCION**		14
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		14
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		20
3.1	Información general del contrato		20
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20
3.3	Seguimiento Items no previstos		21
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		21
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	26
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	26
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	26
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	26
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	26
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	26
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	29
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		29
	• Seguimiento a la Inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	29
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	29
	• Seguimiento Programa de Obra		29
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	29
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	29
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	29
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	29
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		29
5.1	Información general del contrato		29
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		30
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		30
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	30
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	32
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	33
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	33
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		33
	• Seguimiento a la Inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	33
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	33
7	**Conclusiones y recomendaciones**		33
8	**Anexos**		33
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		33
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		33
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		33

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ABRIL

CONVENIO No.: 4643-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL : $ 194.052.521,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 193.052.521,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas	UND	6
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas	UND	6	6
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 145.302.830,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.359.085,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.390.606,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 194.052.521,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 41.727.801,45	$ 71.756.758,07
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 30.787.105,65	$ 37.084.128,65
VALOR EJECUTADO	$ 72.514.907,11	$ 108.840.886,73

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 145.302.830,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 71.756.758,07
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 49,38%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sector batea, Instalacion y figurado de aceros en costado izquierdo



Sector batea, Instalacion de formaleteria para muro



Sector batea, Instalacion de tuberias 36"



Sector batea, Instalacion de acero de refuerzo



Sector batea, Instalacion de formaleteria para bordes



Sector batea, verificacion de medidas y espesores de los elementos

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-1015-2023, se celebra el convenio 4643-2023 que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 06 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda El Japón se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.537000 - Longitud -74.683556
Punto Final: Latitud 5.534694 - Longitud -74.684819

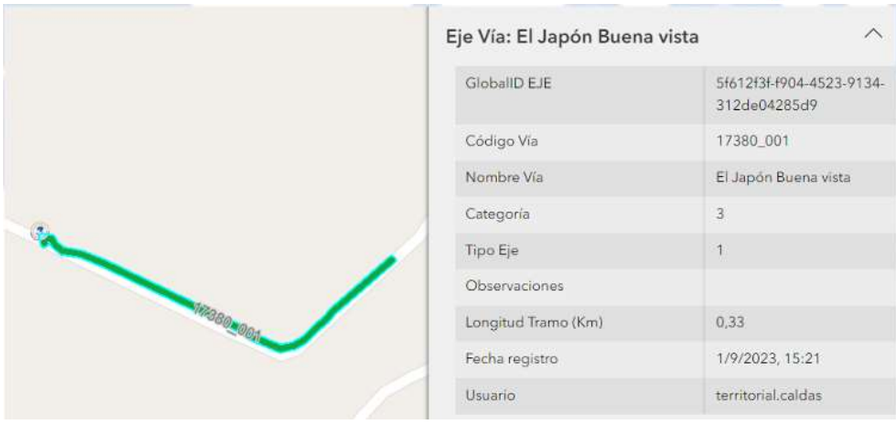


Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en la vereda El Japón
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS JAC EL JAPON

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Norcasia y La Dorada en sus veredas El Japón, Buenavista, La Atarraya, el Tigre, Brisas y La Agustina. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,** el cual comprende un tramo de 330 metros lineales a intervenir, tiene existente una batea, la cual ha perdido su funcionalidad con el paso del tiempo, puesto que en las épocas de invierno que afronta el municipio, el cauce del río sobrepasa el nivel de la via en más de 1.2m de altura lo cual impide el paso vehicular y deja incomunicadas las veredas en la zona de influencia.

El tramo a intervenir en la vereda El Japón se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.537000 - Longitud -74.683556
Punto Final: Latitud 5.534694 - Longitud -74.684819



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en La Vereda El Japón

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en la vereda El Japón, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 4643-2023 que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural de la vereda El Japón a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**

Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 4. ALCANTARILLAS, del cual se copia textualmente:

"La alcantarilla circular, como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta-aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

La profundidad de instalación de la tubería deberá satisfacer los requerimientos geotécnicos de la cimentación y estructurales del tipo de tubería seleccionada durante y después de la construcción. En el numeral 4.4 del Manual de Drenaje para Carreteras se desarrolla todos los aspectos a ser considerados para su diseño. Desde el punto de vista seguridad de ser posible por las condiciones locales de la topografía del terreno, los muros cabezales en el caso de la configuración aleta - aleta y/ o poceta - aleta, se podrían localizar lo más lejanos del borde externo de la calzada, siempre y cuando no se excedan los límites del derecho de vía ni que esta prolongación afecte el presupuesto de la obra. La longitud del ancho sugerido para la poceta es de 1.80 m, sin embargo, si las condiciones constructivas y económicas no lo permite, se podrá disminuir hasta 1.50 m, el cual es el mínimo sugerido por Manual de Drenaje para carreteras (2009).

Durante la etapa de construcción de las alcantarillas se deben considerar en un todo las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS, 2013 y de manera particular los artículos 600-13, 610-13, 630-13, 640-13 y los relacionados con el tipo de tubería artículos 661-13 y 663-13. Considerando los anteriores elementos como los más esenciales para el drenaje de una vía terciaria, en los siguientes planos se presenta los esquemas típicos para una alcantarilla tipo poceta-aleta, tubería en concreto reforzado, tubería plástica, cuneta y filtro.


Las dimensiones que se señalan toman en consideración los valores mínimos que en materia de diseño geométrico e hidráulico han sido establecidos en los diferentes Manuales del Instituto Nacional de Vías, por tal razón corresponden a modelos que pueden ser modificados dependiendo de las particularidades de cada proyecto y de las condiciones locales asociadas a la topografía, estabilidad del suelo, volúmenes de


escorrentía a evacuar, tipo de encole o de descole, criterios de seguridad vial, cimentación del tipo de tubería seleccionada, etc.


Este capítulo presenta los esquemas típicos de las obras de drenaje tipo alcantarilla circular sencilla, obra que como mínimo se deben considerar durante el diseño de la corona de la calzada de una carretera de la red terciaria a cargo del Instituto Nacional de Vías de tal manera que con adecuado manejo de la escorrentía superficial y el flujo subsuperficial se asegure la vida útil y el estado de conservación de la misma.


Si la pendiente en el descole de la alcantarilla es mayor al 6%, se recomienda el diseño de un descole en aliviadero o disipador de energía, tal como está descrito en la sección 4.1.4.2 del Manual de Drenaje para carreteras del Invías (2009).”


Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**

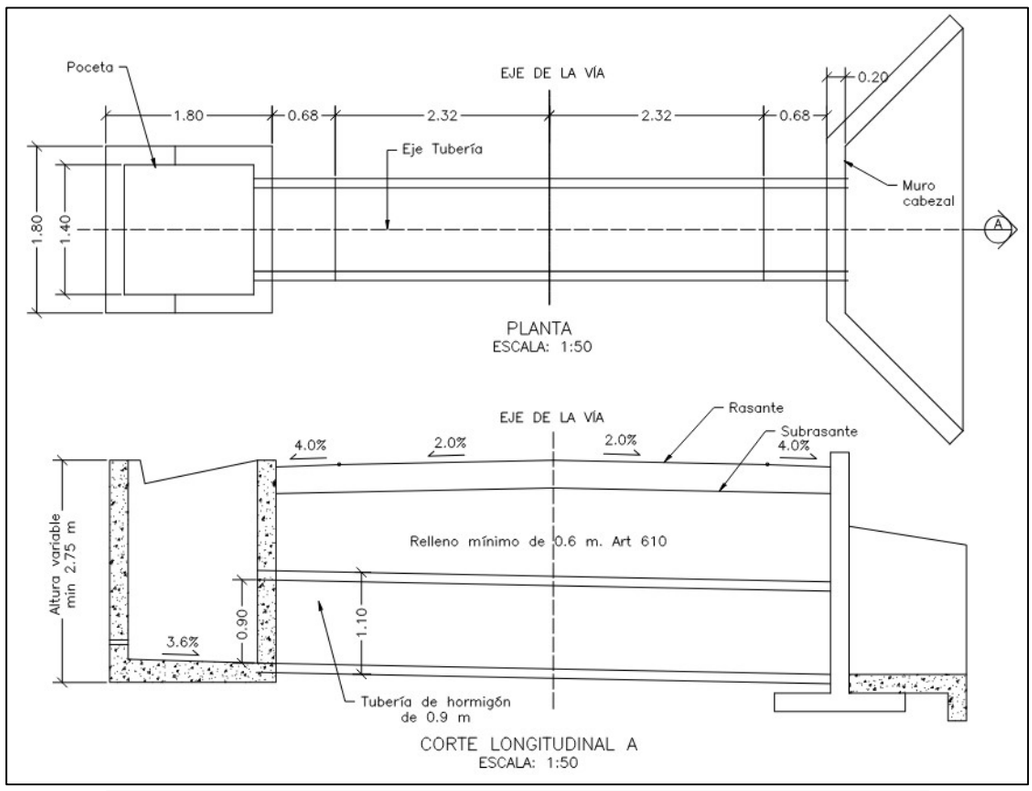

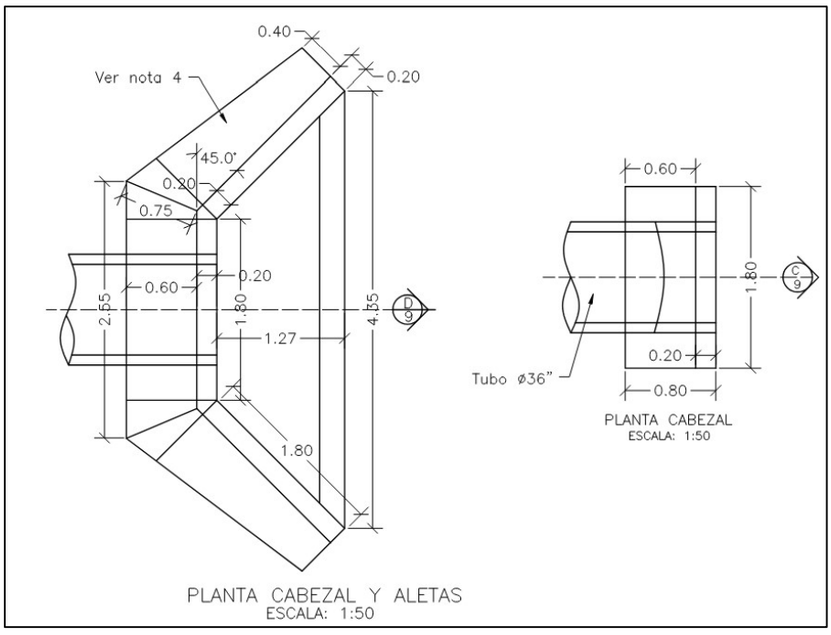

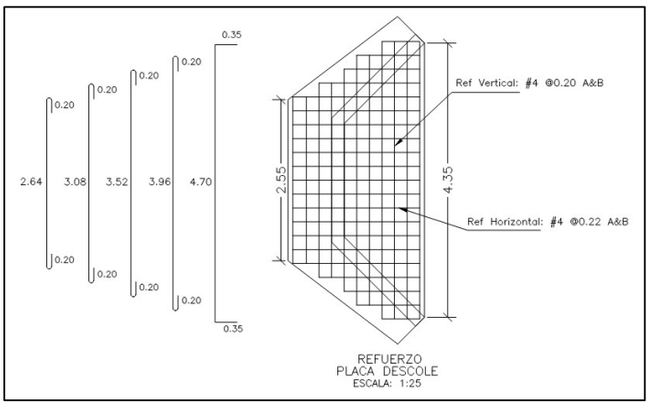

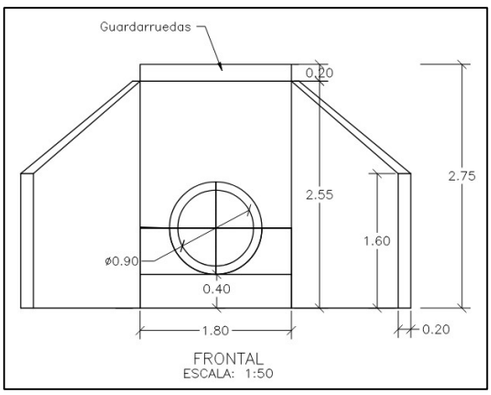

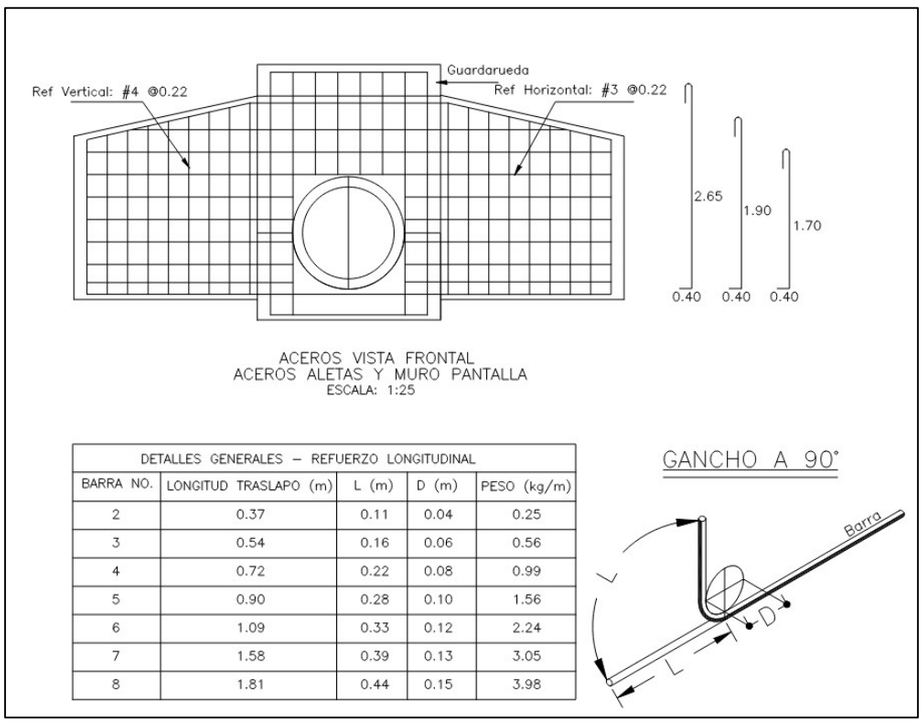

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL

BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Informacion general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4643 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON
NIT:	900.867.709-9
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	330 metros lineales
Valor inicial:	$ 194.052.521,00
Adiciones:	$0,00
Valor total	$ 194.052.521,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapa de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de	19/12/2023

Iniciación:	
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorroga 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizaron las siguientes actividades:
Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalación de acero de refuerzo
Fundición de concreto en muros
Verificación de refuerzo y espesores
Instalación de Tubería 36"
Instalación de material de atraque

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizó el seguimiento del plan de gestión ambiental y formatos sugeridos por INVIAS, en colaboración con la Junta de Acción.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizó el seguimiento al cronograma del plan de gestión social el cual se avaló y contempla todas las áreas de influencia directa de la obra, normativas de la documentación iniciales específicas para cada junta de acción comunal.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron items no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoria evidencia un estado de avance en la obra y tomo las siguientes acciones:

- Se registro semanalmente el avance de las obras ejecutadas, se realizaron medidas preliminares y verificación de espesores.

- Se tuvo comunicación constante con los integrantes de la junta con el fin de resolver las dudas acerca de los pagos del personal y proveedores

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Para el presente mes, la interventoría se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoría N.º 4297-2023

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondiente al mes de abril 2024, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1. Informe semanal 19 – 29 Mar 2024 al 04 Abr 2024
2. Informe semanal 20 - 05 al 11 Abr 2024
3. Informe semanal 21 - 12 al 18 Abr 2024
4. Informe semanal 22 - 19 al 25 Abr 2024
5. Informe semanal 23 – 26 Abr 2024 al 02 May 2024

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	6/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 19 del 29/03/2024 al 4/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534884, longitud 74.684819, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA :		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON		INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.	
			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	4643- 2023	VALOR INICIAL: $ 194.052.521,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL: $ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES: $ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 194.052.521,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.052.521,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 110.320.153,83	56,85%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA(B):	$ 36.498.609,43	18,84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (71.821.544,40)	-37,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.377.023,00	3,29%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 145.852.936,17	75,16%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 64.618.770,76	33,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (81.234.165,41)	-41,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 25.800.513,66	13,30%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 11.146.668,18	5,75%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N°1 y 2

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 12.782.742,00	11,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.195.685,00	2,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.195.685,00	2,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 75,92% — Avance o Atraso Físico %: -49%

Meta Física Ejecutada %: 26,50%

Meta Física (Programa de Obra)			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	
Excavaciones varias sin calificar	m3	269,70	
Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	109,65	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	m3	4,05	
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	m3	34,70	
Tubería Pvc Alcantarillado D= 36"	Ml	31,20	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.381,83	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	269,7			269,70	4,49%
Ejec	170,0			170,00	2,83%
Prog	109,7			109,65	1,65%
Ejec	80,0			80,00	1,21%
Prog	4,0			4,05	1,41%
Ejec	4,7			4,70	1,64%
Prog	34,7			34,70	18,79%
Ejec	0,0			0,00	0,00%
Prog	31,2			31,20	38,58%
Ejec	20,1			20,12	10,90%
Prog	2381,8			2381,83	10,99%
Ejec	2150,0			2150,00	9,92%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Sector Batea

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0810
Certificadode RegistroMinero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	NA	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	NA	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	NA	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	NA	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	NA	x
EMISIONES:	SI	NO	NA	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	NA	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Tienda Paola

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socialisacion del proyecto el dia 27 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de acero de refuerzo
Fundicion de concreto en muros
Verificacion de refuerzo y espesores

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalacion de concreto
Instalacion de tuberia de 36"

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICA EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sector batea, Fundicion de concreto para muro izquierdo



Sector batea, Instalacion y figurado de aceros en costado izquierdo



Sector batea, Instalacion de formaleteria para muro

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LA S ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA S OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 252202-402166 CND

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	
FECHA	14/04/2024 (dia/ Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 20 del 5/04/2024 al 11/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534804, longitud 74.684819, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON		INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.	
			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	4643- 2023	VALOR INICIAL: $ 194.052.521,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL: $ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES: $ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 194.052.521,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO		
	$ 194.052.521,00	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 131.702.548,52	67,87%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60.834.928,47	31,35%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA(B):	$ (70.967.620,05)	-36,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 6.377.023,00	3,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171.421.789,04	88,34%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 93.621.100,32	48,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (77.800.688,73)	-40,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 25.568.852,87	13,18%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 29.002.329,56	14,95%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras Nº 1, 2 Y 3

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.677,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 90,64% — Avance o Atraso Físico %: -49%
Meta Física Ejecutada %: 41,87%

Meta Física (Programa de Obra)			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	
Excavaciones varias sin calificar	m3	269,70	
Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	125,89	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	m3	4,70	
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (C) - mezcla in situ	m3	41,93	
Tubería Pvc Alcantarillado D= 36"	Ml	37,70	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.878,04	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	269,7			269,70	4,49%
Ejec	170,0			170,00	2,83%
Prog	125,9			125,89	1,90%
Ejec	146,2			146,20	2,21%
Prog	4,7			4,70	1,64%
Ejec	4,7			4,70	1,64%
Prog	41,9			41,93	22,71%
Ejec	2,5			2,54	1,38%
Prog	37,7			37,70	46,62%
Ejec	44,1			44,12	23,89%
Prog	2878,0			2878,04	13,28%
Ejec	2150,0			2150,00	9,92%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Sector Batea — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente Nº 331, Resolucion Nº0810
Certificadode RegistroMinero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	NA	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	NA	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	NA	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	NA	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	NA	x
EMISIONES:	SI	NO	NA	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	NA	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutardebido albajo impactoambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Tienda Paola

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto ello se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 27 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de acero de refuerzo
Fundicion de concreto en muros
Verificacion de refuerzo y espesores
Instalacion de Tuberia 36"

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concreto
Instalacion subbase para ataque de tuberia

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta Física programada vs meta Física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Sector batea, Instalacion de tuberias 36"


Sector batea, Instalacion de tuberias 36"


Sector batea, Instalacion de formaleta para muro de fijacion de tuberia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LA S ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN A L CUMPLIMIENTO DE LA S OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 252202-402166 CND

Original: Informe Mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Contabilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
	VERSIÓN	
	PAGINA	
	FECHA	22/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 21 del 12/04/2024 al 18/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.532700, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534804, longitud -74.684819, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No:	4643- 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.052.521,00	CONTRATO No:	4257-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 194.052.521,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.052.521,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 143.410.605,48	73,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 67.051.543,93	34,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (76.358.961,55)	-39,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.377.023,00	3,29%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 185.693.755,98	95,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.768.389,12	51,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (84.925.366,87)	-43,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.271.966,94	7,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.147.288,80	3,68%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1, 2 Y 3

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecución de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.677,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 98,70% — Avance o Atraso Físico %: -53%
Meta Física Ejecutada %: 45,15%

Meta Física (Programa de Obra)

De scripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin calificar	m3	269,70
Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	142,14
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (P) - mezcla in situ	m3	4,70
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	m3	49,15
Tubería Pvc Alcantarillado D= 36"	Ml	39,00
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm-2 (60.000 PSI)	KG	3.374,26

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	269,7			269,70	4,49%
Ejec	170,0			170,00	2,83%
Prog	142,1			142,14	2,14%
Ejec	146,2			146,20	2,21%
Prog	4,7			4,70	1,64%
Ejec	4,7			4,70	1,64%
Prog	49,2			49,15	26,62%
Ejec	10,4			10,44	5,65%
Prog	39,0			39,00	49,23%
Ejec	44,1			44,12	23,89%
Prog	3374,3			3374,26	15,57%
Ejec	2150,0			2150,00	9,92%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Sector Batea — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO: SI x NO	
Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0810
Certificado de Registro Minero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requierenpermisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	12	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Tienda Paola

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 27 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de acero de refuerzo
Fundicion de concreto en muros
Verificacion de refuerzo y vaqueros
Instalacion de Tuberia 36"
Instalacion de material de atraque

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concreto
relleno de estructura
Instalacion de material de atraque

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y S METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sector batea, Fundicion de muro de soporte de tuberia



Sector batea, Instalacion de material de atraque



Sector batea, Instalacion de material de atraque

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma. Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado	FIRMA: Paula A. Ramirez NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	
FECHA	14/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 22 del 19/04/2024 al 25/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.532700, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534804, longitud -74.684819, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No:	4643- 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.052.521,00	CONTRATO No:	4257-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 194.052.521,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.052.521,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 145.302.830,00	74,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 67.293.673,88	34,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (78.009.156,12)	-40,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.377.023,00	3,29%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 194.052.521,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 101.460.505,31	52,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (92.592.015,69)	-47,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.358.765,02	4,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 692.116,19	0,36%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1, 2 Y 3, se esta realizando la revision del plan de compras 4

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.677,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00%
Meta Física Ejecutada %: 45,31%
Avance o Atraso Físico %: -54%

Meta Física (Programa de Obra)

De scripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin calificar	m3	269,70
Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	146,20
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (P) - mezcla in situ	m3	4,70
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	m3	50,80
Tubería Pvc Alcantarillado D= 36"	Ml	39,00
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.473,50

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	269,7			269,70	4,49%
Ejec	170,0			170,00	2,83%
Prog	146,2			146,20	2,21%
Ejec	157,2			157,24	2,37%
Prog	4,7			4,70	1,64%
Ejec	4,7			4,70	1,64%
Prog	50,8			50,80	27,40%
Ejec	10,4			10,44	5,65%
Prog	39,0			39,00	48,23%
Ejec	44,1			44,12	23,89%
Prog	3473,5			3473,50	16,05%
Ejec	2150,0			2150,00	9,92%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Sector Batea
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0810
Certificado de Registro Minero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requierenpermisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	12	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
	Tienda Paola

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 27 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de acero de refuerzo
Fundicion de concreto en muros
Verificacion de refuerzo y vaqueros
Instalacion de Tuberia 36"
Instalacion de material de atraque

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concreto
relleno de estructura
Instalacion de material de atraque
Se solicitara la prorroga del convenio puesto que las obras no han culminado a la fecha, se realizara un ajuste al cronograma de obra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sector batea, Fundicion de muro de soporte de tuberia



Sector batea, compactacion de subbase



Sector batea, Instalacion de subbase para placahuella superior

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Coordinadora, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	
FECHA	6/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS**

SEMANA No.: **23** del **26/04/2024** al **2/05/2024** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534634, longitud 74.684819, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON**

CONVENIO No.	4643- 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.052.521,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 194.052.521,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **PROYECTOS SANABRIA SAS.**

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4257-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.052.521,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 145.302.830,00	74,88%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 71.756.758,07	36,96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (73.546.071,93)	-37,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.377.023,00	3,29%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 194.052.521,00	100,00%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 108.840.886,79	56,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (85.211.634,27)	-43,91%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.380.381,42	3,80%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1, 2, 3 y 4.
Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.877,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -51%
Meta Física Ejecutada %: 49,38%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Excavaciones varias sin calificar	m3	269,70
* Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	146,20
* Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezda in situ	m3	4,70
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezda in situ	m3	50,60
Tubería Pvc Alcantarillado D= 36"	Ml	39,00
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	KG	3.473,50

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	269,7			269,70	4,49%
Ejec	170,0			170,00	2,83%
Prog	146,2			146,20	2,21%
Ejec	217,2			217,24	3,28%
Prog	4,7			4,70	1,64%
Ejec	4,7			4,70	1,64%
Prog	50,6			50,60	27,40%
Ejec	14,4			14,44	7,82%
Prog	39,0			39,00	48,23%
Ejec	44,1			44,12	23,89%
Prog	3473,5			3473,50	16,03%
Ejec	2150,0			2150,00	9,92%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Sector Batea — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: CorporacionAutonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Re solucion N°0810
Certificadode Registro Minero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Tienda Paola

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 27 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de acero de refuerzo
Fundicion de concreto en muros
Verificacion de refuerzo y espesores
instalacion de Tuberia 36"
Instalacion de material de atraque
Se aprobo la prorroga del convenio por 15 dias mas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concreto
Instalacion de acero
Instalacion de llenos laterales

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE META S FÍSICA S PROGRAMADA S VS META S FÍSICA S EJECUTADA S



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sector batea, Instalacion de acero de refuerzo



Sector batea, Instalacion de formaleteria para bordes



Sector batea, verificacion de medidas y espesores de los elementos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LA S ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN A L CUMPLIMIENTO DE LA S OBLIGACIONES CONTRACTUA LES POR PARTE DEL CONTRATISTA

De han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 252-52-492196 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión Inicial: 8 años.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se han iniciado obras, por lo tanto, no se cuenta con maquinaria ni equipo en el momento.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista cuenta con personal contratado.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 4643-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JAPON
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/02/2024 — PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4297-2023 — INTERVENTOR: PROYECTO SANARIA SAS
NOMBRE ARL: POSITIVA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFA - CALDAS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JAIRO DIAZ	10172524	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JAC EL JAPON	40%	$ 45.300	V	EPS FAMISANAR S.AS.	9465476391	$ 81.300	COLPENSIONES	9465476391	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
2	HELMAN FELIPE IBARRA	71184824	OBRERO	$ 1.300.000																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JAC EL JAPON	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A.-CM	9465476391	$ 81.300	PORVENIR S.A	9465476391	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
3	DANIEL FELIPE LAGUNA RUBIO	1054560939	OBRERO	$ 1.300.000																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JAC EL JAPON	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A.	9465476391	$ 81.300	PORVENIR S.A	9465476391	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
4	BENJAMIN LEAL RIAÑO	10168421	OBRERO	$ 1.300.000																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JAC EL JAPON	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A.-CM	9465476391	$ 81.300	COLPENSIONES	9465476391	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
5	VICTOR ESTEBAN MENDEZ LOPEZ	1007140114	OBRERO	$ 1.300.000																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		JAC EL JAPON	40%	$ 45.300	V	EPS FAMISANAR S.AS.	9465476391	$ 81.300	PORVENIR S.A	9465476391	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
6	OSORIO JOSE	10170606	OBRERO	$ 1.300.000																x	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		JAC EL JAPON	40%	$ 3.100	V	EPS FAMISANAR S.AS.	9465476391	$ 5.500	PORVENIR S.A	9465476391	$ 7.000	$ 1.800	$ 1.000	$ 1.300	Ingreso-Retiro
N																																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 15/03/2024, a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FABIAN ANDRES MACHADO MARIN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 011037-0511178AIT

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del PAAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra registro el estado del tiempo en el respectivo formato Invias.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA 09/2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — PERIODO MES: ABRIL

CONVENIO No.: 4403-2023
OBJETO: ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VÍA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO: 12/19/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/31/2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL: $ 194.052.521,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 193.052.521,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4287-2023 — INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas Muro de Contención	UND	6
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas Muro de Contención	UND	6	6
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FÍNANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 145.302.630,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.350.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.399.890,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 194.052.521,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 41.727.801,46	$ 71.756.709,07
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 30.787.189,93	$ 37.084.189,93
VALOR EJECUTADO	$ 72.514.991,41	$ 108.840.899,73

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 145.302.630,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 71.756.709,07
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 49,38%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Sector batea, Instalacion y figurado de acero en costado izquierdo


Sector batea, Instalacion de formaleteria para muro

Foto 3


Sector batea, Instalacion de tuberias 36"


Sector batea, Instalacion de formaleteria para bordos


Sector batea, verificacion de medidas y separacion de los elementos

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentra el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)
A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del Proyecto
Copias: Supervisor, Director Territorial

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo no se realizaron ensayos

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se realizó ningún cambio en las pólizas del convenio.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 4643-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 194.052.521,00

VALOR ACUMULADO: $ 194.052.521,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.810.504	27	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.702.626,1	27	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 58.215.756	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100296680

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	27	11	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073321 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	36%	$ 38.810.504	27	11	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	9%	$ 9.702.626,1	27	11	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	55%	$ 58.215.756	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100296680

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	27	11	2023	30	4	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073321 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobacion de polizas de la prorroga 01.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se realizó el informe de buen manejo de desembolso de la JAC

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC puesto que se encuentra en revisión y aprobación el plan de compras Nº1

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo se dio inicio a las obras, se realizan comités de obra semanalmente.

4.8.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo se realizó el 2 comité operativo con el fin de dar aprobación a las compras preliminares para inicio de obras.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Información general del contrato de interventoría N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoría realizo las siguientes actividades:

- Se realizan comités de seguimiento de obra de manera semanal.
- Se verifica el correcto pago a proveedores y personal de obra
- Se realizo el seguimiento a los resultados de laboratorio

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoría no cuenta con personal especialista.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de equipos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/4/24 (Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abril

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4297-2023

INTERVENTORÍA: PROYECTOS SANABRIA SAS.

CONTRATO DE OBRA No. 4643- 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta	Motocicleta 150 DR Modelo 2021 Placa EZQ15F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta TRK 502X modelo 2023 Placa FIF85G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta Suzuki GE110 modelo 2015 Placa SCN72D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
Certificado de revision tecnomecanica desde 10/10/2023 hasta 10/10/2024
Soat desde 03/10/2023 hasta 02/10/2024

Certificado de revision tecnomecanica desde 17/06/2023 hasta 17/06/2024
Soat desde 30/05/2023 hasta 29/05/2024

Certificado de revision tecnomecanica desde 05/12/2023 hasta 05/12/2024
Soat desde 30/06/2023 hasta 29/06/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoria cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de Interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de Interventoria" las acciones que adelanta o adelantara tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de Interventoria" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-37430

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoria.
Matricula Profesional No.: 1702-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 — **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA

CONTRATO DE OBRA No.: 4643-2023 El Japon; 3809-2023 La Atarraya; 3908-2023 La Habana; 4053-2023 Buenavista — **CONTRATISTA:** JAC DE LA VEREDA EL JAPON; JAC DE LA VEREDA LA HABANA; JAC DE LA VEREDA ATARRAYA; JAC DE LA VEREDA BUENAVISTA

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comp Fliar Caldas

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	79,267,382	Director de Interventoria	$ 1,914,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	33%	proyecto sanabria	$ 1,914,000	$ 133,200	V	Compesar EPS	77787805	$ 76,600	Colfondos	77787805	$ 306,200	$ 76,600	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
3	RAMIREZ GUERRERO PAULA ANDREA	1,013,760,290	Residente Interventoria	$ 2,600,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 2,600,000	$ 181,000	V	Nueva EPS	77787805	$ 104,000	Colpensiones	77787805	$ 416,000	$ 104,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
4	OREJUELA ARCE JULIANA MARCELA	1,017,236,990	Profesional Ambiental	$ 560,000	x x x x x	20%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	Nueva EPS	77787805	$ 52,000	Colpensiones	77787805	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
5	COMETA JIMENEZ ARNOLDO	10,187,384	Inspector de obra	$ 1,350,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 1,350,000	$ 93,700	V	EPS Sura	77787805	$ 54,000	Colfondos	77787805	$ 216,000	$ 54,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
6	LOTERO ATEHORTUA MARTHA XIOMARA	1,055,837,067	Profesional SST	$ 1,350,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 1,350,000	$ 93,700	V	Salud Total EPS	77787805	$ 54,000	Porvenir	77787805	$ 216,000	$ 54,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 7,774,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (Incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.:252023743OCND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	02/05/2024 (DÍA / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297 DE 2023 — INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: abr-24 — PROYECTO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARAEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"

CONVENIOS: 4643-2023, 3809-2023, 3980-2023, 4053-2023 — CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CALDAS : MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA JAPON 4643-2023; MUNICIPIO LA DORADA , VEREDA ATARRAYA 3809-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA HABANA 3980-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA BUENAVISTA 4053-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1260123	C-2402-0600-14-D-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 79,541,151.00	$ -
2023	1260123	C-2402-0600-14-D-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 36,326,998.00	
			TOTAL			$ 115,868,149.00	$ 78,359,825

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 115,868,149.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
2	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
3	ene-24	$ 10,701,800.00	$ 2,033,342.00	$ 12,735,142.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 103,133,007.00	$ 103,133,007.00		
4	feb-24	$ 8,306,000.00	$ 1,578,140.00	$ 9,884,140.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 93,248,867.00	$ 93,248,867.00		
5	mar-24	$ 12,511,800.00	$ 2,377,242.00	$ 14,889,042.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 78,359,825.00	$ 78,359,825.00		
6	abr-24	$ 14,645,800.00	$ 2,782,702.00	$ 17,428,502.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 60,931,323.00	$ 60,931,323.00		
	TOTALES	$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estan o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -		$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.17202-125676CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se presentaron cambios en las pólizas actualizadas en el periodo pasado.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA."

FECHA DE INICIO: 23/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 79.541.150,93

VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.954.115,10	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.908.230,2	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 23.862.345,3	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/112023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.586.814,80	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.173.629,6	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 34.760.444,4	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Se realizó el Acta de modificación No. 4

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se evidencio durante la obra las fuertes lluvias que afectan el sector, con lo cual se identificó el buen funcionamiento de las estructuras construidas

- Se identifico la correcta ejecución de las actividades, así como son la fundición de mezcla de concreto en sitio y la figuración de acero

8. ANEXOS


8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió correspondencia oficial directamente al contratista.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante este periodo se iniciaron obras.



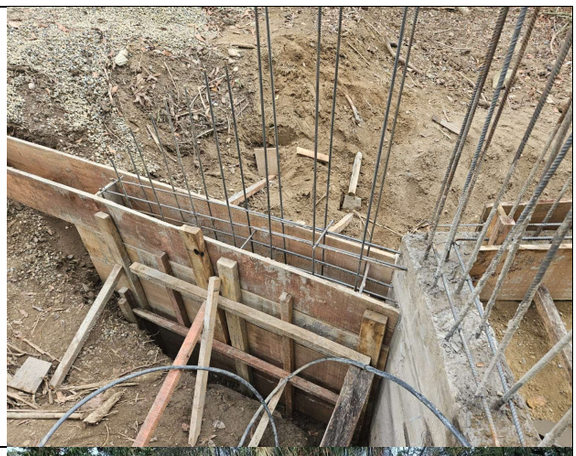












8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se anexa la bitácora de obra correspondiente al mes de abril en formato PDF

CONVENIO N.º 4053-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL
CORREGIMIENTO BUENAVISTA

II. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4053-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

Contrato de Interventoria No. 4297-2023 **Interventoria:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** abr-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	35
1	**INTRODUCCIÓN**		36
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		36
2.1	Localización		36
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		37
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		37
2.4	Características técnicas del proyecto		38
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		41
3.1	Información general del contrato		41
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		42
3.3	Seguimiento ítems no previstos		42
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		42
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		42
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	42
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	47
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-5-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		50
5.1	Información general del contrato		50
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		50
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		51
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	54
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	54
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		54
8	**Anexos**		54
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		54
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 6/05/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ABRIL

CONVENIO No.: 4053-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 24/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.929.132,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 199.929.132,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placahuella	ml	168
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construccion	ML	55	55
Estructuras				
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.371.172,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.511.135,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.046.825,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.929.132,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 33.448.324,26	$ 61.209.725,94
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 18.404.619,95	$ 25.764.542,95
VALOR EJECUTADO	$ 51.852.944,21	$ 86.974.268,89

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 150.371.172,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 61.209.725,94
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 40,71%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalacion de refuerzo para cunetas, Vereda Buenavista



Compactacion de subbase, Vereda Buenavista



Instalacion de acero, Vereda Buenavista



Fundicion de cunetas, Vereda Buenavista



Fundicion de bordillos, Vereda Buenavista



Instalacion de acero, Vereda Buenavista

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-653-2023, se celebra el convenio 4053-2023 que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 06** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.673648 y longitud -75.427575 y punto de referencia final el PR 2+700 con coordenadas latitud 5.667733 y longitud -75.428956, de la vía Buenavista – Japón, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda Buenavista se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.744600 - Longitud -74.676130
Punto Final: Latitud 5.765760 - Longitud -74.675210



Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en el corregimiento de Buenavista
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS JAC BUENAVISTA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Norcasia y La Dorada en sus veredas El Japón, Buenavista, La Atarraya, el Tigre, Brisas y La Agustina. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,** el cual comprende un tramo de aproximadamente 2600 metros lineales, el cual se ve afectado durante el invierno en diferentes tramos los cuales son señalados por la comunidad que transita a diario por esta via.

El tramo a intervenir en la vereda Buenavista se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.744600 - Longitud -74.676130
Punto Final: Latitud 5.765760 - Longitud -74.675210



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en el corregimiento Buenavista.

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en el Corregimiento de Buenavista, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 4053-2023 que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural del Corregimiento de Buenavista a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**


Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 8.1.3 ESTRUCTURA TIPO PLACA HUELLA, del cual se copia textualmente:


"La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.


Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2.


En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa, cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando vehículos tipo C3, C2 y vehículos ligeros (camionetas y automóviles). También se consideró que la placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para identificar la mejor combinación posible. En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.


Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**




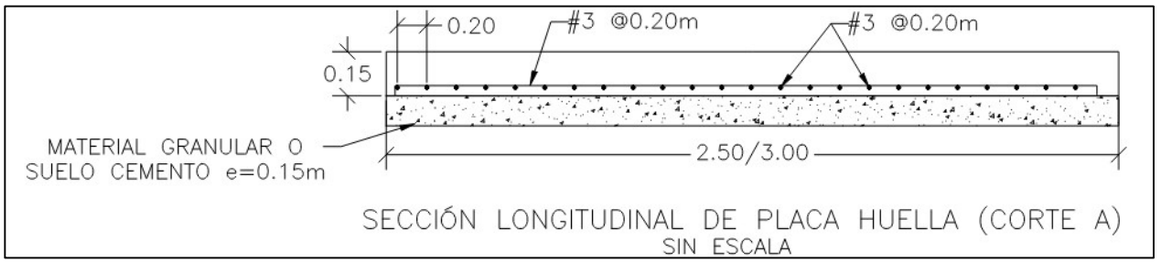




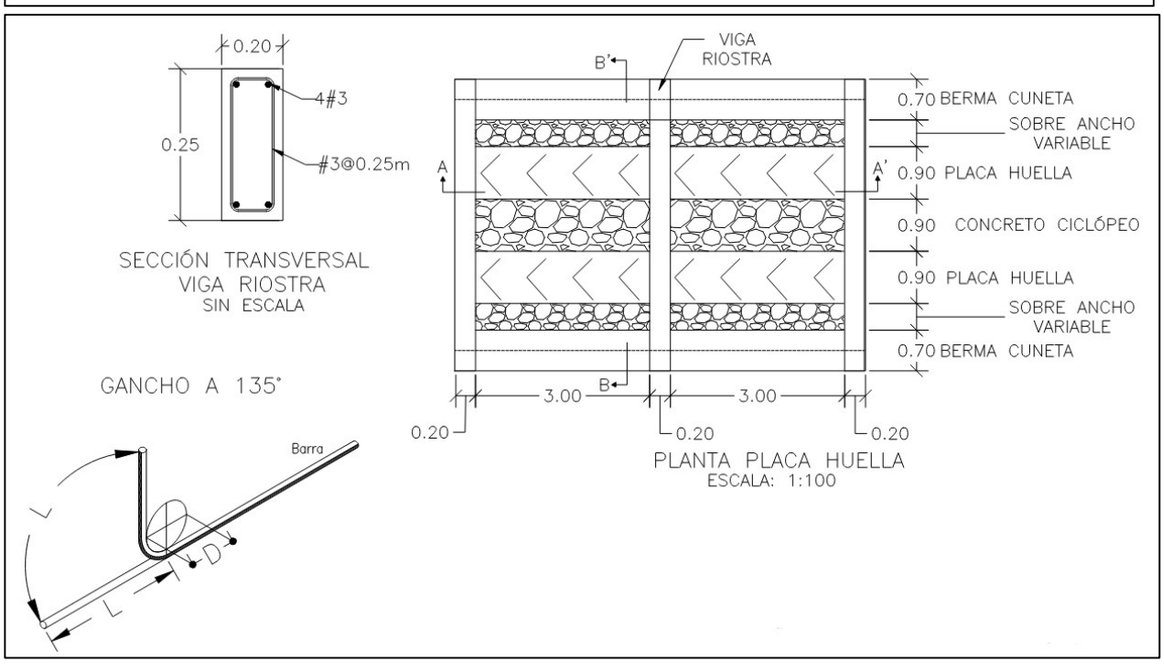

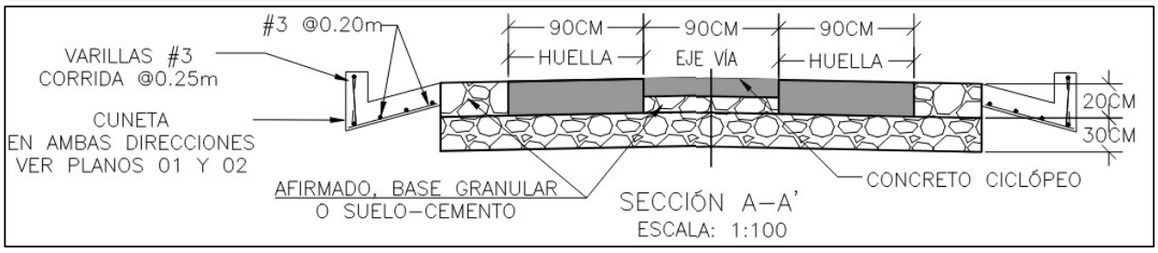

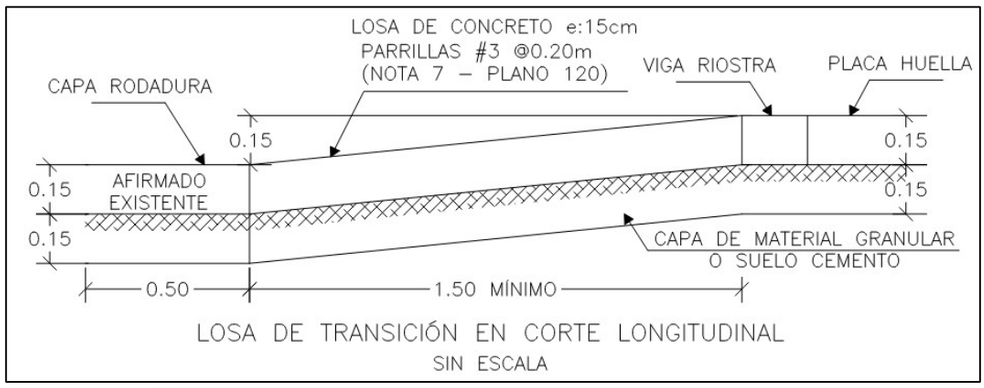

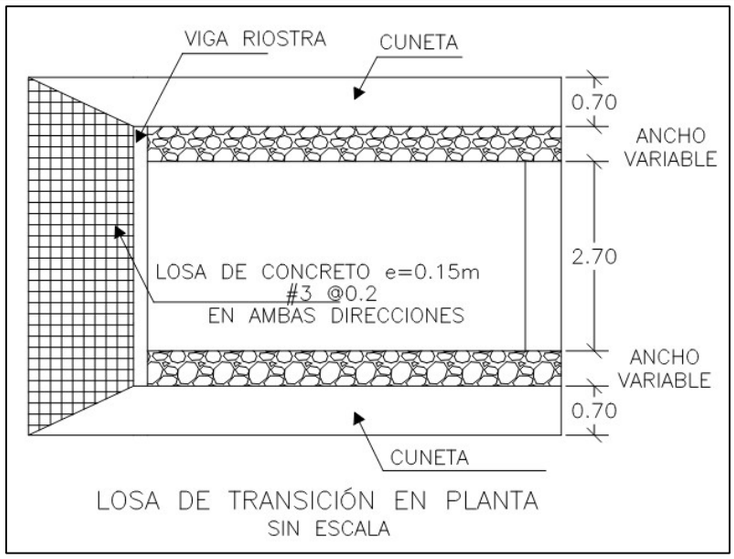

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Información general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4053 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA
NIT:	810.005.838-6
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	2630 metros lineales
Valor inicial:	$ 200.929.132,00
Adiciones:	$0,00
Valor total	$ 200.929.132,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapa de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	24/11/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorroga 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizaron las siguientes actividades.
Se realizaron actividades de figurado de aceros.
se realizó la instalación de concretos para huellas
Fundición de concreto ciclópeo
Instalación de acero de refuerzo para cunetas
Fundición de concreto en bordillos y cunetas
Se aprobó la prórroga del convenio por 30 días

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizó el seguimiento del plan de gestión ambiental y formatos sugeridos por INVIAS, en colaboración con la Junta de Acción.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizó el seguimiento al cronograma del plan de gestión social el cual se avaló y contempla todas las áreas de influencia directa de la obra, normativas de la documentación iniciales específicas para cada junta de acción comunal.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron ítems no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoría evidencia un estado de avance en la obra y tomo las siguientes acciones:

- Se registro semanalmente el avance de las obras ejecutadas, se realizaron medidas preliminares y verificación de espesores.

- Se tuvo comunicación constante con los integrantes de la junta con el fin de resolver las dudas acerca de los pagos del personal y proveedores

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, tampoco se ha remitido un cronograma por parte del contratista de obra, por otro lado, desde la interventoría se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoría N.º 4297-2023

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondiente al mes de abril 2024, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1. Informe semanal 19 – 29 Mar 2024 al 04 Abr 2024
2. Informe semanal 20 - 05 al 11 Abr 2024
3. Informe semanal 21 - 12 al 18 Abr 2024
4. Informe semanal 22 - 19 al 25 Abr 2024
5. Informe semanal 23 – 26 Abr 2024 al 02 May 2024

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	
FECHA	6/04/2024 (dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 19 del 29/03/2024 al 4/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744000 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.929.132,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.929.132,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: PROYECTOS SANABRIA SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4257-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BASICO CONVENIO (A):	$ 200.929.132,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119.999.035,61	59,72%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 34.845.149,66	17,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (85.153.885,96)	-42,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.559.923,00	3,76%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 157.759.061,16	78,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 56.382.783,10	28,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (101.376.278,06)	-50,45%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.018.519,89	8,97%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.913.215,92	4,44%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N°1 y2

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 12.782.742,00	11,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.195.685,00	2,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.195.685,00	2,76%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 79,80% — Avance o Atraso Físico %: -56,65%

Meta Física Ejecutada %: 23,17%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,40
* Subbase Granular Clase C	m3	160,66
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	69,43
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	13,68
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.676,25

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,40			4,40	0,06%
Ejec	4,40			4,40	0,06%
Prog	160,66			160,66	21,50%
Ejec	62,00			62,00	8%
Prog	69,43			69,43	38,61%
Ejec	16,00			16,00	9%
Prog	13,68			13,68	3,79%
Ejec	4,05			4,05	1%
Prog	3.676,25			3.676,25	15,84%
Ejec	1114			1.114,00	5%

* El Interventor identifica la meta física ejecutada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Entrada al corregimiento - Escuela

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		PERMISO MINERO:		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI	x NO				
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x NO				
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO				
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO				

OBSERVACIONES: Corporación Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0810

Certificado de Registro Minero RMN GQCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Salon de la Junta de accion Comunal del Corregimiento de buena vista

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 28 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
se realizo la instalacion de concretos para huellas
Fundicion de concreto ciclopeo
Instalacion de acero de refuerzo para cunetas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concretos
Figuracion de aceros
Compactacion de subbase

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion de concreto ciclopeo, Vereda Buenavista



Instalacion de refuerzo para cunetas, Vereda Buenavista



Fundicion de concreto en cunetas, Vereda Buenavista

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez

NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-462166 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del PROYE.S.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		PÁGINA:	
		FECHA	14/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 20 del 5/04/2024 al 11/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.929.132,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.929.132,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA :

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	-		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	-		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.929.132,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 135.257.844,14	67,32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 49.909.466,49	24,86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (85.268.357,65)	-42,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.559.923,00	3,76%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 175.777.581,05	87,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.906.737,02	36,78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (101.870.844,02)	-50,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 18.018.519,89	8,97%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 17.523.953,92	8,72%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1, 2 Y 3.

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.877,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 5.452.664,25	4,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 89,95% — Avance o Atraso Físico %: -56,71%
Meta Física Ejecutada %: 33,24%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,40
* Subbase Granular Clase C	m3	160,66
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	81,40
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	16,42
Acero de refuezo de FY = 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	KG	4.310,06

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,40			4,40	0,06%
Ejec	4,40			4,40	0,06%
Prog	160,66			160,66	21,50%
Ejec	62,00			62,00	8%
Prog	81,40			81,40	45,27%
Ejec	28,17			28,17	16%
Prog	16,42			16,42	4,55%
Ejec	5,3			5,30	1%
Prog	4.310,06			4.310,06	16,58%
Ejec	1600			1.600,00	9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Entrada al corregimiento - Escuela — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0810
Certificado de Registro Minero RMN: GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Salon de la Junta de accion Comunal del Corregimiento de buena vista

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realiza la socializacion del proyecto el dia 28 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
se realizo la instalacion de concretos para huellas
Fundicion de concreto ciclopeo
Instalacion de acero de refuerzo para cunetas
Fundicion rde concreto en bordillos y cunetas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concretos
Figuracion de acero

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y S META S FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion de cunetas, Vereda Buenavista



Instalacion de formaleta para bordillos, Vereda Buenavista



Fundicion de concreto bordillos, Vereda Buenavista

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidencias las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402166 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del PSAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO:	
	VERSIÓN:	
	PÁGINA:	
	FECHA	22/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 21 del 12/04/2024 al 18/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.929.132,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.929.132,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA :

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	-		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.929.132,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 147.229.541,25	73,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53.677.175,51	26,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (93.552.365,74)	-46,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.559.923,00	3,76%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.706.731,66	94,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 95.959.601,69	47,76%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (93.747.129,96)	-46,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 13.929.150,61	6,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 4.588.829,30	2,28%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1, 2 Y 3.

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.877,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 5.452.664,25	4,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 97,91% — Avance o Atraso Físico %: -52,21%
Meta Física Ejecutada %: 35,70%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,40
* Subbase Granular Clase C	m3	160,66
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	93,38
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	19,15
Acero de refuezo de FY = 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	KG	4.436,85

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,40			4,40	0,06%
Ejec	4,40			4,40	0,06%
Prog	160,66			160,66	21,50%
Ejec	62,00			62,00	8%
Prog	93,38			93,38	51,93%
Ejec	28,17			28,17	16%
Prog	19,15			19,15	5,30%
Ejec	5,3			5,30	1%
Prog	4.436,85			4.436,85	19,12%
Ejec	2369			2.369,00	10%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Entrada al corregimiento - Escuela — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0810
Certificado de Registro Minero RMN: GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Salon de la Junta de accion Comunal del Corregimiento de buena vista

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realiza la socializacion del proyecto el dia 28 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
se realizo la instalacion de concretos para huellas
Fundicion de concreto ciclopeo
Instalacion de acero de refuerzo para cunetas
Fundicion rde concreto en bordillos y cunetas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concretos
Figuracion de acero

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y S META S FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion de cunetas, Vereda Buenavista



Compactacion de subbase, Vereda Buenavista



Instalacion de acero, Vereda Buenavista

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidencias las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402166 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del PAGA S.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO:	
	VERSION:	
	PAGINA:	
	FECHA	26/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 22 del 19/04/2024 al 25/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.929.132,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.929.132,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA :

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	-		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.929.132,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150.371.172,00	74,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 61.209.725,84	30,46%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (89.161.446,06)	-44,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.559.923,00	3,76%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 195.659.064,88	97,38%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 86.974.268,89	43,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (108.684.795,99)	-54,09%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.952.333,22	2,96%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.478.702,56	4,22%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1, 2 Y 3, se esta realizando la revision del plan de compras 4

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.877,00	18,82%
INVERSION PRODRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -59,29%

Meta Física Ejecutada %: 40,71%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,40
* Subbase Granular Clase C	m3	160,66
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	95,77
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	21,89
Acero de refuerzo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	KG	4.436,85

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,40			4,40	0,06%
Ejec	4,40			4,40	0,06%
Prog	160,66			160,66	21,50%
Ejec	62,00			62,00	8%
Prog	95,77			95,77	53,26%
Ejec	35,00			35,00	19%
Prog	21,89			21,89	0,06%
Ejec	5,3			5,30	1%
Prog	4.436,85			4.436,85	19,12%
Ejec	2550			2.550,00	11%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Planta electrica	1	1
Total	4	4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Entrada al corregimiento - Escuela — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0810

Certificado de Registro Minero RMN: GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Salon de la Junta de accion Comunal del Corregimiento de buena vista

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 28 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
se realizo la instalacion de concretos para huellas
Fundicion de concreto ciclopeo
Instalacion de acero de refuerzo para cunetas
Fundicion de concreto en bordillos y cunetas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concretos
Figuracion de acero
Se solicitara la prorroga del convenio puesto que las obras no han culminado a la fecha, se realizara un ajuste al cronograma de obra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Verificacion de medidas y espesores, Vereda Buenavista



Instalacion de acero, Vereda Buenavista



Instalacion de acero, Vereda Buenavista

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidencias las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez

NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-402166 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del PSYA S.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTO S DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	
FECHA	4/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **23** del **26/04/2024** al **2/05/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.748600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.929.132,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.929.132,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.929.132,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150.371.172,00	74,84%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 61.209.725,94	30,46%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (89.161.446,06)	-44,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ 7.559.923,00	3,76%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 200.929.132,00	100,00%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 86.974.266,89	43,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (113.954.865,11)	-56,71%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.270.067,13	2,62%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.478.702,56	4,22%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras Nº 1, 2, 3 y 4
Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.677,00	18,82%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -59,29%
Meta Física Ejecutada %: 40,71%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,40
* Subbase Granular Clase C	m3	160,66
* Concreto rellenado resistencia 21 MPA	m3	95,77
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	21,89
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.436,85

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,40			4,40	0,06%
Ejec	4,40			4,40	0,06%
Prog	160,66			160,66	21,50%
Ejec	62,00			62,00	8%
Prog	95,77			95,77	53,26%
Ejec	35,00			35,00	19%
Prog	21,89			21,89	6,06%
Ejec	5,3			5,30	1%
Prog	4.436,85			4.436,85	19,12%
Ejec	2650			2.650,00	11%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Entrada al corregimiento - Escuela — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	Guarinocito-Balcones	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACION:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Corporación Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente Nº 331, Resolucion Nº0810
Certificado de Registro Minero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Salon de la Junta de accion Comunal del Corregimiento de buena vista

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
se realizo la instalacion de concretos para huellas
Fundicion de concreto ciclopeo
Instalacion de acero de refuerzo para cunetas
Fundicion de concreto en bordillos y cunetas
Se aprobo la prorroga del convenio por 30 dias

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concretos
Figuracion de acero

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema grafico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada, es meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fundicion de bordillos, Vereda Buenavista


Fundicion loza de aproximacion, Vereda Buenavista


Instalacion de acero, Vereda Buenavista

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402166 CND

Original: Archivo Financiero de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

no se cuenta con maquinaria ni equipo en el momento.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista cuenta con personal contratado.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 4543-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/02/2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4053-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANARIA SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFA - CALDAS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BOCANEGRA JHON	1054543623	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	EPS FAMISANAR S.A.S.	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
2	ESMERAL SERGIO	1005188043	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A. -CM	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
3	GAITAN JORGE	1064639606	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A.	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
4	JIMENEZ JUAN	1054860340	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
5	MURILLO JHON	1054540168	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A. -CM	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
6	POSADA FREDIS	4437737	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 16.200	V	NUEVA EPS S.A	9465451529	$ 29.000	PROTECCION SA	9465451529	$ 37.200	$ 9.300	$ 4.700	$ 7.000	Ingreso
7	ROMERO JHON	1054538155	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	EPS FAMISANAR S.A.S.	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
8	SALAS JOSE	1073320102	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	EPS FAMISANAR S.A.S.	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
9	TORRES ALEJANDRO	1073328616	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 14/04/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional sea debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EFREN FERNANDO MORENO ZAMORA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202131489 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra registro el estado del tiempo en el respectivo formato Invias.

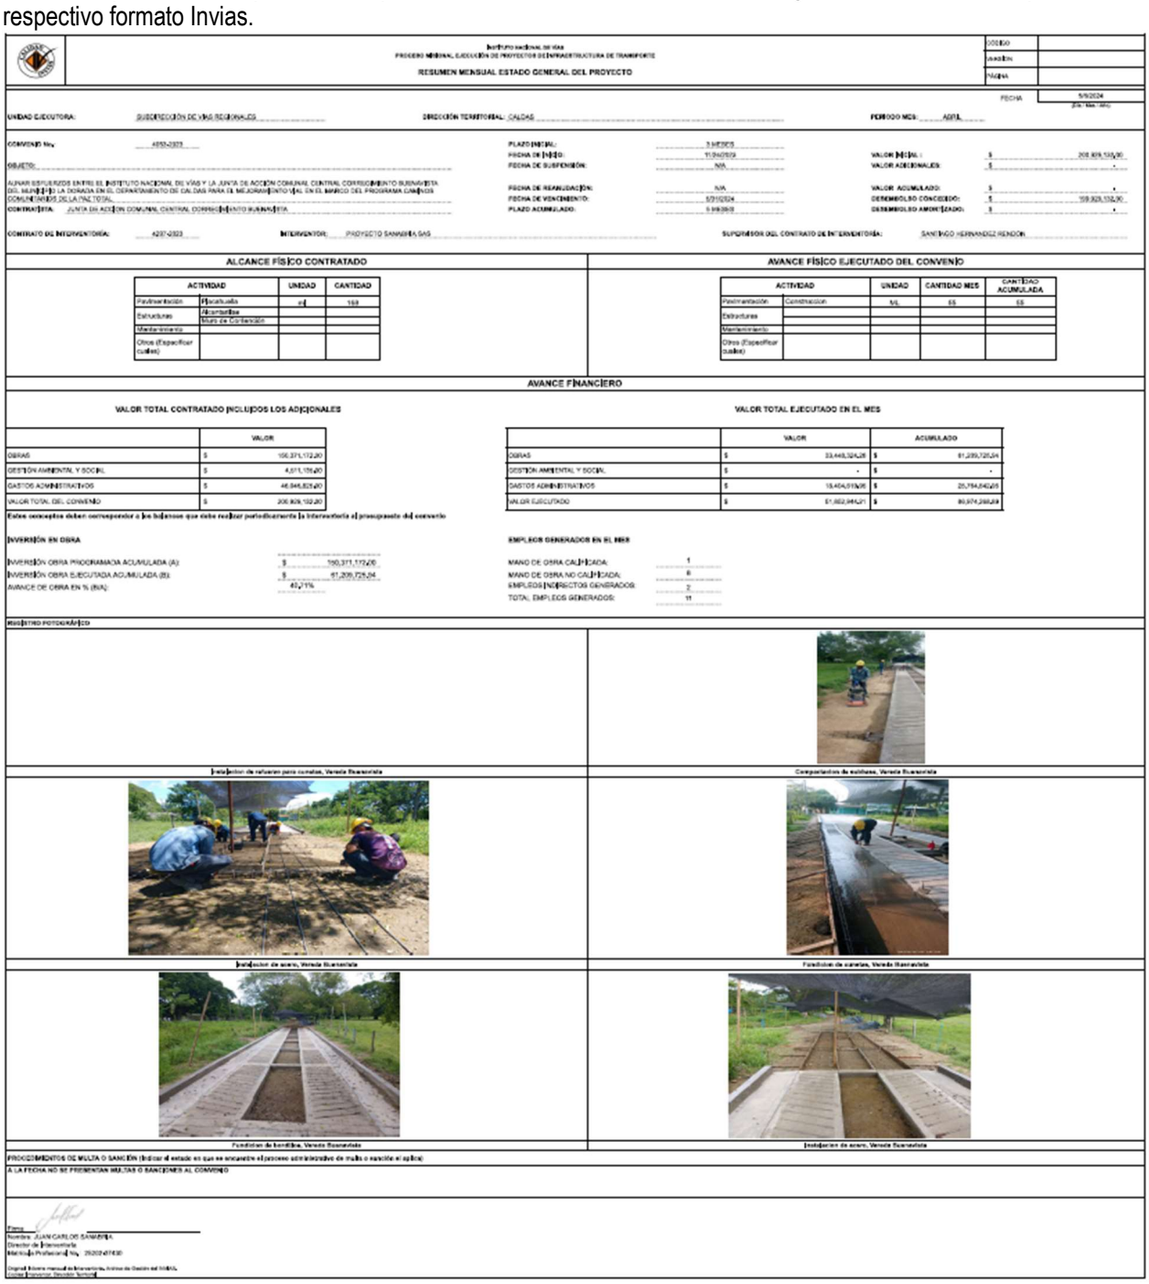

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO
ANEXO
VIGENCIA
FECHA 5/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — PERÍODO MES: ABRIL

CONVENIO No.: 4553-2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO SUBANEGTA DEL MUNICIPIO LA DONADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA EN ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO SUBANEGTA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 11/04/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/10/2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL: $ 208.809.185,90
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 159.925.132,90
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4287-2023 — INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Fundida	m	159
Estructuras	Alcantarilla		
Mantenimiento	Muro de Contención		
Otros (Especificar cuáles)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	65	65
Estructuras				
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuáles)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 166.371.172,20
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.011.139,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.946.824,20
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 208.809.192,20

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 33.445.324,28	$ 61.289.725,84
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 18.404.819,56	$ 20.794.842,05
VALOR EJECUTADO	$ 51.850.144,01	$ 80.974.288,68

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 190.371.172,20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 61.289.725,84
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 40,21%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de refuerzo para cunetas, Vereda Buenavista

Compactación de subbase, Vereda Buenavista

Instalación de acero, Vereda Buenavista

Fundición de cunetas, Vereda Buenavista

Fundición de bordillo, Vereda Buenavista

Instalación de acero, Vereda Buenavista

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)
A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-274130

Original firmado manual de Interventoría, Sistema de Gestión del INVÍAS.
Copias: Supervisor, Residente Territorial

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con la realización de ensayos de laboratorio.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se realizó ningún cambio en las pólizas del convenio.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 4053-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 24/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.929.132,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.929.132,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.185.826	24	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.046.457	24	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.278.739	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290063

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	24	10	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071102 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.185.826	24	10	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.046.457	24	10	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.278.739	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290063

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	27	11	2023	30	4	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071102 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobacion de polizas de la prorroga 01.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se han realizado movimientos en la cuenta

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo se dio inicio a las obras, se realizan comités de obra semanalmente

4.8.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo se realizó el segundo comité operativo con el fin de aprobar el plan de compras Nº1 y dar inicio a las obras

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Información general del contrato de interventoría N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoría realizo las siguientes actividades:

- Se realizan comités de seguimiento de obra de manera semanal.
- Se verifica el correcto pago a proveedores y personal de obra
- Se realizo el seguimiento a los resultados de laboratorio

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoría no cuenta con personal especialista **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

5.4. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/4/24 (Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abril

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4297-2023

INTERVENTORÍA: PROYECTOS SANABRIA SAS.

CONTRATO DE OBRA No. 4643- 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta	Motocicleta 150 DR Modelo 2021 Placa EZQ15F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta TRK 502X modelo 2023 Placa FIF85G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta Suzuki GE110 modelo 2015 Placa SCN72D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
Certificado de revision tecnomecanica desde 10/10/2023 hasta 10/10/2024
Soat desde 03/10/2023 hasta 02/10/2024

Certificado de revision tecnomecanica desde 17/06/2023 hasta 17/06/2024
Soat desde 30/09/2023 hasta 29/09/2024

Certificado de revision tecnomecanica desde 09/12/2023 hasta 09/12/2024
Soat desde 30/06/2023 hasta 29/06/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 1702-125676 CLD

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

5.5. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 — INTERVENTOR: PROYECTO SANABIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 — PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA

CONTRATO DE OBRA No.: 4643-2023 El Japon; 3809-2023 La Atarraya; 3908-2023 La Habana; 4053-2023 Buenavista — CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL JAPON; JAC DE LA VEREDA LA HABANA; JAC DE LA VEREDA ATARRAYA; JAC DE LA VEREDA BUENAVISTA

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Comp Fliar Caldas

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	79,267,382	Director de Interventoria	$ 1,914,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	33%	proyecto sanabria	$ 1,914,000	$ 133,200	V	Compesar EPS	77787805	$ 76,600	Colfondos	77787805	$ 306,200	$ 76,600	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
3	RAMIREZ GUERRERO PAULA ANDREA	1,013,760,290	Residente Interventoria	$ 2,600,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 2,600,000	$ 181,000	V	Nueva EPS	77787805	$ 104,000	Colpensiones	77787805	$ 416,000	$ 104,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
4	OREJUELA ARCE JULIANA MARCELA	1,017,236,990	Profesional Ambiental	$ 560,000	x x x x x x x x x x	20%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	Nueva EPS	77787805	$ 52,000	Colpensiones	77787805	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
5	COMETA JIMENEZ ARNOLDO	10,187,384	Inspector de obra	$ 1,350,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 1,350,000	$ 93,700	V	EPS Sura	77787805	$ 54,000	Colfondos	77787805	$ 216,000	$ 54,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
6	LOTERO ATEHORTUA MARTHA XIOMARA	1,055,837,067	Profesional SST	$ 1,350,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 1,350,000	$ 93,700	V	Salud Total EPS	77787805	$ 54,000	Porvenir	77787805	$ 216,000	$ 54,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 7,774,000																

El interventor adjunta la certificación de fecha 30/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.:2520237430CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

5.6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297 DE 2023 — INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: abr-24 — PROYECTO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARAEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA""

CONVENIOS: 4643-2023, 3809-2023, 3960-2023, 4053-2023 — CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CALDAS : MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA JAPON 4643-2023; MUNICIPIO LA DORADA , VEREDA ATARRAYA 3809-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA HABANA 3960-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA BUENAVISTA 4053-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1260123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 79,541,151.00	$ -
2023	1260123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 36,326,998.00	
				TOTAL		$ 115,868,149.00	$ 78,359,825

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 115,868,143.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
2	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
3	ene-24	$ 10,701,800.00	$ 2,033,342.00	$ 12,735,142.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 103,133,007.00	$ 103,133,007.00		
4	feb-24	$ 8,306,000.00	$ 1,578,140.00	$ 9,884,140.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 93,248,867.00	$ 93,248,867.00		
5	mar-24	$ 12,511,800.00	$ 2,377,242.00	$ 14,889,042.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 78,359,825.00	$ 78,359,825.00		
6	abr-24	$ 14,645,800.00	$ 2,782,702.00	$ 17,428,502.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 60,931,323.00	$ 60,931,323.00		
TOTALES		$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse estan o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -		$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No. 17202-125676CLD

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se presentaron cambios en las polizas actualizadas en el periodo pasado.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA."

FECHA DE INICIO: 23/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 79.541.150,93

VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.954.115,10	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.908.230,2	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 23.862.345,3	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/112023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.586.814,80	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.173.629,6	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 34.760.444,4	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

5.8.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Se realizó el Acta de modificación No. 4

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizo la verificación de los contratos del personal, los cuales cuentan con sus respectivas afiliaciones de seguridad social.
- Se dio inicio a las actividades de obra
- Se recomienda seguir con las indicaciones estipuladas en el diseño de mezcla

7. ANEXOS

7.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió correspondencia oficial directamente al contratista.

7.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS
















7.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se anexa la bitácora de obra correspondiente al mes de marzo en formato PDF.

CONVENIO N.º 3809-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ATARRAYA

III. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3809-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA

Contrato de Interventoria No. 4297-2023 **Interventoria:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** abr/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	56
1	**INTRODUCCIÓN**		57
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		57
2.1	Localización		57
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		58
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		58
2.4	Características técnicas del proyecto		59
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		62
3.1	Información general del contrato		62
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		63
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		63
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		63
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		63
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	63
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	68
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la Inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		71
5.1	Información general del contrato		71
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		72
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		72
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	75
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la Inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	75
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		75
8	**Anexos**		75
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		75
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ABRIL

CONVENIO No.: 3809-2023

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 29/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.779.147,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 199.779.147,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placahuella	ml	170
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placahuella	Construccion	ML	61	61
Estructuras				
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.473.039,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.514.191,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.791.917,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.779.147,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 15.650.088,69	$ 85.740.606,25
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ 35.768.246,31
VALOR EJECUTADO	$ 15.650.088,69	$ 121.508.852,56

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 150.473.039,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 85.740.606,25
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 56,98%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Atarraya, Instalacion de formaletas y fundicion de concretos



Vereda Atarraya, Compactacion de subbase para cunetas



Vereda Atarraya, Instalacion de formaletas y fundicion de concretos



Vereda Atarraya, Fundicion de concreto ciclopeo



Vereda Atarraya, Instalacion de formaletas y fundicion de concretos



Vereda Atarraya, Alistado de seccion para fundicion de vigas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-507-2023, se celebra el convenio 3809-2023 que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 06** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda La Atarraya se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.719000 Longitud -74.725000
Punto Final: Latitud 5.723000 Longitud -74.724000



Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en el corregimiento de La Atarraya
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA ATARRAYA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Norcasia y La Dorada en sus veredas El Japón, Buenavista, La Atarraya, el Tigre, Brisas y La Agustina. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,** el cual comprende un tramo de aproximadamente 1180 metros lineales, el cual se ve afectado durante el invierno en diferentes tramos los cuales son señalados por la comunidad que transita a diario por esta vía.

El tramo a intervenir en la vereda La Atarraya se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.719000 Longitud -74.725000
Punto Final: Latitud 5.723000 Longitud -74.724000



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en la vereda La Atarraya.

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en la vereda La atarraya, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 3809-2023 que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural de la vereda La Atarraya a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**


Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 8.1.3 ESTRUCTURA TIPO PLACA HUELLA, del cual se copia textualmente:

"La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.


Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2.

En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa, cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando vehículos tipo C3, C2 y vehículos ligeros (camionetas y automóviles). También se consideró que la placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para identificar la mejor combinación posible. En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.

Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**




SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA (CORTE B–B)
SIN ESCALA

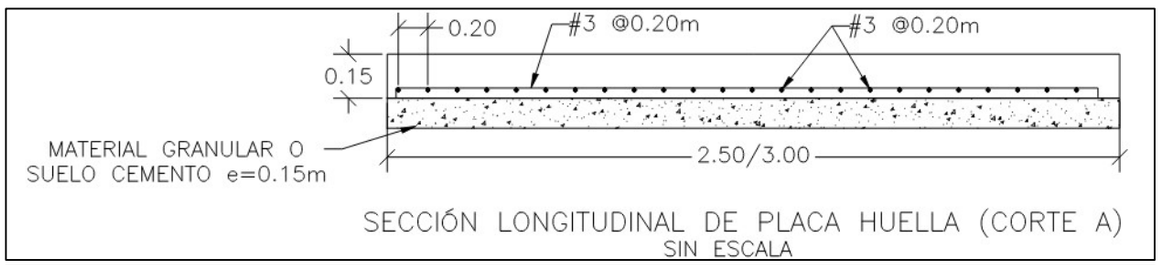


SECCIÓN LONGITUDINAL DE PLACA HUELLA (CORTE A)
SIN ESCALA





SECCIÓN LONGITUDINAL VIGA RIOSTRA
SIN ESCALA

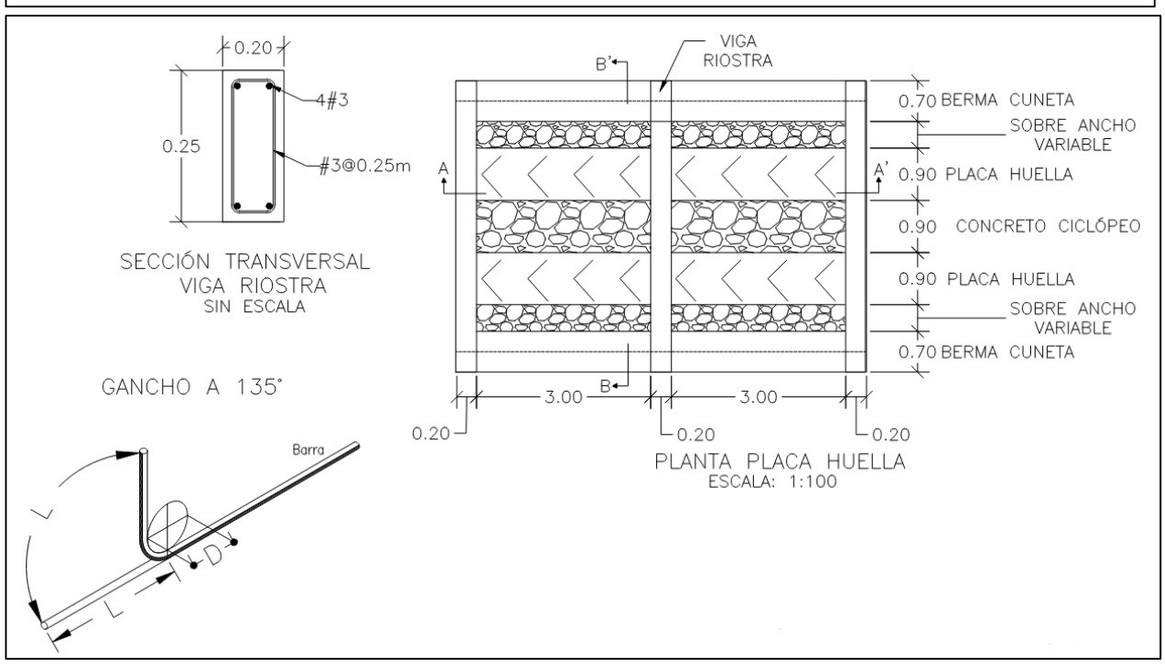

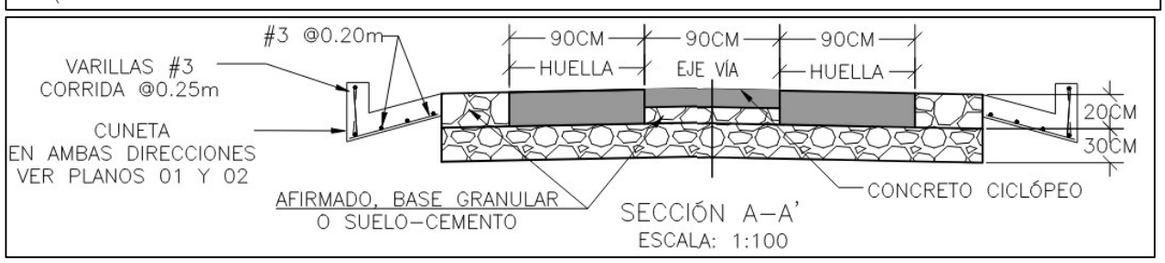

SECCIÓN A–A'
ESCALA: 1:100

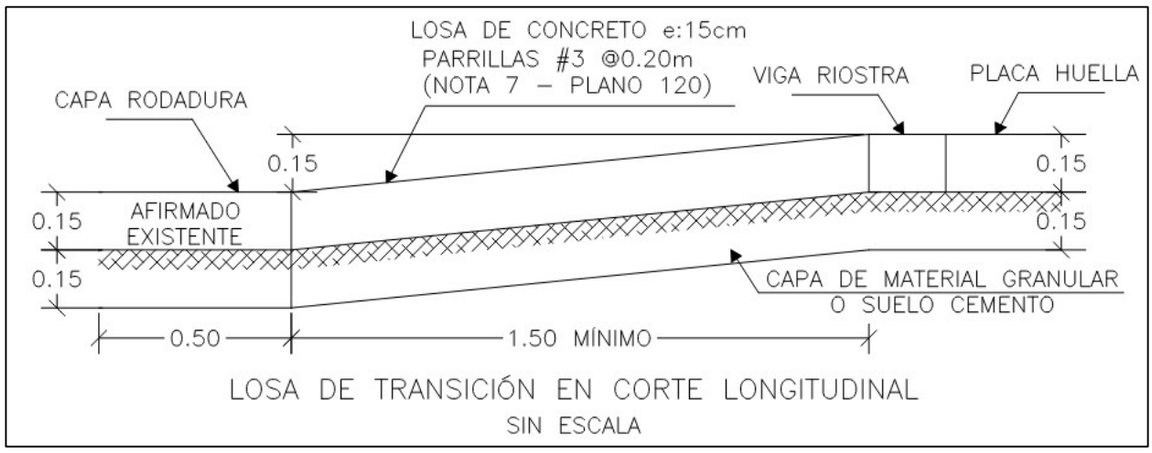

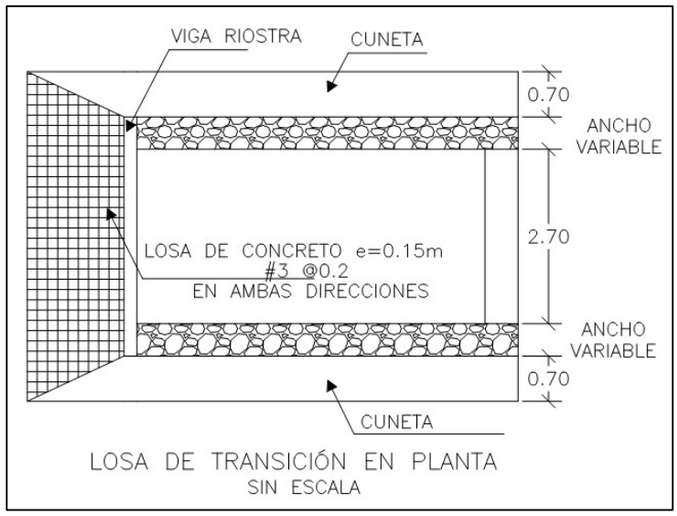

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Informacion general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3809 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA
NIT:	901.022.262
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	550 metros lineales
Valor inicial:	$ 200.779.147,00
Adiciones:	$0,00
Valor total	$ 200.779.147,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapa de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	29/11/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorroga 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizaron las siguientes actividades:
Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalación de subbase
Se realizo ensayo de densidades.
Se verifico el replanteo de las obras a realizar.
Se realizo la fundición de concreto para huellas
Se aprobó la prórroga del convenio por 30 días

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizó el seguimiento del plan de gestión ambiental y formatos sugeridos por INVIAS, en colaboración con la Junta de Acción.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizó el seguimiento al cronograma del plan de gestión social el cual se avaló y contempla todas las áreas de influencia directa de la obra, normativas de la documentación iniciales específicas para cada junta de acción comunal.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron items no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoría evidencia un estado de avance en la obra y tomo las siguientes acciones:

- Se registro semanalmente el avance de las obras ejecutadas, se realizaron medidas preliminares y verificación de espesores.

- Se tuvo comunicación constante con los integrantes de la junta con el fin de resolver las dudas acerca de los pagos del personal y proveedores

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, tampoco se ha remitido un cronograma por parte del contratista de obra, por otro lado, desde la interventoria se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoria Nº 4297-2023

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondiente al mes de enero 2024, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1. Informe semanal 19 – 29 Mar 2024 al 04 Abr 2024
2. Informe semanal 20 - 05 al 11 Abr 2024
3. Informe semanal 21 - 12 al 18 Abr 2024
4. Informe semanal 22 - 19 al 25 Abr 2024
5. Informe semanal 23 – 26 Abr 2024 al 02 May 2024

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO:	
VERSION:	
PAGINA:	
FECHA:	6/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 19 del 29/03/2024 al 4/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SA S.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3809- 2023	VALOR INICAL:	$ 200.779.147,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	25/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.779.147,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.779.147,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 120.038.126,34	59,79%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 45.535.264,74	22,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (74.502.861,61)	-37,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.254.807,00	4,11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 157.243.510,90	78,32%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 70.024.219,04	34,88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (87.219.291,86)	-43,44%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.081.164,40	9,01%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.352.181,42	6,65%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N°1 y 2

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 12.782.742,00	11,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.196.685,00	2,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.196.685,00	2,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 79,77% — Avance o Atraso Físico %: -49,51%

Meta Física Ejecutada %: 30,26%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,40
* Subbase Granular Clase C	m3	163,04
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	69,57
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	13,68
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	m3	3.696,32

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,40			4,40	0,07%
Ejec	4,40			4,40	0,07%
Prog	163,04			163,04	21,01%
Ejec	130,00			130,00	16,75%
Prog	69,57			69,57	38,40%
Ejec	8,10			8,10	4,47%
Prog	13,68			13,68	3,72%
Ejec	0,00			0,00	0,00%
Prog	3696,32			3696,32	16,59%
Ejec	2000,00			2000,00	8,97%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Escuela - Finca San Fernando — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente Nº 331, Resolucion Nº0810

Certificado de Registro Minero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	NA	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	NA	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	NA	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	NA	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	NA	x
EMISIONES:	SI	NO	NA	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	NA	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Salon de la Junta de accion Comunal Vereda la Atarraya

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 28 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de subbase
Se realizo ensayo de densidades.
Se verifico el replanteo de las obras a realizar.
Se realizo la funcion de concreto para huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalacion de formaletas
Instalacion de acero
Fundicion de concretos

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Atarraya, Instalacion de formaletas y fundicion de concretos



Vereda Atarraya, Fundicion de concreto huella izquierda



Vereda Atarraya, Instalacion de formaletas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramírez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 252122-402166 CND

Original: Informe mensual de interventoria. Archivo de Gestión del PROAD.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO:
VERSIÓN:
PÁGINA:

FECHA: 14/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 20 del 5/04/2024 al 11/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SA S.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3809- 2023	VALOR INICAL:	$ 200.779.147,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	25/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.779.147,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.779.147,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 135.420.768,06	67,45%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 60.849.302,85	30,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (74.571.465,21)	-37,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.254.807,00	4,11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 175.324.675,30	87,32%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 89.005.391,09	44,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (86.319.284,20)	-42,99%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.081.164,40	9,01%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.981.172,09	9,45%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1, 2 Y 3

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 21.810.677,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 79,77% — Avance o Atraso Físico %: -49,51%

Meta Física Ejecutada %: 30,26%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,40
Subbase Granular Clase C	m3	163,04
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	81,57
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	16,42
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	m3	4.333,62

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,40			4,40	0,07%
Ejec	4,40			4,40	0,07%
Prog	163,04			163,04	21,01%
Ejec	163,04			163,04	21,01%
Prog	81,57			81,57	45,02%
Ejec	13,68			13,68	7,55%
Prog	16,42			16,42	4,46%
Ejec	3,85			3,85	1,05%
Prog	4333,62			4333,62	19,44%
Ejec	2400,00			2400,00	10,77%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Escuela - Finca San Fernando — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0810

Certificado de Registro Minero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	NA	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	NA	x
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	NA	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	NA	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	NA	x
EMISIONES:	SI	NO	NA	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	NA	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Salon de la Junta de accion Comunal Vereda la Atarraya

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 28 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de subbase
Se realizo ensayo de densidades.
Se verifico el replanteo de las obras a realizar.
Se realizo la funcion de concreto para huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalacion de formaletas
Instalacion de acero
Fundicion de concretos

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Atarraya, Instalacion de formaletas y fundicion de concretos



Vereda Atarraya, Compactacion de subbase para cunetas



Vereda Atarraya, Compactacion de subbase para cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 252122-402166 CND

Original: Informe mensual de la interventoria. Archivo de Gestión del PROYECTO.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO:
VERSION:
PAGINA:
FECHA: 22/04/2024 (dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 21 del 12/04/2024 al 18/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA		INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SA S.	
			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3809- 2023	VALOR INICAL: $ 200.779.147,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL: $ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	25/11/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES: $ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200.779.147,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.779.147,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 147.352.005,20	73,40%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 67.244.453,11	33,49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (80.117.552,09)	-39,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.254.807,00	4,11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 189.179.410,34	94,22%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 95.959.601,09	47,79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (93.219.806,05)	-46,43%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.854.735,05	6,90%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.954.210,60	3,46%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras Nº 1, 2 Y 3

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 21.810.677,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 97,93% — Avance o Atraso Físico %: -53,24%
Meta Física Ejecutada %: 44,69%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,40
Subbase Granular Clase C	m3	163,04
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	93,56
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	19,15
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	m3	4.461,08

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,40			4,40	0,07%
Ejec	4,40			4,40	0,07%
Prog	163,04			163,04	21,01%
Ejec	163,04			163,04	21,01%
Prog	93,56			93,56	51,64%
Ejec	21,38			21,38	11,80%
Prog	19,15			19,15	5,20%
Ejec	3,85			3,85	1,05%
Prog	4461,08			4461,08	20,01%
Ejec	2400,00			2400,00	10,77%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Escuela - Finca San Fernando — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente Nº 331, Resolucion Nº0810

Certificado de Registro Minero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	NA	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	NA	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	NA	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	NA	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	NA	x
EMISIONES:	SI	NO	NA	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	NA	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Salon de la Junta de accion Comunal Vereda la Atarraya

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 28 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de subbase
Se realizo ensayo de densidades.
Se verifico el replanteo de las obras a realizar.
Se realizo la funcion de concreto para huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalacion de formaletas
Instalacion de acero
Fundicion de concretos

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Atarraya, Instalacion de formaletas y fundicion de concretos



Vereda Atarraya, Fundicion de huella derecha



Vereda Atarraya, Fundicion de concreto ciclopeo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 252122-402166 CND

Original: Informe mensual de la interventoria. Archivo de Gestión del PROYAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO:	
VERSION:	
PAGINA:	
FECHA:	26/04/2024 (dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 22 del 19/04/2024 al 25/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA		INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SA S.	
			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3809- 2023	VALOR INICAL: $ 200.779.147,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL: $ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	25/11/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES: $ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200.779.147,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.779.147,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150.473.039,00	74,94%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 78.357.120,58	39,03%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (72.115.918,42)	-35,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.254.807,00	4,11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 195.038.030,58	97,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111.304.305,78	55,44%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (83.733.724,10)	-41,70%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.858.820,53	2,92%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.344.705,09	7,64%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras Nº 1, 2 Y 3, se esta realizando la revision del plan de compras 4

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 21.810.677,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -47,93%

Meta Física Ejecutada %: 52,07%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,40
Subbase Granular Clase C	m3	163,04
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	95,96
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	21,89
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	m3	4.461,08

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,40			4,40	0,07%
Ejec	4,40			4,40	0,07%
Prog	163,04			163,04	21,01%
Ejec	163,04			163,04	21,01%
Prog	95,96			95,96	52,97%
Ejec	29,08			29,08	16,05%
Prog	21,89			21,89	5,95%
Ejec	15,39			15,39	4,18%
Prog	4461,08			4461,08	20,01%
Ejec	2400,00			2400,00	10,77%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de las estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Planta electrica	1	1
Total	4	4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Escuela - Finca San Fernando — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente Nº 331, Resolucion Nº0810

Certificado de Registro Minero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		NA x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		NA x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		NA x
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		NA x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		NA x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		NA x
EMISIONES:	SI		NO		NA x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		NA x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Salon de la Junta de accion Comunal Vereda la Atarraya

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de subbase
Se realizo ensayo de densidades.
Se verifico el replanteo de las obras a realizar.
Se realizo la funcion de concreto para huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalacion de formaletas
Instalacion de acero
Fundicion de concretos
Se solicitara la prorroga del convenio puesto que las obras no han culminado a la fecha, se realizara un ajuste al cronograma de obra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE META S FÍSICA S PROGRAMADA S VS META S FÍSICA S EJECUTADA S



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Atarraya, Fundicion de concreto ciclopeo



Vereda Atarraya, Instalacion de formaleta



Vereda Atarraya, Fundicion de concreto ciclopeo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 252122-402166 CND

Original: Informe mensual de la Interventoria. Archivo de Gestión del PROYECTO.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	
FECHA	6/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

SEMANA No.: 23 del 29/04/2024 al 2/05/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA		INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.	
			INTEGRANTES:		
CONVENIO No:	3809- 2023	VALOR INICIAL: $ 200.779.147,00	CONTRATO No:	4297-2023	VALOR INICIAL: $ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	29/11/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES: $ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200.779.147,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.779.147,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150.473.039,00	74,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 85.740.606,25	42,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (64.732.432,75)	-32,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.254.807,00	4,11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.189.755,00	99,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 121.508.852,55	60,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (78.680.903,45)	-39,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.151.725,13	2,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.204.545,78	5,08%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras Nº 1, 2, 3 y 4
Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.677,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: .....
PERIODO FACTURADO: .....
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -43,02%
Meta Física Ejecutada %: 56,98%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,40
Subbase Granular Clase C	m3	163,04
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	95,96
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	21,89
Acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	m3	4.461,08

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,40			4,40	0,07%
Ejec	4,40			4,40	0,07%
Prog	163,04			163,04	21,01%
Ejec	163,04			163,04	21,01%
Prog	95,96			95,96	52,97%
Ejec	34,18			34,18	18,87%
Prog	21,89			21,89	5,95%
Ejec	23,06			23,06	6,27%
Prog	4461,08			4461,08	20,01%
Ejec	2400,00			2400,00	10,77%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Planta electrica	1	1
Total	4	4

* El Interventor identifica la meta física agrobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Escuela - Finca San Fernando — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	.....	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente Nº 3.33, Resolución Nº0850
Certificado de Registro Minero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la informacion necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Salon de la Junta de accion Comunal Vereda la Atarraya

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra actier personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 28 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de subbase
Se realizo ensayo de densidades.
Se verifico el replanteo de las obras a realizar.
Se realizo la fundicion de concreto para huellas
Se aprobo la prorroga del convenio por 30 dias

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalacion de formaletas
Instalacion de acero
Fundicion de concretos

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema grafico será definido por el Interventor de acuerdo con la la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Atarraya, Instalacion de formaletas y fundicion de concretos



Vereda Atarraya, A listado de seccion para fundicion de vigas



Vereda Atarraya, Limpieza manual de laterales de via

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 252021-402166 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA


Durante este periodo se han iniciado obras, se cuenta con maquinaria placa compactadora tipo rana, mezcladora tipo trompo y vibrador de concreto.

4.3. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra

4.4. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra registro el estado del tiempo en el respectivo formato Invias.

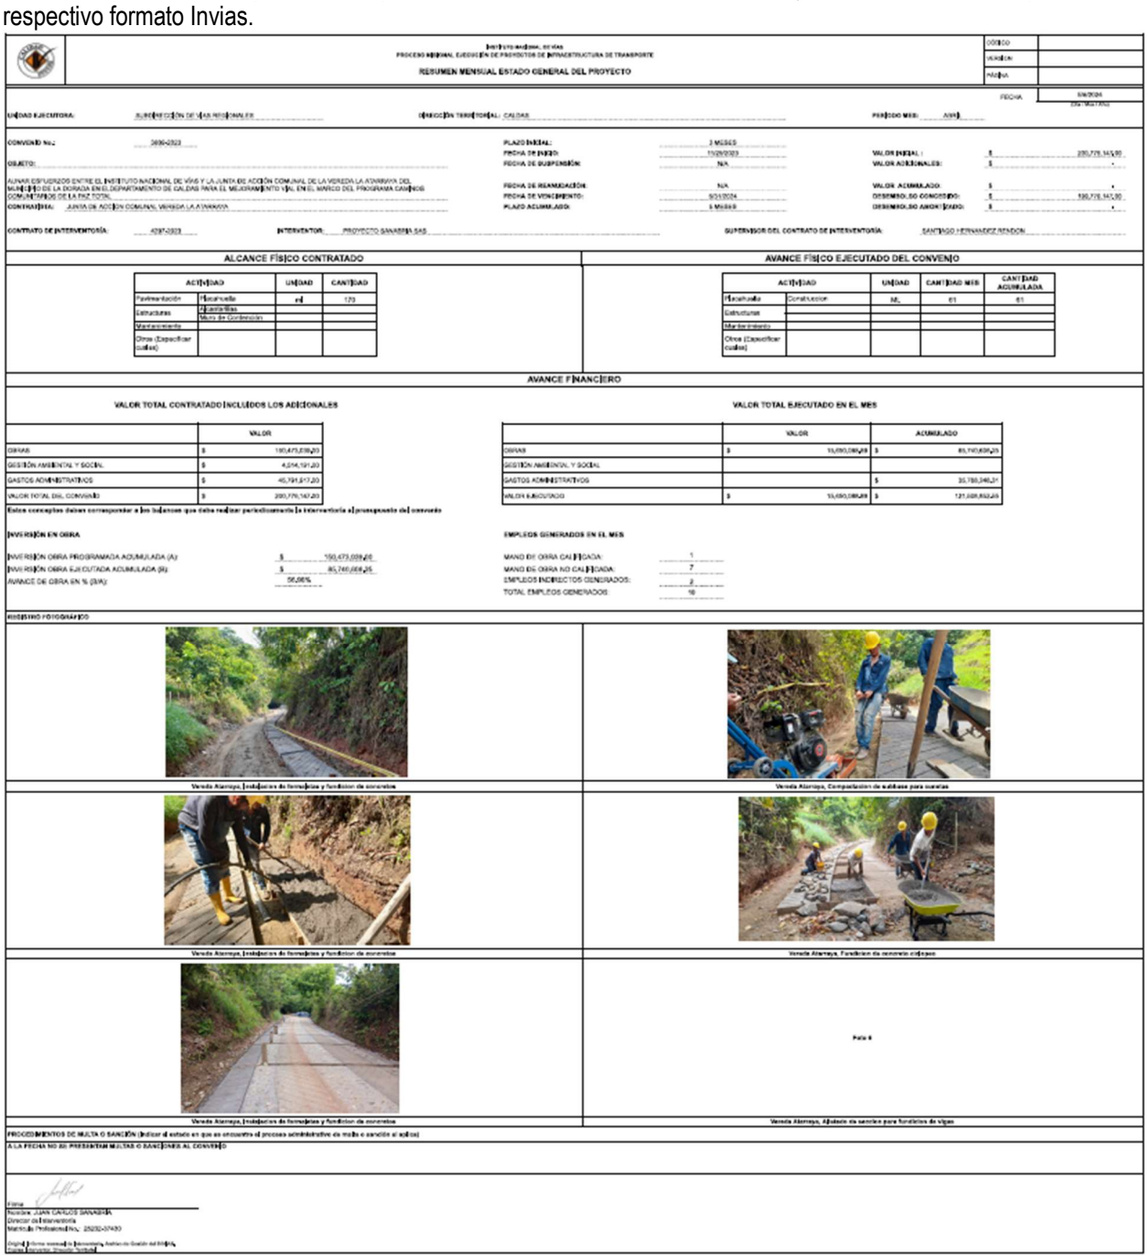

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placahuella	ml	123
Estructuras	Cuentillas		
Mantenimiento	Muro de Contención		
Otros (Especificar cuáles)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placahuella	Construccion	ML	61	61
Estructuras				
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuáles)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 180,473,059.20
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4,014,191.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45,791,917.20
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 230,279,167.20

Estos conceptos deben corresponder a los bajacon que debe realizar periodicamente la interventoria el presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 13,080,080.00	$ 83,740,834.25
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ 33,780,340.21
VALOR EJECUTADO	$ 13,080,080.00	$ 127,688,892.25

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A)	$ 180,473,059.20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	$ 83,740,834.25
AVANCE DE OBRA EN % (B/A)	56.06%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	10

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vereda Alarraja, Instalacion de formaletas y fundicion de concretos

Vereda Alarraja, Compactacion de subbase para cunetas

Vereda Alarraja, Instalacion de formaletas y fundicion de concretos

Vereda Alarraja, Fundicion de concreto ciclopeo

Vereda Alarraja, Instalacion de formaletas y fundicion de concretos

Vereda Alarraja, Alistando de sandas para fundicion de vigas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentra el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 25252-37430

4.5. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo no se cuenta con la realización de ensayos de laboratorio.

4.6. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se realizó ningún cambio en las polizas del convenio.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3809-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ATRRAYA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 29/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.779.147,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.779.147,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.155.829	12	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.038.957	12	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.233.744	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100291857

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	12	10	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071722 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.185.826	12	10	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.046.457	12	10	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.278.739	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100291857

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	12	10	2023	30	4	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071722 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobacion de polizas de la prorroga 01.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.7.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se han realizado movimientos en la cuenta

4.7.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC

4.7.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, se realizan comités de obra semanalmente

4.7.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo se realizó el segundo comité operativo con el fin de dar aprobación al plan de compras Nº1.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Información general del contrato de interventoría N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoría realizo las siguientes actividades:

- Se realizan comités de seguimiento de obra de manera semanal.
- Se verifica el correcto pago a proveedores y personal de obra
- Se realizo el seguimiento a los resultados de laboratorio

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoria no cuenta con personal especialista toda vez que no se han iniciado actividades de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se relacionan equipos o vehículos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/4/24 (Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abril

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4297-2023

INTERVENTORÍA: PROYECTOS SANABRIA SAS.

CONTRATO DE OBRA No. 4643- 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta	Motocicleta 150 DR Modelo 2021 Placa EZQ15F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta TRK 502X modelo 2023 Placa FIF85G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta Suzuki GE110 modelo 2015 Placa SCN72D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
Certificado de revision tecnomecanica desde 10/10/2023 hasta 10/10/2024
Soat desde 03/10/2023 hasra 02/10/2024

Certificado de revision tecnomecanica desde 17/06/2023 hasta 17/06/2024
Soat desde 30/09/2023 hasra 29/09/2024

Certificado de revision tecnomecanica desde 05/12/2023 hasta 05/12/2024
Soat desde 30/06/2023 hasra 29/06/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la interventoria cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoria" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoria" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-37430

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoria.
Matricula Profesional No.: 1702-125676 CLD

Original: Informe mensual de interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023

INTERVENTOR: PROYECTO SANABIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA

CONTRATO DE OBRA No.: 4643-2023 El Japon; 3809-2023 La Atarraya; 3908-2023 La Habana; 4053-2023 Buenavista

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL JAPON; JAC DE LA VEREDA LA HABANA; JAC DE LA VEREDA ATARRAYA; JAC DE LA VEREDA BUENAVISTA

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Comp Fliar Caldas

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	79,267,382	Director de Interventoria	$ 1,914,000	x	x	x			x		x			x								x				x	x	x						33%	proyecto sanabria	$ 1,914,000	$ 133,200	V	Compesar EPS	77787805	$ 76,600	Colfondos	77787805	$ 306,200	$ 76,600	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
3	RAMIREZ GUERRERO PAULA ANDREA	1,013,760,290	Residente Interventoria	$ 2,600,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	proyecto sanabria	$ 2,600,000	$ 181,000	V	Nueva EPS	77787805	$ 104,000	Colpensiones	77787805	$ 416,000	$ 104,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
4	OREJUELA ARCE JULIANA MARCELA	1,017,236,990	Profesional Ambiental	$ 560,000				x					x	x						x	x					x		x							20%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	Nueva EPS	77787805	$ 52,000	Colpensiones	77787805	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
5	COMETA JIMENEZ ARNOLDO	10,187,384	Inspector de obra	$ 1,350,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	proyecto sanabria	$ 1,350,000	$ 93,700	V	EPS Sura	77787805	$ 54,000	Colfondos	77787805	$ 216,000	$ 54,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
6	LOTERO ATEHORTUA MARTHA XIOMARA	1,055,837,067	Profesional SST	$ 1,350,000	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	proyecto sanabria	$ 1,350,000	$ 93,700	V	Salud Total EPS	77787805	$ 54,000	Porvenir	77787805	$ 216,000	$ 54,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 7,774,000																																													

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.:252023743OCND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/05/2024 (Día/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297 DE 2023 — INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: abr-24 — PROYECTO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARAEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"

CONVENIOS: 4643-2023, 3809-2023, 3980-2023, 4053-2023 — CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CALDAS : MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA JAPON 4643-2023 MUNICIPIO LA DORADA , VEREDA ATARRAYA 3809-2023 MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA HABANA 3980-2023 MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA BUENAVISTA 4053-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1260123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 79,541,151.00	$ -
2023	1260123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 36,326,998.00	
		TOTAL				$ 115,868,149.00	$ 78,359,825

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 115,868,149.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
2	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
3	ene-24	$ 10,701,800.00	$ 2,033,342.00	$ 12,735,142.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 103,133,007.00	$ 103,133,007.00		
4	feb-24	$ 8,306,000.00	$ 1,578,140.00	$ 9,884,140.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 93,248,867.00	$ 93,248,867.00		
5	mar-24	$ 12,511,800.00	$ 2,377,242.00	$ 14,889,042.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 78,359,825.00	$ 78,359,825.00		
6	abr-24	$ 14,645,800.00	$ 2,782,702.00	$ 17,428,502.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 60,931,323.00	$ 60,931,323.00		
	TOTALES	$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -		$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.17202-125676CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se presentaron cambios en las polizas actualizadas en el periodo pasado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA."

FECHA DE INICIO: 23/11/2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 79.541.150,93
VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.954.115,10	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.908.230,2	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 23.862.345,3	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/112023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.586.814,80	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.173.629,6	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 34.760.444,4	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Se realizó el Acta de modificación No. 4

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizo la verificación de los contratos del personal, los cuales cuentan con sus respectivas afiliaciones de seguridad social.
- Se dio inicio a las actividades de obra
- Se recomienda seguir con las indicaciones estipuladas en el diseño de mezcla

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO


Durante este periodo no se remitió correspondencia oficial directamente al contratista.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS







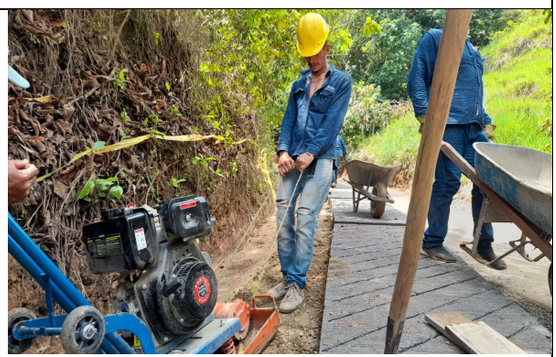



8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se anexa la bitácora de obra correspondiente al mes de abril en formato PDF.

CONVENIO N.º 3980-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA

IV. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3980-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoria No. 4297-2023 **Interventoría:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** abr/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	77
1	**INTRODUCCIÓN**		78
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		78
2.1	Localización		78
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		79
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		79
2.4	Características técnicas del proyecto		80
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		80
3.1	Información general del contrato		83
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		83
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		84
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		84
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		84
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	84
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	89
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		92
5.1	Información general del contrato		92
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		92
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		93
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	93
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	95
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	96
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	99
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		96
8	**Anexos**		96
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		96
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		96
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ABRIL

CONVENIO No.: 3980-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 29/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.765.816,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 199.765.816,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placahuella	ml	166
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placahuella	Construccion	ML	67	67
Estructuras				
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.527.845,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.515.835,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.722.136,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.765.816,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 44.463.130,94	$ 70.691.017,17
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 22.135.790,65	$ 30.501.594,49
VALOR EJECUTADO	$ 66.598.921,58	$ 101.192.611,66

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 150.527.845,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 70.691.017,17
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 46,96%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda La Habana, Fundicion de concreto



Vereda La Habana, Compactacion de subbase



Vereda La Habana, Instalacion de acero de refuerzo



Vereda La Habana, Fundicion de concreto



Vereda La Habana, Fundicion de concreto



Vereda La Habana, Instalacion de acero de refuerzo y formaleta

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-613-2023, se celebra el convenio 3809-2023 que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 06** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda La Habana se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.632200 Longitud -74.783800
Punto Final: Latitud 5.641743 Longitud -74.782085



GlobalID EJE	ee6d9f75-0913-4bc5-9f50-5a07f6a226a0
Código Vía	17380_001
Nombre Vía	Vía el tigre- vereda la habana
Categoría	3
Tipo Eje	1
Observaciones	Necesitan muro
Longitud Tramo (Km)	1,18
Fecha registro	2/9/2023, 15:26
Usuario	territorial.caldas

Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en el corregimiento de La Habana
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA HABANA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Directamente se afecta el municipio de la Dorada en el departamento de Caldas, el cual se compone el 10% de población rural, y este tipo de obras crean beneficios de movilidad, transitabilidad, en general mejora las condiciones actuales de comunicación entre veredas, principalmente al ejecutar placas huellas y obras complementarias, que garanticen mayor tiempo de obras realizadas con calidad.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,** el cual comprende un tramo de aproximadamente 1180 metros lineales, el cual se ve afectado durante el invierno en diferentes tramos los cuales son señalados por la comunidad que transita a diario por esta via.

El tramo a intervenir en la vereda La Habana se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.632200 Longitud -74.783800
Punto Final: Latitud 5.641743 Longitud -74.782085



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en la vereda La Habana.

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en la vereda La Habana, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 3980-2023 que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural de la vereda La Habana a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**


Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 8.1.3 ESTRUCTURA TIPO PLACA HUELLA, del cual se copia textualmente:

"La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.


Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2.

En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa, cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando vehículos tipo C3, C2 y vehículos ligeros (camionetas y automóviles). También se consideró que la placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para identificar la mejor combinación posible. En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.

Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**




SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA (CORTE B–B)
SIN ESCALA

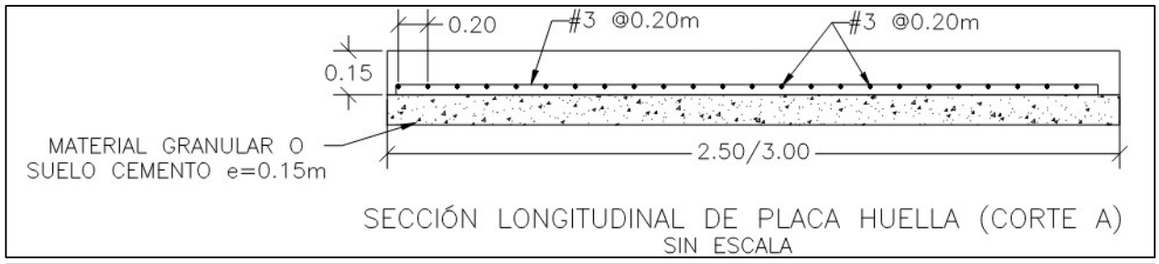


SECCIÓN LONGITUDINAL DE PLACA HUELLA (CORTE A)
SIN ESCALA




SECCIÓN LONGITUDINAL VIGA RIOSTRA
SIN ESCALA

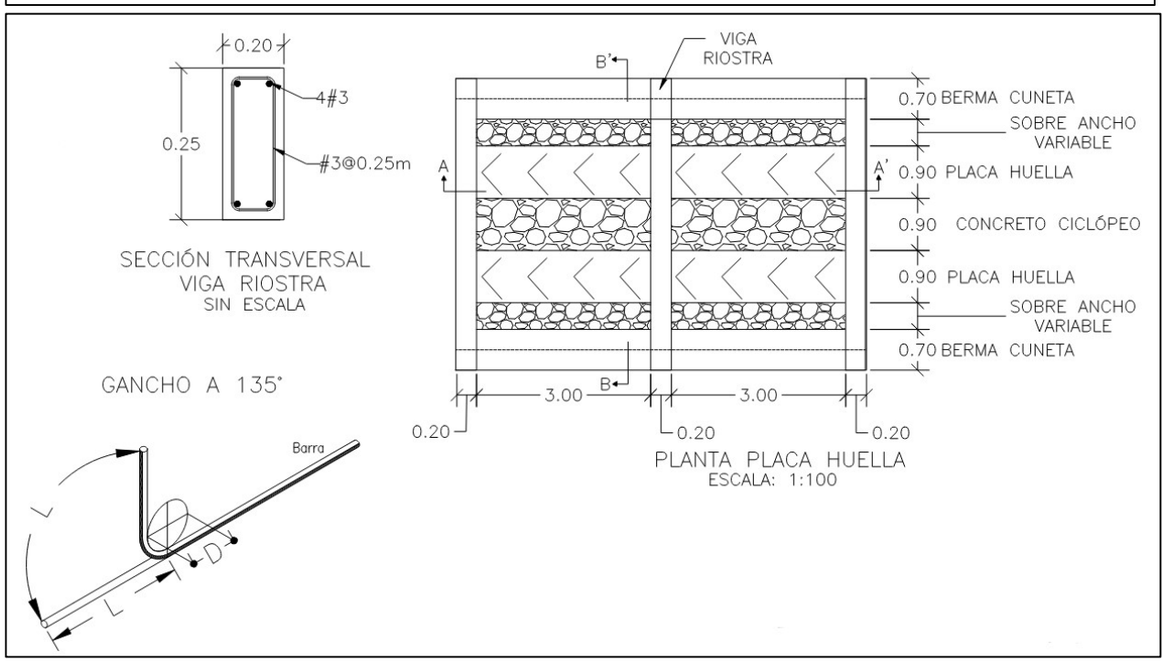


PLANTA PLACA HUELLA
ESCALA: 1:100

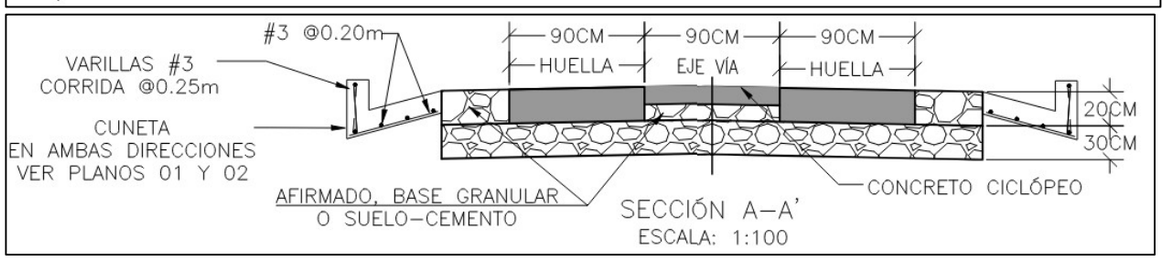

SECCIÓN A–A'
ESCALA: 1:100

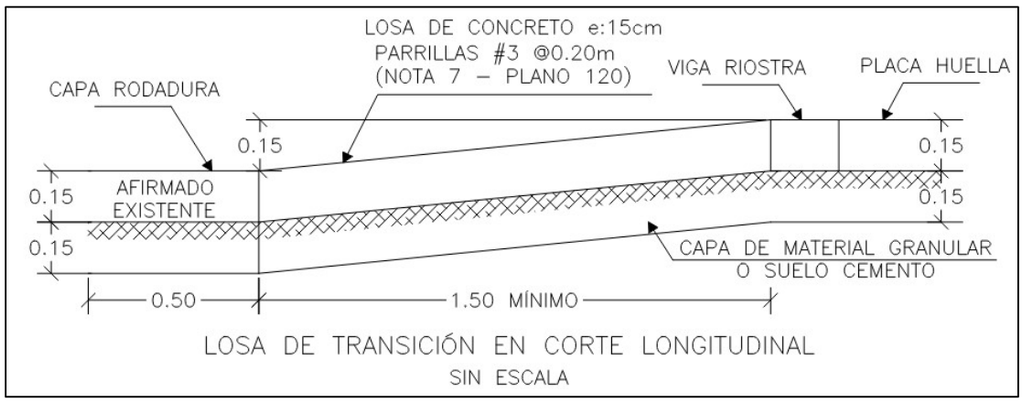

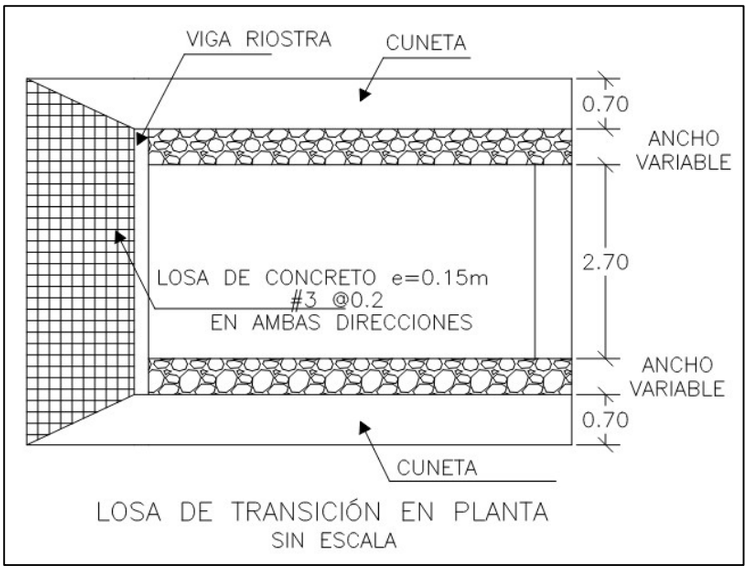

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Información general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3980 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA
NIT:	810.005.741-0
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	1180 metros lineales
Valor inicial:	$ 200.765.816,00
Adiciones:	$0,00
Valor total	$ 200.765.816,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapa de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	29/11/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorroga 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, Se realizaron las siguientes actividades:
Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalación de subbase
Instalación de formaleteria
Fundición de concreto
Instalación de acero de refuerzo
Se aprobó la prórroga del convenio por 30 días
mejoramiento del terreno afectado por las fuertes lluvias presentadas

3.3. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizó el seguimiento del plan de gestión ambiental y formatos sugeridos por INVIAS, en colaboración con la Junta de Acción.

3.4. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, se realizó el seguimiento al cronograma del plan de gestión social el cual se avaló y contempla todas las áreas de influencia directa de la obra, normativas de la documentación iniciales específicas para cada junta de acción comunal.

3.5. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron ítems no previstos en la ejecución del convenio.

3.6. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoría evidencia un estado de avance en la obra y tomo las siguientes acciones:

- Se registro semanalmente el avance de las obras ejecutadas, se realizaron medidas preliminares y verificación de espesores.

- Se tuvo comunicación constante con los integrantes de la junta con el fin de resolver las dudas acerca de los pagos del personal y proveedores

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, tampoco se ha remitido un cronograma por parte del contratista de obra, por otro lado, desde la interventoría se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoría N.º 4297-2023

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondiente al mes de abril 2024, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1. Informe semanal 19 – 29 Mar 2024 al 04 Abr 2024
2. Informe semanal 20 - 05 al 11 Abr 2024
3. Informe semanal 21 - 12 al 18 Abr 2024
4. Informe semanal 22 - 19 al 25 Abr 2024
5. Informe semanal 23 – 26 Abr 2024 al 02 May 2024

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO		
	VERSIÓN		
	PAGINA		
	FECHA	6/04/2024 (dia / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 19 del 29/03/2024 al 4/04/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3980- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.765.816,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.765.816,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BASICO CONVENIO (A):	$ 200.765.816,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 120.314.263,80	59,93%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 30.551.040,11	15,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (89.763.223,82)	-44,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.596.561,84	3,78%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 157.862.369,65	78,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 51.539.883,22	25,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (106.322.486,43)	-52,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.897.653,41	8,91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA I	$ 5.039.102,70	2,51%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1 y 2

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.782.742,00	11,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.195.685,00	2,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.195.685,00	2,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 79,93% — Avance o Atraso Físico %: -59,63%
Meta Física Ejecutada %: 20,30%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,32
Subbase Granular Clase C	m3	159,29
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	66,22
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (0)	m3	13,43
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	m3	3619,75

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,32			4,32	0,07%
Ejec	4,32			4,32	0,07%
Prog	159,29			159,29	22,05%
Ejec	80,00			80,00	11,07%
Prog	66,22			66,22	38,41%
Ejec	4,50			4,50	2,53%
Prog	13,43			13,43	3,79%
Ejec	1,20			1,20	0,34%
Prog	3.619,75			3.619,75	15,81%
Ejec	1.456,22			1.456,22	6,28%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Escuela - Villa manantial — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACION:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0850

Certificado de Registro Minero RMN GDOC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	NA	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	NA	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	NA	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	NA	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	NA	x
EMISIONES:	SI	NO	NA	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	NA	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la información necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de subbase
Instalacion de formaleteria
Fundicion de concreto
Instalacion de acero de refuerzo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concreto
Instalacion de formaleteria
Instalacion de acero de refuerzo

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS META S FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda La Habana, adecuacion del terreno por lluvias



Vereda La Habana, Instalacion de acero de refuerzo



Vereda La Habana, Fundicion de concretos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramírez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matricula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del Proceso
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO		
	VERSIÓN		
	PAGINA		
	FECHA	14/04/2024 (dia / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 20 del 5/04/2024 al 11/04/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3980- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.765.816,00	CONTRATO No.	4257-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.765.816,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BASICO CONVENIO (A):	$ 200.765.816,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 130.474.987,57	67,46%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 40.592.831,78	20,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (94.782.055,80)	-47,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.596.561,84	3,78%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 175.760.023,06	87,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 64.302.061,67	32,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (111.457.761,39)	-55,52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.897.653,41	8,91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA I	$ 12.762.168,45	6,36%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1, 2 Y 3

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.864,25	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.864,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.864,25	4,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 90,00% — Avance o Atraso Físico %: -62,97%
Meta Física Ejecutada %: 27,03%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,32
Subbase Granular Clase C	m3	159,29
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	79,99
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (D)	m3	16,11
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	m3	4243,84

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,32			4,32	0,07%
Ejec	4,32			4,32	0,07%
Prog	159,29			159,29	22,05%
Ejec	80,00			80,00	11,07%
Prog	79,99			79,99	45,03%
Ejec	13,40			13,40	7,54%
Prog	16,11			16,11	4,55%
Ejec	7,32			7,32	2,07%
Prog	4.243,84			4.243,84	18,31%
Ejec	1.456,22			1.456,22	6,28%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Escuela - Villa manantial — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACION:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0850

Certificado de Registro Minero RMN GDOC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la información necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de subbase
Instalacion de formaleteria
Fundicion de concreto
Instalacion de acero de refuerzo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concreto
instalacion de formaleteria
Instalacion de acero de refuerzo

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS META SÍSICA EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda La Habana, Fundicion de concreto en huellas



Vereda La Habana, Instalacion de acero de refuerzo



Vereda La Habana, Fundicion de concreto

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matricula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del Proceso
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO		
	VERSIÓN		
	PAGINA		
	FECHA	22/04/2024 (dia / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 21 del 12/04/2024 al 19/04/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3980- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.765.816,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.765.816,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BASICO CONVENIO (A):	$ 200.765.816,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 147.393.715,90	73,42%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 51.877.145,46	25,84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (95.516.570,44)	-47,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.596.561,84	3,78%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189.819.854,31	94,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77.044.919,45	38,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (112.774.734,86)	-56,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.859.631,25	6,90%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA I	$ 12.742.867,78	6,35%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1, 2 Y 3

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.077,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 97,92% — Avance o Atraso Físico %: -63,45%
Meta Física Ejecutada %: 34,46%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,32
Subbase Granular Clase C	m3	159,29
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	91,75
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (D)	m3	18,80
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	m3	4368,66

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,32			4,32	0,07%
Ejec	4,32			4,32	0,07%
Prog	159,29			159,29	22,05%
Ejec	80,00			80,00	11,07%
Prog	91,75			91,75	51,85%
Ejec	23,29			23,29	13,11%
Prog	18,80			18,80	5,30%
Ejec	8,01			8,01	2,26%
Prog	4.368,66			4.368,66	18,84%
Ejec	1.842,82			1.842,82	7,95%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Escuela - Villa manantial — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACION:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0850

Certificado de Registro Minero RMN GDOC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la información necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	15	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realiso la socializacion del proyecto el dia 26 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de subbase
Instalacion de formaleteria
Fundicion de concreto
Instalacion de acero de refuerzo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concreto
instalacion de formaleteria
Instalacion de acero de refuerzo

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS META S FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda La Habana, Fundicion de concreto en huellas



Vereda La Habana, Instalacion de acero de refuerzo



Vereda La Habana, Compactacion de subbase

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matricula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del Proceso
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	
FECHA	25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **22** del **19/04/2024** al **25/04/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3980- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.765.816,00	CONTRATO No.	4257-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.765.816,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BASICO CONVENIO (A):	$ 200.765.816,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150.527.945,00	74,98%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 58.559.638,76	29,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (91.969.206,24)	-45,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.596.561,84	3,78%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.540.577,36	97,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 86.291.696,00	42,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (109.248.881,35)	-54,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.920.923,04	2,95%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA I	$ 9.246.778,55	4,61%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras Nº 1, 2 Y 3, se esta realizando la revision del plan de compras 4

Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.677,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.664,25	4,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -61,09%

Meta Física Ejecutada %: 38,91%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,32
Subbase Granular Clase C	m3	159,29
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	94,10
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (D)	m3	21,48
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	m3	4368,66

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,32			4,32	0,07%
Ejec	4,32			4,32	0,07%
Prog	159,29			159,29	22,05%
Ejec	96,89			96,89	13,41%
Prog	94,10			94,10	52,96%
Ejec	23,29			23,29	13,11%
Prog	21,48			21,48	6,05%
Ejec	12,83			12,83	3,62%
Prog	4.368,66			4.368,66	18,84%
Ejec	2.016,00			2.016,00	8,70%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Planta eléctrica	1	1
Total	4	4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Escuela - Villa manantial — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente Nº 331, Resolucion N°0850

Certificado de Registro Minero RMN GDOC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la información necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	15	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de subbase
Instalacion de formaleteria
Fundicion de concreto
Instalacion de acero de refuerzo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concreto
Instalacion de formaleteria
Instalacion de acero de refuerzo
Se solicitara la prorroga del convenio puesto que las obras no han culminado a la fecha, se realizara un ajuste al cronograma de obra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS META FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda La Habana, Instalacion de formaleta



Vereda La Habana, Fundicion de concreto



Vereda La Habana, Fundicion de concreto

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramírez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matricula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO:
VERSIÓN:
PAGINA:

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 23 del 26/04/2024 al 2/05/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SA S.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No:	3980- 2023	VALOR INICAL:	$ 200.765.816,00	CONTRATO No:	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.765.816,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.765.816,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150.627.845,00	74,98%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 70.691.017,17	35,21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (79.936.827,83)	-39,77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.596.561,94	3,78%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 200.765.816,00	100,00%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 101.192.511,66	50,40%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (99.573.204,34)	-49,60%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.225.238,65	2,60%
INVERSION EJECUTADA EN LA S	$ 14.900.915,65	7,42%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio y el plan de compras N° 1, 2, 3 y 4
Los valores consignados en el cuadro corresponden a la ejecucion de actividades realizadas en la semana y adquisicion de materiales en obra

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.810.677,00	18,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.452.669,25	4,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.452.669,25	4,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -53,04%
Meta Física Ejecutada %: 46,96%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,32
Subbase Granular Clase C	m3	159,29
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	94,10
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m3	21,48
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	m3	4368,66

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,32			4,32	0,07%
Ejec	4,32			4,32	0,07%
Prog	159,29			159,29	22,05%
Ejec	96,89			96,89	13,41%
Prog	94,10			94,10	52,96%
Ejec	32,79			32,79	18,46%
Prog	21,48			21,48	6,06%
Ejec	17,83			17,83	5,03%
Prog	4.368,66			4.368,66	18,94%
Ejec	2.316,00			2.316,00	9,99%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluida la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa vibratoria Tipo Rana	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
vibrador de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Escuela - Villa manantial — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Guarinocito-Balsones	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
Corregimiento Guarinocito, La Dorada, Caldas	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Corporacion Autonoma Regional de Caldas, Corpocaldas, Expediente N° 331, Resolucion N°0810
Certificado de Registro Minero RMN GDCC-01

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: No se requieren permisos para las obras a ejecutar debido al bajo impacto ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha se ha verificado la información necesaria para dar inicio a las actividades del PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de figurado de aceros.
Se realizo la instalacion de subbase
Instalacion de formaleteria
Fundicion de concreto
Instalacion de acero de refuerzo
Se aprobo la prorroga del convenio por 30 dias
mejoramiento del terreno afectado por las fuertes lluvias presentadas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundicion de concreto
Instalacion de formaleteria
Instalacion de acero de refuerzo

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE META S FÍSICA S PROGRAMADA S VS META S FÍSICA S EJECUTADA S



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Vereda La Habana, mejoramiento del terreno que presentaba acolchonamientos


Vereda La Habana, Instalacion de acero de refuerzo y formaleta


Vereda La Habana, Replanteo de cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se han realizado visitas de inspeccion con el fin de verificar la correcta realizacion de las actividades ejecutadas, asi como el cumplimiento de la norma.
Se realiza acompañamiento a la junta con el fin de evidenciar las actuaciones necesarias para cumplir con el cronograma estipulado

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Administración Documental. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo se han iniciado obras, se cuenta con maquinaria placa compactadora tipo rana, mezcladora tipo trompo y vibrador de concreto.

4.3. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra

4.4. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra registro el estado del tiempo en el respectivo formato Invias.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO | VERSION | VIGENCIA | FECHA: 5/9/2024 (DD/ MM/ AAA)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — PERIODO MES: ABRIL

CONVENIO No.: 3666-2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 11/04/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/10/2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL: $ 209.766.515,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 159.766.515,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4287-2023 — INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SANTIAGO HERNANDEZ HENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa huella	ml	166
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuáles)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa huella	Construcción	ML	67	67
Estructuras					
Mantenimiento					
Otros (Especificar cuáles)					

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 166.527.845,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.515.515,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.722.154,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 209.766.514,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 44.463.133,34	$ 70.691.617,17
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 22.135.759,55	$ 30.631.894,43
VALOR EJECUTADO	$ 66.598.892,89	$ 101.192.911,60

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 160.527.845,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 70.691.617,17
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 44,04%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



Vereda La Habana, Fundición de concreto

Vereda La Habana, Compactacion de subbase





Vereda La Habana, Instalacion de acero de refuerzo

Vereda La Habana, Fundición de concreto





Vereda La Habana, Fundicion de concreto

Vereda La Habana, Instalacion de acero de refuerzo y formaleta

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar si existe en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-47430

Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del Invías.
Copias: Supervisor, Director Territorial

4.5. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo no se cuenta con la realización de ensayos de laboratorio.

4.6. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se realizó ningún cambio en las pólizas del convenio.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3809-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HABANA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 23/11/2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.765.816,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.765.816,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.153.163	19	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.038.291	19	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.229.745	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290003

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	19	10	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071093 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 0/01/1900

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 06

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.185.826	19	10	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.046.457	19	10	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.278.739	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290003

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	12	10	2023	30	4	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071093 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobacion de polizas.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.7.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se han realizado movimientos en la cuenta

4.7.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC

4.7.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo se dio inicio a las obras, se realizan comités de obra semanalmente

4.7.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo se realizó el segundo comité operativo con el fin de dar aprobación al plan de compras Nº1.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Información general del contrato de interventoría N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoría realizo las siguientes actividades:

- Se realizan comités de seguimiento de obra de manera semanal.
- Se verifica el correcto pago a proveedores y personal de obra
- Se realizo el seguimiento a los resultados de laboratorio

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoria no cuenta con personal especialista toda vez que no se han iniciado actividades de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se relacionan equipos o vehículos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/4/24 (DÍA/MES/AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abril

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4297-2023

INTERVENTORÍA: PROYECTOS SANABRIA SAS.

CONTRATO DE OBRA No. 4643- 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta	Motocicleta 150 DR Modelo 2021 Placa EZQ15F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta TRK 502X modelo 2023 Placa FIF85G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta Suzuki GE110 modelo 2015 Placa SCN72D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
Certificado de revision tecnomecanica desde 10/10/2023 hasta 10/10/2024
Soat desde 03/10/2023 hasta 02/10/2024

Certificado de revision tecnomecanica desde 17/06/2023 hasta 17/06/2024
Soat desde 30/09/2023 hasta 29/09/2024

Certificado de revision tecnomecanica desde 03/12/2023 hasta 03/12/2024
Soat desde 30/06/2023 hasta 29/06/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoria cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoria" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoria" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-37430

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoria.
Matricula Profesional No.: 1702-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Direccion Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPMIN1-N-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 — **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONTRATO DE OBRA No.: 4643-2023 El Japon; 3809-2023 La Atarraya; 3908-2023 La Habana; 4053-2023 Buenavista — **CONTRATISTA:** JAC DE LA VEREDA EL JAPON; JAC DE LA VEREDA LA HABANA; JAC DE LA VEREDA ATARRAYA; JAC DE LA VEREDA BUENAVISTA

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comp Fliar Caldas

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	79,267,382	Director de Interventoria	$ 1,914,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	33%	proyecto sanabria	$ 1,914,000	$ 133,200	V	Compesar EPS	77787805	$ 76,600	Colfondos	77787805	$ 306,200	$ 76,600	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
3	RAMIREZ GUERRERO PAULA ANDREA	1,013,760,290	Residente Interventoria	$ 2,600,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 2,600,000	$ 181,000	V	Nueva EPS	77787805	$ 104,000	Colpensiones	77787805	$ 416,000	$ 104,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
4	OREJUELA ARCE JULIANA MARCELA	1,017,236,990	Profesional Ambiental	$ 560,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	20%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	Nueva EPS	77787805	$ 52,000	Colpensiones	77787805	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
5	COMETA JIMENEZ ARNOLDO	10,187,384	Inspector de obra	$ 1,350,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 1,350,000	$ 93,700	V	EPS Sura	77787805	$ 54,000	Colfondos	77787805	$ 216,000	$ 54,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
6	LOTERO ATEHORTUA MARTHA XIOMARA	1,055,837,067	Profesional SST	$ 1,350,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 1,350,000	$ 93,700	V	Salud Total EPS	77787805	$ 54,000	Porvenir	77787805	$ 216,000	$ 54,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 7,774,000																

El interventor adjunta la certificación de fecha 30/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.:252023743OCND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSION	1
		PAGINA	

FECHA: 02/05/2024 (Dia/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297 DE 2023 — INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: abr-24 — PROYECTO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARAEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"

CONVENIOS: 4643-2023, 3809-2023, 3980-2023, 4053-2023 — CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CALDAS : MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA JAPON 4643-2023; MUNICIPIO LA DORADA , VEREDA ATARRAYA 3809-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA HABANA 3980-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA BUENAVISTA 4053-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1260123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 79,541,151.00	$ -
2023	1260123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 36,326,998.00	
			TOTAL			$ 115,868,149.00	$ 78,359,825

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 115,868,149.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
2	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
3	ene-24	$ 10,701,800.00	$ 2,033,342.00	$ 12,735,142.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 103,133,007.00	$ 103,133,007.00		
4	feb-24	$ 8,306,000.00	$ 1,578,140.00	$ 9,884,140.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 93,248,867.00	$ 93,248,867.00		
5	mar-24	$ 12,511,800.00	$ 2,377,242.00	$ 14,889,042.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 78,359,825.00	$ 78,359,825.00		
6	abr-24	$ 14,645,800.00	$ 2,782,702.00	$ 17,428,502.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 60,931,323.00	$ 60,931,323.00		
TOTALES		$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse estan o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -		$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 46,165,400.00	$ 8,771,426.00	$ 54,936,826.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.17202-125676CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se presentaron cambios en las polizas actualizadas en el periodo pasado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA."

FECHA DE INICIO: 23/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 79.541.150,93

VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.954.115,10	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.908.230,2	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 23.862.345,3	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/112023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.586.814,80	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.173.629,6	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 34.760.444,4	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Durante este periodo se realizó el acta de modificación No. 4

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



- Se realizo la verificación de los contratos del personal, los cuales cuentan con sus respectivas afiliaciones de seguridad social.
- Se dio inicio a las actividades de obra
- Se recomienda seguir con las indicaciones estipuladas en el diseño de mezcla

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió la correspondencia oficial directamente al contratista.


8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

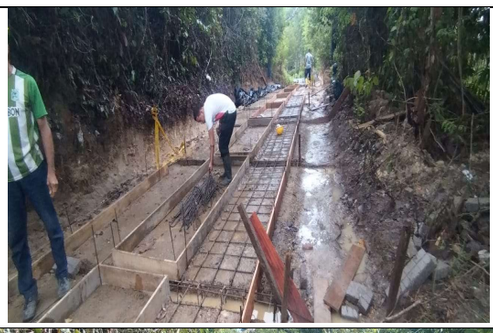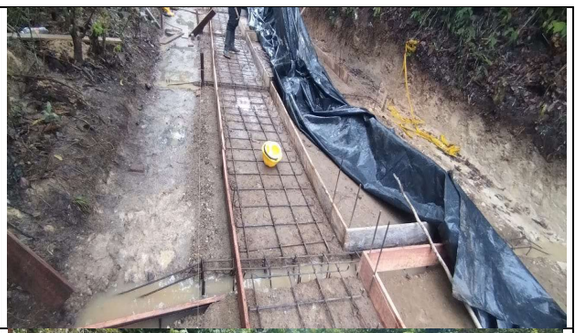





8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

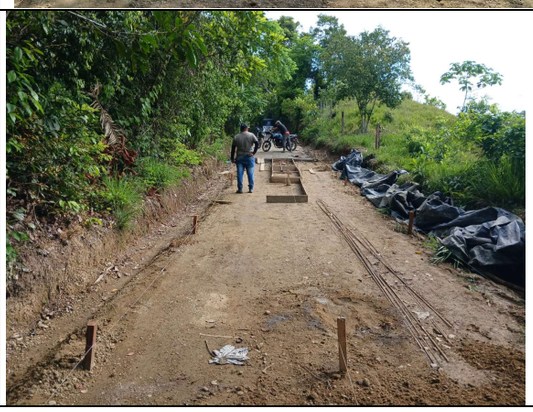Se anexa la bitácora de obra correspondiente al mes de marzo en formato PDF

Ing. Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND
