Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**6**				FECHA:	**22**	de	**OCTUBRE**	de	**2024**
PERIODO:	DEL	8	de	SEPTIEMBRE	de	2024	AL	7	de	OCTUBRE	de	2024

CONTRATO No:	**3230**	DE	**2023**	REGISTRO BP Y P No	**2022004150318**

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGÜI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se ubica en el corredor vial que conduce de Moniquirá al municipio de Togüi, en el departamento de Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA


NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S – NIT. 900.916.608-4	**LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR - CC.52.461.611**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA :	NOMBRE DEL SUPERVISOR
CONSORCIO MONIQUIRA - NIT. 901.740.222-1	**ING. JOSE LEONARDO ALVAREZ**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	07 MESES

VALOR INICIAL:	**$ 361,963,536.00**	VALOR ADICIONALES:	**$ 0.00**	VALOR TOTAL:	**$ 361,963,536.00**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	**7**	de	**DICIEMBRE**	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**7**	de	**DICIEMBRE**	de	**2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE AVANCE CTO INTERV.	**75.8%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**64.3%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**70.5%**



Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA						
No PÓLIZA	CSC - 100035562	7/06/2024	ANEXO No.	5	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	8	4	2024	9	6	2025	$ 72,392,707.20
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8	4	2024	8	12	2027	$ 18,098,176.80
CALIDAD DEL SERVICIO	8	12	2024	8	12	2029	$ 72,392,707.20

Observaciones y aclaraciones: ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS (ANEXO 0) EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN CON FECHA 07/06/2024.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	8	4	2024
Reunion con SGR para inicio de tramite de ajuste de proyecto	13	8	2024
Mesa de trabajo con especialistas en geotecnia	29	8	2024
Mesa de trabajo con SGR observaciones de entrega parcial de documentacion	3	9	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Verificación de actividades ejecutadas en obra	MURO 3
Verificación de actividades ejecutadas en obra	MURO 6
Verificación de actividades ejecutadas en obra	MURO 7
Verificación de actividades ejecutadas en obra	MURO 12
Revisión de documentación entregada por el contratista	N/A
Verificación de afiliaciones del personal a seguridad social	N/A
Registro diario en bitácora de obra	N/A
Control tecnico a excavaciones , perforaciones, amarre de hierro en Muros 2,4,8	N/A

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
AUTOMOVIL EIQ365	TRANSPORTE	100%	
CAMPAMENTO OFICINA		100%	

Observaciones y aclaraciones:

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo (NO APLICA)				$ 0.00
Acta Parcial No. 1				$ 117,239,989.00
Acta Parcial No.				
Acta Parcial No.				
Acta Parcial No.				
Acta Parcial No.				
Acta Recibo Final a Satisfacción				
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				$ 117,239,989.00
TOTAL SALDO NO EJECUTADO				$ 244,723,547.00

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
GIC-CB-191-23 09/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RESPUESTA COMUNICACIÓN CMONIQUIRA-CE-172 - ORDEN DE GIRO NO. 42 A 47 - ANTICIPO Y CMONIQUIRA-CE-171 MODIFICIACION PLAN DE	SE DA RESPUESTA A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA
GIC-CB-192-23 09/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SA	SOLICITUD PROGRAMACION DE OBRA	SE REALIZA LA SOLCIITUD AL CONTRATISTA
GIC-CB-193-23 09/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	REMISION MODIFICIACION PLAN DE INVERCION DEL ANTICIPO V9	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-194-23 09/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	OBSERVACIONES COMPONENTE GEOTECNICO MODIFICACION DE OBRA NO. 01	E DA RESPUESTA A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA
GIC-CB-195-23 09/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME SEMANAL NO. 22 CTO 3230-2023	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CMONIQUIRA-CE-171 09/09/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	REAJUSTE PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO.	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
CMONIQUIRA-CE-172 09/09/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	DOCUMENTOS PARA LA APROBACIÓN Y PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR COMPRAS REALIZADAS Y/O PAGO DE ANTICIPOS – ORDENES DE GIRO	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
S-2024-001377-SECINF 09/09/24	GOBERNACION DE BOYACA	CONTRATO DE INTERVENTORIA 3230 DE 2023- DEVOLUCION N°01 -ACTA PARCIAL 01, POR PARTE DE SECRETARIA DE HACIEND	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

GIC-CB-196-23 10/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SUBSANACIÓN ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO. 1	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-197-23 10/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	OBSERVACIONES COMPONENTE PAVIMENTOS MODIFICACION DE OBRA NO. 01	SE DA RESPUESTA A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA
CMONIQUIRA-CE-174 10/09/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	ENTREGA INFORME SEMANAL NO. 22	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
GIC-CB-198-23 11/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	REMISIÓN INFORMES SEMANALES NO. 20, 21 Y 22 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-199-23 11/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	OBSERVACIONES COMPONENTE GEOTECNICO MODIFICACION DE OBRA NO. 01	SE DA RESPUESTA A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA
GIC-CB-200-23 12/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	OBSERVACIONES MUROS DE CONTENCION 7, 12 Y 14	SE DA RESPUESTA A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA
CMONIQUIRA-CE-176 13/09/24	CONSORCIO MONIQUIRA	ENTREGA INFORME MENSUAL NO 5	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
GIC-CB-201-23 17/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	REMISIÓN INFORME MENSUAL NO. 5 DE INTERVENTORÍA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-202-23 24/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RESPUESTA COMUNICACIÓN CMONIQUIRA-CE-161 - PLAN DE GERENCIA VERSIÓN 2	SE DA RESPUESTA A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA
CMONIQUIRA-CE-179 26/09/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	ACTA DE OBRA NO. 1	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
CMONIQUIRA-CE-178 26/09/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
GIC-CB-206-23 27/09/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME SEMANAL NO. 24 CTO 3230-2023	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-207-23 02/10/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RESPUESTA COMUNICACIÓN CMONIQUIRÁ-CE-178 SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y MODIFICACION 1	SE DA RESPUESTA A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA

GIC-CB-208-23 02/10/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	REMISIÓN CERTIFICADO DE PAGO DE LOS RENDIMIENTOS DEL ANTICIPO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024.	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-209-23 02/10/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOLICITUD LIQUIDACION CONTRATO DE FIDUCIA	SE REALIZA LA SOLCIITUD AL CONTRATISTA
CMONIQUIRA-CE-180 02/10/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	ENVÍO DE INFORME MENSUAL DE ANTICIPO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-210-23 03/10/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME SEMANAL NO. 25 CTO 3230-2023	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-211-23 04/10/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOLICITUD DE AJUSTE DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CONCEPTO DEL ESPECIALISTA	SE REALIZA LA SOLCIITUD AL CONTRATISTA
GIC-CB-212-23 07/10/24	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOLICITUD MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA Y ADICIÓN DE RECURSOS	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA TRAMITE
CMONIQUIRA-CE-181 07/10/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	SUBSANACIÓN MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA Y ADICIÓN DE RECURSOS POR AMPLIACIÓN DE META FÍSICA.	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍ

Observaciones y aclaraciones: Se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el periodo del informe

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
TATIANA ESTHER RODRÍGUEZ DE LA OSSA	52264618	x	x	x	1	9	2024			
CESAR CAMILO PARDO RUIZ	7176397	x	x	x	1	9	2024			
JAIRO ANDRÉS MEZA ROSAS	13874430	x	x	x	1	9	2024			
JULIAN ARNULFO DIMATE MICAN	79.185.182	x	x	x	1	9	2024			
IVAN DARÍO CRUZ SANCHEZ	1.016.110.151	x	x	x	1	9	2024			
OLGA CECILIA ACOSTA DÕAZ	52.258.833	X	X	X	1	9	2024			

Observaciones y aclaraciones: Para el presente informe NO APLICA verificación de pagos, se adjunta informe cero de interventoria con evidencias de afiliación del personal mínimo

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TATIANA ESTHER RODRÍGUEZ DE LA OSSA	52.264.618
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CESAR CAMILO PARDO RUIZ	7.176.397
ESPECIALISTA GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAES	79.758.293
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JAIRO ANDRÉS MEZA ROSAS	13.874.430
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	OLGA CECILIA ACOSTA DÕAZ	52.258.833
TOPÓGRAFO	JULIAN ARNULFO DIMATE MICAN	79.185.182
CADENERO 1	IVAN ALBERTO MORENO PARRA	1.014.193.107
CADENERO 2	IVAN DARÍO CRUZ SANCHEZ	1.016.110.151

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se verifica que todo el personal cuente con sus respectivos elementos de protección personal y se verifica la implementación del Plan de Manejo del Tránsito aprobado por la gobernación.	N/A
Se realiza verificación de afiliaciones y seguridad social del personal que se encuentra en obra.	N/A

Se revisa documentacion de la camioneta con placa HGT066 y equipo de perforacion sin ninguna observacion	N/A

Observaciones y aclaraciones

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Zapatas muro No. 3 concreto 4000 psi	19	9	2024	OK
Pantallas muro No. 7 concreto 4000 psi	23	9	2024	OK
Pantallas muro No. 7 concreto 4000 ps	7	10	2024	OK
Zapatas muro No. 13 concreto 4000 psi	4	10	2024	OK
Pantallas muro No. 6 concreto 4000 psi	5	9	2024	ok
Zapatas muro No. 7 concreto 4000 psi	1	10	2024	ok

Observaciones y aclaraciones: Según se reporta en el informe mensual de Obra e Interventoria, se logra el cumplimiento de resietencias esperadas

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité de Obra	18	9	2024	
Comité de Obra	25	9	2024	
Comité de Obra	2	10	2024	

Nota: Se relacionan los comités realizados en la etapa previa a la iniciación. (ver anexo. Actas de comité)

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe semanal de Interventoría No. 23	9	9	2024	15	9	2024	
Informe semanal de Interventoría No. 24	16	9	2024	22	9	2024	
Informe semanal de Interventoría No. 25	23	9	2024	29	9	2024	
Informe semanal de Interventoría No. 26	30	9	2024	6	10	2024	

OBSERVACIONES

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Obra	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	NO	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	LEONARDO ALVAREZ FONSECA

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
OSVALDO ENRIQUE SANCHEZ
FECHA 22/10/2024

GIC-GB-205-24

Bogotá D.C. 27 de septiembre de 2024

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".**

Asunto: **Entrega Informe Semanal No. 23 Contrato de Interventoría No. 3230-2023**

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 23	Del 09/09/24 al 15/09/24

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal

Anexo: INFORME SEMANAL No. 23
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: TDR

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 15/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 23 del 9/09/2024 al 15/09/2024 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.936.601.853,14	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.480.980.556,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.936.601.853			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 361.963.536			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.936.601.853,14	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.864.196.756,55	58,02% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.901.260.847,14	58,77% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37.064.090,59	0,75% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	% *
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.864.196.756,55	58,02% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.901.260.847,14	58,77% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37.064.090,59	0,75% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 205.020.280,52	4,15% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 91.187.370,78	1,85% *

Observaciones: * Se el porcentaje programado acorde con la reprogramacion de obra, la cual contempla los 11 muros que se priorizaron con el valor contractual del contrato y esta sujeta a cambios una vez se realice la modificacion del contrato de obra y/o la inclusion de las actividades no previstas.

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 361.963.536,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 260.161.291,50	71,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 260.161.291,50	71,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.311.360,50	3,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.311.360,50	3,13%

Observaciones: N/A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,94
Amortizado $	$ 479.704.777,16
Saldo $	$ 1.001.275.778,78

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 58,02% — Avance o Atraso Físico % 0,75%
Meta Física Ejecutada % 58,77% — Avance tiempo contrato 66%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	59,11%	59,16%
II. VARIOS	9,38%	49,65%
TOTAL OBRA	**58,02%**	**58,77%**

* El flujo de inversión programado y ejecutado se ajusta de acuerdo a la última versión de la programacion de obra entregada por el contratista V7 de septiembre de 2024, mediante la cual se prioriza la intervención de los muros de contención 2 al 10, 12 y 14.

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416E	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELÉCTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO		1
Total	5	11

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:
Se realizaron (15) actas de vecindad de inicio en los predios que se encuentran aledaños al tramo del proyecto.
De acuerdo a lo concertado en acta de comité del 7 de mayo de 2024, el avance físico programado y ejecutado se tomarán del cronograma en project presentado por el contratista y con corte a la fecha.
Se realiza el presente informe con el último cronograma entregado por el contratista Versión No.6.
Se realizó pago del anticipo de acuerdo al plan de inversión del anticipo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se ejecutaron trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en concreto en muro No. 7.
* Se efectuaron trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No. 3.
* Se inician actividades de perforación para anclajes verticales en muro No. 12.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.


XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizarán trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en muro No. 12.
* Se efectuarán trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en muro No. 7.
* Se realizarán actividades de instalación de geodren y relleno de afirmado compactado.


INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 15/09/2024 (Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

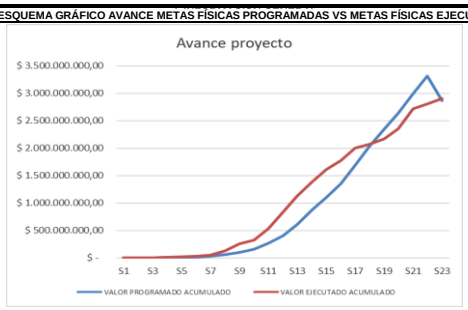

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

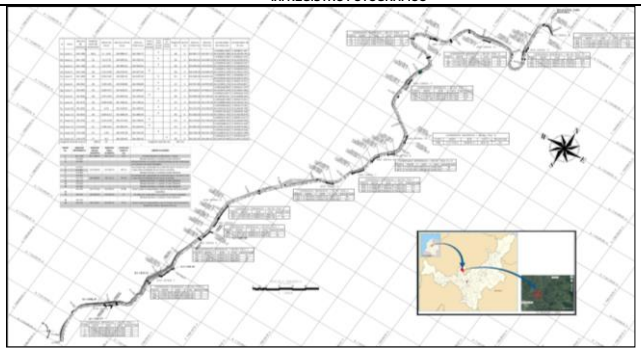

PLANTA LOCALIZACIÓN PUNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 02 abscisa K4+320



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 2.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 3.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 4



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 4

Muro No. 05 abscisa K4+600



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 5.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 6.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040



Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en muro No. 7.



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 7.



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 8.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 9.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 10



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 10

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Mediante el comunicado No. CMONIQUIRA-CE-172 del 9 de septiembre de 2024, el contratista remite a interventoría documentos para la aprobación y pago directo a proveedores por compras realizadas y/o pago de anticipos – ordenes de giro 45 y 46.
* Por medio del comunicado CMONIQUIRÁ-CE-171 del 9 de septiembre de 2024, el contratista envía a la interventoría Reajuste plan de inversión de anticipo.
* A través del oficio GIC-GB-195-24 del 9 de septiembre de 2024, la interventoría remite a la supervisión del contrato Entrega Informe Semanal No. 22 Contrato de Interventoría No. 3230-2023.
* Con el oficio GIC-GB-194-24 del 9 de septiembre de 2024 , la interventoría remite al contrtista Observaciones componente geotecnia - Modificación de obra No. 01
* Mediante oficio No. CMONIQUIRÁ-CE-173 del 9 de septiembre de 2024, el contratista remire a la interventoría Programación de obra versión 7 y flujo de inversión Modificación de contrato No. 1..
* Con el comunicado CMONIQUIRÁ-CE-174 del 11 de septiembre de 2024,el contratista envía a interventoría el informe Semanal No. 22.
* Por medio del comunicado GIC-GB-199-24 del 11 de septiembre de 2024, la interventoría remite al contratista Observaciones componente geotecnia - Modificación de obra No. 01
* A través del oficio GIC-GB-200-24 del 12 de septiembre de 2024, la interventoría remite al contratista Observaciones muros de contención 7, 12 y 14.
* Se realiza el 11 de septiembre de 2024 reunión virtual con especialistas de interventoría y contratista para revisar las observaciones de geotecnia a la modificación del contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ING. TATIANA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 2520273225 CND

GIC-GB-206-24

Bogotá D.C. 27 de septiembre de 2024

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".**

Asunto: **Entrega Informe Semanal No. 24 Contrato de Interventoría No. 3230-2023**

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 24	Del 16/09/24 al 22/09/24

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal

Anexo: INFORME SEMANAL No. 24
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: TDR

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 22/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 24 del 16/09/2024 al 22/09/2024 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.936.601.853,14	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.480.980.556,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.936.601.853			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 361.963.536			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.936.601.853,14	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.069.246.474,57	62,17% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.928.308.847,14	59,32% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (140.937.627,43)	-2,85% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	% *
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.069.246.474,57	62,2% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.928.308.847,14	59,3% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (140.937.627,43)	-2,9% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 205.049.718,02	4,15% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.048.000,00	0,55% *

Observaciones: * Se el porcentaje programado acorde con la reprogramacion de obra, la cual contempla los 11 muros que se priorizaron con el valor contractual del contrato y esta sujeta a cambios una vez se realice la modificacion del contrato de obra y/o la inclusion de las actividades no previstas.

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 361.963.536,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 271.472.652,00	75,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 271.472.652,00	75,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.311.360,50	3,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.311.360,50	3,13%

Observaciones: N/A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,94
Amortizado $	$ 479.704.777,16
Saldo $	$ 1.001.275.778,78

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62,17% — Avance o Atraso Físico % -2,85%
Meta Física Ejecutada % 59,32% — Avance tiempo contrato 68,85%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	63,38%	59,73%
II. VARIOS	9,94%	49,65%
TOTAL OBRA	**62,17%**	**59,32%**

* El flujo de inversión programado y ejecutado se ajusta de acuerdo a la última versión de la programacion de obra entregada por el contratista V7 de septiembre de 2024, mediante la cual se prioriza la intervención de los muros de contención 2 al 10, 12 y 14.

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416E	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELÉCTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
DORA DE CONCRETO AUTOCA		1
Total	5	11

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:
Se realizaron (15) actas de vecindad de inicio en los predios que se encuentran aledaños al tramo del proyecto.
De acuerdo a lo concertado en acta de comité del 7 de mayo de 2024, el avance físico programado y ejecutado se tomarán del cronograma en project presentado por el contratista y con corte a la fecha.
Se realiza el presente informe con el último cronograma entregado por el contratista Versión No.6.
Se realizó pago del anticipo de acuerdo al plan de inversión del anticipo.


ES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se ejecutaron trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en concreto en muro No. 7.
* Se efectuaron trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en concreto en muro No. 12.
* Se inician actividades de relleno con material de afirmado en muro No. 8.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.

EALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizarán trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en muro No. 12.
* Se efectuarán trabajos de excavación mecánica y perforaciones verticales en muro No. 7
* Se realizarán actividades de instalación de geodren y relleno de afirmado compactado.


ISICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

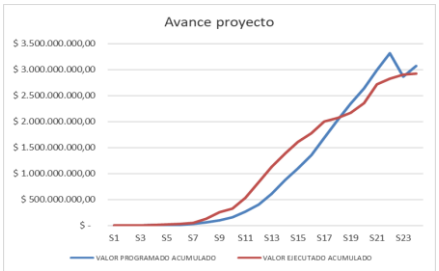

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA 22/09/2024
(Dia / Mes / Año)

ISTRO FOTOGRÁFICO

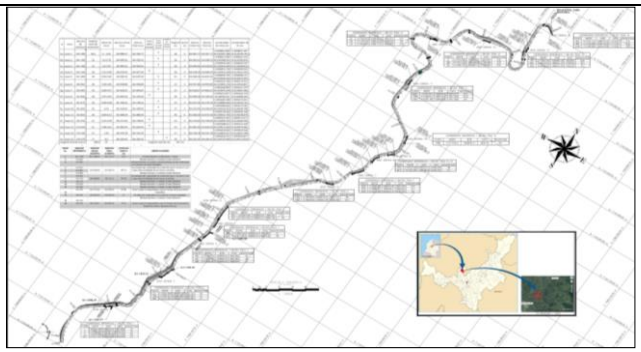

UNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 02 abscisa K4+320



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 2.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 3.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 4



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 4

Muro No. 05 abscisa K4+600



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 5.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 6.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 6.

FECHA 22/09/2024 (Día / Mes / Año)

Muro No. 07 abscisa K5+040



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 7.



Excavación mecánica en muro No. 7.



Perforaciones para anclajes verticales en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 8.



Limpieza de material de arrastre para iniciar actividades de relleno en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 9.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 10



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 10

Muro No. 12 abscisa K5+730



Perforaciones para anclajes verticales en muro No. 12



Amarre de acero de refuerzo para zapatas en muro No. 12



Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en concreto para muro No. 12

cantidades y

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	R DE INTERVENTORÍA
* Mediante el comunicado No.GIC-GB-171-24 del 17 de septiembre de 2024, la interventoría remite a la supervisión del contrato Remisión Informe Mensual No. 5 de Interventoría - Contrato de Interventoría No. 3230-2023 * Por medio del comunicado CMONIQUIRÁ-CE-176 del 13 de septiembre de 2024, el contratista envía a la interventoría el informe mensual No. 5 para revisión. * Se realiza el 18 de septiembre de 2024 comité de obra en donde se realia recorrido con supervisión y especialista en geotecnia de la interventoría para definir el alcance del contrato y cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.	FIRMA NOMBRE: ING. TATIANA RODRIGUEZ Matrícula Profesional No.: 2520273225 CND

GIC-GB-210-24

Bogotá D.C. 03 de octubre de 2024

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".**

Asunto: **Entrega Informe Semanal No. 25 Contrato de Interventoría No. 3230-2023**

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 25	Del 23/09/24 al 29/09/24

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal

Anexo: INFORME SEMANAL No. 25
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: TDR

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 29/09/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 25 del 23/09/2024 al 29/09/2024 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL: $ 4.936.601.853	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL: $ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES: -	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.936.601.853,14	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.480.980.556,00			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.936.601.853			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 361.963.536			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.936.601.853,14		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.274.796.630,09	66,34%	*
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.110.021.447,88	63,00%	*
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (164.775.182,21)	-3,34%	*
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%	*
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.274.796.630,09	66,3%	*
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.110.021.447,88	63,0%	*
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (164.775.182,21)	-3,3%	*
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 205.550.155,52	4,16%	*
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 181.712.600,74	3,68%	*

Observaciones: * Se encuentra en revisión los APUs no previstos entregados por el contratista para la modificación del contrato de obra; así mismo, esta pendiente que el contratista entregue el ajuste del diseño de pavimento.

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 361.963.536,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 282.784.012,50	78,13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 282.784.012,50	78,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.311.360,50	3,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.311.360,50	3,13%

Observaciones: N/A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,94
Amortizado $	$ 479.704.777,16
Saldo $	$ 1.001.275.778,78

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 66,34% — Avance o Atraso Físico % -3,34%
Meta Física Ejecutada % 63,00% — Avance tiempo contrato 72,92%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	67,64%	59,40%
II. VARIOS	10,92%	14,77%
TOTAL OBRA	**66,34%**	**63,00%**

* El flujo de inversión programado y ejecutado se ajusta de acuerdo a la última versión de la programacion de obra entregada por el contratista V7 de septiembre de 2024, mediante la cual se prioriza la intervención de los muros de contención 2 al 10, 12 y 14.

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
EZCLADORA DE CONCRETO AUTOCARGAN		1
Total	5	11

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:
Se realizaron (15) actas de vecindad de inicio en los predios que se encuentran aledaños al tramo del proyecto.
De acuerdo a lo concertado en acta de comité del 7 de mayo de 2024, el avance físico programado y ejecutado se tomarán del cronograma en project presentado por el contratista y con corte a la fecha.
Se realiza el presente informe con el último cronograma entregado por el contratista Versión No.7.
Se realizó pago del anticipo de acuerdo al plan de inversión del anticipo.

ES REALIZADAS EN LA SEMANA
* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se ejecutaron trabajos de perforaciones verticales para anclajes en muro No. 7.
* Se efectuaron trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en concreto en muro No. 12.
* Se inician actividades de relleno con material de afirmado en muro No. 8.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.

EALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
* Se realizarán trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en muro No. 12.
* Se ejecutarán trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en muro No. 7
* Se realizarán actividades de instalación de geodren y relleno de afirmado compactado.


ISICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 29/09/2024 (Día / Mes / Año)

ISTRO FOTOGRÁFICO

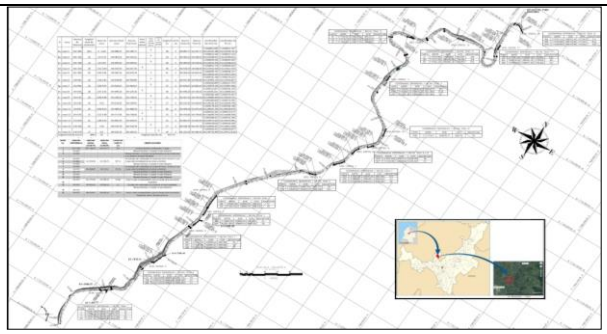

UNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 02 abscisa K4+320



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 2.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 3.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 4



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 4

Muro No. 05 abscisa K4+600



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 5.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 6.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 6.

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 29/09/2024 (Dia / Mes / Año)

Muro No. 07 abscisa K5+040



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 7.



Perforaciones para anclajes verticales en muro No. 7.



Perforaciones para anclajes verticales en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Instalación de geodren planar en muro No. 8.



Actividades de relleno con material de afirmado compactado en muro No. 8.



Actividades de relleno con material de afirmado compactado en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 9.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 10



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 10

Muro No. 12 abscisa K5+730



Amarre de acero de refuerzo para pantallas en muro No. 12



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 12



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 12

cantidades y

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	R DE INTERVENTORÍA
* Mediante el comunicado No. CMONIQUIRÁ-CE-178 del 26 de septiembre de 2024, el contratista remite a la interventoría Solicitud de inclusión de ítems no previstos * Por medio del comunicado GIC-GB-206-24 del 27 de septiembre de 2024, la interventoría envía a la supervisión del contrato entrega de Informe Semanal No. 24 Contrato de Interventoría No. 3230-2023 . * Con el oficio No. GIC-GB-205-24 del 27 de septiembre de 2024, la interventoría envía a la supervisión del contrato entrega de Informe Semanal No. 23 Contrato de Interventoría No. 3230-2023 . * A traves del comunicado No. GIC-GB-203-24 del 26 de septiembre de 2024, la interventoría envía al contratista Solicitud APU No Previstos. * Se realiza el 25 de septiembre de 2024 comité de obra virtual cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.	FIRMA NOMBRE: ING. TATIANA RODRIGUEZ Matrícula Profesional No.: 2520273225 CND

GIC-GB-216-24

Bogotá D.C. 15 de octubre de 2024

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".**

Asunto: **Entrega Informe Semanal No. 26 Contrato de Interventoría No. 3230-2023**

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 26	Del 30/09/24 al 06/10/24

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal

Anexo: INFORME SEMANAL No. 26
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: TDR

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 6/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION

SEMANA No.: 26 del 30/09/2024 al 6/10/2024 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL: $ 4.936.601.853	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL: $ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.936.601.853,14	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ 479.704.777,16			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.001.275.778,84			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.936.601.853			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 361.963.536			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.936.601.853,14	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.480.608.739,61	70,51% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.172.796.639,57	64,27% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (307.812.100,04)	-6,24% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	% *
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.480.608.739,61	70,5% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.172.796.639,57	64,3% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (307.812.100,04)	-6,2% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 205.812.109,52	4,17% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 62.775.191,69	1,27% *

Observaciones: * Se el porcentaje programado acorde con la reprogramación de obra, la cual contempla los 11 muros que se priorizaron con el valor contractual del contrato y esta sujeta a cambios una vez se realice la modificación del contrato de obra y/o la inclusión de las actividades no previstas.

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 361.963.536,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 294.095.373,00	81,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 294.095.373,00	81,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.311.360,50	3,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.311.360,50	3,13%

Observaciones: N/A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,94
Amortizado $	$ 479.704.777,16
Saldo $	$ 1.001.275.778,78

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 70,51% Avance o Atraso Físico %: -6,24%
Meta Física Ejecutada %: 64,27% Avance tiempo contrato: 75,83%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	71,92%	59,40%
II. VARIOS	11,91%	251,07%
TOTAL OBRA	**70,51%**	**64,27%**

* El flujo de inversión programado y ejecutado se ajusta de acuerdo a la última versión de la programación de obra entregada por el contratista V7 de septiembre de 2024, mediante la cual se prioriza la intervención de los muros de contención 2 al 10, 12 y 14.

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416E	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELÉCTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
DORA DE CONCRETO AUTOCA		1
Total	5	11

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:
Se realizaron (15) actas de vecindad de inicio en los predios que se encuentran aledaños al tramo del proyecto.
De acuerdo a lo concertado en acta de comité del 7 de mayo de 2024, el avance físico programado y ejecutado se tomarán del cronograma en Project presentado por el contratista y con corte a la fecha.
Se realiza el presente informe con el último cronograma entregado por el contratista Versión No.7.
Se realizó pago del anticipo de acuerdo al plan de inversión del anticipo.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se efectuaron trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en concreto en muro No. 7.
* Se realiza instalación de geodren en muros No. 4, 8 y 5.
* Se inician actividades de relleno con material de afirmado en muro No. 4 y No. 5.
* Se realiza construcción de drenes horizontales en talud superior del muro No. 8.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizarán trabajos de instalación de geodren en muro No. 5.
* Se efectuarán actividades de perforación para drenes horizontales en muro No. 8.
* Se realizarán actividades de relleno con material de afirmado compactado en muro No. 5.


SICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

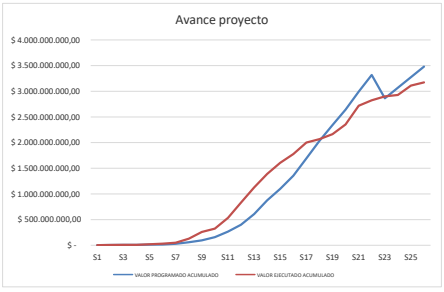

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 6/10/2024 (Dia / Mes / Año)

ISTRO FOTOGRÁFICO

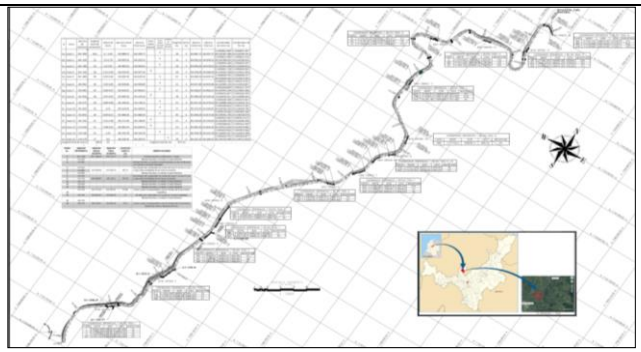

UNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 02 abscisa K4+320



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 2.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 3.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Instalación de geodren y relleno con material de afirmado compactado en muro No. 4



Instalación de geodren y relleno con material de afirmado compactado en muro No. 4



Relleno con material de afirmado compactado en muro No. 4

Muro No. 05 abscisa K4+600



Instalación de geodren y relleno con material de afirmado compactado en muro No. 5



Instalación de geodren y relleno con material de afirmado compactado en muro No. 5



Instalación de geodren y relleno con material de afirmado compactado en muro No. 5

Muro No. 06 abscisa K4+940



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 6.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 6.

FECHA 6/10/2024 (Dia / Mes / Año)

Muro No. 07 abscisa K5+040



Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en muro No. 7.



Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en muro No. 7.



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Actividades de relleno con material de afirmado compactado en muro No. 8.



Perforación de drenes horizontales en talud superior del muro No. 8.



Perforación de drenes horizontales en talud superior del muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 9.



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 10



Pantallas en concreto terminadas en muro No. 10

Muro No. 12 abscisa K5+730



Amarre de acero de refuerzo para pantallas en muro No. 12



Desencofrado de pantallas en muro No. 12



Desencofrado de pantallas en muro No. 12

cantidades y

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Mediante correo electrónico del 1 de octubre de 2024, el contratista realiza la entrega de los documentos requeridos para la modificación al contrato de obra, para la revisión respectiva
* Por medio del comunicado CMONIQUIRA-CE-180 del 2 de octubre de 2024, el contratista remite a la interventoría el informe mensual de anticipo del mes de julio y agosto.
* Con el oficio No. GIC-GB-210-24 del 3 de octubre de 2024, la interventoría envía a la supervisión del contrato entrega de Informe Semanal No. 25 Contrato de Interventoría No. 3230-2023.
* A través del comunicado por correo electrónico del 3 de octubre de 2024, el contratista envía presupuesto con memorias de cantidades por muros.
* Se realiza el 2 de octubre de 2024 comité de obra virtual cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.
* Se realizan mesas de trabajo entre interventoría y contratista para revisión de documentos para modificación del contrato.

R DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ING. TATIANA RODRIGUEZ

Matrícula Profesional No.: 2520273225 CND
