CONTRATO No. 1942 DE 2024

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 1 LOTE 4".

INFORME MENSUAL N° 3 DE ADMINISTRACIÓN VIAL



PERIODO: 1 al 31 AGOSTO DE 2024

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1 LOCALIZACIÓN 5
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 7
2.3 INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 7
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 70

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA 71

3.1 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 71
3.2 ESTADO DE AVANCE DE LOS CONTRATOS 72
3.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 76
3.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS. N.A 76

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 76

4.1 INFORMES SEMANALES. 76
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 76
4.3 PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA 76
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 76
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 76
4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 76
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SSEGUROS CONTRATO DE OBRA 76
4.8 PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 77
4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 77

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 77

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 77
5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 77
5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL 78
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC. 82
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 82

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 83

6.1 EQUIPO CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 83
6.2 PERSONAL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL. 83
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 83
6.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 83
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 83
6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 83

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 84

8. ANEXOS 86

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA JULIO DE 2024 86
8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE LAS OBRAS 89
8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 130
8.4 COPIA DE LA BITÁCORA 131
8.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO 156

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS", con el fin de *"de contribuir efectivamente en el proceso de mejoramiento socio-económico de Colombia y el propósito específico de alcanzar la satisfacción de los usuarios de las vías, llevo a desarrollar el programa Administradores de Mantenimiento Vial de alto nivel para adelantar todas las gestiones y acciones tendientes a conservar y valorar el patrimonio vial y, por ende, brindar la atención adecuada que demandan permanentemente los diferentes sectores de la población que utiliza las carreteras. Los Administradores de Mantenimiento Vial son profesionales de la ingeniería, altamente calificados para ejercer funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, responsables de la dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las carreteras"*, realiza la convocatoria CMA-DEO-SGI-128-2023, del cual se deriva el contrato No 1942 de 2024 celebrado con CONSORCIO ANTEA-GPM, cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 1 LOTE 4"

El INVIAS cuenta también con el programa de Mantenimiento Rutinario que, *"es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento"*, el cual ejecuta, con microempresas y/o Cooperativas de Trabajo Asociado en todas las vías nacionales del país y como unidades ejecutoras las Direcciones Territoriales, dando prioridad a los grupos asociados de la zona de influencia de la vía, con lo cual se busca adicionalmente que ellos adquieran un sentido de pertenencia del tramo de la vía contratado.

En atención a nuestra obligación contractual, establecida en el contrato No. 1942 de 2024, nos permitimos poner a consideración de la Dirección *Territorial* Casanare el **informe mensual No. 3** de las actividades realizadas durante el mes **AGOSTO DE 2024**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto hace énfasis en las actividades principales de la Administración Vial *"a: la conservación, el inventario físico y estado de vías, la recolección de* información *para la base de datos de los sistemas de administración vial, la atención de emergencias, la ejecución de algunos estudios y el inventario de accidentes, entre otras.*

También dentro de las actividades de administración vial se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio público vial, la descontaminación visual, eliminación de basureros, atención de usuarios y evaluaciones estructurales y funcionales de pavimentos, así como estudios de tránsito y perfiles de vulnerabilidad."

El mantenimiento rutinario consiste en *"el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento."*

"Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y

bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo."

Las actividades de Mantenimiento Rutinario y Administración de Mantenimiento Vial se desarrollan en los tramos 6211 SOGAMOSO – AGUAZUL y 6512 MONTERREY – YOPAL a cargo de la Territorial Casanare en los siguientes sectores:

- Sector El Crucero-Aguazul, PR 16+0000 (El Crucero) a PR 118+0616 (Aguazul), del tramo 6211.
- Paso nacional por el municipio de Yopal, PR 103+0287 – PR105+0448, del tramo 6512.

"El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento".


"Consiste en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía". El programa de Administración de Mantenimiento Vial busca "Optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía".

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla en el oriente del Departamento de Boyacá y occidente del departamento de Casanare distribuidos de la siguiente manera:

- Departamento de Boyacá: Sector comprendido entre El Crucero, PR 16+0000 y el puente Guadalcanal, PR 91+0208, del tramo 6211.
- Departamento de Casanare: Sector comprendido entre el puente Guadalcanal, PR 91+0208 y Aguazul, PR 118+0616 del tramo 6211.
- Departamento de Casanare: Sector paso Nacional por el municipio de Yopal, PR 103+0287 – PR 105+0448 del tramo 6512.

La longitud total es de 104.98 kilómetros a lo largo de los cuales tres Cooperativas de trabajo asociado, realizan su actividad, entramos de 47,824km; 40,918 km y 15,025 km cada una.

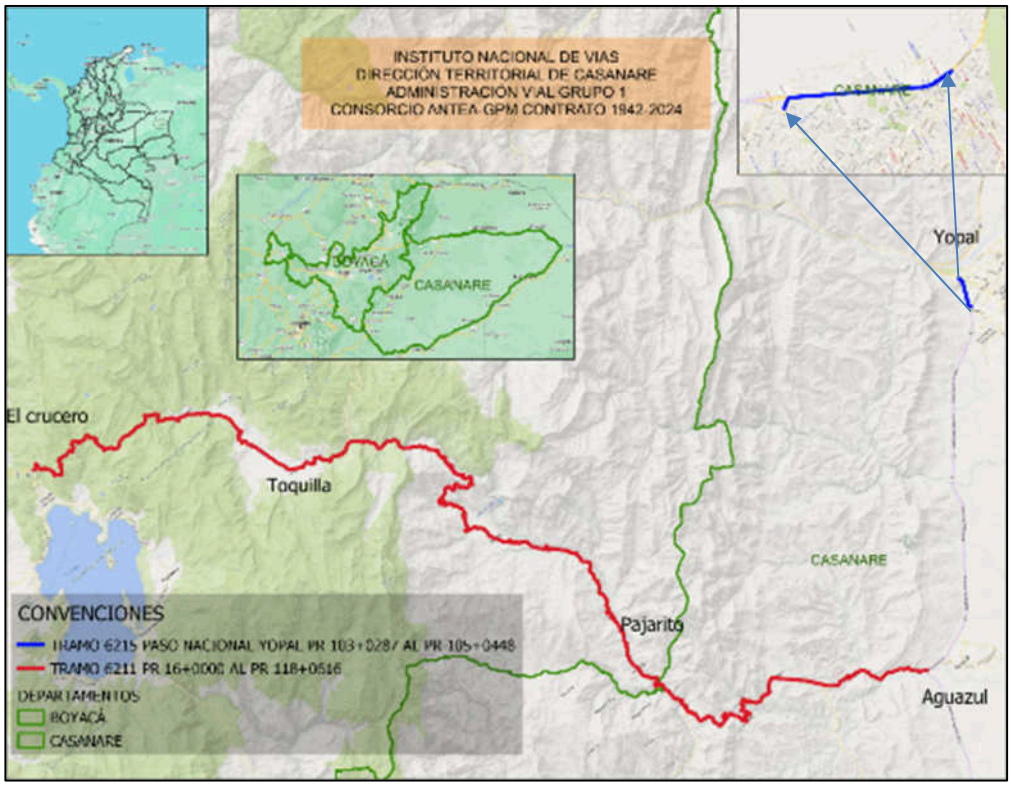


Distribución de los sectores.

En la siguiente tabla podemos observar la distribución de los sectores correspondientes a cada microempresa y/o cooperativa de trabajo asociado.

CARRETERA		LONGITUD (km)			PR inicial	PR final	N° PUENTES	MICROEMPRESA / COOPERATIVA
TRAMO	SECTOR	PAV.	AFIRM.	TOTAL				
6211: SOGAMOSO – AGUAZUL	EL CRUCERO – AGUAZUL	101,356	0,250	101,606	16+0000	64+0539	4	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD.
					64+0539	105+0642	18	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
					105+0642	118+0616	4	EN PROCESO DE CONCURSO PARA ADJUDICAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
6512: MONTERREY - YOPAL	PASO NACIONAL POR YOPAL	2,161	0	2,161	103+0287	105+0448	0	

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

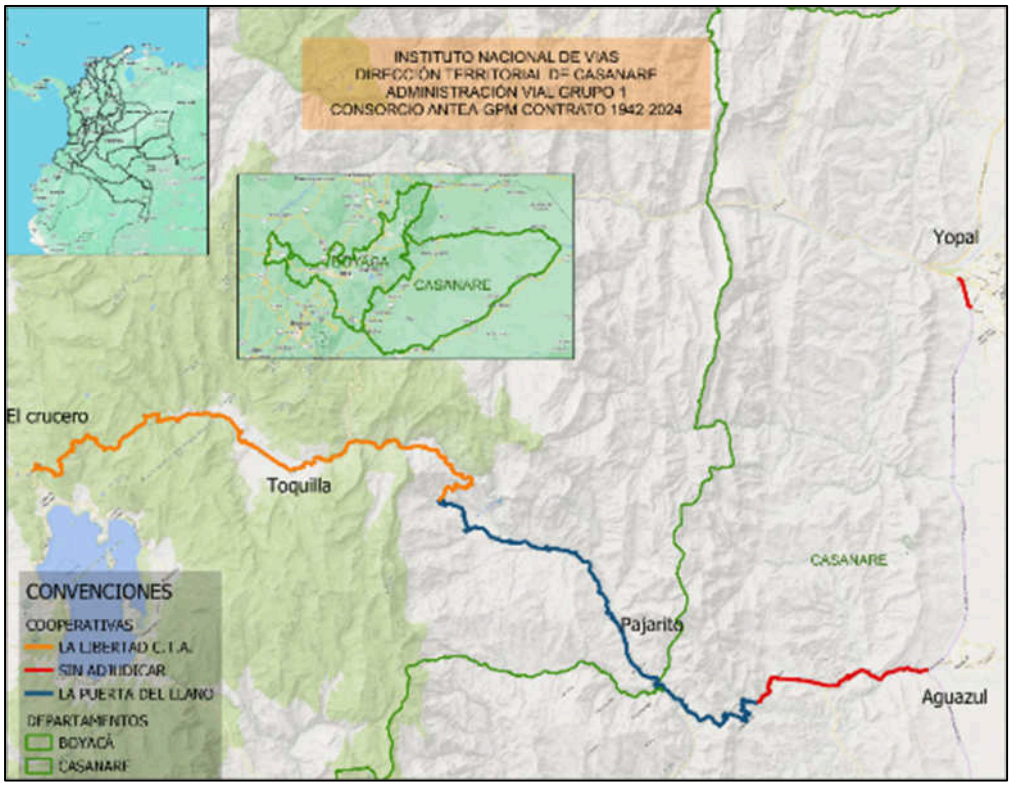

Ubicación de los sectores correspondientes a cada Cooperativa

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de administración vial grupo 1 y mantenimiento rutinario está dentro de la zona de influencia de los municipios de Aguazul, Pajarito, Aquitania, Cuítiva y Sogamoso para el tramo 6211 y Yopal en el tramo 6512. Dentro de los beneficios que aporta, además del mantenimiento de la vía y todos sus elementos, está la generación de empleo para la gente de la región, en los tramos 6211 y 6512 hay en este momento un total de 30 personas de la región que conforman las 2 cooperativas y 6 empleos adicionales derivados de los contratos de las microempresas.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA VÍA

A continuación, se describe el inventario general de los sectores a cargo, así como el estado de estos para el presente informe:

2.3.1 ESTADO DE LA VÍA.

2.3.1.1 PAVIMENTO

El tramo 6211 cuenta con 101,606 kilómetros de superficie pavimentada, la cual se encuentra en las

siguientes condiciones:

TRAMO	CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
PR 16+0000 AL PR 27+0000	TRAMO CON REPARCHEO TÉCNICO. En el PR 21+0800 se presenta desintegración de la capa asfáltica. Desgaste general, pequeños baches y piel de cocodrilo en zonas puntuales. El sector más deteriorado se encuentra entre el PR 22+0300 y el PR 22+0400, zona que no ha sido intervenida.	INTERVENIDO EN EL AÑO 2020 CONTRATO 1950/19 SE OBSERVAN SECTORES PUNTUALES CON FISURAS, DESGASTE Y PIEL DE COCODRILO,
PR 27+0000 AL PR 44+0000	TRAMO CON REPARCHEO TÉCNICO. Se observa desgaste, piel de cocodrilo y baches en zonas puntuales.	INTERVENIDO EN EL AÑO 2022 CONTRATO 1858 DE 2020, SE OBSERVAN SECTORES PUNTUALES CON BACHES Y PIEL DE COCODRILO
PR 45+0000 AL PR 49+0000	TRAMO CON REHABILITACIÓN. Presencia de fisuras y desgaste en zonas puntuales	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1950 DE 2019, EN EL PR 45+0050 SE OBSERVA HUNDIMIENTO PUNTUAL EN LA ZONA DE RELLENO COSTADO IZQUIERDO
PR 49+0000 AL PR 52+0000	TRAMO CON REPARCHEO EN ZONAS MAS CRITICAS. Se observa nuevamente piel de cocodrilo en varios de las zonas con parcheo. En los sectores no intervenidos hay fisuras, piel de cocodrilo, desgaste y se ha iniciado la formación de baches.	SE ATENDIERON SOLO LAS ÁREAS MAS AFECTADAS, A LA FECHA LOS TRAMOS NO INTERVENIDOS PRESENTAN BACHES Y PIEL DE COCODRILO, ALGUNOS PARCHES TAMBIÉN PRESENTAN PIEL DE COCODRILO.
PR 57+0000 AL PR 65+0000	CON MANTENIMIENTO AÑO 2020. El tramo presenta un proceso acelerado de desgaste hay perdida de ligante con desprendimientos de agregado en algunos sectores, piel de cocodrilo y fisuras. Dado que en zonas inestables solo se realizó renivelación, se observa hundimientos nuevamente en tramos de la vía como en el PR60+0900; PR 63 AL PR63+0400.	ALGUNOS SECTORES PRESENTAN MAYOR DESGASTE, HAY PIEL DE COCODRILO Y LAS ZONAS INESTABLES PRESENTAN HUNDIMIENTO DE CALZADA COMO EL PR 63+0000 Y PR 60+0900
PR 65+0750 AL PR 66+0050	Se interviene hasta nivel de carpeta asfáltica entre el PR 65+0750 al PR 65+0950, entre el PR 65+0950 al PR 66+0050 por su inestabilidad se deja a nivel de capa en fresado. (carpeta instalada en abril de 2024)	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020
PR 66+0100 AL PR 73+0000	TRAMO CON REPARCHEO TÉCNICO Se observan ya sectores puntuales con baches y piel de cocodrilo	INTERVENIDO EN EL AÑO 2022 CONTRATO 1858 DE 2020
PR 74+0000 AL PR 75+0100	TRAMO CON REPARCHEO TÉCNICO, intervenido en el año 2023	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020
PR 78+0900 AL PR 79+0100	Se encuentran dos puntos críticos, renivelados con material de fresado, zona con baches. Tramo en afirmado y capa de rodadura con material de fresado, por falla rotacional y hundimiento de banca.	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020
PR 80+0050 AL PR 80+0100	Zona inestable tramo renivelado con fresado	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020
PR 80+0150 AL PR 80+0300	zona inestable de procesos lentos de movimiento en masa en este sector se encuentra el viaducto La Leonera. la calzada en los accesos presenta deformación y fisuras, afectación en muros	DENTRO DEL CONTRATO 1858 SE ESTÁN INSTALANDO INCLINÓMETROS PARA MONITOREO
PR 81+0000 AL 81+0600	Variante Grillos. En el mes de marzo 2024 la capa de rodadura queda a nivel de capa asfáltica y entrega el tránsito vehicular en el Puente Chorro blanco., cuenta con dos capas MDC 19 y MDC 20.	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020

TRAMO	CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
PR 82+0100 AL PR 82+0400	Tramo en afirmado por estar en intervención	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020
PR 82+0500	Paso uno a uno variante Molinera (Verbeno)	SE REQUIERE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE NUEVO.
PR 83+0100	Renivelado por hundimiento	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020
PR83+0200	Paso alternado, hundimiento de banca, renivelado con material granular para mantener transitabilidad	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020
PR 83+0600	Zona inestable que presenta continua caída de flujo de lodos debido a la temporada invernal que se presenta en la zona. La calzada ha perdido la carpeta asfáltica y se encuentra a nivel de capa granular.	SECTOR ATENDIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020, PRESENCIA DE CARGADOR Y VOLQUETAS PARA RETIRO DE MATERIAL DEL DERRUMBE.
PR 84+0950 AL PR 85+0400	Zona inestable, se presentan procesos de movimiento en masa de los taludes superior e inferior. Hay perdida total de la carpeta asfáltica, actualmente se reniveló para mejorar el alineamiento vertical.	SECTOR ATENDIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020, PRESENCIA DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PARA RETIRO DE MATERIAL DE LA CALZADA PARA RENIVELARLA Y DISMINUIR LAS PENDIENTES CAUSADAS POR EL MOVIMIENTO DEL TALUD INFERIOR.
PR 86+900 AL PR 87+0350	Tramo estabilizado y recuperada la banca, se encuentra a nivel de capa asfáltica. >Los taludes superior e inferior se encuentran estabilizados, aunque en el talud inferior se presenta perdida de los trinchos construidos para sostener el talud.	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020
PR 87+0550 AL PR 88+0100	Algunos sectores con piel de cocodrilo y ahuellamiento	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020, se realizó parcheo técnico.
PR 89+0300 AL PR 94+0000	Algunos sectores presentan piel de cocodrilo, fisuras y desgaste general	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020, se realizó parcheo en áreas de mayor daño.
PR 97+0000 AL PR 99+0000	Presenta desgaste y fisuras.	CONTRATO 1513 DE 2015 Pendiente intervención por garantía de estabilidad.
PR 105+0000 AL PR 107+0000	Algunos trayectos presentan fisuras, longitudinales y transversales y media luna. 105+01250 paso a dos carriles cuenta con capa asfáltica.	CONTRATO 1513 DE 2015 Pendiente intervención por garantía de estabilidad.
PR 109+0000 AL PR 113+0000	El trayecto entre el PR 111 AL 113 presenta desgaste, fisuras y sectores con baches	CONTRATO 1513 DE 2015 Pendiente intervención por garantía de estabilidad.
PR 113+0400 AL PR 113+0500	Presencia de fisuras y piel de cocodrilo	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020
PR 117+0200 AL PR 117+0550	RECUPERACIÓN DE LA BANCA CON MATERIAL DE FRESADO	INTERVENIDO CON EL CONTRATO 1858 DE 2020, Requiere mantenimiento hay baches
PR 103+0287 AL PR 105+0448	Del tramo ruta 6512 está conformado por 2,161 kilómetros de superficie pavimentada en regular estado. El pavimento presenta desgaste, piel de cocodrilo, perdida de agregados y se observa algunos sectores con parcheo.	PASO NACIONAL POR YOPAL PRESENTA PERDIDA DE AGREGADOS, PIEL DE COCODRILO, FISURAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, AHUELLAMIENTO, DESPLAZAMIENTO DE LA CAPA SUPERIOR DEL ASFALTO.

2.3.1.2 ZONAS INESTABLES.

En el siguiente cuadro se presentan los principales sitios de inestabilidad identificados en el tramo 6211 El Crucero – Aguazul y se describe la situación observada en cada sitio.

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
PR 60+0900	Tramo de 100 metros donde la calzada presenta hundimiento debido a la inestabilidad de la zona, en contratos anteriores fue renivelada la capa de rodadura mejorando las condiciones de transitabilidad, pero debido a la falta de obras de estabilización y manejo de aguas, el hundimiento continuó con presencia de fisuras en los extremos del tramo, afloramiento de agua y el asentamiento del terreno que aumenta el riesgo de accidentabilidad para los vehículos que transitan por el sector. El movimiento que se está presentando es de tipo traslacional en el cual la masa se desplaza con dirección occidente-oriente. Como agravante al deslizamiento se identifica en este sitio la alta tasa de infiltración y el avance de la de forestación en este sector
PR 63+0000	Tramo con Inestabilidad de en un tramo de 200 metros, la calzada presenta hundimiento, hay un muro sobre el costado derecho que presenta desplazamiento, el talud superior presenta erosión y deslizamiento, afloramiento de agua.
PR 66+0000	Inestabilidad de la zona. Movimiento progresivo en masa de una amplia área dentro de la cual están afectados 150 metros de vía. Intervenido por transitabilidad dentro del contrato 1858/2020. El muro en tierra armada esta fallando y la banca por el costado izquierdo presenta agrietamientos y perdida de agregados.
PR 78+0900 AL PR 79+0200	La Afectación del sector está comprendida entre el PR 78+0800 y PR 79+0250. -PR 78+0900: En temporada de invierno luvias presenta deslizamiento de lodos en el, lado derecho sector Curisí, de la Quebrada La Amargosa -En el PR 79+0150: Se presentan fisuras, y grietas en media luna y hundimiento del terreno., El tramo anteriormente intervenido, el material por el costado izquierdo corresponde a relleno, la vivienda ahí ubicada fue demolida y reubicada.
PR79+0800	Costado izquierdo presenta Erosión en la pata del talud inferior por acción del rio Cusiana, el hundimiento, debido a un proceso de falla rotacional, que involucra al talud superior, la calzada y todo el talud superior el talud inferior de la vía. ha recibido hasta el momento intervención por transitabilidad, dando manejo a la escorrentía y adición de material a la calzada. Se continúa la construcción de zanjas de coronación en el talud superior por parte del Consorcio Vial MHC 056 con cargo al contrato 1858 de 202. Se observan escarpes.
PR 80+0080	Sector Huerta Vieja: en el sector hay instalados drenes transversales de longitud 30 m con el fin de abatir el agua de infiltración, además se construyeron un filtro y cuneta por el costado derecho y la cuneta, y se realizaron obras de recalce en el box tanto en el encole como en el descole y en la zona inicial del disipador que se encuentra en el costado izquierdo, la calzada ha sido renivelada con material de fresado. Hasta la fecha estas intervenciones corresponden a mitigación y transitabilidad. El muro que se encuentra en el costado izquierdo no ha recibido ninguna intervención. Se observa en la calzada que continua movimiento lento y continuo de la masa del talud inferior.
PR80+0150 AL PR 80+0400	Zona inestable: en el talud se observa erosión, cárcavas y desplazamiento del terreno, en el trayecto se encuentra el puente Leonera, el movimiento de la masa de suelo que se presenta en ambos extremos es una situación de riesgo para la estructura del puente la cual presenta un apoyo principal en la zona central con extremos libres, el empuje que se genere en cualquier extremo puede ocasionar un efecto de torsión.
PR 80+0950	Carril izquierdo, se presenta falla tipo media luna, hundimiento de un tramo de banca de 40 m, se ha mantenido mediante adición de material de fresado. El contratista hizo un relleno para mantener transitabilidad en el tramo.
PR 81+0100 AL PR 81+0900 SECTOR LOS GRILLOS-PUENTE NUEVO-CHORRO BLANCO	En agosto 20 de -2023 colapsó el puente los Grillos en diciembre 21 de 2023 se habilitó transitabilidad por la Variante Los Grillos la cual tiene una de longitud de 515 m, en el este tramo se instalaron 2 puentes metálicos de 52 y 33 m, construcción de una variante por la antigua vía, paralela a la parte inferior del talud derecho, la cual conecta en el puente Chorro Blanco con cargo al contrato 1858, se construyeron de cunetas por el costado derecho de la vía Monitoreo mediante topográfico, inclinómetros y se implementó monitoreo satelital para realizar chequeo en tiempo real a la estructura existente de los puentes, y taludes inferior y superior.
	Mediante resolución 02540 de 26-jun-2024 se decreta cierre total entre el PR 81+0000 al PR 82+0000. Mediante resolución 27047 del 3de julio de 2024 se declara una emergencia vial en la infraestructura de transporta a cargo del INVIAS, se decreta el cierre definitivo en la vía Transversal del Cusiana en el sector comprendido entre el PR 77+0000 (Curisí) y el PR 90+0000 (Pajarito).

PR 81+0650	Sector puente Chorro Blanco: Se presenta deslizamiento de material en la parte alta del talud superior entre las pilas 3 y 4, Se observa material suelto sobre lo que resta de la vía antigua, En la pila 3 se observa la viga cabezal de los caisson. La viga cajón entre la pila 2 y 3 presenta fisuras. La pila 4 presenta fisuras en la zona cercana a la base de cimentación. El Instituto Nacional de Vías actualmente, por Urgencia Manifiesta, ejecuta los contratos 3015 de 2024 cuyo objeto es *"URGENCIA MANIFIESTA PARA RESTABLECER LA CONECTIVIDAD VIAL DE LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS ENTRE EL CORREGIMIENTO DE CURISÍ Y EL MUNICIPIO DE PAJARITO, DE LA VÍA TRANSVERSAL CUSIANA VÍA SOGAMOSO – AGUAZUL, RUTA 6211, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE."* con el contratista INGENIERÍA Y VÍAS S.A.S. BIC y el contrato 3192 de 2024 cuyo objeto es "*INTERVENTORÍA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA RESTABLECER LA CONECTIVIDAD VIAL DE LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS ENTRE EL CORREGIMIENTO DE CURISÍ Y EL MUNICIPIO DE PAJARITO, DE LA VÍA TRANSVERSAL CUSIANA, RUTA 6211, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE*." con el contratista CONSORCIO EMERGENCIAS CID para atender la transitabilidad por el sector.
PR 81+0900	Talud inestable zona sur puente Chorro Blanco: Continuo arrastre de material, cuando se presenta colmatación de la zona este sobrepasa y cae a la calzada. En la parte alta del talud se observan escarpes. En el talud inferior de la calzada se inició un deslizamiento de material poniendo en riesgo a los habitantes de la casa existente en el sitio.
PR 82+0100 AL PR 82+0350	Zona de falla activa donde se vio afectado el muro de contención por el costado derecho y la calzada. Con el contrato de obra 1858 se instalaron drenes transversales en el talud superior e inferior. Este sector se intervino con el contrato 1858 de 2020, se construyeron 2 alcantarillas, se mejo el perfil longitudinal de la vía, el tramo se encuentra a nivel de carpeta asfáltica, aun no se ha reconstruido los tramos de muro y canal que se demolieron debido a estar fallados. No se han continuado las obras en el sector
PR 82+0500	La Molinera: sector de falla activa. La obra de drenaje existente en la vía alterna presenta socavación en el talud inferior, la quebrada presenta un cauce entallado y erosionado en sus márgenes desde la parte alta, la calzada presenta fisuras. Este es un sector que requiere atención urgente.
PR 82+0700 AL PR 83+0080	Sector Verbeno – Tobogán: inestabilidad talud lado derecho, se observa erosión y escarpes en el talud superior e inferior, afloramiento de agua, un tramo del muro del costado derecho presenta desplazamiento y varias secciones del muro del canal presentaron cabeceo, la calzada presenta fisuras transversales y hundimiento con afectación también en las cunetas.
PR 83+0000	REACTIVACIÓN DE PUNTO CRÍTICO: Punto conocido como El Tobogán: zona que presenta deslizamiento de material, en la parte alta se observan cárcavas, erosión del talud y deslizamiento traslacional, afloramiento continuo de agua.
PR 83+0200	Hundimiento de banca. Se ha mantenido el paso con adición de material de fresado. Por el costado izquierdo el contratista protegió zona de cuneta con geomembrana, solución poco funcional ya que el paso es estrecho y los carros deterioran la zona de cuneta, continuando la infiltración de agua
PR 83+0600	Talud superior inestable, presenta escarpes y grietas, afloramiento de aguas, situación que se observa desde la cima, en temporada de invierno hay caída constante de material tipo lodo, se realiza terraceo en el talud superior con cargo al contrato 1858 de 2020 **Sitio CRÍTICO y DE ALTO RIESGO**. Retiro y traslado de material a zonas de Zodme de San Benito, Intervenciones realizadas con cargo al contrato 1858/20 para garantizar la transitabilidad el contratista mantiene maquinaria en el sitio y se tiene paso vehicular alternado a un carril.
PR 84+0900 AL PR 85+0350	Sector denominado Barro Negro, presenta un preocupante avance del asentamiento de la calzada con formación de grietas. El box Culvert conformado por 2 secciones colapsó, separándose, lo que permite la infiltración del agua. El muro del canal lateral lado derecho colapsó debido al empuje del talud superior. El talud por el costado izquierdo presenta grandes grietas y escarpes, en la pata del talud hay un proceso de socavación. El talud superior presenta, igual que el inferior, un movimiento en masa generalizado, con desplazamiento hacia el rio Cusiana generados un hundimiento pronunciado de la calzada. El Consorcio Vial MHC 056 actualment4e realiza labores de renivelación de la calzada, retirando material que había sido adicionado en oportunidades anteriores, Esto con el objeto de disminuir las altas pendientes que se ha generado en la calzada por el hundimiento de esta. El talud inferior cuenta con 7 espolones los cuales presentan fractura y colapso, a la fecha uno sólo se encuentra en pie, situación que ha ocasionado que el cauce del río se recueste sobre su margen derecha y socave la pata del talud, ocasionándose así una condición de inestabilidad de en toda esta zona, se puede apreciar la inclinación de los árboles, debido al movimiento de la masa. En la corona del talud inferior hay pérdida de cuneta y pérdida parcial de la calzada por el lado izquierdo de la vía. Esta zona está próxima al acceso norte del puente La Chigüirera

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

PR 86+0600	Variante La Orquídea: en temporada de invierno hay arrastre de material desde la parte alta, costado derecho hacia la batea, la acción erosiva socavó y deterioró la estructura en concreto empleada para el paso de vehículos con cargas extrapesadas. Los dos puentes tipo Acrow, están funcionando, por ser esta una zona inestable de continuo movimiento, se debe mantener control de las zonas de apoyo de los puentes tipo Acrow allí instalados. La zona de batea, utilizada como paso alterno en situaciones de emergencia, se encuentra obstruida con material de arrastre.
PR 86+0700 AL PR 86+0850	Se presentan escarpes en la zona superior del talud superior. Arrastre de material de la quebrada, la obra de drenaje presenta socavación en la zona de descole, en el PR 86+0850 se presentó deslizamiento de material del talud lado derecho. En la zona de salida de la antigua vía y el acceso a Orquídea 2 (costado Pajarito) se observa fisuras en media luna en la calzada indicativas del empuje del terreno, situación que afecta el muro del costado izquierdo de la vía y que debe obligar a que se realice la observación de la zona de estribo sur puente Orquídea 2.
PR 86+09000 AL - PR 87+0400	Sector La Granja: PR 87 al PR 87+0300 En proceso actividades de mitigación en el talud inferior (Trinchos). PR 87+0000: Se RECUPERÓ LA BANCA, se construyeron obras de mitigación en talud inferior, cuneta en la margen izquierda de la vía PR 87+0300: CONSTRUCCIÓN DE CANAL en la margen derecha de la vía para conducir aguas provenientes de las terrazas hacia la quebrada La Innominada. Quebrada La Granja, durante las crecientes ha arrastrado material, lo cual ha ido involucrando la zona de las pilas del puente y márgenes aguas abajo donde se puede observar la gran cantidad de terreno que ha ganado la quebrada.
PR 88+0050 AL PR 88+0350	Sector denominado El Cogollo, salida norte Pajarito, el talud superior se ve afectado por los desbordamientos de la quebrada. En el PR 88+0250 (lácteos Pajarito), se presenta socavación severa en el talud inferior, el cual debido a las crecientes súbitas ha avanzado el proceso erosivo por acción del río Cusiana.
PR 98+0000 AL PR 105+0500	En temporada de invierno se presentan deslizamientos en varios puntos a lo largo de este sector el sector la arenera y afectaciones en las obras hidráulicas menores por arrastre de material.
PR 103+0200 AL PR 103 +0300	Hundimiento crítico de la calzada, con afectación en obras de drenaje, la infiltración del agua es permanente, situación que acelera el proceso en el tramo. El contratista Consorcio Vial MHC 056 ha realizado labores de mantenimiento por transitabilidad mediante la adición de material en los extremos de la zona afectada. Con la cooperativa de mantenimiento rutinario se ha señalizado el sector.
PR 104+0300	El desbordamiento de la quebrada en temporadas de lluvias intensas, intensas ocasiona afectación en el box existente en el tramo debido a la gran cantidad de material arrastrado.
PR 114+0400 Al PR 114+0850	Sector crítico, presenta fisuras, hundimiento, afectación en alcantarillas y cunetas, socavación y problemas de manejo de agua de escorrentía. Entre el PR 114 AL PR 114+0850 el tramo presenta afectación por la acción erosiva del rio Unete en la pata del talud inferior de la vía y el movimiento lento de la masa de suelo del talud superior y problemas por las aguas de escorrentía superficial y subsuperficial. El contratista, Consorcio Vial MHC 056 reniveló y reconformó la calzada con pedraplén, subbase y base, aplico carpeta asfáltica entre el PR 114+0600 AL PR 114+0750 para reparar la zona donde se presenta mayor hundimiento, estos trabajos se realizan por mitigación y por transitabilidad. Se construyeron Cunetas por los costados derecho e izquierdo para mejorar el drenaje. A la fecha han comenzado a aparecer nuevamente las afectaciones por hundimiento de la calzada en el costado derecho, por la acción de socavación del rio Unete a la pata del talud derecho. Se esta reconformando el pedraplén para dar estabilidad a la estructura de la vía, reconformar la calzada y aplicar nuevamente carpeta asfáltica por el costado derecho.
PR 115+0000 AL PR 115+0850	Por la temporada de invierno, se presentan múltiples derrumbes que involucran suelo y rocas de gran tamaño provenientes del talud superior, lado izquierdo de la vía. Específicamente el 22 de julio hacia las 11:00 p. m. cayó una roca de gran tamaño sobre la vía afectando los bienes materiales de un usuario de la vía. Desde esa fecha han continuado cayendo rocas de menor tamaño y escurrimiento de lodo, eventos atendidos por el Contratista Consorcio Vial MHC 056.
PR 116+0450	La alcantarilla de 36” presentaba el colapso de cabezal lado derecho, debido a esto la escorrentía procedente de la superficie de la calzada y el agua que transporta la tubería ha ocasionado fisura en el carril derecho y perdidas de borde. Zona de alto riesgo por accidentalidad. se requiere recuperación del suelo de soporte del cabezal y disipador hasta nivel de río, obras de protección contra la erosión, reconstrucción de cunetas y obras complementarias Dentro del actual contrato 1858/2020 no se intervendrá este sitio, a pesar de ser esta una PQR de la comunidad y de la cual se había dicho que se atendería.

PR 117+0200 AL PR 117+0600	Sector Las Lajas: Cuenta con una capa de fresado la cual a la fecha presenta baches.

2.3.1.3 OTROS TALUDES INESTABLES

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
PR 17+0000 AL PR 17+0450 PR 18+0400; PR 22+0200	Costado izquierdo deslizamientos de material.
PR 51+0100	Talud lado derecho sector Cuspaquirá.
PR 52+0400	Talud costado derecho.
PR 53+0150	Roca fracturada sector Peña De Gallo
PR 78+0900	Quebrada La Amargosa.
PR 100+0550	El Arenal
PR 114+0300	Deslizamiento de piedras
PR 115+0000 AL PR 115+0550	Caída de piedra y material
PR 116+0900	Talud izquierdo caída de piedra
PR 117+0350	costado izquierdo

2.3.1.4 PASOS POR VARIANTES:

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
PR 81 +0150 Variante Grillos	Zona inestable de altísimo riesgo Velocidad paso 10 kph Carga máxima 32 tn Paso alternado mediante controladores viales Paso uno a uno en zona de puentes metálicos Dificultad para vehículos grandes por radio de giro en el primer puente metálico sentido Pajarito – Sogamoso. Durante los eventos fuertes de lluvia el terreno aledaño al puente metálico más corto se desliza y acumula contra su estructura produciendo un empuje lateral que puede llegar a producir el desplazamiento de esta.
PR 82+0500. La Molinera	Paso en buen estado El box construido está siendo utilizado para el paso alterno, debido a una creciente súbita ocurrida en septiembre 2021, originó socavación y el arrastre de gran parte del enrocado, el paso actual presenta en la calzada fisuras y socavación costado izquierdo. Dado que una creciente súbita puede causar afectaciones severas, por el arrastre de material, como ocasionar que la estructura del puente Berveno se desplace más, es urgente que se evalué la condición de esta variante y el riesgo en que se encuentra. La zona es inestable, presenta erosión, entallamiento de la quebrada, escarpes en la parte alta y deforestación. El paso alterno que se tiene en esta zona presenta socavación, es un sector de alto riesgo por la inestabilidad de la zona y por accidentalidad debido a que es un paso angosto y los conductores exceden límites de velocidad.
PR 86+0500 La Orquídea	Debido a la inestabilidad del sector los puentes metálicos deben tener monitoreo y deben reposicionarse de acuerdo con las variaciones que presente. Batea alterna mal estado por socavación y fractura de losa

2.3.1.5 SITIOS DE ALTA VULNERABILIDAD EN LA RUTA 6211.

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
PR 66+0000	Zona de falla, movimiento continuo que ocasionó hundimiento de la calzada y afectación en obra de drenaje y muro en tierra armada, dentro del contrato 1858 de 2020 se ha realizado la reparación del muro en tierra armada, reemplazo de la alcantarilla PR 66, se deja rodadura en material de fresado. En el PR65+0750 se construyeron dos muros en concreto ciclópeo, se retiró la capa asfáltica entre el PR 65+0750 al PR65+0950 se conformó y en el mes de abril de 2024 se instala carpeta asfáltica. En el tramo está pendiente terminar obras de drenaje y protección y la señalización vial. Se reactiva el hundimiento, es urgente intervenir la alcantarilla dañada para evitar la infiltración y así detener el daño en la estructura del pavimento.
PR 78+0900	La Amargosa. en el presente mes no se han presentado deslizamientos, en la parte alta el talud presenta escarpes y material suelto.
PR 79+0100 AL PR 79+0200	Hundimiento de calzada, afectación en el talud inferior costado izquierdo.
PR 79+0800 AL PR 80+0100	movimiento en masa, en el tramo se presenta hundimiento de banca y en el PR 80+0080 deformación de calzada y afectación de muro y obras de drenaje. En el presente mes se observa un incremento en el hundimiento.
PR 80+0100 AL PR 80+0400	Zona inestable, en este trayecto se encuentra el puente la Leonera, en los extremos de la estructura, se presenta desplazamiento del terreno, situación que afecta al puente debido a que, en los extremos, en especial el costado norte, se genera un empuje que ocasiona movimiento torsor en el apoyo.
PR 81+0000 AL PR 82+0000	Zona inestable de continuo movimiento, alto riesgo para la variante Grillos y el Puente Chorroblanco. El movimiento en masa se ha incrementado en el presente mes lo que generó empujes sobre las estructuras de los puentes Grillos, Nuevo y Chorroblanco, afectando más notoriamente al puente Chorroblanco que ahora manifiesta, en tablero y vigas, fisuras que están aumentando progresivamente. En el apoyo compartido con el puente Nuevo se observan desplazamientos importantes; horizontales, verticales y rotacionales. La anterior situación fue evaluada por especialistas del contrato 1858 de 2020, de la interventoría y del INVIAS dando como resultado que el Instituto emitiera las siguientes resoluciones: **Resolución 2707 del 03 de julio de 2024 Declaratoria de Emergencia en la Infraestructura de Transporte, cierre definitivo entre el PR 77+0000 (Curisí) y el PR 90+0000 (Pajarito)** **Resolución número 02540 del 26 junio 2024. Medidas de restricción al tránsito de vehículos de carga entre el PR16+0000 y el PR107+0200 así**: 1. Restricción al paso de vehículos con peso bruto vehicular superior a 32 toneladas, entre el PR16+0000 y el PR107+0200. 2. Restricción al paso de vehículos de carga con categorías superiores a C3S3, entre el PR16+0000 y el PR107+0200. 3. Paso uno a uno con velocidad máxima de circulación de 20 km/h, entre el PR84+0100 y el PR85+0800. 4. Restricción al paso de vehículos que superen las dimensiones establecidas en la Resolución 4100 del 2004, expedida por el Ministerio de Transporte, entre el PR84+0100 y el PR85+0800. 5. Restricción de la velocidad de circulación, sobre los puentes metálicos ubicados entre el PR84+0100 y el PR85+0800, a máximo 10 km/h. 6. Cierre total entre el PR81+0000 y el PR82+0000. También el Instituto ha decretado la urgencia manifiesta con lo cual celebro los contratos: 3015 de 2024 de obra y 3192 de 2024 de interventoría para la intervención del talud superior para recuperar la transitabilidad teniendo en cuenta soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Corto plazo: Rehabilitar la vía antigua, paralela al viaducto.

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
	Mediano plazo: Evaluación de alternativas para la habilitación de una vía alterna por la parte occidental del viaducto entre Pajarito y Curisí. Largo Plazo: Construcción de una vía por la parte oriental del río Cusiana; entre Pajarito y Curisí.
PR 82+0100 AL PR 82+0350	Sitio que se ha intervenido dentro del contrato 1858/20, construcción de 2 alcantarillas, demolición de tramo de muro y canal fallados, retiro de la carpeta asfáltica y se baja el nivel de rasante, se recalzó el canal lado derecho.
PR 82+0700	Movimiento del sector afectación en muro lado derecho, fisura y grietas en la calzada, se presentó cabeceo de las secciones del muro- canal del lado derecho.
PR83+0000	zona inestable escarpes y fisuras talud superior, deslizamiento de lodos y detritos.
PR 83+0080	hundimiento de calzada. Renivelado.
PR 83+0200	Hundimiento de la bancada. Hay paso alternado mediante controladores viales. Tramo que por transitabilidad se renivela con material granular, hay cuneta por el costado derecho protegida con geomembrana la cual dura muy poco debido al paso de vehículos permitiendo que continue la infiltración de agua.
PR 83+0600	En la parte superior del talud se observa incremento del escarpe, en temporada de invierno se presenta flujo de detritos, que ocasionan deslizamientos de gran magnitud con cierre de la calzada, dentro del adicional al contrato 1858 se continuará con el descargue de material remanente, depositado en la parte alta del talud. • Zanjas corona y obras de manejo de aguas. • Empradización • Renivelación de calzada.
PR 84+0900 AL PR85+0350	Avance progresivo de la falla rotacional, grietas y hundimiento de la calzada, fracturas y colapso de parte del muro- canal costado derecho, escarpes y fisuras en talud inferior, espolones colapsados y socavación por acción del río Cusiana a lo largo del sector. El contratista realizó Renivelación con material de fresado a los escalonamientos que aparecen en los flancos del hundimiento de la calzada. Se realizó construcción de obras de mitigación, reconstrucción de zanjas corona en el talud de la margen derecha. El revestimiento de la zanja presenta un rápido deterioro a lo que se suma la presencia de ganado en el sector, se requiere realizar las reparaciones y terminar el revestimiento de la zanja, complementar las obras de drenaje, mantenimiento de la calzada con adición de material para renivelar y pronta atención en la parte baja en especial PR 84+0900 donde se aprecia cómo la socavación en la pata ha ocasionado deslizamiento el cual ya afecta el carril izquierdo donde se observa pérdida parcial de banca y de la cuneta. Debido al incremento del movimiento de la masa de suelo en la cazada se acentuaron notoriamente los daños, el contratista Consorcio Vial MHC 056 realiza el retiro de las capas granulares y de la subrasante afectadas para proceder con su extensión y compactación a fin de restablecer la transitabilidad.
PR 86+0700	Antiguo escarpe asociado con flujo de detritos talud superior y proceso en talud inferior con afectación sobre la banca de la vía. Sector acceso sur Puente la Orquídea 2, el terreno presenta movimiento, en la calzada se observan fisuras y en el muro del costado izquierdo se alcanza a apreciar desplazamiento, en la parte posterior al estribo bajo la losa de aproximación se observa socavación, el movimiento del suelo va de la parte alta, pasa por debajo del contrapeso y se puede observar el movimiento del terreno por ese costado en el talud inferior al puente.
PR 87+0000	Se encuentra el paso por la calzada a nivel de capa asfáltica avance de un 99%, pendiente se encuentra la instalación de pernos y manto de protección en el talud inferior y concluir algunos canales. Se construyeron 10 terrazas de 5m de ancho cada una con zanjas para la captación de aguas de los drenes transversales que se instalaron en los taludes, las zanjas llevan el agua captada hasta los descoles ubicado en los extremos y que van desde la parte alta hasta llegar al canal ubicado a nivel de calzada, las terrazas cuentas con obras de protección con manto TRM500, pernos pasivos y malla eslabonada. A nivel de calzada se instalaron micropilotes unidos por viga cabezal, pilotes d=60 y d=40 cm unidos por placas, concreto celular, muros de confinamiento y geo bloque, en el talud 1 contiguo a la calzada se construyó un muro pantalla, 5 filas de anclajes activos, dados

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
	y viga reticulada, en el talud inferior, drenes transversales y trinchos (parte de estos se perdieron debido a la acción del río en la pata del talud). Se realizó siembra de vegetación y se instaló biomanto.
PR 88+0000 AL PR 88+0300	Zona de alto riesgo debido al avance de la acción erosiva del rio en el talud inferior, el cual ha afectado construcciones y se encuentra cercano a la calzada.
PR 103+0200	**Punto crítico**: debido al incremento del proceso de hundimiento se presentan grietas en el pavimento y en la alcantarilla tipo cajón con fallas estructurales de consideración, hay socavación de la zona.
PR 105+1250	Con el contrato 1858 de 2020 se realizaron las actividades para recuperación de la banca y paso a dos carriles.
PR 114+0400 AL PR 114+0850	Sector Unete: hundimiento progresivo del tramo, hay fisuras, deformación y afectación en obras de drenaje.
PR 115+0000 AL PR 115 +0800	En temporada de invierno, especialmente, se presenta caída y deslizamiento de suelo y rocas de gran tamaño, procedente del talud costado izquierdo, situación que pone en alto riesgo a los usuarios de esta vía. En este periodo (22 de julio) se presentó una emergencia en el PR 115+0800 que consistió en la caída de una roca de grandes proporciones que ocasionó el cierre total de la vía y daños materiales a un camión.
PR116+0410	Debido a que la obra no cuenta con cabezal la escorrentía está socavando el costado derecho, la calzada presenta fisuras y hay perdida de borde del pavimento, alto riesgo para los vehículos circulantes.
PR 117+0200 AL PR 117+0550	sector inestable, en el PR 117+0350 en temporada de invierno se presenta deslizamiento de material.

2.3.1.6 PUENTES VÍA EL CRUCERO AGUAZUL

El tramo 6211 cuenta con 26 puentes de los cuales 12 fueron terminados entre los años 2012 y 2015, todas estas estructuras se encuentran localizadas entre en el departamento de Boyacá entre los PR 52+0752 y el PR 91+0260.

En el cuadro siguiente se relacionan los puentes existentes en el tramo 6211 el Crucero – Aguazul y se describen sus principales necesidades.

NOMBRE	PR INICIAL	LONGITUD (m)	ESTADO
TOQUILLA	42+0313	16.3	REGULAR
CUSPAQUIRÁ	51+0050	12.9	REGULAR
PEÑA DE GALLO	52 + 0752	360	BUENO
LA ROCHA	64+0385	140.8	BUENO
LA LEJÍA	69+0640	10.96	BUENO
LA CÓNGUTA	76 + 0435	86,7	BUENO.
CURISÍ	77 + 0800	28,7	BUENO
LA LEONERA	80 + 0120	180	BUENO
LOS GRILLOS	81 + 0184	260	PUENTE FUERA DE SERVICIO, COLAPSADO.
LOS GRILLOS 1	81+0200	52	PUENTE METÁLICO, PROVISIONAL
LOS GRILLOS 2	81+0320	33	PUENTE METÁLICO, PROVISIONAL
PUENTE NUEVO	81 + 0444	104	PUENTE FUERA DE SERVICIO.

NOMBRE	PR INICIAL	LONGITUD (m)	ESTADO
CHORROBLANCO	81 + 0548	299,76	PUENTE DECLARADO EN CIERRE TOTAL AL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL.
LA MOLINERA (VERBENO)	82 + 0550	40	PUENTE FUERA DE SERVICIO.
QUEBRADA NEGRA	84+0235	22	PUENTE FUERA DE SERVICIO.
QUEBRADA NEGRA 1	84+0230	43	PUENTE METÁLICO, PROVISIONAL
LA CHIGÜIRERA	85 + 0536	108	BUENO
ORQUÍDEA 1	86 + 0485	110	PUENTE FUERA DE SERVICIO, COLAPSADO.
ORQUÍDEA 1.1	86+0510	46	PUENTE METÁLICO, PROVISIONAL
ORQUÍDEA 1.2	86+0505	56	PUENTE METÁLICO, PROVISIONAL
ORQUÍDEA 2	86 + 0622	92	BUENO
LA GRANJA	87+0400	200	BUENO
LA CASCADA	89 + 0315	96	BUENO
CUSIANA	90 + 0104	46	BUENO
GUADALCANAL	91+0208	52	BUENO
HOYO CALIENTE	102+0693	10.6	REGULAR
LA CHICHACA	103+0692	22	MALO
LA GUÁYMARA	105+0492	15	REGULAR
LA PALMICHA	112+0591	15.7	REGULAR
UNETE	113+0462	101.1	BUENO
MARLENY	116+0171	10.9	REGULAR
LAS LAJAS	117+0250	11	MALO

- **PUENTE TOQUILLA.**

Esta conformado por una estructura inicial con estribos y pila en mampostería (bloque piedra pegada) y una ampliación posterior con estribos en concreto. La superestructura en ambos casos es en concreto reforzado.

Presenta socavación en los estribos y el apoyo central, también, se observa deflexión en la placa de la superestructura de la sección antigua, que, se refleja en la baranda.

Los espolones construidos para proteger la margen izquierda aguas arriba fallaron, por lo que, se requiere su reconstrucción.

Teniendo en cuenta que este puente no cumple con las especificaciones de construcción vigentes, y las afectaciones actuales, se recomienda la construcción de un puente nuevo.



Vista general puente La Toquilla.

- **PUENTE CUSPAQUIRÁ.**

Puente en condiciones aceptables de funcionamiento. Presenta pérdida de la baranda derecha. Se recomienda la construcción de un puente nuevo acorde con la normatividad de diseño y construcción vigentes.



Vista general puente Cuspaquira.

- **PUENTE PEÑA DE GALLO.**

Puente en buenas condiciones de funcionamiento. Por el costado derecho, debido a la cercanía del talud y a que la superficie del mismo es roca altamente fracturada y expuesta, presenta daño en la baranda a la


salida del puente por caída de rocas sobre la superficie del puente. Presenta deterioro en las juntas, lo que permite la filtración del agua lluvia y el consecuente deterioro de los estribos.



Vista general puente Peña de Gallo.

- **PUENTE LA ROCHA.**

Puente en buen estado de funcionamiento. Presenta deterioro en las juntas, principalmente en la junta de salida donde hay pérdida de una sección de la junta dentada. También presenta afectación en la baranda derecha a la salida del puente.

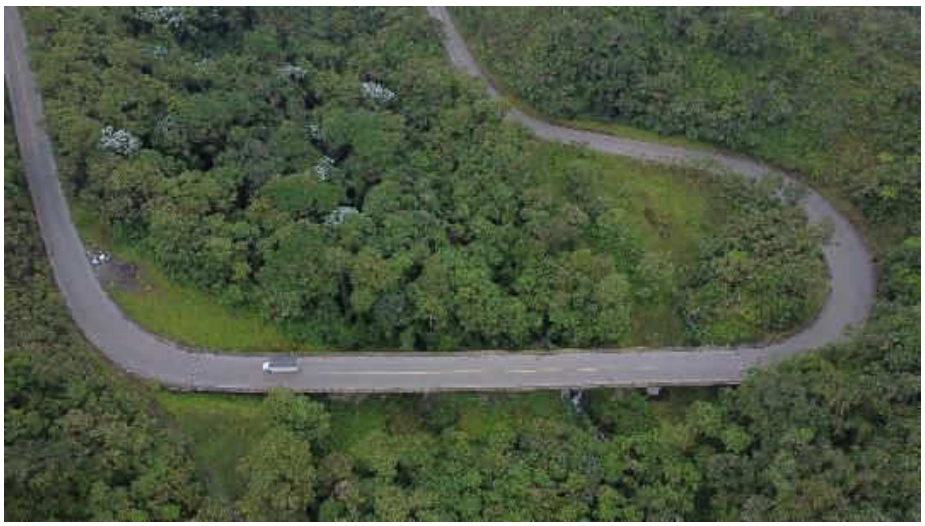

Vista general puente La Rocha.

- **PUENTE LA LEJÍA.**

Puente en buen estado de funcionamiento. Está conformado por una estructura inicial con estribos en

mampostería (bloque piedra pegada) y una ampliación posterior con estribos en concreto. La superestructura en ambos casos es en concreto reforzado, no obstante, presenta exposición del acero de refuerzo en las vigas del puente.



Vista general puente La Lejía.

- **PUENTE LA CÓNGUTA.**

Puente en buen estado de funcionamiento.



Vista general puente La Conguta.

- **PUENTE CURISÍ.**

Puente en buen estado de funcionamiento, requiere mantenimiento periódico en las barandas metálicas

como sandblasting y pintura.
Presenta también deterioro en las juntas, socavación en el estribo norte.



Vista general puente Curisí.

- **PUENTE LA LEONERA:**

Se encuentra dentro de una zona inestable, la corriente de la quebrada ha socavado las zonas laterales de su cauce exponiendo la cimentación de la pila central que está próxima a este. La pila presenta micro fisuras en la base; presenta también daño en las juntas de la superestructura y filtración de agua del agua Se encuentra dentro de una zona inestable, la corriente de la quebrada ha socavado las zonas laterales de su cauce exponiendo la cimentación de la pila central que está próxima a este. La pila presenta microfisuras en la base; presenta también daño en las juntas de la superestructura y filtración de agua del agua lluvia.

En los accesos norte y sur hay movimiento del terreno que pueden generar un efecto torsor, dado que la estructura está en una zona inestable requiere controles y monitoreo permanente. La pila central y la viga principal entre el apoyo y el estribo 2 presenta fisuras con inclinaciones a 45 grados.
Con cargo al contrato 1858 de 2020 el Consorcio vial MHC 056 ha realizado por transitabilidad reparación de la junta sur y nivelación del acceso con mezcla asfáltica (carril izquierdo)



Empuje del terreno sobre el costado norte del puente

- **PUENTE LOS GRILLOS.**

El 20 de agosto de 2023 a las 8:10 am se presenta el colapso del puente. La estructura se encuentra localizada en una zona geológicamente inestable que presenta movimientos en masa tanto del talud superior como del talud inferior.

En diciembre 2023 se habilitó el paso alterno por el costado derecho del puente mediante rehabilitación de la antigua vía y la instalación de dos puentes metálicos.



Vista general puente Grillos.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Vista general puentes metálicos instalados, paso provisional.

- ***PUENTE NUEVO.***

La estructura presenta fisuras a 45°en viga cajón apoyo final por el costado derecho las cuales no han presentado variaciones de abertura significativas, la pila 1 presenta fisuras abiertas en la base, y entre el apoyo y la pila 1 hay cárcava en el terreno, en la zona hay drenes que instaló el contratista.
Entre el apoyo estribo 1 y la pila 1 hay grietas en el terreno, la viga cabezal de los caisson en la pila 1 presenta fisuras.

El estribo compartido por los puentes Puente Nuevo y Chorro Blanco, presenta un asentamiento diferencial, causando la inclinación en dirección del río Cusiana y hacia la quebrada Los Grillos. El estribo presenta fisuras del lado puente nuevo. La junta entre los dos puentes fue reparada.



Vista general Puente Nuevo.



Cárcavas en muro de contención apoyo 1



Escarpe del terreno entre estribo norte y apoyo 1

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Apoyo 2. Puente Nuevo



La pila 1 presenta fisuras en el dado de la corona de los pilotes.

- **PUENTE CHORRO BLANCO.**

Al igual que los dos puentes anteriores, este puente se encuentra localizado en una zona altamente inestable que presenta movimientos en masa de los taludes superior e inferior.

El apoyo que comparten los puentes "***Puente Nuevo y Chorroblanco***", debido al movimiento del talud inferior hacia el rio cuasina y hacia la quebrada Los Grillos, genera un asentamiento diferencial, causando la inclinación del estribo en dirección del río Cusiana y el desplazamiento hacia la quebrada Los Grillos. Estos movimientos han generado la perdida del apoyo de la viga 1 del puente Chorro Blanco lo que genera esfuerzos de torsión para los cuales no está diseñado este elemento. Adicionalmente los topes sísmicos, que están anclados al estribo compartido que se está moviendo, generan esfuerzos de tracción para los cuales tampoco está diseñada la estructura.
Desde el mes de julio de 2024 se instalo un sistema de monitoreo robótico en tiempo real y en este mes se

instaló un sistema adicional de monitoreo tipo inclinómetros por radiofrecuencia en Puente Nuevo para monitorear los movimientos tanto del terreno como de las estructuras.

Las afectaciones a las estructuras de los puentes y el movimiento del terreno han sido evaluadas por especialistas, estructurales y de geotecnia, de la empresa constructora, del Consorcio Vial MHC 056, de la interventoría del contrato 1858 de 2020 y del Instituto Nacional de Vías "INVIAS" quienes de manera unánime recomendaron cerrar el paso por el viaducto para todo tipo de vehículos, personas y semovientes.

Para tal efecto el INVIAS emitió las siguientes resoluciones:

- **Resolución número 02540 del 26 junio 2024. Medidas de restricción al tránsito de vehículos de carga entre el PR16+0000 y el PR107+0200 así**:

1. Restricción al paso de vehículos con peso bruto vehicular superior a 32 toneladas, entre el PR16+0000 y el PR107+0200.
2. Restricción al paso de vehículos de carga con categorías superiores a C3S3, entre el PR16+0000 y el PR107+0200.
3. Paso uno a uno con velocidad máxima de circulación de 20 km/h, entre el PR84+0100 y el PR85+0800.
4. Restricción al paso de vehículos que superen las dimensiones establecidas en la Resolución 4100 del 2004, expedida por el Ministerio de Transporte, entre el PR84+0100 y el PR85+0800.
5. Restricción de la velocidad de circulación, sobre los puentes metálicos ubicados entre el PR84+0100 y el PR85+0800, a máximo 10 km/h.
6. **Cierre total entre el PR81+0000 y el PR82+0000.**

- **Resolución 2707 del 03 de julio de 2024 Declaratoria de Emergencia en la Infraestructura de Transporte, cierre definitivo entre el PR 77+0000 (Curisí) y el PR 90+0000 (Pajarito)**



Vista general Puente Chorro Blanco.



Pérdida de alineamiento horizontal y vertical entre barandas de puente Nuevo y Chorroblanco



Pérdida de alineamiento horizontal y vertical entre los andenes de puente Nuevo y Chorroblanco

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Viga que presenta fisuras en puente Chorroblanco



Fisuras en viga de la luz 2 Chorroblanco

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Inestabilidad de la zona, deslizamentos talud superior



Inestabilidad de la zona de aproximación al acceso sur de Chorroblanco

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Vista general apoyo 3, cimentacion expuesta debido procesos de socavación por la inestabilidad del talud inferior.



Se observa el asentamiento diferencial en apoyo compartido de los puentes Nuevo y Chorroblanco

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



La variante Grillos se conectó a la superestructura del puente Chorro Blanco.

- **PUENTE LA MOLINERA (VERBENO)**.

Este puente se terminó de construir en el año 2012, dos días después de darse al servicio se produjo un desplazamiento del terreno ocasionando el basculamiento de la estructura.
Puente Colapsado.



Puente La Molinera (Verbeno) colapsado y variante habilitada.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

- **PUENTE QUEBRADA NEGRA.**

Puente de cimentación superficial, con cargo al contrato 1858 de 2020 se recalzaron los estribos y cunetas aguas arriba, se efectuó una canalización del cauce y se hizo la reconstrucción del tramo de muro de protección margen derecha.
Debido a la creciente súbita del 2 de agosto de 2023, el puente quedó debilitado en su estructura por lo que se instaló un puente metálico de 42 metros de longitud y obras de protección en las riberas con bolsacretos. Debido al radio de giro en el costado sur, el puente metálico está expuesto a golpes.



Vista general puente Quebrada Negra



Puente metálico instalado sobre el de concreto.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

- **PUENTE LA CHIGÜIRERA**

Este puente presenta daño en la junta de salida por perdida, grietas en muro de acompañamiento acceso norte, se observa desplazamiento del terreno aledaño al apoyo norte, zona inestable.



Vista general puente Chigüirera.

- **PUENTE LA ORQUÍDEA 1**.

Puente fuera de servicio, colapso el 29 de octubre de 2019. Se instalaron de 2 puentes metálicos tipo Acrow para mejorar las condiciones de transitabilidad en el sector. Como medida provisional se construyó una batea sobre el lecho de la quebrada para dar transitabilidad por el sector.

Posteriormente entre enero y febrero de 2022 se instalaron dos puentes metálicos tipo Acrow para dar transitabilidad por el sector. El puente 1 instalado por el costado derecho tiene una longitud de 56 m y el puente 2 instalado por el costado izquierdo tiene una longitud de 45 m.

Dentro del contrato 1858 de 2020, realizan controles topográficos ya que esta zona es inestable y presenta movimientos.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031




Vista general puente Orquídea 1, colapsado y puentes metálicos instalados.



Vista general puentes metálicos instalados, paso provisional Orquídea 1.

- **PUENTE LA ORQUÍDEA 2**.

Puente en buen estado de funcionamiento. Se observa afectación por el agua lluvia en la parte posterior del estribo sur, está arrastrando material y puede dejar expuesta la viga cabezal y caisson.

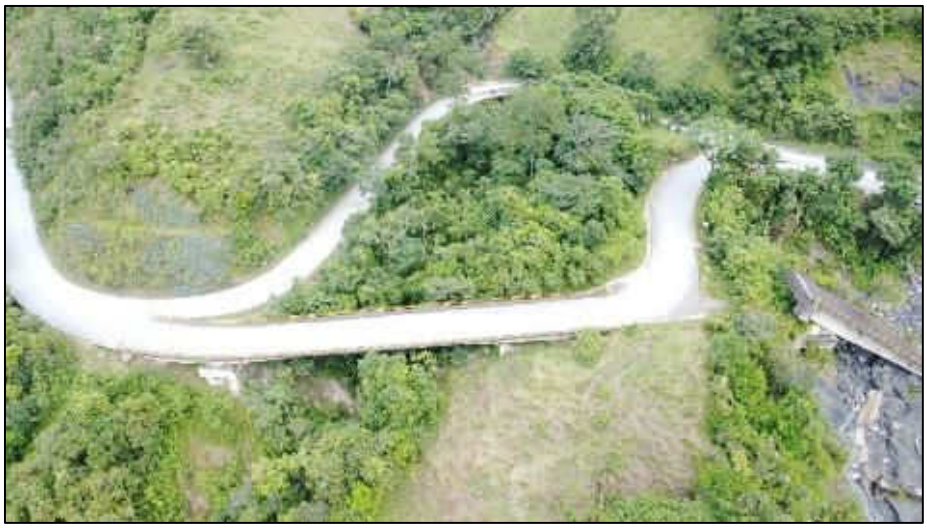

Vista general puente Orquídea 2.

- **PUENTE LA GRANJA**.

Puente en buen estado de funcionamiento. Se presenta sedimentación de material aguas arriba de la quebrada. Se observan procesos de erosión y socavación en zonas próximas a las pilas.



Vista general puente La Granja.

- **PUENTE LA CASCADA**.

Puente en buen estado de funcionamiento. Se presenta sedimentación de material aguas arriba de la quebrada. Se presenta pérdida de los elementos que forman la juna metálica dentada a la salida del puente.



Vista general puente La Cascada.

- **PUENTE CUSIANA**.
  - Puente en buen estado de funcionamiento.



Vista general puente Cusiana.

- **PUENTE GUADALCANAL**.

Puente en buen estado de funcionamiento.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Vista general puente Guadalcanal.

- **PUENTE HOYO CALIENTE**.

Puente en regular estado general debido a que ya cumplió su vida útil, fue construido a mediados del siglo pasado. Presenta deterioro en la carpeta asfáltica y se encuentra ubicado en una curva de radio mínimo, por lo cual con cargo al contrato 1858 de 2020 se está ampliando, para mejorar la transitabilidad.



Vista general puente Hoyo Caliente.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Vista general construcción caisson para ampliación.



Vista general construcción vigas postensadas para ampliación.

- **PUENTE LA CHICHACA**.

Puente construido a mediados del siglo pasado, según Sipucol, en 1958. A pesar de la capacidad de diseño es de 30Ton, las cargas de servicio pueden llegar a superar las 52 Ton. En general el puente se encuentra en malas condiciones tanto en la superestructura como en la infraestructura y en el cauce de la quebrada.

La super estructura, combinada entre acero y concreto, presenta corrosión en las vigas metálicas que soportan la placa de concreto, daño total en las juntas del puente que generan impacto a la estructura principalmente por los vehículos de carga pesada.


La infraestructura presenta pérdida de la aleta izquierda a la salida del puente, Se realizó recuperación del enrocado de protección aguas arriba margen izquierda con cargo al contrato 1858 de 2020 a cargo del Consorcio Vial MHC 056. También se presenta deterioro en la cimentación de los estribos.

Los taludes del costado izquierdo de la quebrada presentan deslizamientos del terreno, originados por la socavación de la pata del talud durante las crecientes de la quebrada.

Los disipadores de energía de las cunetas se encuentran fallados, lo que ayuda a la socavación de los taludes.



Vista general puente la Chichaca.

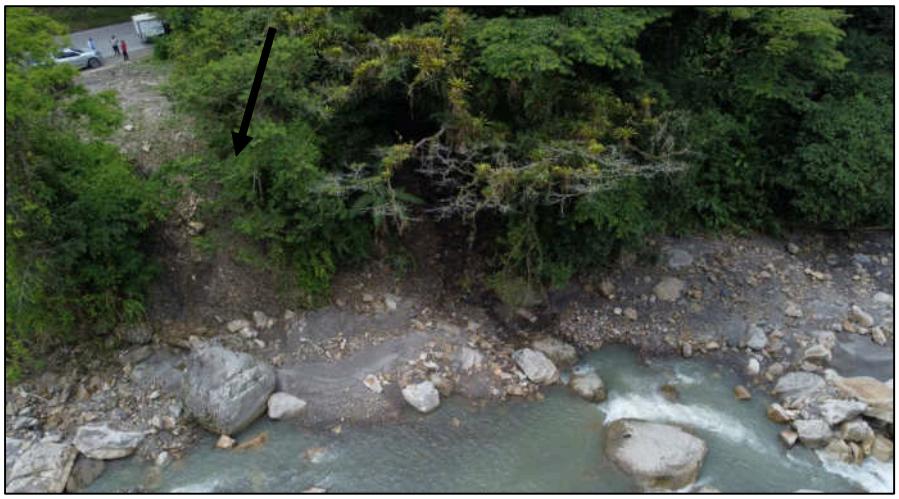

Erosión en la parte inferior del talud de la vía por acción de la quebrada la Chichaca aguas abajo.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Erosión en la parte alta del talud superior de la vía por acción de la quebrada, margen izquierda aguas arriba.

- **PUENTE LA GUÁYMARA**.

Puente en regular estado general debido a que ya cumplió su vida útil, fue construido a mediados del siglo pasado. Presenta deterioro en la carpeta asfáltica y se encuentra ubicado en una curva de radio mínimo,

Con cargo al contrato 1858 de 2020 se tenía proyectado ampliar este puente, pero los trabajos fueron suspendidos y tan solo se realizó la excavación y revestimiento de los anillos para los caisson.



Vista general puente la Guaymara.



Trabajos de ampliación suspendidos.




Trabajos de excavación y construcción de anillos para los caisson, suspendidos.

- **PUENTE LA PALMICHA**.

Puente en regular estado general debido a que ya cumplió su vida útil, fue construido a mediados del siglo pasado y recientemente fue ampliado para mejorar la configuración geométrica, esto debido a que se encuentra ubicado en una curva de radio mínimo. La parte antigua del puente tiene un apoyo central mientras la ampliación es de una sola luz.

Presenta socavación en el estribo de entrada en la parte correspondiente a la nueva estructura. La parte antigua tiene una placa de fondo que también se encuentra socavada.

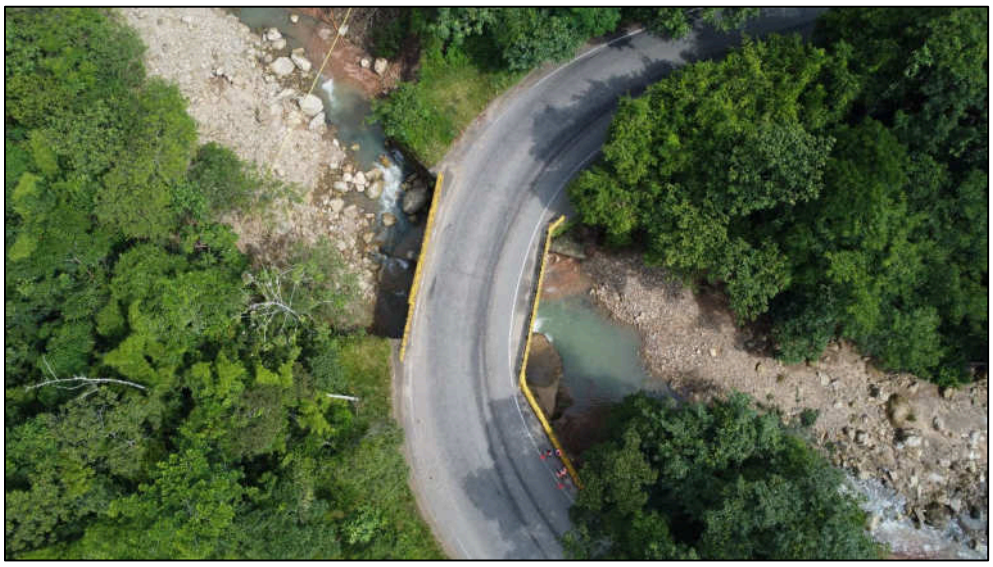

Vista general puente la Palmicha.



Vista general socavación estribo de entrada ampliación puente La Palmicha.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Vista general socavación placas de fondo puente La Palmicha.

- **PUENTE UNETE.**

Puente en buenas condiciones de funcionamiento. La superestructura es mixta de concreto y acero en arco superior, el acero tiene la propiedad que durante el proceso de mojado y secado continuo el acero forma una capa protectora conocida como patina, que impide el paso de la corrosión. Sin embargo, se puede observar en algunos elementos metálicos inferiores en la zona próxima a la losa, que hay corrosión, esto debido a la exposición continua al agua proveniente de mangueras que la comunidad del sector adosa al puente y las cuales presentan fugas permanentes, también presenta daños en las juntas.



Vista general puente la Unete.

- **PUENTE LA MARLENY.**

Puente en regular estado general debido a que ya cumplió su vida útil, fue construido a mediados del siglo pasado y recientemente fue ampliado para mejorar la configuración geométrica, presenta fisuras y hormigueros en las vigas, especialmente en el tramo de ampliación. No tiene barandas, solo bordillos.



Vista general puente la Marleny.

- **PUENTE LAS LAJAS.**

Puente en mal estado general debido a que ya cumplió su vida útil, fue construido a mediados del siglo pasado, se encuentra ubicado en una curva con radio mínimo, presenta hormigueros en las vigas desde el momento de su construcción lo que ha ocasionado corrosión en el acero de refuerzo principal en los apoyos.

Presenta afectación en el bordillo derecho a la salida del puente. La capacidad hidráulica también se ve afectada por una roca de gran tamaño localizada aguas arriba del puente.

Las cunetas y filtros para manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales no tienen disipadores de energía y caen directamente al cauce, ocasionando afectaciones a las zonas aledañas aletas.

Por su ubicación geométrica y estado este puente requiere ser reemplazado por uno nuevo que este acorde con la normatividad vigente y que permita mejorar la geometría de la vía.



Vista general puente Las Lajas.



Vista general roca de gran tamaño que disminuye la capacidad hidráulica del puente.

2.3.1.7 PUENTES VÍA AGUAZUL – YOPAL.

El Paso Nacional por Yopal del tramo 6512 no cuenta con puentes ni pontones.

2.3.1.8 PUENTES QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE

La Chichaca	Puente de cimentación superficial, capacidad 30T, estructura mixta en malas condiciones, presenta socavación aguas arriba y alto riesgo debido a la condición del talud. En este sitio han realizado estudios de exploración y según se conoce por información por parte contratista cuenta con estudios y diseños fase 3. El contratista Consorcio Vial MHC 056 adelantó trabajos de ampliación del enrocado, aguas arriba margen izquierda de la quebrada, y reacomodación, aguas abajo margen derecha de la quebrada, del enrocado construido por Gestión del Riesgo departamental.
Guáymara, Palmicha, Las Lajas	Puentes de cimentación superficial que presentan socavación.
Sector Los Grillos – Puente Nuevo- Chorroblanco PR 81+0000-PR 82+0000	CRÍTICO. el 20 de agosto de 2023 el tramo Los Grillos presentó colapso de la superestructura. Con el contrato 1858/2020 se habilitó un paso para mantener la movilidad en este punto. El sector del apoyo entre puente Nuevo y Chorroblanco presenta movimientos. Se requiere inspección especializada de los puentes, hay fisuras en la viga de las luces 2 y 3, en el apoyo 4 del puente Chorroblanco, y fisuras en apoyo 1 y estribo final del puente Nuevo. A lo largo de los puentes la zona es inestable de continuo movimiento lo que representa muy alto riesgo para las estructuras de los puentes Nuevo Chorroblanco. El puente Chorroblanco ha presentado incrementos en las afectaciones estructurales y se ha registrado (mediante estación robótica en tiempo real) aumento significativo del desplazamiento en la masa de suelo adyacente al estribo sur del puente los Grillos, lo que también acrecienta la alarma de posible colapso del puente Chorroblanco.
Puente Quebrada Negra PR 84+025	Con la creciente súbita ocurrida el 2 de agosto de 2023 se vio afectada la estructura del puente, se instaló un puente metálico y se instalaron bolsacretos en la margen derecha aguas arriba. Se mantiene control de tránsito mediante controladores viales entre el PR 84+0100 al PR 85+0800.

2.3.2 OBRAS HIDRÁULICAS MENORES

Los tramos a cargo 6211 y 6512 cuentan con los siguientes pontones:

#	TRAMO	PR INICIAL	LONG (m)
1	6211	22+0017	10,10
2	6211	23+0485	11,60
3	6211	31+0347	11,60
4	6211	32+0926	11,70
5	6211	43+0049	12,60
6	6211	43+0450	13,70
7	6211	44+0045	11,70
8	6211	47+0116	12,60
9	6211	57+0380	13,70
10	6211	63+0109	8,20
11	6211	68+0677	12,00
12	6211	72+0845	11,00
13	6211	80+0270	6,00
14	6211	80+0709	6,00

#	TRAMO	PR INICIAL	LONG (m)
15	6211	81+0800	6,40
16	6211	88+0184	4,00
17	6211	92+0763	4,00
18	6211	93+0525	7,50
19	6211	93+0923	5,00
20	6211	95+0122	10,00
21	6211	99+0055	6,20
22	6211	99+0400	5,20
23	6211	104+0255	5,00
24	6211	107+0032	8,20
25	6211	116+0560	5,00
26	6211	116+0970	5,00
27	6211	118+0190	4,00
	6512	No tiene pontones	

2.3.3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Rutas 6211 y 6512: Se ha venido revisando el inventario de señales verticales tomando como base inventarios de administraciones viales anteriores y se ha encontrado que un porcentaje cercano al 50% han sido vandalizadas (hurtadas) tal como se aprecia en las siguientes fotografías.



Señal vandalizada, tramo 6211.



Señal vandalizada, tramo 6211.

2.3.4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

- **Ruta 6211**

La señalización existente se encuentra en regular condición, hay tramos donde ya es inexistente

especialmente en las curvas, existen algunos sectores donde es poco visible siendo más crítico para la circulación en horas de la noche, especialmente la línea central.

Para el tramo entre Curisí y Pajarito, la señalización existente es deficiente debido a la situación de la vía, ya que en este trayecto se encuentra la mayoría de las zonas críticas.



Sector PR 87+0790 Tramo 6211



Sector Toquilla



Sector PR 115+0240



Sector PR 103+0000



Sector PR 53+0000



PR 51+0100

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Sector PR 69+0300



Sector PR 77+0400



Sector PR 86+0500



Sector PR 105

Ruta 6512

Se observa una demarcación en buenas condiciones consistente en líneas blancas de borde de pavimento y doble línea central.







2.3.5 SITIOS CRÍTICOS.

El tramo 6211 se encuentra localizado en su totalidad sobre la cordillera oriental, y presenta gran cantidad de sitios de inestabilidad geológica, con suelos poco consolidados los cuales dificultan el tránsito de los vehículos tanto de carga como de pasajeros por este corredor vial.

Adicionalmente a las dificultades de tipo geológico se suma la ubicación de la vía en las cercanías a los ríos Cusiana y Únete, los cuales, en épocas de lluvia,
ocasionan procesos de socavación de los taludes inferiores de la vía, acelerando los procesos en las zonas de

inestabilidad, hundimientos y fallas en la banca.

Otros sectores afectados por acción erosiva de ríos y quebradas son los taludes inferiores de la calzada en tramos aguas abajo de las quebradas Chichaca, Guáymara, Lajas y Palmicha que también involucran a los puentes del mismo nombre.

PR 43+0045 y PR 47+0120. Los pontones aquí ubicados presentan socavación en los estribos, requiriendo la protección de estos con concreto ciclópeo y bolsacretos

PR 66+0000: zona inestable falla activa. La instabilidad de la zona ocasionó la deformación de la calzada, del muro y separación en la unión de la tubería ocasionando filtración del agua.



Vista general estado drenaje.

PR 78+0900 ***Quebrada La Amargosa***, arrastre de material tipo lodos y detritos, en temporada de invierno ocasiona cierres continuos, por arrastre de material hacia la calzada. En la parte alta se aprecian escarpes y material suelto, zona de alto riesgo en temporada de invierno.



Antes *Ahora*

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Parte media

79+0100 y 79+0800: Los dos puntos están dentro de tramos inestables, en la calzada se evidenciaba fisuras tipo media luna. El talud inferior muestra la acción del río Cusiana en la base del talud a la cual se suma la infiltración de agua procedente del talud superior. Calzada y cuneta presentaron un fuerte escalonamiento, para mantener la transitabilidad se ha adicionado material de fresado. La capa asfáltica para mejorar condiciones de transitabilidad ya se ha deteriorado se mantiene con adición de material granular



PR 79+0100

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031




Pr 79+0800:Talud superior presenta carcavas el canal que se construyó en la parte superior en sacos de suelo cemento se ha deteriorado la presencia de ganado ayuda a que su duración sea mucho menor. Debido a la inestabilidad del terreno el filtro y la alcantarilla se tapan de material, situación que en temporada de invierno es crítica.

80+0100 SECTOR HUERTA VIEJA: zona inestable, la calzada presenta hundimiento con afectación de obras de drenaje, el talud inferior presenta erosión y escarpes, el muro presenta cabeceo y fracturas, el box existente en el tramo ha sufrido desplazamiento, el disipador está colapsado y hay infiltración de agua hacia el talud inferior, como se aprecia en las fotografías los terrenos están deforestados y son usados para pastoreo y cultivos:







Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

80+0100 SECTOR LEONERA: Zona inestable,el talud superior presenta escarpes y grietas, se han presentado desplazamiento del terreno en ambos costados de la estructura del puente, el costado norte lado derecho el movimiento del terreno esta generando empuje en el extremo,al ser este puente una estructura con un apoyo central los empujes que se generen en cualquier extremo puede ocasionar un efecto torsor lo que seria critico para elpuet, según manifestaron los especialistas. En el costado sur el empuje de la masa de suelo se evidencia en calzada de la via y los muros del aproche próximos al acceso del puente



Costado sur



Apoyo central



Costado norte





PR 80+0980 AL PR 82+0000 La zona está compuesta por depósitos coluviales se encuentra entre dos fuentes hídricas Q. Grillos y Q. Chorroblanco, esta zona presenta procesos de socavación, flujos de detritos y deslizamientos complejos que comprometen al puente Chorroblanco al cual se empalma la variante Grillos.

Se observa que el material del talud tiene un continuo proceso de deslizamiento hasta la parte más baja y que está dejando expuesta la cabeza de los caisson en la pila 3.

Puente Nuevo – Chorroblanco: el apoyo compartido entre los puentes presenta desplazamientos horizontales y verticales, el estribo presenta fisuras, en el lado Chorroblanco se aprecia en un tope sísmico que las varillas de 1” ya se encuentran dobladas producto de los desplazamientos presentados

20 de agosto de 2023: se presentó colapso del puente Grillos, para superar la emergencia dentro del contrato 1858 de 2020, se habilitó por la antigua vía una variante entre Grillos y Puente Nuevo la que entrega lateralmente en el puente Chorroblanco.



Sector Chorroblanco. Terreno inestable, movimiento en masa que afecta la estructura del puente.



Puente Chorroblanco. Se observa exposición de la cimentación en la pila 3

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Varillas del tope sísmico afectadas por el desplazamiento de la estructura



Aparición de fisuras en el tablero de puente Chorroblanco

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Desplazamiento vertical en apoyo compartido Puentes Chorroblanco y Nuevo.



Desplazamiento horizontal en apoyo compartido puentes Chorroblanco y Nuevo.



Aparición de fisuras en la pila 2 de puente Chorroblanco

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Fisuras en viga-cajón del puente Chorroblanco.



Fisuras en viga-cajón del puente Chorroblanco.

PR 82+0100. ZONA DE FALLA ACTIVA. Con el contrato 1858 de 2020 se instalan 80 drenes distribuidos en el talud superior e inferior cada 5 metros en una longitud de 200 ml, se continuó la intervención de la zona para lo cual se retiró la capa asfáltica bajo el nivel de la rasante mejorando la pendiente, recalce del canal lado derecho, construcción de 2 alcantarillas, demolición de los tramos de muro fallados, hasta el momento

el paso está a nivel de capa granular y la pantalla construida para tapar la zona de cabeza de pilotes, presenta fractura, indicativas del movimiento que presenta la zona.



Pantalla construida costado derecho contrato 1858 de 2020



PR 82+0190. Tramo inicial del canal, colapsado.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PR 82+0190. Tramo inicial del canal, colapsado.

PR 82+0500, Sector variante La Molinera, presenta un deslizamiento complejo, la obra de drenaje tipo box que hay en el paso por la quebrada presentan socavación. Se realizaron trabajos de protección con enrocado. ***Es una quebrada cuya pendiente hasta el río es alta, situación que puede ocasionar que ante próximas crecientes arrastre todo el material y produzca el colapso de la obra existente dejando inhabilitado el paso***. Como se aprecia en la foto aérea la quebrada en sus áreas aledañas presenta erosión y escasa vegetación dado que el suelo en su mayoría en la parte alta y baja es empleado para pastoreo. Es muy complejo para esta vía, que se desarrolla en una zona de extensa falla geológica, que se logre mitigar los puntos críticos sólo con obras civiles ya que no existe control ni compromiso en la parte ambiental para la protección del suelo y de las cuencas de ríos y quebradas



SECTOR PR 82+0670 al PR 83+0145 Zona que había sido intervenida anteriormente, presenta erosión, filtración, afectación en obras, Flujo de detritos.

PR 82+0700: Inestabilidad talud lado derecho, el muro existente en uno de los tramos presenta desplazamiento, la calzada presenta fisuras transversales y las cunetas en ambos costado desprendimiento

y deformación, afloramiento de agua, cabeceo de 2 secciones del muro del canal lado derecho.





PR 82+0900 – PR 83+0080 (Tobogán). Sector inestable, el talud superior presenta escarpes, hay deslizamiento de material y continuo afloramiento de agua.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PR83+0000 Tobogán: talud superior presenta escarpes y desprendimiento de detritos sobre calzada.



PR 83+0080 aunque existe un muro de contención y canal en costado derecho, en la calzada se presenta hundimiento, el actual contratista reniveló con material de fresado por seguridad para los vehículos.

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Renivelación por transitabilidad dentro del contrato 1858 de 2020

PR 83+0200: Hundimiento de banca, el paso se mantiene con material de fresado

PR 83+0600: Talud inestable costado derecho, flujo continuo de lodos y detritos que ocasionan, en temporada de invierno, el cierre total debido a la saturación y caída del suelo.

Dentro del contrato 1858 de 2020 se mantiene despejada la calzada, mediante el retiro de material.



Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PR 84+0256 Quebrada Negra: La cimentación del puente resultó afectada por un proceso acelerado de socavación. En la zona se observan bolsacretos que han sido instalados para la protección de los estribos y se instaló un puente metálico,

PR 84+0500 al PR 85+0150 sector de Barro Negro: Se encuentra en un tramo de falla activa. En el tramo se puede apreciar afectación de la zona por acción erosiva en el talud inferior y daño de espolones.

PR 84+595 – PR84+0802: Talud superior presenta afloramiento continuo de agua, suelo en condiciones de represamiento

PR 84+0950 al PR 85+0250: En la margen izquierda del río se presenta afectación por socavación lateral. Como se muestra en las fotografías, por el costado izquierdo y talud inferior, los espolones están partidos y otros colapsados, se observan escarpes, en la calzada se presentan fisuras tipo media luna y se observa hundimiento de ésta, la cuneta del lado izquierdo presenta separación, hay socavación y en la zona del hombro se aprecian grietas.

Por el costado derecho talud superior se observa; el muro del canal está partido y colapsado en diferentes puntos, hay filtración de agua hacia la calzada situación que afecta la banca, se observan fisuras transversales y afloramiento de agua.

Talud inferior: cuenta con 7 espolones, el primero colapsó, el segundo y el tercero están bien, el cuarto, quinto, sexto y séptimo están partidos, ante las crecientes que se han presentado el caudal supera los espolones, afectando la pata, se observó que después de los espolones, en el sentido de avance del rio margen derecha, este ha socavado la base del talud inferior de la vía, zona que corresponde al tramo donde la calzada presenta mayor afectación, el talud presenta saturación del suelo.
Sector PR 85+0000. Zona inestable. En la parte alta terreno erosionado, con cárcavas, falla rotacional y una zona totalmente deforestada, en la parte baja se observa erosión en la pata del talud y la vegetación presenta inclinación, hay un tramo próximo al sector de la Chigüirera que corresponde a un relleno y presenta grietas en el terreno del talud inferior.



El tramo vial comprendido entre el PR 84+0900 al PR 85+0350 es una zona de geología inestable, actualmente la zona presenta una falla rotacional en el talud superior y en el margen del río presenta afectación por socavación lateral, situaciones que progresivamente han llevado al tramo a una condición crítica de altísimo riesgo; donde se puede observar:
-En el PR 84+0950, pérdida de banca que inició con una socavación bajo la zona de cuneta y que actualmente ya degeneró en hundimiento y pérdida parcial de la bancada.

-En el tramo comprendido entre el 84+0900 al PR 85+0350 . Hundimiento y fisuras en la calzada, debido a la falla rotacional que involucra tanto al talud superior como al inferior y que afecta, además de toda esa masa de tierra, a las obras de contención, cunetas existentes y la calzada.


-Pasando del PR 85+0150. se observan fisuras, grietas, hundimiento, afectación en una obra de drenaje y en la zona próxima al acceso norte del puente la Chigüirera.

Se considera urgente que se adelanten todas las gestiones necesarias que permitan atender, a la mayor brevedad, este sitio crítico, preferiblemente antes de que se vea afectada totalmente su estabilidad y en consecuencia se exponga gravemente, en primer lugar, la vida de los usuarios de la vía y en segundo lugar la transitabilidad del tramo que al estar en alta probabilidad de colapso ocasionaría una interrupción total del tránsito vehicular.



Tramo crítico PR 84+0900 – PR 85+0350. Siete Espolones

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.
dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

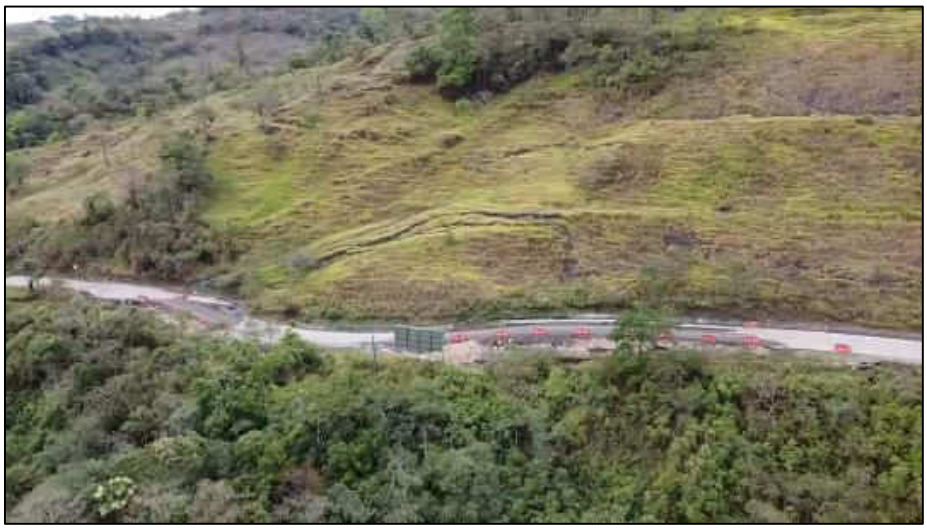

Grietas en talud superior, hundimiento y pérdida de banca por falla rotacional



Hundimiento banca PR 85+0050 al PR 85+0150

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



La dinámica del río afecta ambas riberas



Talud inferior entre 85+0150 al 85+0300; hay grietas y cárcava y en la pata un proceso de erosión, la calzada presenta fisuras, grietas y hundimiento

El terreno presentó movimiento rotacional, el tramo se encuentra en riesgo de pérdida de la bancada, es necesario recuperar y/o mantener los espolones existentes, construir obras de protección en la base de talud, realizar obras complementarias para mitigar la acción erosiva en la parte inferior, en el talud superior instalar drenes transversales y obras complementarias.

Hasta la fecha el actual contratista 1858 de 2020 ha realizado medidas de mitigación y transitabilidad.

PR 103+0692 La Chichaca. El contratista instaló un enrocado en el acceso de salida del puente (margen izquierda de la quebrada).



Antes



Ahora

PR 103+0240: sector crítico que presenta un proceso de movimiento en masa, la calzada presenta hundimiento en un tramo de aproximadamente 60 metros y fisuras abiertas. Debido a los periodos intensos de lluvia, hay saturación del suelo y filtración del agua, debido a la reactivación de la condición de falla, también se observa afectación en cuneta y alcantarilla.



Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PR 112+0500 sector Unete. Hundimiento calzada costado izquierdo por acción erosiva del río Palmicha en el talud inferior costado izquierdo de la vía.

Sector *inestable PR 114+0400 AL PR 114+0850.* Presenta socavación talud inferior lado izquierdo por acción erosiva del rio Unete, la calzada presenta escalonamientos, fisuras abiertas, socavación en obras y fracturas en alcantarillas, deformaciones y hundimiento, talud superior lado izquierdo presenta movimiento.



Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

PR 115+0000 al PR 115+0800. Inestabilidad del talud lado izquierdo: se presentan continuos deslizamientos de roca suelo y capa vegetal del talud lado izquierdo, por el lado derecho, talud inferior de la vía, está la acción erosiva del río Unete.





Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031





2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El Instituto Nacional de Vías “INVIAS” con el presente proyecto de Mantenimiento Rutinario de las rutas 6211 entre los PR 16+0000 al PR 118+0616 y la ruta 6512 entre los PR 103+0287 y PR 105+0448, busca que los contratistas ejecuten de forma permanente y a lo largo de la vía las diferentes actividades encaminadas a preservar todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o daños, conservando en lo posible las condiciones que se tenían en el momento de su construcción o mejoramiento.

El programa de Mantenimiento Rutinario busca preservar “el patrimonio de la Nación, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía, de igual manera se busca contribuir a la generación y distribución de empleo de mano de obra no calificada eliminando los posibles intermediarios garantizando así en forma directa y estable una remuneración justa al trabajador que lo realiza. Vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participación permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma

que tome conciencia de que las obras públicas han sido construidas para beneficio común y deben ser conservadas.

Entre las principales actividades de Mantenimiento Rutinario se tienen:

- Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa.
- Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa. Se realiza limpieza de señales y despeje
- Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa. Retiro de derrumbes menores y apoyo al contratista en retiro de los mayores con apoyo de control tránsito.
- Atención de emergencias y vigilancia en los tramos. Además de los trabajos rutinarios a diario se realiza recorridos de inspección y se reporta estado de la vía antes de las 6:30 am y 5:00 pm
- Rocería y desmonte manual
- Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa
- Limpieza de muros

Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial o el director territorial. Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones. Durante este periodo las actividades se centraron especialmente en limpieza de obras de drenaje, rocería y despeje de calzada, también se realizó el retiro de deslizamientos menores en varios sectores.

En cuanto al programa de Administración Vial el Instituto Nacional de Vías busca optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, vigilancia y control de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía.

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA

3.1 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

La administración vial realiza el seguimiento y control a 2 contratos de mantenimiento rutinario los cuales describimos a continuación.:

3.1.1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD

SECTOR: Sogamoso - Aguazul, PR 16 + 0000 (El crucero) - PR 64 + 0539 (Puente Quebrada La Rocha Incluido)

CONTRATO:	1666 del 2024
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.
VALOR INICIAL:	$1.854.367.126,00
PLAZO INICIAL:	29 meses
FECHA DE INICIO:	04 junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 julio de 2026

3.1.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

SECTOR:	6211 Sogamoso - Aguazul, PR 64 + 0539 (Puente Q. La Rocha) - PR 105 + 0642 (Puente Quebrada. La Guáymara Incluido)
CONTRATO:	1684 del 2024
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3.
VALOR INICIAL:	$1.894.958.851,00
PLAZO INICIAL:	29 meses
FECHA DE INICIO:	04 de junio del 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de julio de 2026

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS

Actualización estado contratos de mantenimiento rutinario

3.2.1 CONTRATO 1666 DE 2024

CONTRATISTA	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD CTA**	**NIT: 800.014.469**
OBJETO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.	
CONTRATO	**1666 de 2024**	
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CASANARE	
PLAZO INICIAL	29 meses	
FECHA DE INICIO	04 de junio de 2024	

FECHA FINAL	31 de julio de 2026
VALOR INICIAL	$1.854.367.126,00

VIGENCIA	*REGISTRO*	*PROGRAMA*	*RECURSO*	*VALOR*	*SALDO REGISTRO*
2024	427724 (16-may-2024)	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	601.006.660,00	426,714,729.00
2025	-	-	-	771.694.342,00	771.694.342,00
2026				481.666.124,00	481.666.124,00

VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	**$174.291.931,00**
PORCENTAJE EJECUTADO	**9.40%**

3.2.2 CONTRATO 1684 DE 2024

CONTRATISTA	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO**	**NIT: 844000065-0**
OBJETO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3	
CONTRATO	**1684 DE 2024**	
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CASANARE	
UBICACIÓN	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)	
PLAZO INICIAL	29 meses	
FECHA DE INICIO	04 de junio de 2024	
FECHA FINAL	31 de julio de 2026	
VALOR INICIAL	$1.894.958.851,00	

VIGENCIA	*REGISTRO*	*PROGRAMA*	*RECURSO*	*VALOR*	*SALDO REGISTRO*
2024	440524 (20-may-2024)	C-2401-0600-103-51102D-240102302 VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	614,162,641.00	436,055,475.00
2025	-	-	-	788,586,156.00	788,586,156.00
2026				492,210,054.00	492,210,054.00

VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	**$178,107,166**
PORCENTAJE EJECUTADO	**9.46%**

3.2.3 CONTRATO 2358 DE 2024

CONTRATISTA	**JAIRO GARZÓN DUARTE**	**NIT: 844000065-0**
OBJETO	" CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS CON CÓDIGO 6512, 6211, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL CASANARE."	
CONTRATO	**2358 DE 2024**	
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CASANARE	
UBICACIÓN	VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 16+0000 - 118+0616 VÍA 6512 MONTERREY – YOPAL PR 103+0287 – 105+0448	
PLAZO INICIAL	2 meses	
FECHA DE INICIO	01 de agosto de 2024	
FECHA FINAL	30 de septiembre de 2024	
VALOR INICIAL	$ 83,996,642.00	

VIGENCIA	*REGISTRO*	*PROGRAMA*	*RECURSO*	*VALOR*	*SALDO REGISTRO*
2024	636024 (18-jul-2024)	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02 VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	83,996,642.00	83,996,642.00

VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	**$0.0**
PORCENTAJE EJECUTADO	**0%**

3.2.4 CONTRATO 2277 DE 2024

CONTRATISTA	**INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S.**	**NIT: 901.677.709-7**
OBJETO	"HABILITAR Y/O BRINDARR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE."	
CONTRATO	**2277 DE 2024**	
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CASANARE	
UBICACIÓN	TRAMO 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL TRAMO 6512 MONTERREY – YOPAL TRAMO 6513 YOPAL – PAZ DE ARIPORO TRAMO 6514 PAZ DE ARIPORO – LA CABUYA	SECTOR PR 16+0000 – PR 118+0616 SECTOR PR 103+0287 – PR 105+0448 SECTOR PR 0+0000 – PR 90+0368 SECTOR PR 0+0000 – PR 72+0368

CONTRATISTA	INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S.	NIT: 901.677.709-7
PLAZO INICIAL	2 meses	
FECHA DE INICIO	01 de agosto de 2024	
FECHA FINAL	31 de diciembre de 2024	
VALOR INICIAL	$ 161.912.124,00	

VIGENCIA	*REGISTRO*	*PROGRAMA*	*RECURSO*	*VALOR*	*SALDO REGISTRO*
2024	650724 (22-jul-2024)	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 VÍA PRIMARIA MANTENIDA	11	161.912.24,00	161.912.24,00

VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	**$0.00**
PORCENTAJE EJECUTADO	**0%**

3.2.5 CONTRATO 2335 DE 2024

CONTRATISTA	CAROLINA REYES PEÑA	NIT: 844000065-0
OBJETO	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA RUTAS NACIONALES 6405, 6512 MONTERREY-YOPAL (PASO URBANO YOPAL)"; 6513 YOPAL-PAZ DE ARIPORO Y 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE A CORGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.	
CONTRATO	**2335 DE 2024**	
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CASANARE	
UBICACIÓN	VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL VÍA 6512 MONTERREY – YOPAL VÍA 6513	PR 16+0000 - 118+0616 PR 103+0287 – 105+0448 (Paso urbano por Yopal)
PLAZO INICIAL	2 meses	
FECHA DE INICIO	01 de agosto de 2024	
FECHA FINAL	30 de septiembre de 2024	
VALOR INICIAL	$ 83,996,642.00	

VIGENCIA	*REGISTRO*	*PROGRAMA*	*RECURSO*	*VALOR*	*SALDO REGISTRO*
2024	636024 (18-jul-2024)	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02 VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	83,996,642.00	83,996,642.00

VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	**$00.00**
PORCENTAJE EJECUTADO	**0%**

3.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

Para el periodo comprendido entre el 24 al 30 de 2024 se realizaron las siguientes actividades:

- Vigilancia de la vía.
- Rocería y desmonte manual.
- Limpieza de obras de arte (encoles, descoles, disipadores, zanjas, canales.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de calzada.
- Limpieza de puentes y pontones (drenes, calzada, acceso, estribos, pilas)
- Limpieza de muros
- Retiro de piedras, material, ramas y árboles.

3.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS. N.A

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMES SEMANALES.

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 para cada una de las Cooperativas de Trabajo Asociado, ejecutoras de los contratos de mantenimiento rutinario. Entregado como parte del acta de recibo parcial No 3

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

Se efectúa el control diario del equipo mínimo exigida a las diferentes Cooperativas de Trabajo Asociado y se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 para cada una de ellas. Entregado como parte del acta de recibo parcial No 3

4.3 PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se efectúa el control de asistencia del personal integrante de las diferentes Cooperativas de Trabajo Asociado y se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 para cada una de ellas. Entregado como parte del acta de recibo parcial No 3

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 para cada una de las cooperativas de trabajo asociado. Entregado como parte del acta de recibo parcial No 3

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Entregado como parte del acta de recibo parcial No 3

4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SSEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se realiza mediante la revisión de las pólizas tomadas por las tres cooperativas de trabajo asociado y se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 para cada una de ellas. Entregado como parte del acta de recibo parcial No 3

4.8 PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

No aplica

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

No aplica para este periodo.

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se presenta el formato MEPI-MN-IN-6-FR-2 para cada una de las cooperativas de trabajo asociado. Entregado como parte del acta de recibo parcial No 3

4.9.2 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

No aplica este ítem debido a que los contratos de mantenimiento rutinario no son de obra sino de servicios.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No:	1942 de 2024
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4
Contratista:	CONSORCIO ANTEA-GPM
Representante Legal (Apoderado)	HENRY GIOVANNY ERAZO RODRÍGUEZ
Valor Contrato inicial:	$3.985.036.419,00
Plazo inicial del Contrato:	29 MESES
Fecha de Inicio:	24 DE JUNIO DE 2024
Fecha de Terminación inicial:	31 DE JULIO DE 2024
Supervisor del Contrato:	ING. MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

NOTA: El porcentaje ejecutado es calculado con respecto al valor acumulado del contrato.

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	*REGISTRO*	*PROGRAMA*	*RECURSO*	*VALOR*	*SALDO REGISTRO*
2024	550524 (16-may-2024)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	1.383.849.572,00	1.191.841.748,72
2025	550524 (16-may-2024)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	1.565.412.513,00	1.565.412.513,00
2026	550524 (16-may-2024)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	1.035.774.334,00	1.035.774.334,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:					**$ 192.007.823,28**
PORCENTAJE EJECUTADO					**4.82%**

5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL

Dentro del periodo se desarrollaron trabajos siguiendo la programación exigida así:

1. PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LAS VÍAS

a. Se realizan 2 reportes diarios del estado de las vías a cargo de la AMV entre 6 y 7 am y entre 5 y 6 pm que se envían a la Dirección Territorial Casanare vía WhatsApp y cualquier situación que día a día suceda, los reportes de emergencias se realizan con las fichas Promage y registro en la plataforma Hermes, cuando está en funcionamiento.
b. Se mantiene la señalización en el Pr 116+415, sitio donde el cabezal de salida de la alcantarilla está colapsado y la estructura del pavimento está erosionándose y ya se ha perdido parte de la calzada esto representa riesgo de accidente para los usuarios de la vía.
c. Se actualizan los reportes del estado de vía como: Seguimiento a los puntos de control los Grillos – Puente Nuevo, la condición del tramo PR 114+0400 AL PR 115+0800, la del tramo PR 117+0300 al PR 117+0500, PR 83+0200, 83+0600, sector La Orquídea y deformaciones por movimientos en sectores que ya se habían intervenido y que presentan fallas como el sector PR 79+0100; Huerta vieja PR 79+0900, PR 85+0000 al PR 85+0350, se reporta los avances y situaciones en el sector PR 87+0000 La Granja, PR 83+0600 Tobogán.
d. CAV-1942-046-202.Informe afectación de canal en el PR 82+0190 Tramo 6211
e. CAV-1942-059-2024. Informe de afectación de la calzada en el PR 99+0790 Tramo 6211

2. ALERTAR OPORTUNAMENTE AL INVÍAS SOBRE LA NECESIDAD DE DISEÑAR Y CONSTRUIR OBRAS ESPECIALES PARA LA MITIGACIÓN DE LA INESTABILIDAD EN SITIOS CRÍTICOS

Se realizaron las siguientes gestiones:

CAV-1942-049-2024. Informe afectación calzada en el PR 65+0950 al PR 66+000 del tramo 6211 Crucero-Aguazul.
CAV-1942-050-2024. Informe afectación calzada en el PR 90+0800 costado derecho del tramo 6211 Crucero-Aguazul.
CAV-1942-054-2024. Informe afectación obras hidráulicas menores y calzada de la vía por material de derrumbes tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
CAV-1942-057-2024. Informe de inspección visual: deslizamiento en el PR 115+0800 costado izquierdo, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
CAV-1942-058-2024. Informe inspección visual afectación cabezal de salida alcantarilla y pérdida de banca en el PR 116+0415 costado derecho, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.

3. INFORMAR OPORTUNAMENTE AL INVIAS SOBRE LA NECESIDAD DE DISEÑAR OBRAS Y ADELANTAR ACCIONES EN RELACIÓN CON EL ENTORNO DE LA VÍA, ENCAMINADAS A SU ORNATO, A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA CONTAMINACIÓN VISUAL.

Se realizaron las siguientes gestiones:

CAV-1942-049-2024. Informe inspección visual solicitud reductores sector “El Parador”, radicado INVIAS 2024S-VCAS-051493.

4. PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS CARRETERAS QUE SE LE ASIGNEN Y EJERCER SU SUPERVISIÓN Y CONTROL.

a. Se presentaron informes de las actividades semanales ejecutadas de los dos contratos de mantenimiento rutinario, los viernes se registró la programación de actividades para ejecutar durante la siguiente semana. Se revisa los trabajos realizados por las cooperativas de acuerdo con lo programación

b. Con las cooperativas se verifica y se mantiene la señalización en los sitios críticos que se encuentran en sus jurisdicciones. Charlas de refuerzo y revisión sobre la importancia de la señalización de los lugares de trabajo.

c. Reconfirmación a las cooperativas respecto a los tiempos de permanencia en la vía. La calidad de las actividades y estar alerta a cualquier novedad que se les presente en sus tramos. Disponibilidad 24/7

d. Visitas de seguimiento chequeo de actividades y señalización lugares de trabajo.

e. Se tramita y avala el acta mensual de pago No 2 para las cooperativas de trabajo asociado La Libertad y Puerta del Llano.
CAV-1942-038-2024. Entrega Acta No. 02 – mes julio de 2024 - Contrato No. 1684 de 2024.
CAV-1942-038-2024. Entrega Acta No. 02 – mes julio de 2024 - Contrato No. 1666 de 2024.
CAV-1942-043-2024. Solicitud cumplimiento directriz M. C. 2024I-VBOG-04334, uso uniforme institucional, personal de mantenimiento rutinario. C.T.A. La Libertad
CAV-1942-044-2024. Solicitud cumplimiento directriz M. C. 2024I-VBOG-04334, uso uniforme institucional, personal de mantenimiento rutinario. C.T.A. Puerta del Llano

5. ACTUALIZAR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO VIAL (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU) Y SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CARRETERAS QUE UTILIZA INVÍAS
No aplica para este periodo

6. MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE REFERENCIACIÓN VIAL, CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE LE SUMINISTRE INVÍAS Y REPONER LOS POSTES DE REFERENCIA QUE HAGAN FALTA EN LA VÍA A SU CARGO Y REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE AUSCULTACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATOS Y QUE TIENE PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, SEGÚN RELACIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMACIÓN QUE LES SERÁ ENTREGADA POR INVIAS. PINTURA E INDICADORES.
CAV-1942-043-2024. Solicitud cumplimiento directriz M. C. 2024I-VBOG-04334, uso uniforme institucional, personal de mantenimiento rutinario. C.T.A. La Libertad

7. INSPECCIONAR LOS PUENTES DE MANERA RUTINARIA, DIRIGIR Y VERIFICAR SU MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO.
Se realizaron las siguientes gestiones:
CAV-1942-045-2024: Informe incremento afectaciones puente Chorro Blanco, PR 81+0450 tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
CAV-1942-052-2024: Informe incremento afectaciones topes sísmicos, puente Chorro Blanco, PR 81+0450 tramo 6211 El Crucero – Aguazul.

8. CAPACITAR CADA MES A LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A SU CARGO, EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS, DE PUENTES, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ECONOMÍA SOLIDARIA.
CAV-1942-056-2024. Se informa a la territorial el tema de la capacitación correspondiente al mes de agosto de 2024.
Se imparte capacitación a los empresarios de mantenimiento rutinario acerca de: “Trabajo en equipo”. el tema aplica dentro de los sugeridos por el Instituto Nacional de Vías en el numeral 3 “ENRIQUECIMIENTO PERSONAL

9. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, EVALUACIONES Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA QUE INVÍAS PROGRAME PARA

LOS INGENIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, EN DIFERENTES SITIOS DEL PAÍS.
No aplica para este periodo, aún el INVIAS no ha convocado a reuniones de coordinación ni de transferencia de tecnología.

10. EVALUAR CON CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL) EL ESTADO DE LA RED VIAL
No aplica para este periodo

11. APOYAR LA GESTION DE LA TERRITORIAL EN LOS CONTRATOS QUE EJECUTE EL INVÍAS EN SECTORES DE CARRETERAS A SU CARGO.
Se realizan actividades en apoyo al supervisor del contrato 1858 de 2020 ruta 6211

Se participa en la reunión virtual previa al inicio del contrato 2358-2024, con objeto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS CON CÓDIGO 6512, 6211, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL CASANARE".

12. ESTABLECER LAS NECESIDADES DE LAS VÍAS Y PUENTES EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, LLEVAR UN INVENTARIO DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN.
CAV-1942-052-2024: Informe incremento afectaciones topes sísmicos, puente Chorro Blanco, PR 81+0450 tramo 6211 El Crucero – Aguazul.

13. RECOLECCIÓN, DIGITACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACCIDENTALIDAD OCURRIDA EN LOS TRAMOS DE CARRETERAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PRESENTACIÓN DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL.
CAV-1942-042-2024. Solicitud información accidentalidad mes julio 2024 ruta 6211 sector departamento de Boyacá. Aún no ha sido respondido.
CAV-1942-063-2024 Se entrega informe de accidentalidad del mes de julio de 2024

Se lleva registro de los accidentes ocurridos durante el presente periodo, se reporta a la territorial tan pronto se tiene conocimiento de la ocurrencia de.

14. PROPORCIONAR DATOS PARA EL CÁLCULO DEL PATRIMONIO DE LAS VÍAS OBJETO DEL CONTRATO.
No aplica para este periodo

15. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN REFERENTE AL BUEN USO Y DEFENSA DE LAS VÍAS Y GESTIONAR ACCIONES QUE BRINDEN SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS EN COORDINACIÓN CON LAS TERRITORIALES Y LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES.

Participación en reunión presencial en la territorial Casanare con el objetivo de profundizar las observaciones realizadas a la solicitud de uso de vía para el proyecto “INSTALACIÓN RED DE GAS NATURAL CENTRO POBLADO CURISÍ CORINTO”. Participaron: ingeniera Bibiana Reina, profesional de apoyo a la supervisión; Xiomara Suárez, representante de la Alcaldía de Pajarito; Eleazar Durán, en representación de la empresa contratada por la Alcaldía.
CAV-1942-041-2024. Se solicita a la Alcaldía de Aguazul dar aplicación a lo establecido en la Ley 1228 de 2008 por la afectación a la zona de reserva de vía, Tramo 6211 El Crucero - Aguazul, por relleno efectuado en un predio ubicado en el PR 113+0580 costado derecho.
CAV-1942-060-2024. Remisión documentos respuesta alcaldía municipio de Aguazul al informe con consecutivo CAV 1942-041-2024.
CAV-1942-061-2024. Informe de inspección visual en el PR 88+0043 costado derecho, Sitio denominado La Quesería, Tramo 6211 El Crucero – Aguazul, para dar respuesta a la solicitud de la Territorial radicada con consecutivo Invias 2024EVUVR-072949.

CAV-1942-062-2024 Respuesta dada por la inspección de policía de Aguazul Casanare al informe sobre Uso Zona de Vía con consecutivo interno CAV 1942-041-2024 de fecha agosto 2 de 2024 asunto " Afectación Zona de reserva de Vía, Tramo 6211 El Crucero - Aguazul, por relleno de un predio ubicado en el PR 113+0580 costado derecho"

16. **SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTEOS MANUALES DE TRÁNSITO, REVISAR LA INFORMACIÓN DE CAMPO QUE SE ENVIARÁ A PLANTA CENTRAL PARA SU PROCESAMIENTO Y VERIFICAR LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CARGA.**
No aplica para el presente periodo

17. **LLEVAR A EFECTO LA TOMA DE INFORMACIÓN Y/O AJUSTES DE LA VÍA A SU CARGO CON UN EQUIPO DE GPS.**
No aplica para este periodo

18. **REALIZAR ESTIMATIVOS SOBRE LA VIDA RESIDUAL DE LOS PAVIMENTOS DE LOS SECTORES A SU CARGO.**
No aplica para este periodo

19. **EVALUAR CON CRITERIO TÉCNICO EL ESTADO DE LA RED VIAL SEMESTRALMENTE CON LA METODOLOGÍA SUMINISTRADA POR EL INVIAS.**
No aplica para este periodo

20. **REALIZAR ENCUESTAS DE ORIGEN Y DESTINO, FLUJO DE CARGA, PASAJEROS, Y TIPO DE CARGA. N/A**
No aplica para este periodo

21. **REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUE LE SEAN ASIGNADAS, SIGUIENDO LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN.**
No aplica para este periodo

22. **COLABORAR EN LA TOMA DE LA GEORREFERENCIACIÓN DESARROLLADA POR EL INVIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DIGITAL DE LA RED VIAL Y MANTENER AL DÍA LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO VIAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DEL INVIAS.**
Aún no se recibe instrucción para desarrollar esta actividad

23. **EFECTUAR ESTUDIOS TENDIENTES A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INESTABILIDAD EN LAS VÍAS A SU CARGO, CUANDO SE LO REQUIERA EL INVIAS Y SU COSTO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE SU PROPUESTA.**
No aplica para este periodo

24. **PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA ETAPA DE TRANSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL - HERMES, REALIZANDO DE MANERA PERMANENTE EL CARGUE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO VIAL, EVENTOS DE EMERGENCIAS, ACCIDENTALIDAD Y ESTADO DE LA SUPERFICIE (CRITERIO TÉCNICO), DISPUESTA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL - HERMES, CON USUARIO Y CONTRASEÑA ASIGNADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA.**
No aplica para este periodo, aún no se cuenta con la clave para actualizar información levantada en campo en los aplicativos desarrollados por el INVIAS.

25. **FAUNA SILVESTRE ATROPELLADA.**

No se presentó fauna silvestre atropellada

26. EMBELLECIMIENTO Y ORNATO

CAV-1942-055-2024. Se presenta informe de cumplimiento de políticas de embellecimiento y ornato correspondiente a julio de 2024

5.3.1.1.1 PRESTAR APOYO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTE EL INVIAS

No aplica para este periodo

27. APOYAR LA VALIDACIÓN DE ALERTAS EMITIDAS POR LOS DISPOSITIVOS ITS.

No aplica para este periodo

28. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTEOS MANUALES Y/O AUTOMATIZADOS (DISPOSITIVOS ITS)

No aplica para este periodo

29. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS

No aplica para este periodo

30. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS PARA EMERGENCIAS

No aplica para este periodo

31. EFECTUAR LOS TAPAHUECOS CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

No aplica para este periodo

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Se presentó PAC para el mes de agosto, empresas de mantenimiento rutinario y AMV y se envió al correo institucional del supervisor de la territorial.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

1. **ORDEN PÚBLICO:**
   No se presentaron eventos de orden público
2. **EXPEDICION DE NORMAS**
   Manual de interventoría, adoptados mediante resolución 329 del 26 de enero de 2022.
3. **TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**
   No se presentan causales previstas en la ley para la terminación anticipada del contrato.
4. **CLIMÁTICOS**
   Durante el periodo informado se presentaron episodios de lluvia sectorizados que no trajeron afectaciones mayores para el desarrollo de actividades.
5. **DISPOSICIÓN DE PERSONAL**
   El personal que labora para la administración de mantenimiento vial está debidamente aprobado por el Instituto Nacional de Vías para ejercer dichas labores.
6. **DEFICIENTE SEÑALIZACIÓN VIAL**
   En los recorridos de inspección realizados al tramo 6211 se observa que la gran mayoría de la señalización vertical está en regular y mal estado, y que en algunos sectores no hay suficiente.
7. **INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN**

Se ha realizado de manera oportuna el envío de la información requerida contractualmente de acuerdo con lo que ha ido solicitando la territorial.

8. **SALARIOS, PARAFISCALES, HONORARIOS**
   El contratista realiza de manera oportuna el pago de los salarios, seguridad social y aportes parafiscales a cada una de las personas que laboran en la administración vial.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

6.1 EQUIPO CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Entregado junto con el acta de costos No3

6.2 PERSONAL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL.

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. Entregado junto con el acta de costos No3

CARGO	NOMBRE
INGENIERO RESIDENTE	LUIS FRANCISCO ROA GÓMEZ
INGENIERO AUXILIAR 1	HUGO ORLANDO GONZÀLEZ CARRILLO
INGENIERO AUXILIAR 2	JULIETH NAIARA MARTÍNEZ PÉREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LAURA ALEJANDRA SUÁREZ MORENO
SISO	SANDY LORENA ROMERO AGUDELO
CONDUCTOR 1	SEGUNDO CERAFÌN CASTRO SÁNCHEZ
CONDUCTOR 2	SEBASTIÁN DAVID PATIÑO PÉREZ

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

Este seguimiento se realiza con el formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Entregado junto con el acta de costos No 3

6.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

Este seguimiento se realiza con el formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-13. Entregado junto con el acta de costos No 3

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

No aplica

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento al Plan de Cargas. MEPI-MN-IN-9-FR-3. Entregado junto con el acta de costos No 3

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sectores inestables:

1. Se presentan informes semanales y particulares referentes al estado de puntos críticos y en riesgo. La ruta de Cusiana presenta varios sectores de inestabilidad y riesgo, se ha hecho énfasis en la condición de riesgo para los usuarios de esta vía y de la necesidad de evaluación para la carga máxima que debe circular y los controles que se deben mantener en la vía.

2. Destinar recursos para estudio y diseños de sectores inestables de esta vía que a la fecha no cuentan.

3. La vía necesita recursos suficientes en este corredor para prevención y mantenimiento. Se ha informado desde las primeras manifestaciones de situaciones en sectores inestables, en los cuales, si se hubiese evaluado y atendido desde el primer momento, representarían menores inversiones o la perdida de estructura, así se mantendría un corredor funcional, más seguro y con menores contratiempos para los usuarios de la vía y a los pobladores de la región y por tanto no tener que llegar al estado de emergencia para que obligatoriamente se destine el recurso.

Estado de Puentes

1. La vía presenta 3 puentes colapsados Molinera, La Orquídea, Grillos y afectación estructural en Quebrada Negra, estas son 4 estructuras con las que ya no cuenta la vía y para las cuales a la fecha han sido sustituidos por puentes metálicos, en el caso de la Molinera y la combinación entre paso por variante y puentes metálicos que se adelantó para la transitabilidad en el sector Los Grillos.
2. Es conocido por el Invias la condición de la zona critica entre Curisí y Pajarito, dentro de la cual se encuentran estos puentes ya fallados y otros como Leonera el cual presenta una condición de riesgo dado el movimiento que presenta el terreno en ambos extremos lo cual puede llevar a la afectación de la estructura, Puente Nuevo , Chorroblanco (zona de inestabilidad susceptible a movimientos que pueden llevar a situación similar a los Grillos), Chigüirera, Orquídea 2 (movimiento del terreno por el acceso sur), La Granja (procesos de arrastre de material a causa de la Quebrada), sin dejar de considerar las demás estructuras fuera de este tramo en mención, ya que corresponden a estructuras afectadas por problemas de socavación como Curisí, Palmicha, Guáymara, Chichaca, Lajas en otros, son estructuras antiguas de cimentación superficial, en el caso de la Chichaca (año 1958 capacidad 30 tn) se requiere un puente nuevo o al menos su mantenimiento y repotenciación ya que es una estructura mixta que presenta condición crítica, todos los puentes de esta vía que cuentan con juntas las tienen en regular estado y en otros ya no existe.
   Es fundamental la atención para estas estructuras dentro de los contratos que se adelanten por parte de la SRN en esta vía, los viaductos y puentes están en zonas inestables que requieren monitoreo permanente, y obras complementarias a tiempo para su protección.
3. Actualmente se cuenta con cierre total de la vía según las siguientes resoluciones:

-02540 de 26-jun-2024. Se decreta cierre total entre el PR 81+0000 al PR 82+0000.

-27047 del 3 de julio de 2024. Se declara una emergencia vial en la infraestructura de transporte a cargo del INVIAS, se decreta el cierre definitivo en la vía Transversal del Cusiana en el sector comprendido entre el PR 77+0000 (Curisí) y el PR 90+0000 (Pajarito).

4. La condición estructural y del entorno del puente Chorroblanco es crítica, actualmente la estructura presenta importantes efectos debido a la acción del desplazamiento en masa del terreno, se observan

fisuras en la viga cajón y en el tablero, además de la posible falla de los torones de tensionamiento, actualmente existe restricción del tránsito en este punto (mediante las dos resoluciones antes mencionadas) para la circulación de todo tipo de vehículo, peatones y semovientes y se está trabajando interdisciplinariamente en la búsqueda de una solución alterna para restablecer la movilidad.

5. Se recomienda suspender los topes sísmicos del puente Chorro Blanco para independizarlo de la estructura de Puente Nuevo. El movimiento del terreno donde se encuentra el apoyo común a los dos puentes está ocasionando u n movimiento del estribo común hacia el rio Cusiana y hacia la quebrada Los Grillos, el cual hace que por los topes sísmicos se transmitan esfuerzos de tensión y rotación a la viga 1 del puente Chorro Blanco para los cuales no está diseñada la estructura. Estos esfuerzos adicionales pueden ocasionar la falla de las vigas 1 y 2 del puente Chorro Blanco.
6. Es prioritario evaluar:

   - La condición del sector La Leonera PR 80+0000 al PR 81+0000 dentro del cual está el viaducto
   - El tramo PR 82+0500 al PR 83+0300, hundimientos en calzada y deslizamientos
   - El estado **crítico** del tramo PR 84+0900 AL PR 85+0350 el cual cada vez abarca más trayecto, presenta hundimiento continuo y permanentemente se mantiene transitabilidad mediante la adición de material de relleno, también se observan muchas grietas en el pavimento y escarpes en el talud izquierdo.
   - Los tramos 86+0400 al PR 87+0000 y PR88+0000 al PR 88+0250, por la acción erosiva del rio Cusiana en el talud inferior costado izquierdo de la vía
   - PR 103+0200 al PR 103+0300, hundimiento y socavación de la banca con afectación en las obras de drenaje
   - PR 114+0400 al PR 114+0800, movimiento en masa, la calzada presenta hundimiento y deformación grave y afectación en las obras de drenaje.
   - PR 115 al PR 115+0900, taludes con continuos deslizamientos de material y rocas.

7. Protección del uso del suelo en las zonas aferentes a la vía ruta 6211 y zonas aledañas a quebradas y ríos.

   A lo largo de la vía ruta 6211 se observa deforestación para sobrepastoreo, y siembra de cultivos de pancoger, lo cual representa una grave afectación para el medio ambiente y para la estabilidad de la vía nacional pues estas situaciones afectan la infraestructura vial.

   La protección y exigencias que deben ejercer las autoridades ambientales, y la acción efectiva por parte de las autoridades municipales y la Unidad Nacional de Gestión de riesgo y desastres referente a la protección de zonas altamente vulnerables en las temporadas invernales es apremiante, es importante que el INVIAS aúne esfuerzos que logren el compromiso y cumplimiento efectivo ante las leyes y normas existentes, ya que las vías ,y por ende las comunidades, resultan demasiado afectadas al no tomar acciones tempranas de prevención.

   Se requiere acción efectiva por parte de las corporaciones ambientales CORPOBOYCÁ y CORPORINOQUIA, así como de las autoridades municipales, para velar por la protección de fuentes hídricas afluentes del Cusiana.

   Es necesario que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Al igual que en otras regiones del país, ejecute las acciones necesarias para mitigar los riesgos asociados a fenómenos naturales que se pueden apreciar a lo largo de las zonas aferentes al río Cusiana y sus tributarios, principalmente las que están en condición de riesgo para los habitantes de centros poblados de Pajarito, Curisí y varias veredas de la zona, también se deben tener en cuenta las afectaciones que ocasiona el río Unete y la quebrada La Chichaca, entre otras, para que se realicen y ejecuten proyectos de control ante crecientes y arremetidas de caudal en temporada de invierno

8. ANEXOS

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA JULIO DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Consecutivo	Dirigido a	Atn	Asunto	Fecha Envío	Radicado	Fecha Rad.
CAV-1942-038-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Entrega Acta No. 02 – mes julio de 2024 - Contrato No. 1684 de 2024.	1-ago-24	2024E-VUVRAZ-071611	2-ago-24
CAV-1942-039-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Entrega Acta No. 02 – mes julio de 2024 - Contrato No. 1666 de 2024.	1-ago-24	2024E-VUVRAZ-071618	2-ago-24
CAV-1942-040-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Alcance oficio CAV 1942-034-2024. Informe accidentalidad mes junio 2024, Radicado Invias 2024E-VUVRAZ-070973	1-ago-24	2024E-VUVRAZ-071407	1-ago-24
CAV-1942-041-2024	ALCALDIA AGUAZUL	Nelson Camacho Caicedo	Afectación Zona de reserva de Vía, Tramo 6211 El Crucero - Aguazul, por relleno predio ubicado en el PR 113+0580 costado derecho.	2-ago-24	N/A	N/A
CAV-1942-042-2024	DEBOY	Salcedo Torres Henry Mario	Solicitud información accidentalidad mes julio 2024 ruta 6211 sector departamento de Boyacá.	2-ago-24	2024E-VUVRAZ-072357	5-ago-24
CAV-1942-043-2024	R. L. C. T. A. LA LIBERTAD.	Mauricio Beltrán Fonseca	Solicitud cumplimiento directriz M. C. 2024I-VBOG-04334, uso uniforme institucional, personal de mantenimiento rutinario.	5-ago-24	N/A	N/A
CAV-1942-044-2024	R. L. C. T. A. PUERTA DEL LLANO	Henry Calixto Chaparro	Solicitud cumplimiento directriz M. C. 2024I-VBOG-04334, uso uniforme institucional, personal de mantenimiento rutinario.	5-ago-24	N/A	N/A
CAV-1942-045-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe incremento afectaciones puente Chorro Blanco, PR 81+0450 tramo 6211 El Crucero – Aguazul.	5-ago-24	2024E-VUVR-072263	5-ago-24
CAV-1942-046-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe afectación de canal en el PR 82+0190 Tramo 6211	5-ago-24	2024E-VUVRAZ-072468	5-ago-24
CAV-1942-047-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Presentación Acta de Costos No 02	5-ago-24	2024E-VUVRAZ-072808	6-ago-24
CAV-1942-048-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe inspección visual solicitud reductores sector "El Parador", radicado INVIAS 2024S-VCAS-051493	5-ago-24	2024E-VUVRAZ-072838	6-ago-24
CAV-1942-049-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe afectación calzada en el PR 65+0950 al PR 66+000 del tramo 6211 Crucero-Aguazul.	6-ago-24	2024E-VUVRAZ-073449	8-ago-24
CAV-1942-050-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe afectación calzada en el PR 90+0800 costado derecho del tramo 6211 Crucero-Aguazul.	6-ago-24	2024E-VUVRAZ-073455	8-ago-24
CAV-1942-051-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Entrega informe mensual de actividades # 2 de la administración vial grupo 1, periodo 01 al 31 de julio de 2024.	8-ago-24	2024E-VUVRAZ-074133	9-ago-24
CAV-1942-052-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe incremento afectaciones topes sísmicos, puente Chorro Blanco, PR 81+0450 tramo 6211 El Crucero – Aguazul.	9-ago-24	2024E-VUVRAZ-074679	9-ago-24
CAV-1942-053-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe afectación señal SP-03 PR 117+0200 costado derecho, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.	9-ago-24	2024E-VUVRAZ-074717	12-ago-24
CAV-1942-054-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe afectación obras hidráulicas menores y calzada de la vía por material de derrumbes tramo 6211 El Crucero – Aguazul.	9-ago-24	2024E-VUVRAZ-074829	12-ago-24
CAV-1942-055-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe ornato N°1 mes julio del 2024.	12-ago-24	2024E-VUVRAZ-075111	12-ago-24
CAV-1942-056-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Tema Capacitación a microempresarios mes de agosto de 2024.	14-ago-24	2024E-VUVRAZ-076399	14-ago-24
CAV-1942-057-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe inspección visual deslizamiento en el PR 115+0800 costado izquierdo, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.	14-ago-24	2024E-VUVRAZ-076575	14/08/2024
CAV-1942-058-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe inspección visual afectación cabezal de salida alcantarilla y pérdida de banca en el PR 116+0415 costado derecho, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.	14-ago-24	2024E-VUVRAZ-076555	14/08/2024
CAV-1942-059-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe afectación calzada en el PR 99+0790 costado izquierdo del tramo 6211 Crucero-Aguazul.	15-ago-24	2024E-VUVRAZ-077236	16-ago-24
CAV-1942-060-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Remisión documentos respuesta alcaldía municipio de Aguazul al informe con consecutivo CAV 1942-041-2024 .	23-ago-24	2024E-VUVRAZ-080299	26-ago-24

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Consecutivo	Dirigido a	Atn	Asunto	Fecha Envío	Radicado	Fecha Rad.
CAV-1942-061-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe inspección visual PR 88+0043 costado derecho, Sitio La Quesería, Tramo 6211 El Crucero – Aguazul, para dar respuesta a la correspondencia radicada con consecutivo Invias 2024EVUVR-072949.	27-ago-24	2024E-VUVRAZ-081247	27-ago-24
CAV-1942-062-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Remisión documento respuesta de la inspección de policía de Aguazul.	29-ago-24	2024E-VUVRAZ-082051	29-ago-24
CAV-1942-063-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe de accidentalidad mes julio de 2024	29-ago-24	2024E-VUVRAZ-082252	29-ago-24
CAV-1942-064-2024	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez	Informe capacitación a microempresarios tramo 6211 El Crucero -Aguazul, mes de agosto de 2024.	30-ago-24	2024E-VUVRAZ-082787	30-ago-24

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha	Procedencia	Dirigido a	Asunto	Consecutivo de procedencia	Fecha Rad.	Oficio de Respuesta	Fecha
1-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando 2024S-VCAS-051191 Orden de Inicio Contrato No. 2277 de 2024	2024S-VCAS-051191	29/07/2024		
1-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando 2024S-VCAS-051275 Orden de Inicio Contrato No. 2358 de 2024	2024S-VCAS-051275	29/07/2024		
2-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando 2024I-VBOG-052637 Solicitud de diligenciamiento "Seguimiento semanal a sitios criticos"	2024I-VBOG-052637	31/07/2024		
2-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando 2024I-VBOG-051491 Reporte semanal No.2 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.	2024I-VBOG-051491	26/07/2024		
6-ago-24	DEBOY	Grupo AMV 1 Lote 4	información accidentalidad mes julio de 2024.	GS-2024-143387-DEBOY	6/08/2024		
6-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando 2024I-VBOG-009058 Solicitud reporte de emergencias y sitios críticos	2024I-VBOG-009058	23/02/2024		
8-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando 2024I-VBOG-052999 Solicitud implementación de acciones para preparación y alistamiento fenómeno de La Niña 2024-2025	2024I-VBOG-052999	1/08/2024		
8-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando Ccircular 2024I-VBOG-054087 Presentación: Caja de Herramientas Pedagógicas de Participación y Divulgación-INVIAS	2024I-VBOG-054087	5/08/2024		
12-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024I-VBOG-055613 Reporte semanal No.4 de puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y pormovimientos en masa	2024I-VBOG-055613	9/08/2024		
13-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	memorando circular2024I-VBOG-056060 Publicación APU regionalizados periodo 2024_1	2024I-VBOG-056060	12/08/2024		
14-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024I-VBOG-056298 Comunicación Resolución No. 3356 de 31-07-2024 y Resolución No.365 de 31-07-2024 - Permiso de Transporte Terrestre de Carga Indivisible extradimensionada y Extrapesada	2024I-VBOG-056298	13/08/2024		
14-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024I-VBOG-056484 memo amv y rut información referente a los contratos de administración vial	2024I-VBOG-056484	13/08/2024		
15-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024I-VBOG-055632 Solicitud información cierres preventivos 05 de agosto de 2024	2024I-VBOG-055632	10/08/2024		
20-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024I-VBOG-056914 Solicitud de información sobre fuentes de materiales	2024I-VBOG-056914	15/08/2024		
20-ago-24	JAIRO GARZON	Grupo AMV 1 Lote 4	Apus contrato no. 2358 de 2024.	N/A	N/A		
21-ago-24	JAIRO GARZON	Grupo AMV 1 Lote 4	Vehículos y maquinaria contrato no. 2358 de 2024.	N/A	N/A		
21-ago-24	JAIRO GARZON	Grupo AMV 1 Lote 4	Hoja de vida del personal requerido NO. 2358 DE 2024.	N/A	N/A		
22-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024I-VBOG-057925 Reporte semanal No.5 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa	2024I-VBOG-057925	20/08/2024		
23-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024S-VCAS-058566 Respuesta radicado 2024E-VUVR-072263	2024S-VCAS-058566	23/08/2024		

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha	Procedencia	Dirigido a	Asunto	Consecutivo de procedencia	Fecha Rad.	Oficio de Respuesta	Fecha
26-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024S-VCAS-058581 Solicitud de Inspección y Verificación de Afectaciones en la Vía Nacional por Actividades de la Fábrica de Queso TRADIQUESO PR 88 / Sector la Quesería	2024S-VCAS-058581	23/08/2024	CAV-1942-061-2024	27-ago-24
27-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024I-VBOG-058002 Socialización Cronograma de actividades: Estado de la red con criterio tecnico	2024I-VBOG-058002	20/08/2024		
27-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024I-VBOG-059358 Segundo informe Estado de la red vial con criterio técnico 2024 por los AMV	2024I-VBOG-059358	23/08/2024		
28-ago-24	INVIAS	Grupo AMV 1 Lote 4	Memorando circular 2024I-VBOG-059607 Memo-Reporte semanal No.6 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa	2024I-VBOG-059607	23/08/2024		
28-ago-24	Inspección de policia Aguazul	Grupo AMV 1 Lote 4	Comunicacion fecha y hora de visita de la inspeccion de policia Aguazul	120.33.07.1189	N/A		

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE LAS OBRAS

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

8.2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COOPERATIVA LA LIBERTAD



LIMPIEZA DE BERMA PR 16+0850 (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA PR 16+0850 (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA PR 16+0850 (DESPUES)



LIMPIEZA DESCOLE PR 19+0400 (ANTES)



LIMPIEZA DESCOLE PR 19+0400 (DURANTE)



LIMPIEZA DESCOLE PR 19+0400 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



RETIRO DE RAMAS PR 19+0480 (ANTES)



RETIRO DE RAMAS PR 19+0480 (DURANTE)



RETIRO DE RAMAS PR 19+0480 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE CAJA PR 19+0600 (ANTES)



LIMPIEZA DE CAJA PR 19+0600 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CAJA PR 19+0600 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE DESCOLES PR 20+0600 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLES PR 20+0600 (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLES PR 20+0600 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 21+0350 (ANTES)



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 21+0350 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 21+0350 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE MOJONES PR 23+0000 (ANTES)



LIMPIEZA DE MOJONES PR 23+0000 (DURANTE)



LIMPIEZA DE MOJONES PR 23+0000 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE MURO PR 23+0800 (ANTES)



LIMPIEZA DE MURO PR 23+0800 (DURANTE)



LIMPIEZA DE MURO PR 23+0800 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE DISCIPADOR PR 23+0650 (ANTES)



LIMPIEZA DE DISCIPADOR PR 23+0650 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DISCIPADOR PR 23+0650 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



DESPRADIZACIÓN DE BERMA PR 25+0400 (ANTES)



DESPRADIZACIÓN DE BERMA PR 25+0400 (DURANTE)



DESPRADIZACIÓN DE BERMA PR 25+0400 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 27+0450 (ANTES)



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 27+0450 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 27+0450 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



ENDEREZAMIENTO DE SEÑAL PR 28+0700 (ANTES)



ENDEREZAMIENTO DE SEÑAL PR 28+0700 (DURANTE)



ENDEREZAMIENTO DE SEÑAL PR 28+0700 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



ROCERÍA PR 33+0000 (ANTES)



ROCERÍA PR 33+0000 (DURANTE)



ROCERÍA PR 33+0000 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



ROCERÍA PR 38+0000 (ANTES)



ROCERÍA PR 38+0000 (DURANTE)



ROCERÍA PR 38+0000 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DESCOLE PR 35+0550 (ANTES)



LIMPIEZA DESCOLE PR 35+0550 (DURANTE)



LIMPIEZA DESCOLE PR 35+0550 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE MURO PR 38+0030 (ANTES)



LIMPIEZA DE MURO PR 38+0030 (DURANTE)



LIMPIEZA DE MURO PR 38+0030 (DEPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LABORES DE TAPAHUECOS PR 39+0350 (ANTES)



LABORES DE TAPAHUECOS PR 39+0350 (ANTES)



LABORES DE TAPAHUECOS PR 39+0350 (ANTES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA PUENTES PR 42+0400 (ANTES)



LIMPIEZA PUENTES PR 42+0400 (DURANTE)



LIMPIEZA PUENTES PR 42+0400 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE CUNETA EN TIERRA PR 44+0000 (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA EN TIERRA PR 44+0000 (DURANTEE)



LIMPIEZA DE CUNETA EN TIERRA PR 44+0000 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LABORES DE TAPAHUECOS PR 45+0050 (ANTES)



LABORES DE TAPAHUECOS PR 45+0050 (DURANTE)



LABORES DE TAPAHUECOS PR 45+0050 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE CUNETA PR 46+0100 (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA PR 46+0100 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA PR 46+0100 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DISCIPADOR PR 45+0650 (ANTES)



LIMPIEZA DISCIPADOR PR 45+0650 (DURANTE)



LIMPIEZA DISCIPADOR PR 45+0650 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



DESMONTE MANUAL DE SEÑALES PR 50+0300 (ANTES)



DESMONTE MANUAL DE SEÑALES PR 50+0300 (DURANTE)



DESMONTE MANUAL DE SEÑALES PR 50+0300 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES PR 51+0900 (ANTES)



DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES PR 51+0900 (DURANTE)



DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES PR 51+0900 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

8.2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COOPERATIVA PUERTA DEL LLANO



LIMPIEZA DE CANAL PR 80+0500 (ANTES)



LIMPIEZA DE CANAL PR 80+0500 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CANAL PR 80+0500 (DESPUES)



LIMPIEZA DE DISCIPADOR PR 80+0900 (ANTES)



LIMPIEZA DE DISCIPADOR PR 80+0900 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DISCIPADOR PR 80+0900 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 51+0650 (ANTES)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 51+0650 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



RETIRO DE DERRUMBES PR 91+0550 (ANTES)



RETIRO DE DERRUMBES PR 91+0550 (DURANTE)



RETIRO DE DERRUMBES PR 91+0550 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE CANAL PR 82+0150 (ANTES)



LIMPIEZA DE CANAL PR 82+0150 (DURANTE)



)


LIMPIEZA DE CANAL PR 82+0150 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE DISCIPADOR PR 91+0150 (ANTES)

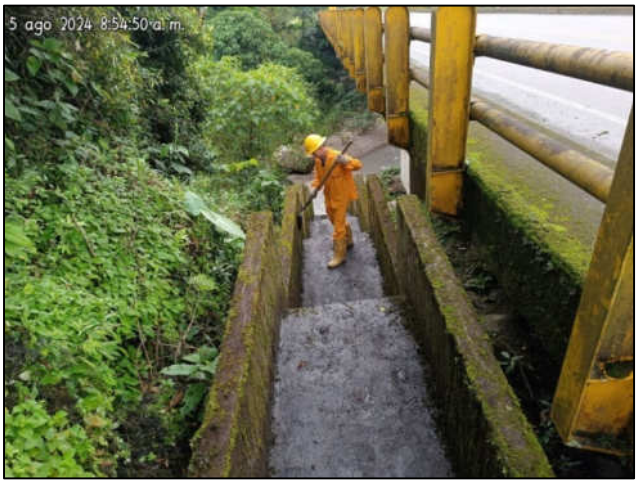

LIMPIEZA DE DISCIPADOR PR 91+0150 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DISCIPADOR PR 91+0150 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE PUENTES PR 91+0150 (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTES PR 91+0150 (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTES PR 91+0150 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE SEÑALES PR 91+0000 (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES PR 91+0000 (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES PR 91+0000 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



TAPAHUECOS CON TIERRA PR 103+0300 (ANTES)



TAPAHUECOS CON TIERRA PR 103+0300 (DURANTE)



TAPAHUECOS CON TIERRA PR 103+0300 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 83+0400 (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 83+0400 (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 83+0400 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 85+0800 (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 85+0800 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 85+0800 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE BERMA PR 86+0230 (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA PR 86+0230 (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA PR 86+0230 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE CUNETA PR 88+0200 (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA PR 88+0200 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA PR 88+0200 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DE PUENTES PR 89+0350 (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTES PR 89+0350 (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTES PR 89+0350 (DESPUES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



ROCERÍA PR 102+0000 (ANTES)



ROCERÍA PR 102+0000 (ANTES)



ROCERÍA PR 102+0000 (ANTES)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



LIMPIEZA DESCOLE PR 71+0450 (ANTES)



LIMPIEZA DESCOLE PR 71+0450 (DURANTE)



LIMPIEZA DESCOLE PR 71+0450 (DESPUÉS)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No aplica para este periodo


Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.


dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

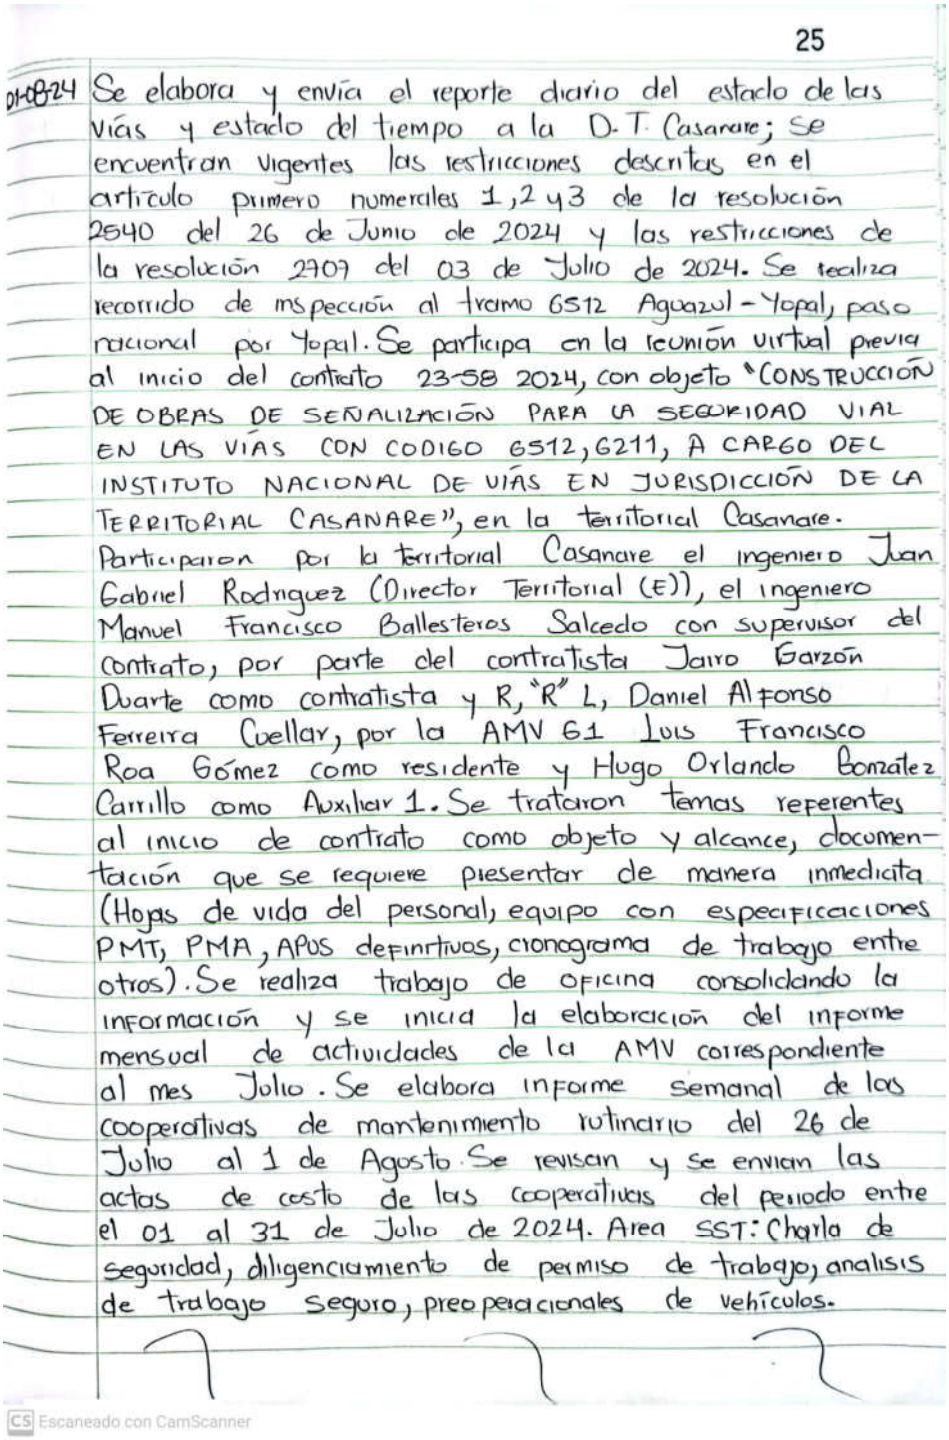

25

01-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T. Casanare; se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul - Yopal, paso nacional por Yopal. Se participa en la reunión virtual previa al inicio del contrato 23-58 2024, con objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS CON CODIGO 6512, 6211, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL CASANARE", en la territorial Casanare. Participaron por la territorial Casanare el ingeniero Juan Gabriel Rodriguez (Director Territorial (E)), el ingeniero Manuel Francisco Ballesteros Salcedo con supervisor del contrato, por parte del contratista Jairo Garzón Duarte como contratista y R, "R" L, Daniel Alfonso Ferreira Cuellar, por la AMV 61 Luis Francisco Roa Gómez como residente y Hugo Orlando Gonzalez Carrillo como Auxiliar 1. Se trataron temas referentes al inicio de contrato como objeto y alcance, documentación que se requiere presentar de manera inmediata (Hojas de vida del personal, equipo con especificaciones PMT, PMA, APOS definitivos, cronograma de trabajo entre otros). Se realiza trabajo de oficina consolidando la información y se inicia la elaboración del informe mensual de actividades de la AMV correspondiente al mes Julio. Se elabora informe semanal de las cooperativas de mantenimiento rutinario del 26 de Julio al 1 de Agosto. Se revisan y se envian las actas de costo de las cooperativas del periodo entre el 01 al 31 de Julio de 2024. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos.

CS Escaneado con CamScanner

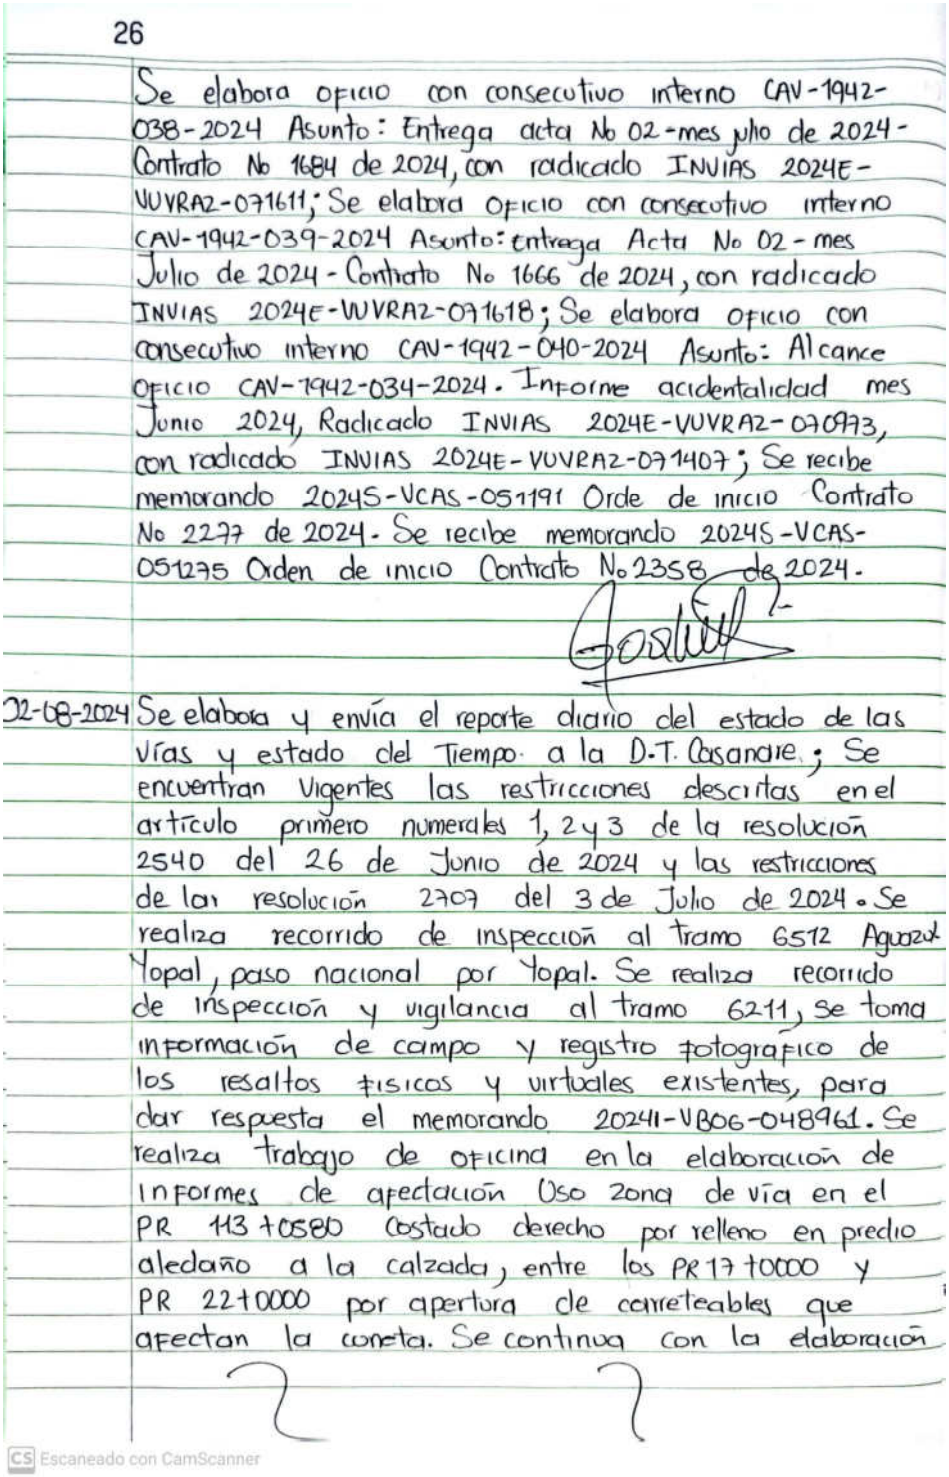


26

Se elabora oficio con consecutivo interno CAV-1942-038-2024 Asunto: Entrega acta No 02-mes julio de 2024-Contrato No 1684 de 2024, con radicado INVIAS 2024E-VUVRA2-071611; Se elabora oficio con consecutivo interno CAV-1942-039-2024 Asunto: entrega Acta No 02-mes Julio de 2024-Contrato No 1666 de 2024, con radicado INVIAS 2024E-VUVRA2-071618; Se elabora oficio con consecutivo interno CAV-1942-040-2024 Asunto: Alcance oficio CAV-1942-034-2024. Informe accidentalidad mes Junio 2024, Radicado INVIAS 2024E-VUVRA2-070973, con radicado INVIAS 2024E-VUVRA2-071407; Se recibe memorando 2024S-VCAS-051191 Orde de inicio Contrato No 2277 de 2024. Se recibe memorando 2024S-VCAS-051275 Orden de inicio Contrato No 2358 de 2024.

22-08-2024 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del Tiempo a la D.T. Casanare.; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 3 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul Yopal, paso nacional por Yopal. Se realiza recorrido de inspección y vigilancia al tramo 6211, se toma información de campo y registro fotografico de los resaltos fisicos y virtuales existentes, para dar respuesta el memorando 20241-VBOG-048961. Se realiza trabajo de oficina en la elaboración de informes de afectación Uso zona de vía en el PR 113+0580 costado derecho por relleno en predio aledaño a la calzada, entre los PR 17+0000 y PR 22+0000 por apertura de carreteables que afectan la coneta. Se continua con la elaboración

CS Escaneado con CamScanner

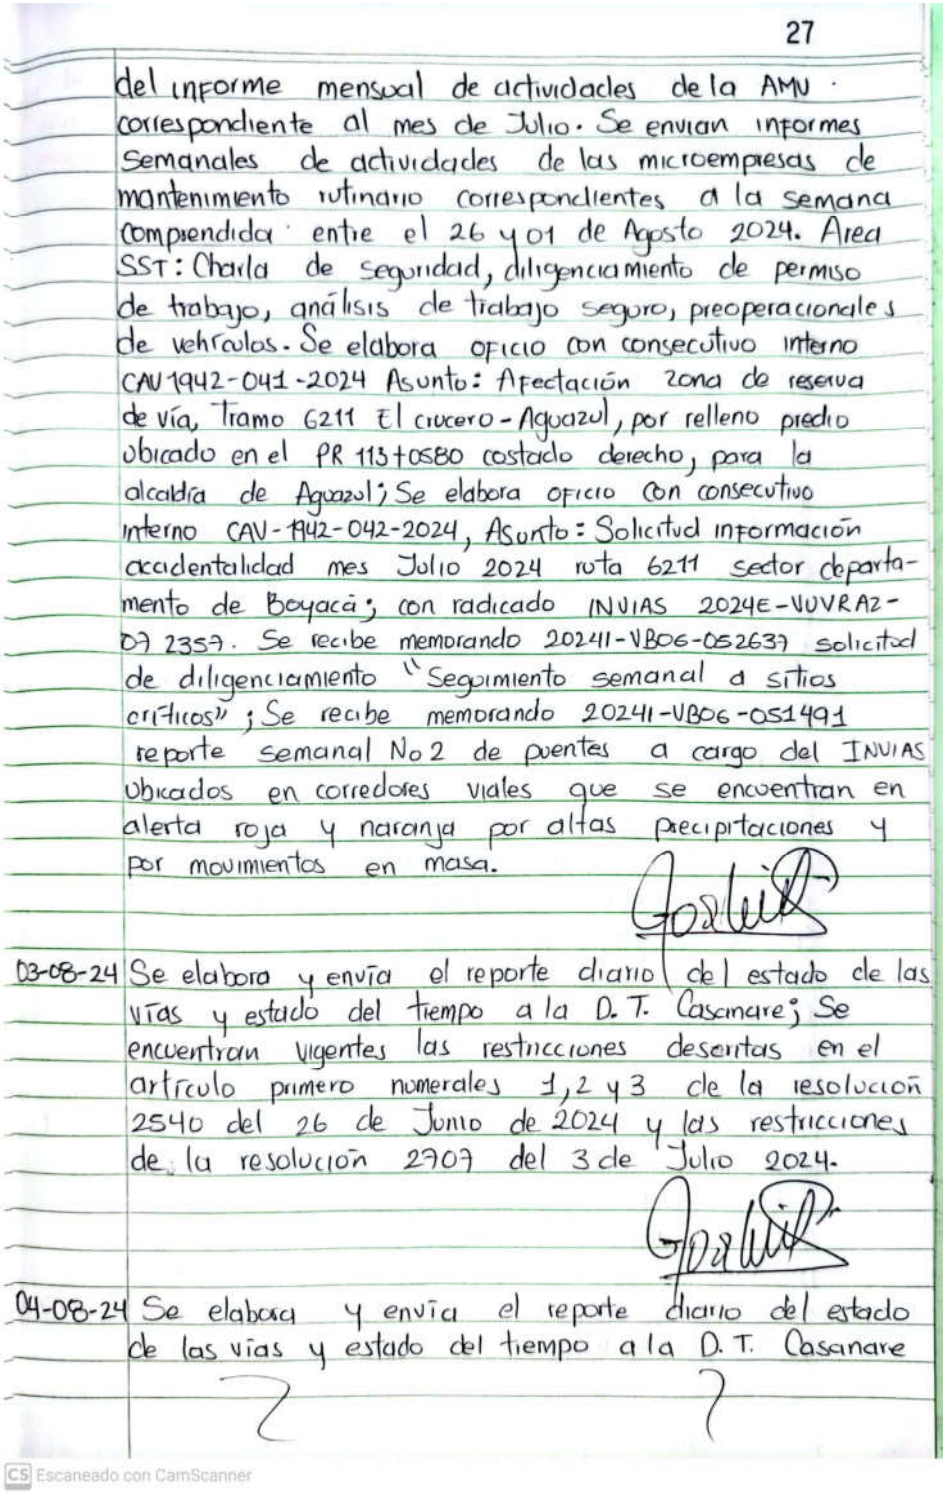


27

del informe mensual de actividades de la AMV correspondiente al mes de Julio. Se envian informes semanales de actividades de las microempresas de mantenimiento rutinario correspondientes a la semana compendida entre el 26 y 01 de Agosto 2024. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, análisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos. Se elabora oficio con consecutivo interno CAV 1942-041-2024 Asunto: Afectación zona de reserva de vía, Tramo 6211 El cruce ro - Aguazul, por relleno predio ubicado en el PR 113+0580 costado derecho, para la alcaldía de Aguazul; Se elabora oficio con consecutivo interno CAV-1942-042-2024, Asunto: Solicitud información accidentalidad mes Julio 2024 ruta 6211 sector departamento de Boyacá; con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-07 2357. Se recibe memorando 20241-VBOG-052637 solicitud de diligenciamiento "Seguimiento semanal a sitios críticos"; Se recibe memorando 20241-VBOG-051491 reporte semanal No 2 de puentes a cargo del INVIAS ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.

03-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D. T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 3 de Julio 2024.

04-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D. T. Casanare

CS Escaneado con CamScanner

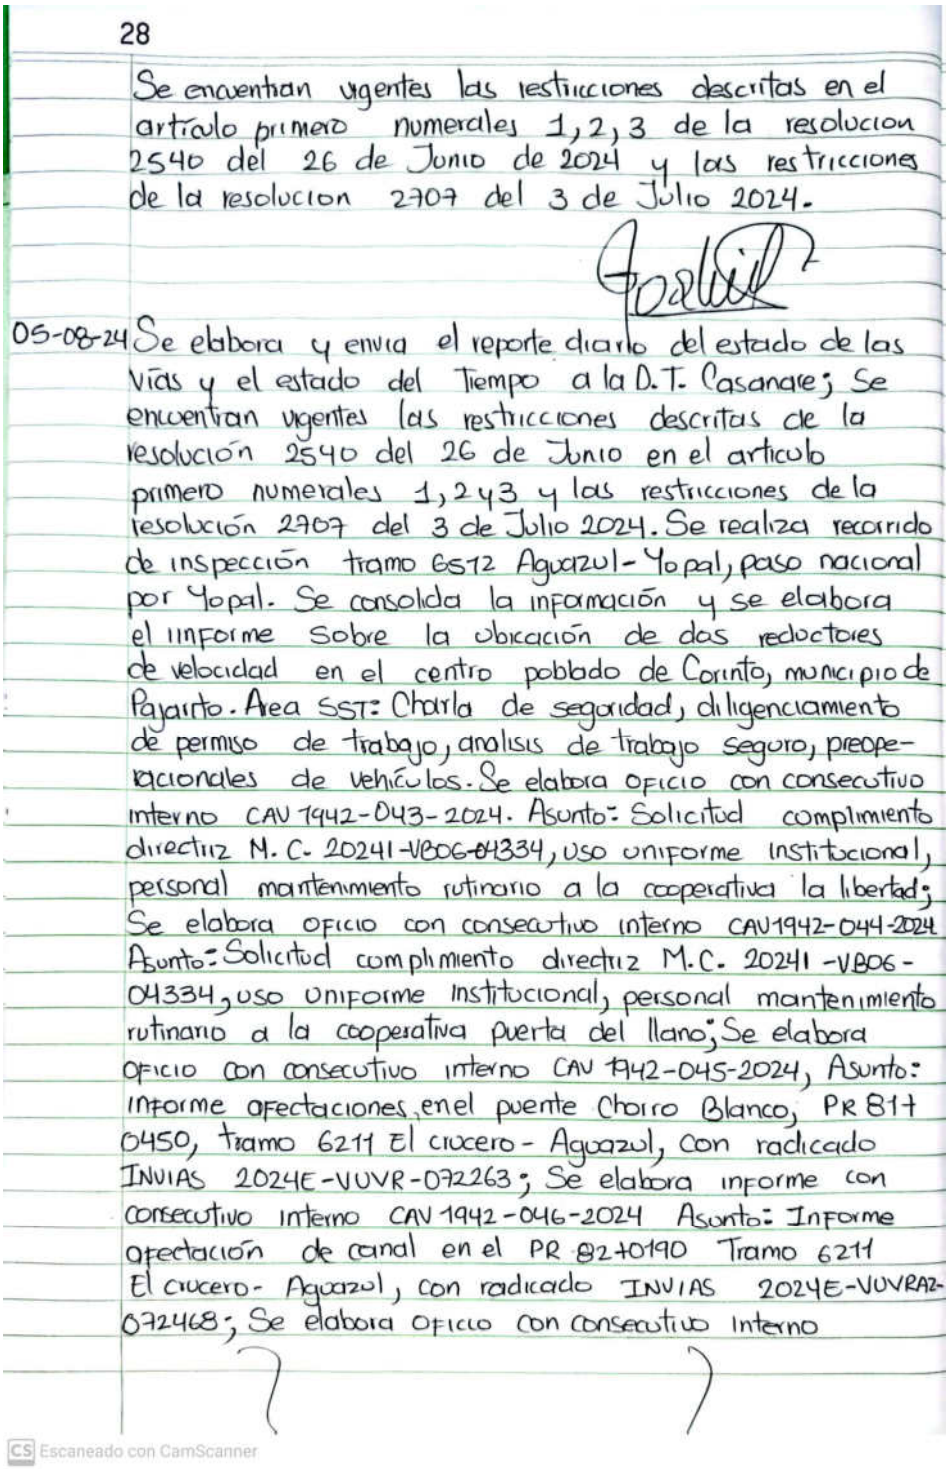

28


Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2, 3 de la resolucion 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolucion 2707 del 3 de Julio 2024.

05-08-24 Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y el estado del Tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas de la resolución 2540 del 26 de Junio en el articulo primero numerales 1, 2 y 3 y las restricciones de la resolución 2707 del 3 de Julio 2024. Se realiza recorrido de inspección tramo 6512 Aguazul - Yopal, paso nacional por Yopal. Se consolida la información y se elabora el informe sobre la ubicación de dos reductores de velocidad en el centro poblado de Corinto, municipio de Pajarito. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos. Se elabora oficio con consecutivo interno CAV 1942-043-2024. Asunto: Solicitud complimiento directiz M. C. 20241-VBOG-04334, uso uniforme institucional, personal mantenimiento rutinario a la cooperativa la libertad; Se elabora oficio con consecutivo interno CAV1942-044-2024 Asunto: Solicitud complimiento directiz M.C. 20241-VBOG-04334, uso uniforme institucional, personal mantenimiento rutinario a la cooperativa puerta del llano; Se elabora oficio con consecutivo interno CAV 1942-045-2024, Asunto: informe afectaciones, en el puente Chorro Blanco, PR 817 0450, tramo 6211 El cruce ro - Aguazul, con radicado INVIAS 2024E-VUVR-072263; Se elabora informe con consecutivo interno CAV 1942-046-2024 Asunto: Informe afectación de canal en el PR 82+0190 Tramo 6211 El cruce ro - Aguazul, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-072468; Se elabora oficio con consecutivo interno

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

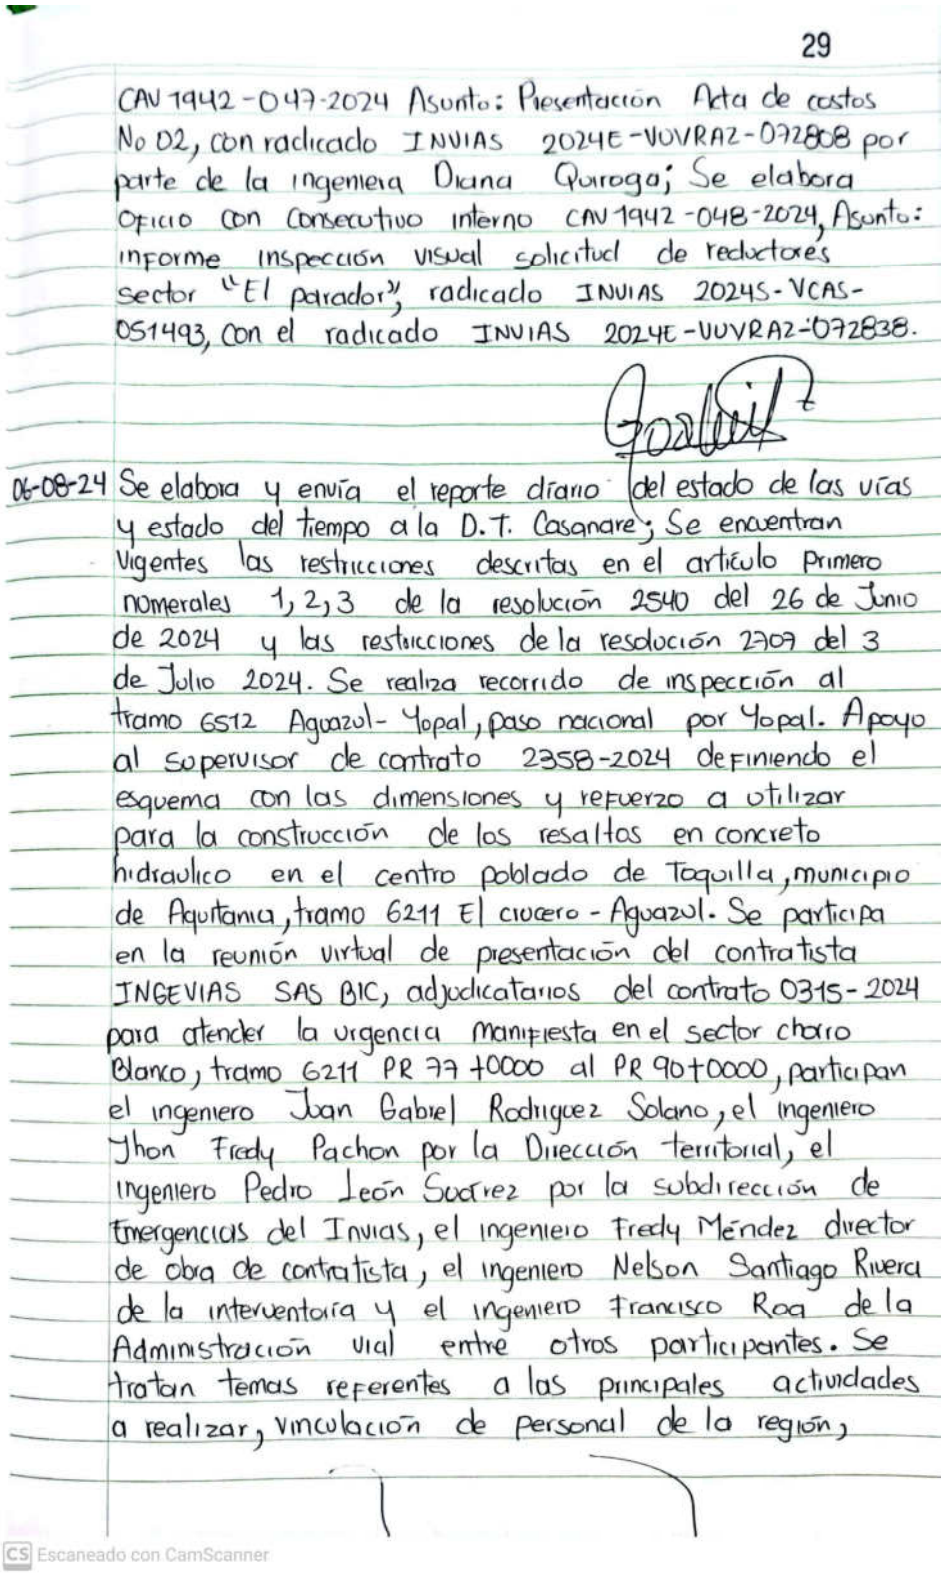

29


CAV 1942-047-2024 Asunto: Presentación Acta de costos No 02, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-072808 por parte de la ingeniera Diana Quiroga; Se elabora Oficio con Consecutivo interno CAV 1942-048-2024, Asunto: informe inspección visual solicitud de reductores sector "El parador", radicado INVIAS 2024S-VCAS-051493, con el radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-072838.

06-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2, 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2709 del 3 de Julio 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul-Yopal, paso nacional por Yopal. Apoyo al supervisor de contrato 2358-2024 definiendo el esquema con las dimensiones y refuerzo a utilizar para la construcción de los resaltos en concreto hidraulico en el centro poblado de Taquilla, municipio de Aquitania, tramo 6211 El cucero - Aguazul. Se participa en la reunión virtual de presentación del contratista INGEVIAS SAS BIC, adjudicatarios del contrato 0315-2024 para atender la urgencia manifiesta en el sector charco Blanco, tramo 6211 PR 77+0000 al PR 90+0000, participan el ingeniero Juan Gabriel Rodriguez Solano, el ingeniero Yhon Fredy Pachon por la Dirección territorial, el ingeniero Pedro León Suarez por la subdirección de Emergencias del Invias, el ingeniero Fredy Méndez director de obra de contratista, el ingeniero Nelson Santiago Rivera de la interventoria y el ingeniero Francisco Roa de la Administración vial entre otros participantes. Se tratan temas referentes a las principales actividades a realizar, vinculación de personal de la región,

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

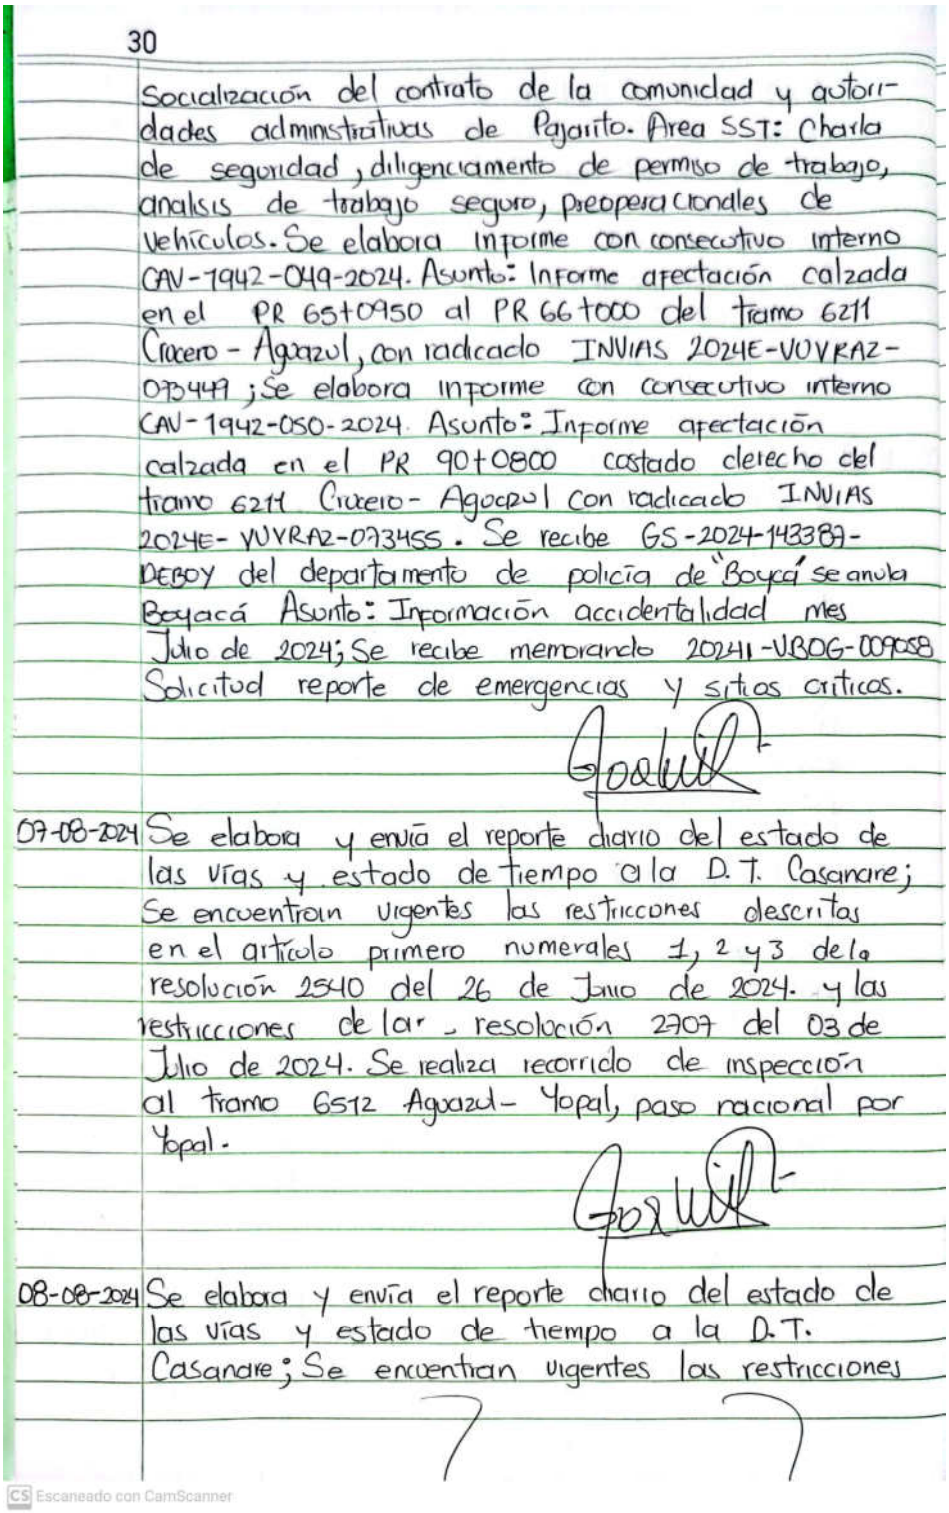


30

Socialización del contrato de la comunidad y autoridades administrativas de Pajarito. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos. Se elabora informe con consecutivo interno CAV-1942-049-2024. Asunto: Informe afectación calzada en el PR 65+0950 al PR 66+000 del tramo 6211 Crucero - Agoazul, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-073449; Se elabora informe con consecutivo interno CAV-1942-050-2024. Asunto: Informe afectación calzada en el PR 90+0800 costado derecho del tramo 6211 Crucero - Agoazul con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-073455. Se recibe GS-2024-142387-DEBOY del departamento de policía de Boyacá se anula Boyacá Asunto: Información accidentalidad mes Julio de 2024; Se recibe memorando 20241-VBOG-009058 Solicitud reporte de emergencias y sitios criticos.

07-08-2024 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado de tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Julio de 2024. y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Agoazul - Yopal, paso nacional por Yopal.

08-08-2024 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado de tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones

CS Escaneado con CamScanner

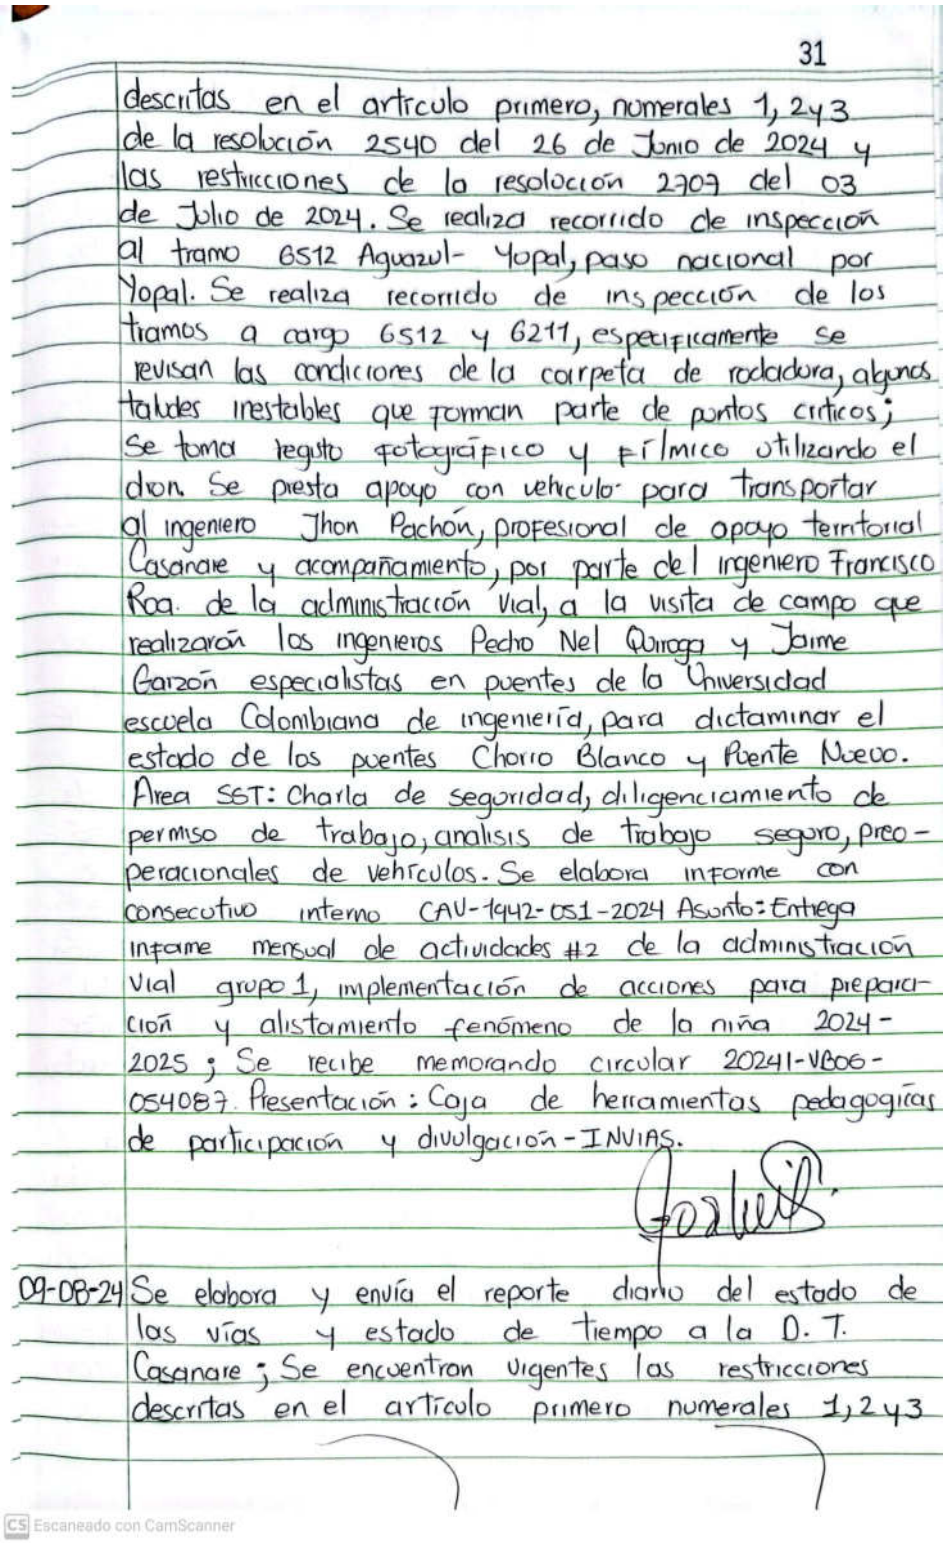

31


descritas en el artículo primero, numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul- Yopal, paso nacional por Yopal. Se realiza recorrido de inspección de los tramos a cargo 6512 y 6211, específicamente se revisan las condiciones de la carpeta de rodadura, algunos taludes inestables que forman parte de puntos críticos; Se toma registo fotográfico y fílmico utilizando el dron. Se presta apoyo con vehículo para transportar al ingeniero Jhon Pachón, profesional de apoyo territorial Casanare y acompañamiento, por parte del ingeniero Francisco Roa. de la administración Vial, a la visita de campo que realizarán los ingenieros Pedro Nel Quiroga y Jaime Garzón especialistas en puentes de la Universidad escuela Colombiana de ingeniería, para dictaminar el estado de los puentes Chorro Blanco y Puente Nuevo. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos. Se elabora informe con consecutivo interno CAV-1942-051-2024 Asunto: Entrega informe mensual de actividades #2 de la administración vial grupo 1, implementación de acciones para preparación y alistamiento fenómeno de la niña 2024-2025; Se recibe memorando circular 20241-VB06-054087. Presentación: Caja de herramientas pedagogicas de participación y divulgación - INVIAS.

09-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado de tiempo a la D. T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3

Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

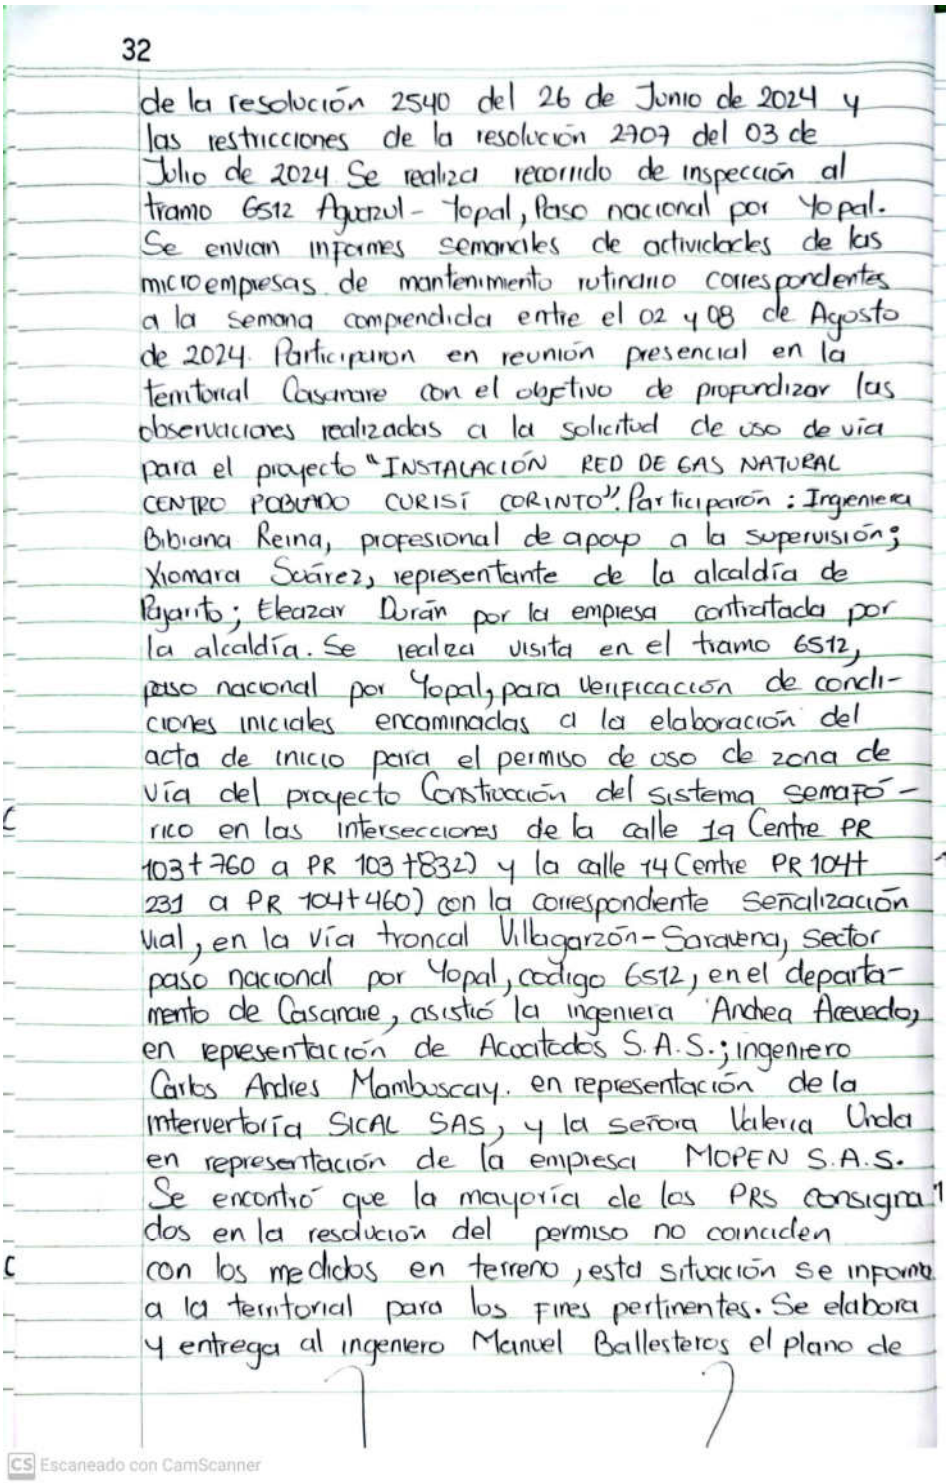


32

de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024 Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul - Yopal, Paso nacional por Yopal. Se envían informes semanales de actividades de las microempresas de mantenimiento rutinario correspondientes a la semana comprendida entre el 02 y 08 de Agosto de 2024. Participaron en reunión presencial en la territorial Casanare con el objetivo de profundizar las observaciones realizadas a la solicitud de uso de vía para el proyecto "INSTALACIÓN RED DE GAS NATURAL CENTRO POBLADO CURISÍ CORINTO". Participaron: Ingeniera Bibiana Reina, profesional de apoyo a la supervisión; Xiomara Suárez, representante de la alcaldía de Payarito; Eleazar Durán por la empresa contratada por la alcaldía. Se realiza visita en el tramo 6512, paso nacional por Yopal, para verificación de condiciones iniciales encaminadas a la elaboración del acta de inicio para el permiso de uso de zona de vía del proyecto Construcción del sistema semafórico en las intersecciones de la calle 14 Centre PR 103+760 a PR 103+832) y la calle 14 Centre PR 104+231 a PR 104+460) con la correspondiente señalización vial, en la vía troncal Villagarzón-Saravena, sector paso nacional por Yopal, código 6512, en el departamento de Casanare, asistió la ingeniera Andrea Acevedo, en representación de Accitodos S.A.S.; ingeniero Carlos Andres Mamboscay. en representación de la interventoría SICAL SAS, y la señora Valeria Ureña en representación de la empresa MOPEN S.A.S. Se encontró que la mayoría de los PRS consignados en la resolución del permiso no coinciden con los medidos en terreno, esta situación se informa a la territorial para los fines pertinentes. Se elabora y entrega al ingeniero Manuel Ballesteros el plano de

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

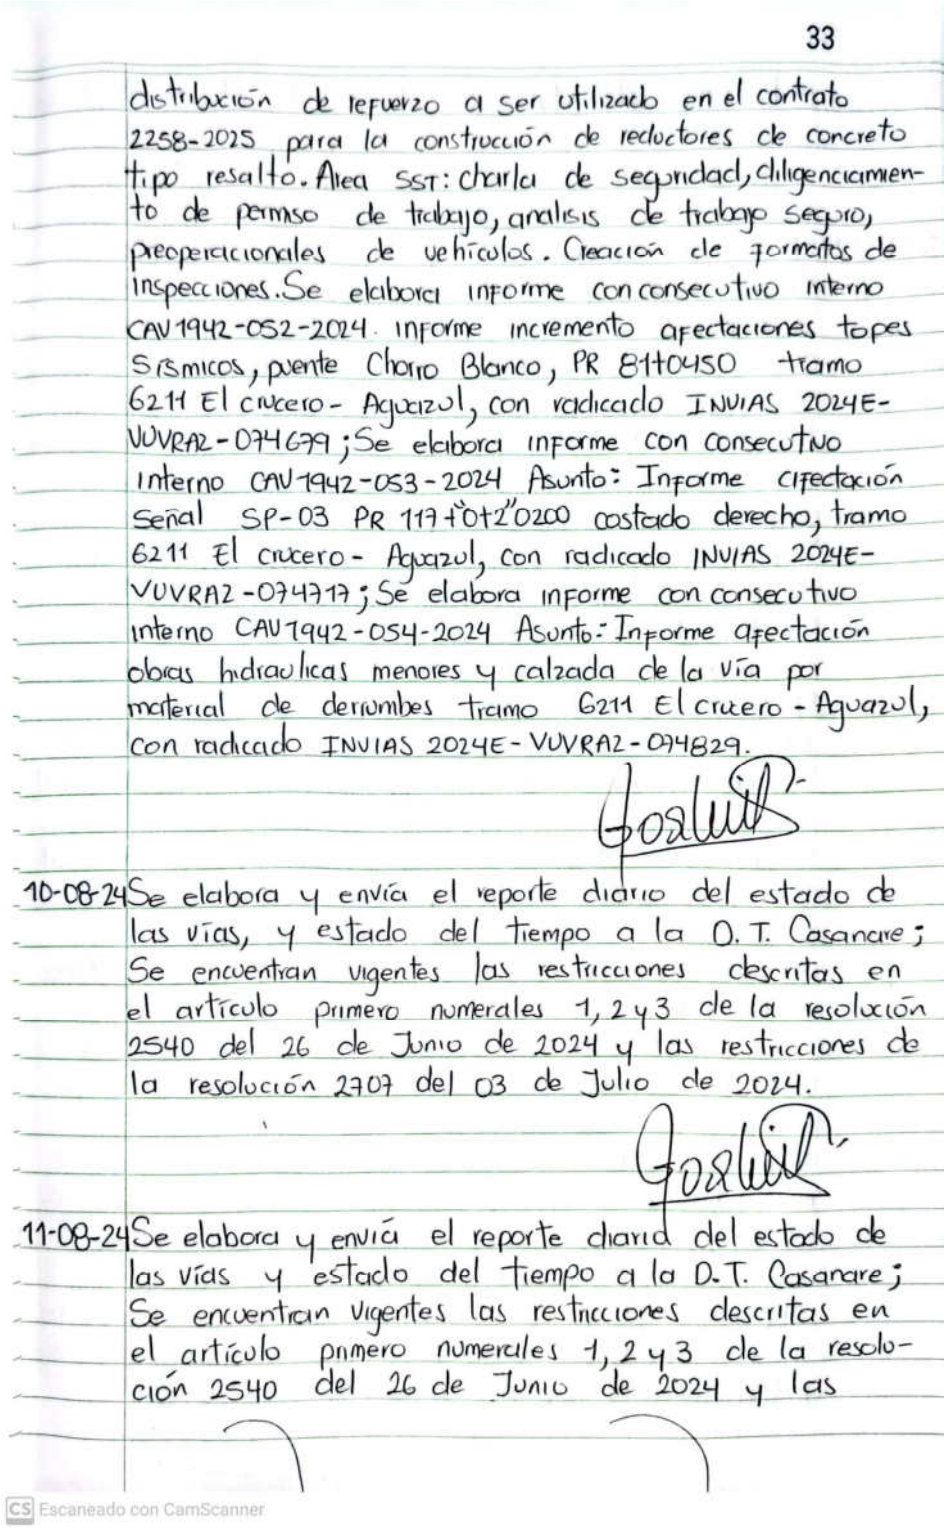


33

distribución de refuerzo a ser utilizado en el contrato 2258-2025 para la construcción de reductores de concreto tipo resalto. Area SST: charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos. Creación de formatos de inspecciones. Se elabora informe con consecutivo interno CAV1942-052-2024 informe incremento afectaciones topes sísmicos, puente Charo Blanco, PR 81+0450 tramo 6211 El crucero - Aguazul, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-074679; Se elabora informe con consecutivo interno CAV1942-053-2024 Asunto: Informe afectación señal SP-03 PR 117+0+2"0200 costado derecho, tramo 6211 El crucero - Aguazul, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-074717; Se elabora informe con consecutivo interno CAV1942-054-2024 Asunto: Informe afectación obras hidraulicas menores y calzada de la vía por material de derrumbes tramo 6211 El crucero - Aguazul, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-074829.

10-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías, y estado del tiempo a la O.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024.

11-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la O.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las

CS Escaneado con CamScanner

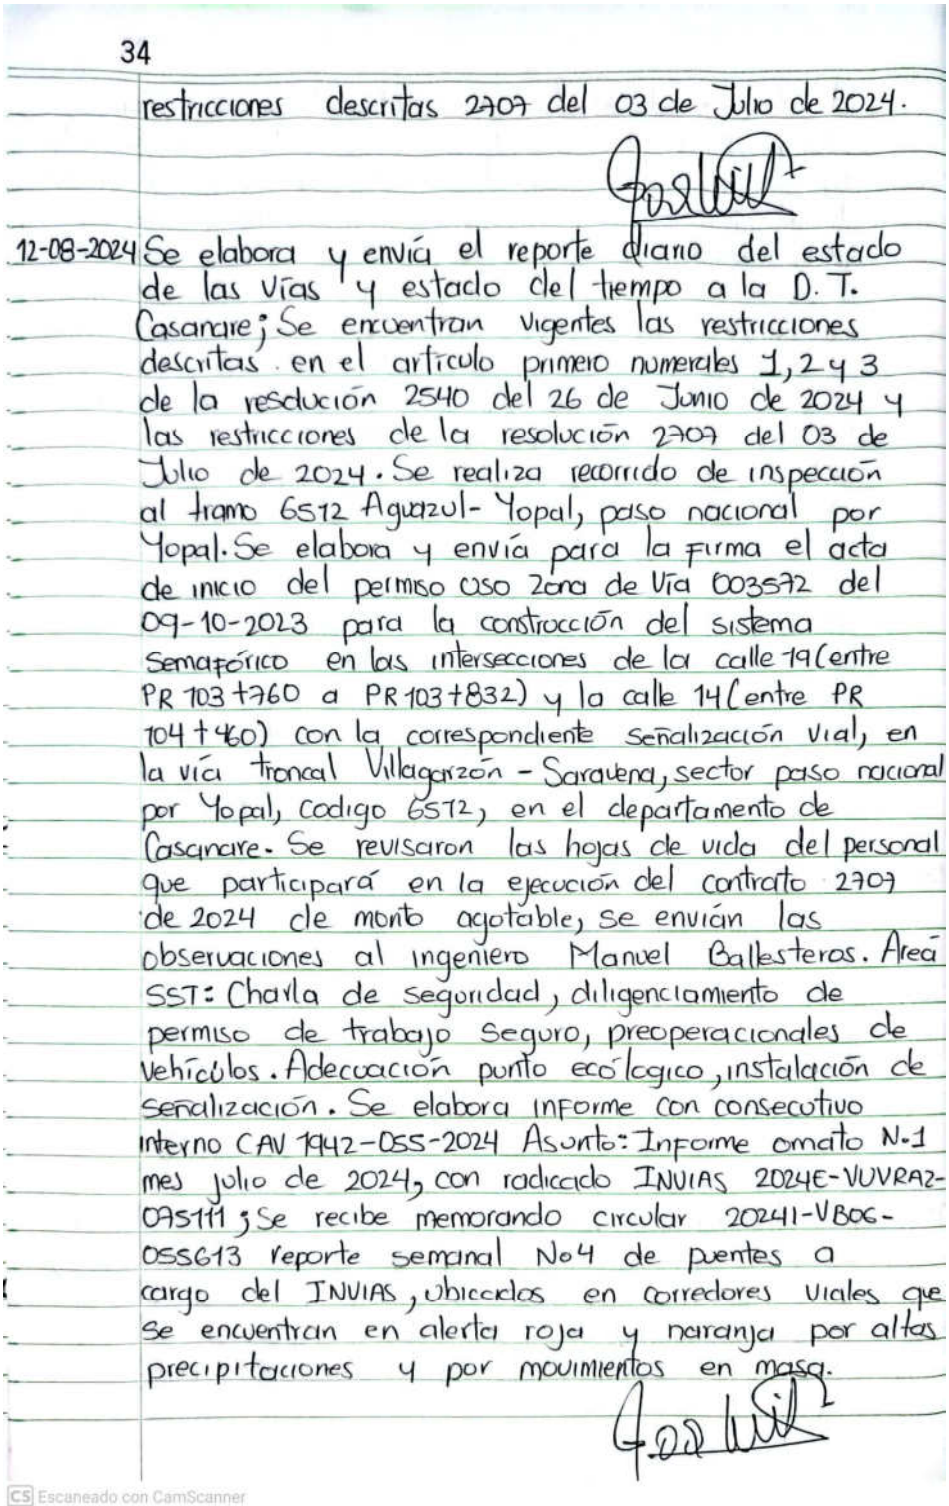


34

restricciones descritas 2707 del 03 de Julio de 2024.

12-08-2024 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D. T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul- Yopal, paso nacional por Yopal. Se elabora y envía para la firma el acta de inicio del permiso uso zona de Vía 003572 del 09-10-2023 para la construcción del sistema semafórico en las intersecciones de la calle 19 (entre PR 103+760 a PR 103+832) y la calle 14 (entre PR 104+460) con la correspondiente señalización vial, en la vía troncal Villanueva - Saravena, sector paso nacional por Yopal, codigo 6512, en el departamento de Casanare. Se revisaron las hojas de vida del personal que participará en la ejecución del contrato 2707 de 2024 de monto agotable, se envían las observaciones al ingeniero Manuel Ballesteros. Área SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos. Adecuación punto ecológico, instalación de señalización. Se elabora informe con consecutivo interno CAV 1942-055-2024 Asunto: Informe omato N.1 mes julio de 2024, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-095111; Se recibe memorando circular 20241-VBOG-055613 reporte semanal No4 de puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.

CS Escaneado con CamScanner

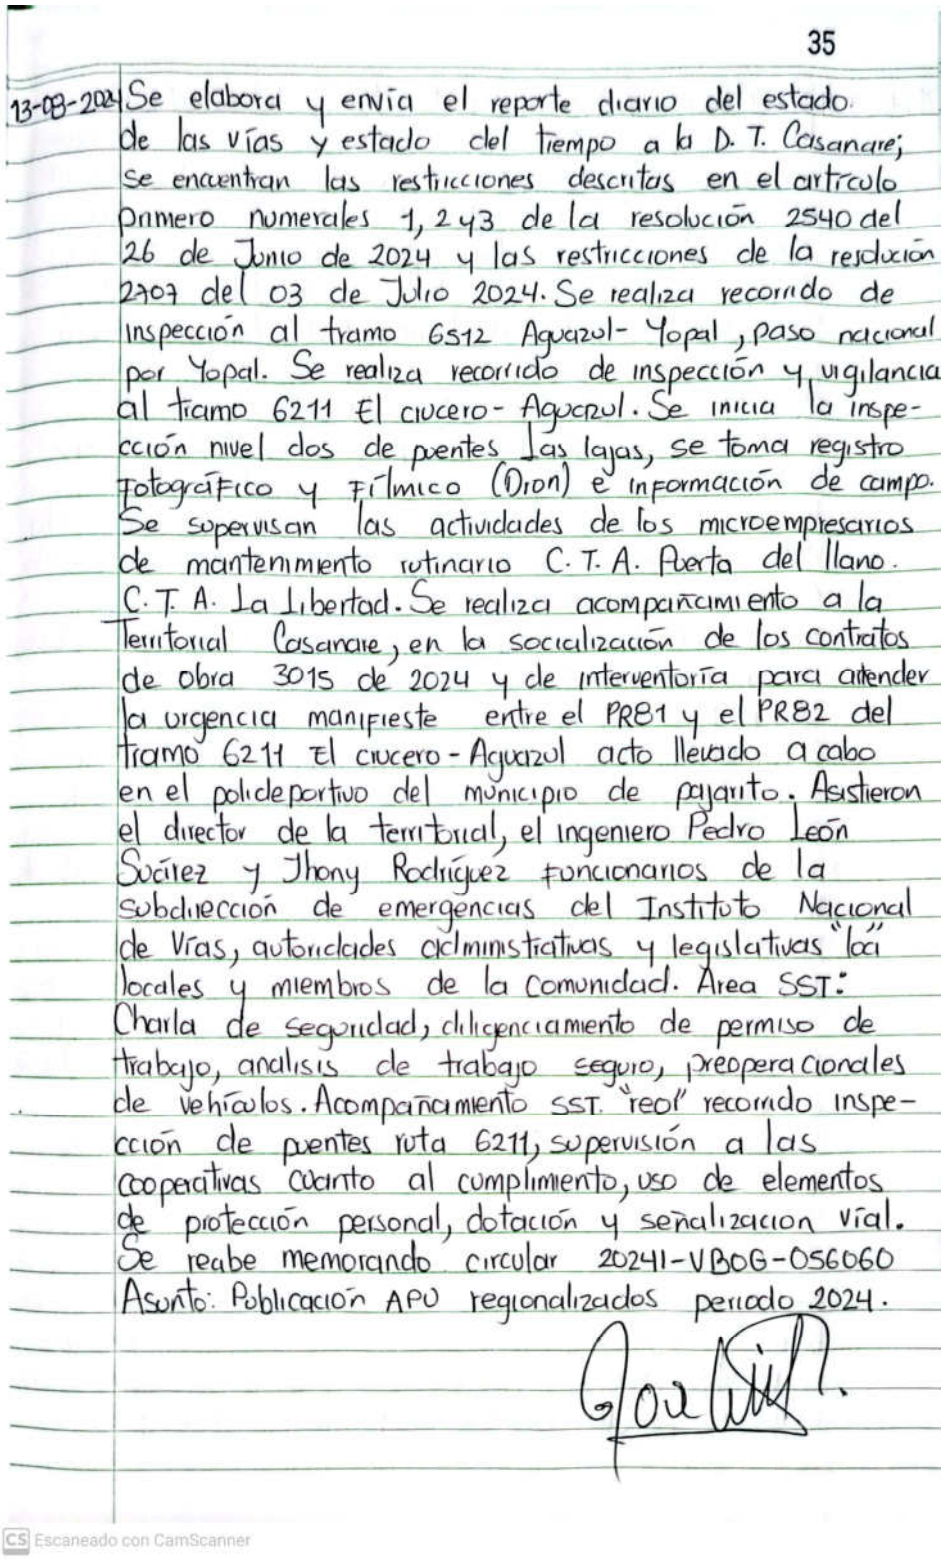


35

13-08-2024 Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D. T. Casanare; se encuentran las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul- Yopal, paso nacional por Yopal. Se realiza recorrido de inspección y vigilancia al tramo 6211 El cruce ro- Aguazul. Se inicia la inspección nivel dos de puentes las lajas, se toma registro fotográfico y fílmico (Dron) e información de campo. Se supervisan las actividades de los microempresarios de mantenimiento rutinario C. T. A. Puerta del llano. C. T. A. La Libertad. Se realiza acompañamiento a la Territorial Casanare, en la socialización de los contratos de obra 3015 de 2024 y de interventoría para atender la urgencia manifiesta entre el PR81 y el PR82 del tramo 6211 El cruce ro - Aguazul acto llevado a cabo en el polideportivo del municipio de pajarito. Asistieron el director de la territorial, el ingeniero Pedro León Suárez y Jhony Rodríguez funcionarios de la subdirección de emergencias del Instituto Nacional de Vías, autoridades administrativas y legislativas "ediles" locales y miembros de la comunidad. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos. Acompañamiento SST. "recorrido inspección de puentes ruta 6211, supervisión a las cooperativas cuanto al cumplimiento, uso de elementos de protección personal, dotación y señalizacion vial. Se reabe memorando circular 20241-VBOG-056060 Asunto: Publicación APU regionalizados periodo 2024.

Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

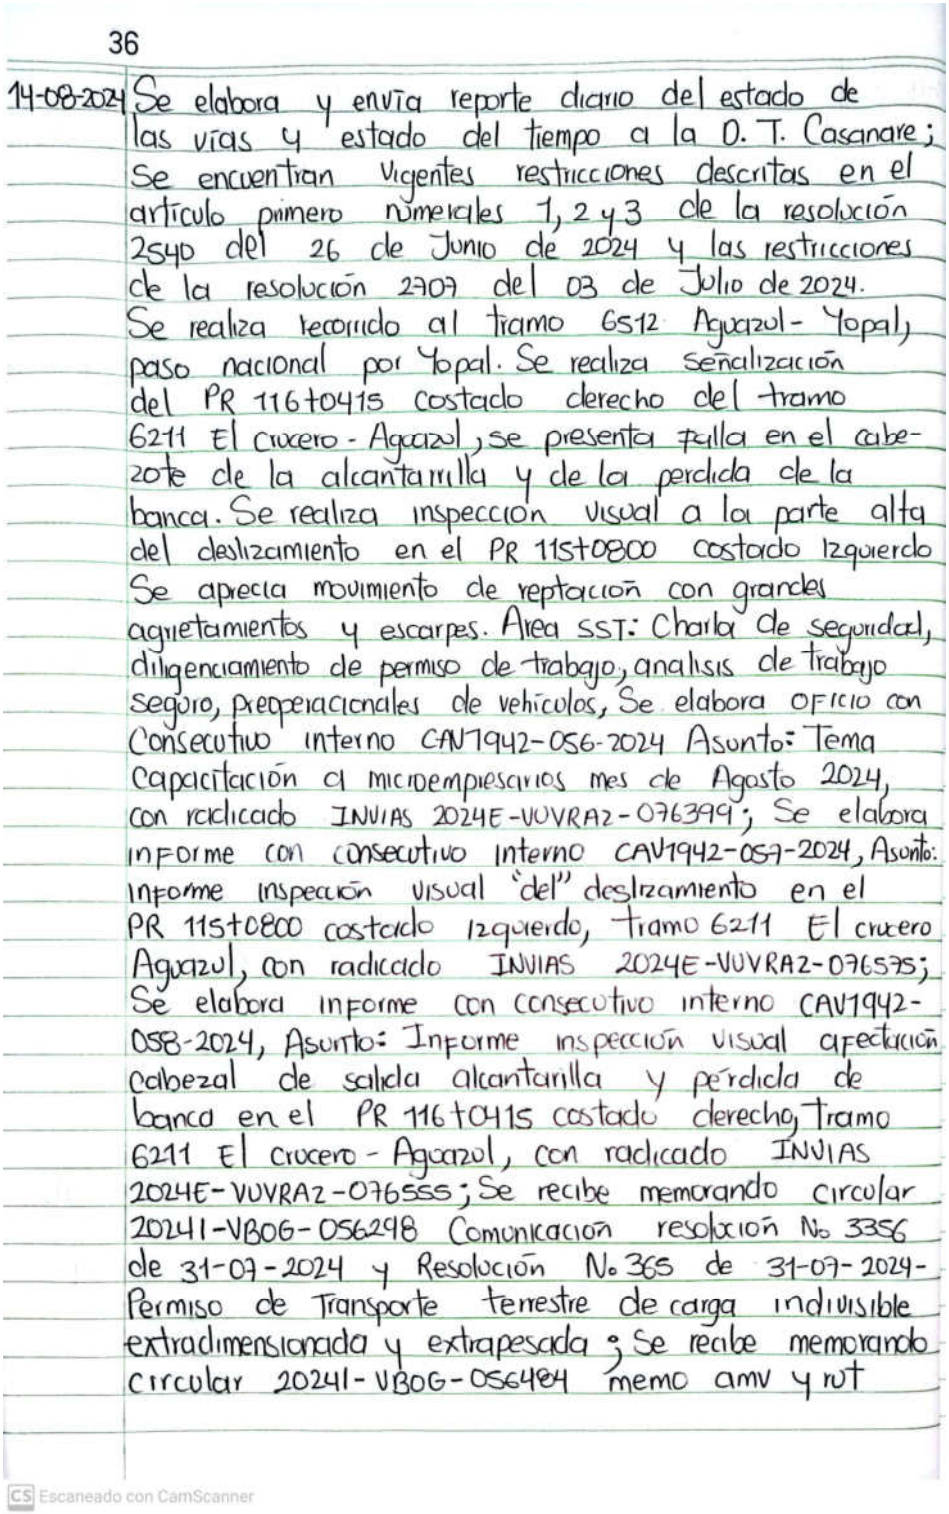


36

14-08-2024 Se elabora y envía reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la O. T. Casanare; Se encuentran vigentes restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido al tramo 6512 Aguazul - Yopal, paso nacional por Yopal. Se realiza señalización del PR 116+0415 costado derecho del tramo 6211 El Crucero - Aguazul, se presenta falla en el cabezote de la alcantarilla y de la perdida de la banca. Se realiza inspección visual a la parte alta del deslizamiento en el PR 115+0800 costado izquierdo Se aprecia movimiento de reptación con grandes agrietamientos y escarpes. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehiculos, Se elabora oficio con Consecutivo interno CAV1942-056-2024 Asunto: Tema capacitación a microempresarios mes de Agosto 2024, con radicado INVIAS 2024E-VUVRA2-076399; Se elabora informe con consecutivo interno CAV1942-057-2024, Asunto: Informe inspección visual "del" deslizamiento en el PR 115+0800 costado izquierdo, tramo 6211 El crucero Aguazul, con radicado INVIAS 2024E-VUVRA2-076575; Se elabora informe con consecutivo interno CAV1942-058-2024, Asunto: Informe inspección visual afectación cabezal de salida alcantarilla y pérdida de banca en el PR 116+0415 costado derecho, tramo 6211 El crucero - Aguazul, con radicado INVIAS 2024E-VUVRA2-076555; Se recibe memorando circular 20241-VBOG-056298 Comunicación resolución No 3356 de 31-07-2024 y Resolución No 365 de 31-07-2024- Permiso de Transporte terrestre de carga indivisible extradimensionada y extrapesada; Se recibe memorando circular 20241-VBOG-056484 memo amv y rut

Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

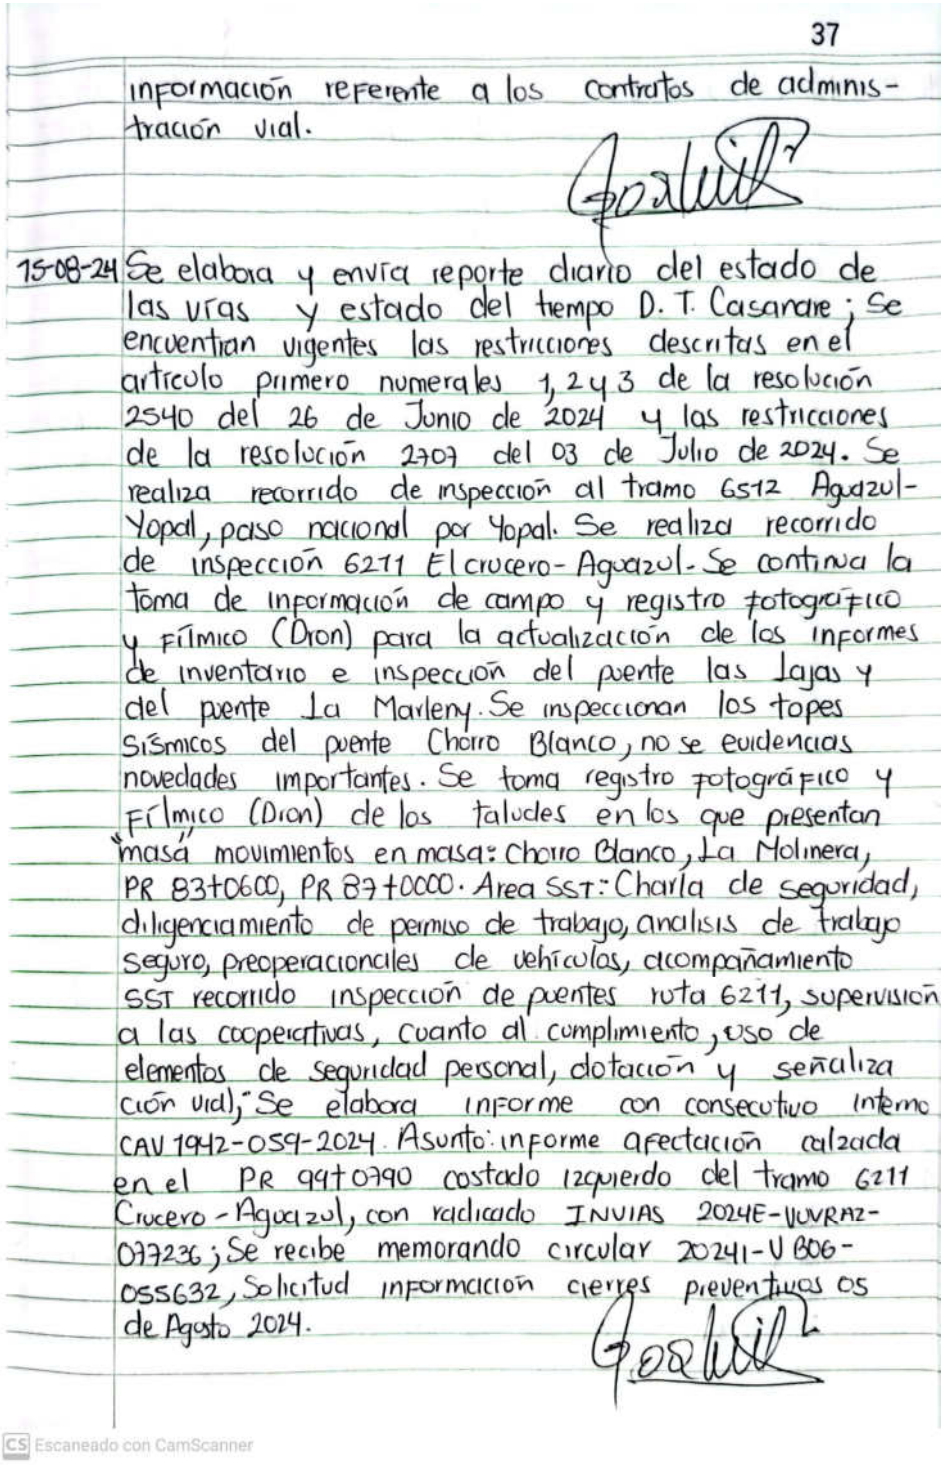

37


información referente a los contratos de administración vial.

15-08-24 Se elabora y envía reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo D. T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul-Yopal, paso nacional por Yopal. Se realiza recorrido de inspección 6211 El crucero-Aguazul. Se continua la toma de información de campo y registro fotográfico y fílmico (Dron) para la actualización de los informes de inventario e inspección del puente las Lajas y del puente La Marleny. Se inspeccionan los topes sísmicos del puente Chorro Blanco, no se evidencias novedades importantes. Se toma registro fotográfico y fílmico (Dron) de los taludes en los que presentan "masa" movimientos en masa: Chorro Blanco, La Molinera, PR 83+0600, PR 87+0000. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos, acompañamiento SST recorrido inspección de puentes ruta 6211, supervisión a las cooperativas, cuanto al cumplimiento, uso de elementos de seguridad personal, dotación y señalización vial; Se elabora informe con consecutivo interno CAV 1942-059-2024. Asunto: informe afectación calzada en el PR 99+0790 costado izquierdo del tramo 6211 Crucero - Aguazul, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-077236; Se recibe memorando circular 20241-VBOG-055632, Solicitud información cierres preventivos 05 de Agosto 2024.

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

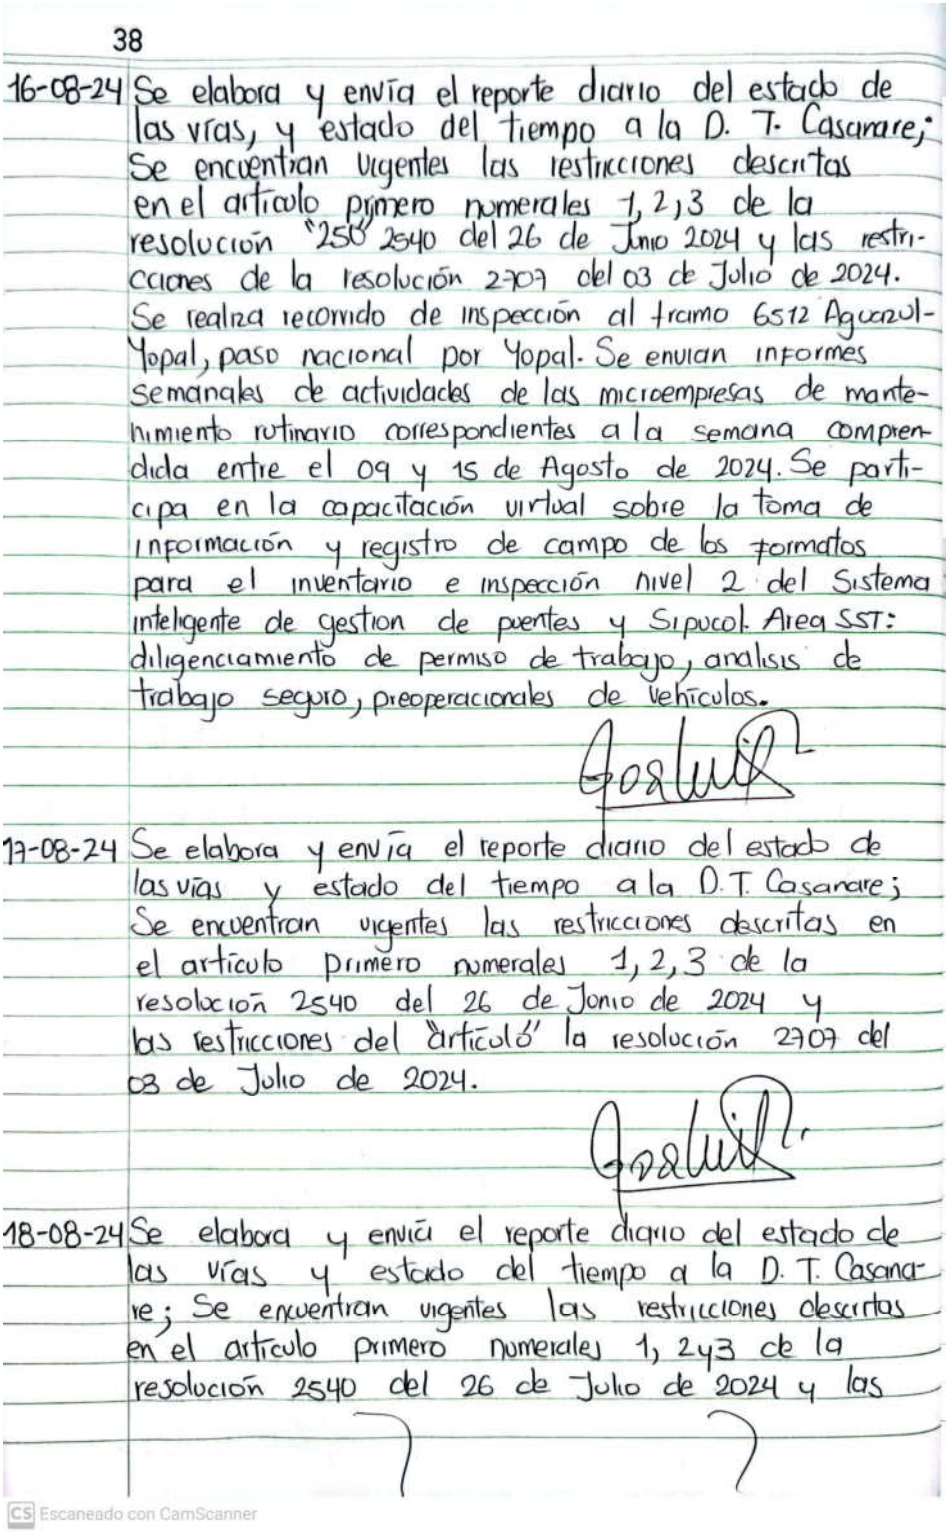

38

16-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías, y estado del tiempo a la D. T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2, 3 de la resolución "2540 2540 del 26 de Junio 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul-Yopal, paso nacional por Yopal. Se envían informes semanales de actividades de las microempresas de mantenimiento rutinario correspondientes a la semana comprendida entre el 09 y 15 de Agosto de 2024. Se participa en la capacitación virtual sobre la toma de información y registro de campo de los formatos para el inventario e inspección nivel 2 del Sistema inteligente de gestion de puentes y Sipucol. Area SST: diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos.


17-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2, 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones del "artículo" la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024.

18-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D. T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 243 de la resolución 2540 del 26 de Julio de 2024 y las

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

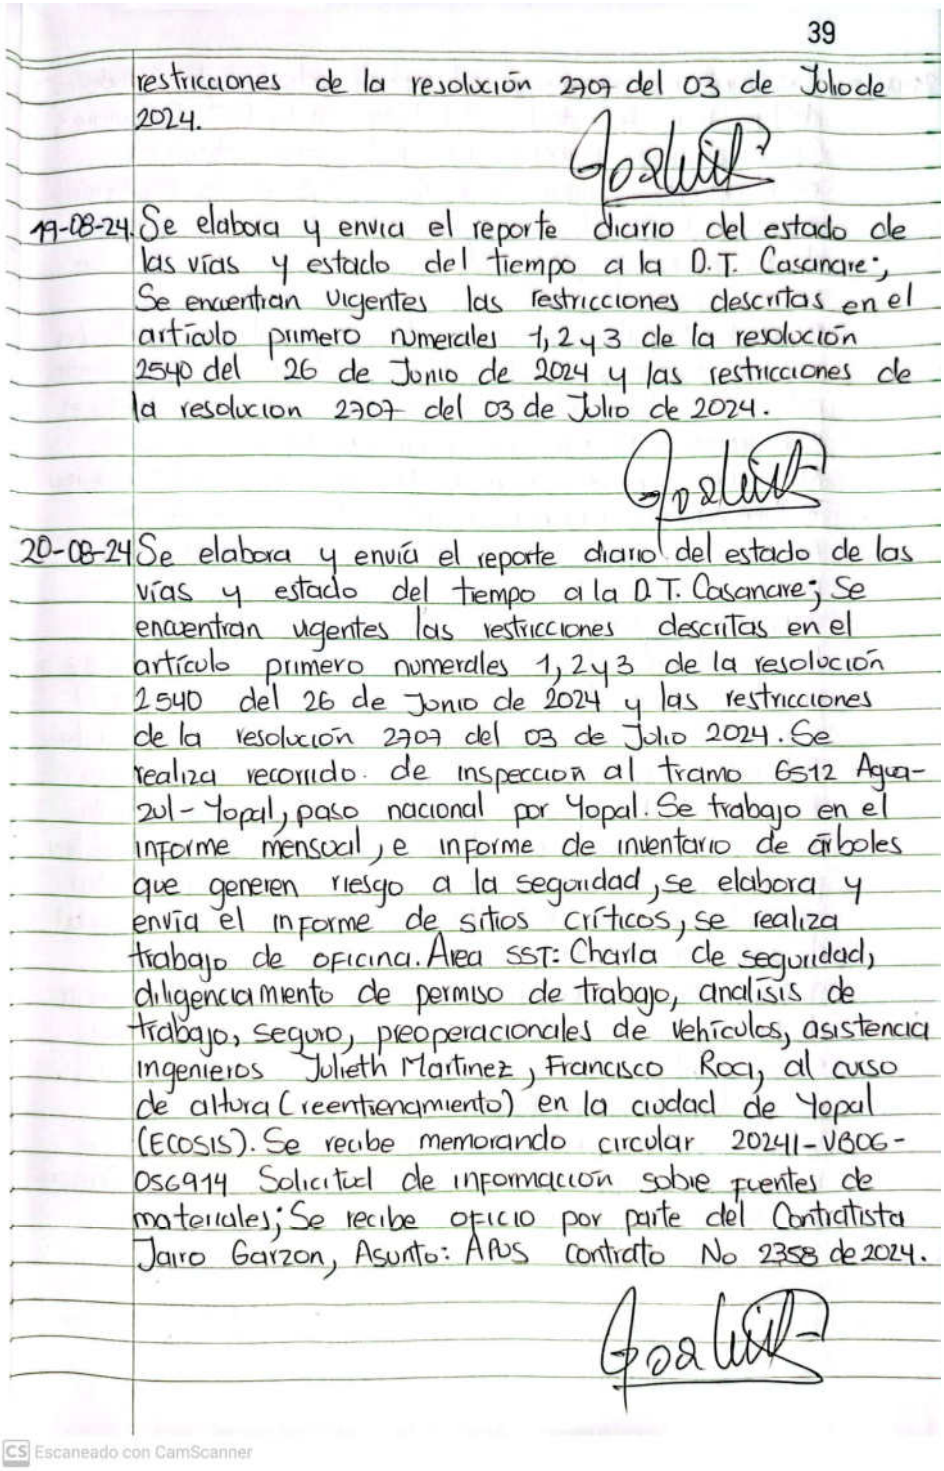

39

restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024.


19-08-24. Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolucion 2707 del 03 de Julio de 2024.

20-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul - Yopal, paso nacional por Yopal. Se trabajo en el informe mensual, e informe de inventario de árboles que generen riesgo a la seguridad, se elabora y envía el informe de sitios críticos, se realiza trabajo de oficina. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo, seguro, preoperacionales de vehículos, asistencia ingenieros Julieth Martinez, Francisco Roca, al curso de altura (reentrenamiento) en la ciudad de Yopal (ECOSIS). Se recibe memorando circular 20241-VBOG-0S6914 Solicitud de información sobre fuentes de materiales; Se recibe oficio por parte del Contratista Jairo Garzon, Asunto: APUS contrato No 2358 de 2024.

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

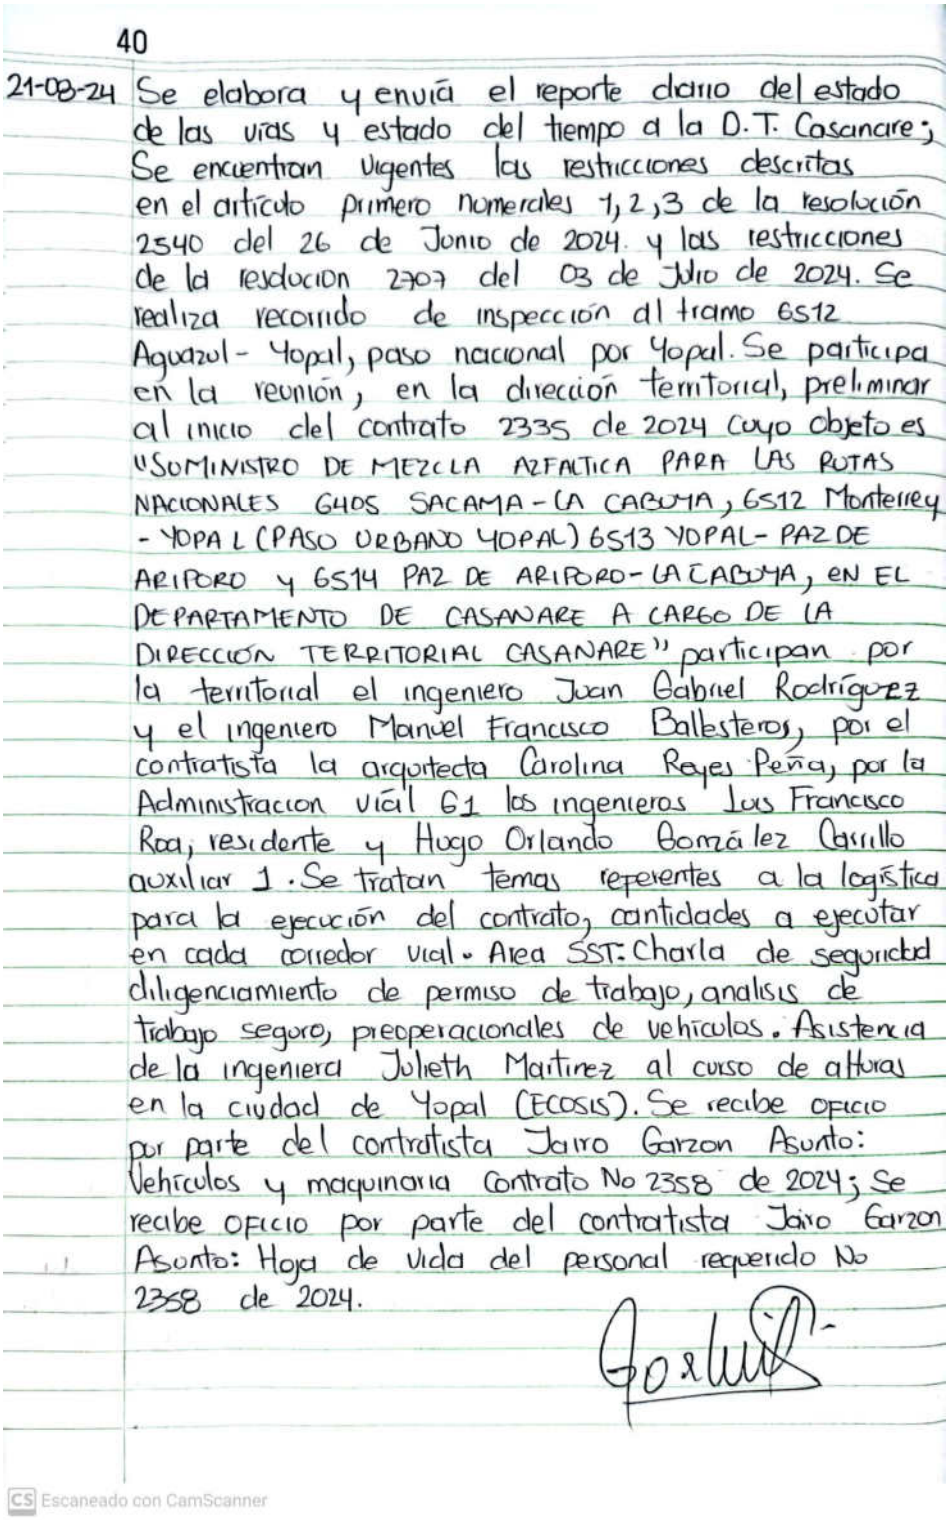


40

21-08-24 Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el articulo primero numerales 1, 2, 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024. y las restricciones de la resolucion 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul - Yopal, paso nacional por Yopal. Se participa en la reunión, en la dirección territorial, preliminar al inicio del contrato 2335 de 2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405 SACAMA - LA CABUYA, 6512 Monterrey - YOPAL (PASO URBANO YOPAL) 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO y 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE" participan por la territorial el ingeniero Juan Gabriel Rodriguez y el ingeniero Manuel Francisco Ballesteros, por el contratista la arquitecta Carolina Reyes Peña, por la Administracion vial 61 los ingenieros Luis Francisco Roa, residente y Hugo Orlando Gonzalez Carrillo auxiliar 1. Se tratan temas referentes a la logistica para la ejecución del contrato, cantidades a ejecutar en cada corredor vial. Area SST: Charla de seguridad diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehiculos. Asistencia de la ingeniera Julieth Martinez al curso de alturas en la ciudad de Yopal (CECOSIS). Se recibe oficio por parte del contratista Jairo Garzon Asunto: Vehiculos y maquinaria Contrato No 2358 de 2024; Se recibe OFICIO por parte del contratista Jairo Garzon Asunto: Hoja de vida del personal requerido No 2358 de 2024.

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

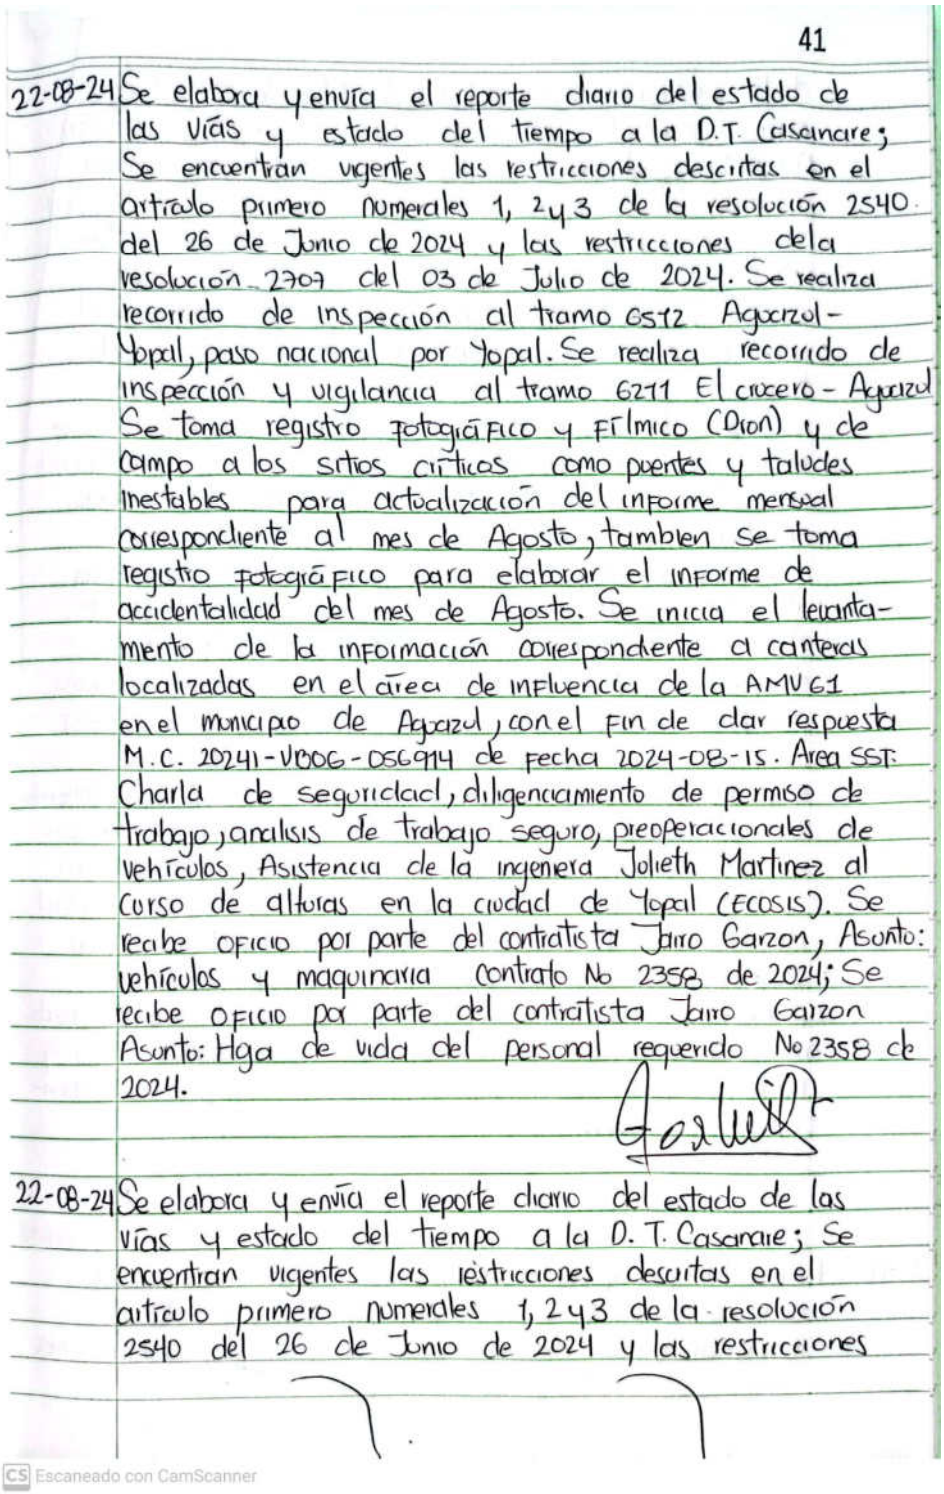


41

22-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2709 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Agazul-Yopal, paso nacional por Yopal. Se realiza recorrido de inspección y vigilancia al tramo 6211 El cruzero - Agazul Se toma registro fotográfico y fílmico (Dron) y de campo a los sitios críticos como puentes y taludes inestables para actualización del informe mensual correspondiente al mes de Agosto, también se toma registro fotográfico para elaborar el informe de accidentalidad del mes de Agosto. Se inicia el levantamiento de la información correspondiente a canteras localizadas en el área de influencia de la AMV 61 en el municipio de Agazul, con el fin de dar respuesta M.C. 20241-VB06-056914 de fecha 2024-08-15. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos, Asistencia de la ingeniera Julieth Martinez al curso de alturas en la ciudad de Yopal (ECOSIS). Se recibe oficio por parte del contratista Jairo Garzon, Asunto: vehículos y maquinaria contrato No 2358 de 2024; Se recibe oficio por parte del contratista Jairo Garzon Asunto: Hoja de vida del personal requerido No 2358 de 2024.

22-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D. T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones

CS Escaneado con CamScanner

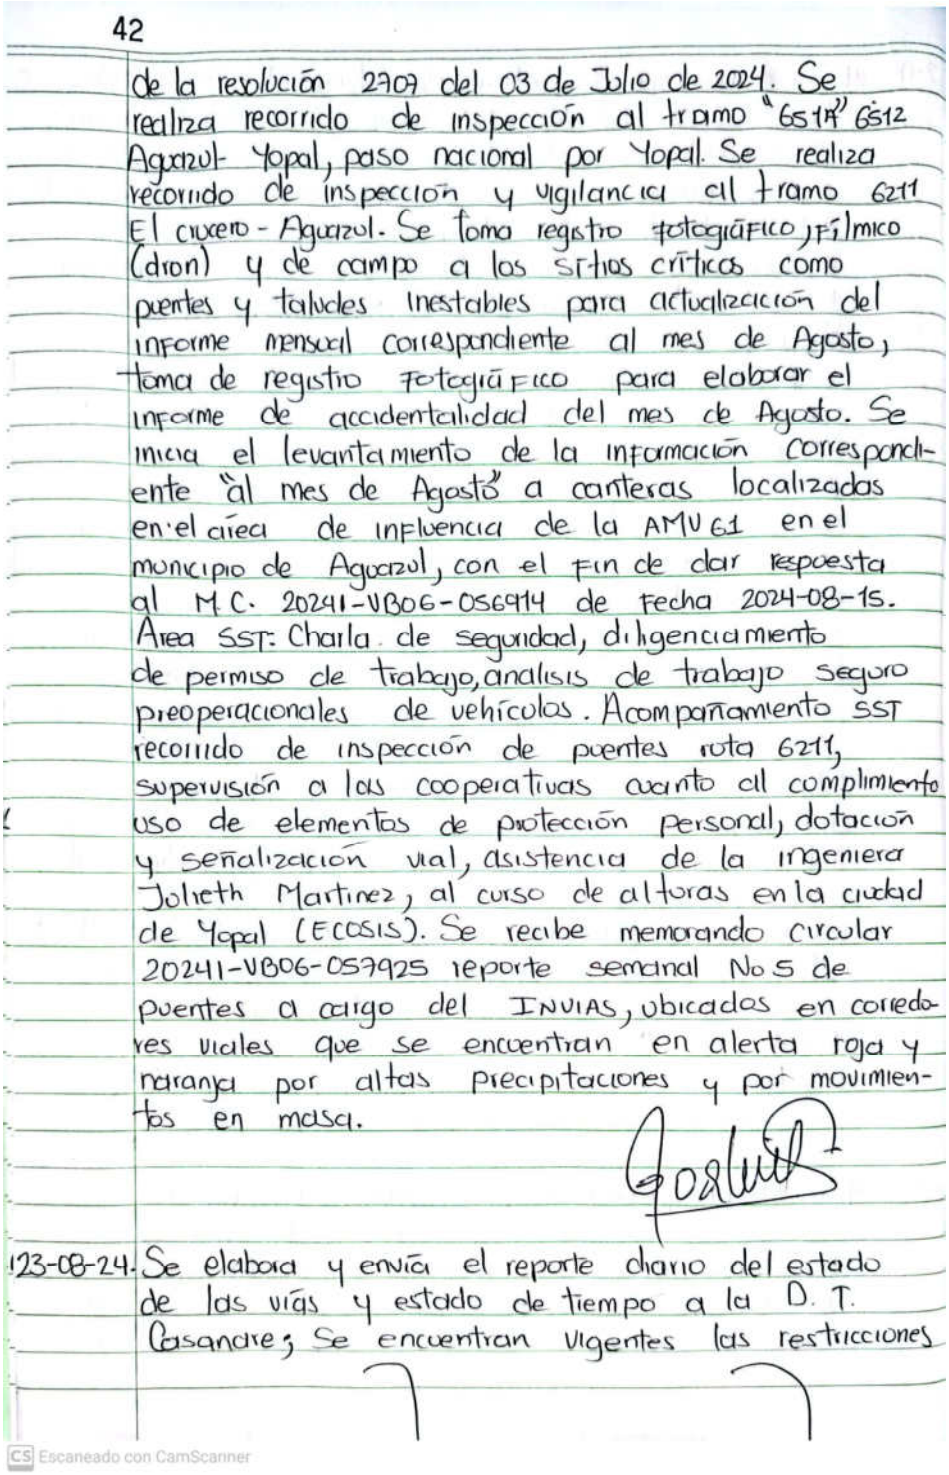

42


de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo "6514" 6512 Aguazul- Yopal, paso nacional por Yopal. Se realiza recorrido de inspección y vigilancia al tramo 6211 El cruce ro - Aguazul. Se toma registro fotográfico, fílmico (dron) y de campo a los sitios críticos como puentes y taludes inestables para actualización del informe mensual correspondiente al mes de Agosto, toma de registro fotográfico para elaborar el informe de accidentalidad del mes de Agosto. Se inicia el levantamiento de la información correspondiente al mes de Agosto a canteras localizadas en el área de influencia de la AMV 61 en el municipio de Aguazul, con el fin de dar respuesta al M.C. 20241-VB06-056914 de fecha 2024-08-15. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro preoperacionales de vehículos. Acompañamiento SST recorrido de inspección de puentes ruta 6211, supervisión a las cooperativas cuanto al cumplimiento uso de elementos de protección personal, dotación y señalización vial, asistencia de la ingeniera Jolieth Martinez, al curso de alturas en la ciudad de Yopal (ECOSIS). Se recibe memorando circular 20241-VB06-057925 reporte semanal No 5 de puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.

23-08-24. Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y estado de tiempo a la D. T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

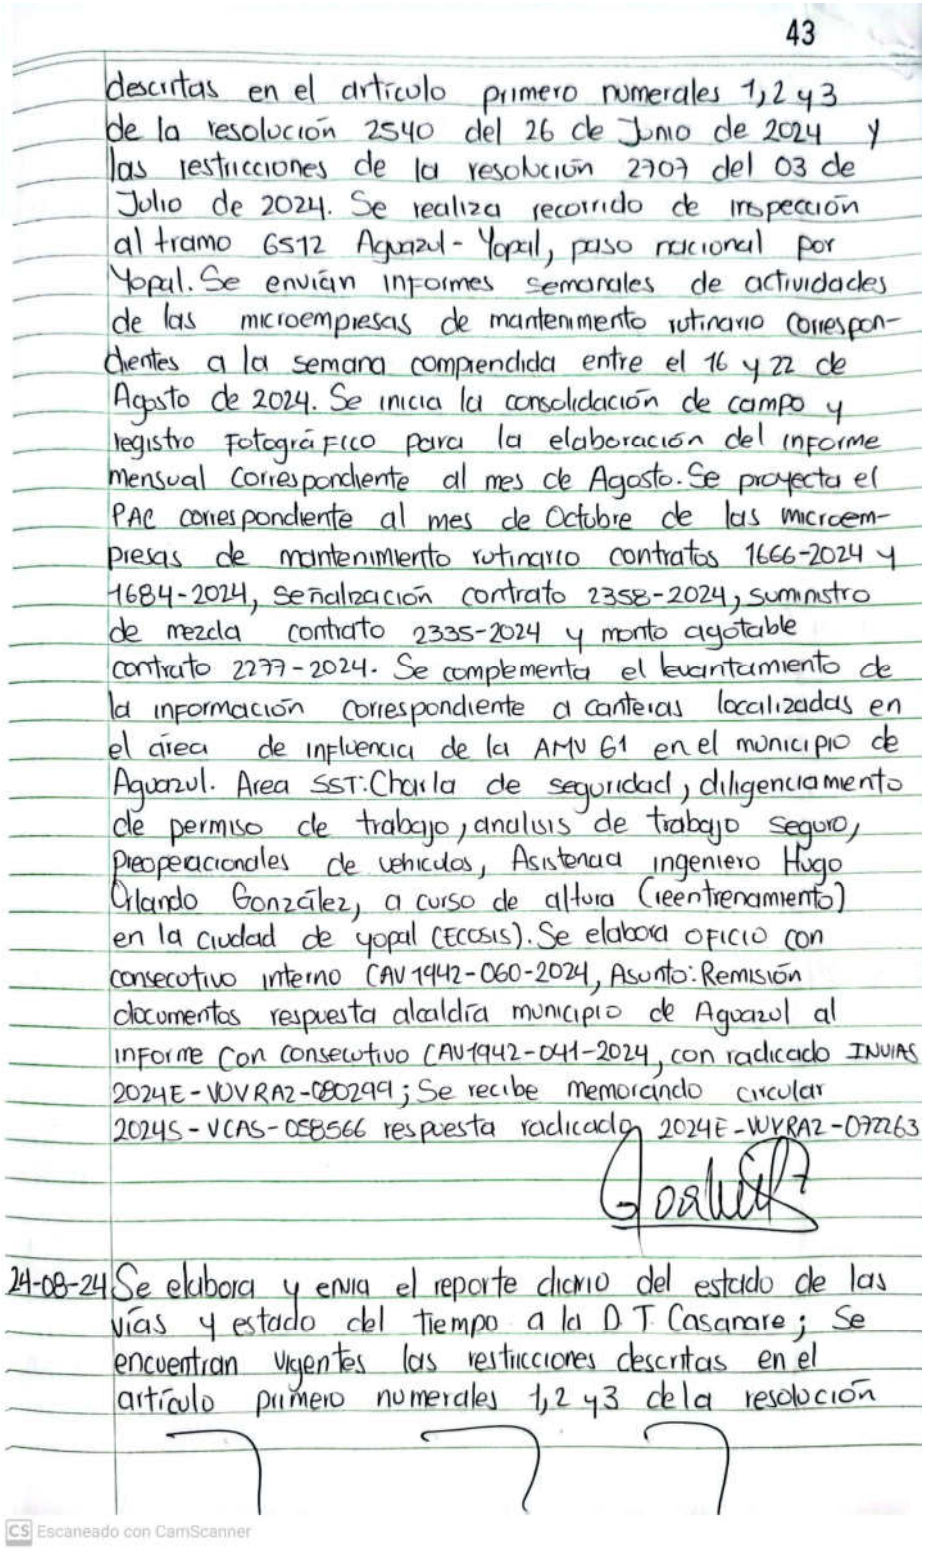

43


descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul - Yopal, paso nacional por Yopal. Se envían informes semanales de actividades de las microempresas de mantenimiento rutinario correspondientes a la semana comprendida entre el 16 y 22 de Agosto de 2024. Se inicia la consolidación de campo y registro fotográfico para la elaboración del informe mensual correspondiente al mes de Agosto. Se proyecta el PAC correspondiente al mes de Octubre de las microempresas de mantenimiento rutinario contratos 1666-2024 y 1684-2024, Señalización contrato 2358-2024, suministro de mezcla contrato 2335-2024 y monto agotable contrato 2277-2024. Se complementa el levantamiento de la información correspondiente a canteras localizadas en el área de influencia de la AMV 61 en el municipio de Aguazul. Area SST: Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehiculos, Asistencia ingeniero Hugo Orlando González, a curso de altura (reentrenamiento) en la ciudad de yopal (ECOSIS). Se elabora OFICIO con consecutivo interno CAV1942-060-2024, Asunto: Remisión documentos respuesta alcaldía municipio de Aguazul al informe con consecutivo CAV1942-041-2024, con radicado INVIAS 2024E-VVRAZ-080299; Se recibe memorando circular 2024S-VCAS-058566 respuesta radicado 2024E-VVRAZ-077263

24-08-24 Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

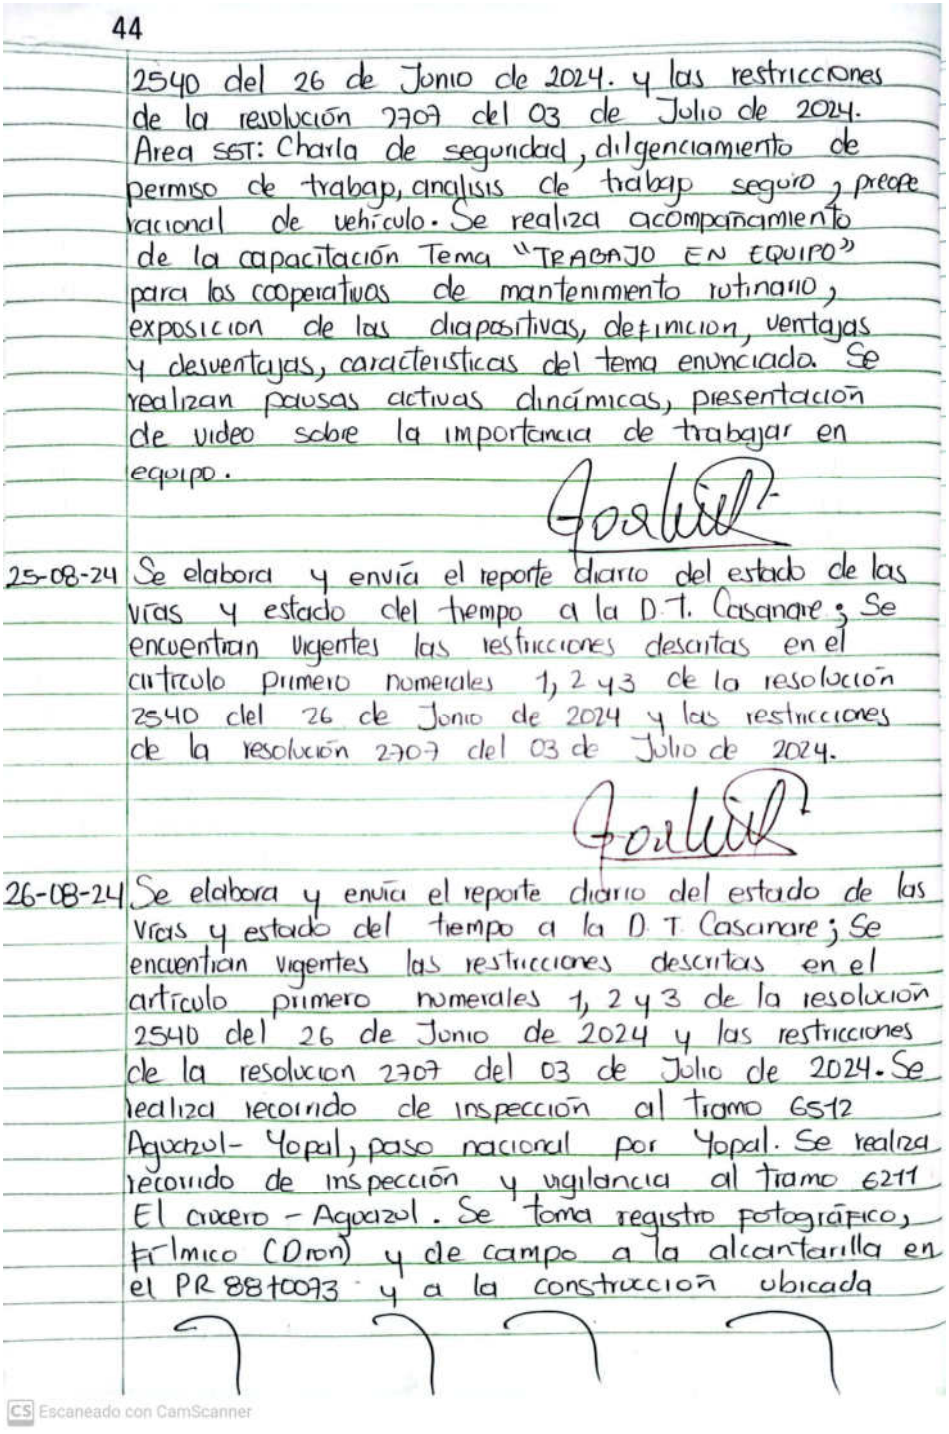

44

2540 del 26 de Junio de 2024. y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Area SST: Charla de seguridad, dilgenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro y preope racional de vehiculo. Se realiza acompañamiento de la capacitación Tema "TRABAJO EN EQUIPO" para los cooperativos de mantenimiento rutinario, exposicion de las diapositivas, definicion, ventajas y desventajas, caracteristicas del tema enunciado. Se realizan pausas activas dinámicas, presentación de video sobre la importancia de trabajar en equipo.


25-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el articulo primero nomerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024.

26-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero nomerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolucion 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul- Yopal, paso nacional por Yopal. Se realiza recorrido de inspección y vigilancia al tramo 6211 El cruce ro - Aguazul. Se toma registro fotográfico, fílmico (Dron) y de campo a la alcantarilla en el PR 88+0073 y a la construcción ubicada

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

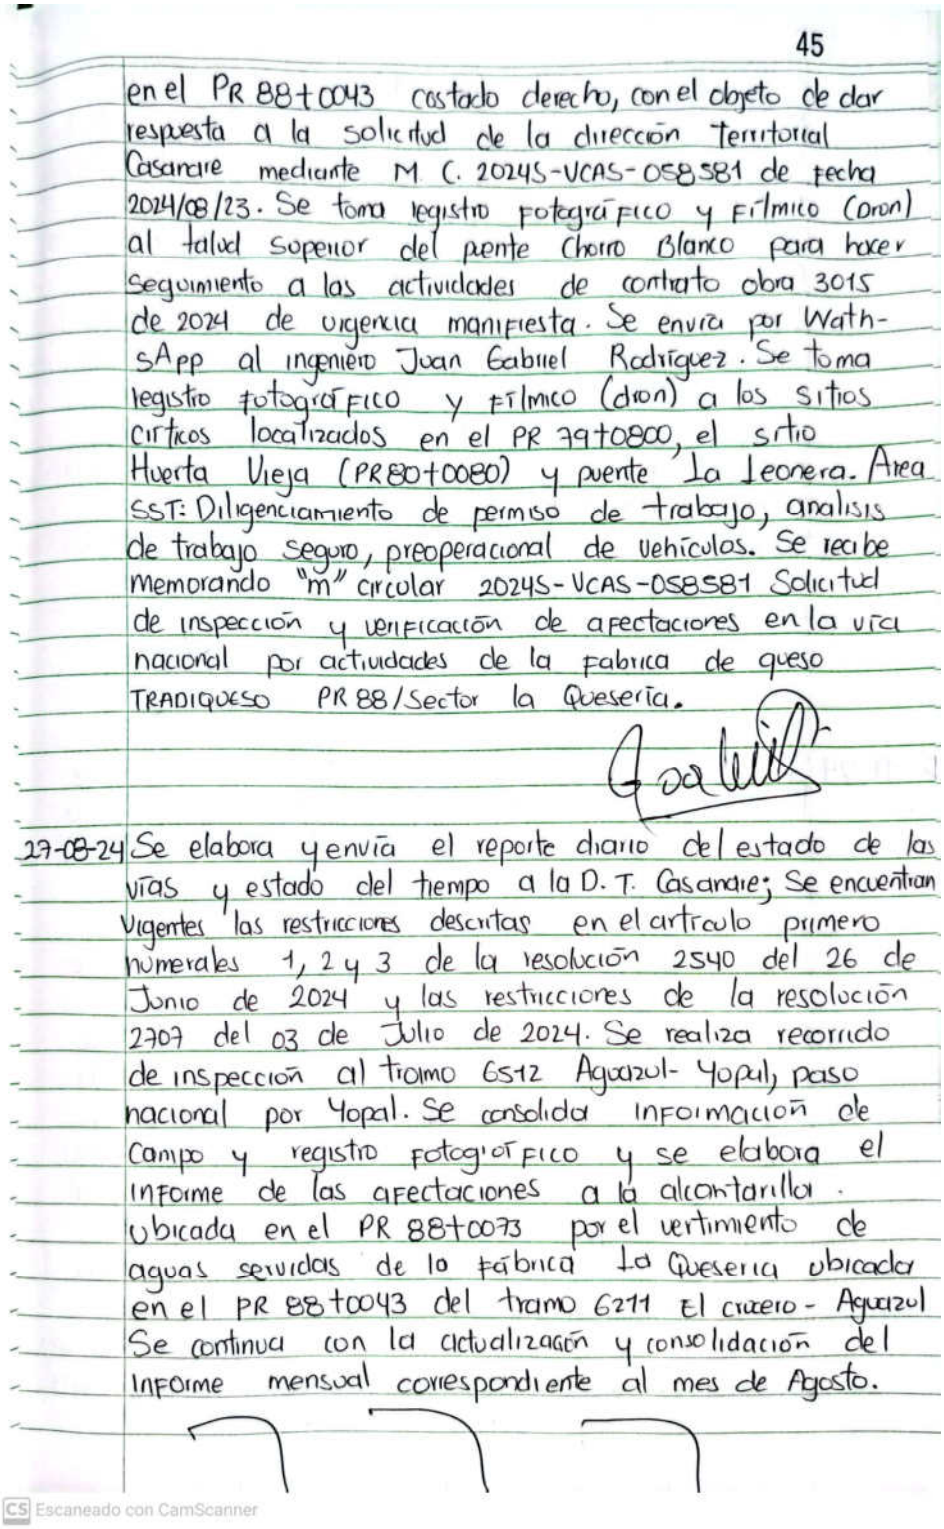

45


en el PR 88+0043 costado derecho, con el objeto de dar respuesta a la solicitud de la dirección Territorial Casanare mediante M C. 2024S-VCAS-058581 de fecha 2024/08/23. Se toma registro fotográfico y fílmico (dron) al talud superior del puente Chorro Blanco para hacer seguimiento a las actividades de contrato obra 3015 de 2024 de urgencia manifiesta. Se envía por Wath-sApp al ingeniero Juan Gabriel Rodríguez. Se toma registro fotográfico y fílmico (dron) a los sitios críticos localizados en el PR 79+0800, el sitio Huerta Vieja (PR80+0080) y puente La Leonera. Area SST: Diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacional de vehículos. Se recibe memorando "m" circular 2024S-VCAS-058581 Solicitud de inspección y verificación de afectaciones en la vía nacional por actividades de la fabrica de queso TRADIQUESO PR 88/Sector la Quesería.

27-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D. T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul- Yopal, paso nacional por Yopal. Se consolida información de Campo y registro fotográfico y se elabora el Informe de las afectaciones a la alcantarilla ubicada en el PR 88+0073 por el vertimiento de aguas servidas de la fábrica La Quesería ubicada en el PR 88+0043 del tramo 6211 El cruzero - Aguazul Se continua con la actualización y consolidación del Informe mensual correspondiente al mes de Agosto.

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

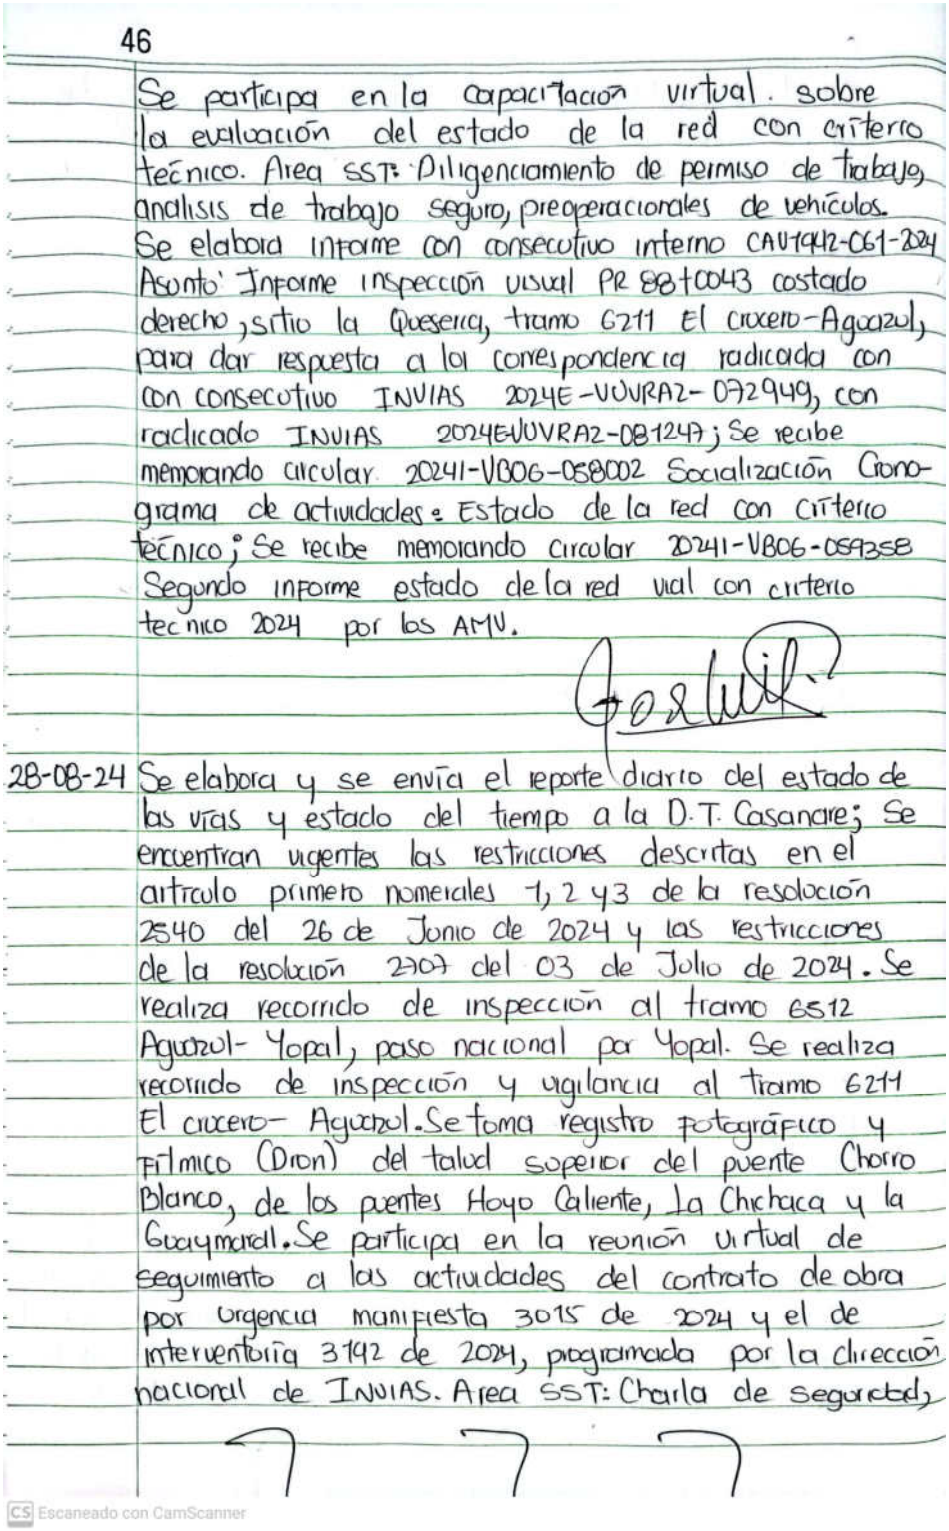

46


Se participa en la capacitación virtual. sobre la evaluación del estado de la red con criterio técnico. Area SST: Diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos. Se elabora informe con consecutivo interno CAU1442-C61-2024 Asunto: Informe inspección visual PR 88+0043 costado derecho, sitio la Quesera, tramo 6211 El crucero-Aguazul, para dar respuesta a la correspondencia radicada con con consecutivo INVIAS 2024E-VUVRA2-072949, con raclicado INVIAS 2024E-VUVRA2-081247; Se recibe memorando circular 20241-VBOG-058002 Socialización Cronograma de actividades: Estado de la red con criterio técnico; Se recibe memorando circular 20241-VBOG-059358 Segundo informe estado de la red vial con criterio tecnico 2024 por los AMV.

28-08-24 Se elabora y se envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero nomerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul- Yopal, paso nacional por Yopal. Se realiza recorrido de inspección y vigilancia al tramo 6211 El crucero- Aguazul. Se toma registro fotográfico y fílmico (Dron) del talud superior del puente Chorro Blanco, de los puentes Hoyo Caliente, La Chichaca y la Guaymaral. Se participa en la reunión virtual de seguimiento a las actividades del contrato de obra por Urgencia manifiesta 3015 de 2024 y el de interventoría 3142 de 2024, programada por la dirección nacional de INVIAS. Area SST: Charla de seguridad,

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

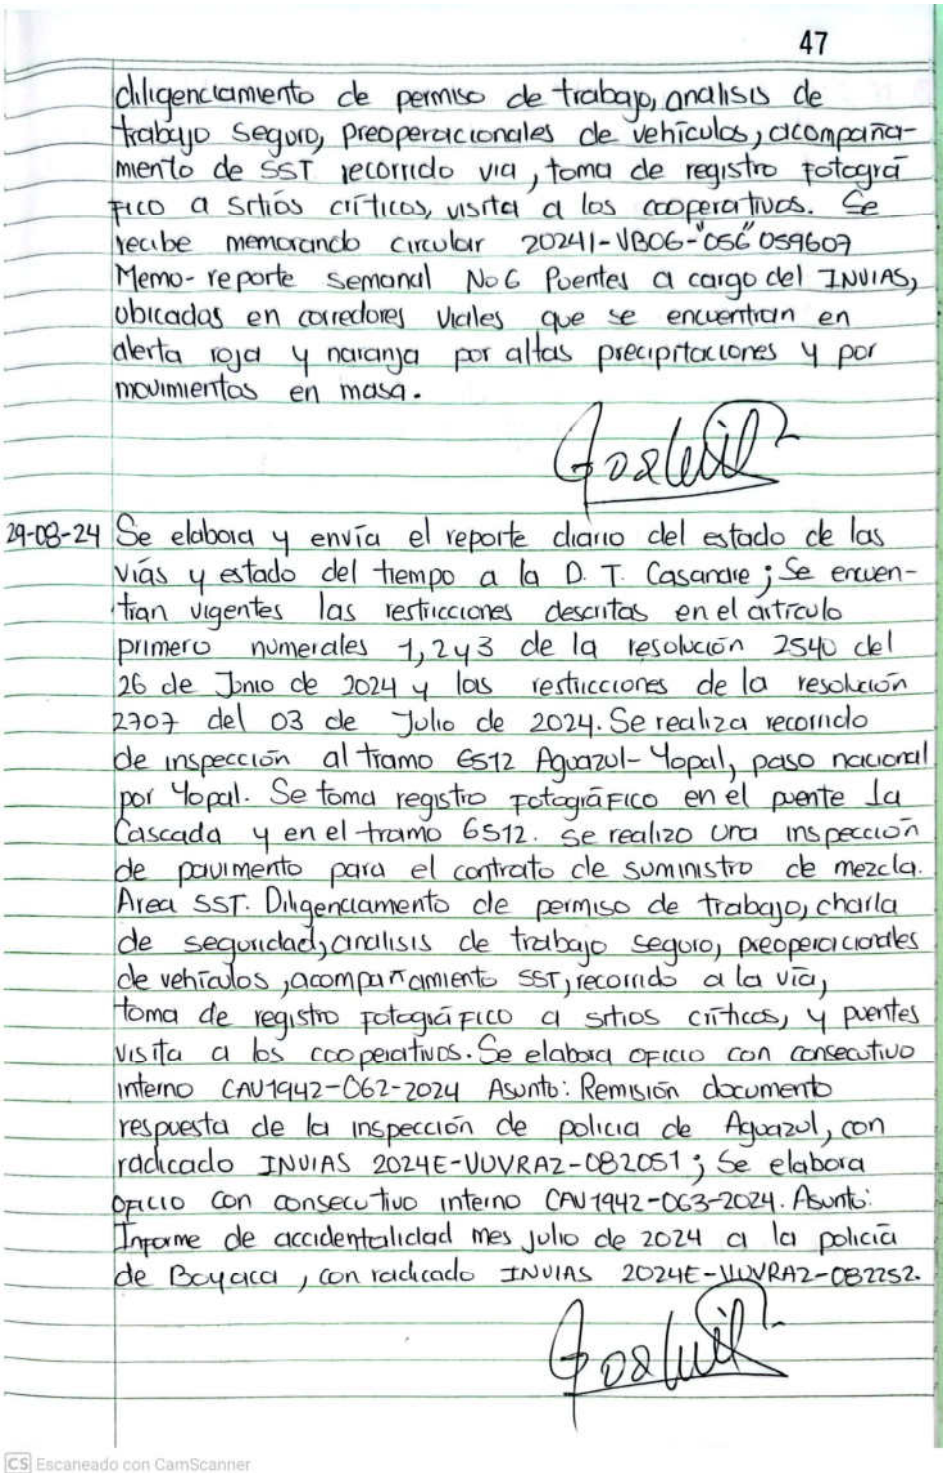


47

diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos, acompañamiento de SST recorrido via, toma de registro fotográfico a sitios críticos, visita a los cooperativos. Se recibe memorando circular 20241-VBOG-056059607 Memo-reporte semanal No 6 Puentes a cargo del INVIAS, ubicadas en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.

29-08-24 Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D. T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul-Yopal, paso nacional por Yopal. Se toma registro fotográfico en el puente la Cascada y en el tramo 6512. se realizo una inspección de pavimento para el contrato de suministro de mezcla. Area SST. Diligenciamento de permiso de trabajo, charla de seguridad, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos, acompañamiento SST, recorrido a la vía, toma de registro fotográfico a sitios críticos, y puentes visita a los cooperativos. Se elabora oficio con consecutivo interno CAV1942-062-2024 Asunto: Remisión documento respuesta de la inspección de policia de Aguazul, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-082051; Se elabora oficio con consecutivo interno CAV1942-063-2024. Asunto: Informe de accidentalidad mes julio de 2024 a la policía de Boyaca, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-082252.

CS Escaneado con CamScanner

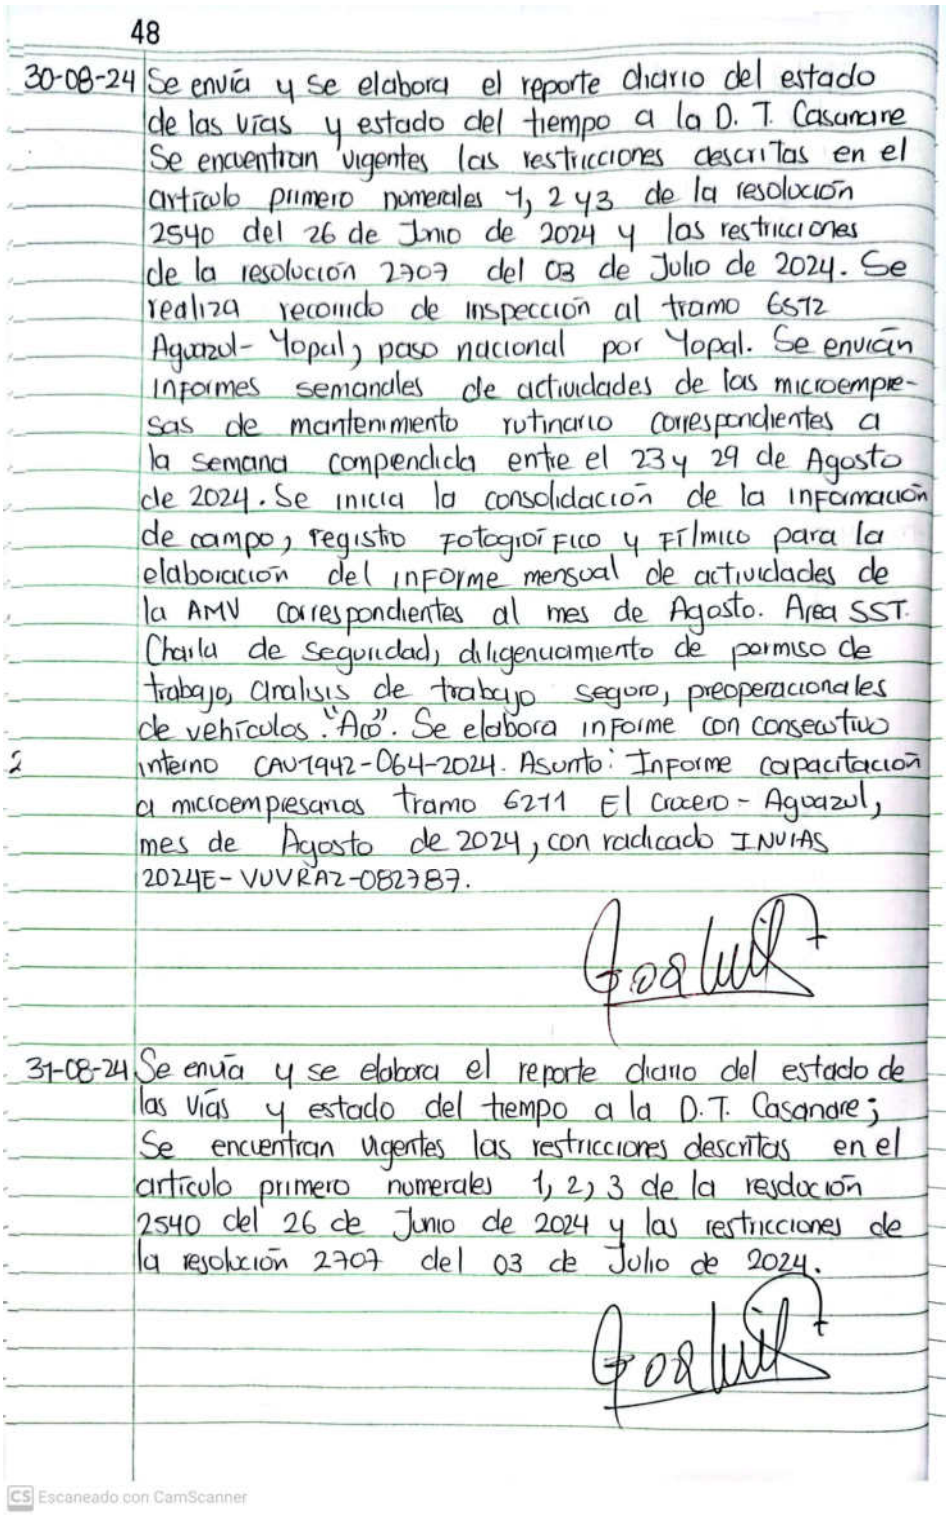

48

30-08-24 Se envía y se elabora el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D. T. Casanare Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2 y 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024. Se realiza recorrido de inspección al tramo 6512 Aguazul - Yopal, paso nacional por Yopal. Se envían informes semanales de actividades de las microempresas de mantenimiento rutinario correspondientes a la semana compendida entre el 23 y 29 de Agosto de 2024. Se inicia la consolidación de la información de campo, registro fotográfico y fílmico para la elaboración del informe mensual de actividades de la AMV correspondientes al mes de Agosto. Area SST. Charla de seguridad, diligenciamiento de permiso de trabajo, analisis de trabajo seguro, preoperacionales de vehículos "Ace". Se elabora informe con consecutivo interno CAV1942-064-2024. Asunto: Informe capacitación a microempresarios tramo 6211 El Crucero - Aguazul, mes de Agosto de 2024, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-082787.

31-08-24 Se envía y se elabora el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la D.T. Casanare; Se encuentran vigentes las restricciones descritas en el artículo primero numerales 1, 2, 3 de la resolución 2540 del 26 de Junio de 2024 y las restricciones de la resolución 2707 del 03 de Julio de 2024.

CS Escaneado con CamScanner

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.


dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

8.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

8.5.1 ESTADO DE SITIOS CRÍTICOS

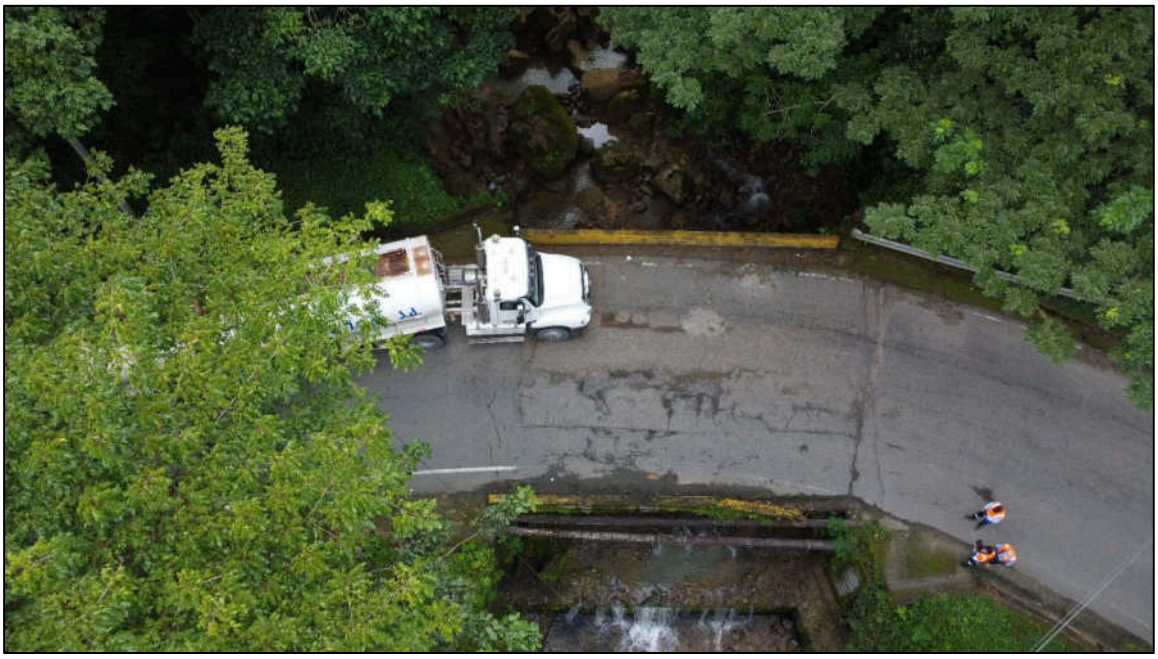

PUENTE LAS LAJAS PR 117+0250



SITIO CRÍTICO PR 116+0415

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031




PR 116+0415



TALUD INESTABLE PR 115+0800

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

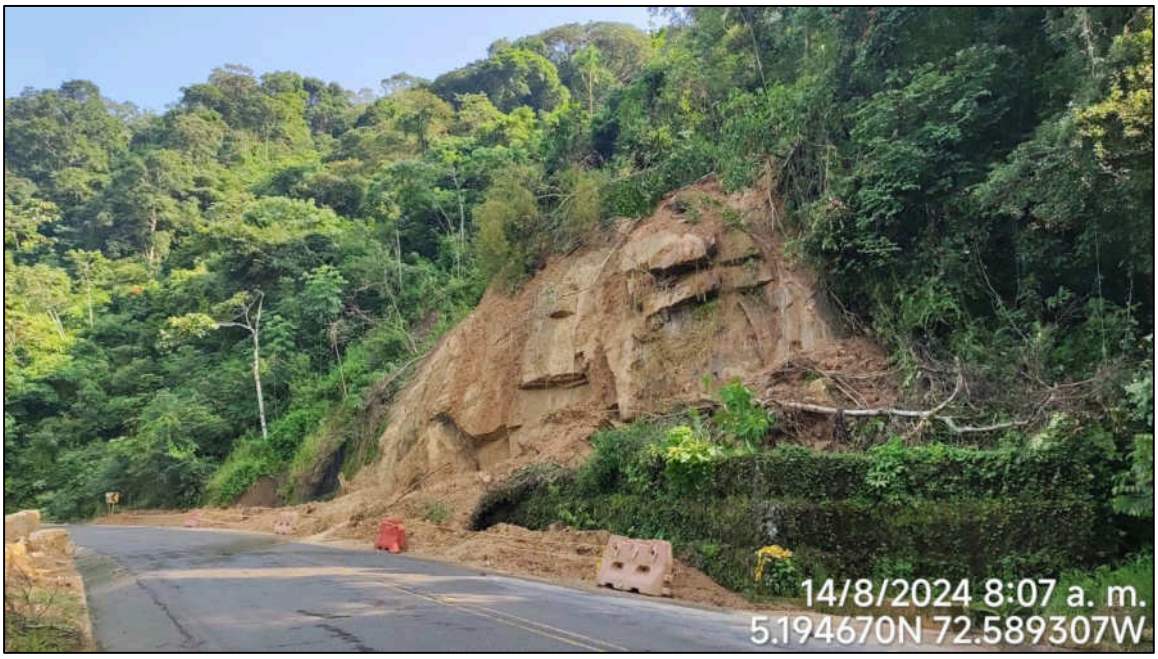

TALUD INESTABLE PR 115+0800




LABORES DE ENROCADO PR 114+0000

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PUENTE LA PALMICHA 112+0591

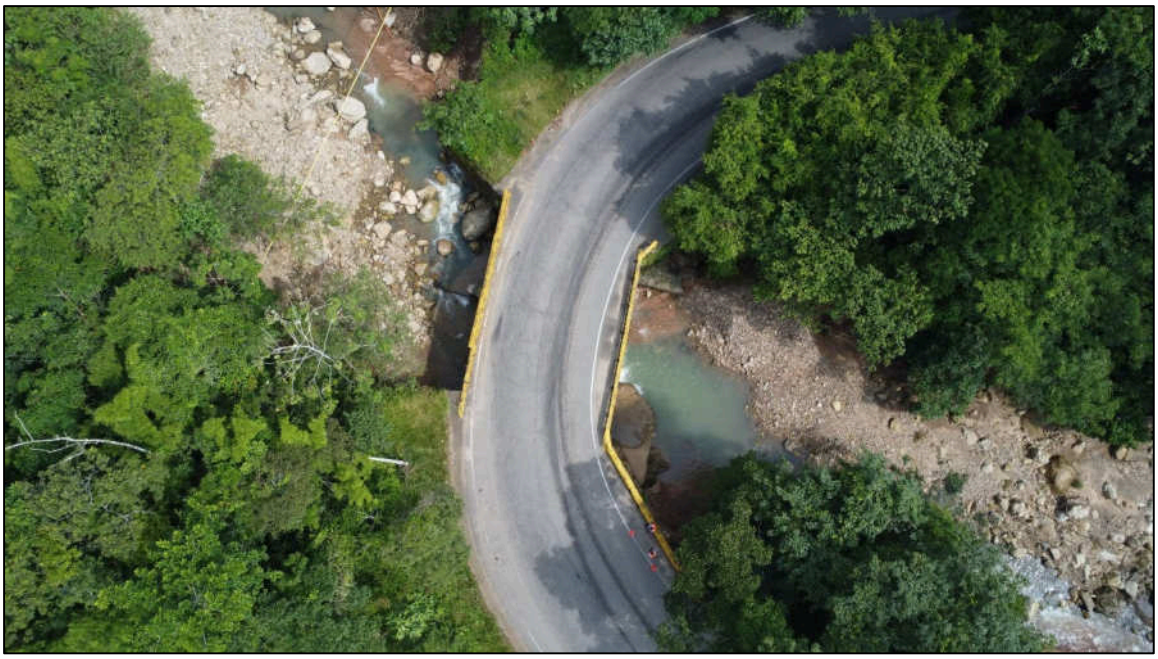

PUENTE LA PALMICHA 112+0591

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PUENTE LA CHICHACA 103+0692



PUENTE LA CHICHACA 103+0692

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



HUNDIMIENTO CALZADA, AFECTACIÓN DE OBRA DE DRENAJE PR 103+0200



FISURAS EN CAPA DE RODADURA PR 97+0790

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



FISURAS EN CAPA DE RODADURA PR 97+0790



PUENTE LA GRANJA PR 87+0300

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PR 87+0000



PR 87+0000

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PUENTE ORQUIDEA



PUENTE ORQUIDEA

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PUENTE LA CHIGÜIRERA PR 85+0536



RENIVELACIÓN PR 85+0000

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



HUNDIMIENTO PR 85+0000



PERDIDA DE BANCA PR 85+0450

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PUENTE QUEBRADA NEGRA PR 84+0052



PUENTE QUEBRADA NEGRA PR 84+0052

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



TALUD INESTABLE PR 83+0600



TALUD INESTABLE PR 83+0600

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



TALUD INESTABLE PR 83+0600



PR 83+0100

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PR 83+0100



PUENTE LA MOLINERA 82+0500 (COLAPSADO)

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PUENTE LA MOLINERA 82+0500 (COLAPSADO)



PUENTE CHORRO BLANCO PR 81+0450

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PUENTE CHORRO BLANCO PR 81+0450



PUENTE CHORRO BLANCO PR 81+0450

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



ESTABILIZACIÓN TALUD PUENTE CHORRO BLANCO PR 81+0450



PUENTE LOS GRILLOS 81+0184

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



MOVIMIENTO EN MASA, AFECTACIÓN JUNTA DE SALIDA PUENTE LA LEONERA PR 80+0120



MOVIMIENTO EN MASA, AFECTACIÓN JUNTA DE SALIDA PUENTE LA LEONERA PR 80+0120

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PÉRDIDA DE BANCA PR 66+0000



PÉRDIDA DE BANCA PR 66+0000

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PUENTE PEÑA DE GALLO 52+0752



PUENTE TOQUILLA PR 42+0313

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PUENTE TOQUILLA PR 42+0313

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

8.5.2 ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN VIAL



CHARLAS DE ORIENTACIÒN MANTENIMIENTO RUTINARIO



ÀREA SST. CHARLAS DE SEGURIDAD



INSPECCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS




ELABORACIÓN INVENTARIO DE RESALTO

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



INSPECCIÒN A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CHARLAS DE ORIENTACIÒN

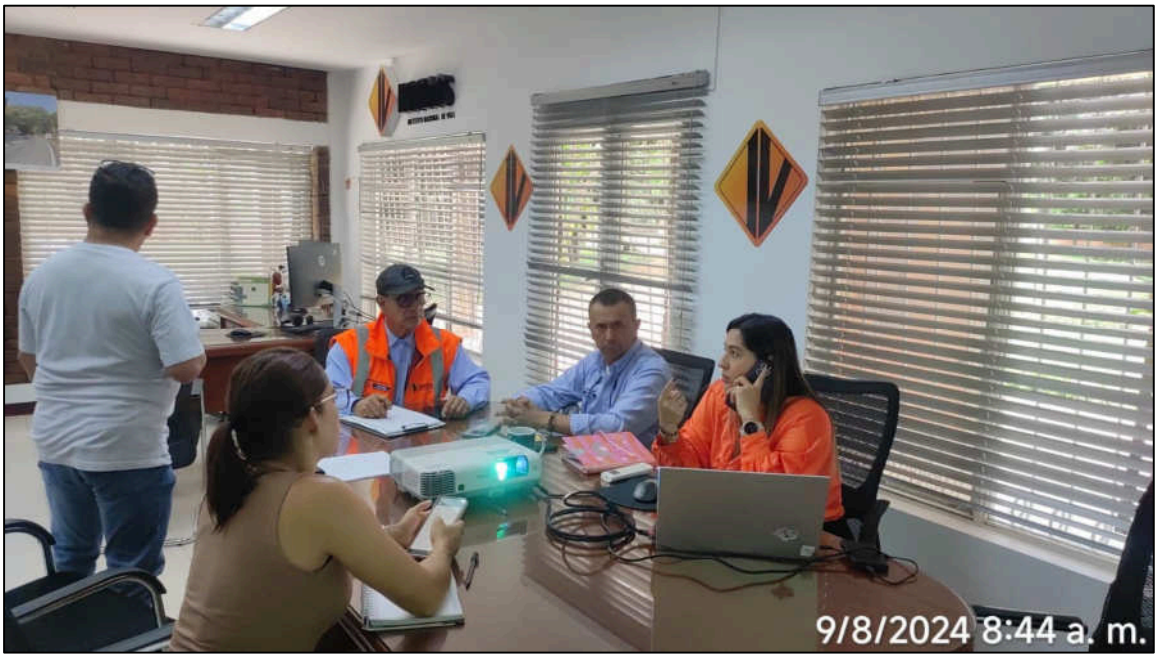

REUNIÓN COORDINACIÓN PERMISO USO DE ZONA DE VÍA

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



REUNIÓN COORDINACION PERMISO USO DE ZONA DE VÍA



ACOMPAÑAMIENTO FUNCIONARIOS SOLICITADO POR LA TERRITORIAL

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



PARTICIPACIÓN REUNIÓN URGENCIA MANIFIESTA EN PAJARITO, BOYACÁ



SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS PR 116+0410

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



INSPECCIÓN DE PUENTES



REUNIÓN INICIAL CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



INSPECCIÓN DE PUENTES



ÀREA SST. CHARLAS DE SEGURIDAD A LAS COOPERATIVAS

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



SEGUIMIENTO AFECTACIÓN PUENTE CHORRO BLANCO

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

8.5.3 CAPACITACIÒN MICROEMPRESARIOS DE MANTNIMIENTO RUTINARIO



CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO




CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

8.5.4 TEMA DE LA CAPACITACIÓN



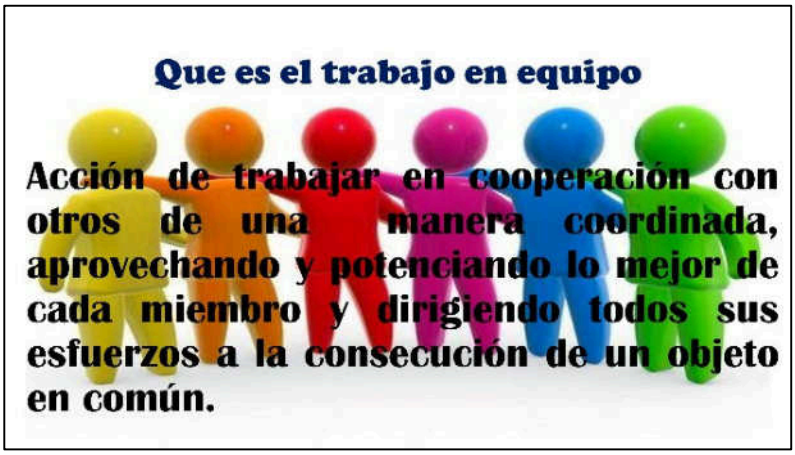




Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



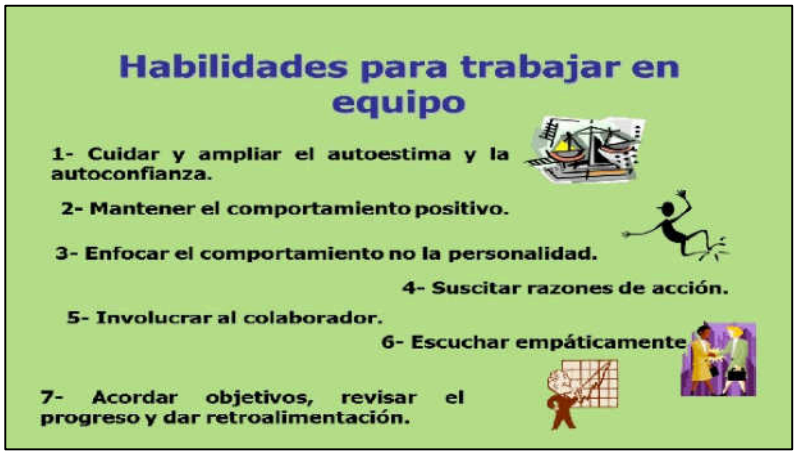



Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031






	Ventajas	Desventajas
Individuos	✓ Trabajo con menos tensión ✓ Responsabilidad compartida para solucionar problemas ✓ Participe del trabajo bien hecho ✓ Comparten incentivos y reconocimiento ✓ Influencia a los demás ✓ Trabajo e información con más claridad ✓ Aceptación de las decisiones grupales ✓ Más participación de opiniones ✓ Integración	➢ Conflictos al tener que interrelacionarse con otros ➢ Diluye responsabilidades al tomar al equipo como escudo frente a resultados negativos. ➢ Problemas de comunicación y falta de asertividad ➢ Agresividad (ironía, desprecio, acoso laboral, indiferencia). ➢ Deserción, aislamiento ➢ División, exceso de llamados de atención.



Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN
COOPERATIVA LA LIBERTAD

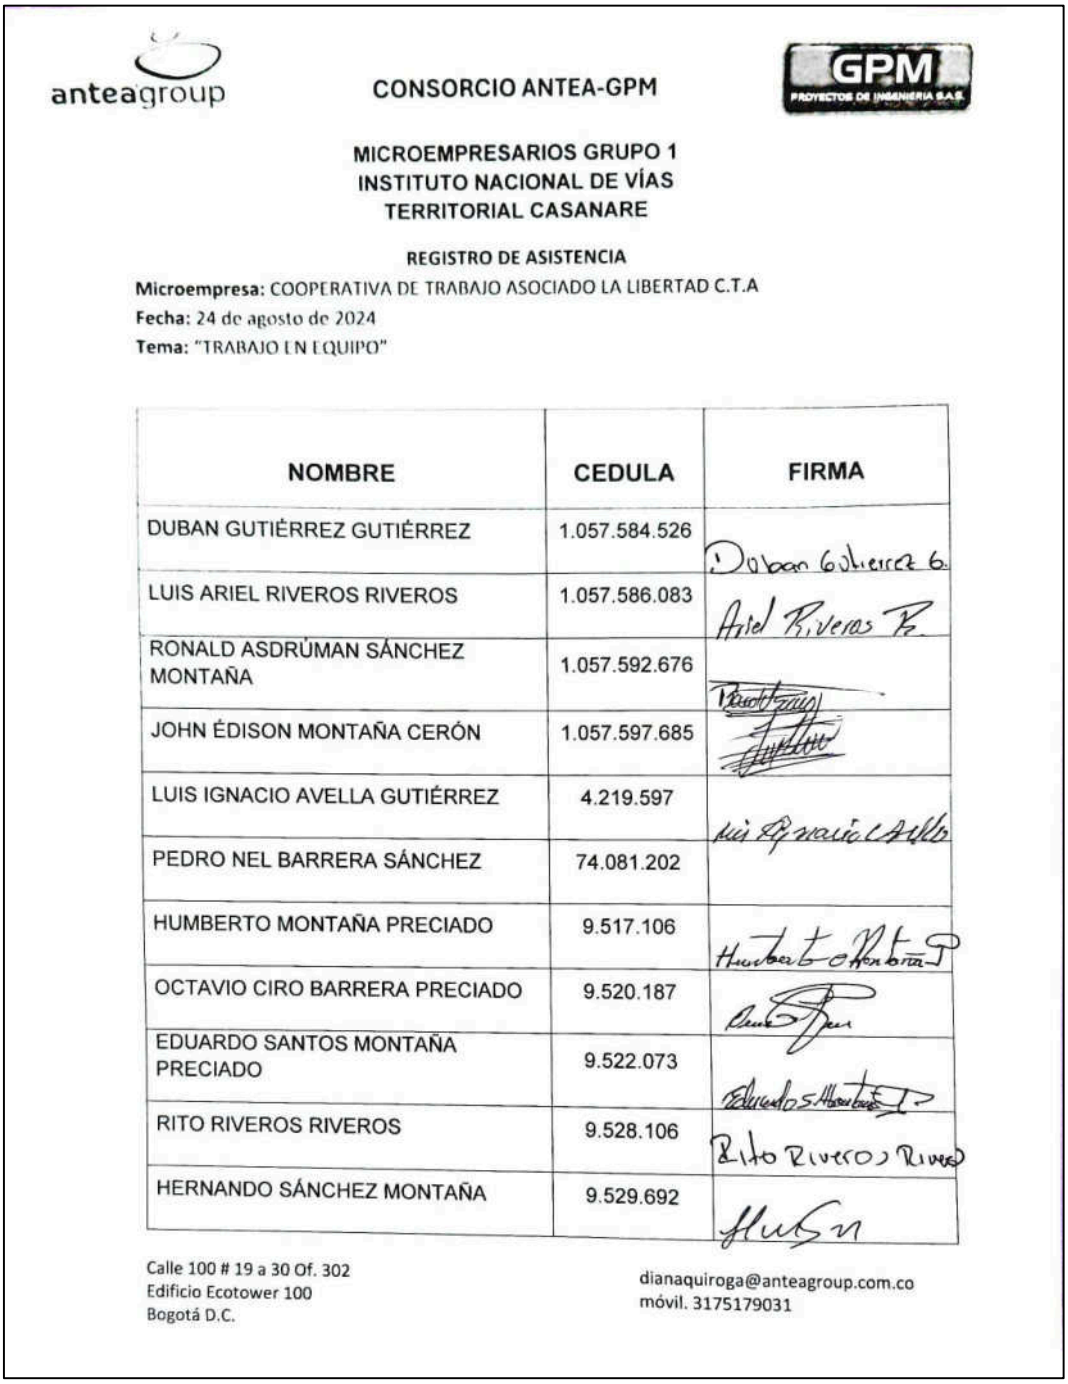

CONSORCIO ANTEA-GPM

MICROEMPRESARIOS GRUPO 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CASANARE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Microempresa: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A
Fecha: 24 de agosto de 2024
Tema: "TRABAJO EN EQUIPO"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
DUBAN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ	1.057.584.526	
LUIS ARIEL RIVEROS RIVEROS	1.057.586.083	
RONALD ASDRÚMAN SÁNCHEZ MONTAÑA	1.057.592.676	
JOHN ÉDISON MONTAÑA CERÓN	1.057.597.685	
LUIS IGNACIO AVELLA GUTIÉRREZ	4.219.597	
PEDRO NEL BARRERA SÁNCHEZ	74.081.202	
HUMBERTO MONTAÑA PRECIADO	9.517.106	
OCTAVIO CIRO BARRERA PRECIADO	9.520.187	
EDUARDO SANTOS MONTAÑA PRECIADO	9.522.073	
RITO RIVEROS RIVEROS	9.528.106	
HERNANDO SÁNCHEZ MONTAÑA	9.529.692	

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

CONSORCIO ANTEA-GPM

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
EDGAR CERÓN MONTAÑA	74.081.797	
JULIO EMIRO PRECIADO CHAPARRO	74.182.186	
ÉDGAR GILBERTO PÉREZ CERÓN	74.184.039	
MAURICIO BELTRÁN FONSECA	74.814.971	

Vo. Bo _____

LUIS FRANCISCO ROA

Ingeniero Residente A. M. V. G 1

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

CONTROL DE ASISTENCIA
COOPERATIVA PUERTA DEL LLANO

CONSORCIO ANTEA-GPM

MICROEMPRESARIOS GRUPO 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CASANARE

REGISTRO DE ASISTENCIA LABORAL

Microempresa: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO
Fecha: 24 de agosto de 2024
Tema: "TRABAJO EN EQUIPO"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
IVÁN ANDRÉS CÁRDENAS ROJAS	1.002.603.313	
ALARCÓN GUTIÉRREZ EDWARD DAVID	1.057.582.587	
CÁRDENAS SÁNCHEZ JORGE ELIÉCER	1.116.545.201	
ROJAS SANABRIA WILSON ALEJANDRO	1.118.536.145	
ROJAS VELANDIA JOSÉ RODRIGO	3.276.882	
RODRÍGUEZ VEGA MANUEL FAUSTINO	4.193.454	
CHAPARRO CÁRDENAS HENRY CALIXTO	4.193.863	
NAVA RODRÍGUEZ JOSÉ RAÚL	74.182.056	
ROJAS ROJAS ROLFE ELIECER	74.343.299	
ESPINEL FONSECA RÓBER ENRIQUE	74.755.084	
VIVAS ÁVILA MANUEL ANTONIO	79.566.134	

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

CONSORCIO ANTEA-GPM

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ALARCÓN CASTILLO JOSE ESPÍRITU	9.534.743	
CÁRDENAS HOLGUÍN PRECILIANO	9.659.281	
GOMEZ ARIZA JUAN DAVID	1.116.550.990	
JHON FERNANDO ROJAS FLORÉZ	1.116.544.739	JHon F Rojas

Vo. Bo _____

LUIS FRANCISCO ROA

Ingeniero Residente A. M. V. G 1

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031
