INFORME MENSUAL N°5

CONVENIO No. 3981 DE 2023: "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total".

PERIODO: Mayo de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4870 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, Junio de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información Contrato de obra. 7
3.1 Información General del Contrato 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 7
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA....8
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8
4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 8
4.10 Otros documentos seguimiento mensual: 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas 10
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 10
5.5 Información otros programas y aplicativo 10
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 10
6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 10
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 10
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 10
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 10
6.7 Otros documentos seguimiento mensual 10
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11
8. ANEXOS 12

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 12
8.2. Registro fotográfico 12
8.3. Bitácora del mes correspondiente: 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Anexo 5 Estado General del Tiempo

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo 8 Programa de Inversiones

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total surgió en septiembre de 2022 como una iniciativa con vocación de convertirse en un programa de inversión de alta prioridad dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, dentro del componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional.

Este programa es un vehículo para activar la participación comunitaria en todo el territorio nacional, jalonando el desarrollo local y así aportar en el propósito de encontrar la justicia social, ambiental y económica de los colombianos de la ruralidad. El desafío para el gobierno del cambio es intervenir 33.102 km de vías regionales y caminos ancestrales con una inversión estimada de $8 billones para su mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación.

A través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total se avanza en el objetivo de mejorar el tránsito por las vías terciarias del país. Es así como gracias a la firma de estos nuevos convenios solidarios en esta zona del departamento de Bolívar que benefician a comunidades del sur de Bolívar, se invertirán en kilómetros de vías terciarias para su mejoramiento y mantenimiento.

Las intervenciones en estos caminos veredales y comunitarios se basan en mejoramientos de vías mediante construcción de placa huella, mantenimiento rutinario de obras de drenaje y construcción de elementos de estabilización de taludes, entre otros.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Arenal del departamento de Bolívar, en el Corregimiento de Carnizala, teniendo como punto de referencia inicial en la coordenada 8°27'19.11"N 73°54'11.75"O y punto de referencia final en la coordenada 8°27'50.06"N 73°53'15.45"O de la vía Colegio Caño grande, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Ocaña del INVIAS.

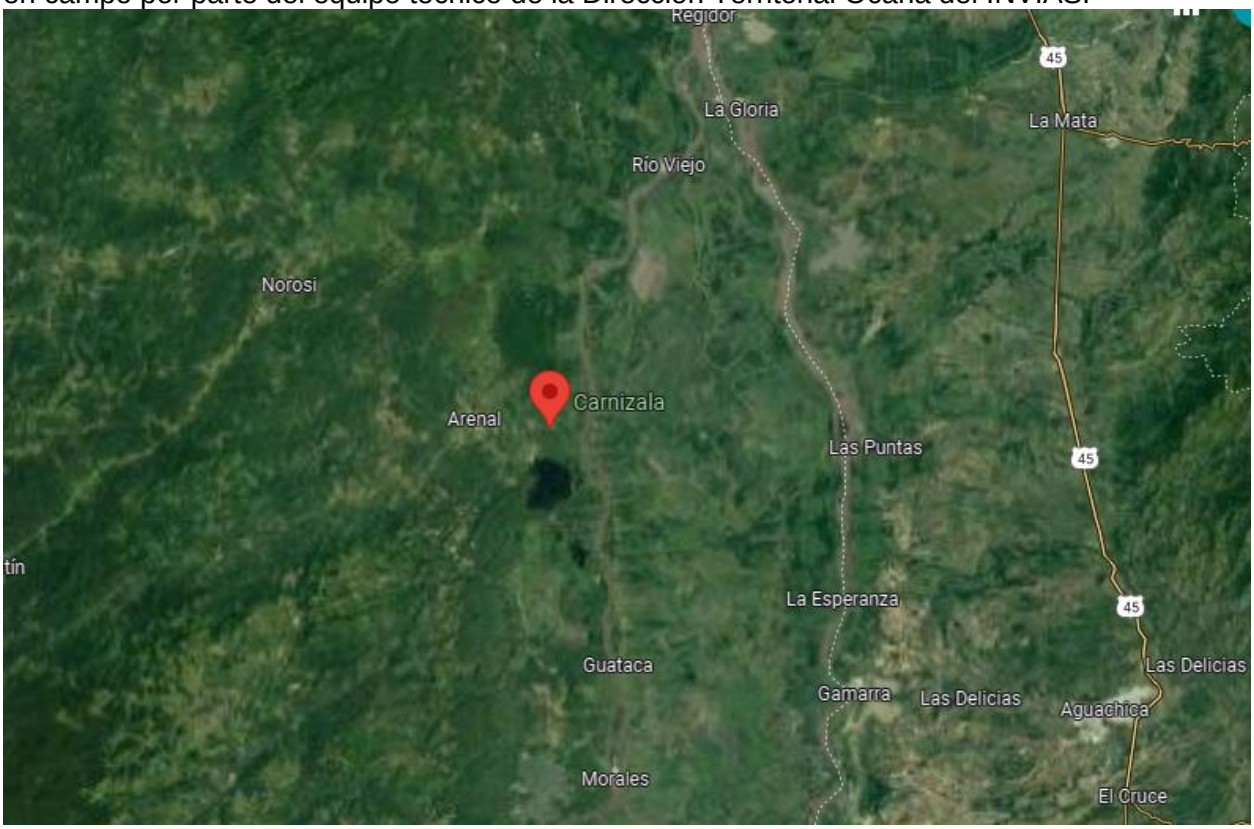


Figura 1. Localización de corregimiento Carnizala

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.


El proyecto objeto del convenio de referencia, se ejecuta en el corregimiento de Carnizala zona rural del municipio de Arenal, Bolívar, beneficia la población de este corregimiento directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El paso de la vía de acceso al municipio, vía con código 13042_2059, se encuentra en carpeta asfáltica, la JAC en cabeza de su presidente requieren que esta sea intervenida con un mejoramiento en placa huella.

El corredor vial a intervenir se encuentra esta es una vía terciara que requiere intervención, mantenimiento, por otro lado, mediante los ajustes a estudios y diseños se descartó realizar la

estabilización de algunos sitios críticos mediante la construcción de una alcantarilla sencilla de 36”.

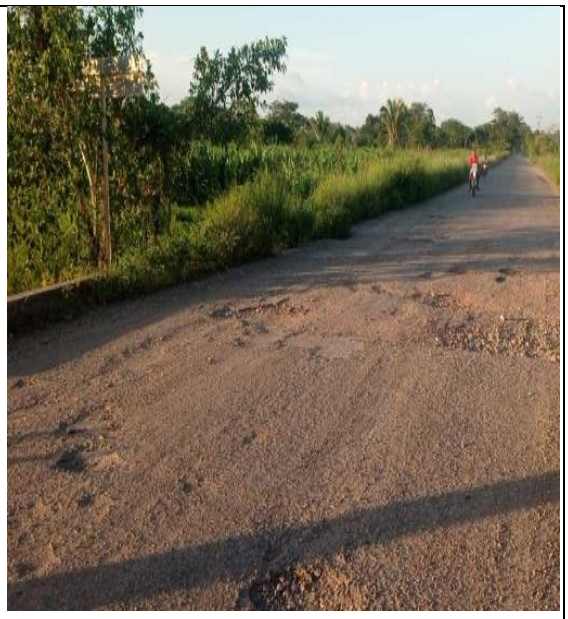	
Situación inicial 13-07-2023	Situación inicial 13-07-2023

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella.

El presento convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir, posterior al desarrollo de los ajustes a estudios y diseños, se determina llevar a cabo la construcción de 168 ml de placa huella, eliminando según el estudio y análisis hidrológico, la construcción de una alcantarilla sencilla de 36 “ y se conserva llevar a cabo el mantenimiento rutinario de tres (3) alcantarillas ya existentes.

3. Información Contrato de obra.

3.1 Información General del Contrato

CONTRATO No.	3981 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JAC del corregimiento de Carnizala
FECHA DE INICIACIÓN	15/12/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	0.5 MESES
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/04/2024
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30/06/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/06/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 201.556.351 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 201.556.351 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

El avance de obra no se ve reflejado en este periodo de informe ya que las condiciones climáticas de la zona y del corregimiento no permiten la ejecución física de la obra debido a las fuertes e intensas lluvias que se presentan en la zona el sitio de ejecución para la construcción de la placa huella se ha visto altamente afectado por estas lluvias lo que impides labores de maquinaria y el ingreso de personal para trabajar.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Durante el periodo evaluado el contrato de obra se lleva a cabo la revisión y seguimiento de las actividades realizadas en obra, el contratista inicia el estudio de mercado para seleccionar proveedores de materiales de obra, en ese proceso se estima unas cantidades y se fijan y se acuerdan de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de obra establecido con los ajustes a estudios y diseños.

Por su parte la interventoría realiza gestión documental y seguimiento y control a cada una de las actividades que se vayan llevando a cabo, de igual manera solicita de manera inmediata la reprogramación de obra acorde al componente presupuestal, la cual es revisada y aprobada por la interventoría.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.10 Otros documentos seguimiento mensual:

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4870 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	EUDOMAR PAEZ TORRADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0,5) MESES.
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2	UN (1) MES
PRÓRROGA 2	QUINCE (15) DÍAS
SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	15/06/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 96.091.300,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 19.908.700,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Acompañamiento en los procesos de gestión documental del proyecto mediante socialización para aclarar los parámetros que se deben tener en cuenta para dar inicio en la ejecución del convenio solidario. Envío de oficios de correspondencia para mantener bajo cumplimiento a la junta de aquellos aspectos necesarios para darle una buena ejecución al convenio solidario.

- Elaboración de informes semanales como seguimiento y control a las actividades desarrolladas por la junta, de esta manera se controla el cumplimiento de la junta en cuanto a la ejecución del convenio solidario.
- Apoyo en generación de cuentas de cobro, aclaración de información tributaria, financiera y contable. Revisión y aprobación parcial de los ajustes a estudios y diseños y de la programación de obra suministrada por la junta.
- Realizar la interventoría integral en los términos que se indique en el manual de interventoría vigente de la Entidad, al convenio N°3981 del 2023, garantizando que se dé correcto cumplimiento al objeto del contrato.

5.3 Informes especialistas
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5(Anexo 12)

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 13)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 15)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 16)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

- Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

- Seguimiento al Plan de Cargas

No Aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La interventoría ha brindado acompañamiento a la junta desde la orden de inicio de actividades en todos los procesos y actividades iniciales a la ejecución del convenio con el fin de brindar apoyo para pronto inicio de actividades de obra
- Se debe estudiar la probabilidad de suspensión del convenio debido a las fuertes lluvias que se presentan en la zona.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3981 **Contratista:** JAC del corregimiento de Carnizala

Contrato de Interventoría No. 4870 del 2023 **Interventoría:** Ingenius Solutions S.A.S

Objeto Contrato de Obra: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** Mayo de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	16
1	**INTRODUCCION**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		8
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		9
3.1	Información general del contrato		9
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		9
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		9
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		10
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		10
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	31
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	20
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	22
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	27
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	29
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	31
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		11
5.1	Información general del contrato		11
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		11
5.3	Informes especialistas y profesionales		12
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		12
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		12
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	45
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	47
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	49
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	51
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		13
8	**Anexos**		15
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		54
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		56
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		58

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaime Fernandez

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXOS

Anexo 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 05/06/2024

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña
PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CONVENIO No.: 3981
OBJETO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
CONTRATISTA: Junta de accion comunal del corregimiento de Carnizala Arenal

PLAZO INICIAL: 0,5 meses
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30/06/2024

VALOR INICIAL : $ 201.556.351,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.556.351,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4870 del 2023
INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	168
Estructuras	Alcantarillas	Und	
	Muro de Contención	Ml	
Mantenimiento		Ml	21
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	0	
Estructuras	Alcantarillas	Und	1	
	Muro de Contención	Ml	0	
Mantenimiento		Ml	0	
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.571.427,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.517.143,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.467.781,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.556.351,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 26.696.210,00	$ 26.696.210,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.593.000,00	$ 16.783.268,00
VALOR EJECUTADO		

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 94.777.787,79
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 26.696.210,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 17,73%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **19**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DEL 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal

CONTRATO No. 3981 **CONTRATISTA:** JAC del corregimiento de Carnizala

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023 **INTERVENTORÍA:** Ingenius Solutions S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Edinson Orozco Olivero
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-239908

Firma
Nombre: Alejandra Villegas Amaya
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0665951 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	05/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONVENIO No: 3981

CONTRATISTA: Junta de accion comunal corregimiento de carnizala Arenal

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DEL 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Comfenalco Cartagena

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MUÑOZ PEÑA HEINER	1007688338	OFICIAL DE OBRA	$ 1,950,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC CARNIZALA	9	$ 135,800	V	NUEVA EPS	77605717	$ 243,800	PORVENIR	77605717	$ 312,000	$ 78,000	$ 39,000	$ 58,500	
2	HERNANDEZ CAMPOS GESEN ANDRES	1,048,554,582	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC CARNIZALA	9	$ 90,500	V	NUEVA EPS S.A. MOV	77605717	$ 162,500	PORVENIR	77605717	$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	
3	ZAYAS CAMPO KEVIS ALFONSO	1048557280	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC CARNIZALA	9	$ 90,500	V	EPS SURA	77605717	$ 162,500	PORVENIR	77605717	$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	
4	ZAYAS CAMPO RICARDO	1048557591	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC CARNIZALA	9	$ 90,500	V	NUEVA EPS S.A. MOV	77605717	$ 162,500	PORVENIR	77605717	$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	
5	SAAVEDRA ZAYAS JEFERSON FABIAN	1096190024	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC CARNIZALA	9	$ 63,400	V	NUEVA EPS S.A. MOV	77605717	$ 113,800	PORVENIR	77605717	$ 145,600	$ 36,400	$ 18,200	$ 27,300	
6	ATUESTA PIMIENTA ISRAEL	73021236	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC CARNIZALA	9	$ 90,500	V	NUEVA EPS S.A. MOV	77605717	$ 162,500	PORVENIR	77605717	$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	
7	MUÑOZ PEÑA LUIS CARLOS	73021684	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC CARNIZALA	9	$ 90,500	V	NUEVA EPS S.A. MOV	77605717	$ 162,500	PORVENIR	77605717	$ 208,000	$ 52,000	$ 26,000	$ 39,000	
8	AYALA AMAYA JOSE LUIS	9693752	MAESTRO DE OBRA	$ 2,320,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC CARNIZALA	9	$ 161,500	V	NUEVA EPS S.A. MOV	77605717	$ 290,000	PORVENIR	77605717	$ 371,200	$ 92,800	$ 46,400	$ 69,600	
9	LOBO CAMPO OCTAVIO	1002256570	AYUDANTE DE OBRA	$ 390,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC CARNIZALA	9	$ 27,200	V	NUEVA EPS	77605717	$ 48,800	PORVENIR	77605717	$ 62,400	$ 15,600	$ 7,800	$ 11,700	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/06/2024

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: Edinson Orozco Olivero
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-239908

Firma

Nombre: Eudomar Páez Torrado
Director de Interventoría:
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 05/06/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 5

UNIDAD EJECUTORA Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3981 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento de Carnizala

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S. **CONTRATO No.** 4870 del 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	15 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 201,556,351.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE REANUDACIÓN:	15 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 201,556,351.00
PLAZO (MESES):	4 meses						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO	30 (Día)	DE	6 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	Yesica Oñate Campo (aux Transporte)			24/05/2024	$ 400,000.00		$ 400,000.00
2	Dulfrides Galeano Peña			25/05/2024	$ 200,000.00		$ 200,000.00
3	Edinson Orozco (residente)			23/05/2024	$ 3,500,000.00		$ 3,500,000.00
4	Yesica Oñate Campo			27/05/2024	$ 1,800,600.00		$ 1,800,600.00
5	Yesica Oñate Campo			26/05/2024	$ 3,721,400.00		$ 3,721,400.00
6	Edinson Orozco (residente)			30/05/2024	$ 3,500,000.00		$ 3,500,000.00
7	Norberto Simon Ruiz Lopez			29/05/2024	$ 2,800,000.00		$ 2,800,000.00
8	Norberto Simon Ruiz Lopez			28/05/2024	$ 300,000.00		$ 300,000.00
9	Norberto Simon Ruiz Lopez			31/05/2024	$ 12,306,600.00		$ 12,306,600.00
				TOTAL	$ 28,528,600.00	$ -	**$ 28,528,600.00**

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 28,528,600	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 148,641,027
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 2,038,751
TOTAL PAGOS	$ 28,528,600	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 150,679,778

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: YESICA P.O.C

Nombre: Yesica Oñate Campo
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:

Nombre: Edinson Orozco Olivero
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 13202-239908

Firma:

Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 05/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** MAYO del 2024

ACTA FINAL □

CONVENIO No : 3981 (Indique número y año)

OBJETO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC del corregimiento de Carnizala (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

PLAZO INICIAL: 0,5 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 201.556.351,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**:

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 201.556.351,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	76,2768017	$ 77.586	$ 5.918.012				$ -	21	$ 1.629.306
			CONSTRUCCION PLACA HUELLA								$ -		$ -
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m^3	16	$ 39.257	$ 628.112				$ -	16	$ 628.112
	320-13		Subbase Granular Clase C	m^3	138	$ 179.697	$ 24.798.186				$ -		$ -
	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m^3	96,8	$ 808.479	$ 78.260.767				$ -		$ -
	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m^3	21,9	$ 541.706	$ 11.863.361				$ -		$ -
	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	4.637,00	$ 7.173	$ 33.261.201				$ -		$ -
			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								$ -		$ -
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m^3		$ 44.409	$ -				$ -		$ -
	600-13		Excavaciones en roca en seco	m^3		$ 78.139	$ -				$ -		$ -
	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	m^3		$ 583.833	$ -				$ -		$ -
	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	m^3		$ 813.869	$ -				$ -		$ -
	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg		$ 7.225	$ -				$ -		$ -
	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	m^3		$ 80.377	$ -				$ -		$ -
	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml		$ 926.437	$ -				$ -		$ -
	610-13		Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	m^3		$ 23.366	$ -				$ -		$ -
													$ -
			SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA				**$ 154.729.640**				$ -		$ 2.257.418
*			PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)				$ 4.546.156						
*			GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 45.471.649				$ 4.593.000		$ 16.783.000
*			**VALOR ESTIMADO CONVENIO**				$ 204.747.445				$ 4.593.000		$ 19.040.418
*													
*													
*													
*			**VALOR TOTAL**										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

FECHA 05/06/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -		$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

VALOR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

En el presente no hubo avance fisico, debido a la ola invernal, y que la interventoria se suspendio desde el 10 de mayo

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: YESICA P.O.C
Nombre:YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
PRESIDENTE JAC

Firma:
Nombre: Edinson Orozco Olivero
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 13202-239908

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5
Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 05/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 3981 **CONTRATISTA:** Junta de accion comunal corregimiento de Carnizala, municipio de Arenal

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DEL 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	20	24	18	17	24	15	22	23	16	18	18	19	24	19	17	22	24	22	21	24	21	18	21	18	24	23	23	22	24	23	648
Lluvias moderadas		1		4	4		2		1	4	4	3	2		2	4	2		2	3		3	3	3	1			1			1	50
Lluvias intensas		3		2	3		7	2		4	2	3	3		3	3							3		5		1		2			46
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se presenta tiempo de sequia prolongada en gran parte del territorio nacional.

Firma
Nombre: Edinson Orozco Olivero
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-239908

Firma
Nombre: Alejandra Villegas Amaya
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0665951 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA 03/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No.: 4788 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Mayo de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ,CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS, MUNICIPIO MORALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado ensayos de laboratorio

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: HUMBETO DE LA HOZ ALVAREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202091-479 NTS

Firma

Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo7

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	5	5	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3981 **CONTRATISTA:** Junta de Accion Comunal corregimineto de Carnizala,Arenal

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.556.351,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.556.351,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.311.271,00	21	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.077.818,00	21	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.466.906,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100294543

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	21	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072672 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.311.271,00	30	4	2024	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.077.818,00	30	4	2024	30	6	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.466.905,30	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100294543

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	21	10	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072672 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informe Semanal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 09/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal,Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 17 02/05/2024 al 08/05/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

168 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 168 m de placa huella en el corregimiento de Carnizala, municipio de Arenal,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC del corregimiento de Carnizala		
CONVENIO No.	3981	VALOR INICIAL:	$ 201,556,351.00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,556,351.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96,091,300.00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19,908,700.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,556,351	$ 201,556,351		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 43,479,478		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,556,351	$ 158,076,873		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116,000,000	$ 116,000,000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 109,768,279		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116,000,000	$ 6,231,721		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,440,933.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 114,335,109.08	76.0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 26,696,210.00	18%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (87,638,899.08)	-58.3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 16,783,268.00	8.3%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ 18,052,911.96	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 127,907,276.72	63.5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 43,479,478.00	21.6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 84,427,798.72	41.9%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,052,911.96	12.0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109,768,279.40	95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 109,768,279.40	95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,115,860.30	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,115,860.30	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 76%

Meta Física Ejecutada %: 18%

Avance o Atraso Físico %: -58%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa Huella	ml	168
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				100.0%
Ejec	1				100.0%
Prog	127.68				76.0%
Ejec	29.81212				17.7%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Corregimiento Carnizala

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Latitud: 8°20'13,61" N	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Longitud:73°43'8,51" O	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

no ha habido significativos debido a las lluvias

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella	76	Programado
	17	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Alejandra Villegas Amaya

Matrícula Profesional No.: 121037-0665951 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12 / 9 / 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1-09 de mayo del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4870 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

CONVENIO No. 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta	AKT AK150 BR 2016 Placa TAW59D	A	A	A	A	A	A	A	A	A																						
MOTOCICLETA	BAJAJ PULSAR NS160 FE 2023 PLACA NRH 45G	A	A	A	A	A	A	A	A	A																						

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10

Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 12 9 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCION TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 DEL 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-09 de mayo del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

NOMBRE ARL: POSITIVA SAS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13.361.189	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 522.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						33%	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	1940000	$ 3.100,0	I	SANITAS	1744032503	$ 23.300,0				$ 23.300,00	$ -	$ -	
2	MONICA ALEJANDRA VILLEGAS AMAYA	1.007.391.647	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 810.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						100%		2700000	$ 56.400,0	V	NUEVA EPS	1744032503	$ 32.400,0	COLPENSIONES	1744032503	$ 129.600,0	$ 32.400,00	$ -	$ -	
3	CONTRERAS JIMENEZ SINDY MARCELA	1.003.257.511	INSPECTORA SST	$ 360.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						100%		1300000	$ 27.200,0	V	NUEVA EPS CM	1744032503	$ 15.600,0	PORVENIR	1744032503	$ 62.400,0	$ 15.600,00			
4	SANTIAGO PEÑA EDWIN	1.007.971.534	INSPECTOR	$ 360.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						100%		1300000	$ 27.200,0	V	NUEVA EPS	1744032503	$ 15.600,0	PROTECCION	1744032503	$ 62.400,0	$ 15.600,00			
5	PEÑARANDA VERGEL YOZEF FARID	1.090.456.303	INSPECTOR	$ 360.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						100%		1300000	$ 27.200,0	V	SANITAS	1744032503	$ 15.600,0	PORVENIR	1744032503	$ 62.400,0	$ 15.600,00			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 2.412.000,00																																										

El Interventor adjunta la certificación de fecha 3/7/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO *
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12 / 9 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4870 DEL 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1-09 de mayo del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$96.091.300,00	$ 19.075.023,60
2023	1398423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	ADICIONAL 1	$19.908.700,00	
			TOTAL			$ 116.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 116.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 96.091.300,00		CONTRATO PRINCIPAL
								1398423 de 19/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ADICIONAL
1	**15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	$ -	$ -	$ -				1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ACTA EN CERO
2	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2024**	$ 7.409.080,00	$ 1.407.725,20	$ 8.816.805,20				1357323 de 11/12/2023	$ 8.816.805,20	$ 107.183.194,80	RADICADO 963 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	**1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**	$ 20.853.040,00	$ 3.962.077,60	$ 24.815.117,60				1357323 de 11/12/2023	$ 33.631.922,80	$ 82.368.077,20	RADICADO 2167 DE FECHA 06 ABRIL 2024	
4	**1 AL 31 DE MARZO DEL 2024**	$ 30.872.400,00	$ 5.865.756,00	$ 36.738.156,00				1357323 de 11/12/2023	$ 70.370.078,80	$ 45.629.921,20	RADICADO 3767 DE FECHA 08 MAYO 2024	
5	**1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**	$ 22.315.040,00	$ 4.239.857,60	$ 26.554.897,60				1357323 de 11/12/2023 1398423 de 19/12/2023	$ 96.091.300,00 $ 96.924.976,40	$ - $ 19.075.023,60	RADICACION 5068 DE FECHA 30 MAYO 2024	
6	**1 AL 09 DE MAYO DEL 2024**	$ 5.731.320,00	$ 1.088.950,80	$ 6.820.270,80				1357323 de 11/12/2023	$ 103.745.247,20	$ 12.254.752,80		PRESENTA ACTA EN TRÁMITE
TOTALES		**$ 87.180.880,00**	**$ 16.564.367,20**	**$ 103.745.247,20**					**$ 103.745.247,20**	**$ 12.254.752,80**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 74.948.880,00	$ 14.240.287,20	$ 89.189.167,20
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 12.232.000,00	$ 2.324.080,00	$ 14.556.080,00
*			
VALOR TOTAL	$ 87.180.880,00	$ 16.564.367,20	$ 103.745.247,20

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius Solutions S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y las organizaciones de acción comunal de los municipios de arenal, Norosi y morales del departamento del Bolívar, en la dirección territorial Ocaña para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaime Fernandez

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	8%	$ 9.609.130,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17%	$ 19.218.260,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	25%	$ 28.827.390,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B–100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.600.000,00	15	1	2024	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.200.000,00	15	1	2024	30	4	2024
Calidad del servicio	30%	$ 34.800.000,00	15	1	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/01/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RELACION DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 10/06/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA	ASUNTO	DESTINO
OFI-4870-2023-100	02-may-24	INVITACION COMITÉ OPERATIVO	GUSTAVO ANDRES PEÑA PIMIENTA
OFI-4870-2023-101	02-may-24	INVITACION COMITÉ OPERATIVO	REINALDOMANRIQUE TERAN
OFI-4870-2023-102	02-may-24	INVITACION COMITÉ OPERATIVO	ROSA ISELLA ROBLES ZAYAS
OFI-4870-2023-103	02-may-24	INVITACION COMITÉ OPERATIVO	NEIVERZAYAS PIMIENTA Presidente veeduria Peñones
OFI-4870-2023-104	06-may-24	Gestión de recursos para el proyecto	GUSTAVO ANDRES PEÑA PIMIENTA
OFI-4870-2023-105	06-may-24	Gestión de recursos para el proyecto	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
OFI-4870-2023-106	06-may-24	Gestión de recursos para el proyecto	JUDIT MONRROY GUERRERO
OFI-4870-2023-107	06-may-24	Gestión de recursos para el proyecto	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
OFI-4870-2023-108	08-may-24	SOLICITUD FACTURACION MATERIAL DE CANTERA	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
OFI-4870-2023-109	08-may-24	Entrega constitucion de veedurias	LAURA CRISTINA ROMERO VELÁSQUEZ
OFI-4870-2023-110	10-may-24	Solicitud de suspensión No. 1 al contrato de interventoría No. 4870 de 2023.	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
OFI-4870-2023-111	15-may-24	REITERACIÓN SOLICITUD FACTURACION MATERIAL DE CANTERA	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
OFI-4870-2023-112	16-may-24	Solicitud suspensión convenio solidario No 3825 - 2023	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
OFI-4870-2023-113	17-may-24	Preocupación Desarrollo Del Convenio solidario No 3967- 2023	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
OFI-4870-2023-114	17-may-24	Concepto Para Emergencia Por Inundación	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
OFI-4870-2023-115	17-may-24	Solicitud entrega exámenes de ingreso y afiliaciones de personal	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
OFI-4870-2023-116	17-may-24	Actualización de Pólizas conforme a la prórroga N°2 del convenio	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
OFI-4870-2023-117	23-may-24	Segunda Reiteración Solicitud Entrega “Informe inversión buen manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, primer requerimiento so pena de incumplimiento.	JUDIT MONRROY GUERRERO
OFI-4870-2023-118	23-may-24	Segunda Reiteración Solicitud Entrega “Informe inversión buen manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, primer requerimiento so pena de incumplimiento.	GUSTAVO ANDRES PEÑA PIMIENTA
OFI-4870-2023-119	23-may-24	Segunda Reiteración Solicitud Entrega “Informe inversión buen manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, primer requerimiento so pena de incumplimiento.	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
OFI-4870-2023-120	27-may-24	Solicitud de adición y prorroga	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
OFI-4870-2023-121	31-may-24	Presunto Incumplimiento Entrega “Informe Inversión Buen Manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, Segundo Requerimiento So Pena De Incumplimiento.	JUDIT MONRROY GUERRERO



Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Anexo 14
Registro fotográfico

Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente
