	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4629 DE 2023 **Contratista:** JAC ÚLTIMO CASO

Contrato de Interventoría No. 4988 DE 2023 **Interventoría:** GER Y PRO S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: GILBERTO ELIAS PÉREZ ARMELLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4988-2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Periodo:

Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2024

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 3
INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVO DEL INFORME 5
1. DATOS GENERALES 6
1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría 6
1.2. Datos del contrato de Interventoría 6
2. ACTIVIDADES DEL PERIODO 7
2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 8
2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra 9
2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 10
2.4. Informes semanales 11
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 12
3.1. Seguimiento Gestión Social 12
3.1. Seguimiento Gestión Ambiental 12
4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO 13
4.1. Relación de pólizas convenio de obra 13
4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría 13
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 15
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado..... 7
Tabla 2-2: Actividades Programadas Mes de diciembre por JAC Vereda Ultimo Caso .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-3. Gastos financieros JAC VEREDA ULTIMO CASO en el convenio 4629 de 2023 9
Tabla 2-4. Relación de avance del Contrato de Obra .**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-5. Informes semanales elaborados por interventoría 11
Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra 13
Tabla 4-3. Póliza según firma del contrato de interventoría..... 14

INTRODUCCIÓN

La entidad INVIAS, en cumplimiento de sus funciones, ejecuta a través del convenio solidario 4629 de 2023, el proyecto, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" así como el contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

El proyecto consta de la construcción de 180 metros lineales de placa huella, así como limpieza manual de una alcantarilla (01) y 0,32 Ha de rocería del corredor a intervenir.

En el presente documento se presenta a detalle el seguimiento realizado a las actividades asociadas al proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el contratista de la JAC de Ultimo Caso en cumplimiento del contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

1. DATOS GENERALES

FECHA:	31/03/2024	**INFORME No.**	**3**

PERIODO No.	3	**DEL**:	01/03/2024	**AL**:	31/03/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR – VEREDA ULTIMO CASO

1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría

CONVENIO SOLIDARIO No.:	4629 DE 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ULTIMO CASO
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	3 MES
VALOR INICIAL:	$ 200.868.525,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

1.2. Datos del contrato de Interventoría

CONTRATO No.:	4988 DE 2023
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	3 MES
VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00
ANTICIPO:	N.A.

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo reportado, no se reporta obra ejecutada, el convenio se encuentra en etapa de ajustes y diseños. tal y como se muestra a continuación:

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Fase de estudios y ajustes de diseño definitivo	Como parte del proceso para la ejecución del convenio solidario, es de vital importancia ajustar los diseños y el presupuesto ya que los presupuestos son de referencias y el diseño se debe ajustar según las condiciones encontradas en campo.
2	Corte y nivelación y compactación de la subrasante, también como la nivelación de los ejes según diseño.	Para iniciar el proceso del material de subbase, es necesario perfilar, mejorar y compactar la subrasante, ya que esta será de apoyo a la capa de subbase, donde reposará la estructura de la placa huella. Todo esto es llevado a cabo según los diseños previamente establecidos.
3	Acarreo de materiales y disposición de maquinaria en campo.	Para llevar a cabo estas actividades se debe acarear el material seleccionado hasta el sitio del proyecto, del mismo modo contar con las maquinarias necesarias para llevar a cabo dichas actividades.
4	Corte y figurado de acero (Armado de vigas Riostras y las parrillas)	Para llevar a cabo el proceso de fundición del concreto de 21 MPA, es necesario contar con el armado y figurado del acero. Todo esto según los diseños establecidos.

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Previa suscripción del acta de inicio, esta interventoría recomendó la elaboración del cronograma de actividades de obra de acuerdo con el ajuste presupuestal para conocer el alcance final del convenio y posteriormente dar inicio a las labores programadas. realizado y aprobado, una vez surtida la fase de estudios y diseños. A finales del periodo se revisó y aprobó dicha programación, la cual será la herramienta de seguimiento a emplear.

2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra

Durante el periodo reportado, la Junta de acción comunal de la estación de candelaria ha presentado movimientos bancarios, movimientos que se verán consignados en la siguiente tabla.

Tabla 2-2. Gastos financieros JAC VEREDA ULTIMO CASO en el convenio 4629 de 2023

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) /PERSONAL	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	MARIA ANGELICA DÍAZ RAMOS	$ 3.360.000,00		$ 3.360.000,00
2	ELSA PATRICIA GOMEZ RIVERA	$ 2.688.000,00		$ 2.688.000,00
3	WILMAN RAFAEL CAMPO RODRÍGUEZ	$ 400.000,00		$ 400.000,00
4	SERVICIOS BOSCONIA SAS	$ 470.000,00		$ 470.000,00
5	CLEMENTE ANDRÉS CUADRO ESCOBAR	$ 2.138.118,00		$ 2.138.118,00
6	OSCAR ALBERTO LÓPEZ NUÑEZ	$ 4.830.000,00		$ 4.830.000,00
7	LUIS RAFAEL ALARCON PANTOJA	$ 2.162.000,00		$ 2.162.000,00
8	MARJORIE LISETTE GARCÍA MENDOZA	$ 1.024.600,00		$ 1.024.600,00
9	FERROTODO JT Y/O JUAN CARLOS ARGUELLES MEDINA	$ 14.036.344,00		$ 14.036.344,00
10	FERROTODO JT Y/O JUAN CARLOS ARGUELLES MEDINA	$ 14.550.266,00		$ 14.550.266,00
11	AGREGADOS DEL CHAMPAN SAS	$ 27.375.287,00		$ 27.375.287,00
12	WILMAN RAFAEL CAMPO RODRÍGUEZ	$ 300.000,00		$ 300.000,00
13	INDIRA JANETH VIZCAINO GUTIERREZ	$ 336.000,00		$ 336.000,00
14	INDIRA JANETH VIZCAINO GUTIERREZ	$ 345.259,00		$ 345.259,00
TOTAL EJECUTADO				**$ 76.192.758,00**

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, el avance de la interventoría se encuentra condicionado al avance del contrato de obra. A la fecha la interventoría no presenta factura de cobro.

Tabla 2-5. Relación de avance financiero contrato de interventoría

No	Concepto	Total dedicación recurso (Hombre-mes)	Valor Total	Dedicación Recurso utilizado (Hombre-mes)	Valor	Dedicación recurso utilizado ACUMULADO (Hombre-mes)	VALOR ACUMULADO
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director de interventoría	0,4					
2	Ingeniero Residente	2,00					
3	Profesional Ambiental	0,2					
4	Profesional Social	0,2					
5	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS						
	PERSONAL TECNICO						
6	Inspector	1,0					
7	Inspector SST	1,0					
				SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
				FACTOR MULTIPLICADOR			
				TOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	Viáticos Director y/o Especialistas	5					
9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	7					
10	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	1,5					
11	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	3					

12	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	3					
13	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2					
14	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	3					
15	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	3					
16	Veeduría Técnica Comunitaria	3					
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS			
				IVA 19%			
				COSTO TOTAL			

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.4. Informes semanales

Durante el periodo reportado se construyeron 04 informes semanales tal como se indican en la tabla a continuación:

Tabla 2-3. Informes semanales elaborados por interventoría

Informes	Periodo
Informe semanal No. 11	Del 4 Marzo al 10 de Marzo de 2024
Informe semanal No. 12	Del 11 Marzo al 17 de Marzo de 2024
Informe semanal No. 13	Del 18 Marzo al 24 de Marzo de 2024
Informe semanal No. 14	Del 25 Marzo al 31 de marzo de 2024

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

3.1. Seguimiento Gestión Social

Por parte del profesional social, esta interventoría ha realizado visitas y actas de socialización con la comunidad beneficiada del proyecto a ejecutar.

3.1. Seguimiento Gestión Ambiental

Esta interventoría solicitó al contratista la elaboración del PAGA de acuerdo con el Manual De Interventoría Obra Pública del 2022, Instructivo Para El Seguimiento De La Gestión Ambiental.

4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO

4.1. Relación de pólizas convenio de obra

La Garantía que ampara el contrato de obra es la Póliza No. CRC - 100015960 Expedida por la Aseguradora Seguros mundial., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio del mismo):

Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra

Póliza No.	**CRC - 100015960**	
Aseguradora:	**Seguros mundial**	
Fecha de Expedición:	**28/11/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	Desde 24/11/2023 hasta 31/10/2024	$ 40.173.705,00
Prestaciones sociales	Desde 24/11/2023 hasta 31/12/2026	$ 10.043.426,25
Estabilidad de la obra	Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028	$ 60.260.557,50

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 1 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de las mismas.

4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría

La Garantía que ampara el contrato de interventoría es la Póliza No. 47-44-101025771, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio de este:

Tabla 4-2. Póliza según firma del contrato de interventoría

Póliza No.	**47-44-101025771**	
Aseguradora:	**Seguros del estado S.A**	
echa de Expedición:	**29/12/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	14/12/2023 a 30/10/2024	$10.342.875.60
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/12/2023 a 30/04/2027	$20.685.751,20
Calidad del servicio	14/12/2023 a 30/04/2025	$31.028.626,80

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 2 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO











GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
1 abr 2024 11:00:44 a. m.
9°6'35.82"N -73°45'0.966"W
Altitud:44.4m
Velocidad:0.2km/h
#Vereda Último Caso



GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
1 abr 2024 11:02:47 1
9°6'35.73148"N -73°45'1.15927"W
6° N
Vía sin nombre
Chimichagua
Cesar
#Corregimiento Último Caso


GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
1 abr 2024 10:54:11 a. m.
9°6'35.916"N -73°45'1.158"W
Altitud:43.6m
Velocidad:0.0km/h
#Vereda Último Caso


GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
1 abr 2024 10:56:16 a. m.
9°6'35.916"N -73°45'1.158"W
Altitud:43.6m
Velocidad:0.0km/h
#Vereda Último Caso

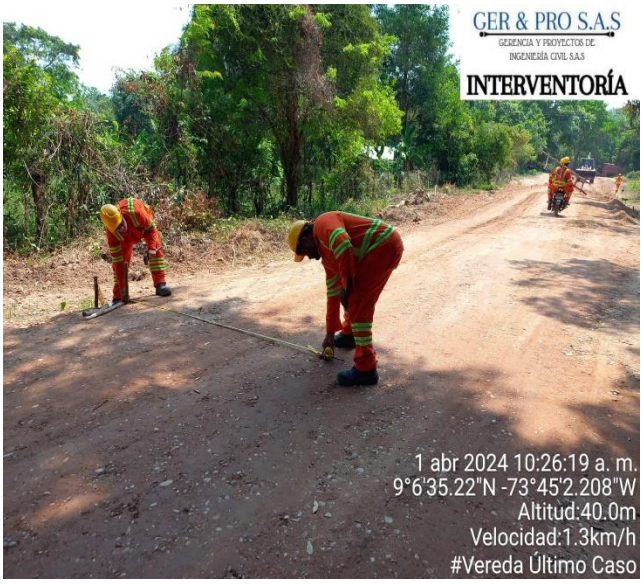
GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
1 abr 2024 10:26:19 a. m.
9°6'35.22"N -73°45'2.208"W
Altitud:40.0m
Velocidad:1.3km/h
#Vereda Último Caso


GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
1 abr 2024 10:53:07 a. m.
9°6'35.544"N -73°45'0.624"W
Altitud:41.5m
Velocidad:1.8km/h
#Vereda Último Caso

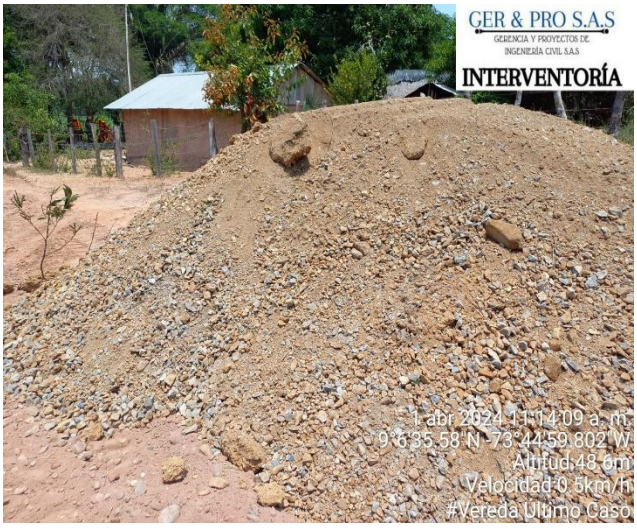
GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
1 abr 2024 11:14:09 a. m.
9°6'35.58"N -73°44'59.802"W
Altitud:48.6m
Velocidad:0.5km/h
#Vereda Último Caso


GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
1 abr 2024 10:22:41 a. m.
9°6'35.532"N -73°44'59.946"W
Altitud:37.5m
Velocidad:1.0km/h
#Vereda Último Caso

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Trascurrido el periodo contractual a corte 31 de Marzo, esta interventoría recomienda lo siguiente:

- Entregarle a esta interventoría las cotizaciones pertinentes propias de la fase de revisión y ajustes de presupuesto.
- Entregarle a la interventoría la documentación requerida para aprobar cronograma ajustado, presupuesto ajustado y plan de inversión.
- Todos los demás documentos que el interventor solicite.
- Presentar un plan de contingencia para dar cumplimiento al convenio ya que solo tienen un mes para terminar dicho contrato.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 11 del 4 al 10 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÈ BARÒN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual para la vereda ULTIMO CASO es (1 limpieza de alcantarilla, 135 ml de placa huella, construccion de 2 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en el corregimiento ULTIMO CASO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 y punto de referencia final el PR 2+00, de la vía la Yee de Saloa a Último Caso, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

CONVENIO No. 4629 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.868.525,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.868.525	$ 200.868.525		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.868.525	$ 200.868.525		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.868.525,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La JAC ya cuenta con los diseños definitivos aprobados por la interventoría, resultados de laboratorio y demás, por lo cual se programa inicio de ejecución de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA ULTIMO CASO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBS ERVACIONES: el objetivo de esta reunión fue dar a conocer a la comunidad en general la etapa en la que se encuentra el convenio. También buscar soluciones a diferentes inconvenientes que se han presentado en el transcurso del proyecto

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoría
2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Levantamiento topográfico
10. Cotización y elaboración del PAGA
11. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
12. Cotización de la valla publicitaria según convenio
13. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
14. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
15. Programación para ejecución de la obra
16. Aprobación del personal minimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)
17. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
18. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
2. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
3. Elaboración del PAGA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reuinion comunidad JAC / Ultimo Caso



Reuinion comunidad JAC / Ultimo Caso



Reuinion comunidad JAC / Ultimo Caso

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 12 del 11 al 17 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÒN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual para la vereda ULTIMO CASO es (1 limpieza de alcantarilla, 135 ml de placa huella, construccion de 2 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en el corregimiento ULTIMO CASO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 y punto de referencia final el PR 2+00, de la vía la Yee de Saloa a Último Caso, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

CONVENIO No.: 4629 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.868.525,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No.: 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.868.525	$ 200.868.525		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.868.525	$ 200.868.525		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.868.525,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La JAC ha presentado inconvenientes con levantamiento topografico y por ende aun no tiene los diseños y los demas entregables definidos. Por lo tanto aun no hay inicio de labores en campo

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA ULTIMO CASO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La JAC ha presentado inconvenientes con levantamiento topografico y por ende aun no tiene los diseños y los demas entregables definidos. Por lo tanto aun no hay inicio de labores en campo

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizaron dos socializaciones en el sitio de intervención donde estuvo presente la comunidad, equipo técnico de interventoría, equipo de topografía. Esto con la finalidad de dar a conocer a la comunidad la finalización de la etapa de ajuste a los estudios y diseños y establecer los pasos a seguir en el transcurso del convenio.

2 la segunda reunión se hizo con la finalidad de establecer el comité de participación comunitaria y el comité operativo de obra, previo al inicio de labores en campo. Se hizo nivelación de topografía para establecer las cotas del proyecto

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoría
2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Levantamiento topográfico
10. Cotización y elaboración del PAGA
11. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
12. Cotización de la valla publicitaria según convenio
13. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
14. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
15. Programación para ejecución de la obra
16. Aprobación del personal minimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)
17. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
18. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
19. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
20. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
21. Elaboración del PAGA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Mejoramiento de la subrasante según diseño.
2. Extensión y conformación del material de subsabe según diseño.
3. Conformación de placa huella según diseño.
4. Elaboración del PAGA
5. Elaboración del plan de inversión de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion estado del convenio / Ultimo Caso



Socializacion estado del convenio / Ultimo Caso



Socializacion estado del convenio / Ultimo Caso

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Velar por el buen manejo del recurso en cada una de las etapas del convenio
2. velar para que cada actividad realizada se haga conforme a lo establecido en el convenio
3. Entregar directrices al contratista que tengan un impacto positivo en la ejecion del convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 13 del 18 al 24 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÒN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual para la vereda ULTIMO CASO es (1 limpieza de alcantarilla, 135 ml de placa huella, construccion de 2 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en el corregimiento ULTIMO CASO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 y punto de referencia final el PR 2+00, de la vía la Yee de Saloa a Último Caso, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

CONVENIO No. 4629 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.868.525,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.868.525	$ 200.868.525		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.868.525	$ 200.868.525		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.868.525,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La JAC ha presentado atraso en la adquesicion de materiales

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA ULTIMO CASO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ELABORACION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se Sostuvo una reunión virtual en la que participaron: Equipo técnico de interventoría, equipo técnico de invias y equipo técnico de las diferentes JAC. esto con la finalidad de conocer el avance que han presentado las JAC en l tiempo transcurrido.

2. Se sostuvo una reuinon en las instalaciones del INVIAS en la que participò el equipo tecnico de interventoria, equipo tecnico de invias y equipo tecnico de la JAC con la finalidad de ajustar y dar a conocer el los estudios y diseños, entre otras.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoría
2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Levantamiento topográfico
10. Cotización y elaboración del PAGA
11. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
12. Cotización de la valla publicitaria según convenio
13. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
14. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
15. Programación para ejecución de la obra
16. Aprobación del personal minimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)
17. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
18. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
19. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
20. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
21. Elaboración del PAGA
22. Mejoramiento de la subrasante según diseño.
23. Extensión y conformación del material de subsabe según diseño.
24. Conformación de placa huella según diseño.
25. Elaboración del PAGA
26. Elaboración del plan de inversión de obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Elaboración de ensayos para la subrasante.
2. Construcción de placa huella
3. Limpieza a mano de alcantarillas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reuinion instalaciones INVIAS / Ultimo Caso



Factura pago polizas / Ultimo Caso



Reuinion instalaciones INVIAS / Ultimo Caso

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Velar por el buen manejo del recurso en cada una de las etapas del convenio
2. velar para que cada actividad realizada se haga conforme a lo establecido en el convenio
3. Entregar directrices al contratista que tengan un impacto positivo en la ejecion del convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 14 del 25 al 31 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÈ BARÒN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual para la vereda ULTIMO CASO es (1 limpieza de alcantarilla, 135 ml de placa huella, construccion de 2 alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en el corregimiento ULTIMO CASO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 y punto de referencia final el PR 2+00, de la vía la Yee de Saloa a Último Caso, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

CONVENIO No. 4629 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.868.525,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.868.525	$ 200.868.525		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.868.525	$ 200.868.525		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.868.525,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.728.730,25	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.227.410,56	5,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.227.410,56	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.227.410,56	25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA ULTIMO CASO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA A & G - VIA CURUMANI	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ELABORACION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoría
2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Levantamiento topográfico
10. Cotización y elaboración del PAGA
11. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
12. Cotización de la valla publicitaria según convenio
13. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
14. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
15. Programación para ejecución de la obra
16. Aprobación del personal minimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)
17. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
18. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
19. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
20. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
21. Elaboración del PAGA
22. Mejoramiento de la subrasante según diseño.
23. Extensión y conformación del material de subsabe según diseño.
24. Conformación de placa huella según diseño.
25. Elaboración del PAGA
26. Elaboración del plan de inversión de obra
27. Elaboración de ensayos para la subrasante.
28. Construcción de placa huella
29. Limpieza a mano de alcantarillas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.
2. Nivelación de la subrasante y conformación de la subbase
3. Ensayos de densidades para la capa de subbase
4. Construcción de placa huella concreto de 21 MPA
5. Toma de ejes para la calzada, según diseño.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armado y figurado de vigas riostras / Ultimo Caso



Armado y figurado de parrillas / Ultimo Caso



Rectificacion de ejes (según diseño) / Ultimo Caso

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 1/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 4629 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/03/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		x		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29
Lluvias moderadas																			x		x											2
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSÉ LUIS PARODI
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Juan D. Zambrano
Nombre: JUAN DAVID ZAMBRANO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037 - 0584524 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

01

18/03/24

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: 008
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vias Regio DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cesar

CONTRATO DE OBRA No. 4629-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC ultimo Caso

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GER y PRO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Solución problematicas en la Ejecución del Convenio

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Solución problematicos en la ejecución del Convenio 4629 2023 (ultimo Caso) Chimichagua Presenta retrasos
- Cotizaciones del Material para ejecución de Obra por medio del Comite Operativo.
- Permiso de Ocupación de Cauces para la Intervención de Obras de drenajes.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

FOLIO: 02

FECHA: 18/03/24
Día Mes Año

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Presentación del personal presente en la reunión
- Palabras del representante legal de la Vereda y expresa su preocupación por la tardanza en la ejecución y mal manejo de la chequera en relación al pago de los comisiones topográficos
- Intervención de la directora Territorial CESAR Sobre los rubros seleccionados para cada ITEM. y el manejo de la chequera.
- Intervención Interventoría GER y PROSAS Sobre los problemáticas presentados por el representante legal.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MP-PMINT-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	03

FECHA 18/03/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
→ Pago replanteo topografía Interventoría		Interventoría.
→ Pago Poliza Prorroga	18/03/2024	JAC ultimo Coso
→ La NO realización de alcantarillos "2" debido al tramite con la Corporación excede el tiempo y plazo Estipulado en el Convenio	18/03/2024.	JAC ultimo Coso
→ Aprobación del material de cantera del lugar cotizado por la Junta de Acción Comunal siempre y cuando este certificado con licencias y cumpla la especificaciones requeridas		
→ Compra de Uniformes	18/03/2024.	
→ Aprobación hoja de vida	18/03/2024.	Interventor.
→ Aprobación estudios y diseños presentados por el ing. Oscar lopez	18/03/2024	Interventor
→ Pago valla informativa	18/03/2024	JAC.
→ Entrega documentación contratual a la comunidad.	18/03/2024	Interventor

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día /Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato [illegible] el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite [illegible] correspondiente

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad [illegible] obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Diana Maria Zuleta	DT - CESAR	Invias.	
Willman Campo	Pre JAC	ultimo Coso	
Eduber Duran	Lider	Ultimo Coso	
Angel M. Realta		ultimocaso	
OMAR PERALTA C.	DM. / INTERVENTOR	GERYPRO.	
JOSE DAVID DORIA H	Rep. Legal.	Ger y Pro SAS	
Saul Cebs J.	Apy. Sup. Inter.	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Viernes 01 de Marzo de 2024
• Corregimiento de ultimo Caso, Municipio de Chimichagua, Cesa

• Contratista: JAC - Corregimiento ultimo Caso
• Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

· Desarrollo: El proyecto se encuentra en etapa de ajuste y diseño
- No hay Personal operativo en Campo
· Condiciones Climaticatica: Dia Soleado y caluroso.

- Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Sabado 02 de Marzo de 2024
· Corregimiento de ultimo Caso, Municipio de Chimichagua, Cesar

Contratista: JAC corregimiento Ultimo Caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS.

Desarrollo: El proyecto se encuentra en etapa de ajustes y diseños
- El contratista realiza actividades de cotizacion de materiales y demas
- No hay Personal operativo en campo.

- Condiciones climaticas: Dia soleado y caluroso.
- Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Domingo 03 de Marzo de 2024
Corregimiento Ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Powered by CamScanner

• Desarrollo Dia no laboral
- Condiciones climaticas: Soleado y despejado
- Coordenadas: 9° 6' 33,73"N 73° 44' 25,55" W



Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Lunes 04 de Marzo de 2024.
Corregimiento ultimo caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso
Interventoria Gerencia y Proyecto de ingenieria civil. SAS

• Desarrollo: El proyecto se encuentra en etapa de ajustes y diseños
- No hay personal operativo en campo.
- Se adelantan las cotizaciones de los materiales.
• Condiciones Climaticas: Dia soleado y caluroso
• Coordenadas: 9° 6' 33,73"N 73° 44' 25,55"W



Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Martes 05 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de Chimichagua - Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventoria Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Se lleva cabo visita en campo por parte del equipo de interventoria para dar a conocer a la comunidad el atraso que ha presentado el convenio, tambien el alcance del mismo, la caracterizacion y demas, donde la comunidad se presento muy participativa.
- NO hay personal operativo en campo
- Se adelantan labores administrativas

Powered by CamScanner

* Condiciones Climaticas: Dia Nublado y soleado
• Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Miercoles 06 de Marzo 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de chimichagua - Cesar

Desarrollo: el proyecto continua en etapa de ajustes y diseños
- NO hay personal operativo en campo
- Se adelantan labores administrativas
• Condiciones Climaticas: Dia nublado y soleado
• Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Jueves 07 de Marzo 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua Cesar

Contratista: JAC de la Vereda ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y Proyectos de ingeniera civil SAS

Desarrollo: El proyecto se encuentra en etapa de ajuites y diseños
- Se adelantan ensayos d muestras para laboratorio de material de Subbase y triturado, Arena Para los diseños de Mezclas.
- No hay personal operativo en campo.
• Condiciones Climaticas: Nublado y soleado
• Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano.
Residente interventoria

Powered by CamScanner

Viernes 08 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua - Cesar

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: El proyecto se encuentra en etapa de Ajustes y diseño
- Se adelantan labores administrativas
- No hay personal en campo
- Condiciones climaticas: Dia soleado y caluroso
- Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoria

Sabado 09 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua Cesar

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso.
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingeniena civil SAS

Desarrollo: El proyecto Sigue en etapa de Ajustes al Diseño y Presupuesto.
- No hay personal en campo.
- Se adelantan labores administrativas.
- Condiciones Climaticas: Dia soleado y caluroso
- Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoria

Domingo 10 de Marzo 2024.
Corregimiento ultimo caso, Municipio de Chimichagua - Cesar
Contratista: JAC corregimiento ultimo caso.
Contratista: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenia civl SAS.

Powered by CamScanner

• Desarrollo: Dia no laboral

• Condiciones climaticas: Dia soleado y caluroso
• Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25.55" W



Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Lunes 11 de Marzo 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso
Interventoria Gerencia y proyecto de ingeniera civil SAS

Desarrollo: El proyecto continua en etapa de Ajustes al diseño y presupuesto.
- La Comunidad resolvio realizar un nuevo levantamiento topografico
- No hay personal operativo en campo

Condiciones Climaticas: Dia soleado y caluroso
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25.55" W



Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente Interventoria

Marzo 12 de 2024, Martes.
Corregimiento ultimo Caso, Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: En campo tenemo la visita de parte de la interventoria para dar los tramites pertinentes respecto de la obra
- No hay personal en campo
- se adelanta cotizaciones de canteras, materiales y demas

Condiciones climaticas: Soleado y caluroso
Coordenadas: 9°6' 33.73" N 73° 44' 2555" W



Juan D Zambrano
Residente interventoria

Miercoles 13 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Se adelanta labores de levantamiento topografico para si efectuar el diseño geometrico de la via.
- Se adelanta Cotizaciones de materiales y cantera.
- No hay personal operativo en campo.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W



Juan D. Zambrano
Residente Interventoria

Jueves 14 Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua - Cesar


Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: El proyecto continua en labores administrativas, sigue presentando atraso en la obra.
- No hay personal operativo en campo

Condiciones climaticos:
Dia Soleado y despejado

Powered by CamScanner

Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W




Juan D. Zambrano.
Residente Interventoria

Viernes 15 Marzo de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de chimichagua - Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: El proyecto se encuentra en etapa de ajustes y diseños.
- No hay personal operativo en campo
- se adelanta actividades administrativas

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W



Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Sabado 16 Marzo de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de chimichagua - Cesar

Desarrollo: ya se cuenta con el levantamiento topografico de la via a intervenir.
- Se adelanta cotizaciones de Maquinarias ya que en el sector no se cuenta con maquinarias disponibles.
- NO hay personal operativo en campo

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado
Coordenadas: 9°6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Powered by CamScanner

Domingo 17 de Marzo 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua - Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Dia no laboral
Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D zambrano
Residente interventoria

Lunes 18 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua - Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: debido a la demora que el convenio a presentado se llevo a cabo una reunion en las instalaciones del INVIAS en la que participaron Equipo del INVIAS en presencia de la directora territorial del cesar (Omaira Zuleta), Equipo de interventoria y equipo de la junta de accion Comunal, donde se trataron temas Pertinentes a la obra (avance), tambien se aprobó el nuevo levantamiento topografico con el nuevo diseño geometrico de la Via; se establecio dar inicio a las labores en campo.
- se adelanta cotizacion de maquinaria.
- Materiales de ferreteria y demas
- El dia 18 se realizan los pagos de laboratorio topografia, EPP, Diseños y demas.
Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D zambrano
Residente interventoria

Martes 19 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarollo: Se realiza al personal que va a trabajar los examenes ocupacionales, requerimiento previo antes de iniciar a laborar.
- Se adelanta labores de cotizacion de maquinaria Pesada
- No hay Personal operativo en campo

Condiciones Climaticas: lluvias moderadas
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente de obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoria

Miercoles 20 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Se adelanta busqueda de maquinaria, ya que en el sector la hora/maquina excede el valor presupuestado, razon por la cual no se ha iniciado labor en campo
- No hay Personal operativo en campo

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente de obra

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Powered by CamScanner

Jueves 21 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC del corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil. SAS.

Desarrollo: se inician los Preparativos Para la compra de materiales de Subbase, materiales de ferreteria para dar inicio a las labores.
- aun no hay maquinaria Para ejecucion de obra en campo
- INVias hace una invitacion a los presidentes de juntas, interventoria Para realizar una videoconferencia Para tratar temas pertinentes al convenio

Condiciones climaticas: lluvias fuertes.
Coordenadas: Dia soleado y lluvias 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zumbrano
Residente interventoria.

Viernes 22 de Marzo 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua - Cesar

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingeniería civil SAS

Desarrollo: se llevo a cabo una reunion virtual (meet) para dar a conocer el avance de cada JAC. en la que participaron ingenieros del INVIAS, Presidente JAC y equipo, junto al equipo de interventoría.
- Se adelantan los tramites para pago de materiales.
- Se continua con la busqueda de maquinaria.

Condiciones Climaticas: Dia soleado despejado
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zumbrano
Residente interventoria.

Powered by CamScanner

Sabado 23 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Chimichagua, Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingeniena civil SAS.

Desarrollo: El dia Sabado 23 del presente ano interventoria firma el cheque Para Pagos en ferreterias Para los materiales de construccion, Pago por Concepto de Grava 3/4" y material de Subbase, Acero y demas
- Se busca la maquinaria Para el proyecto, ya que el Precio excede lo Presupuestado
- Se hacen los preparativos Para iniciar labores en campo, los obreros estan afiliados y cuentan con uniformes y EPP.

Condicion Climaticas: Soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N y 73° 44' 25,55" W

Residente de obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente Interventoria

Domingo 24 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo Caso, municipio Chimichagua Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventona: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Dia no laboral

Condiciones climaticas: Soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25.55" W

Residente obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoria

Powered by CamScanner

Lunes 25 de Marzo de 2024.
Corregimiento ultimo caso, Municipio de Chimichagua - Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS.

Desarrollo: en campo se recibe materiales de ferreteria (Acero, Alabre, Puc, tanque) etc
- Con el acero disponible los obreros y el maestro direccionado por el ing residente de la JAC inician con corte y figurado de acero 3/8" Para armar las Parrillas y las Vigas riostras Segun diseño.
- El acero se verifico que fuera legitimo.
- Aun se busca la maquinaria que se Ajuste al Presupuesto
- Aun no hay material de triturado, Subbase y relleno en la obra

Condiciones climaticas: Soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33.73"N 73° 44' 25,55" W

Residente de obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Martes 26 de Marzo de 2024
Corregimiento Ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Se adelantan labores de corte y figurado de acero en campo
- Se prevee ucorreo de material de relleno para la via.
- Se adelanta Alquiler de maquinaria, se Prevee que para el 30 del Pres-ente mes la maquinaria este en campo.
- Hay personal en campo, con uniforme y sus EPP

Condiciones climaticas:
- Dia Soleado y despejado

Powered by CamScanner

Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25.55" W

Residente obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoria

Miercoles 27 de Marzo de 2024
Corregimiento Ultimo caso, municipio de chiriguaná - Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil SAS.

Desarrollo: se continua con la actividad de corte y figurado de acero, se lleva a cabo actividad de roceria y la limpieza de una alcantarilla.
- Se buscan chequeo de topografia, previo a empezar a trabajar con maquinaria (replanteo).

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25.55" W.

Residente obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoría.

Jueves 28 de Marzo de 2024
Corregimiento Ultimo caso, municipio de chiriguaná - Cesar

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Dia festivo por ser jueves Santo.

Condiciones climaticas: Soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventor

Powered by CamScanner

Viernes 29 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, municipio chimichagua - Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: es festivo por la celebración de la Semana Santa

Condición climaticas: Soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25,55" W



Residente obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoria

Sabado 30. de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo caso, municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Se llevan acabo actividades de nivelacion de terreno con Pajarita se hizo corte de material (segun Diseño) ya que el terreno esta desnivelado. En campo esta el equipo de topografia, personal operativo, ingeniero residente y ingeniero inspector de interventoria. tambien se llevan a cabo actividades de corte y figurado de acero segun diseño.

Condicione climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25,55" W



Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Powered by CamScanner

Domingo 31 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC del Corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Dia no laboral.

Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoria

Lunes 01 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC del corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS

Desarrollo: Equipo JAC (Ingeniero residente, Presidente JAC, personal operativo)
Equipo interventoria (Ing residente interv insporector SST, inspector de obra)
Se llevaron a cabo actividades como: transporte de material seleccionado para relleno, transpor de material de construccion. Se llevan a cabo actividad de extension de material de subbase a lo largo de la calzada, tambien se compacto el material extendido.
- Corte y figurado de aceero.

Condiciones Climaticas Dia Soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoria

Powered by CamScanner
