RECIBO A SATISFACCIÓN

Después de haber efectuado una revisión al Contrato Estatal de Prestación de Servicio No. 023 de 2024 – SAMC-2024-02 y se puede dar el recibo a satisfacción a la sociedad CAPITAL NETWORKS S.A.S. identificada con NIT: 830.086.643-6, Representada legalmente por el señor HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ Identificado con cedula de ciudadanía No. 91.489.578 de Bucaramanga, de conformidad con el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación y desinstalación cuando se requiera de los Equipos de Aire Acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca, realizado durante el periodo 10 de agosto al 23 de septiembre de 2024, conforme a la factura electrónica FE-1148, por valor **SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS** ($73.614.152) MCTE incluido IVA.

Firmado en Santiago de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2024

MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa

Supervisora del Contrato

Unidad	Recurso	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación	Nuevo Saldo del Registro Pptal
02	10 CSF	8824	02/04/2024	$45.000.000	-0-	$45.000.000
Factura No.FE-1022 De 21 -05-2024 **ABONO**					$45.000.000.00	$0.

Unidad	Recurso	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación	Nuevo Saldo del Registro Pptal
08	10 CSF	33324	02/04/2024	$205.000.000.00	-0-	$205.000.000.00
Factura No.FE-1022 21-05-2024 **SALDO**					$29.300.094.31	$175.699.905.69
Nota C-002-107 21-05-2024					**$1,31**	$175.699.907.00
Factura No. FE-1075; 28-06-2024					$38.613.673,00	$137.086.234,00
Factura No. FE-1100; 10-08-2024					$51.267.981,02	$85.818.252,98
Nota C-002-111 14-08-2024					**$0.02**	$85.818.253,00
Factura No. FE-1148; 23-09-2024					$73.614.152	$12.204.101.00

AOC/AA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CALI - VALLE
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
octubre 23 de 2024	CORTE CUATRO	CAPITAL NETWORKS S.A.S.	MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	023 de 2024 - SAMC-2024-02	**Tipo:**	PRESTACION DE SERVICIOS	**Convenio Nro.**	N/A	**Tipo:**	N/A
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como la instalacion y desinstalacion cuando se requiera de los Equipos de Aire Acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca.						

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A 02 02 02 008 007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2024	2324	25/01/2024	$45.000.000,00
A 02 02 02 008 007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2024	11824	25/01/2024	$205.000.000,00
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2024	68224	9/10/2024	$10.000.000,00

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
$250.000.000,00	$260.000.000,00	21/04/2022	OCHO(08) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS	04/04/2024	31/12/2024

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato
21-44-101438533	03-04-2024	8824	02-04-2024	01/04/2024
21-40-101230021	03-04-2024	33324	02-04-2024	
21-44-101438533 **ANEXO 1**	16-10-2024	120624	16-10-2024	16-10-2024
21-40-101230021 **ANEXO 1**	18-10-2024			

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	MODIFICACION No.1	16/10/2024		$10.000.000,00	Modificar el contrato estatal de prestación de servicios No. 023 de 2024 – SAMC-2024-02, con la finalidad de adicionar el valor del contrato
Prorrogas:	N/A				
Otro sí:	No.				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	$260.000.000,00	% Anticipo	N/A

Pagos				Amortización			
Fecha del pago	**Forma de pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
28/05/2024	FE-1022	30,0%	$ 74.300.094,31			$ 29.300.093	166467624
	NOTA C-002-107		-$ 1,31			$ 45.000.000	166527124
15/07/2024	FE-1075	15,0%	$ 38.613.673,00			$ 38.613.673	233340024
4/09/2024	FE-1100	21,0%	$ 51.267.981,02			$ 51.267.981	309726624
	NOTA C-002-107		-$ 0,02				
Pagos y % de Avance		**66,0%**	**$164.181.747,00**		**$0**	**$164.181.747**	

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
1.Ejecutar el objeto del contrato, conforme lo establecido en Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantia SAMC-2024-02, conforme a los valores de la oferta presentada. 2.Efectuar las actividades señaladas dentro de las Especificaciones Técnicas Esenciales – Condiciones Técnicas Exigidas del servicio de mantenimiento y la CARTILLA DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO.	Realizacion de la Rutina preventivaS y mantenimientos correctivos según cronograma	Ordenes de servicio o Actas,solo de los equipos atendidos, con el respectivo recibido a satisfacción, elaborados por el contratista y aprobadas por la Entidad.
3.Realizar conjuntamente con el Supervisor del Contrato al inicio del mismo, el cronograma de actividades a ejecutar, donde se contemplen las rutinas de mantenimiento preventivo conforme la periodicidad establecida y las actividades de instalación y desinstalación, las cuales, por necesidad del servicio, deberán ser ejecutadas de manera simultánea.	Realizacion del cronograma de Actividades en conjunto con el Supervisor del contrato	Aporta documento
4.Guardar la reserva debida de la información a la que tenga acceso con ocasión del contrato y a no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del mismo.	El contratista a la fecha ha realizado lo pertinente en la ejecución del contrato.	N/A
5.El CONTRATISTA deberá designar un empleado que atienda los requerimientos de la Entidad, el trámite de cuentas, las quejas y demás información que se pretenda cruzar	El contratista cuenta con el personal solicitado por la Entidad. Para la ejecuion del contrato	APORTA HOJA DE VIDA
6.Coordinar la prestación del servicio con el supervisor del contrato, de acuerdo con el horario establecido en la Entidad.	El contratista a la fecha ha realizado lo pertinente en la ejecución del contrato.	
7.Atender en forma oportuna las solicitudes, observaciones y reclamos que se presenten por el Supervisor del Contrato, en relación con la prestación del servicio contratado y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata, así como corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas.	El contratista ha atendido de forma opoutuna los Servicios contratados.	-
8.Garantizar la calidad del servicio y responder por ella de conformidad con el artículo 5 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993	El contratista a la fecha a realizado lo pertinente en la ejecución del contrato.	N/A
9.Suscribir el Acta de Liquidación del contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previo requerimiento realizado por la entidad en dos (2) oportunidades o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA.	A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.	-
10.Responder por cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras personas, comprometiéndose a repararlo en forma inmediata; de no hacerlo así, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procederá a corregirlo en la forma que estime conveniente, pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontarán de los pagos pendientes al CONTRATISTA.	A la fecha no se ha presentado ninguna daño o perjuicio	N/A
11.Suministrar al Supervisor del Contrato, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	El contratista a la fecha a realizado lo pertinente para la ejecución del contrato.	
12. Recibir y acatar las instrucciones que sean impartidas por el Supervisor del Contrato para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	El contratista a la fecha a realizado lo pertinente para la ejecución del contrato.	Aporta diagnostico, cotización y costo de los correcitivos.
13. Suministrar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de la prestación del servicio.	A la fecha la Entidad no ha requerido informacion adicional	N/A
14. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL. a. Cumplir con las normas laborales, en lo referente al personal que utilice en la ejecución del Contrato y en especial a las obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios, Decreto 1443 de 2014 - SG-SST y Decreto 1072 de 2015; y la Resolución Nro. 0312 de 2019. b. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilicé en la ejecución del Contrato, si a ello hubiere lugar y conforme a la vinculación que se efectué y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, podrá generar la imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única, en los amparos de cumplimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, como también dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con la normatividad vigente. c. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato los documentos y constancias necesarias para que los supervisores del contrato, verifiquen el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. e. Responder en forma exclusiva por la vinculación del personal, de manera que los errores u omisiones de este, son de su cuenta y riesgo. PARÁGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en la realización del contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo del CONTRATISTA.	El Contratista cumple, toda vez que aporta las Planillas del pago a la seguridad Social **SEPTIEMBRE** **FECHA DE PAGO** / **No. PLANILLA** 9/09/2024 / 79939105 7/10/2024 / 1066420541	Aporta soportes Planilla No.79939105 09-09-2024 Planilla No:1066420541 07-10-2024

<table>
<tr><td>15. El Contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2119 de 2021 “Por medio del cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación básica secundaria, educación media y educación superior y se dictan otras disposiciones en materia de inserción laboral para jóvenes”; deberá incorporar dentro de la planta de personal contratado a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos conforme lo requerido por la Entidad (EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO), cuyo porcentaje no podrá ser inferior al 8% del total del personal que se requiera para la ejecución contractual. Aplicará de forma preferente, las disposiciones contenidas en las leyes 2039 y 2043 de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen. De dicha obligación, el Supervisor del Contrato realizará el respectivo seguimiento durante la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de la misma.</td><td>-0-</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>16. Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor total del contrato.</td><td rowspan="2">El Contratista cumple, toda vez que aporta las garantias.</td><td>Aportó Polizas
No 21-44-101438533
No. 21-40-101230021
De la compañía Seguros del Estado</td></tr>
<tr><td>17. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la legalización y ejecución del Contrato.</td><td>El contratista realizó modificacion de las Polizas
No 21-44-101438533 Anexo 1
16-10-2024
No. 21-40-101230021 Anexo 1
18-10-2024
De la compañía Seguros del Estado</td></tr>
<tr><td>18. Informar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, cualquier anomalía que se presente durante la prestación del servicio</td><td>Cumple con lo requerido, al momento de la prestacion del servicio no se han presentado anomalias</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>19.Constituir las Garantías que establezca el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en el Proceso de Selección, así mismo deberá informar toda suspensión, reinicio y modificación del Contrato a la Compañía Aseguradora, a efectos de prorrogar las vigencias y/o modificar la suficiencia de las mismas en caso de requerirse</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">INFORMACION POLIZA CONTRATO No.023 DE 2024</th></tr>
<tr><th colspan="3">POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</th></tr>
<tr><th>No. POLIZA</th><th colspan="2">FECHA EXPEDICION</th></tr>
<tr><td>21-44-101438533</td><td colspan="2">3/04/2024</td></tr>
<tr><td>APROBACION DE LA ENTIDAD</td><td colspan="2">4/04/2024</td></tr>
<tr><th>AMPAROS</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>2/04/2024</td><td>30/04/2025</td></tr>
<tr><td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td><td>2/04/2024</td><td>31/12/2027</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>2/04/2024</td><td>31/12/2025</td></tr>
<tr><th colspan="3">POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL</th></tr>
<tr><th>No. POLIZA</th><th colspan="2">FECHA EXPEDICION</th></tr>
<tr><td>21-40-101230021</td><td colspan="2">3/04/2024</td></tr>
<tr><td>APROBACION DE LA ENTIDAD</td><td colspan="2">4/04/2024</td></tr>
<tr><th>AMPAROS</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>PREDIOS LABORES Y OPERACIONES</td><td>2/04/2024</td><td>30/04/2025</td></tr>
</table>
</td><td>Aportó Polizas
No 21-44-101438533
No. 21-40-101230021
De la compañía Seguros del Estado

El contratista realizó modificacion de las Polizas
No 21-44-101438533 Anexo 1
16-10-2024
No. 21-40-101230021 Anexo 1
18-10-2024
De la compañía Seguros del Estado</td></tr>
<tr><td>20. Cumplir con los requisitos ambientales establecidos en el Proceso de Selección y las normas ambientales aplicables.</td><td>El contratista cumple con lo requerido por la Entidad.</td><td>Aporta documento “Plan Gestion ambiental-Capital Networks”</td></tr>
<tr><td>21. Firmar, conjuntamente con el Supervisor designado el Acta de Inicio, suspensión, reiniciación, recibo definitivo, liquidación final del Contrato. Para su validez las actas de suspensión, reiniciación y liquidación final del Contrato, requieren de la aprobación de la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.</td><td>El Contratista y la Entidad firmaron conjuntamente el Acta de Incio el 04 de abril de 2024.</td><td>Acta de inicio
04-abril de 2024</td></tr>
<tr><td>22. Adoptar las medidas que emita el Gobierno Nacional y/o el Consejo Superior de la Judicatura ante la eventualidad de presentarse alguna emergencia sanitaria</td><td>A la fecha NO se ha presentado ninguna emergencia sanitaria.</td><td></td></tr>
<tr><td>23. Como requisito para el último pago, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato, informe detallado del estado actual de los equipos, indicando el estado de los mismos, si requieren la realización de correctivos, y en caso de así requerirse, suministrar el listado de repuestos y/o actividades que se deban ejecutar.</td><td>A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.</td><td></td></tr>
<tr><td>24. Cumplir con los lineamientos del Decreto No. 1072 de 2015 y la Resolución No. 312 de 2019, con el Documento de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, adicionalmente deberá entregar el estándar y/o procedimiento de la ejecución de trabajo en alturas</td><td>El contratista cumple con lo requerido por la Entidad.</td><td>Aporta Documento “ Procedimiento trabajo Seguro”</td></tr>
<tr><td>25.El Contratista deberá cumplir con 15 desinstalaciones y 15 instalaciones de equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU y con personal técnico adicional, conformado por Dos (2) Técnicos o Tecnólogos en carreras que estén relacionadas a mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado y/o Sistemas de Refrigeración y Climatización y/o Ventilación, con experiencia profesional mínima de tres (3) años y una experiencia laboral de dos (2) años en la cual se acredite labores relacionadas con el objeto del presente proceso, con la finalidad de ejecutar de manera exclusiva durante la ejecución del contrato actividades de desinstalación e instalación de equipos de aire acondicionado, conforme cronograma realizado entre el Contratista y el Supervisor, lo cual será verificado por el Supervisor del Contrato.</td><td>A la fecha el contratista ha realizado Rutina Preventiva, aun no se ha realizado las actividades de instalacion y Desintalacion de Aires Acondcionados.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>26. La presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.</td><td>Factura generada y subida al SIIF, aprobada por el supervisor</td><td>FE-1148
$73,614,152
23-09-2024</td></tr>
<tr><td>27. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo.</td><td>-</td><td></td></tr>
</table>

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
			78,0%

GESTION DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)
la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como la instalacion y desinstalacion cuando se requiera de los Equipos de Aire Acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca,se está ejecutando dentro de los parametros establecidos en el Contrato Estatal de Prestación de Servicios No.23 de 2024 - SAMC-2024-02.

DIFICULTADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	**Alternativas de Solución**	**Fecha de Solución**	**Gestión**	**Resultados**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCION DEL INFORME	
SUPERVISOR	
Nombre	MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Cargo	Coordinador Area Administrativa

CAPITAL NETWORKS SAS

NIT : 830,086,643 - 6
CRA 73 A # 52 A 18 OFICINA 202
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
(601) 4660328 3102768501
comercial@capitalnetworks.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90

Cliente	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	805,003,838 - 9	**Teléfono**	
Dirección	CRA 10 No 12 15 PISO 2 TORRE A	**Vendedor**	SOLANYI CASTRO DIAZ
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	401
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1148

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-23	16:45:22
Expedición	2024-09-23	16:33:30
Vencimiento	2024-10-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ASI COMO LA INSTALACION Y DESINSTALACION CUANDO SE REQUIERA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA RAMA JUDICIAL EN EL VALLE DEL CAUCA	UN	1	61,860,631.93	61,860,631.93

Total Bruto	61,860,631.93
IVA	11,753,520.07
Total a Pagar	**$ 73.614.152,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	73.614.152,00	Cuota 1 Vence el 2024-10-23

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Tres Millones Seiscientos Catorce Mil Ciento Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No somos Agentes de retencion de IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764050036056 **aprobado en** 2023-06-05 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 750 **al** 2000

CUFE :6f1277873a1aa7996402706effd5d9635ee2d9176afdabb513c8a36089c185b0e52abe0a98d49a072349130aca87027a

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Hector Augusto Quiros Ibañez, identificado con CC 91489578, en mi condición de Representante Legal de Capital Networks SAS identificada con Nit 83086643-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Aprendizaje o del Impuesto Autorretención Renta (cuando a ello haya lugar).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Ley 1819 de 2016 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Dada en Bogota, a los (02) dos del mes de octubre de 2024

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA : Hector Augusto Quiros Ibañez

Nombre o Razón Social del PROPONENTE: Capital Networks SAS
Nit: 830086643-6
Nombre del Representante: Hector Augusto Quiros Ibañez
Cédula de Ciudadanía No. 91489578 de Bucaramanga
Dirección: Cra 73ª N° 52ª 18
Ciudad Bogotá
Teléfono 4660318-3177963991
Correo electrónico comercial@capitalnetworks.com.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS	CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	79939105	$17.521.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	479.500	0		0		0	0	0	0	479.500	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	536.300	0		0		0	0	0	0	536.300	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	586.600	0		0		0	0	0	0	586.600	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	27.800	0		0		0	0	0	0	27.800	1
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	7.000	0		0		0	0	0	0	7.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	203.200	0		0		0	0	0	0	203.200	4
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	71.600	0		0		0	0	0	0	71.600	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	81.700	0		0		0	0	0	0	81.700	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	183.400	0		0		0	0	0	0	183.400	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	90.800	0		0		0	0	0	0	90.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	907.500	0	0	0	0	0	0		907.500	5
230301	Porvenir	800224808-8	6.331.200	0	0	0	0	0	0		6.331.200	27
231001	Colfondos	800227940-6	1.080.900	0	0	0	0	0	0		1.080.900	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	834.600	0	0	0	0	0	0		834.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	3.505.500				3.505.500	0	0	3.505.500			35.055	3.505.500	39

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.273.700	0	0	2.273.700	39

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	79939105	$17.521.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	2.587.900	2.587.900
Pensión	4	9.154.200	9.154.200
Riesgos Laborales	1	3.505.500	3.505.500
CCF	1	2.273.700	2.273.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	17.521.300	17.521.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	79939105	$17.521.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030527239	GARCIA GUIZA DIANA ROSALBA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1049454784	GONZALEZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO	1	0			S								X									230301	1.481.170	237.000	0	0	0	0	EPS002	1.481.170	59.300	14-4	1.481.170	5	103.100	CCF24	1.481.170	59.300	0	0	0	0	0
3	CC	1078347749	SANCHEZ BALLEN EDWIN ALEXANDER	1	0			S								X									230301	2.349.575	376.000	0	0	0	0	EPS017	2.349.575	94.000	14-4	2.349.575	5	163.600	CCF24	2.349.575	94.000	0	0	0	0	0
4	CC	73186800	IMITOLA CONTRERAS WILSON RAFAEL	1	0			S								X									230301	1.277.412	204.400	0	0	0	0	ESSC07	1.277.412	51.100	14-4	1.277.412	5	89.000	CCF24	1.277.412	51.100	0	0	0	0	0
5	CC	73186800	IMITOLA CONTRERAS WILSON RAFAEL	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC07	43.334	0	14-4	43.334	5	0	CCF24	43.334	0	0	0	0	0	0
6	CC	91489578	QUIROS IBAÑEZ HECTOR AUGUSTO	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
7	CC	1012330555	CASTRO DIAZ SOLANYI	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
8	CC	1032481529	MONTAÑO PACALAGUA NATALIA	1	0			S								X									25-14	2.205.298	352.900	0	0	0	0	EPS005	2.205.298	88.300	14-4	2.205.298	5	153.500	CCF24	2.205.298	88.300	0	0	0	0	0
9	CC	1047448006	MARRUGO TORRES JOSE LUIS	1	0			S								X									230301	1.586.277	253.900	0	0	0	0	EPS017	1.586.277	63.500	14-4	1.586.277	5	110.500	CCF24	1.586.277	63.500	0	0	0	0	0
10	CC	13871436	QUIROS IBAÑEZ EVANGELISTA	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-4	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
11	CC	1047452879	NATES ORTEGA HUGO ANTONIO	1	0			S								X									230301	1.789.575	286.400	0	0	0	0	EPS042	1.789.575	71.600	14-4	1.789.575	5	124.600	CCF24	1.789.575	71.600	0	0	0	0	0
12	CC	73352529	ESPINOSA MORENO JULIO CESAR	1	0			S								X									25-14	1.510.213	241.700	0	0	0	0	ESSC07	1.510.213	60.500	14-4	1.510.213	5	105.200	CCF24	1.510.213	60.500	0	0	0	0	0
13	CC	1023009865	RUEDA CASTELLANO ROMINGER JHAZLLERS	1	0			S																	230201	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-4	1.256.667	5	87.500	CCF24	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
14	CC	1023009865	RUEDA CASTELLANO ROMINGER JHAZLLERS	1	0			S										X							230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-4	43.334	5	0	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
15	CC	7600979	CAMARGO BOLAÑO JEHITON	1	0			S								X									230301	1.944.468	311.200	0	0	0	0	EPS002	1.944.468	77.800	14-4	1.944.468	5	135.400	CCF24	1.944.468	77.800	0	0	0	0	0
16	CC	1103094281	ORTEGA JORGE ENDER SEGUNDO	1	0			S								X									230301	1.320.745	211.400	0	0	0	0	EPS037	1.320.745	52.900	14-4	1.320.745	5	92.000	CCF24	1.320.745	52.900	0	0	0	0	0
17	CC	1022393506	CERQUERA SUAREZ JULIAN ALBERTO	1	0			S																	230301	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS002	563.334	22.600	14-4	563.334	5	39.300	CCF24	563.334	22.600	0	0	0	0	0
18	CC	1022393506	CERQUERA SUAREZ JULIAN ALBERTO	1	0			S													X				230301	736.667	117.900	0	0	0	0	EPS002	736.667	29.500	14-4	736.667	5	0	CCF24	736.667	29.500	0	0	0	0	0
19	CC	1006148223	MORENO GONZALEZ BRENDA	1	0			S								X									230301	2.775.532	444.100	0	0	0	0	EPS008	2.775.532	111.100	14-4	2.775.532	5	193.200	CCF24	2.775.532	111.100	0	0	0	0	0
20	CC	1143325859	FUENTES CUESTAS ESTEFANY DEL ROSARIO	1	0			S								X									230301	2.267.872	362.900	0	0	0	0	ESSC24	2.267.872	90.800	14-4	2.267.872	5	157.900	CCF24	2.267.872	90.800	0	0	0	0	0
21	CC	1072528497	MORALES FERNANDEZ LUIS MIGUEL	1	0			S	X																230301	186.667	29.900	0	0	0	0	EPS005	186.667	7.500	14-4	186.667	5	13.000	CCF24	340.278	13.700	0	0	0	0	0
22	CC	7696056	FLOREZ PARRA BENJAMIN	1	0			S	X							X									230301	880.497	140.900	0	0	0	0	EPS037	880.497	35.300	14-4	880.497	5	61.300	CCF24	965.358	38.700	0	0	0	0	0
23	CC	1047464611	BURGOS RAMIREZ ANDERSON	1	0			S								X									230301	1.524.043	243.900	0	0	0	0	EPS002	1.524.043	61.000	14-4	1.524.043	5	106.100	CCF24	1.524.043	61.000	0	0	0	0	0
24	CC	1066721310	GARAY GUERRA JUAN GUILLERMO	1	0			S								X									230301	1.422.341	227.600	0	0	0	0	EPS002	1.422.341	56.900	14-4	1.422.341	5	99.000	CCF24	1.422.341	56.900	0	0	0	0	0
25	CC	14699366	MORALES VELASCO LUIS ALVEIRO	1	0			S																	230201	1.321.000	211.500	0	0	0	0	EPS002	1.321.000	52.900	14-4	1.321.000	5	92.000	CCF24	1.321.000	52.900	0	0	0	0	0
26	CC	1143855749	FONSECA ROJAS DANIEL ALBERTO	1	0			S	X																230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS012	173.334	7.000	14-4	173.334	5	12.100	CCF24	204.027	8.200	0	0	0	0	0
27	CC	1000506787	CABALLERO FONSECA DANIEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
28	CC	1022438685	URREGO QUITIAN SEBASTIAN CAMILO	1	0			S																	231001	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-4	1.256.667	5	87.500	CCF24	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
29	CC	1022438685	URREGO QUITIAN SEBASTIAN CAMILO	1	0			S										X							231001	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-4	43.334	5	0	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
30	CC	5049144	VASQUEZ CAMARGO ONASIS DE JESUS	1	0			S								X									231001	1.793.723	287.000	0	0	0	0	ESSC07	1.793.723	71.800	14-4	1.793.723	5	124.900	CCF24	1.793.723	71.800	0	0	0	0	0
31	CC	1010195858	FERNANDEZ PINTO JENNIFER ALEXANDRA	1	0			S							X	X									230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
32	CC	1090466867	GALVIS DIAZ ERNESTO	1	0			S																	230301	1.483.333	237.400	0	0	0	0	EPS005	1.483.333	59.400	14-4	1.483.333	5	103.300	CCF24	1.483.333	59.400	0	0	0	0	0
33	CC	1065574688	PINZON GUERRA LISANDRO ALONSO	1	0			S								X									230201	1.373.333	219.800	0	0	0	0	EPS037	1.373.333	55.000	14-4	1.373.333	5	95.600	CCF24	1.373.333	55.000	0	0	0	0	0
34	CC	1075686173	AREVALO ROJAS FABIO LEONARDO	1	0			S	X																230201	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS005	823.334	33.000	14-4	823.334	5	57.400	CCF24	823.334	33.000	0	0	0	0	0
35	CC	1075686173	AREVALO ROJAS FABIO LEONARDO	1	0			S										X							230201	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS005	130.000	0	14-4	130.000	5	0	CCF24	130.000	0	0	0	0	0	0
36	CC	1070307425	TIBAQUIRA USSA LUIS ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	1.330.000	212.800	0	0	0	0	EPS008	1.330.000	53.200	14-4	1.330.000	5	92.600	CCF24	1.330.000	53.200	0	0	0	0	0
37	CC	1006093678	DUCUARA MONTOYA MARIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
38	CC	52358175	VELASQUEZ AREVALO EDITH LILIANA	1	0			S								X									230301	1.540.000	246.400	0	0	0	0	EPS005	1.540.000	61.600	14-4	1.540.000	5	107.200	CCF24	1.540.000	61.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	79939105	$17.521.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
39	CC	1010199088	PERDOMO TOVAR CRISTIAN ANDRES	1	0			S	X																230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS010	693.334	27.800	14-4	693.334	5	48.300	CCF24	693.334	27.800	0	0	0	0	0
40	CC	1010199088	PERDOMO TOVAR CRISTIAN ANDRES	1	0			S									X								230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS010	130.000	0	14-4	130.000	5	0	CCF24	130.000	0	0	0	0	0	0
41	CC	1012354011	HERNANDEZ OSMA WILMER FABIAN	1	0			S	X																230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS008	693.334	27.800	14-4	693.334	5	48.300	CCF24	693.334	27.800	0	0	0	0	0
42	CC	1012354011	HERNANDEZ OSMA WILMER FABIAN	1	0			S									X								230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	0	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
43	CC	1082806955	ZAPATA CARDOSO BRAYAN EDUARDO	1	0			S	X																230301	660.000	105.600	0	0	0	0	EPS005	660.000	26.400	14-4	660.000	5	46.000	CCF24	660.000	26.400	0	0	0	0	0
44	CC	1082806955	ZAPATA CARDOSO BRAYAN EDUARDO	1	0			S									X								230301	240.000	38.400	0	0	0	0	EPS005	240.000	0	14-4	240.000	5	0	CCF24	240.000	0	0	0	0	0	0
45	CC	1143269239	MERCADO CAMARGO YAIR ANDRES	1	0			S	X																230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS048	173.334	7.000	14-4	173.334	5	12.100	CCF24	173.334	7.000	0	0	0	0	0
46	CC	1143269239	MERCADO CAMARGO YAIR ANDRES	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS048	43.334	0	14-4	43.334	5	0	CCF24	43.334	0	0	0	0	0	0
47	CC	1143396750	AGUAS JIMENEZ DEIMER JADITH	1	0			S								X									230301	1.865.638	298.600	0	0	0	0	EPS048	1.865.638	74.700	14-4	1.865.638	5	129.900	CCF24	1.865.638	74.700	0	0	0	0	0
48	CC	9297264	FUENTES SALAS ELVIS ENRIQUE	1	0			S								X									231001	1.660.957	265.800	0	0	0	0	EPS002	1.660.957	66.500	14-4	1.660.957	5	115.700	CCF24	1.660.957	66.500	0	0	0	0	0
49	CC	1013595791	PEÑA FLOREZ MARIA PAULA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
50	CC	1018224742	CARDONA TORRES JUAN MANUEL	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-07, 05:00:44 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1066420541

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 07/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YESICA VANESSA LOAIZA	**Nombre Sucursal**	SUCURSAL	**Código Sucursal**	002
Documento	CC1144142130	**Dirección**	CL 101 #20 - 39 BARRIO COMPARTIR		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3080039		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1111748610	YOSIMAR VALENCIA OCORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 544.100
CC 1112465084	JOSE ERIK OSORIO PULGARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1193519472	JULIAN ESTEBAN TORRES AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 16745860	FREDY BLANCO GENOY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 832.000	$ 318.500	$ 226.400	$ 208.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.649.900	$ 0	$ 1.649.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INFORME DE ENTREGA

Fecha: 22-09-2024	**Contacto: Ing. Edwin Cante**
Cliente: Rama Judicial	**Teléfono: 310 2726793**
Dirección: Carrera 10 No. 12 – 15	**Ciudad: Cali**

Observaciones:

Se realizo el mantenimiento Correctivo – Instalación y desinstalación de aires acondicionados en las ciudades y municipios de SEDE SIRPA BUGA - TULUA Palacio de Justicia, Palmira J-02 pequeñas Causas y competencias multiples, Cartago J-01 civil, Zarzal J02 Promiscuo, El cerrito J01 Y J02, Juzgado promiscuo de Guacari Desintalacion, Palmira Sede Familia, Palmira Palacio de Justicia (j-03 civil cto)

INFORMACION DEL SITIO

NOMBRE SITIO:	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA
CONTACTO:	ING. EDWIN CANTE
DIRECCIÓN:	**Carrera 10 No. 12 – 15**
COORDENADAS:	4°43'58.8"N 74°04'03.4"W
ESPECIFICAR PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL SITIO:	Se tramita los permisos de ingreso con los responsables de Telemática
HORARIO DE TRABAJO:	Lunes a viernes 7 am. a 7 pm., sábado 7 am. a 7 pm.

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN CUANDO SE REQUIERA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA RAMA JUDICIAL EN EL VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-2024-02.

ALCANCE DEL CONTRATO

Se realizo el mantenimiento Correctivo – Instalación y desinstalación de aires acondicionados en las ciudades y municipios de SEDE SIRPA BUGA - TULUA Palacio de Justicia, Palmira J-02 pequeñas Causas y competencias multiples, Cartago J-01 civil, Zarzal J02 Promiscuo, El cerrito J01 Y J02, Juzgado promiscuo de Guacari Desintalacion, Palmira Sede Familia, Palmira Palacio de Justicia (j-03 civil cto)

OBJETIVO DEL INFORME

- Instalaciones de equipos mini Split faltantes.
- Desinstalación e instalación de equipos del sistema de aire acondicionado. (mini Split de 12.000 – 18.000 - 24.000 – 36.000 btu).

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

- Equipo Mini Split de 12.000 BTU
- Equipo Mini Split de 18.000 BTU
- Equipo Mini Split de 24.000 BTU
- Equipo Mini Split de 36.000 BTU

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES


DESINSTALACION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO


Se inicia la actividad ingresando al sitio de trabajo, se solicita el acompañamiento por parte del área responsable y se procede al sitio que ellos indican.
En sitio se procede a inspeccionar las herramientas a utilizar y los equipos de acceso luego de esto iniciamos des energizando el circuito eléctrico y validamos la ausencia de tensión y se realiza la desconexión del equipo seguido a esto se cortan las tuberías y se desmonta la unidad interna , se retiran la base del equipo y la tubería de refrigeración existentes , luego se dirige a la condensadora se desmonta y se instala la base y condensadora nueva se realiza la instalación de tubería de refrigeración desde esta hasta la unidad interna se realiza el cableado eléctrico y se conecta , se instalan la base y unidad interna se realizan las respectivas conexiones luego de esto se realiza el acople de la tubería en las dos unidades se realiza el barrido con nitrógeno gaseoso se realiza el vacío a 400 micrones , se apertura las válvulas , se energiza el circuito eléctrico y se realiza el arranque del equipo , se ejecuta el protocolo de pruebas y por último se entrega el equipo funcionando a el personal responsable .

REGISTRO FOTOGRAFICO DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO SEDE SIRPA BUGA






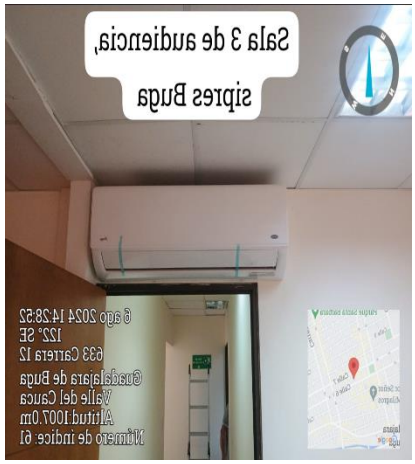

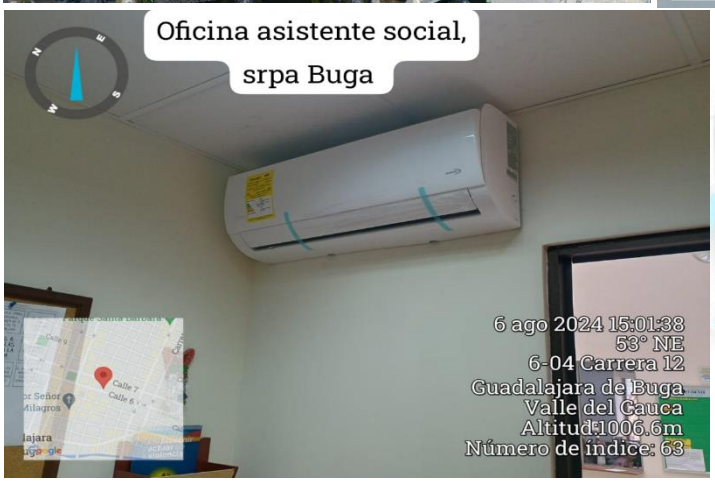






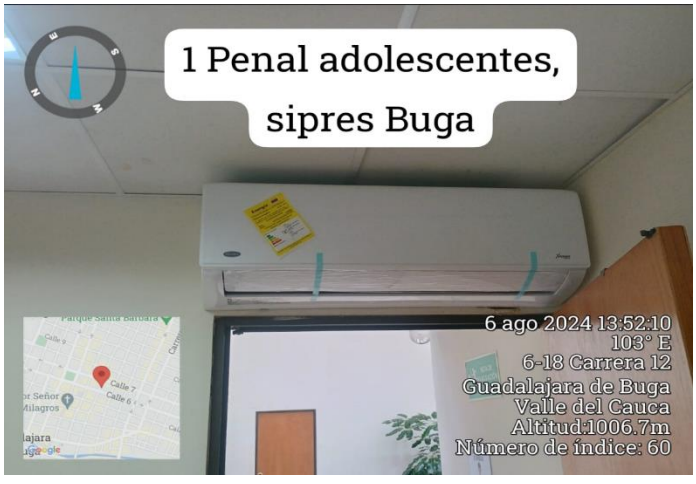

REGISTRO FOTOGRAFICO DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO CARTAGO





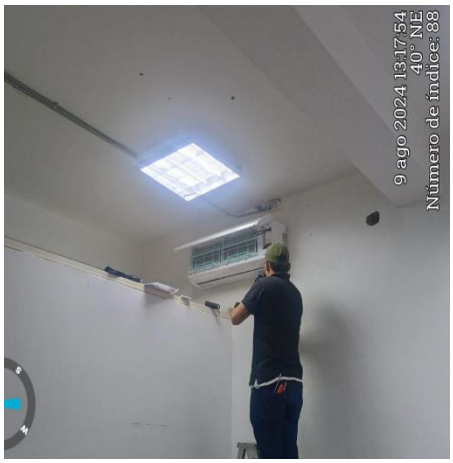










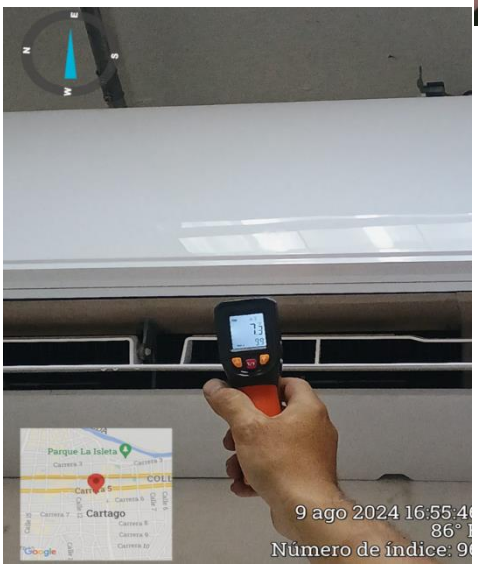



REGISTRO FOTOGRAFICO DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO CERRITO











REGISTRO FOTOGRAFICO DE DESINTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO GUACARI












REGISTRO FOTOGRAFICO: CORRECTIVO REPARACION MOTOR..... JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO PALMIRA







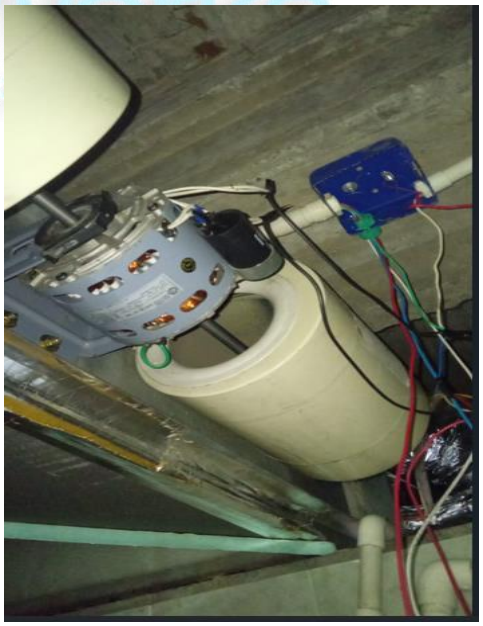

REGISTRO FOTOGRAFICO: INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, JUZGADO PEQUEÑAS CAUSAS PALMIRA



REGISTRO FOTOGRAFICO INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO TULUA
















Carrier
18,000 btu
R 410
Sala audiencias #3
piso 2 palacio justicia
Tulua
13 de septiembre de 2024 11:50 a. m.

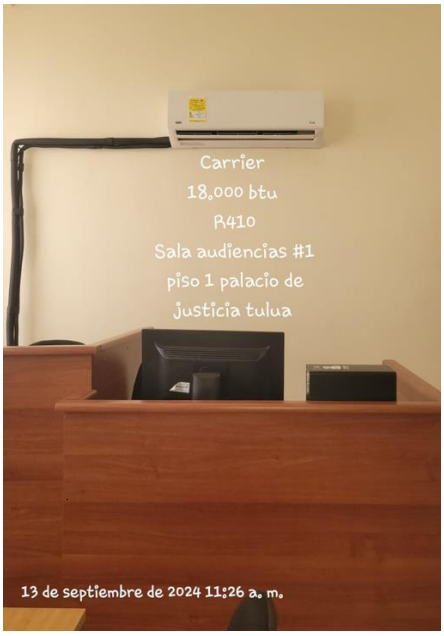
Carrier
18,000 btu
R410
Sala audiencias #1
piso 1 palacio de
justicia tulua
13 de septiembre de 2024 11:26 a. m.


Carrier
18,000 btu
R410
J. 2 civil circuito piso
2 palacio justicia
Tulua
13 de septiembre de 2024 12:06 p. m.

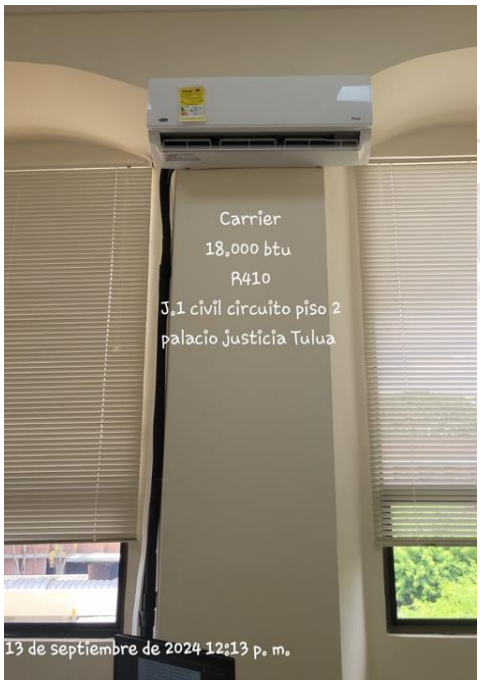
Carrier
18,000 btu
R410
J.1 civil circuito piso 2
palacio justicia Tulua
13 de septiembre de 2024 12:13 p. m.


Carrier
18.000btu
R410
J.3 civil circuito piso
2 palacio de justicia
Tulua
13 de septiembre de 2024 12:19 p. m.


Midea
12.000 btu
R410
J.3 familia piso 2
Palacio justicia
Tulua
13 de septiembre de 2024 3:16 p. m.









REGISTRO FOTOGRAFICO INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO ZARZAL







PROTOCOLO DE ATENCIÓN

El protocolo de soporte establecido en Capital Networks S.A.S va soportado por un área de trabajo, con un equipo dedicado y asignado como sistema único de contacto para responder de manera eficiente y oportuna las solicitudes realizadas por los clientes con relación a soporte de productos ofrecidos por la compañía.

Aplica para todos los portafolios ofrecidos por la compañía. El equipo de trabajo para soporte remoto o en sitio, es un punto de contacto entre los usuarios de la empresa y las tecnologías estándares adoptadas por la misma, y cuyo objetivo principal será responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad a las peticiones que dichos usuarios realicen, con relación a los diversos aspectos de la Tecnología de la Información.

Medios de contacto:
Correos:comercial@capitalnetworks.com.co,
hquiros@capitalnetworks.com.co.proyectos2@capitalnetworks.com.co
Teléfonos: 031-4660328, 3177963991 – 3218061528 - 3124274632

El Ingeniero deberá recibir la solicitud y requerimiento del cliente bien sea mediante vía telefónica, correo electrónico, página web o al dar cierre a un contrato, ya que recibe un Acta de Entrega de parte de la Gerencia de Proyectos para darle a conocer el alcance de los proyectos y las garantías de este.

Una vez recibidos los requerimientos del cliente, el Ingeniero, deberá:

- Verificar el alcance del contrato de servicio o garantía del producto solicitada por el cliente
- Certificar si el equipo o servicio está dentro de los tiempos de garantía
- Reportar si requiere cobro y facturación del servicio solicitado.

Una vez identificado el tipo de servicio a ofrecer, el Ingeniero, asignara una marca y observación para dar seguimiento al caso, adjuntando la información completa del cliente, el equipo, el servicio y de su solicitud, bien sea para monitoreo, configuración, pruebas, programación, software o soporte de manera telefónica o remota.

El Ingeniero, deberá dar solución a los requerimientos y necesidades encontradas en el proceso anterior, de la mano con las personas que se encuentran en sitio (colaboradores, canales, etc.) de esta manera, generará el soporte necesario según los requerimientos identificados.

Si se requiere un mayor escalamiento, e ida personal a sitio, el Ingeniero enviará un informe al cliente y solicitud al Área Técnica para dar inicio al trámite de ingreso a reparación. En este caso, se realiza seguimiento según orden de reparación asignada en laboratorio especializado para poder dar cierre al ticket.

Al ser resuelta la solicitud se enviará el informe técnico respectivo a los correos del cliente:

ecantec@cendoj.ramajudicial.gov.co aospinaca@cendoj.ramajudicial.gov.co

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL

Mitigar lo más posible la generación de residuos y gestionar aquellos que se han producido de la manera mas adecuada cumpliendo las normas de medio ambiente , usar únicamente la energía eléctrica para lo que es necesario y gestionar responsablemente los recursos naturales AGUA reducir o evitar utilizar residuos desechables .

Desinstalación sostenible

Se realizó desmontaje cuidadoso de las tapas del equipo, bandeja y filtro con cuidado para evitar dañar los componentes y maximizar su potencia de reutilización.

Capacitación del personal

Todo el personal involucrado en la instalación y mantenimiento de los aires acondicionado recibirá capacitación sobre prácticas sostenibles, manejo de producto químico y equipos.

Consumo eficiente del agua

Durante el mantenimiento se tuvo en cuenta el uso y el manejo adecuado del agua durante toda la actividad, empleando métodos de limpieza que requirieron menos agua, como la limpieza en seco o la utilización de equipos de limpieza de alta presión o bajo consumo como hidro lavadora de bajo consumo.

Eficiente de la energía

- Algunas medidas para el uso eficiente de energía durante el mantenimiento fueron:
- Ajustar y calibrar los sistemas de aire acondicionado para garantizar un funcionamiento eficiente y reducir el consumo de energía.
- Se aseguro de que las áreas acondicionadas estuvieran correctamente aisladas y selladas para evitar fugas de aire y perdida de energía.
- Se reparó grietas, juntas y otras imperfecciones en los conductos de aires para minimizar la entrada de aire no deseado y la salida de aire acondicionado.
- Lo cual ayudara al sistema de aire de acondicionamiento, en ahorros significativos de energía y al tiempo ayuda al impacto ambiental.

Elaborado por:
Hector Augusto Quiros
Coordinador

AUTORIZACION CORRECTIVOS -CONTRATO No. 023 DE 2024-SAMC-2024- CAPITALNETWORKS S.A.S												
OBJETO	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación y desinstalación cuando se requiera de los equipos de aire acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca.											
MUNICIPIO	**SEDE**	**DETALLE**	**MAERIALES Y REPUESTOS**	**ITEM CONTRACTAL**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**SUB TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**TOTAL**	**OBSERVACIÓN**
BUGA	**ASISTENTE SOCIAL SEDE SIRPA**	**MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 (Incluye Rubatex)	**9**	MTS	13	$ 25.719	$ 4.887	$ 30.606	$ 459.084	**$ 3.035.757**	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	**8**	MTS	13	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 681.205		
			CANALETA PLASTICA 100 MM X 45MM	**NO CONTRACTUAL**	MTS	15	$ 41.875	$ 7.956	$ 49.831	$ 747.469		
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	**NO CONTRACTUAL**	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685		
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	**NO CONTRACTUAL**	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -		
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	**NO CONTRACTUAL**	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	**2**	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soportería)	**32**	MTS	15	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 294.399		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	**NO CONTRACTUAL**	MTS	15	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 237.459		
			Suministro e instalación de juego de Chazos 3/8 x 2" y tipo caiman	**NO CONTRACTUAL**	UND	16	$ 815	$ 155	$ 970	$ 15.518		
			ROLLOS DE CINTA FOAN	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475		
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/2**	**UND**	**1**	**$ 362.569**	**$ 68.888**	**$ 431.457**	**$ -**		**FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA**
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/1**	**UND**	**1**	**$ 243.942**	**$ 46.349**	**$ 290.291**	**$ -**		**FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA**
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	**19**	MTS	16	$ 15.384	$ 2.923	$ 18.307	$ 292.911		
			Suministro e instalación de juego de tornillos 1/4 Para caracasa	**NO CONTRACTUAL**	UND	8	$ 330	$ 63	$ 393	$ 3.142		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	**15**	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390		

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL	OBSERVACIÓN
BUGA	J-2 FAMILIA SEDE SIRPA	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 (Incluye Rubatex)	9	MTS	13	$ 25.719	$ 4.887	$ 30.606	$ 459.084	$ 3.145.477	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	13	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 681.205		
			CANALETA PLASTICA 100 MM X 45MM	NO CONTRACTUAL	MTS	15	$ 41.875	$ 7.956	$ 49.831	$ 747.469		
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685		
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -		
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soportería)	32	MTS	15	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 294.399		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	15	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 237.459		
			Suministro e instalación de juego de Chazos 3/8 x 2" y tipo caiman	NO CONTRACTUAL	UND	16	$ 815	$ 155	$ 970	$ 15.518		
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475		
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/2**	**UND**	**1**	**$ 362.569**	**$ 68.888**	**$ 431.457**	**$ -**		**FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA**
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/1**	**UND**	**1**	**$ 243.942**	**$ 46.349**	**$ 290.291**	**$ -**		**FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA**
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	1	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 109.719		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	19	MTS	16	$ 15.384	$ 2.923	$ 18.307	$ 292.911		
			Suministro e instalación de juego de tornillos 1/4 Para caracasa	NO CONTRACTUAL	UND	8	$ 330	$ 63	$ 393	$ 3.142		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390		

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL	OBSERVACIÓN
BUGA	CAMARA GECELL SEDE SIRPA	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 (Incluye Rubatex)	9	MTS	15	$ 25.719	$ 4.887	$ 30.606	$ 459.084	$ 3.388.130	cotizacion corregida
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	15	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 786.005		
			CANALETA PLASTICA 100 MM X 45MM	NO CONTRACTUAL	MTS	15	$ 41.875	$ 7.956	$ 49.831	$ 747.469		
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685		
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -		
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846		
			Manguera transparente	NO CONTRACTUAL	MTS	10	$ 5.500	$ 1.045	$ 6.545	$ 65.450		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	17	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 269.120		
			Suministro e instalación de juego de Chazos 3/8 x 2" y tipo caiman	NO CONTRACTUAL	UND	18	$ 815	$ 155	$ 970	$ 17.457		
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475		
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1		$ -	$ -	$ -		FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/1	UND	1		$ 46.349	$ 290.291	$ -		FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	1	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 109.719		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	19	MTS	16	$ 15.384	$ 2.923	$ 18.307	$ 292.911		
			Suministro e instalación de juego de tornillos 1/4 Para caracasa	NO CONTRACTUAL	UND	8	$ 330	$ 63	$ 393	$ 3.142		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390		
			SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR - BOMBA DE CONDENSADO	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200		

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL	OBSERVACIÓN
BUGA	J-1 ADOLESCENTES	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 18.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 (Incluye Rubatex)	9	MTS	15	$ 25.719	$ 4.887	$ 30.606	$ 459.084	$ 3.268.721	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	15	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 786.005		
			CANALETA PLASTICA 100 MM X 45MM	NO CONTRACTUAL	MTS	14	$ 41.875	$ 7.956	$ 49.831	$ 697.638		
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685		
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -		
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soportería)	32	MTS	15	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 294.399		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	17	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 269.120		
			Suministro e instalación de juego de Chazos 3/8 x 2" y tipo caiman	NO CONTRACTUAL	UND	16	$ 815	$ 155	$ 970	$ 15.518		
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475		
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ -		FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/1	UND	1	$ 243.942	$ 46.349	$ 290.291	$ -		FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	1	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 109.719		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	19	MTS	18	$ 15.384	$ 2.923	$ 18.307	$ 329.525		
			Suministro e instalación de juego de tornillos 1/4 Para caracasa	NO CONTRACTUAL	UND	8	$ 330	$ 63	$ 393	$ 3.142		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390		

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL	OBSERVACIÓN
BUGA	ADOLESCENTES SEDE SIRPA	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 18.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 (Incluye Rubatex)	9	MTS	15	$ 25.719	$ 4.887	$ 30.606	$ 459.084	$ 3.268.721	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	15	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 786.005		
			CANALETA PLASTICA 100 MM X 45MM	NO CONTRACTUAL	MTS	14	$ 41.875	$ 7.956	$ 49.831	$ 697.638		
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685		
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -		
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soportería)	32	MTS	15	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 294.399		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	17	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 269.120		
			Suministro e instalación de juego de Chazos 3/8 x 2" y tipo caiman	NO CONTRACTUAL	UND	16	$ 815	$ 155	$ 970	$ 15.518		
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475		
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ -		FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/1	UND	1	$ 243.942	$ 46.349	$ 290.291	$ -		FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	1	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 109.719		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	19	MTS	18	$ 15.384	$ 2.923	$ 18.307	$ 329.525		
			Suministro e instalación de juego de tornillos 1/4 Para caracasa	NO CONTRACTUAL	UND	8	$ 330	$ 63	$ 393	$ 3.142		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390		

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL	OBSERVACIÓN
BUGA	SALA 3 ADOLESCENTES SEDE SIRPA	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 24.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	13	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 504.941	$ 3.110.808	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye Rubatex)	10	MTS	12	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 705.807		
			CANALETA PLASTICA 100 MM X 45MM	NO CONTRACTUAL	MTS	15	$ 41.875	$ 7.956	$ 49.831	$ 747.469		
			codos 3/8 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	7	$ 2.832	$ 538	$ 3.370	$ 19.827		
			codos 5/8de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.400	$ 456	$ 2.856	$ 14.280		
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -		
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soportería)	32	MTS	15	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 294.399		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	14	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 221.628		
			Suministro e instalación de juego de Chazos 3/8 x 2" y tipo caiman	NO CONTRACTUAL	UND	16	$ 815	$ 155	$ 970	$ 15.518		
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475		
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ -		FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/1	UND	1	$ 243.942	$ 46.349	$ 290.291	$ -		FACTOR CALIDAD OFERTA ECONIMICA
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	19	MTS	16	$ 15.384	$ 2.923	$ 18.307	$ 292.911		
			Suministro e instalación de juego de tornillos 1/4 Para caracasa	NO CONTRACTUAL	UND	8	$ 330	$ 63	$ 393	$ 3.142		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390		
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	2	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ 93.717	$ 2.069.781	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE R410A (Cilindro x 25 Lbs.)	5	UND	3	$ 485.719	$ 92.287	$ 578.006	$ 1.734.018		
			Nitrogeno gaseoso	NO CONTRACTUAL	MTS	3	$ 67.800	$ 12.882	$ 80.682	$ 242.046		
										TOTAL	$ 21.287.395	

MARIA DEL SOCORRO MARIN
autorizado 17-julio 2024

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES

NIT. 830.086.643-6

Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 08.08.2024.

CLIENTE: rama judicial (Buga).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [x] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: minisplith.
MARCA: Carrier.
MODELO:
SEDE: juzgado 2 familia juez.
DE SERIE:
capa 12.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion:

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: instalación equipo minisplith, cableado electrico fabrica, desagüe pendiente correctivo en red principal desagüe

Observaciones despues de la intervencion: Condensar fabrica

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION	FIRMA DEL CLIENTE
	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 6 agosto/24

CLIENTE: rama judicial (buga)

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Mini Split

MARCA: Camer.

MODELO:

SEDE: 1 penal addecente secretaria - sirpa Buga

DE SERIE: 1 pena/ municipal para adolecentes

capa: 18.000 Btu

Observaciones antes de la intervencion:

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalacion Equipo minisplit. Se utiliza tuberia de cobre, cableado electrico, cabre de control, cable de fuerza, rubatex, gas map, soldadura. Equipo queda operando.

Observaciones despues de la intervencion:

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION	FIRMA DEL CLIENTE
	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 6 agosto /24.

CLIENTE: Rama Judicial (buga)

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

X	INSTALACION.
	DESISNTALACION.
	MTTO. PREVENTIVO.
	MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: mini split.

MARCA: Carrier

MODELO:

SEDE: 1 penal adolecente sirpa. Buga. Juez.

DE SERIE:

capa: 48.000 Btu

Observaciones antes de la intervencion:

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalacion Equipo minisplit se utiliza tuberia de cobre, cableado electrico, cable de control, cable de fuerza, aislante, gas mapp, soldadura. Equipo queda operando.

Observaciones despues de la intervencion:

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES

NIT. 830.086.643-6

Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 6 agosto/24

CLIENTE: Rama Judicial (Buga)

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

X	INSTALACION.
	DESISNTALACION.
	MTTO. PREVENTIVO.
	MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Mini Split

MARCA: Carrier

MODELO: _____

SEDE: Salda 3 de audiencias Sup. Buga

DE SERIE: _____

capa: 24.000 Btu

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo mini split, se utiliza tubería de cobre, cableado electrico, cable de control, cable de fuerza, rubatex, gas map, soldadura equipo queda operando.

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____

FIRMA DEL TECNICO _____

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES

NIT. 830.086.643-6

Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (571) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 6 agosto/21.

CLIENTE: Rama Judicial (Buga)

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Mini split

MARCA: _____

MODELO: _____

SEDE: Asiste social sirpa Buga.

DE SERIE: _____

capa: 12.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalacion equipo mini split, se utiliza tubería de cobre, cableado electrico, cable de control, cable de fuerza, rubatex, gas map soldadura. Equipo queda operando.

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____

FIRMA DEL TECNICO _____

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 6 agosto/ 24

CLIENTE: Rama Judicial (Buga)

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

X	INSTALACION.
	DESISNTALACION.
	MTTO. PREVENTIVO.
	MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Mini Split

MARCA: _____

MODELO: _____

SEDE: Cuarto electrico - SIPA Buga

DE SERIE: Juzgado 1 Familia.

Capa. 18.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalacion equipo minisplit, se utiliza tubena de cobre, cableado electrico, cable de control, cable de fuerza, rubatex, gas map, soldadura. Equipo queda operando.

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____

FIRMA DEL TECNICO _____

AUTORIZACION CORRECTIVOS -CONTRATO No. 023 DE 2024-SAMC-2024- CAPITALNETWORKS S.A.S

OBJETO Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación y desinstalación cuando se requiera de los equipos de aire acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca.

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL
TULUA	CUARTO ELECTRICO	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.509.038
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	12	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 628.804	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
		MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.509.038
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	12	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 628.804	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
TULUA	ADO 3 PROMISCUO FA	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 24.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.599.726
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye Rubatex)	10	MTS	12	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 705.807	
			codos 5/8 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.400	$ 456	$ 2.856	$ 14.280	
			codos 3/8 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.200	$ 418	$ 2.618	$ 13.090	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
	J-01 CIVIL CIRCUITO	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 18.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.509.038
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	12	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 628.804	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL
TULUA	J-02 CIVIL CIRCUITO	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.509.038
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	12	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 628.804	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
TULUA	J-03 CIVIL CIRCUITO	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.509.038
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	12	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 628.804	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
TULUA	J-01 CIVIL MUNICIPAL	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 18.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.509.038
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	12	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 628.804	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
TULUA	J-01 CIVIL MUNICIPAL	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 36.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.599.726
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye Rubatex)	10	MTS	12	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 705.807	
			codos 5/8 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.400	$ 456	$ 2.856	$ 14.280	
			codos 3/8 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.200	$ 418	$ 2.618	$ 13.090	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
TULUA	J-02 CIVIL MUNICIPAL	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 18.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.509.038
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	12	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 628.804	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL
TULUA	J-03 CIVIL MUNICIPAL	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 18.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.509.038
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	12	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 628.804	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12.000 a 36.000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
TULUA	ADO 1 PROMISCUO FA	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 24.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	12	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 466.104	$ 2.599.726
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye Rubatex)	10	MTS	12	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 705.807	
			codos 5/8 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.400	$ 456	$ 2.856	$ 14.280	
			codos 3/8 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.200	$ 418	$ 2.618	$ 13.090	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12.000 a 36.000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
TULUA	Juzgado laboral 1	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 18.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	14	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 543.788	$ 2.691.523
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	14	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 733.605	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12.000 a 36.000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
TULUA	Juzgado laboral 2	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 18.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	14	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 543.788	$ 3.019.533
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	14	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 733.605	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	7	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ 328.010	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soporteria)	32	MTS	8	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 157.013	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	12	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 189.967	
			Suministro e instalación juego de tornillos 5/16 para carcasa	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 330	$ 63	$ 393	$ 1.964	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12.000 a 36.000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	3	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 329.158	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
										TOTAL	$ 33.582.538

AUTORIZADO Dra. MARIA DEL SOCORRO MARIN

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: Palacio Justicia. (tulua).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Carrier.
MODELO: 42KHG07805.
SEDE: Sala # 2 - Piso 7.
DE SERIE: 54CL496310634200130020.
cap: 18.000 Btu

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo Minisplith Se Suministra tubería cobre - cable fuerza, cable control rubatex - Soldadura - cableado efectivo.

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____ 3/20/2020

FIRMA DEL TECNICO _____.

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: palacio justicia (tulua).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Carrier.
MODELO: 42KHG018DS.
SEDE: sala audencia #1 piso 1.
DE SERIE: 5456463106 3A200130026.
capa: 18.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalacion equipo Minisplith se utiliza tuberia cobre, cable fuerza, cable control, cableado electrico, soldadura, gas map, rubatex.

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____ 3/20/2023

FIRMA DEL TECNICO _____

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: palacio justicia (tulua).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [x] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Carrier.
MODELO: 42KHC018DS.
SEDE: Sala audiencia #4 piso 2.
DE SERIE: 54CL4963106JA200130016
capa: 18.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalacion equipo Minisplith Se utiliza, tubtna cobre, cable control, cable fuerza, soldadura gas map, rubatex

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____ 31/10/2020

FIRMA DEL TECNICO _____.

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: palacio justicia (tulua).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [x] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Carrier.
MODELO: 42KHG018DS.
SEDE: Sala audiencias #3 piso 2.
DE SERIE: 54CL4963106 3A200130021.
Capa: 18.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo Minisplith se utiliza tubería cable, cable control, cable fuerza, gas map, soldadura, rubatex, cableado electrico.

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____ 31/2020 20 Juliana

FIRMA DEL TECNICO _____.

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: palacio justicia (Tulua).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: carrier.
MODELO: 42KHG018D5.
SEDE: juz. 2 civil circuito piso 2.
DE SERIE: 54CL49631063A200130015.
capa. 18.000 Btu

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo Minisplith se utiliza gas map, soldadura, cable fuerza, cable control cableado electrico rubatex.

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE Karen Alvarez Ruiz.

FIRMA DEL TECNICO _____.

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: Palacio Justicia (tulua).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Mideа
MODELO: MSAFB-12CRDN1-NQOW
SEDE: J.3 familia PUO 2
DE SERIE: 54122000DZU3A170130128
capa: 12.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

	LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo Minisplith. Se utiliza rubatex, tubería cobre, cableado electrico, cable contrl, cable fuerza, soldadura, gas map.

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION	FIRMA DEL CLIENTE Jauf.
	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO _____.

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: palacio justicia.

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [x] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Carrier.
MODELO: 42KHG018DS.
SEDE: juz. 3 civil circuito piso 2.
DE SERIE: 54CL49631063A200130024.
capa: 18.000 Btu

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo Minisplith. Se utiliza gas map, soldadura, cable control, cable fuerza, cableado electrico

Observaciones despues de la intervencion: _____

✓	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION	FIRMA DEL CLIENTE Daniela Trujillo Lance
	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO _____

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: palacio justicia (tulua).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Carrier.
MODELO: 42KHQ018DS.
SEDE: J.T civil municipal piso 2.
DE SERIE: 54CL4963106JA200730073.
capa: 18.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo Minisplith. Se utiliza, tubena cobre, cableado electrico, gas mapi, soldadura rubatex, cable fuerza, cable control.

Observaciones despues de la intervencion: Pendiente cubrir rubatex y resane Paredes.

✓	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION	FIRMA DEL CLIENTE 3/2020 20 buena.
✓	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO _____.

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: palacio justicia. (tulua).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [x] INSTALACION.
- [x] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Midea.
MODELO: MSABf-36HRfNX-MQOW.
SEDE: J.1 civil municipal piso 2.
DE SERIE: 341220003373617013001 7.
capa: 36.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se desmonta equipo y se instala nuevo Se utiliza gas map, Soldadura, rubatex, cableado electrico, cable funda cable control, cableado electrico, equipo operando.

Observaciones despues de la intervencion: Pendiente cubrir rubatex y resane de paredes.

[x]	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
[x]	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____ 3/2020 20 Jan

FIRMA DEL TECNICO _____.

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: Palacio Justicia (Tulua).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [X] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Carrier.
MODELO: 42KHQ022DS.
SEDE: J.1 familia.
DE SERIE: 54CL49631083A2001300710.
Capa: 24.000 Btu

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza desmonte equipo antiguo y se instala equipo nuevo, se utiliza, soldadura, gas map, cable control, cable fuerza, cableado electrico, rubatex.

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION OK	FIRMA DEL CLIENTE 31/2020
	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO _____

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: palacio justicia Ctulca

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Carrier.
MODELO: 42KHQ018DS.
SEDE: J. 7. civil circuito 2 piso.
DE SERIE: 54CL4963106 3A2001300 23
capa: 18.000 Btu.

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo Minisplith. Se utiliza gas map, soldadura, cable control, cable fuerza, rubatex, equipo queda operativo.

Observaciones despues de la intervencion: Pendiente colocación de las canaletas para cubrir el rubatex.

✓	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION ✓
✓	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____ 31/02/2020

FIRMA DEL TECNICO _____.

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES

NIT. 830.086.643-6

Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: palacio justicia (tulua).

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Midea.
MODELO: MSAFB-12CRDN1-NQ0W
SEDE: cuarto tecnico.
DE SERIE: 54122000D203A170130225
Capa: 12.000 Btu

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalacion Minisplith. Se utiliza rubatex, gas map, cable control, cable teena, Cableado electrico, soldadura, equipo operativo.

Observaciones despues de la intervencion: _____

✓	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION ✓
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____ 31/2020

FIRMA DEL TECNICO _____.

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES

NIT. 830.086.643-6

Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 20-09-24.

CLIENTE: Palacio justicia Tulua.

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplith.
MARCA: Carrier.
MODELO: 42KHQD220S.
SEDE: Juzgado 3 promiscuo de flia
DE SERIE: 54CL4963108 3A200130034
cap: 24.000 Btu

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo Minisplith se utiliza tubería cobre, cable control, cable fuerza, soldadura gasmap, rubatex, cableado electrico.

Observaciones despues de la intervencion: _____

X	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION	FIRMA DEL CLIENTE _____
	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO _____

JUDITH HENAO MUÑOZ c.c. 31.202.020

AUTORIZACION CORRECTIVOS -CONTRATO No. 023 DE 2024-SAMC-2024- CAPITALNETWORKS S.A.S	
OBJETO	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación y desinstalación cuando se requiera de los equipos de aire acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca.

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL
PALMIRA	J-PEQUEÑAS CAUSAS	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 (Incluye Rubatex)	9	MTS	9	$ 25.719	$ 4.887	$ 30.606	$ 459.084	$ 2.695.612
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	8	MTS	9	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 471.603	
			CANALETA PLASTICA 100 MM X 45MM	NO CONTRACTUAL	MTS	9	$ 41.875	$ 7.956	$ 49.831	$ 448.481	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	11	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 174.136	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/1	UND	1	$ 243.942	$ 46.349	$ 290.291	$ 290.291	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	19	MTS	11	$ 15.384	$ 2.923	$ 18.307	$ 201.377	

CARTAGO	**J-02 CIVIL CIRCUITO**	**MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 (Incluye Rubatex)	**9**	MTS	18	$ 25.719	$ 4.887	$ 30.606	$ 550.901	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	**8**	MTS	18	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 943.206	
			CANALETA PLASTICA 100 MM X 45MM	**NO CONTRACTUAL**	MTS	18	$ 41.875	$ 7.956	$ 49.831	$ 896.963	
			codos 1/2 de cobre a 90 Grados	**NO CONTRACTUAL**	UND	5	$ 2.300	$ 437	$ 2.737	$ 13.685	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	**NO CONTRACTUAL**	UND	0	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ -	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	**NO CONTRACTUAL**	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	**2**	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	**$ 4.347.951**
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	**NO CONTRACTUAL**	MTS	20	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 316.611	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/2**	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/1**	UND	1	$ 243.942	$ 46.349	$ 290.291	$ 290.291	
			SUMINSITRO E INSTALACION MOTOR - BOMBA DE CONDENSADO	**NO CONTRACTUAL**	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200,00	$ 333.200	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	**19**	MTS	20	$ 15.384	$ 2.923	$ 18.307	$ 366.139	
		MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 24.000BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10	**18**	MTS	15	$ 16.800	$ 3.192	$ 19.992	$ 299.880	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/2**	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soportería)	**32**	MTS	10	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 196.266	$ 1.425.009
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	**15**	UND	4	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 341.560	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	**2**	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	

ROLDANILLO	**Juzgado 02 Promiscuo Zarzal**	**MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 36.000BTU**	Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/2**	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	**8**	MTS	5	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 262.002	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye Rubatex)	**10**	MTS	5	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 294.086	$ 1.777.958
			CANALETA PLASTICA 25 MM X 10 MM	**NO CONTRACTUAL**	MTS	15	$ 18.750	$ 3.563	$ 22.313	$ 334.688	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10	**18**	MTS	15	$ 16.800	$ 3.192	$ 19.992	$ 299.880	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	**2**	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
										TOTAL	**$ 10.246.530**

MARIA DEL SOCORRO MARIN
autorizado 17-julio 2024

Capital Networks
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 2
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (571) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA: 02-09-2024

CLIENTE: Casa de Justicia

DOCUMENTO CONTROLADO Palmira Valle

TIPO DE SERVICIO:	
X	INSTALACION.
X	DESISNTALACION.
	MTTO. PREVENTIVO.
	MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Minisplit

MARCA: carrier

MODELO: 42KHGQ22DS

SEDE: Palmira Valle

DE SERIE: 540G1916108272270130022

24.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion:

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	R410A
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:	7.5 °C	PRESION DE BAJA:	128 PSI
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:	08 A	VOLTAJE FASE 1:	208/230 V.
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se desintala equipo minisplit y se instala equipo nuevo marca carrier de 24.000 Btu

Observaciones despues de la intervencion: hacerle seguimiento a los desagues, obstruccion

X	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION	FIRMA DEL CLIENTE: 1.113.500.426
	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO: Richard J. Vivas

Scanned with CamScanner

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 27-09-24

CLIENTE: _____.

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

X	INSTALACION.
	DESISNTALACION.
	MTTO. PREVENTIVO.
	MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Carrier.
MARCA: minisplith.
MODELO: 42KHQ18D5
SEDE: Cartago
DE SERIE: _____.
18.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: instalacion equipo minisplith. Cableado y accesorios para su funcionamiento adicional una bomba de condensado.

	LIMPIEZA		TOMA DE VALORES		
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: _____.

Observaciones despues de la intervencion: _____.

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE Angello Merchán R.

FIRMA DEL TECNICO _____.

Scanned with CamScanner

Capital NetWorks
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA: 19/09/24

CLIENTE: 2a12a

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: mini split

MARCA: Coolpo

MODELO: 42HFI30W5D5

SEDE: Torre 1

DE SERIE: 340C986 740314 0950130032

24.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo Minisplith se utiliza, tubería cobre, cableado de fuerza y control, rubatex gas map, base para uca, soldadura, cableado electrico

Observaciones despues de la intervencion: _____

X	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION	FIRMA DEL CLIENTE Luis David Arias H.
	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO Rigo Idrian

Scanned with CamScanner

Capital NetWorks

NIT 830.086.643-6

Cra 73 a # 52a -18 Oficina 208
Bogotá D.C. Colombia
Tel. (57 1) 4660323

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA: 19/09/24

CLIENTE: Palacio justicia

DOCUMENTO CONTROLADO

7 or 7 a 1.

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: mini split

MARCA: mirage

MODELO: MSA6F-36HRFNx-M60W

SEDE: 7 or 7 a 1

DE SERIE: 541220006373819013003 1

36.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se realiza instalación equipo Mini split. Se utiliza, cableado electrico, cable fuera, cable con tal, base para uca, gas map, soldadura, tornabatex.

Observaciones despues de la intervencion: _____

X	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION	FIRMA DEL CLIENTE Luis David Arias H.
	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO Rigo Jotson

Scanned with CamScanner

AUTORIZACION CORRECTIVOS -CONTRATO No. 023 DE 2024-SAMC-2024- CAPITALNETWORKS S.A.S

OBJETO Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación y desinstalación cuando se requiera de los equipos de aire acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca.

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL
EL CERRITO	EL CERRITO J1 PROMISCUO MUNICIPAL	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 24.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	8	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 310.733	$ 2.705.592
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye Rubatex)	10	MTS	8	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 470.538	
			CANALETA PLASTICA 100 MM X 45MM	NO CONTRACTUAL	MTS	8	$ 41.875	$ 7.956	$ 49.831	$ 398.650	
			codos 3/8 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.200	$ 418	$ 2.618	$ 13.090	
			codos 5/8de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.400	$ 456	$ 2.856	$ 14.280	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 39.377	$ 7.482	$ 46.859	$ 46.859	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soportería)	32	MTS	6	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 117.759	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	9	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 142.475	
			Suministro e instalación de juego de Chazos 3/8 x 2" y tipo caiman	NO CONTRACTUAL	UND	11	$ 815	$ 155	$ 970	$ 10.668	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/1	UND	1	$ 243.942	$ 46.349	$ 290.291	$ 290.291	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	19	MTS	9	$ 15.384	$ 2.923	$ 18.307	$ 164.763	
			Suministro e instalación de juego de tornillos 1/4 Para caracasa	NO CONTRACTUAL	UND	8	$ 330	$ 63	$ 393	$ 3.142	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
	EL CERRITO J-2 PROMISCUO MUNICIPAL	MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 24.000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	6	MTS	8	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 310.733	$ 2.658.733
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye Rubatex)	10	MTS	8	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 470.538	
			CANALETA PLASTICA 100 MM X 45MM	NO CONTRACTUAL	MTS	8	$ 41.875	$ 7.956	$ 49.831	$ 398.650	
			codos 3/8 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.200	$ 418	$ 2.618	$ 13.090	
			codos 5/8de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 2.400	$ 456	$ 2.856	$ 14.280	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	5	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 20.176	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4 (Incluyendo accesorios y soportería)	32	MTS	6	$ 16.493	$ 3.134	$ 19.627	$ 117.759	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	9	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 142.475	
			Suministro e instalación de juego de Chazos 3/8 x 2" y tipo caiman	NO CONTRACTUAL	UND	11	$ 815	$ 155	$ 970	$ 10.668	
			ROLLOS DE CINTA FOAN	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 29.475	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/1	UND	1	$ 243.942	$ 46.349	$ 290.291	$ 290.291	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	19	MTS	9	$ 15.384	$ 2.923	$ 18.307	$ 164.763	
			Suministro e instalación de juego de tornillos 1/4 Para caracasa	NO CONTRACTUAL	UND	8	$ 330	$ 63	$ 393	$ 3.142	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DOBLE (ENTRE 20 A 30 AMP)	15	UND	1	$ 71.756	$ 13.634	$ 85.390	$ 85.390	
BUGA	JUZGADO PROMISCUO GUACARI	DESINSTALACION DE EQUIPO	Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/1	UND	1	$ 243.942	$ 46.349	$ 290.291	$ 290.291	$ 290.291
PALMIRA	Juzgado 3 Civil Municipal Palacio Justicia	CORRECTIVO REPARACION MOTOR	Mantemiento correctivo Desmontar y llevar a reparar el Motor	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 680.000	$ 129.200	$ 809.200	$ 809.200	$ 809.200,00
PALMIRA	Juzgado 1 de familia SEDE FAMILIA	Programación	Verificar parámetros de pantalla táctil, incluir unidades del sistema Realizar programación y entrega de zonas dentro del equipo	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 1.350.000	$ 256.500	$ 1.606.500	$ 1.606.500	$ 1.606.500,00
TULUA	PALACIO DE JUSTICIA	MATERIALES CORRECTIVO REEMPLAZO DE RUBATEX Y CINTA FOAM	CINTAS FOAM	NO CONTRACTUAL	UND	2	$ 24.769	$ 4.706	$ 29.475	$ 58.950	$ 427.374,00
			RUBATEX 3/4	NO CONTRACTUAL	UND	10	$ 12.450	$ 2.366	$ 14.816	$ 148.155	
			RUBATEX 1/2	NO CONTRACTUAL	UND	10	$ 9.750	$ 1.853	$ 11.603	$ 116.025	
			RUBATEX 3/8	NO CONTRACTUAL	UND	10	$ 8.760	$ 1.664	$ 10.424	$ 104.244	
										TOTAL	**$ 8.497.690**

AUTORIZADO: MARIA DEL SOCORRO MARIN
AGOSTO-06-2024

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : _____.

CLIENTE: _____.

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [ ] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Carrier. minisplith.

MARCA: Carrier power.

MODELO: 42KHQ022D5

SEDE: Centro - Jurado 1.

DE SERIE: 5400699610827230130001

24.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: instalación equipo de aire nuevo Carrier, desmonte equipo mirage., tubería Cableado - refrigerante. La bomba no se bombea !! quedo operando !! - queda sin punto de aluna.

Observaciones despues de la intervencion: _____

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE Paola Andrea Borgia Torres

FIRMA DEL TECNICO Alfonso - Richard - Bolivar

Scanned with CamScanner

Capital Net

NIT. 830.086.643-6

Cra 73 a # 52a -18 Oficina 2
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (571) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 11-08-2024

CLIENTE: rama judicial.

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [ ] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: minisplith.

MARCA: Comer

MODELO: 42 KBQ24Q5

SEDE: Cuarto — 3400986220514090

DE SERIE: Sala audiencias 2.

24.000 BTU

Observaciones antes de la intervencion:

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: instalación equipo dep aire acondicionado Sala audiencias, fabena, Cableado y desmonte equipo viejo. Se entrega Control remoto

Observaciones despues de la intervencion: NOTA! requiere instalación Cableado de fuerza para que funcione! Sin problemas de Comente en el area.

[ ]	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
[ ]	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

Scanned with CamScanner

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES

NIT. 830.086.643-6

Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 21/08/2019

CLIENTE: Juzgado promiscuo Municipal Guacari.

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [ ] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Mini Split 1 Ton.

MARCA: Pioneer.

MODELO: EMF09B1N

SEDE: 701826

DE SERIE: Guacari Juzgado promiscuo.

Observaciones antes de la intervencion: _____

LIMPIEZA		TOMA DE VALORES			
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: _____

Se realizo desmonte y lavado de equipo. Tipo mini split 1Th.

Observaciones despues de la intervencion: _____

Juzgado Promiscuo Municipal
Guacari - Valle
RECIBIDO

[ ]	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
[ ]	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE _____

FIRMA DEL TECNICO _____

Juzgado Promiscuo Municipal

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES

NIT. 830.086.643-6

Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 06. 09. 24

CLIENTE: palacio N. palmira

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [ ] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [x] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: Fan coil
MARCA: Airflex
MODELO: FCW 060S G
SEDE: AC 0504 2643 Palmira V.
DE SERIE:

Observaciones antes de la intervencion: Juzgado 3. civil del Circuito oficina 207.

	LIMPIEZA		TOMA DE VALORES		
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Reparacion Motor Instalacion y Suministro de Termostato y Cableado

Observaciones despues de la intervencion: Pendiente Instalar el guarda Motor. 25 Septiembre Se ajusto Guarda motor quedando operativo se deja area Sin novedades. 25/09/2024

[ ]	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
[ ]	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE:

FIRMA DEL TECNICO: Freddy Blanco G

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
NIT. 830.086.643-6
Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 22-09-2024

CLIENTE: Rama judicial Palmira

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [ ] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [ ] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: LG Janable.

MARCA: LG

MODELO: ARUV 192 BTE 5

SEDE: Familia Coli — palmira

DE SERIE: 807KCDYDQJ32

Observaciones antes de la intervencion: Se realiza escaneo de equipos variable. Con el programa Lgmv - encontrando equipos operativos con algunas adecuaciones por: realizar, pantalla no tiene Cableado de Comunicación

	LIMPIEZA		TOMA DE VALORES		
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: Se programan temperaturas y velocidad de Ventiladores 21°C Maxima. velocidad para mejorar Condiciones

Observaciones despues de la intervencion:

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION	FIRMA DEL CLIENTE
	TRABAJO PENDIENTE	FIRMA DEL TECNICO

OFIC. SERVICIO TULUA

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES

NIT. 830.086.643-6

Cra 73 a # 52a -18 Oficina 202
Bogotá D.C- Colombia
Tel. (57 1) 4660328

EQUIPOS REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

FECHA : 19 - sptiembre - 2024.

CLIENTE: ramo judicial tulua

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE SERVICIO:

- [X] INSTALACION.
- [ ] DESISNTALACION.
- [ ] MTTO. PREVENTIVO.
- [X] MTTO. CORRECTIVO.

EQUIPO: minisplith.

MARCA: mirage.

MODELO: EMH 26 IN

SEDE: palacio justicia tulua

DE SERIE: 24.000 BTU.

Observaciones antes de la intervencion: instalación robotes y Cinta foam de 3/4 — 1/2 — 3/8

	LIMPIEZA		TOMA DE VALORES		
	LIMPIEZA CONDENSADOR.	TMP. SUCCION:		TIPO DE REFRIGERANTE:	
	LIMPIESA EVAPORADOR.	TMP. INTERNA:		PRESION DE BAJA:	
	REVI. VENTILADOR.	FILTRO SECADOR:		PRESION DE ALTA:	
	LIMPIEZA HELICE.	AMPERAJE F-1:		VOLTAJE FASE 1:	
	LIMPIEZA DRENAJE.	AMPERAJE F-2:		VOLTAJE FASE 2:	
	LIMPIEZA DE FILTROS.	AMPERAJE F-3:		VOLTAJE FASE 3:	

Trabajo efectuado en el equipo: equipo operando correctamente despues del cambio.

Observaciones despues de la intervencion:

	EQUIPO OPERANDO CON SATISFACCION
	TRABAJO PENDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO alvaro osorio.
