INFORME INTERVENTORÍA



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4912 de 2023

CONTRATISTA: INTERCON MVN SAS

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS CMOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

JUNIO 2024

Calle 3A Sur No. 1 – 13 Barrio Los Sauces, Sopó, Cundinamarca, Colombia.
Tel: 300 4957240 - 313 2625522 E-mail: intercon@interconmvn.com

CONTENIDO

CONTENIDO 2
1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1. LOCALIZACION 6
2.1.1. LOCALIZACIÓN CONVENIO DE 2023 VEREDA SALITRE BLANCO BAJO Y CONVENIO DE VEREDA LA MASATA MUNICIPIO DE VILLETA 6
2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA. 10
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 13
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 13
3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 15
3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS. ..... ¡Error! Marcador no definido.
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 16
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA. ..... ¡Error! Marcador no definido.
4.1. INFORME SEMANAL. ..... ¡Error! Marcador no definido.
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 17
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA. 17
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA. 17
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. 17
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO. 17
4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 17
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 17
4.9. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL. 17
4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo. 17
4.9.2. Seguimiento programa de obra. 17
4.9.3. Seguimiento programa de inversiones 18
4.9.4. Actas de Comité de Obra 18
4.9.5. Actas de reunión. 18
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA. 18

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO. 18
5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 19
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES. 20
5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC. 20
5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS. 20
5.6. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 20
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21
6.2. PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORÍA. 21
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA 21
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 21
6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21
6.6. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUMIENTO MENSUAL 21
6.6.1. Seguimiento a la inversión del anticipo 21
6.6.2. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO. 21
6.6.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 21
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22
8. ANEXOS 22
8.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 22
8.2. REGISTRO FOTOGRAFICO 25
8.2.1. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas 27
8.3. BITÁCORA 27

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, titulado "Colombia Potencia Mundial de la Vida" (Ley 2294 del 19 de mayo de 2023), incluye dentro de sus Proyectos Estratégicos de Impacto Regional el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total". Este programa se centra en proporcionar estrategias de impacto social y diálogo a nivel regional, con el principio fundamental de que la paz total y la justicia social se inician a través del diálogo y la concertación con las comunidades.

En consonancia con este enfoque, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), responsable de la planificación y desarrollo de la infraestructura vial a nivel nacional y regional, toma la iniciativa, liderado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS. La meta del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total es atender a 33.102 km de vías terciarias, mejorando la transitabilidad en la red vial regional, incluyendo caminos ancestrales.

A través de este programa, el Gobierno Nacional busca consolidar la gobernabilidad en todo el país, proporcionando oportunidades para mejorar el acceso en las zonas rurales a través de servicios de educación y salud. Además, se busca reducir los impactos ambientales, fomentar la comercialización de productos agrícolas, potenciar la industria del turismo y, de esta manera, impulsar el aumento de la productividad nacional y la integración entre regiones.

En este contexto, las Organizaciones de Acción Comunal de las veredas Salitre Blanco Bajo y La Masata del municipio de Villeta, San Miguel del municipio de Quebradanegra y Furatena Baja del municipio de Útica en el Departamento de Cundinamarca, presentaron postulaciones que resultaron favorecidas con la asignación de recursos para las vías prioritarias, formalizando los siguientes convenios:

No. Convenio	Junta de Accion Comunal	Objeto
4656-2023	SALITRE BLANCO BAJO - VILLETA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SALITRE BLANCO BAJO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

4042-2023	LA MASATA - VILLETA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MASATA DEL MUNICIPIO VILLETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
3173-2023	SAN MIGUEL - QUEBRADANEGRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO QUEBRADANEGRA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
3975-2023	FURATENA BAJA - UTICA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL FURATENA BAJA DEL MUNICIPIO ÚTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Las actividades que se desarrollaran corresponden al Mejoramiento de la vía mediante construcción de tramos de huella y Construcción de obras de drenaje.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra dentro del marco del programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" del Gobierno Nacional, el cual se lleva a cabo a través de la postulación de las Juntas de Acción Comunal para la asignación de recursos destinados a intervenir vías terciarias en sus respectivas veredas.

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales, mediante la provisión de infraestructura vial segura y sostenible. Con este propósito, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), a través del convenio solidario No. De 2023 suscrito con la Organización de acción comunal (OAC) de la Vereda Salitre Blanco Bajo del municipio de Villeta, departamento de Cundinamarca, asigna recursos por un valor de $198.823.137,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas de esta vereda; Convenio solidario No. De 2023 suscrito con la organización de acción comunal (OAC) de la Vereda La Masata del municipio de Villeta, departamento de Cundinamarca, asigna recursos por un valor de $193.275.043,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas de esta vereda; Convenio solidario No. De 2023 suscrito con la Organización de acción comunal (IAC) de la Vereda San Miguel del municipio de Quebradanegra, departamento de Cundinamarca, asigna recursos por un valor de $197.913.973,00 para le ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas de esta vereda, y Convenio solidario No. De 2023 suscrito con la Organización de acción comunal (OAC) de la Vereda Furatena Baja del municipio de Útica, departamento de Cundinamarca, asigna recursos por un valor de $199.543.044,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas de esta vereda.

Esta asignación de recursos tiene como meta principal impulsar el desarrollo socioeconómico de la región, contribuyendo significativamente al bienestar de la comunidad local y fortaleciendo la conectividad en la zona.

2.1. LOCALIZACION

2.1.1. LOCALIZACIÓN CONVENIO DE 2023 VEREDA SALITRE BLANCO BAJO Y CONVENIO DE VEREDA LA MASATA MUNICIPIO DE VILLETA

Villeta es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Cundinamarca. Forma parte de la provincia del Gualivá, de la que es capital. Se sitúa a 91 kilómetros de Bogotá y 330 de Medellín. Villeta es conocida por su producción de panela, por sus festividades, como el Reinado Nacional de La Panela en enero y el Festival Departamental de Bandas en agosto, y por ser la población donde se da inicio a la Ruta del Sol. Es también un importante centro turístico del departamento de Cundinamarca debido a su clima, sus senderos ecológicos,

cascadas, balnearios, fincas paneleras e infraestructura hotelera. Tiene una superficie de 140 km² (14.000 Has). Su altitud está comprendida entre los 850 m s. n. m. en el punto denominado Tobia Grande, sobre el límite norte del municipio, y 1950 m s. n. m. en la Vereda la Esmeralda. Su altura sobre el nivel del mar en el casco urbano se encuentra entre 779 y 842 m s. n. m.

Coordenadas:
Latitud: 5°0’46’’ N
Longitud: 74°28’23’’ W

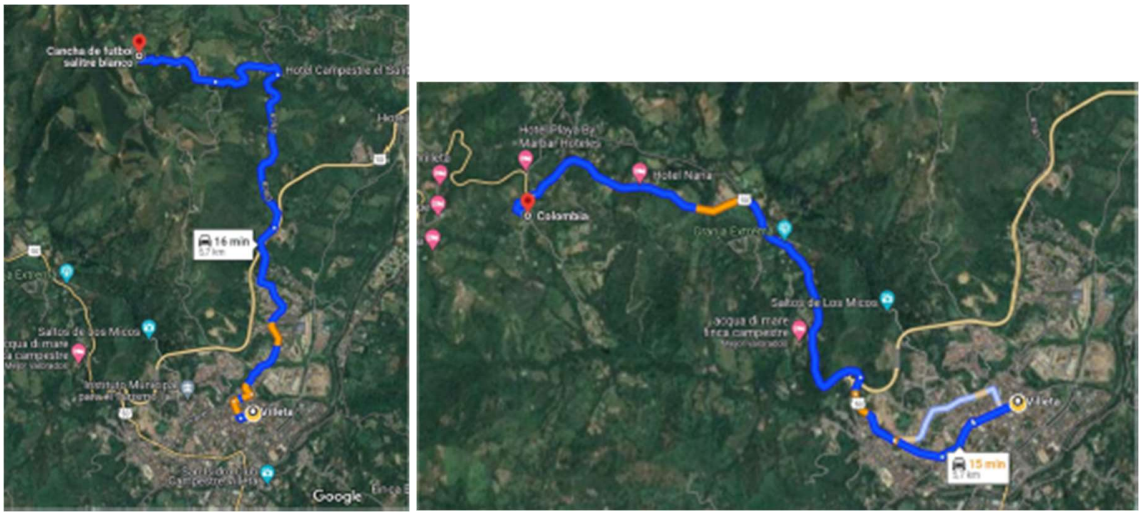


Ilustración 1 Localización del proyecto Fuente Google Earth

2.1.2. LOCALIZACIÓN CONVENIO DE 2023 VEREDA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA

El municipio de Quebradanegra se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, sobre la ladera occidental de la cordillera oriental, formando parte de la provincia del Gualivá y al noroccidente de Santafé de Bogotá. Tiene una superficie de 82.67 kms2, que es equivalente 8.267 has. El Municipio de Quebradanegra basa su economía en las actividades agropecuarias, especialmente en el cultivo de la caña para la producción de panela. Le sigue en importancia el cultivo del café asociado con plátano y la actividad ganadera. Recientemente el municipio se ha visto beneficiado económicamente por el desarrollo turístico para lo cual se han desarrollado complejos de condominios y clubes sociales, como el Club Payande y el desarrollo del casco urbano de la Magdalena.

Coordenadas:

Latitud: 5°7’4’’ N
Longitud: 74°28’48’’ W

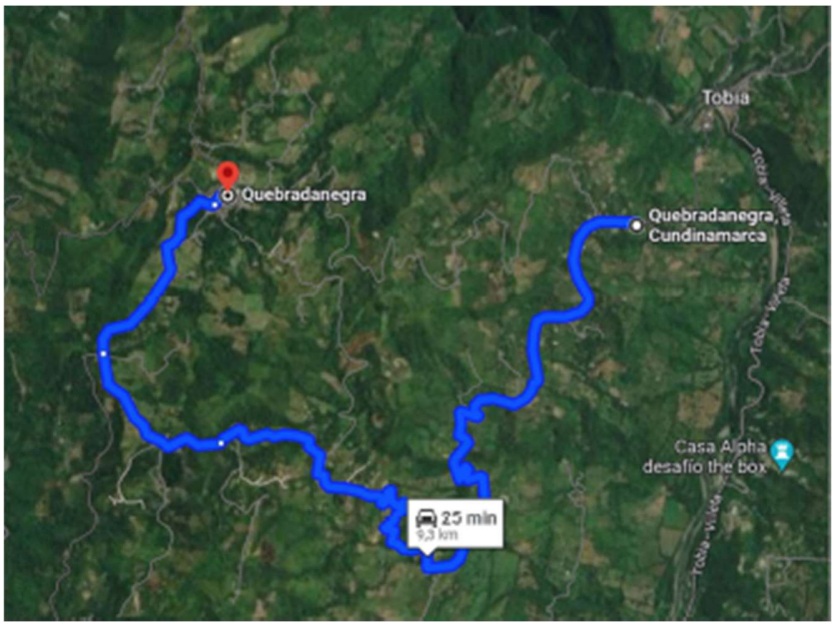


Ilustración 2 Localización del proyecto Fuente Google Earth

2.1.3. LOZALIZACIÓN CONVENIO DE 2023 VEREDA FURATENA BAJA MUNICIPIO DE ÚTICA

El municipio de Útica, se localiza al noroeste del Departamento de Cundinamarca, en la Provincia del Gualivá, con una altura que oscila entre los 400 a 1600 metros sobre el nivel del mar. El casco urbano del municipio de Útica se encuentra localizado a ciento quince (115) Km de distancia de la capital Colombiana a través de la vía a Medellín, desviando a la altura del casco urbano de Villeta por medio de una vía terciaria intermunicipal que pasa por la inspección de La Magdalena. En la extensión del municipio se tienen vías en condición bastante regular, algunas permiten llegar a los municipios de La Palma, Guaduas, Caparrapí, Quebradanegra y La Peña. La economía de municipio es Agropecuaria: En donde se destaca el cultivo de caña y la Ganadería. El patrimonio natural del municipio de Útica, se puede dividir en tres aspectos: su riqueza natural, representada en la flora, la fauna y el recurso hídrico, los cuales tratan los aspectos biológicos; su clima que lo convierte en un potencial turístico y de hecho así ha ocurrido en el pasado, y sus sitios de interés turístico que están relacionados con los dos primeros, que en conjunto conforman el paisaje de la región.

Coordenadas:
Latitud: 5°11’19’’ N
Longitud: 74°28’52’’ W



Ilustración 3 Localización del proyecto Fuente Google Earth

2.2.MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. Vereda Salitre Blanco Bajo y La Masata

La vereda Salitre Blanco Bajo establece conexiones con el municipio de Útica a través de una red vial que en su conjunto facilita el acceso a las cabeceras municipales de dichas localidades.
Ademas, el desarrollo del proyecto simplificará el tránsito de los estudiantes que constituye la mayoría de población que van a desplazarse por la misma. Al mismo tiempo, se mitigarán los riesgos de inundaciones y daños a la infraestructura vial mediante la construcción y mantenimiento de obras de drenaje. De esta manera, el proyecto no solo busca mejorar la conectividad, sino que también tiene un impacto positivo en la seguridad, la economía local y la prevención de daños ambientales.

La vereda La Masata establece conexiones con el municipio de Guaduas a través de una red vial que en su conjunto facilita el acceso a las cabeceras municipales de dichas localidades.

2.2.2. Vereda San Miguel

La vereda San Miguel establece conexiones con el municipio de La Peña a través de una red vial que en su conjunto facilita el acceso a las cabeceras municipales de dichas localidades.

Además, el desarrollo del proyecto simplificará el tránsito de los estudiantes que constituye la mayoría de población que van a desplazarse por la misma. Al mismo tiempo, se mitigarán los riesgos de inundaciones y daños a la infraestructura vial mediante la construcción y mantenimiento de obras de drenaje. De esta manera, el proyecto no solo busca mejorar la conectividad, sino que también tiene un impacto positivo en la seguridad, la economía local y la prevención de daños ambientales.

2.2.3. Vereda Furatena Baja

El Desarrollo del proyecto simplificará el tránsito de los estudiantes que constituye la mayoría de población que van a desplazarse por la misma. Al mismo tiempo, se mitigarán los riesgos de inundaciones y daños a la infraestructura vial mediante la construcción y mantenimiento de obras de drenaje. De esta manera, el proyecto no solo busca mejorar la conectividad, sino que también tiene un impacto positivo en la seguridad, la economía local y la prevención de daños ambientales.

2.3.INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

De acuerdo con la indagación preliminar del estado de las vías antes de ser intervenidas se obtuvo la información consignada a continuación.

2.3.1. VEREDA SALITRE BLANCO BAJO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Villeta del departamento de Cundinamarca, en la vereda Salitre Blanco Bajo, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas NORTE 5.020227, ESTE -74.475962 y punto de referencia final el PR0+200 de coordenadas NORTE 5.021526, ESTE -74.475688, de la vía Camino Real las Panelas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.Se constata que la

totalidad de este tramo carece de una rasante mejorada, unas elevadas pendientes lo cual afecta negativamente la transitabilidad al no cumplir con condiciones óptimas.

Esta carencia de condiciones adecuadas en la rasante se traduce en limitaciones significativas para el paso de vehículos, generando inconvenientes sustanciales para la comunidad local y aquellos que dependen de esta vía para llevar a cabo sus actividades diarias en áreas circundantes. Es evidente que la ausencia de una superficie de rodadura mejorada implica un desafío considerable para la movilidad y representa una preocupación primordial para la comunidad del sector y sus áreas adyacentes.
La intervención del corredor corresponde a 186 ml y se efectuara mediante la construcción de placas huella.

2.3.2. VEREDA LA MASATA

2.3.3. VEREDA SAN MIGUEL

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quebradanegra del departamento de Cundinamarca, en la vereda San Miguel teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas NORTE 5.115905, ESTE -74.455248 y punto de referencia final el PR0+326 de coordenadas NORTE 5.116495, ESTE -74.452681, de la vía QUEBRADANEGRA- TOBIA SECTOR ESCUELA, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS. Se constata que la totalidad de este tramo carece de una rasante mejorada, unas elevadas pendientes lo cual afecta negativamente la transitabilidad al no cumplir con condiciones óptimas.

Esta carencia de condiciones adecuadas en la rasante se traduce en limitaciones significativas para el paso de vehículos, generando inconvenientes sustanciales para la comunidad local y aquellos que dependen de esta vía para llevar a cabo sus actividades diarias en áreas circundantes. Es evidente que la ausencia de una superficie de rodadura mejorada implica un desafío considerable para la movilidad y representa una preocupación primordial para la comunidad del sector y sus áreas adyacentes.
La intervención del corredor corresponde a 180 ml y se efectuara mediante la construcción de placas huellas y construcción de 1 alcantarilla.

2.3.4. VEREDA FURATENA BAJA

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Utica del departamento de Cundinamarca, en la vereda Furatena Baja, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas NORTE 5.205958, ESTE -74.46736 y punto de referencia final el PR0+210 de coordenadas NORTE 5.204259, ESTE -74.467944, de la vía Furatena-Utica Sector las Moyas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.

. Se constata que la totalidad de este tramo carece de una rasante mejorada, unas elevadas pendientes lo cual afecta negativamente la transitabilidad al no cumplir con condiciones óptimas.

Esta carencia de condiciones adecuadas en la rasante se traduce en limitaciones significativas para el paso de vehículos, generando inconvenientes sustanciales para la comunidad local y aquellos que dependen de esta vía para llevar a cabo sus actividades diarias en áreas circundantes. Es evidente que la ausencia de una superficie de rodadura mejorada implica un desafío considerable para la movilidad y representa una preocupación primordial para la comunidad del sector y sus áreas adyacentes.
La intervención del corredor corresponde a 190 ml y se efectuara mediante la construcción de placas huella.

2.4.CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del instituto nacional de vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Las juntas de acción comunal deberán gestionar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

El alcance priorizado para el corredor consiste en la construcción de las obras de infraestructura vial para el MEJORAMIENTO DE VÍASD TERCIARIAS en los municipios de Villeta, Quebradanegra y útica en el departamento de Cundinamarca, comprende las siguientes intervenciones:

- En conjunto con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) realizar la revision e implementación del contenido de CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o pavimentos y/u obras de contención y/o aplicación de nuevas tecnologias en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA	
No. CONVENIO	4656-2023
CONTRATISTA	JAC SALITRE BLANCO BAJO
REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA ROJAS GONGORA
VALOR TOTAL	$ 198.823.137,00
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	28/12/2023
FECHA REINICIO No. 1	16/02/2024
FECHA TERMINACIÓN No. 2	19/02/2024
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	30/07/2024
ESTADO	EN EJECUCIÓN
No. CONVENIO	4042-2023
CONTRATISTA	JAC LA MASATA
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ HELENA HERNANDEZ MOJICA
VALOR TOTAL	$ 193.572.043,00

FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	28/12/2023
FECHA REINICIO No. 1	16/02/2024
FECHA TERMINACIÓN No. 2	19/02/2024
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	30/07/2024
ESTADO	EN EJECUCION
MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA – CUNDINAMARCA	
No. CONVENIO	3173-2023
CONTRATISTA	JAC SAN MIGUEL
REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA DEISY AVILA MEDINA
VALOR TOTAL	$ 197.913.973,00
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	28/12/2023
FECHA REINICIO No. 1	16/02/2024
FECHA TERMINACIÓN No. 2	19/02/2024
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	30/07/2024
ESTADO	EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO DE ÚTICA – CUNDINAMARCA	
No. CONVENIO	3975-2023
CONTRATISTA	JAC FURATENA BAJA
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA ROCIO OLAYA REINA
VALOR TOTAL	$ 199.543.044,00
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	28/12/2023
FECHA REINICIO No. 1	16/02/2024
FECHA TERMINACIÓN No. 2	19/02/2024
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	30/07/2024
ESTADO	EN EJECUCIÓN

Tabla N°1 *información básica del contrato de obra*

3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

En el periodo comprendido en el mes de Junio de 2024, se llevó a cabo actividades administrativas para el inicio y ejecución del proyecto se realiza verificación de medidas según diseños y se verifica también dosificación de mezclas y aceros.

A la fecha y teniendo en cuenta los inicios de obras pasados, tres de los cuatro convenios solidarios han finalizado labores de ejecución de obra y se encuentran en la ejecución de obras sociales siguiendo los lineamientos establecidos por el PAGA.

El movimiento financiero del convenio solidario 4656 de 2023 es de $199.987.353,76 dentro de los cuales se encuentran materiales de obra, nóminas, tramites documentales, maquinaria, pago de aportes legales y honorarios de profesionales, su ejecución de obra finalizó el 31 de Mayo de 2024, adicional se hace mención del gran trabajo de la señora presidenta y la comunidad de la vereda Salitre Blanco Bajo quienes a base de donación de material y/o mano de obra consiguieron ampliar la meta del proyecto.

El movimiento financiero del convenio solidario 4042 de 2023 es de $176.627.688,82 dentro de los cuales se encuentran materiales de obra, nóminas, tramites documentales, maquinaria, pago de aportes legales y honorarios de profesionales, sin embargo aún se encuentran pendientes los pagos de dos meses de aportes legales, alquiler de maquinaria y algunas facturas de materiales para la ejecución de obra social y pendientes de obra general, su ejecución finalizó el día 15 de Junio de 2024.

El movimiento financiero del convenio solidario 3173 de 2023 es de $180.905.904,94 dentro de los cuales se encuentran materiales de obra, nóminas, tramites documentales, maquinaria, pago de aportes legales y honorarios de profesionales e incluso refrigerios de plan social, sin embargo se encuentra pendiente pago de planilla de aportes legales del presente mes, nómina final y liquidaciones y los últimos pagos para el PAGA final, su ejecución finalizó el día 15 de Junio de 2024.

Ahora bien, para el convenio solidario 3975 de 2023 se da inicio de ejecución de obra hasta el día 15 de Junio de 2024, motivo por el cual el movimiento financiero es de $109.940.669,72 el mayor rubro es por un valor de $52.948.415 que corresponde a la compra de material para inicio de ejecución de obra, teniendo en cuenta la finalización del convenio se exige que se de cumplimiento a la ejecución constante de obra con el fin de llegar a la meta planteada, el retraso en con este convenio ha sido administrativo, el equipo de profesionales no ha rendido de la misma forma y el apoyo de la comunidad para con el proyecto es nulo motivo por el cual el presidente se ha visto sobrecargado con todo lo solicitado, pero se espera que se pongan al día.

3.3.SEGUIMIENTO DE ITEMS NO PREVISTOS

Finaliza con éxito la ejecución del item no previsto en el convenio solidario 3173 de 2023, y evidencia de lo mismo se evidencia en la finalización del proyecto.

3.4.ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

En el periodo del informe se realiza verificación y seguimiento a actividades de:

- Replanteo
- Colocación de formaleta
- Figuración de acero
- Control de mezcla de concreto
- Verificación de niveles
- Verificación del personal, que cuente con sus respectivos EPP y overol de trabajo

Posterior al inicio de obra del último convenio solidario (01) de la vereda de Furatena Baja, se han sorteado algunos inconvenientes que retrasaron el inicio de obra, sin embargo se espera que se cumpla con la meta del proyecto.

De los demás (03) convenios solidarios solo se mantendrá tramites administrativos, ya que se finalizó la ejecución de obra, se hará control al cumplimiento del PAGA y los últimos pagos para dar por finalizado los convenios solidarios y proceder con los respectivos cierres.

3.5.MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

Ejecución de obra de Furatena Baja con herramienta menor.

3.6.PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

Se verifica que el personal de obra cuente con afiliaciones al día además su dotación sea entregada y utilizada por el personal de obra

3.7.INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

Se relacionó el manejo de rubro de cada convenio.

3.8.ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

No se relaciona el resumen del estado general del tiempo.

3.9.RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No se relaciona el resumen de ensayos de laboratorio.

3.10. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el mes.

3.11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

No se relaciona plan de calidad para este proyecto.

3.12. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL.

3.12.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

No se relaciona este mes seguimiento al buen manejo de desembolso y plan de inversión desembolso mensual, puesto que no se han manejado recursos.

3.12.2. Seguimiento programa de obra.

Se realizó requerimiento a la JAC, sin embargo, debido a que no se cuenta con aprobación de profesionales se indica que una vez inicie se allegue dicha documentación.

3.12.3. Seguimiento programa de inversiones

Se realizó requerimiento a la JAC, sin embargo, debido a que no se cuenta con aprobación de profesionales se indica que una vez inicie se allegue dicha documentación.

3.12.4. Actas de Comité de Obra

De acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio Solidario se realizarán comités operativos, en los cuales podrán participar las siguientes personas:

a) Representante legal de la OAC (Con voz y voto)
b) Interventoría (Con voz y voto)
c) Representante de veeduría (Con voz y voto)
d) Ingeniero residente de obra (Con voz y sin voto)
e) Contadora de la OAC (Con voz y sin voto)

3.12.5. Actas de reunión.

No se realizaron reuniones.

4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO	4912-32023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA,QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.
CONTRATISTA	INTERCON MVN SAS
NIT	901.483.818-8
REPRESENTANTE	MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS,

SUPERVISOR	ING.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
TÉRMINO INICIAL DEL CONTRATO	31/12/2023
FECHA ACTA DE INICIO	01/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 72.480.208,00
PRORROGA No 01	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	30/07/2024

***Tabla N°2** información básica del contrato de obra*

4.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

a) Efectuar revisión del proyecto, estudiar los documentos contractuales.
b) Disponer la organización y los recursos necesarios para la interventoría.
c) Realizar visita de campo ara el reconocimiento y el cumplimiento de especificaciones y condiciones del corredor a intervenir.
d) Solicitar cotizaciones de estudios y diseños.
e) Verificar y colaborar con el contratista en el trámite de las licencias y permisos necesarios.
f) Realizar seguimiento y acompañamiento de reuniones con la comunidad e interacciones necesarias en el área social.
g) Efectuar el control de registros y archivo de interventoría.
h) Efectuar el control de la correspondencia recibida y enviada.
i) Organizar y desarrollar reuniones y comités de obras.
j) Llevar un registro fotográfico del proyecto.
k) Estudiar sugerencias, reclamaciones y consultas de los convenios.
l) Atender observaciones y lineamientos de la entidad contratante.
m) Realizar la medición de los indicadores del proyecto.
n) Realizar seguimientos de los compromisos pactados para llevar a cabo reunión de socialización, para conformación de la veeduría, y comité operativo, cotizaciones, hojas de vida, entre otros.

4.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.

En el periodo del presente informe la interventoría realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal, llevando a cabo inducción respecto a los diferentes procesos Administrativos que se deben realizar para logar el inicio de las obras, se recopilaron y aclararon las diferentes dudas e inquietudes allegadas por las JAC, y comunidad relacionada con el desarrollo del proyecto.

El acompañamiento del profesional Ambiental para el presente mes se enfoca en la evaluación en conjunto con la interventoría para la medición de la afección en el entorno al finalizar tres proyectos, se evidencia por parte del mismo que la socialización previa le permitió al equipo de profesionales de la interventoría dirigir a las JAC para minimizar el impacto negativo al entorno a tal punto que fue de un 0%.

El acompañamiento del profesional Social para el presente mes se enfocó en el acompañamiento a las JAC de los convenios solidarios que ya finalizaron obra, con el fin de guiarlos al cumplimiento de obra social con inclusión, y posterior a ello programar la socialización de cierre de los convenios.

El área de inspectores se encargó durante el presente mes, con la verificación de materiales, actividades a ejecutar y ejecutadas, cumplimiento de la programación de obra del convenio que se encuentra en ejecución, así como del personal, la SST se encarga de verificar las afiliaciones del personal, entrega y uso correcto de la dotación y EPP, así como de la constante evaluación de herramienta empleada para la ejecución con el fin de mantener en cero el índice que accidentalidad y dar cumplimiento con lo solicitado por el INVIAS y de los convenios solidarios que finalizaron se hace la evaluación final del estado de la obra.

4.4.INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC.

No se relaciona para este contrato.

4.5.INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

No se relaciona para este contrato.

4.6.INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

No se relaciona para este contrato.

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se relaciona formato para el presente periodo.

5.2.PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORÍA.

Se anexa Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 diligenciado.

5.3.INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA.

Se anexa Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 diligenciado.

5.4.SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Se anexa Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 diligenciado.

5.5.SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se relaciona para este contrato.

5.6.OTROS DOCUMENTOS DE SEGUMIENTO MENSUAL

5.6.1. Seguimiento a la inversión del anticipo

No se relaciona para este contrato.

5.6.2. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO.

Se anexa Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 diligenciado.

5.6.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

No se relaciona para el mes, el seguimiento al plan de cargas.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el periodo del informe se destaca el avance en cuanto a los aspectos administrativos y el concomimiento y participación de los diferentes actores para poder de esta manera ejecutar a cabalidad el proyecto. Ha sido de vital importancia el acompañamiento en campo del residente de interventoría, los inspectores (Técnico y SST) y el profesional ambiental que en este mes realizó acompañamiento con el fin de verificar que los entornos ambientales no sean afectados.

Durante el periodo del presente informe, la Interventoría ha realizado los requerimientos necesarios y de manera constante con el único objetivo de cumplir con las obligaciones contractuales y garantizar la ejecución de las obras contempladas en el alcance de los convenios, lo que se evidencia en la finalización de obra de 3 de 4 convenios solidarios.

Se mantiene constante apoyo sobre el convenio solidario de Furatena Baja que a la fecha es el único que se mantiene en inicio de ejecución de obra.

INTERVENTORIA
Masiel Lorena Rodríguez Anzola. **INTERCON MVN SAS** **R.L. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA**

8. ANEXOS

8.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

RELACIÓN CORRESPONDENCIA DEL PERIODO					
consecutivo	fecha	destinatario			asunto
		persona	cargo	entidad	
INTER-4912-2023-045	06/06/2024			INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Entrega informes semanales
INTER-4912-2023-046	07/06/2024	FREDDY BELTRA, ALEXANDRA ROJAS GONGORA, LUZ HELENA	REPRESENTANTE LEGAL	JAC FURATENA BAJA, JAC SALITRE BLANCO BAJO, JAC	Remisión memorando No. Radicado 2024I-VBOG-010672, información retorno

		HERNANDEZ, BLANCA DEISY AVILA		LA MASATA Y JAC SAN MIGUEL	rendimientos financieros
INTER-4912-2023-047	07/06/2024	FREDDY BELTRAN Y LA MASATA	REPRESENTANTE LEGAL	JAC FURATENA BAJA Y JAC LA MASATA	Segunda reiteración diligenciamiento plan de inversión social.
INTER-4912-2023-048	07/06/2024	ALEXANDRA ROJAS GONGORA Y BLANCA DEISY AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	JAC SALITRE BLANCO BAJO Y JAC SAN MIGUEL	Solicitud diligenciamiento de ficha de caracterización socioeconómica.
INTER-4912-2023-049	13/06/2024	FREDDY BELTRAN	REPRESENTANTE LEGAL	JAC FURATENA BAJA	Solicitud inicio de obra.
INTER-4912-2023-050	13/06/2024			INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Entrega informes semanales
INTER-4912-2023-051	14/06/2024			INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Remisión plan de Inversión social
	18/06/2024			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS	Certificación interventoría
	18/06/2024			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS	Solicitud cambio de profesional social.

INTER-4912-2023-052	20/06/2024	BLANCA DEISY AVILA MEDINA	REPRESENTANTE LEGAL	JAC SAN MIGUEL	Remisión NO OBJECIÓN plan de inversión social JAC San Miguel
INTER-4912-2023-051	21/06/2024	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS	Entrega obligaciones formatos sociales del contrato de Interventoría 4912 de 2023 del convenio 4656-2023
INTER-4912-2023-054	25/06/2024	FREDDY BELTRAN	REPRESENTANTE LEGAL	JAC FURATENA BAJA	Solicitud de presencia de residente de obra en campo.
INTER-4912-2023-055	25/06/2024	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS	Entrega obligaciones formatos sociales del contrato de Interventoría 4912 de 2023 del convenio 3173-2023
INTER-4912-2023-056	25/06/2024	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	DIRECCTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS	Solicitud de prorroga en tiempo y adición al contrato de interventoría No. 4912-2023
INTER-4912-2023-058	26/06/2024	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	DIRECTOR TERRITORIAL	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS	Solicitud prorroga en tiempo al Contrato 3975-2023

INTER-4912-2023-059	27/06/2024	FREDDY BELTRA, ALEXANDRA ROJAS GONGORA, LUZ HELENA HERNANDEZ, BLANCA DEISY AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	JAC FURATENA BAJA, JAC SALITRE BLANCO BAJO, JAC LA MASATA Y JAC SAN MIGUEL	Remisión listado documentos cierre convenios ‘’Caminos comunitarios de la Paz Total’’
INTER-4912-2023-061	28/06/2024			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS	Entrega informes semanales


8.2. REGISTRO FOTOGRAFICO








Culminación proyecto La Masata

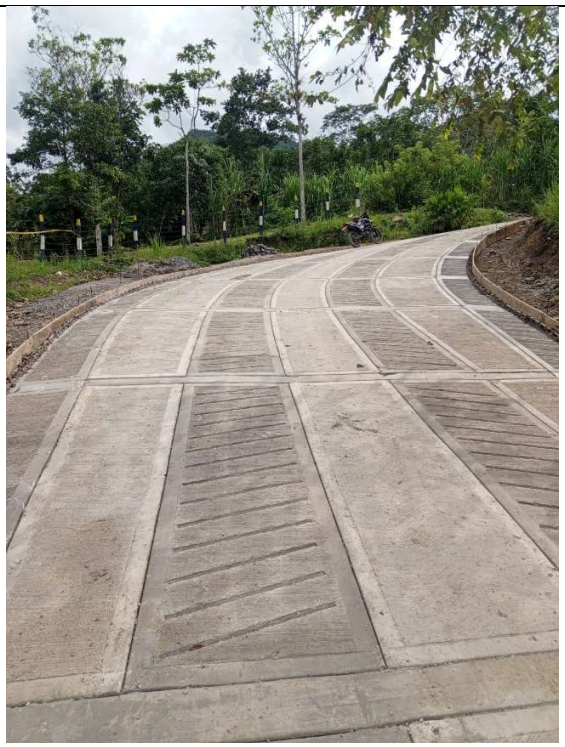

Culminación proyecto San Miguel

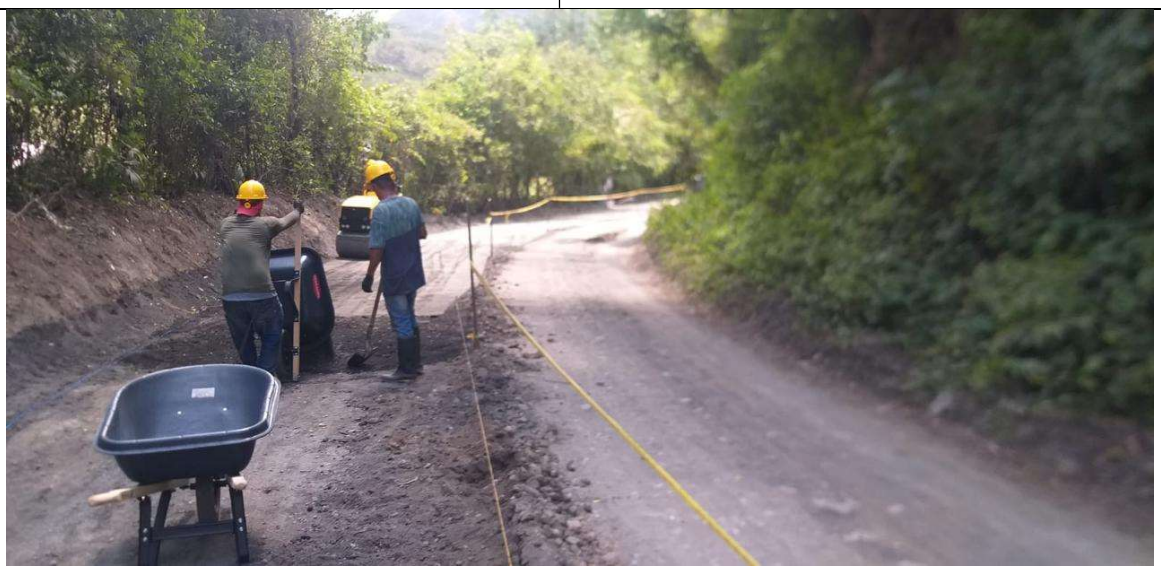



Inicio de ejecución Furatena Baja

8.2.1. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

8.3.BITÁCORA.

Se anexa bitácora de ejecución.

Anexo 1.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INFORMES SEMANALES


FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	VILLETA
CONVENIO SOLIDARIO :	4656 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE SALITRE BLANCO BAJO		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 199.823.137,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	Intercon MVN SAS		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	20	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	6/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%			**% DE AVANCE SEMANAL :**	5%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 200.372.802			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	$ 15.155.000
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	8			**MUJERES EMPLEADAS :**	1

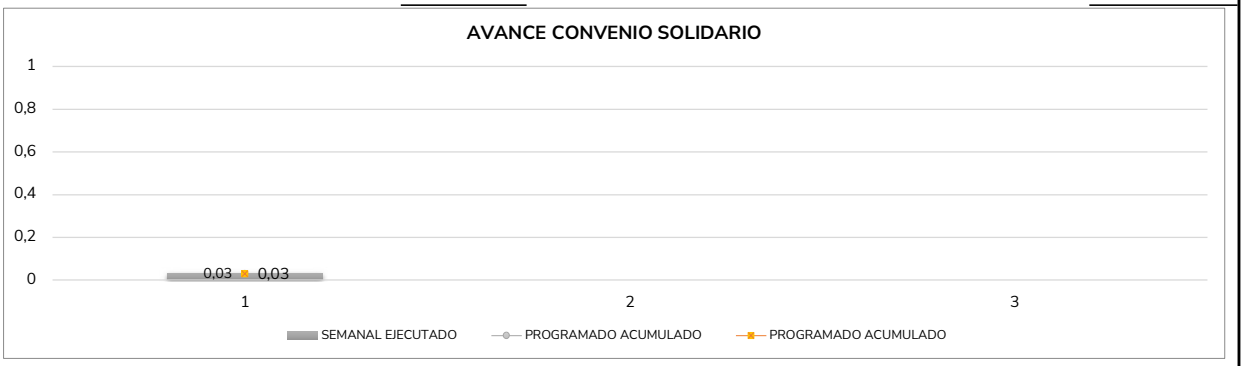

CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	250	250	20	8%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :

SE AUTORIZA PAGOS FINALES A LOS EMPLEADOS DEL CONVENIO,CONTADORA,RESIDENTE,MAESTRO Y DEMAS PERSONAL

RESPONSABLE: Valerie Hernandez **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 6/06/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO








FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	VILLETA
CONVENIO SOLIDARIO :	4656 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE SALITRE BLANCO BAJO		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 199.823.137,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	Intercon MVN SAS		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	21	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	13/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%			**% DE AVANCE SEMANAL :**	5%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 200.372.802			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	$ 15.155.000
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	8			**MUJERES EMPLEADAS :**	1

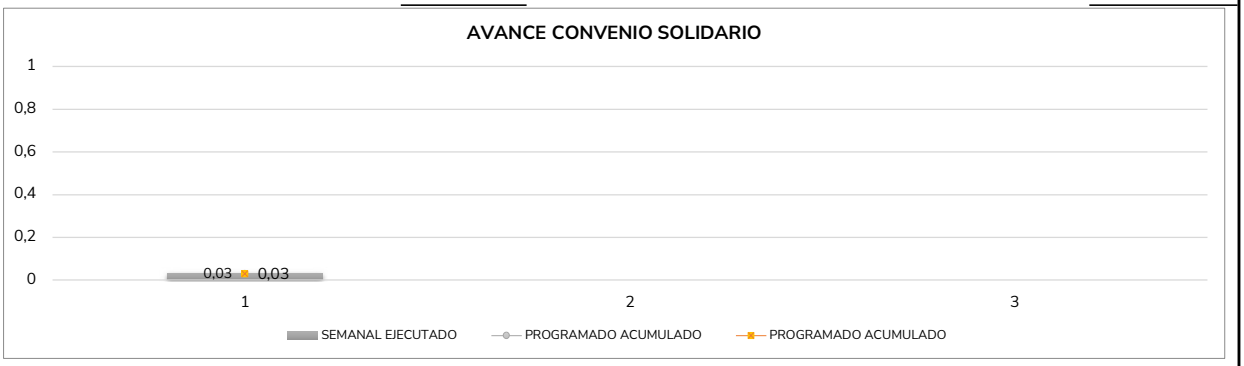

CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	250	250	20	8%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :

SE AUTORIZA PAGOS FINALES A LOS EMPLEADOS DEL CONVENIO,CONTADORA,RESIDENTE,MAESTRO Y DEMAS PERSONAL

RESPONSABLE: Valerie Hernandez **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 13/06/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO








FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	VILLETA
CONVENIO SOLIDARIO :	4656 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE SALITRE BLANCO BAJO		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 199.823.137,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	Intercon MVN SAS		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	22	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	20/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%			**% DE AVANCE SEMANAL :**	5%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 200.372.802			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	$ 23.264.447
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	8			**MUJERES EMPLEADAS :**	1

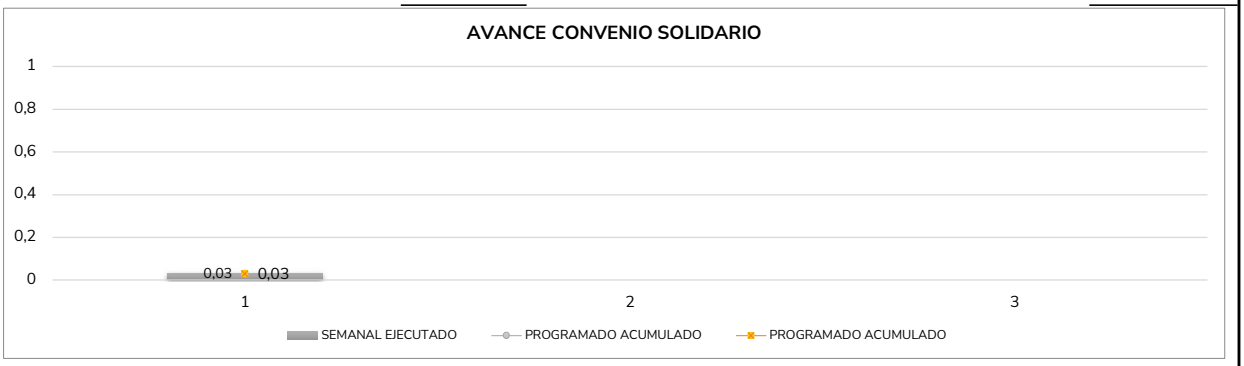

CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	250	250	20	8%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :

SE AUTORIZA PAGOS FINALES A LOS EMPLEADOS DEL CONVENIO,CONTADORA,RESIDENTE,MAESTRO Y DEMAS PERSONAL

RESPONSABLE: Valerie Hernandez **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 20/06/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO








FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	VILLETA
CONVENIO SOLIDARIO :	4656 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE SALITRE BLANCO BAJO		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 199.823.137,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	Intercon MVN SAS		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	24	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	5/07/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%			**% DE AVANCE SEMANAL :**	0%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 200.372.802			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	$ -
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	8			**MUJERES EMPLEADAS :**	1

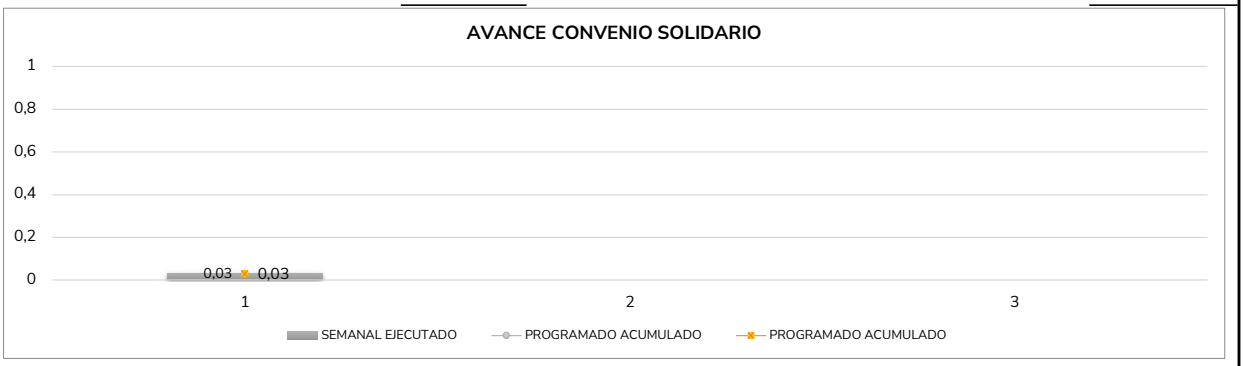

CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	250	250	20	8%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :

AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRA, SE DA PASO A LAS LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SOCIAL

RESPONSABLE: Valerie Hernandez **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 5/07/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO







COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS


ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	VILLETA
CONVENIO SOLIDARIO :	4042 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	Junta de Acción Comunal vereda la Masata Villeta Cundinamarca		
FECHA DE ADJUDICACION:		**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 194.275.043,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERCOM MVN SAS		
FECHA DE ADJUDICACION:		**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	20	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	6/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	90%			**% DE AVANCE SEMANAL :**	5%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 148.972.613			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	5			**MUJERES EMPLEADAS :**	0

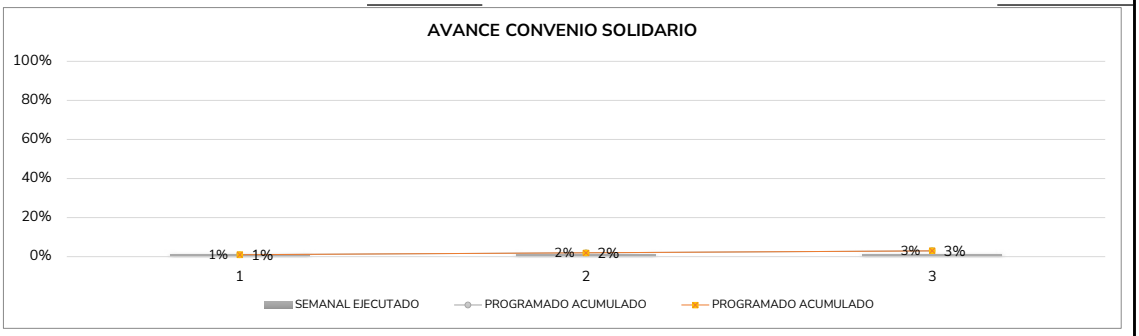

CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	195	185	10	5%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :

RESPONSABLE: JAIRO ROBAYO **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 6/06/2024

ANOTACIONES Y ANEXOS

continua amarre de acero de refuerzo, fundida de huella, cuneta,ciclopeo según diseños, se sacan muestras de concreto para laboratorio




FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	VILLETA
CONVENIO SOLIDARIO :	4042 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	Junta de Acción Comunal vereda la Masata Villeta Cundinamarca		
FECHA DE ADJUDICACION:		**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 194.275.043,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERCOM MVN SAS		
FECHA DE ADJUDICACION:		**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	21	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	13/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%			**% DE AVANCE SEMANAL :**	5%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 148.972.613			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	5			**MUJERES EMPLEADAS :**	0

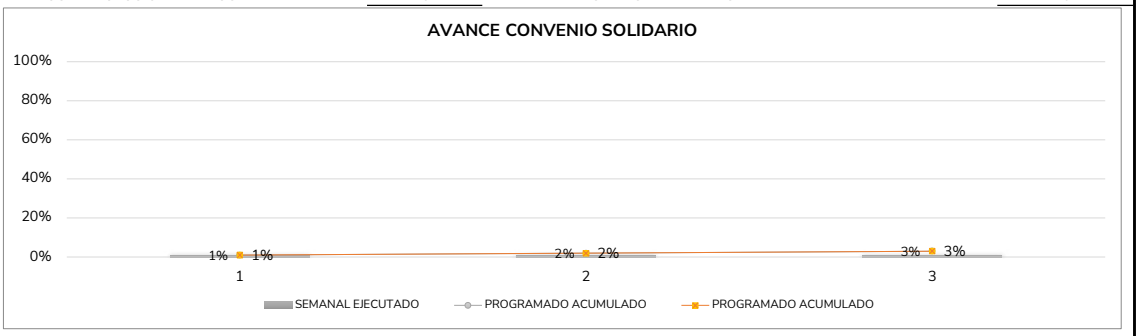

CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	195	195	10	5%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION : se termina fundida de huella.ciclopeo,cuneta y bordillo según lo estipulado se realiza jornada de aseo

RESPONSABLE: JAIRO ROBAYO **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 13/06/2024

ANOTACIONES Y ANEXOS

se termina fundida de huella.ciclopeo,cuneta y bordillo según lo estipulado se realiza jornada de aseo



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS


ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	VILLETA
CONVENIO SOLIDARIO :	4042 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	Junta de Acción Comunal vereda la Masata Villeta Cundinamarca		
FECHA DE ADJUDICACION:		**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 194.275.043,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERCOM MVN SAS		
FECHA DE ADJUDICACION:		**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	22	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	20/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%			**% DE AVANCE SEMANAL :**	5%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 148.972.613			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	5			**MUJERES EMPLEADAS :**	0

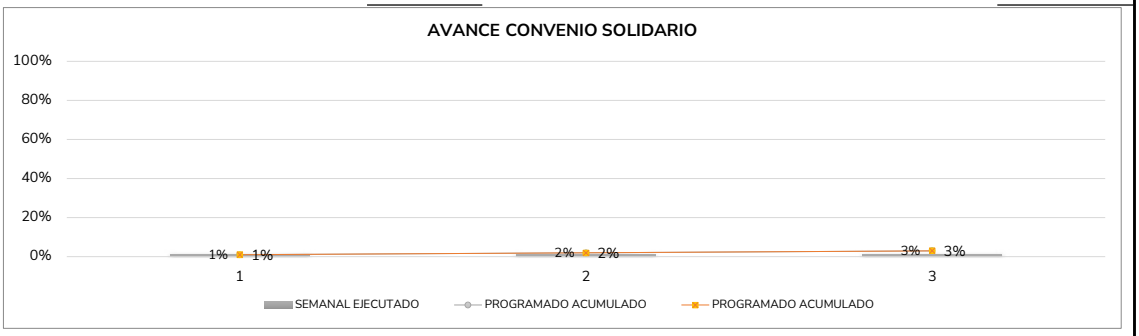

CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	195	195	10	5%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION :

RESPONSABLE: JAIRO ROBAYO **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 20/06/2024

ANOTACIONES Y ANEXOS

se termina fundida de huella.ciclopeo,cuneta y bordillo según lo estipulado se realiza jornada de aseo



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS


ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	VILLETA
CONVENIO SOLIDARIO :	4042	**DE**	2023
CONTRATISTA :	Junta de Acción Comunal vereda la Masata Villeta Cundinamarca		
FECHA DE ADJUDICACION:		**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 194.275.043,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERCOM MVN SAS		
FECHA DE ADJUDICACION:		**FECHA DE INICIO :**	16/01/2023
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	24	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	5/07/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%			**% DE AVANCE SEMANAL :**	0%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 176.627.689			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	$ -
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :	5			**MUJERES EMPLEADAS :**	0

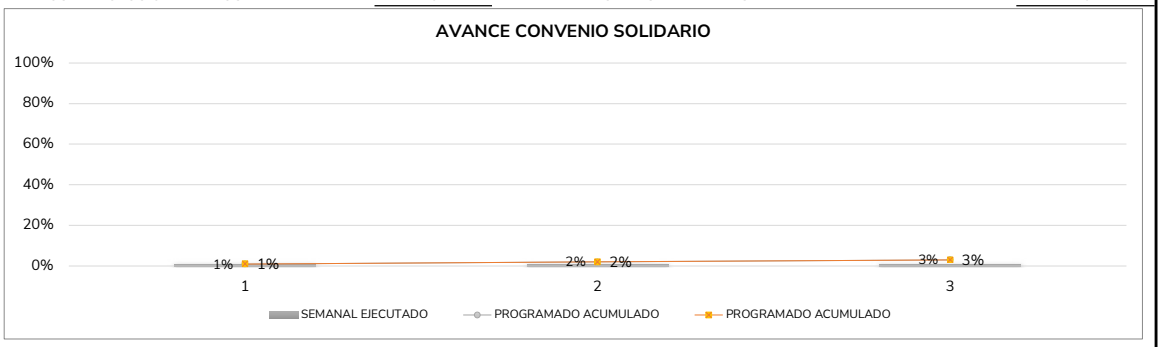

CONTROL DE METAS FISICAS

		UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
	LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	195	195	10	5%
Mantenimiento rutinario						
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
	ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento						
	PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
	ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
	BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
	BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
	MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
	CUNETAS	ml	0	0	0	0%
	BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION : AL FINALIZAR LA OBRA SE DA PASO A LAS LABORES ADMINISTRATIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

RESPONSABLE: JAIRO ROBAYO **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 5/07/2024

ANOTACIONES Y ANEXOS




FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMRCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINMARCA
		MUNICIPIO :	QUEBRADA NEGRA
CONVENIO SOLIDARIO :	3173 **DE** 2023		
CONTRATISTA :		JAC VEREDA SAN MIGUEL	
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 197.913.973,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :		INTERCOM	
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	20	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	6/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%			**% DE AVANCE SEMANAl**	4 4%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 165.409.121			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :				**MUJERES EMPLEADAS :**	1



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	180	180	10	4%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION : SE TERMINA ELTRAMO COMPLETO 180M, SE REALIZA ACTIVIDADES DE ASEO Y SEÑALIZACION DELA OBRA

RESPONSABLE: LUIS ALBERTO CUBILLOS PINZON **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 6/06/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO




FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMRCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINMARCA
		MUNICIPIO :	QUEBRADA NEGRA
CONVENIO SOLIDARIO :	3173 **DE** 2023		
CONTRATISTA :		JAC VEREDA SAN MIGUEL	
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 197.913.973,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :		INTERCOM	
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	21	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	13/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%			**% DE AVANCE SEMANAl**	4%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 175.121.470			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	$ 9.715.349
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :				**MUJERES EMPLEADAS :**	1



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	180	180	10	4%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION : SE TERMINA ELTRAMO COMPLETO 180M, SE REALIZA ACTIVIDADES DE ASEO Y SEÑALIZACION DELA OBRA

RESPONSABLE: LUIS ALBERTO CUBILLOS PINZON **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 13/06/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO




FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMRCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINMARCA
		MUNICIPIO :	QUEBRADA NEGRA
CONVENIO SOLIDARIO :	3173 **DE** 2023		
CONTRATISTA :		JAC VEREDA SAN MIGUEL	
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 197.913.973,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :		INTERCOM	
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	22 **DE** 24	**FECHA DE REPORTE :**	20/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%	**% DE AVANCE SEMANAl** 4	4%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 177.321.470	**VALOR EJECUCION SEMANAL :** $	2.200.000
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :		**MUJERES EMPLEADAS :**	1



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	180	180	10	4%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION : SE TERMINA ELTRAMO COMPLETO 180M, SE REALIZA ACTIVIDADES DE ASEO Y SEÑALIZACION DELA OBRA

RESPONSABLE: LUIS ALBERTO CUBILLOS PINZON **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 20/06/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO




FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMRCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINMARCA
		MUNICIPIO :	QUEBRADA NEGRA
CONVENIO SOLIDARIO :	3173 **DE** 2023		
CONTRATISTA :		JAC VEREDA SAN MIGUEL	
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 197.913.973,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :		INTERCOM	
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	24	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	5/07/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	100%			**% DE AVANCE SEMANAL :**	0%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 180.905.905			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	$ -
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :				**MUJERES EMPLEADAS :**	1



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	180	180	10	4%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION : SE INICIAN LABORES ADMINISTRATIVAS PARA EL INICIO DE OBRA DE PARTICIPACION SOCIAL Y POSTERIOR CIERRE

RESPONSABLE: LUIS ALBERTO CUBILLOS PINZON **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 5/07/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO




FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	UTICA
CONVENIO SOLIDARIO :	3975 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	JAC VEREDA FURATENA BAJA		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 200.543.044,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERCON MVN		
FECHA DE ADJUDICACION:	22/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	20	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	6/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	0%			**% DE AVANCE SEMANAL :**	
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 5.977.216			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	$ -
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :				**MUJERES EMPLEADAS :**	1



CONTROL DE METAS FISICAS


	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	0	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	2	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION : se realizan comites operativos con el fin de aprovar materiales y proveedores para iniciar obra,se recomienda agilizar el proceso de contratacion de personal

RESPONSABLE: CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 6/06/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

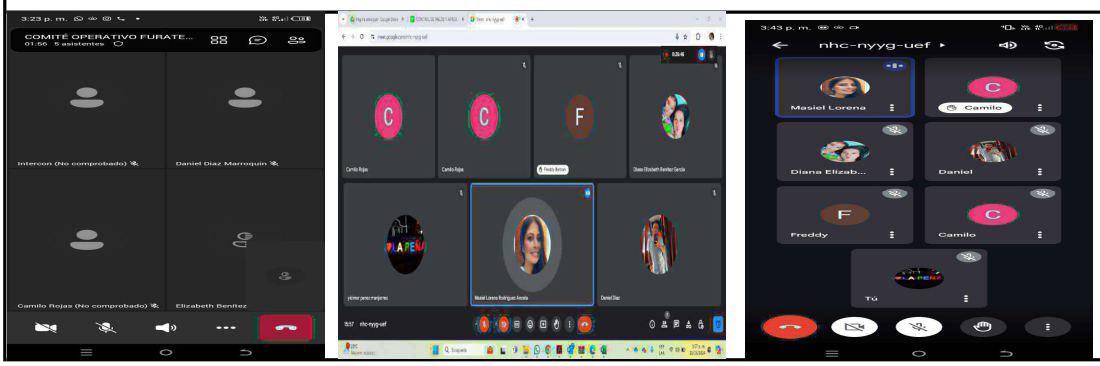


FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	UTICA
CONVENIO SOLIDARIO :	3975 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	JAC VEREDA FURATENA BAJA		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 200.543.044,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERCON MVN		
FECHA DE ADJUDICACION:	22/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	21	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	13/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	5%			**% DE AVANCE SEMANAl**	5% 5%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 5.977.216			**VALOR EJECUCION SEMANAL :**	$ 10.027.152
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :				**MUJERES EMPLEADAS :**	1



CONTROL DE METAS FISICAS


	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	0	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	2	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION : se realiza afiliacion de personal,contratacion de los trabajadores,y pagos de materiales de ferreteria

RESPONSABLE: CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 13/06/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

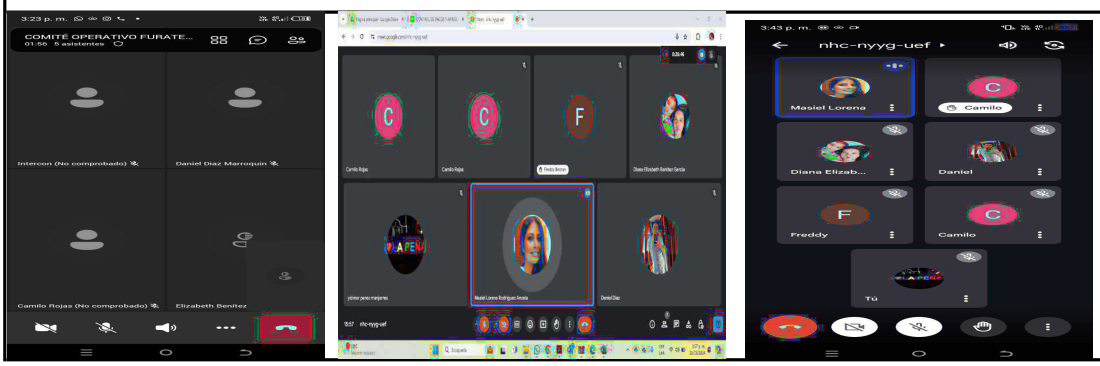


FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	UTICA
CONVENIO SOLIDARIO :	3975 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	JAC VEREDA FURATENA BAJA		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 200.543.044,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERCON MVN		
FECHA DE ADJUDICACION:	22/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	22	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	20/06/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	10%			**% DE AVANCE SEMANAl** 5%	5%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 5.977.216			**VALOR EJECUCION SEMANAL :** $	42.056.988
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :				**MUJERES EMPLEADAS :**	1



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	141	0	0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	2	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION : se realiza replanteo,localizacion de ejes,conformacion con maquinaria amarilla e instalacion de subbase e:0,15, se inicia por el costado izquierdo en direccion via La Palma por que no se puede cerrar por completo la via, la interventoria solicita instalar la señalizacion en el tramo

RESPONSABLE: CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 20/06/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO




FICHA DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ROGRAMA CAMINOS COMUNICATIOS DE LA PAZ TOTAL

TERRITORIAL :	CUNDINAMARCA	**DEPARTAMENTO :**	CUNDINAMARCA
		MUNICIPIO :	UTICA
CONVENIO SOLIDARIO :	3975 **DE** 2023		
CONTRATISTA :	JAC VEREDA FURATENA BAJA		
FECHA DE ADJUDICACION:	31/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 200.543.044,00	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024
INTERVENTOR :	INTERCON MVN		
FECHA DE ADJUDICACION:	22/12/2023	**FECHA DE INICIO :**	16/01/2024
VALOR DEL CONVENIO :	$ 72,480,208	**FECHA DE FIN :**	30/04/2024

AVANCE DEL PROYECTO

SEMANA DE EJECUCION :	24	**DE**	24	**FECHA DE REPORTE :**	5/07/2024
% DE AVANCE ACUMULADO :	20%			**% DE AVANCE SEMANAl** 10%	10%
VALOR EJECUCION ACUMULADA	$ 117.101.955			**VALOR EJECUCION SEMANAL :** $	68.927.282
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS :				**MUJERES EMPLEADAS :**	1



CONTROL DE METAS FISICAS

	UM	TOTAL	EJECUTADO	AVANCE SEMANA	% AVANCE
LONG. TOTAL CORREDOR INTERVENDIA	Und	141		0	0%
Mantenimiento rutinario					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Und	0	0	0	0%
ROCERÍA	Ha	0	0	0	0%
Mejoramiento					
PLACA HUELLA	Ml	0	0	0	0%
ALCANTARILLAS	Und	2	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X1	Und	0	0	0	0%
BOX-CULVERT 1X2	Und	0	0	0	0%
MUROS EN GAVIONES	Und	0	0	0	0%
CUNETAS	ml	0	0	0	0%
BATEA	ml	0	0	0	0%

PROBLEMAS O INCONVENIENTES

DESCRIPCION : continua actividades de corte,figurado,instalacion de aceros de refuerzo según diseños,instalacion de formaleta,acopio de material de rio , ademas continua fundida de huella y ciclopeo costado izquiedo via a La Palma segun diseño de mezcla autorizado

RESPONSABLE: CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS **FECHA DE SEGUIMIENTO :** 5/07/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Anexo 2.

RELACIÓN CORRESPONDENCIA

INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

Sopó, 21 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**051**

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Att: JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de Sostenibilidad
atencionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Entrega obligaciones formatos sociales del contrato de Interventoría 4912de 2023 del convenio 4656 -2023

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales esta interventoría, se permite remitir primera entrega del programa social del contrato de interventoría en mención con objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** Del convenio 34656 – 2023 de la vereda Salitre Blanco municipio de Villeta en el departamento de Cundinamarca , cuyo objeto corresponde a *ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INVIAS Y LA JAC DE LA VEREDA SALITRE BLANCO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*.

Sin otro particular, me suscribo

Cordialmente,

Masiel Lorena Rodríguez Anzola.

INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

Sopó, 6 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**045**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
Carrera 128 No. 17-15A
Fontibón Bogotá Distrito Capital de Bogotá

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.


Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Entrega informes semanales

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales esta interventoría, se permite remitir informes semanales correspondientes hasta le fecha de corte de 06 de junio se adjunta para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, y atenta a su cumplimiento me suscribo

Cordialmente,



INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

Sopó, 07 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**046**

Señores
JAC VEREDA FURATENA BAJA MUNICIPIO DE ÚTICA
FREDDY BELTRAN
Representante legal

JAC SALITRE BLANCO BAJO MUNICIPIO DE VILLETA
ALEXANDRA ROJAS GONGORA
Representante legal

JAC LA MASATA MUNICIPIO DE VILLETA
LUZ HELENA HERNANDEZ MOJICA
Representante legal

JAC VEREDA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA
BLANCA DEISY AVILA MEDINA
Representante legal

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Remisión memorando No. Radicado: 2024I-VBOG-010672, información retorno rendimientos financieros.

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, esta interventoría se permite remitir memorando que contiene información para el procedimiento del retorno de los rendimientos financieros que a la fecha se han generado en la cuenta conjunta del convenio.

Lo anterior con el fin de que se dé cumplimiento a lo contenido en clausulado contractual de los convenios suscritos por parte de las Juntas de Accion Comunal.

Se solicita amablemente una vez se realice el retorno de rendimientos financieros se remita información a esta interventoría, y sea compilada para la entrega final de documentos al cierre del convenio.

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,

Masiel Lorena Rodríguez Anzola.

INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-010672
Fecha: 2024-03-01 14:12:15

Para: Luis Fernando Sepulveda Ortiz
1120306 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
De: Manuel Salvador Barros Pavajeau
1140201 GRUPO PRESUPUESTO E INGRESOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-010416

Cordial saludo

En atención a solicitud del Radicado: 2024I-VBOG-010416 del 2024-02-29, relacionada con la cuenta bancaria para que se consigne los rendimientos y los saldos no ejecutados de los convenios aquí relacionados ; cuyos recursos salieron con fuente de financiación **“Recursos Nación”;** atentamente me permito informarle que los recursos, deben ser consignados a favor de la DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Nit 899.999.090, en la cuenta:

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente
Cuenta Bancaria Número: **61011094**
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

NOTA: Una vez efectuada la transferencia vía SEBRA, deben enviar al correo tramitespresupuestoeingresos@invias.gov.co. **del Grupo de Presupuesto e Ingresos del INVIAS, copia de la misma indicando con precisión el concepto del pago, número y año del contrato/convenio** y la identificación del tercero, para el registro correspondiente.

Así mismo, me permito informar que las consignaciones a las cuentas que el Tesoro Nacional tiene en el Banco de la República deben realizarse **únicamente a través del sistema SEBRA CUD** que ofrece este banco, dicha transferencia vía SEBRA, no es posible hacerla

desde la Banca Empresarial, es necesario solicitarle a la entidad financiera en la cual el tercero tiene la cuenta bancaria, para que la realice, a través del acuerdo interbancario con el Banco de la Republica.

A la entidad financiera que realizará la transferencia al Banco de la República, se le debe indicar que se debe **utilizar el código de operación 137,** de manera tal que la operación quede exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros, de acuerdo al Artículo 879 numeral 3 del Estatuto Tributario.

De igual manera se le debe señalar al intermediario financiero que en el campo de concepto, incluya el Código de Portafolio asignado al INVIAS, que es el (**270**).

Para su información se anexa paso a paso PSE para realizar consignación de los recursos, se recomienda ser muy cuidadoso al momento de elegir la cuenta.

Cordialmente,

Manuel Salvador Barros Pavajeau
COORDINADOR GRUPO PRESUPUESTO E INGRESOS

Proyectado Por: IRMA ROSA CÁRDENAS CRUZ
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a:

Sopó, 07 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**047**

Señores
JAC VEREDA FURATENA BAJA MUNICIPIO DE ÚTICA
FREDDY BELTRAN
Representante legal

JAC LA MASATA MUNICIPIO DE VILLETA
LUZ HELENA HERNANDEZ MOJICA
Representante legal

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


Asunto: Segunda reiteración diligenciamiento plan de inversión social.

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales esta interventoría se permite reiterar que la entrega del formato del plan de inversión social se tiene que entregar de manera perentoria, teniendo en cuenta que desde el 18 de mayo de 2024 se está solicitando, recordamos igualmente que los precios que se evaluaran en dicho formato deben venir soportados por cotizaciones. Adjunto a este oficio encontraran los siguientes anexos:

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5- PLAN DE INVERSION SOCIAL
- ANEXO 2. FICHA CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA
- PRESENTACION PLAN DE INVERSION SOCIAL

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,



INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

Sopó, 07 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**048**

Señores

JAC SALITRE BLANCO BAJO MUNICIPIO DE VILLETA
ALEXANDRA ROJAS GONGORA
Representante legal

JAC VEREDA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA
BLANCA DEISY AVILA MEDINA
Representante legal

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Solicitud diligenciamiento de ficha de caracterización socioeconómica.

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales esta interventoría y de acuerdo a las directrices de Instituto Nacional de Vias solicitamos de antemano el diligenciamiento de la caracterización socioeconómica en cada una de las juntas, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para el cierre del proyecto. Adjunto a este oficio encontraran los siguientes anexos:

- ANEXO 2. FICHA CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA
- PRESENTACION PLAN DE INVERSION SOCIAL

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,



INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

Sopó, 13 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**049**

Señores

JAC VEREDA FURATENA BAJA MUNICIPIO DE ÚTICA
FREDDY BELTRAN
Representante legal

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Solicitud inicio de obra.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que desde el mes de febrero se cuenta con el desembolso y a la fecha se tienen aprobados todos los proveedores para dotación, exámenes, equipos y materiales suficientes para que a la fecha de hoy se tenga un avance significativo físico ejecutado, sin embargo, es evidente que no se inician labores y no se presenta ningún avance físico en obra, es por esta razón que esta interventoría solicita se inicie la ejecución de la obra, además, es importante que se cargue la documentación solicitada en el CUARTO REQUERIMIENTO INTER-4912-2023-035, lo cual será indispensable para iniciar, como afiliaciones de trabajadores y planillas de entrega de dotación. Además de adjuntar toda la documentación correspondiente a lo técnico y dando respuesta a cada uno de los oficios de no ser así esta interventoría hace la solicitud de cambio de profesional INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, esto con el fin de, poder subsanar los más pronto posible los pendientes administrativos y de esa manera podamos continuar con la ejecución de convenio como autorizaciones de desembolsos y diferentes actividades hasta la fecha realizadas.

Es importante que la documentación del nuevo profesional se envié de manera perentoria a esta interventoría, cumpliendo con los requerimientos mínimos del anexo técnico del convenio.

Personal Ofrecido para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Ingeniero Residente de Obra	Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil o de Transportes y Vías. No menor de tres (3) años, contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de suscripción del convenio.	Mínimo un (1) año acumulado, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de suscripción del convenio, como ingeniero residente de obra de carreteras y/o vías urbanas.

Experiencia minima ingeniero residente Fuente: Anexo Tecnico Convenios.

POSGRADO CON TÍTULO	REQUISITOS DE EXPERIENCIA GENERAL	REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA
Especialización	Veinticuatro (24) meses	Doce (12) meses
Maestría	Treinta y seis (36 meses	Dieciocho (18) meses
Doctorado	Cuarenta y ocho (48) meses	Veinticuatro (24) meses

Equivalencias que se pueden aplicar Fuente: Anexo Tecnico Convenios.

Cordialmente,

INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

Sopó, 13 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**050**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
Carrera 128 No. 17-15A
Fontibón Bogotá Distrito Capital de Bogotá

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Entrega informes semanales

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales esta interventoría, se permite remitir informes semanales correspondientes hasta le fecha de corte de 13 de junio se adjunta para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, y atenta a su cumplimiento me suscribo

Cordialmente,

Masiel Lorena Rodríguez Anzola.

INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

Sopó, 14 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**051**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
Ing. Jairo Fernando Argüello Urrego
atencionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Remisión Plan de Inversión Social

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales esta interventoría, se permite remitir el plan de inversión social con sus respectivos soportes de cotizaciones de las labores sociales que se tendrán en cuenta para el cierre del proyecto de la Junta de Acción Comunal vereda La Masata convenio que hace parte del contrato de la referencia.

Sin otro particular, me suscribo

Cordialmente,

Masiel Lorena Rodríguez Anzola.
INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

Sopó, 25 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**056**

Señores
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Director Territorial Cundinamarca
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Solicitud de prorroga y adición al contrato de interventoría No. 4342 de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente comedidamente solicitamos al Instituto Nacional de Vías INVIAS, considere la solicitud de adición por DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($12.743.710,00) y prorroga en tiempo de un (01) MES, es decir hasta el 30 de Julio de 2024, al contrato de interventoría de la referencia. Solicitud que se hace necesaria para continuar realizando acompañamiento, seguimiento y control al convenio solidario a cargo 3975-2023, debido a que el mencionado continua ejecutando OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO que se establece en el parágrafo primero de la clausula cuarta de los convenios donde, el Organismo de Acción Comunal-OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido, utilizando para ellos los frentes de trabajo de intervención necesarios para atender el alcance del convenio, bajo la supervisión de la INTERVENTORÍA.

Agradezco la atención prestada y su pronta respuesta.

Atentamente,

INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

Sopó, 25 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**054**

Señores

JAC VEREDA FURATENA BAJA MUNICIPIO DE ÚTICA
FREDDY BELTRAN
Representante legal

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Solicitud de presencia de residente de obra en campo.

Reciban un cordial saludo

En el seguimiento realizado por esta interventoría en el desarrollo de las actividades, no se evidencia presencia del residente de obra más aun cuando se está desarrollando la ejecución de este convenio, por esta razón solicitamos amablemente se dé cumplimiento al porcentaje de tiempo estipulado en el anexo técnico para el residente, el cual obedece al 100 % del tiempo de obra, adicionalmente de contar con alguna dificultad respecto al personal que ha venido desempeñando la residencia de obra solicitamos amablemente el cambio del profesional para que otro profesional que cumpla los requisitos mínimos según el pliego pueda realizar las actividades de seguimiento, todo esto debido a que no se cuenta con la persona idónea para dar las directrices pertinentes en la ejecución del proyecto.

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,

Masiel Lorena Rodríguez Anzola.

INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

Sopó, 26 de Junio de 2024

INTER-4912-2023-**058**

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atte: Ing. GUSTAVO ALFONSO CÉPEDA OCAMPO
Dirección Territorial Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: Solicitud Prorroga en tiempo al Contrato No 3965 DE 2023.

Dando alcance a nuestras obligaciones contractuales esta interventoría, realizo revisión del oficio de fecha 26 de Junio del 2024, remitido por el presidente de la JAC, en el cual describe las razones por la cual realiza dicha solicitud:

> *''**HUBER ALEXANDER GONZÁLEZ CIFUENTES**, actuando en calidad de ejecutor del Convenio Solidario del asunto y dando cumplimento a las obligaciones contraídas por parte de la Junta de Acción Comunal furatena baja del Municipio de Utica del departamento de Cundinamarca con relación al Convenio Solidario No. 3965 de 2023, me dirijo a usted con el único propósito de solicitar prorroga por un término de treinta (30) días.*
>
> *(...)*
>
> *La solicitud de la Prorroga 2 de este contrato fue presentada por dos meses más, debido a que el permiso de cierre total de la vía fue negado, lo que nos genera que la ejecución de la obra sea con flujo de vehículos, ya que se debe cerrar media calzada de la vía para intervención y dar paso peatonal y vehicular en la otra mitad de calzada.*
> *Adicionalmente existía un proceso administrativo de afiliación de la junta al sistema de seguridad social y parafiscal para la previa afiliación del personal que apoyaría la ejecución del Convenio Solidario No. 3965 de 2023, el cual y bajo los parámetros de las entidades de salud, Arl, Fondos de Pensión y Caja de Compensación familiar rige su tiempo de respuesta para aprobación de la misma de hasta 15 días hábiles, según sus procesos internos y administrativos.*
> *Los procesos de afiliación no fueron tan simples ya que el personal de la Zona seleccionado se reusará a ser afiliado, y postergo demasiado, el día de la entrega de las fotos de las cedulas, Documento principal para que sea aprobada la afiliación ante cualquier entidad de seguridad social y parafiscal, Ese inconveniente genero retrasar aún más el proceso, pero al final logramos solucionar el inconveniente y a la fecha el personal se encuentra en cobertura a los servicios de Salud, Riegos y Fondos Pensionarios.*
> *Sin embargo y logrando solucionar el inconveniente con los empleados, requeríamos materiales, dotación y demás elementos o equipos, para el inicio de obra, pero las demoras en los desembolsos del dinero necesario para la ejecución de la obra han impactado en la Junta de Acción Comunal (JAC) de Furatena Baja. Estos retrasos han llevado a que se la entrega de materiales y elementos de*

Dotación y seguridad social de los empleados, ya que existe un contrato de suministro de materiales y alquiles de equipos y maquinaria en el cual se especifica que las entregas deben ser canceladas anticipadamente, lo que genera un retraso significativo para el traslado de los equipos adecuados requeridos para la ejecución del proyecto.
Además, hemos enfrentado dificultades para desplazarnos a Utica con el fin de depositar los cheques de pago, principalmente debido a la distancia. Este traslado implica una inversión considerable de tiempo y recursos logísticos, lo que ha dificultado completar este trámite administrativo de manera oportuna.
Actualmente, tenemos una proyección de que en 30 días más se entregaría totalmente terminado fisicamente el Convenio Solidario No. 3965 de 2023.

Dado lo expuesto anteriormente, nos interesa concluir las tareas de manera óptima, asegurando la calidad del trabajo, la aceptación por parte de la supervisión de los trabajos realizados y la satisfacción en la entrega. Por lo tanto, solicitamos amablemente considerar la extensión del Convenio Solidario No. 3965 de 2023 hasta el 31 de Julio de 2024.''

Así las cosas, esta interventoría, una vez realizada revisión de la solicitud de prorroga y teniendo en cuenta que a la fecha ya se cuenta con avance en todas las actividades previas a la ejecución de obra, se permiten avalar la prórroga solicitada en el oficio de fecha 26 de Junio del 2024 por un término de UN (01) MES, es decir hasta el 31 de Julio del 2024, para llevar a inicio y ejecución de actividades propias del convenio, radicado por la presidente de la Junta de Acción Comunal, nos permitimos remitir información para su revisión y aprobación.

Sin otro particular y atenta a sus comentarios, me suscribo.

Cordialmente,

Masiel Lorena Rodríguez Anzola.

INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

Sopó, 287 de junio de 2024.

INTER-4912-2023-**059**

Señores
JAC VEREDA FURATENA BAJA MUNICIPIO DE ÚTICA
FREDDY BELTRAN
Representante legal

JAC SALITRE BLANCO BAJO MUNICIPIO DE VILLETA
ALEXANDRA ROJAS GONGORA
Representante legal

JAC LA MASATA MUNICIPIO DE VILLETA
LUZ HELENA HERNANDEZ MOJICA
Representante legal

JAC VEREDA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA
BLANCA DEISY AVILA MEDINA
Representante legal

Referencia: Contrato de interventoría No 4912 DE 2023.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto Remisión listado documentos cierre convenios. "Caminos Comunitarios De La Paz Total"

Dando alcance a nuestras obligaciones contractuales esta interventoría, con base en los avances y fecha de finalización de los convenios, se permite remitir listado de documentos que deben ser recopilados y entregados para el cierre y liquidación del convenio:

1. Minuta del convenio solidario.
2. Minutas prorrogas convenio Solidario.
3. Suspensiones Suscritas convenio Solidario.
4. Modificaciones y aclaraciones (Si aplica).
5. Orden de inicio convenio.
6. Registro presupuestal convenio solidario.
7. RUT.
8. Acta de entrega y recibo definitivo.
9. Memorias de cálculo detalladas acta final.
10. Balance de obra (Cantidades).

11. Actualización de listado de materiales, equipos, costos administrativos, listado de cantidades de materiales acorde a memorias de cálculo, nominas, liquidaciones y seguridad social.
12. Compilado de informes mensuales (Técnicos y contables).
13. Informe final de obra.
14. Manual de mantenimiento de obra.
15. Bitácora de obra.
16. Informe contable y cierre financiero (Contador).
17. Compilado de seguridad social profesionales y personal de obra.
18. Diligenciamiento de formato resumen de ensayos de laboratorio, junto con resultados de laboratorios de materiales.
19. Diligenciamiento de formato estado general del tiempo mensual.
20. Paz y salvo proveedores y profesionales.
21. Compilado de nóminas personal y liquidaciones debidamente firmadas.
22. Planos record.
23. Registro fotográfico.
24. informe de inversión y buen manejo del desembolso convenio mensual junto con el compilado de facturas correspondiente al periodo.
25. Pólizas y anexos emitidos para el convenio solidario, desde anexo 0 hasta póliza actualizada según acta de entrega y recibo definitivo.
26. Paz y salvo por todo concepto con el corredor de seguros que emitió pólizas para el convenio solidario.
27. Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre los rendimientos financieros generados en la cuenta conjunta del convenio.
28. Comprobante de reintegros de los recursos no ejecutados y rendimientos financieros.
29. Soportes de paz y salvo firmado por los trabajadores, que la JAC, se encuentra al día por conceptos de salarios, honorarios, liquidaciones y prestaciones sociales.
30. Certificado de accidentabilidad cubriendo los periodos de ejecución del contrato expedido por la ARL.
31. Certificado firmado por el representante legal de la JAC y/o contador con tarjeta profesional, certificando que la JAC se encuentra a paz y salvo con todos los trabajadores que laboraron para el convenio (debe contener listado de trabajadores con numero de cedulas y cargo), en cuanto a pagos de honorarios, salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema general de seguridad social, salud, riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 ley 789 d 2002, SENA ICBF, o informar si están exentos a realizar estos aportes de acuerdo con la ley 1607 de 2012.
32. Certificación por parte de la entidad financiera de la cancelación de la cuenta.


Con base en lo mencionado anteriormente, esta interventoría esta presta a realizar acompañamiento y resolver las inquietudes que se puedan presentar en cuanto a la recopilación de dichos documentos los cuales son indispensables para el cierre y liquidación del convenio. Es importante mencionar que dichos documentos has sido solicitados y mencionados en diversos comités operativos con el fin de que se fueran adelantado por los profesionales que hacen parte

del convenio. Así las cosas, se espera que en el parte técnico se entregue a más tardar el último día del plazo del convenio.
Con el fin de reafirmar nuestro compromiso esta interventoría invita a las JAC (Representante legal, Residente, contador y veedor) para asistir a una reunión virtual el día miércoles 03 de julio del 2024, a las 3:00 p.m. con el fin de aclarar inquietudes respecto a los documentos y establecer plazos de entrega definitivos.

Con el presente comunicado se adjuntan formatos y link de la reunión.

Sin otro particular y atenta a sus comentarios, me suscribo.

Cordialmente,



INTERCON MVN SAS
Nit. 901.483.818-8
Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Representante Legal

Anexo 3.

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATOS DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 4656-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SALITRE BLANCO BAJO MUNICIPIO DE VILLETA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SALITRE BLANCO BAJO DEL MUNICIPIO DE VILLETA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/11/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 198.823.137,00
VALOR ACUMULADO: $ 198.823.137,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4912-2023 **INTERVENTOR:** INTERCON MVN SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 39.964.628,00	27	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.991.157,00	27	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.946.942,00	27	11	2023			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-994000029897
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	11	23	31	12	23
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360-74-994000008434 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.964.628,00	27	11	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.991.157,00	27	11	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.946.942,00	27	11	2023			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-994000029897

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	31	12	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360-74-994000008434 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LAS POLIZAS EN EL SECOP II, SE HACE LA OBSERVACIÓN DE ACTUALIZAR POLIZAS ACORDE A LA FECHA DE ACTA DE INCIO, SUSPENSION, REINICIO Y PRORROGA

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría: MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Matrícula Profesional No.: 25202-304116 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) | 2 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 4042-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MASATA MUNICIPIO DE VILLETA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MASATA DEL MUNICIPIO DE VILLETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 24/10/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 193.275.043,00

VALOR ACUMULADO: $ 193.275.043,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4912-2023

INTERVENTOR: INTERCON MVN SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.982.009,00	24	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.995.503,00	24	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.973.013,00	24	10	2023			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-994000029716

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	24	10	23	31	12	23
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360-74-994000008366

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LAS POLIZAS EN EL SECOP II, SE HACE LA OBSERVACIÓN DE ACTUALIZAR POLIZAS ACORDE A LA FECHA DE ACTA DE INCIO, SUSPENSION, REINICIO Y PRORROGA

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría: MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Matrícula Profesional No.: 25202-304116 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) | 2 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 3173-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 6/09/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 197.913.973,00

VALOR ACUMULADO: $ 197.913.973,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4912-2023 **INTERVENTOR:** INTERCON MVN SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.782.795,00	6	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.945.699,00	6	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.674.192,00	31	12	2023			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100283277

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	6	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069084 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 39.782.794,60	7	12	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.945.698,65	7	12	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.674.191,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100283277

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	6	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069084 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LAS POLIZAS EN EL SECOP II, SE HACE LA OBSERVACIÓN DE ACTUALIZAR POLIZAS ACORDE A LA FECHA DE ACTA DE INCIO, SUSPENSION, REINICIO Y PRORROGA

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría: MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Matrícula Profesional No.: 25202-304116 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 3975-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FURATENA BAJA MUNICIPIO DE ÚTICA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FURATENA BAJA DEL MUNICIPIO DE ÚTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 18/10/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.543.044,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.543.044,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4912-2023 **INTERVENTOR:** INTERCON MVN SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 40.108.609,00	18 10 2023	31 10 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.027.153,00	18 10 2023	31 12 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.162.914,00	Día Mes Año	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-994000029555

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	18 10 2023	31 12 2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360-74-994000008301 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40.108.609,00	18	10	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.027.153,00	18	10	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.162.914,00	18	10	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-994000029555

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	31	12	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360-74-994000008301 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LAS POLIZAS EN EL SECOP II, SE HACE LA OBSERVACIÓN DE ACTUALIZAR POLIZAS ACORDE A LA FECHA DE ACTA DE INCIO, SUSPENSION, REINICIO Y PRORROGA

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría: MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Matrícula Profesional No.: 25202-304116 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 4.

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS INTERVENTORÍA

Calle 3A Sur No. 1 – 13 Barrio Los Sauces, Sopó, Cundinamarca, Colombia.
Tel: 300 4957240 - 313 2625522 E-mail: intercon@interconmvn.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4912-2023 **INTERVENTOR:** INTERCON MVN SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, QUEBRADANEGRA Y ÚTICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITAROPS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 72.480.208,00

VALOR ACUMULADO: $ 72.480.208,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.248.020,80	11	12	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.496.041,60	11	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 21.744.062,40	11	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101214191

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.248.020,80	20	12	2023	8/01/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.496.041,60	20	12	2023	9	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.744.062,40	20	12	2023	9	7	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101214191

Certificado de modificación o anexo No.: 3 Y 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/07/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.248.020,80	11	12	2023	30/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.496.041,60	11	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.744.062,40	11	12	2023	30	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101214191

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/02/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.248.020,80	11	12	2023	30/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.496.041,60	11	12	2023	30	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.744.062,40	11	12	2023	30	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101214191

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 3/07/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.248.020,80	20	12	2023	31/01/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.496.041,60	20	12	2023	31	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.744.062,40	20	12	2023	31	7	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101214191

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-304116 CND

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
