AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547 5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	67
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCÓN** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. **CONTRATO N° 775 22 PY 214-21 PARC N°3 C1-5 C67**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
507	LISTA DE CHEQUEO	12431-12432
508	ACTA PAGO DE OBRA PARCIAL N°3	12433-12435
509	MEMORIA DE CALCULO OBRA	12436-12631

Fecha de Elaboración		Nombre del Archivo en el SIGA	775 22 PY 214-21 PARC N°3 C1-5 C67

Firma	Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	NO
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	N/A
FACTURA	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	SI
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12431

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V04
05/07/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	-	SI
CARGUE A SECOP II	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma

Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335

Firma

Nombre: JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE INTERVENTORIA PROYECTO BPIN 2021005500214
M.P. 25202-159270 CND

Firma Xamira Cheediak

Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK
RESPONSABLE DEL ARCHIVO

Firma

Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 01194-0290

Firma

Nombre: OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA PROYECTO BPIN 2021005500214
M.P. 25202-78801 CND

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12432

CONSORCIO HALCÓN

ACTA PAGO DE OBRA

PARCIAL No 3

12433

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	19/04/20024 a 20/08/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 24.039.734.150,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	0250 DE 2023
NIT:	901.666.148-3	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ejrmcp@camellingeniería.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	251-2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	20 SET. 2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	**PRELIMINARES**													
1,1	ESCARIFICACIÓN DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	M2	79.773,50	$ 2.201,00	$ 175.581.474,00	0,00	$ 0,00	54.942,30	$ 120.928.002,30	24.831,20	$ 54.653.471,70	79.773,50	$ 175.581.474,00	100,00%
1,2	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	15,49	$ 2.907.481,00	$ 45.036.881,00	0,00	$ 0,00	4,49	$ 13.054.589,69	11,00	$ 31.982.291,31	15,49	$ 45.036.881,00	100,00%
1,3	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	25.657,02	$ 53.067,00	$ 1.361.541.080,00	0,00	$ 0,00	14.183,10	$ 752.654.567,70	0,00	$ 0,00	14.183,10	$ 752.654.567,70	55,28%
1,4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	256.570,20	$ 1.879,00	$ 482.095.406,00	0,00	$ 0,00	57.699,85	$ 108.418.018,15	0,00	$ 0,00	57.699,85	$ 108.418.018,15	22,49%
	SUBTOTAL				**$ 2.064.254.841,00**		**$ 0,00**		**$ 995.055.177,84**		**$ 86.635.763,01**		**$ 1.081.690.940,85**	
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**													
2,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	14.970,47	$ 42.956,00	$ 643.071.509,00	0,00	$ 0,00	14.809,70	$ 636.165.473,20	0,00	$ 0,00	14.809,70	$ 636.165.473,20	98,93%
2,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	39.669,89	$ 139.393,00	$ 5.529.704.977,00	0,00	$ 0,00	23.791,69	$ 3.316.395.044,17	7.478,12	$ 1.042.397.581,16	31.269,81	$ 4.358.792.625,33	78,83%
2,3	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	18.200,75	$ 151.465,00	$ 2.756.776.599,00	0,00	$ 0,00	9.975,75	$ 1.510.976.973,75	1.880,00	$ 284.754.200,00	11.855,75	$ 1.795.731.173,75	65,14%
2,4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	117.724,00	$ 4.631,00	$ 545.179.844,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	38.000,00	$ 175.978.000,00	38.000,00	$ 175.978.000,00	32,28%
2,5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	7.357,75	$ 948.657,00	$ 6.979.981.042,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	2.375,00	$ 2.253.060.375,00	2.375,00	$ 2.253.060.375,00	32,28%
2,6	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1.183.303,83	$ 1.879,00	$ 2.223.427.897,00	0,00	$ 0,00	797.212,02	$ 1.497.961.385,58	127.567,27	$ 239.698.900,33	924.779,29	$ 1.737.660.285,91	78,15%
2,7	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	285.811,80	$ 2.155,00	$ 615.924.429,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	79.871,25	$ 172.122.543,75	79.871,25	$ 172.122.543,75	27,95%
	SUBTOTAL				**$ 19.294.066.297,00**		**$ 0,00**		**$ 6.961.498.876,70**		**$ 4.168.011.600,24**		**$ 11.129.510.476,94**	
3	**OBRAS DE DRENAJE**													
3,1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	361,13	$ 404.392,00	$ 146.038.083,00	0,00	$ 0,00	107,77	$ 43.581.325,84	217,38	$ 87.906.732,96	325,15	$ 131.488.058,80	90,04%
3,2	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	717,73	$ 40.581,00	$ 29.126.201,00	0,00	$ 0,00	300,00	$ 12.174.300,00	417,73	$ 16.951.901,00	717,73	$ 29.126.201,00	100,00%
3,3	EXCAVACIÓN MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	376,40	$ 46.284,00	$ 17.421.298,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 1.388.520,00	346,40	$ 16.032.778,00	376,40	$ 17.421.298,00	100,00%
3,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 -2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	877,45	$ 80.432,00	$ 70.575.058,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	145,20	$ 11.678.726,40	145,20	$ 11.678.726,40	16,55%
3,5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	19.715,80	$ 1.879,00	$ 37.045.968,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	12.426,50	$ 23.349.393,50	12.426,50	$ 23.349.393,50	63,03%
3,6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	64,27	$ 675.916,00	$ 43.441.121,00	0,00	$ 0,00	7,79	$ 5.265.385,64	29,91	$ 20.216.647,56	37,70	$ 25.482.033,20	58,66%
3,7	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	284,44	$ 1.137.025,00	$ 323.415.391,00	0,00	$ 0,00	135,60	$ 154.180.590,00	135,28	$ 153.816.742,00	270,88	$ 307.997.332,00	95,23%
3,8	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	208,00	$ 1.100.860,00	$ 228.978.880,00	0,00	$ 0,00	92,00	$ 101.279.120,00	84,00	$ 92.472.240,00	176,00	$ 193.751.360,00	84,62%
3,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	14.867,58	$ 8.973,00	$ 133.406.795,00	0,00	$ 0,00	9.253,02	$ 83.027.348,46	5.614,56	$ 50.379.446,54	14.867,58	$ 133.406.795,00	100,00%
3,10	CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO 3000 PSI SECCION TRANSVERSAL 1,1 X 0,1 MTS. INCLUYE REFUERZO	ML	4.280,00	$ 207.390,00	$ 887.629.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3,11	TERRAPLENES CON PRESTAMO LATERAL. NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	866,25	$ 24.127,00	$ 20.900.014,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA E= 0.10 MTS	M2	3.497,00	$ 56.923,00	$ 199.059.731,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.137.037.760,00**		**$ 0,00**		**$ 400.896.589,94**		**$ 472.804.607,96**		**$ 873.701.197,90**	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1243

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-9

ACTA PAGO DE OBRA
112-ECP-FR-029-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

4	SEÑALIZACIÓN															
4,1	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	45,00	$ 368.541,00	$ 16.584.345,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%		
4,2	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	46.495,00	$ 4.953,00	$ 230.289.735,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%		
4,3	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	2.582,00	$ 13.385,00	$ 34.560.070,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%		
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN INCLUYE FORMALETA, REFUERZO, CURADO Y PINTURA	M2	10,08	$ 477.057,00	$ 4.808.735,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL				**$ 286.242.885,00**		**$ 0,00**		$ -		**$ 0,00**		$ -			
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 18.153.894.490,84**		**$ 0,00**		**$ 6.423.634.832,74**		**$ 3.608.741.962,76**		**$ 9.988.475.279,15**			
	ADMINISTRACIÓN (27%)				**$ 4.901.551.512,53**				**$ 1.734.381.404,84**		**$ 974.360.329,94**		$ 2.696.888.326,37			
	IMPREVISTOS (0%)				**$ 0,00**				$ -		**$ 0,00**		$ -			
	UTILIDAD (4%)				**$ 726.155.779,63**				**$ 256.945.393,31**		**$ 144.349.678,51**		$ 399.539.011,17			
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 5.627.707.292,16**		**$ 0,00**		**$ 1.991.326.798**		**$ 1.118.710.008,45**		**$ 3.096.427.336,54**			
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 23.781.601.783,00**		**$ 0,00**		**$ 8.414.961.630,89**		**$ 4.727.451.971,21**		**$ 13.084.902.615,69**			
5	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA		1,00	$ 72.613.056,00	$ 72.613.056,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,53	$ 38.484.919,68	0,53	$ 38.484.919,68	53,00%		
6	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		1,00	$ 185.519.311,00	$ 185.519.311,00	0,00	$ 0,00	0,31	$ 57.510.986,41	0,22	$ 40.814.248,42	0,53	$ 98.325.234,83	53,00%		
	SUBTOTAL				**$ 258.132.367,00**		**$ 0,00**		**$ 57.510.986,41**		**$ 79.299.168,10**		**$ 136.810.164,51**			
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 24.039.734.150,00**		**$ 0,00**		**$ 8.414.961.630,89**		**$ 4.806.751.139,31**		**$ 13.221.712.770,20**			

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 24.039.734.150,00
VALOR ADICIONAL		
VALOR TOTAL		$ 24.039.734.150,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 24.039.734.150,00
ANTICIPO	0%	$ -
PRESENTE ACTA		$ 4.806.751.139,31
ACUMULADO		$ 13.221.712.770,20

CONDICIONES ACTUALIZADAS				
RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL	
ACTA 1	$	3.605.934.080,23		$ 3.605.934.080,23
ACTA 2	$	4.809.027.550,66		$ 4.809.027.550,66
			$ -	$ -
PRESENTE ACTA	$	4.806.751.139,31		$ 4.806.751.139,31
TOTALES	$	13.221.712.770,20	$ -	$ 13.221.712.770,20

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	13.221.712.770,20	55,00
POR EJECUTAR	$	10.818.021.379,80	45,00
POR AMORTIZAR	$	-	0%
TOTALES	$	24.039.734.150,00	100

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500214 (Registro Presupuestal No. 1002-2.3.24.02.0600.115-00AD / 1003.2.3.24.020600.117.2.02.05.310 de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PAGO PARCIAL N°1	$ 3.605.934.080,23		$ 3.605.934.080,23	$ 3.605.934.080,23
2	PAGO PARCIAL N°2	$ 4.809.027.550,66		$ 4.809.027.550,66	$ 8.414.961.630,89
3	PRESENTE ACTA	$ 4.806.751.139,31		$ 4.806.751.139,31	$ 13.221.712.770,20
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 10.818.021.379,80			$ 24.039.734.150,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE

NOTAS
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.666.148-8 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°0775 DE 2022 representado legalmente por la Union Temporal o Consorcio HALCON , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ___ de fecha ____ NO X

Para constancia de lo anterior se firma para presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el dia: 20 SET. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 215835-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

124 35

CONSORCIO HALCÓN

MEMORIA DE CALCULO
OBRA

12936

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3

CAPITULO:	**PRELIMINARES**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.1	**ESCARIFICACIÓN DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M**	**M2**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**TOTAL**
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K 5+800	K 4+800	1000	5,15	5.150,00
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K 4+800	K 3+800	1000	5,15	5.150,00
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K 3+800	K 2+800	1000	5,15	5.150,00
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K 2+800	K 1+800	1000	3,9812	3.981,20
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K 1+800	K +800	1000	3	3000,00
ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M	K +800	K +0	800	3	2400,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	24.831,20
				TOTAL	24.831,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12433

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	ESCARIFICACIÓN DE CRUDO EXISTENTE E=0.10M

ABSCISA	ANCHO	LONGITUD	AREA
K 5+800			
K 4+800	5,15	1000	5150,00
K 3+800	5,15	1000	5150,00
K 2+800	5,15	1000	5150,00
K 1+800	3,98	1000	3981,20
K +800	3,00	1000	3000,00
K +0	3,00	800	2400,00
	TOTAL		24.831,20

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

1243

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		

CAPITULO:	PRELIMINARES	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.2	**CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)**	**KM**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD		TOTAL
CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE	K 11+000	K +0	11000		11,00
PASAN:				SUBTOTAL	11,00
				TOTAL	11,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ABSCISA	ANCHO	LONGITUD (M)	TOTAL (KM)
K 11+000			
K +0	5,15	11000	11,00
	TOTAL		11,00

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+200	K 6+180	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+180	K 6+160	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+160	K 6+140	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+140	K 6+120	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+120	K 6+100	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+100	K 6+080	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+080	K 6+060	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+060	K 6+040	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+040	K 6+020	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+020	K 6+000	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+000	K 5+980	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+980	K 5+960	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+960	K 5+940	20	2,561	51,22
PASAN:				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	665,86

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro.de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12491

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3

CAPITULO:	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+940	K 5+920	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+920	K 5+900	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+900	K 5+880	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+880	K 5+860	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+860	K 5+840	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+840	K 5+820	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+820	K 5+800	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+800	K 5+780	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+780	K 5+760	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+760	K 5+740	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+740	K 5+720	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+720	K 5+700	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+700	K 5+680	20	2,561	51,22
PASAN: 665,86				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	1.331,72

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1219

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**		

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+680	K 5+660	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+660	K 5+640	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+640	K 5+620	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+620	K 5+600	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+600	K 5+580	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+580	K 5+560	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+560	K 5+540	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+540	K 5+520	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+520	K 5+500	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+500	K 5+480	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+480	K 5+460	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+460	K 5+440	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+440	K 5+420	20	2,561	51,22
PASAN: 1.331,72				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	1.997,58

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12993

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+420	K 5+400	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+400	K 5+380	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+380	K 5+360	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+360	K 5+340	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+340	K 5+320	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+320	K 5+300	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+300	K 5+280	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+280	K 5+260	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+260	K 5+240	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+240	K 5+220	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+220	K 5+200	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+200	K 5+180	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+180	K 5+160	20	2,561	51,22
PASAN: 1.997,58				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	2.663,44

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12994

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+160	K 5+140	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+140	K 5+120	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+120	K 5+100	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+100	K 5+080	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+080	K 5+060	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+060	K 5+040	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+040	K 5+020	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+020	K 5+000	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+000	K 4+980	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+980	K 4+960	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+960	K 4+940	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+940	K 4+920	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+920	K 4+900	20	2,561	51,22
PASAN: **2.663,44**				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	3.329,30

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12995

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+900	K 4+880	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+880	K 4+860	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+860	K 4+840	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+840	K 4+820	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+820	K 4+800	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+800	K 4+780	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+780	K 4+760	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+760	K 4+740	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+740	K 4+720	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+720	K 4+700	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+700	K 4+680	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+680	K 4+660	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+660	K 4+640	20	2,561	51,22
PASAN: **3.329,30**				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	3.995,16

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1249

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+640	K 4+620	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+620	K 4+600	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+600	K 4+580	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+580	K 4+560	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+560	K 4+540	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+540	K 4+520	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+520	K 4+500	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+500	K 4+480	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+480	K 4+460	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+460	K 4+440	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+440	K 4+420	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+420	K 4+400	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+400	K 4+380	20	2,561	51,22
PASAN: 3.995,16				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	4.661,02

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MATIECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1294

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+380	K 4+360	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+360	K 4+340	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+340	K 4+320	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+320	K 4+300	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+300	K 4+280	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+280	K 4+260	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+260	K 4+240	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+240	K 4+220	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+220	K 4+200	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+200	K 4+180	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+180	K 4+160	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+160	K 4+140	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+140	K 4+120	20	2,561	51,22
PASAN: 4.661,02				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	5.326,88

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12498

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+120	K 4+100	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+100	K 4+080	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+080	K 4+060	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+060	K 4+040	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+040	K 4+020	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+020	K 4+000	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 4+000	K 3+980	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+980	K 3+960	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+960	K 3+940	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+940	K 3+920	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+920	K 3+900	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+900	K 3+880	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+880	K 3+860	20	2,561	51,22
PASAN: 5.326,88				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	5.992,74

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12449

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+860	K 3+840	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+840	K 3+820	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+820	K 3+800	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+800	K 3+780	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+780	K 3+760	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+760	K 3+740	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+740	K 3+720	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+720	K 3+700	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+700	K 3+680	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+680	K 3+660	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+660	K 3+640	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+640	K 3+620	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+620	K 3+600	20	2,561	51,22
PASAN: 5.992,74				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	6.658,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12450

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+600	K 3+580	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+580	K 3+560	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+560	K 3+540	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+540	K 3+520	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+520	K 3+500	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+500	K 3+480	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+480	K 3+460	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+460	K 3+440	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+440	K 3+420	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+420	K 3+400	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+400	K 3+380	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+380	K 3+360	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+360	K 3+340	20	2,561	51,22
PASAN: **6.658,60**				**SUBTOTAL**	665,86
				TOTAL	7.324,46

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12451

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.2	**SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+340	K 3+320	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+320	K 3+300	20	2,561	51,22
SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 3+300	K 3+280	20	2,561	51,22
PASAN: **7.324,46**				**SUBTOTAL**	153,66
				TOTAL	7.478,12

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12452

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 6+200	K 6+180	20	2,561	51,22
K 6+180	K 6+160	20	2,561	51,22
K 6+160	K 6+140	20	2,561	51,22
K 6+140	K 6+120	20	2,561	51,22
K 6+120	K 6+100	20	2,561	51,22
K 6+100	K 6+080	20	2,561	51,22
K 6+080	K 6+060	20	2,561	51,22
K 6+060	K 6+040	20	2,561	51,22
K 6+040	K 6+020	20	2,561	51,22
K 6+020	K 6+000	20	2,561	51,22
K 6+000	K 5+980	20	2,561	51,22
K 5+980	K 5+960	20	2,561	51,22
K 5+960	K 5+940	20	2,561	51,22
K 5+940	K 5+920	20	2,561	51,22
K 5+920	K 5+900	20	2,561	51,22
K 5+900	K 5+880	20	2,561	51,22
K 5+880	K 5+860	20	2,561	51,22
K 5+860	K 5+840	20	2,561	51,22
K 5+840	K 5+820	20	2,561	51,22
K 5+820	K 5+800	20	2,561	51,22
K 5+800	K 5+780	20	2,561	51,22
K 5+780	K 5+760	20	2,561	51,22
K 5+760	K 5+740	20	2,561	51,22
K 5+740	K 5+720	20	2,561	51,22
K 5+720	K 5+700	20	2,561	51,22
K 5+700	K 5+680	20	2,561	51,22
K 5+680	K 5+660	20	2,561	51,22
K 5+660	K 5+640	20	2,561	51,22
K 5+640	K 5+620	20	2,561	51,22
K 5+620	K 5+600	20	2,561	51,22
K 5+600	K 5+580	20	2,561	51,22
K 5+580	K 5+560	20	2,561	51,22
K 5+560	K 5+540	20	2,561	51,22
K 5+540	K 5+520	20	2,561	51,22
K 5+520	K 5+500	20	2,561	51,22
K 5+500	K 5+480	20	2,561	51,22
K 5+480	K 5+460	20	2,561	51,22
K 5+460	K 5+440	20	2,561	51,22
K 5+440	K 5+420	20	2,561	51,22
K 5+420	K 5+400	20	2,561	51,22
K 5+400	K 5+380	20	2,561	51,22
K 5+380	K 5+360	20	2,561	51,22
K 5+360	K 5+340	20	2,561	51,22
K 5+340	K 5+320	20	2,561	51,22
K 5+320	K 5+300	20	2,561	51,22
K 5+300	K 5+280	20	2,561	51,22
K 5+280	K 5+260	20	2,561	51,22

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 5+260	K 5+240	20	2,561	51,22
K 5+240	K 5+220	20	2,561	51,22
K 5+220	K 5+200	20	2,561	51,22
K 5+200	K 5+180	20	2,561	51,22
K 5+180	K 5+160	20	2,561	51,22
K 5+160	K 5+140	20	2,561	51,22
K 5+140	K 5+120	20	2,561	51,22
K 5+120	K 5+100	20	2,561	51,22
K 5+100	K 5+080	20	2,561	51,22
K 5+080	K 5+060	20	2,561	51,22
K 5+060	K 5+040	20	2,561	51,22
K 5+040	K 5+020	20	2,561	51,22
K 5+020	K 5+000	20	2,561	51,22
K 5+000	K 4+980	20	2,561	51,22
K 4+980	K 4+960	20	2,561	51,22
K 4+960	K 4+940	20	2,561	51,22
K 4+940	K 4+920	20	2,561	51,22
K 4+920	K 4+900	20	2,561	51,22
K 4+900	K 4+880	20	2,561	51,22
K 4+880	K 4+860	20	2,561	51,22
K 4+860	K 4+840	20	2,561	51,22
K 4+840	K 4+820	20	2,561	51,22
K 4+820	K 4+800	20	2,561	51,22
K 4+800	K 4+780	20	2,561	51,22
K 4+780	K 4+760	20	2,561	51,22
K 4+760	K 4+740	20	2,561	51,22
K 4+740	K 4+720	20	2,561	51,22
K 4+720	K 4+700	20	2,561	51,22
K 4+700	K 4+680	20	2,561	51,22
K 4+680	K 4+660	20	2,561	51,22
K 4+660	K 4+640	20	2,561	51,22
K 4+640	K 4+620	20	2,561	51,22

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 4+620	K 4+600	20	2,561	51,22
K 4+600	K 4+580	20	2,561	51,22
K 4+580	K 4+560	20	2,561	51,22
K 4+560	K 4+540	20	2,561	51,22
K 4+540	K 4+520	20	2,561	51,22
K 4+520	K 4+500	20	2,561	51,22
K 4+500	K 4+480	20	2,561	51,22
K 4+480	K 4+460	20	2,561	51,22
K 4+460	K 4+440	20	2,561	51,22
K 4+440	K 4+420	20	2,561	51,22
K 4+420	K 4+400	20	2,561	51,22
K 4+400	K 4+380	20	2,561	51,22
K 4+380	K 4+360	20	2,561	51,22
K 4+360	K 4+340	20	2,561	51,22
K 4+340	K 4+320	20	2,561	51,22
K 4+320	K 4+300	20	2,561	51,22
K 4+300	K 4+280	20	2,561	51,22
K 4+280	K 4+260	20	2,561	51,22
K 4+260	K 4+240	20	2,561	51,22
K 4+240	K 4+220	20	2,561	51,22
K 4+220	K 4+200	20	2,561	51,22
K 4+200	K 4+180	20	2,561	51,22
K 4+180	K 4+160	20	2,561	51,22
K 4+160	K 4+140	20	2,561	51,22
K 4+140	K 4+120	20	2,561	51,22
K 4+120	K 4+100	20	2,561	51,22
K 4+100	K 4+080	20	2,561	51,22
K 4+080	K 4+060	20	2,561	51,22
K 4+060	K 4+040	20	2,561	51,22
K 4+040	K 4+020	20	2,561	51,22
K 4+020	K 4+000	20	2,561	51,22
K 4+000	K 3+980	20	2,561	51,22
K 3+980	K 3+960	20	2,561	51,22
K 3+960	K 3+940	20	2,561	51,22
K 3+940	K 3+920	20	2,561	51,22
K 3+920	K 3+900	20	2,561	51,22
K 3+900	K 3+880	20	2,561	51,22
K 3+880	K 3+860	20	2,561	51,22
K 3+860	K 3+840	20	2,561	51,22
K 3+840	K 3+820	20	2,561	51,22
K 3+820	K 3+800	20	2,561	51,22
K 3+800	K 3+780	20	2,561	51,22
K 3+780	K 3+760	20	2,561	51,22
K 3+760	K 3+740	20	2,561	51,22
K 3+740	K 3+720	20	2,561	51,22
K 3+720	K 3+700	20	2,561	51,22
K 3+700	K 3+680	20	2,561	51,22
K 3+680	K 3+660	20	2,561	51,22
K 3+660	K 3+640	20	2,561	51,22
K 3+640	K 3+620	20	2,561	51,22
K 3+620	K 3+600	20	2,561	51,22
K 3+600	K 3+580	20	2,561	51,22
K 3+580	K 3+560	20	2,561	51,22
K 3+560	K 3+540	20	2,561	51,22
K 3+540	K 3+520	20	2,561	51,22
K 3+520	K 3+500	20	2,561	51,22
K 3+500	K 3+480	20	2,561	51,22
K 3+480	K 3+460	20	2,561	51,22

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	SUB-BASE GRANULAR CLASE A

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 3+460	K 3+440	20	2,561	51,22
K 3+440	K 3+420	20	2,561	51,22
K 3+420	K 3+400	20	2,561	51,22
K 3+400	K 3+380	20	2,561	51,22
K 3+380	K 3+360	20	2,561	51,22
K 3+360	K 3+340	20	2,561	51,22
K 3+340	K 3+320	20	2,561	51,22
K 3+320	K 3+300	20	2,561	51,22
K 3+300	K 3+280	20	2,561	51,22
	TOTAL			7478,12

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12456


CONSORCIO HALCÓN

ANEXO

SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS

12957

SUB-BASE GRANULAR CLASE
A NORMA INVIAS
PARCIAL 3

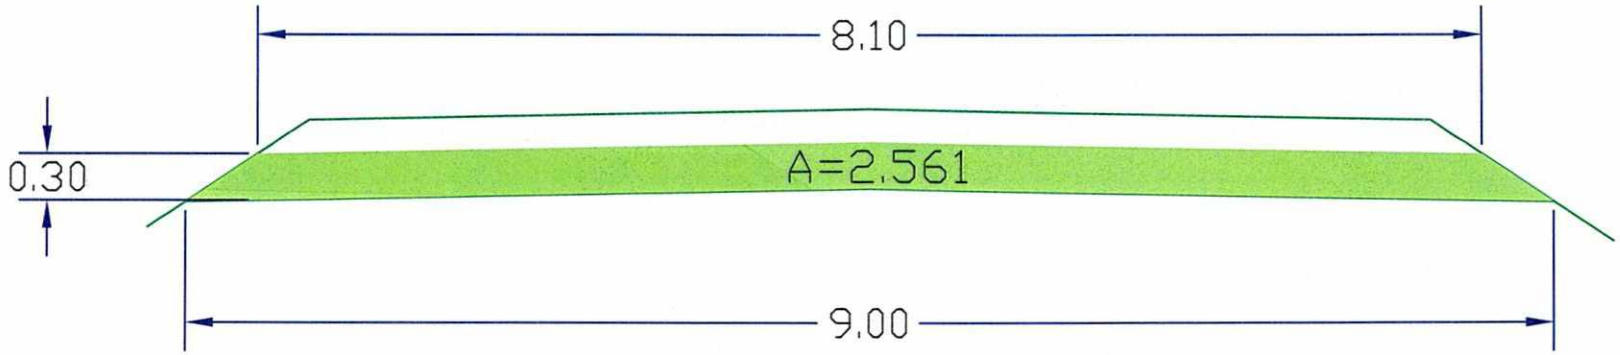

NOTA: EL VALOR DEL AREA ES TOMADO DE LAS
CARTERAS ENTREGADAS POR EL DISEÑO GEOMETRICO

12458

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META", con código BPIN 2021005500214.

Certificamos que la fuente de material que está siendo utilizada en las actividades de SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS y BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS corresponde al Rio Guamal específicamente la mina Murillo, ubicada en el municipio de Guamal. Siendo esta la fuente más cercana al proyecto en mención, ubicada a 8,6 km del inicio el proyecto punto K15+490. Esta fuente de material fue la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, entregados por la Agencia Para la Infraestructura del Meta.

Se adjunta plano de distancia a la fuente en un folio.


Dada en Villavicencio, a los 30 (treinta) días del mes de agosto de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

12959

CONSORCIO INTER AIM

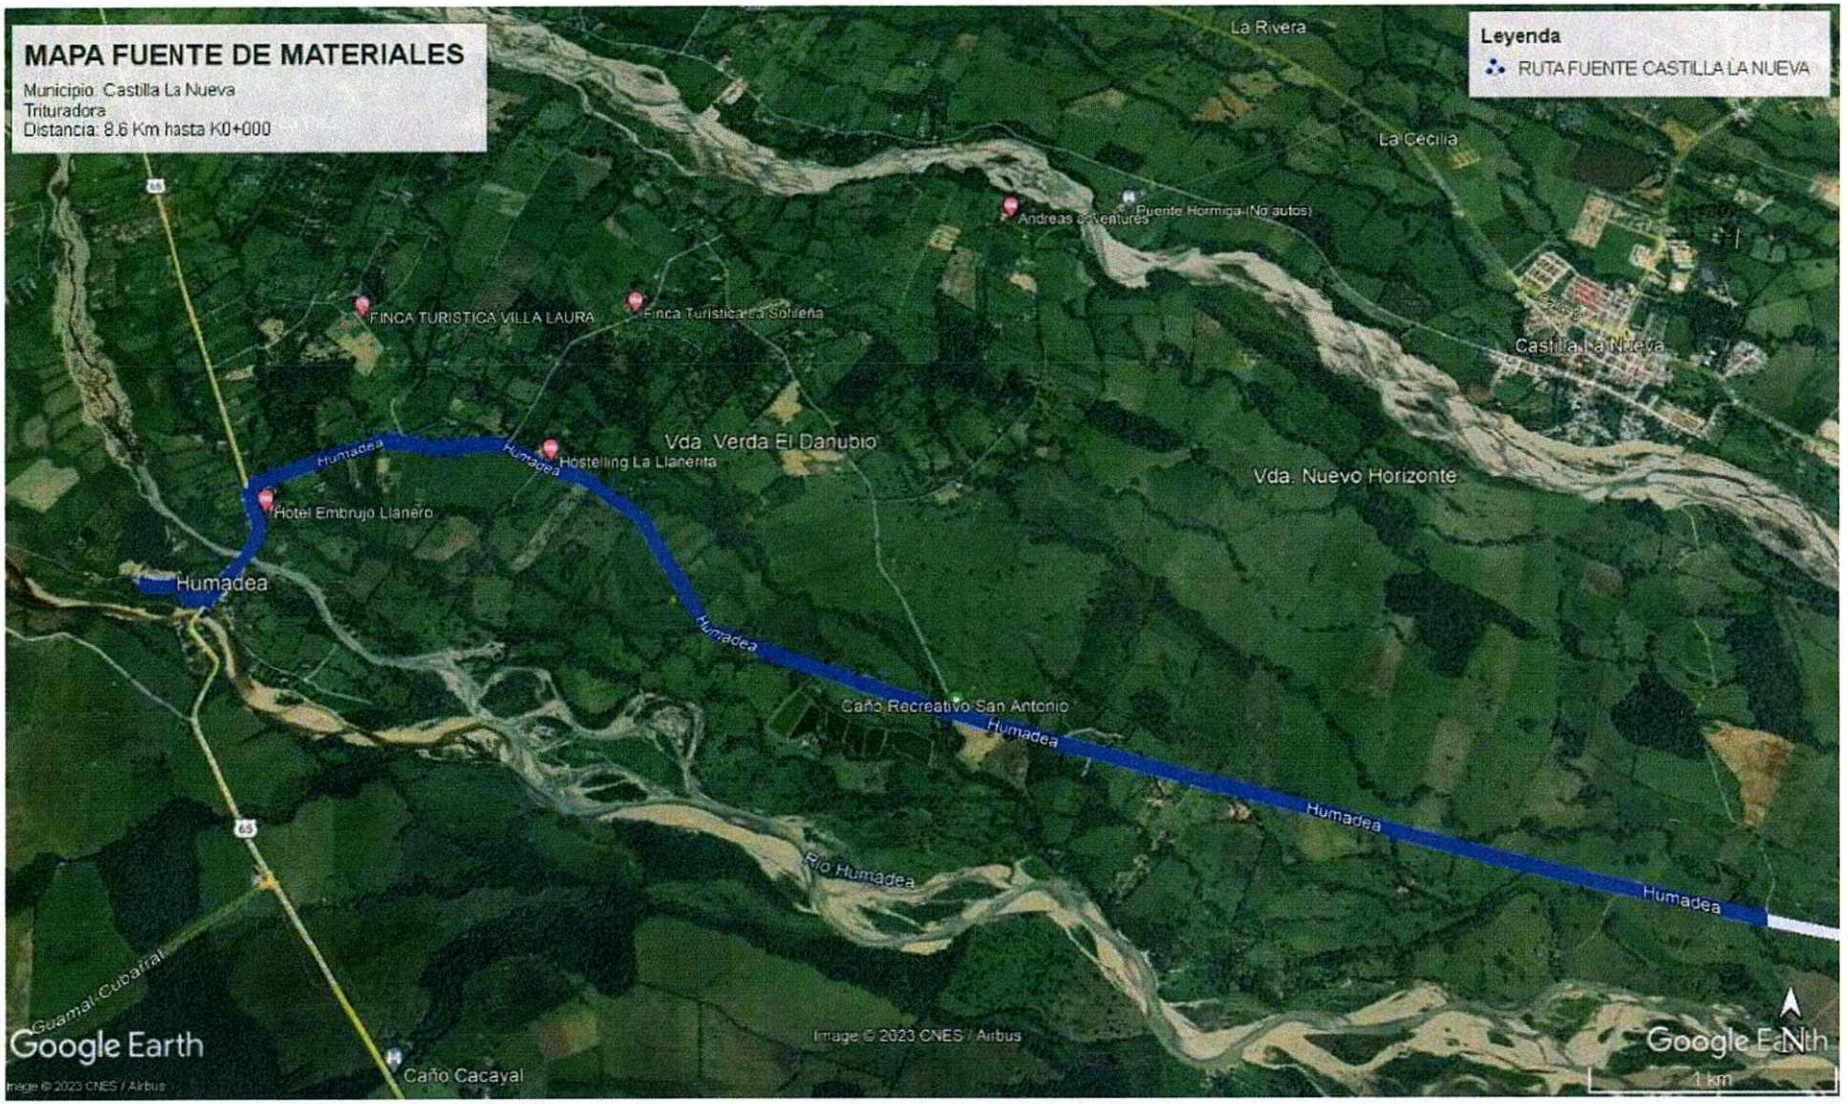

Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

12480

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 7+000	K 6+980	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+980	K 6+960	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+960	K 6+940	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+940	K 6+920	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+920	K 6+900	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+900	K 6+880	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+880	K 6+860	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+860	K 6+840	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+840	K 6+820	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+820	K 6+800	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+800	K 6+780	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+780	K 6+760	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+760	K 6+740	20	1,175	23,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	305,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12961

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+740	K 6+720	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+720	K 6+700	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+700	K 6+680	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+680	K 6+660	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+660	K 6+640	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+640	K 6+620	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+620	K 6+600	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+600	K 6+580	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+580	K 6+560	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+560	K 6+540	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+540	K 6+520	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+520	K 6+500	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+500	K 6+480	20	1,175	23,50
PASAN: 305,50				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	611,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12462

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+480	K 6+460	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+460	K 6+440	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+440	K 6+420	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+420	K 6+400	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+400	K 6+380	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+380	K 6+360	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+360	K 6+340	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+340	K 6+320	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+320	K 6+300	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+300	K 6+280	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+280	K 6+260	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+260	K 6+240	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+240	K 6+220	20	1,175	23,50
PASAN: **611,00**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	916,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12963

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+220	K 6+200	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+200	K 6+180	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+180	K 6+160	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+160	K 6+140	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+140	K 6+120	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+120	K 6+100	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+100	K 6+080	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+080	K 6+060	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+060	K 6+040	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+040	K 6+020	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+020	K 6+000	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 6+000	K 5+980	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+980	K 5+960	20	1,175	23,50
PASAN: **916,50**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	1.222,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12469

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+960	K 5+940	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+940	K 5+920	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+920	K 5+900	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+900	K 5+880	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+880	K 5+860	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+860	K 5+840	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+840	K 5+820	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+820	K 5+800	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+800	K 5+780	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+780	K 5+760	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+760	K 5+740	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+740	K 5+720	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+720	K 5+700	20	1,175	23,50
PASAN: 1.222,00				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	1.527,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+700	K 5+680	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+680	K 5+660	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+660	K 5+640	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+640	K 5+620	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+620	K 5+600	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+600	K 5+580	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+580	K 5+560	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+560	K 5+540	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+540	K 5+520	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+520	K 5+500	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+500	K 5+480	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+480	K 5+460	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+460	K 5+440	20	1,175	23,50
PASAN: **1.527,50**				**SUBTOTAL**	305,50
				TOTAL	1.833,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12466

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.3	**BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**AREA**	**TOTAL**
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+440	K 5+420	20	1,175	23,50
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 5+420	K 5+400	20	1,175	23,50
PASAN: **1.833,00**				**SUBTOTAL**	47,00
				TOTAL	1.880,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12962

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 7+000	K 06+980	20	1,175	23,50
K 6+980	K 06+960	20	1,175	23,50
K 6+960	K 06+940	20	1,175	23,50
K 6+940	K 06+920	20	1,175	23,50
K 6+920	K 06+900	20	1,175	23,50
K 6+900	K 06+880	20	1,175	23,50
K 6+880	K 06+860	20	1,175	23,50
K 6+860	K 06+840	20	1,175	23,50
K 6+840	K 06+820	20	1,175	23,50
K 6+820	K 06+800	20	1,175	23,50
K 6+800	K 06+780	20	1,175	23,50
K 6+780	K 06+760	20	1,175	23,50
K 6+760	K 06+740	20	1,175	23,50
K 6+740	K 06+720	20	1,175	23,50
K 6+720	K 06+700	20	1,175	23,50
K 6+700	K 06+680	20	1,175	23,50
K 6+680	K 06+660	20	1,175	23,50
K 6+660	K 06+640	20	1,175	23,50
K 6+640	K 06+620	20	1,175	23,50
K 6+620	K 06+600	20	1,175	23,50
K 6+600	K 06+580	20	1,175	23,50
K 6+580	K 06+560	20	1,175	23,50
K 6+560	K 06+540	20	1,175	23,50
K 6+540	K 06+520	20	1,175	23,50
K 6+520	K 06+500	20	1,175	23,50
K 6+500	K 06+480	20	1,175	23,50
K 6+480	K 06+460	20	1,175	23,50
K 6+460	K 06+440	20	1,175	23,50
K 6+440	K 06+420	20	1,175	23,50
K 6+420	K 06+400	20	1,175	23,50
K 6+400	K 06+380	20	1,175	23,50
K 6+380	K 06+360	20	1,175	23,50
K 6+360	K 06+340	20	1,175	23,50
K 6+340	K 06+320	20	1,175	23,50
K 6+320	K 06+300	20	1,175	23,50
K 6+300	K 06+280	20	1,175	23,50
K 6+280	K 06+260	20	1,175	23,50
K 6+260	K 06+240	20	1,175	23,50
K 6+240	K 06+220	20	1,175	23,50
K 6+220	K 06+200	20	1,175	23,50
K 6+200	K 06+180	20	1,175	23,50
K 6+180	K 06+160	20	1,175	23,50

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	BASE GRANULAR CLASE A

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 6+160	K 06+140	20	1,175	23,50
K 6+140	K 06+120	20	1,175	23,50
K 6+120	K 06+100	20	1,175	23,50
K 6+100	K 06+080	20	1,175	23,50
K 6+080	K 06+060	20	1,175	23,50
K 6+060	K 06+040	20	1,175	23,50
K 6+040	K 06+020	20	1,175	23,50
K 6+020	K 06+000	20	1,175	23,50
K 6+000	K 05+980	20	1,175	23,50
K 5+980	K 05+960	20	1,175	23,50
K 5+960	K 05+940	20	1,175	23,50
K 5+940	K 05+920	20	1,175	23,50
K 5+920	K 05+900	20	1,175	23,50
K 5+900	K 05+880	20	1,175	23,50
K 5+880	K 05+860	20	1,175	23,50
K 5+860	K 05+840	20	1,175	23,50
K 5+840	K 05+820	20	1,175	23,50
K 5+820	K 05+800	20	1,175	23,50
K 5+800	K 05+780	20	1,175	23,50
K 5+780	K 05+760	20	1,175	23,50
K 5+760	K 05+740	20	1,175	23,50
K 5+740	K 05+720	20	1,175	23,50
K 5+720	K 05+700	20	1,175	23,50
K 5+700	K 05+680	20	1,175	23,50
K 5+680	K 05+660	20	1,175	23,50
K 5+660	K 05+640	20	1,175	23,50
K 5+640	K 05+620	20	1,175	23,50
K 5+620	K 05+600	20	1,175	23,50
K 5+600	K 05+580	20	1,175	23,50
K 5+580	K 05+560	20	1,175	23,50
K 5+560	K 05+540	20	1,175	23,50
K 5+540	K 05+520	20	1,175	23,50
K 5+520	K 05+500	20	1,175	23,50
K 5+500	K 05+480	20	1,175	23,50
K 5+480	K 05+460	20	1,175	23,50
K 5+460	K 05+440	20	1,175	23,50
K 5+440	K 05+420	20	1,175	23,50
K 5+420	K 05+400	20	1,175	23,50
K 5+400				
	TOTAL			1880,00

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12969


CONSORCIO HALCÓN

ANEXO

BASE GRANULAR CLASE A
NORMA INVIAS

1290

BASE GRANULAR CLASE A
NORMA INVIAS
PARCIAL #3

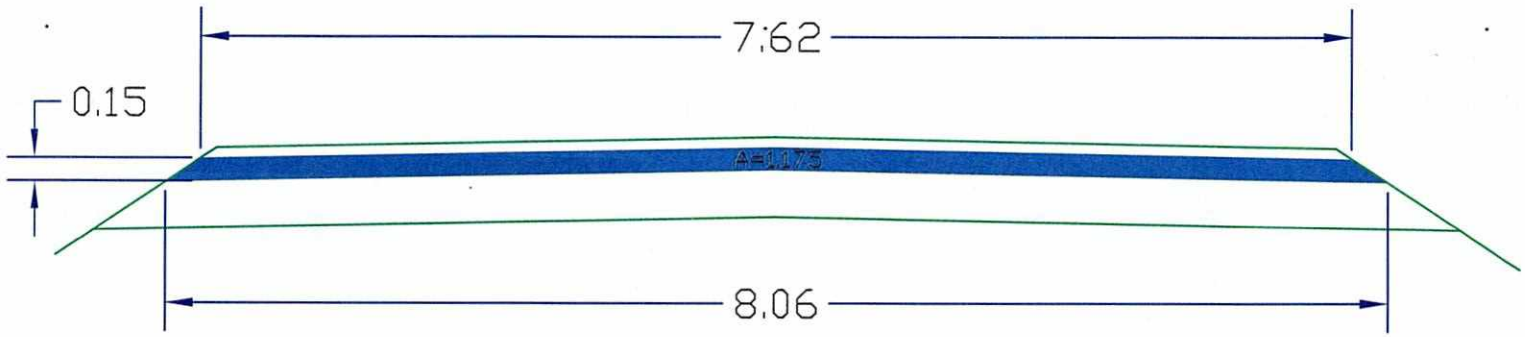

NOTA: EL VALOR DEL AREA ES TOMADO DE LAS CARTERAS ENTREGADAS POR EL DISEÑO GEOMETRICO

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META", con código BPIN 2021005500214.

Certificamos que la fuente de material que está siendo utilizada en las actividades de SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS y BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS corresponde al Rio Guamal específicamente la mina Murillo, ubicada en el municipio de Guamal. Siendo esta la fuente más cercana al proyecto en mención, ubicada a 8,6 km del inicio el proyecto punto K15+490. Esta fuente de material fue la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, entregados por la Agencia Para la Infraestructura del Meta.


Se adjunta plano de distancia a la fuente en un folio.

Dada en Villavicencio, a los 30 (treinta) días del mes de agosto de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

CONSORCIO INTER AIM

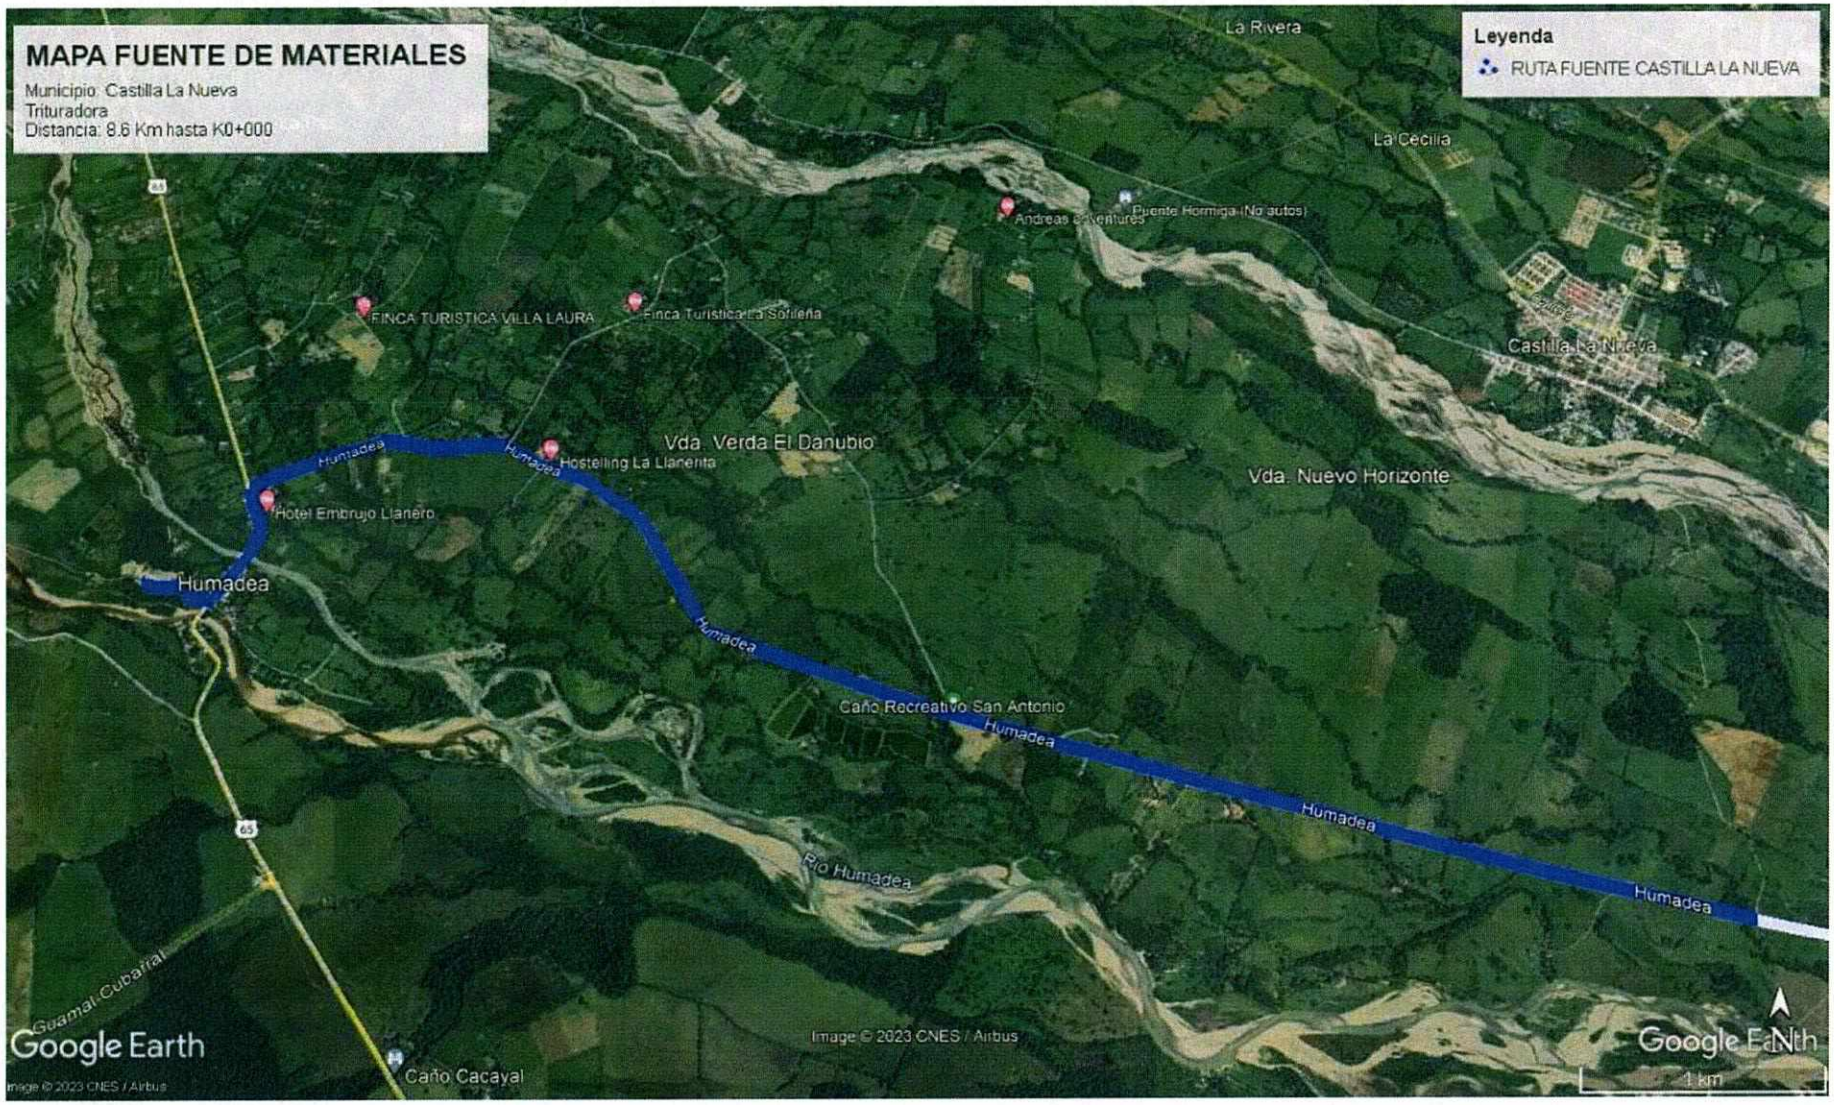

Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

1283

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		

CAPITULO:	PAVIMENTO FLEXIBLE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA	ANCHO	TOTAL
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 15+460	K 14+460	1000,00	7,6	7.600,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 14+460	K 13+460	1000,00	7,6	7.600,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 13+460	K 12+460	1000,00	7,6	7.600,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 12+460	K 11+460	1000,00	7,6	7.600,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 11+460	K 10+460	1000,00	7,6	7.600,00
PASAN:				SUBTOTAL	38.000,00
				TOTAL	38.000,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1292

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3

CAPITULO:	PAVIMENTO FLEXIBLE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 15+460	K 14+460	1000,00	0,475	475,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 14+460	K 13+460	1000,00	0,475	475,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 13+460	K 12+460	1000,00	0,475	475,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 12+460	K 11+460	1000,00	0,475	475,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 11+460	K 10+460	1000,00	0,475	475,00
PASAN:				SUBTOTAL	2375,00
				TOTAL	2375,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12425

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 15+460	K 15+440	20	0,475	9,50
K 15+440	K 15+420	20	0,475	9,50
K 15+420	K 15+400	20	0,475	9,50
K 15+400	K 15+380	20	0,475	9,50
K 15+380	K 15+360	20	0,475	9,50
K 15+360	K 15+340	20	0,475	9,50
K 15+340	K 15+320	20	0,475	9,50
K 15+320	K 15+300	20	0,475	9,50
K 15+300	K 15+280	20	0,475	9,50
K 15+280	K 15+260	20	0,475	9,50
K 15+260	K 15+240	20	0,475	9,50
K 15+240	K 15+220	20	0,475	9,50
K 15+220	K 15+200	20	0,475	9,50
K 15+200	K 15+180	20	0,475	9,50
K 15+180	K 15+160	20	0,475	9,50
K 15+160	K 15+140	20	0,475	9,50
K 15+140	K 15+120	20	0,475	9,50
K 15+120	K 15+100	20	0,475	9,50
K 15+100	K 15+080	20	0,475	9,50
K 15+080	K 15+060	20	0,475	9,50
K 15+060	K 15+040	20	0,475	9,50
K 15+040	K 15+020	20	0,475	9,50
K 15+020	K 15+000	20	0,475	9,50
K 15+000	K 14+980	20	0,475	9,50
K 14+980	K 14+960	20	0,475	9,50
K 14+960	K 14+940	20	0,475	9,50
K 14+940	K 14+920	20	0,475	9,50
K 14+920	K 14+900	20	0,475	9,50
K 14+900	K 14+880	20	0,475	9,50
K 14+880	K 14+860	20	0,475	9,50
K 14+860	K 14+840	20	0,475	9,50
K 14+840	K 14+820	20	0,475	9,50
K 14+820	K 14+800	20	0,475	9,50
K 14+800	K 14+780	20	0,475	9,50
K 14+780	K 14+760	20	0,475	9,50
K 14+760	K 14+740	20	0,475	9,50
K 14+740	K 14+720	20	0,475	9,50
K 14+720	K 14+700	20	0,475	9,50
K 14+700	K 14+680	20	0,475	9,50
K 14+680	K 14+660	20	0,475	9,50
K 14+660	K 14+640	20	0,475	9,50
K 14+640	K 14+620	20	0,475	9,50
K 14+620	K 14+600	20	0,475	9,50
K 14+600	K 14+580	20	0,475	9,50
K 14+580	K 14+560	20	0,475	9,50
K 14+560	K 14+540	20	0,475	9,50
K 14+540	K 14+520	20	0,475	9,50
K 14+520	K 14+500	20	0,475	9,50
K 14+500	K 14+480	20	0,475	9,50
K 14+480	K 14+460	20	0,475	9,50
K 14+460	K 14+440	20	0,475	9,50
K 14+440	K 14+420	20	0,475	9,50
K 14+420	K 14+400	20	0,475	9,50
K 14+400	K 14+380	20	0,475	9,50
K 14+380	K 14+360	20	0,475	9,50

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 14+360	K 14+340	20	0,475	9,50
K 14+340	K 14+320	20	0,475	9,50
K 14+320	K 14+300	20	0,475	9,50
K 14+300	K 14+280	20	0,475	9,50
K 14+280	K 14+260	20	0,475	9,50
K 14+260	K 14+240	20	0,475	9,50
K 14+240	K 14+220	20	0,475	9,50
K 14+220	K 14+200	20	0,475	9,50
K 14+200	K 14+180	20	0,475	9,50
K 14+180	K 14+160	20	0,475	9,50
K 14+160	K 14+140	20	0,475	9,50
K 14+140	K 14+120	20	0,475	9,50
K 14+120	K 14+100	20	0,475	9,50
K 14+100	K 14+080	20	0,475	9,50
K 14+080	K 14+060	20	0,475	9,50
K 14+060	K 14+040	20	0,475	9,50
K 14+040	K 14+020	20	0,475	9,50
K 14+020	K 14+000	20	0,475	9,50
K 14+000	K 13+980	20	0,475	9,50
K 13+980	K 13+960	20	0,475	9,50
K 13+960	K 13+940	20	0,475	9,50
K 13+940	K 13+920	20	0,475	9,50
K 13+920	K 13+900	20	0,475	9,50
K 13+900	K 13+880	20	0,475	9,50
K 13+880	K 13+860	20	0,475	9,50
K 13+860	K 13+840	20	0,475	9,50
K 13+840	K 13+820	20	0,475	9,50
K 13+820	K 13+800	20	0,475	9,50
K 13+800	K 13+780	20	0,475	9,50
K 13+780	K 13+760	20	0,475	9,50
K 13+760	K 13+740	20	0,475	9,50
K 13+740	K 13+720	20	0,475	9,50
K 13+720	K 13+700	20	0,475	9,50
K 13+700	K 13+680	20	0,475	9,50
K 13+680	K 13+660	20	0,475	9,50
K 13+660	K 13+640	20	0,475	9,50
K 13+640	K 13+620	20	0,475	9,50
K 13+620	K 13+600	20	0,475	9,50
K 13+600	K 13+580	20	0,475	9,50
K 13+580	K 13+560	20	0,475	9,50
K 13+560	K 13+540	20	0,475	9,50
K 13+540	K 13+520	20	0,475	9,50
K 13+520	K 13+500	20	0,475	9,50
K 13+500	K 13+480	20	0,475	9,50
K 13+480	K 13+460	20	0,475	9,50
K 13+460	K 13+440	20	0,475	9,50
K 13+440	K 13+420	20	0,475	9,50
K 13+420	K 13+400	20	0,475	9,50
K 13+400	K 13+380	20	0,475	9,50
K 13+380	K 13+360	20	0,475	9,50
K 13+360	K 13+340	20	0,475	9,50
K 13+340	K 13+320	20	0,475	9,50
K 13+320	K 13+300	20	0,475	9,50
K 13+300	K 13+280	20	0,475	9,50
K 13+280	K 13+260	20	0,475	9,50
K 13+260	K 13+240	20	0,475	9,50
K 13+240	K 13+220	20	0,475	9,50
K 13+220	K 13+200	20	0,475	9,50

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 13+200	K 13+180	20	0,475	9,50
K 13+180	K 13+160	20	0,475	9,50
K 13+160	K 13+140	20	0,475	9,50
K 13+140	K 13+120	20	0,475	9,50
K 13+120	K 13+100	20	0,475	9,50
K 13+100	K 13+080	20	0,475	9,50
K 13+080	K 13+060	20	0,475	9,50
K 13+060	K 13+040	20	0,475	9,50
K 13+040	K 13+020	20	0,475	9,50
K 13+020	K 13+000	20	0,475	9,50
K 13+000	K 12+980	20	0,475	9,50
K 12+980	K 12+960	20	0,475	9,50
K 12+960	K 12+940	20	0,475	9,50
K 12+940	K 12+920	20	0,475	9,50
K 12+920	K 12+900	20	0,475	9,50
K 12+900	K 12+880	20	0,475	9,50
K 12+880	K 12+860	20	0,475	9,50
K 12+860	K 12+840	20	0,475	9,50
K 12+840	K 12+820	20	0,475	9,50
K 12+820	K 12+800	20	0,475	9,50
K 12+800	K 12+780	20	0,475	9,50
K 12+780	K 12+760	20	0,475	9,50
K 12+760	K 12+740	20	0,475	9,50
K 12+740	K 12+720	20	0,475	9,50
K 12+720	K 12+700	20	0,475	9,50
K 12+700	K 12+680	20	0,475	9,50
K 12+680	K 12+660	20	0,475	9,50
K 12+660	K 12+640	20	0,475	9,50
K 12+640	K 12+620	20	0,475	9,50
K 12+620	K 12+600	20	0,475	9,50
K 12+600	K 12+580	20	0,475	9,50
K 12+580	K 12+560	20	0,475	9,50
K 12+560	K 12+540	20	0,475	9,50
K 12+540	K 12+520	20	0,475	9,50
K 12+520	K 12+500	20	0,475	9,50
K 12+500	K 12+480	20	0,475	9,50
K 12+480	K 12+460	20	0,475	9,50
K 12+460	K 12+440	20	0,475	9,50
K 12+440	K 12+420	20	0,475	9,50
K 12+420	K 12+400	20	0,475	9,50
K 12+400	K 12+380	20	0,475	9,50
K 12+380	K 12+360	20	0,475	9,50
K 12+360	K 12+340	20	0,475	9,50
K 12+340	K 12+320	20	0,475	9,50
K 12+320	K 12+300	20	0,475	9,50
K 12+300	K 12+280	20	0,475	9,50
K 12+280	K 12+260	20	0,475	9,50
K 12+260	K 12+240	20	0,475	9,50
K 12+240	K 12+220	20	0,475	9,50
K 12+220	K 12+200	20	0,475	9,50
K 12+200	K 12+180	20	0,475	9,50
K 12+180	K 12+160	20	0,475	9,50
K 12+160	K 12+140	20	0,475	9,50
K 12+140	K 12+120	20	0,475	9,50
K 12+120	K 12+100	20	0,475	9,50
K 12+100	K 12+080	20	0,475	9,50
K 12+080	K 12+060	20	0,475	9,50
K 12+060	K 12+040	20	0,475	9,50

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 12+040	K 12+020	20	0,475	9,50
K 12+020	K 12+000	20	0,475	9,50
K 12+000	K 11+980	20	0,475	9,50
K 11+980	K 11+960	20	0,475	9,50
K 11+960	K 11+940	20	0,475	9,50
K 11+940	K 11+920	20	0,475	9,50
K 11+920	K 11+900	20	0,475	9,50
K 11+900	K 11+880	20	0,475	9,50
K 11+880	K 11+860	20	0,475	9,50
K 11+860	K 11+840	20	0,475	9,50
K 11+840	K 11+820	20	0,475	9,50
K 11+820	K 11+800	20	0,475	9,50
K 11+800	K 11+780	20	0,475	9,50
K 11+780	K 11+760	20	0,475	9,50
K 11+760	K 11+740	20	0,475	9,50
K 11+740	K 11+720	20	0,475	9,50
K 11+720	K 11+700	20	0,475	9,50
K 11+700	K 11+680	20	0,475	9,50
K 11+680	K 11+660	20	0,475	9,50
K 11+660	K 11+640	20	0,475	9,50
K 11+640	K 11+620	20	0,475	9,50
K 11+620	K 11+600	20	0,475	9,50
K 11+600	K 11+580	20	0,475	9,50
K 11+580	K 11+560	20	0,475	9,50
K 11+560	K 11+540	20	0,475	9,50
K 11+540	K 11+520	20	0,475	9,50
K 11+520	K 11+500	20	0,475	9,50
K 11+500	K 11+480	20	0,475	9,50
K 11+480	K 11+460	20	0,475	9,50
K 11+460	K 11+440	20	0,475	9,50
K 11+440	K 11+420	20	0,475	9,50
K 11+420	K 11+400	20	0,475	9,50
K 11+400	K 11+380	20	0,475	9,50
K 11+380	K 11+360	20	0,475	9,50
K 11+360	K 11+340	20	0,475	9,50
K 11+340	K 11+320	20	0,475	9,50
K 11+320	K 11+300	20	0,475	9,50
K 11+300	K 11+280	20	0,475	9,50
K 11+280	K 11+260	20	0,475	9,50
K 11+260	K 11+240	20	0,475	9,50
K 11+240	K 11+220	20	0,475	9,50
K 11+220	K 11+200	20	0,475	9,50
K 11+200	K 11+180	20	0,475	9,50
K 11+180	K 11+160	20	0,475	9,50
K 11+160	K 11+140	20	0,475	9,50
K 11+140	K 11+120	20	0,475	9,50
K 11+120	K 11+100	20	0,475	9,50
K 11+100	K 11+080	20	0,475	9,50
K 11+080	K 11+060	20	0,475	9,50
K 11+060	K 11+040	20	0,475	9,50
K 11+040	K 11+020	20	0,475	9,50
K 11+020	K 11+000	20	0,475	9,50
K 11+000	K 10+980	20	0,475	9,50
K 10+980	K 10+960	20	0,475	9,50
K 10+960	K 10+940	20	0,475	9,50
K 10+940	K 10+920	20	0,475	9,50
K 10+920	K 10+900	20	0,475	9,50
K 10+900	K 10+880	20	0,475	9,50

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 10+880	K 10+860	20	0,475	9,50
K 10+860	K 10+840	20	0,475	9,50
K 10+840	K 10+820	20	0,475	9,50
K 10+820	K 10+800	20	0,475	9,50
K 10+800	K 10+780	20	0,475	9,50
K 10+780	K 10+760	20	0,475	9,50
K 10+760	K 10+740	20	0,475	9,50
K 10+740	K 10+720	20	0,475	9,50
K 10+720	K 10+700	20	0,475	9,50
K 10+700	K 10+680	20	0,475	9,50
K 10+680	K 10+660	20	0,475	9,50
K 10+660	K 10+640	20	0,475	9,50
K 10+640	K 10+620	20	0,475	9,50
K 10+620	K 10+600	20	0,475	9,50
K 10+600	K 10+580	20	0,475	9,50
K 10+580	K 10+560	20	0,475	9,50
K 10+560	K 10+540	20	0,475	9,50
K 10+540	K 10+520	20	0,475	9,50
K 10+520	K 10+500	20	0,475	9,50
K 10+500	K 10+480	20	0,475	9,50
K 10+480	K 10+460	20	0,475	9,50
K 10+460				
	TOTAL			2375,00 M3

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON


FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

1240

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
PARCIAL #3

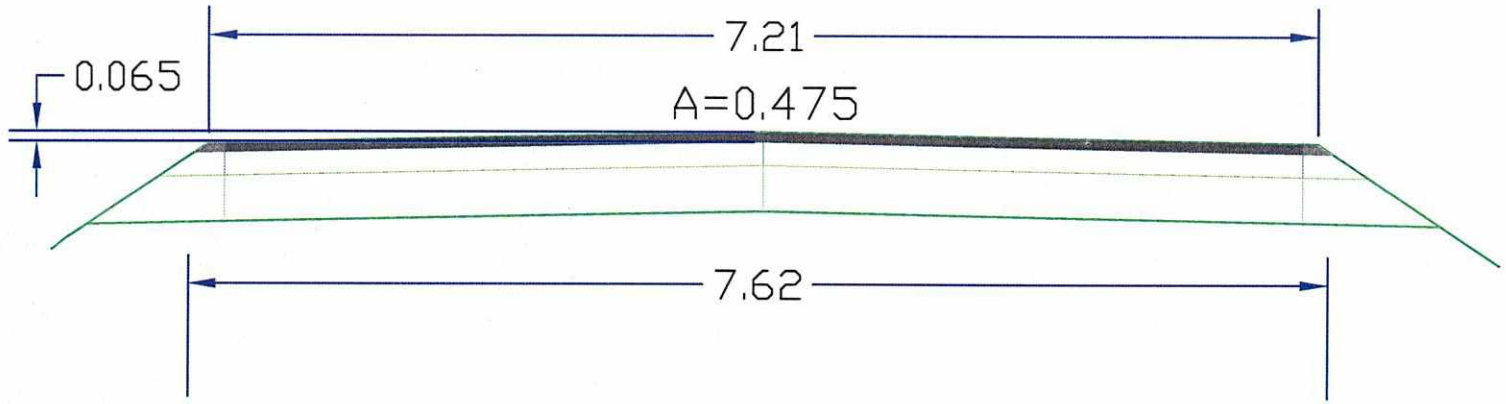

NOTA: EL VALOR DEL AREA ES TOMADO DE LAS CARTERAS ENTREGADAS POR EL DISEÑO GEOMETRICO

12481

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META", con código BPIN 2021005500214".

Que la fuente de material utilizada para las actividades de **MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19** proviene de **Triturados & Triturados Ltda.**, localizada en el municipio de Castilla La Nueva. Siendo esta la fuente más cercana al proyecto en mención, ubicada a 31,10 km del inicio el proyecto punto K15+490. Esta fuente de material fue la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, entregados por la Agencia Para la Infraestructura del Meta.


Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia en un folio.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

CONSORCIO INTER AIM

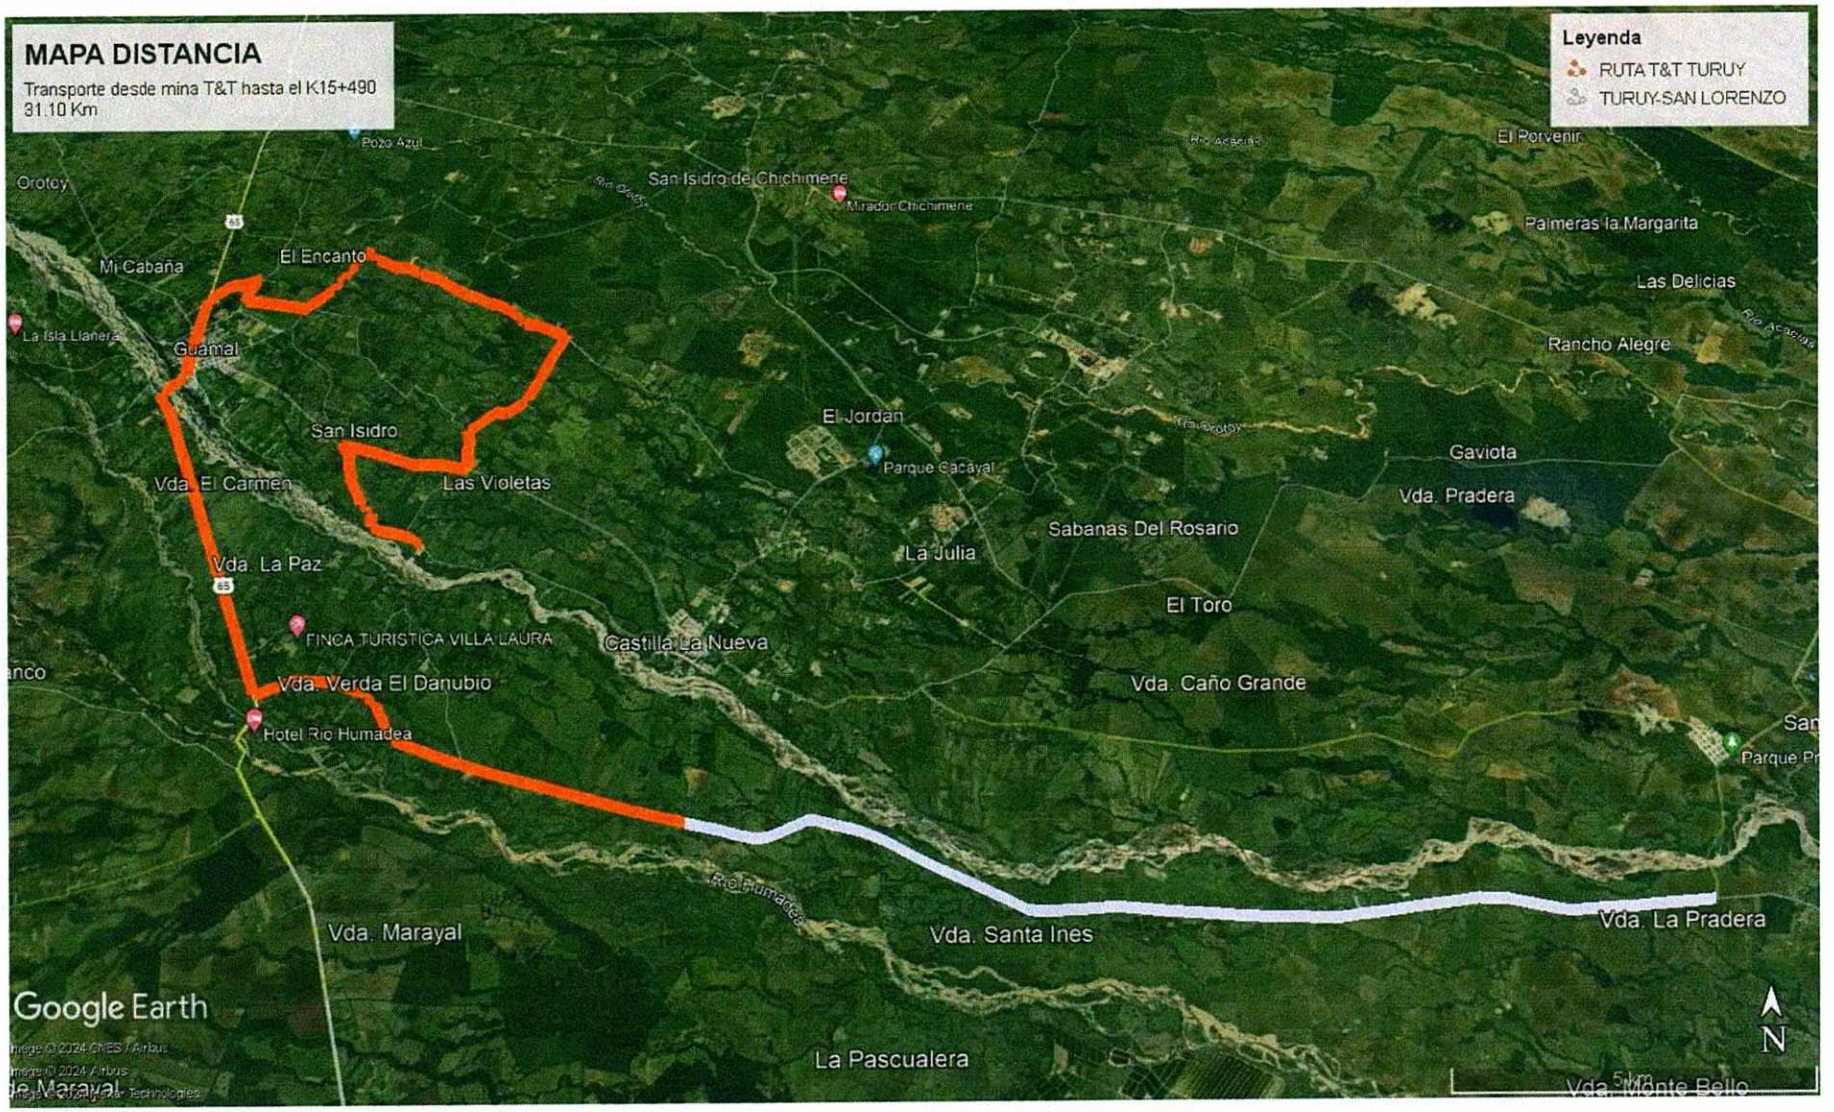

Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

1248

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		
CAPITULO:	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.6	**TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR**	**M3/KM**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DESDE	HASTA	DISTANCIA		
TRANSPORTE MATERIAL DE BASE					
BASE GRANULAR CLASE A	K 7+000	K 5+400	1600,00		27.824,00
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MATERIAL DE BASE					
TRANSPORTE MATERIAL DE SUB BASE					
SUB-BASE GRANULAR CLASE A	K 6+280	K 3+400	2880,00		99.743,27
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MATERIAL DE SUB-BASE					
PASAN:				**SUBTOTAL**	127.567,27
				TOTAL	127.567,27

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12484

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 7+000	23,50	15,59	366,365
K 6+980	23,50	15,57	365,895
K 6+960	23,50	15,55	365,425
K 6+940	23,50	15,53	364,955
K 6+920	23,50	15,51	364,485
K 6+900	23,50	15,49	364,015
K 6+880	23,50	15,47	363,545
K 6+860	23,50	15,45	363,075
K 6+840	23,50	15,43	362,605
K 6+820	23,50	15,41	362,135
K 6+800	23,50	15,39	361,665
K 6+780	23,50	15,37	361,195
K 6+760	23,50	15,35	360,725
K 6+740	23,50	15,33	360,255
K 6+720	23,50	15,31	359,785
K 6+700	23,50	15,29	359,315
K 6+680	23,50	15,27	358,845
K 6+660	23,50	15,25	358,375
K 6+640	23,50	15,23	357,905
K 6+620	23,50	15,21	357,435
K 6+600	23,50	15,19	356,965
K 6+580	23,50	15,17	356,495
K 6+560	23,50	15,15	356,025
K 6+540	23,50	15,13	355,555
K 6+520	23,50	15,11	355,085
K 6+500	23,50	15,09	354,615
K 6+480	23,50	15,07	354,145
K 6+460	23,50	15,05	353,675
K 6+440	23,50	15,03	353,205
K 6+420	23,50	15,01	352,735
K 6+400	23,50	14,99	352,265
K 6+380	23,50	14,97	351,795
K 6+360	23,50	14,95	351,325
K 6+340	23,50	14,93	350,855
K 6+320	23,50	14,91	350,385
K 6+300	23,50	14,89	349,915
K 6+280	23,50	14,87	349,445
K 6+260	23,50	14,85	348,975
K 6+240	23,50	14,83	348,505
K 6+220	23,50	14,81	348,035
K 6+200	23,50	14,79	347,565
K 6+180	23,50	14,77	347,095
K 6+160	23,50	14,75	346,625
K 6+140	23,50	14,73	346,155
K 6+120	23,50	14,71	345,685
K 6+100	23,50	14,69	345,215
K 6+080	23,50	14,67	344,745

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR BASE

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 6+060	23,50	14,65	344,275
K 6+040	23,50	14,63	343,805
K 6+020	23,50	14,61	343,335
K 6+000	23,50	14,59	342,865
K 5+980	23,50	14,57	342,395
K 5+960	23,50	14,55	341,925
K 5+940	23,50	14,53	341,455
K 5+920	23,50	14,51	340,985
K 5+900	23,50	14,49	340,515
K 5+880	23,50	14,47	340,045
K 5+860	23,50	14,45	339,575
K 5+840	23,50	14,43	339,105
K 5+820	23,50	14,41	338,635
K 5+800	23,50	14,39	338,165
K 5+780	23,50	14,37	337,695
K 5+760	23,50	14,35	337,225
K 5+740	23,50	14,33	336,755
K 5+720	23,50	14,31	336,285
K 5+700	23,50	14,29	335,815
K 5+680	23,50	14,27	335,345
K 5+660	23,50	14,25	334,875
K 5+640	23,50	14,23	334,405
K 5+620	23,50	14,21	333,935
K 5+600	23,50	14,19	333,465
K 5+580	23,50	14,17	332,995
K 5+560	23,50	14,15	332,525
K 5+540	23,50	14,13	332,055
K 5+520	23,50	14,11	331,585
K 5+500	23,50	14,09	331,115
K 5+480	23,50	14,07	330,645
K 5+460	23,50	14,05	330,175
K 5+440	23,50	14,03	329,705
K 5+420	23,50	14,01	329,235
K 5+400			
	TOTAL		27824,000

$= 1880 m^3$

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

1486

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 6+280	51,22	14,87	761,641
K 6+260	51,22	14,85	760,617
K 6+240	51,22	14,83	759,593
K 6+220	51,22	14,81	758,568
K 6+200	51,22	14,79	757,544
K 6+180	51,22	14,77	756,519
K 6+160	51,22	14,75	755,495
K 6+140	51,22	14,73	754,471
K 6+120	51,22	14,71	753,446
K 6+100	51,22	14,69	752,422
K 6+080	51,22	14,67	751,397
K 6+060	51,22	14,65	750,373
K 6+040	51,22	14,63	749,349
K 6+020	51,22	14,61	748,324
K 6+000	51,22	14,59	747,300
K 5+980	51,22	14,57	746,275
K 5+960	51,22	14,55	745,251
K 5+940	51,22	14,53	744,227
K 5+920	51,22	14,51	743,202
K 5+900	51,22	14,49	742,178
K 5+880	51,22	14,47	741,153
K 5+860	51,22	14,45	740,129
K 5+840	51,22	14,43	739,105
K 5+820	51,22	14,41	738,080
K 5+800	51,22	14,39	737,056
K 5+780	51,22	14,37	736,031
K 5+760	51,22	14,35	735,007
K 5+740	51,22	14,33	733,983
K 5+720	51,22	14,31	732,958
K 5+700	51,22	14,29	731,934
K 5+680	51,22	14,27	730,909
K 5+660	51,22	14,25	729,885
K 5+640	51,22	14,23	728,861
K 5+620	51,22	14,21	727,836
K 5+600	51,22	14,19	726,812
K 5+580	51,22	14,17	725,787
K 5+560	51,22	14,15	724,763
K 5+540	51,22	14,13	723,739
K 5+520	51,22	14,11	722,714
K 5+500	51,22	14,09	721,690
K 5+480	51,22	14,07	720,665
K 5+460	51,22	14,05	719,641
K 5+440	51,22	14,03	718,617
K 5+420	51,22	14,01	717,592
K 5+400	51,22	13,99	716,568
K 5+380	51,22	13,97	715,543
K 5+360	51,22	13,95	714,519
K 5+340	51,22	13,93	713,495
K 5+320	51,22	13,91	712,470
K 5+300	51,22	13,89	711,446
K 5+280	51,22	13,87	710,421
K 5+260	51,22	13,85	709,397

52

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 5+240	51,22	13,83	708,373
K 5+220	51,22	13,81	707,348
K 5+200	51,22	13,79	706,324
K 5+180	51,22	13,77	705,299
K 5+160	51,22	13,75	704,275
K 5+140	51,22	13,73	703,251
K 5+120	51,22	13,71	702,226
K 5+100	51,22	13,69	701,202
K 5+080	51,22	13,67	700,177
K 5+060	51,22	13,65	699,153
K 5+040	51,22	13,63	698,129
K 5+020	51,22	13,61	697,104
K 5+000	51,22	13,59	696,080
K 4+980	51,22	13,57	695,055
K 4+960	51,22	13,55	694,031
K 4+940	51,22	13,53	693,007
K 4+920	51,22	13,51	691,982
K 4+900	51,22	13,49	690,958
K 4+880	51,22	13,47	689,933
K 4+860	51,22	13,45	688,909
K 4+840	51,22	13,43	687,885
K 4+820	51,22	13,41	686,860
K 4+800	51,22	13,39	685,836
K 4+780	51,22	13,37	684,811
K 4+760	51,22	13,35	683,787
K 4+740	51,22	13,33	682,763
K 4+720	51,22	13,31	681,738
K 4+700	51,22	13,29	680,714
K 4+680	51,22	13,27	679,689
K 4+660	51,22	13,25	678,665
K 4+640	51,22	13,23	677,641
K 4+620	51,22	13,21	676,616
K 4+600	51,22	13,19	675,592
K 4+580	51,22	13,17	674,567
K 4+560	51,22	13,15	673,543
K 4+540	51,22	13,13	672,519
K 4+520	51,22	13,11	671,494
K 4+500	51,22	13,09	670,470
K 4+480	51,22	13,07	669,445
K 4+460	51,22	13,05	668,421
K 4+440	51,22	13,03	667,397
K 4+420	51,22	13,01	666,372
K 4+400	51,22	12,99	665,348
K 4+380	51,22	12,97	664,323
K 4+360	51,22	12,95	663,299
K 4+340	51,22	12,93	662,275
K 4+320	51,22	12,91	661,250
K 4+300	51,22	12,89	660,226
K 4+280	51,22	12,87	659,201
K 4+260	51,22	12,85	658,177
K 4+240	51,22	12,83	657,153
K 4+220	51,22	12,81	656,128
K 4+200	51,22	12,79	655,104
K 4+180	51,22	12,77	654,079
K 4+160	51,22	12,75	653,055
K 4+140	51,22	12,73	652,031
K 4+120	51,22	12,71	651,006

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR SUB-BASE

DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 4+100	51,22	12,69	649,982
K 4+080	51,22	12,67	648,957
K 4+060	51,22	12,65	647,933
K 4+040	51,22	12,63	646,909
K 4+020	51,22	12,61	645,884
K 4+000	51,22	12,59	644,860
K 3+980	51,22	12,57	643,835
K 3+960	51,22	12,55	642,811
K 3+940	51,22	12,53	641,787
K 3+920	51,22	12,51	640,762
K 3+900	51,22	12,49	639,738
K 3+880	51,22	12,47	638,713
K 3+860	51,22	12,45	637,689
K 3+840	51,22	12,43	636,665
K 3+820	51,22	12,41	635,640
K 3+800	51,22	12,39	634,616
K 3+780	51,22	12,37	633,591
K 3+760	51,22	12,35	632,567
K 3+740	51,22	12,33	631,543
K 3+720	51,22	12,31	630,518
K 3+700	51,22	12,29	629,494
K 3+680	51,22	12,27	628,469
K 3+660	51,22	12,25	627,445
K 3+640	51,22	12,23	626,421
K 3+620	51,22	12,21	625,396
K 3+600	51,22	12,19	624,372
K 3+580	51,22	12,17	623,347
K 3+560	51,22	12,15	622,323
K 3+540	51,22	12,13	621,299
K 3+520	51,22	12,11	620,274
K 3+500	51,22	12,09	619,250
K 3+480	51,22	12,07	618,225
K 3+460	51,22	12,05	617,201
K 3+440	51,22	12,03	616,177
K 3+420	51,22	12,01	615,152
K 3+400	51,22	11,99	614,128
K 3+380			
	TOTAL		99743,27

7426,90

Nota: Se reporta el transporte hasta la abscisa K3+400 por ajuste al hito del 55% de la parcial 3

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12489

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**
CAPITULO:	**PAVIMENTO FLEXIBLE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.7	**TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS**	**M3/KM**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA		TOTAL
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	K15+460	K 10+460	5.000,00		79.871,25
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS					
PASAN:				**SUBTOTAL**	79.871,25
				TOTAL	79.871,25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12490

DISTANCIA DESDE LA CANTERA AL PUNTO INICIAL			K 15+490	31,10 KM	
DISTANCIA DEL K15+490 AL PUNTO DE DESCARGUE	DESDE	HASTA	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K +30	K 15+460	K 15+440	9,50	31,14	295,83
K +50	K 15+440	K 15+420	9,50	31,16	296,02
K +70	K 15+420	K 15+400	9,50	31,18	296,21
K +90	K 15+400	K 15+380	9,50	31,20	296,40
K +110	K 15+380	K 15+360	9,50	31,22	296,59
K +130	K 15+360	K 15+340	9,50	31,24	296,78
K +150	K 15+340	K 15+320	9,50	31,26	296,97
K +170	K 15+320	K 15+300	9,50	31,28	297,16
K +190	K 15+300	K 15+280	9,50	31,30	297,35
K +210	K 15+280	K 15+260	9,50	31,32	297,54
K +230	K 15+260	K 15+240	9,50	31,34	297,73
K +250	K 15+240	K 15+220	9,50	31,36	297,92
K +270	K 15+220	K 15+200	9,50	31,38	298,11
K +290	K 15+200	K 15+180	9,50	31,40	298,30
K +310	K 15+180	K 15+160	9,50	31,42	298,49
K +330	K 15+160	K 15+140	9,50	31,44	298,68
K +350	K 15+140	K 15+120	9,50	31,46	298,87
K +370	K 15+120	K 15+100	9,50	31,48	299,06
K +390	K 15+100	K 15+080	9,50	31,50	299,25
K +410	K 15+080	K 15+060	9,50	31,52	299,44
K +430	K 15+060	K 15+040	9,50	31,54	299,63
K +450	K 15+040	K 15+020	9,50	31,56	299,82
K +470	K 15+020	K 15+000	9,50	31,58	300,01
K +490	K 15+000	K 14+980	9,50	31,60	300,20
K +510	K 14+980	K 14+960	9,50	31,62	300,39
K +530	K 14+960	K 14+940	9,50	31,64	300,58
K +550	K 14+940	K 14+920	9,50	31,66	300,77
K +570	K 14+920	K 14+900	9,50	31,68	300,96
K +590	K 14+900	K 14+880	9,50	31,70	301,15
K +610	K 14+880	K 14+860	9,50	31,72	301,34
K +630	K 14+860	K 14+840	9,50	31,74	301,53
K +650	K 14+840	K 14+820	9,50	31,76	301,72
K +670	K 14+820	K 14+800	9,50	31,78	301,91
K +690	K 14+800	K 14+780	9,50	31,80	302,10
K +710	K 14+780	K 14+760	9,50	31,82	302,29
K +730	K 14+760	K 14+740	9,50	31,84	302,48
K +750	K 14+740	K 14+720	9,50	31,86	302,67
K +770	K 14+720	K 14+700	9,50	31,88	302,86
K +790	K 14+700	K 14+680	9,50	31,90	303,05
K +810	K 14+680	K 14+660	9,50	31,92	303,24
K +830	K 14+660	K 14+640	9,50	31,94	303,43
K +850	K 14+640	K 14+620	9,50	31,96	303,62
K +870	K 14+620	K 14+600	9,50	31,98	303,81
K +890	K 14+600	K 14+580	9,50	32,00	304,00
K +910	K 14+580	K 14+560	9,50	32,02	304,19
K +930	K 14+560	K 14+540	9,50	32,04	304,38
K +950	K 14+540	K 14+520	9,50	32,06	304,57
K +970	K 14+520	K 14+500	9,50	32,08	304,76
K +990	K 14+500	K 14+480	9,50	32,10	304,95
K 1+010	K 14+480	K 14+460	9,50	32,12	305,14
K 1+030	K 14+460	K 14+440	9,50	32,14	305,33
K 1+050	K 14+440	K 14+420	9,50	32,16	305,52
K 1+070	K 14+420	K 14+400	9,50	32,18	305,71
K 1+090	K 14+400	K 14+380	9,50	32,20	305,90
K 1+110	K 14+380	K 14+360	9,50	32,22	306,09
K 1+130	K 14+360	K 14+340	9,50	32,24	306,28
K 1+150	K 14+340	K 14+320	9,50	32,26	306,47
K 1+170	K 14+320	K 14+300	9,50	32,28	306,66
K 1+190	K 14+300	K 14+280	9,50	32,30	306,85
K 1+210	K 14+280	K 14+260	9,50	32,32	307,04
K 1+230	K 14+260	K 14+240	9,50	32,34	307,23
K 1+250	K 14+240	K 14+220	9,50	32,36	307,42

DISTANCIA DESDE LA CANTERA AL PUNTO INICIAL			K 15+490	31,10 KM	
DISTANCIA DEL K15+490 AL PUNTO DE DESCARGUE	DESDE	HASTA	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 1+270	K 14+220	K 14+200	9,50	32,38	307,61
K 1+290	K 14+200	K 14+180	9,50	32,40	307,80
K 1+310	K 14+180	K 14+160	9,50	32,42	307,99
K 1+330	K 14+160	K 14+140	9,50	32,44	308,18
K 1+350	K 14+140	K 14+120	9,50	32,46	308,37
K 1+370	K 14+120	K 14+100	9,50	32,48	308,56
K 1+390	K 14+100	K 14+080	9,50	32,50	308,75
K 1+410	K 14+080	K 14+060	9,50	32,52	308,94
K 1+430	K 14+060	K 14+040	9,50	32,54	309,13
K 1+450	K 14+040	K 14+020	9,50	32,56	309,32
K 1+470	K 14+020	K 14+000	9,50	32,58	309,51
K 1+490	K 14+000	K 13+980	9,50	32,60	309,70
K 1+510	K 13+980	K 13+960	9,50	32,62	309,89
K 1+530	K 13+960	K 13+940	9,50	32,64	310,08
K 1+550	K 13+940	K 13+920	9,50	32,66	310,27
K 1+570	K 13+920	K 13+900	9,50	32,68	310,46
K 1+590	K 13+900	K 13+880	9,50	32,70	310,65
K 1+610	K 13+880	K 13+860	9,50	32,72	310,84
K 1+630	K 13+860	K 13+840	9,50	32,74	311,03
K 1+650	K 13+840	K 13+820	9,50	32,76	311,22
K 1+670	K 13+820	K 13+800	9,50	32,78	311,41
K 1+690	K 13+800	K 13+780	9,50	32,80	311,60
K 1+710	K 13+780	K 13+760	9,50	32,82	311,79
K 1+730	K 13+760	K 13+740	9,50	32,84	311,98
K 1+750	K 13+740	K 13+720	9,50	32,86	312,17
K 1+770	K 13+720	K 13+700	9,50	32,88	312,36
K 1+790	K 13+700	K 13+680	9,50	32,90	312,55
K 1+810	K 13+680	K 13+660	9,50	32,92	312,74
K 1+830	K 13+660	K 13+640	9,50	32,94	312,93
K 1+850	K 13+640	K 13+620	9,50	32,96	313,12
K 1+870	K 13+620	K 13+600	9,50	32,98	313,31
K 1+890	K 13+600	K 13+580	9,50	33,00	313,50
K 1+910	K 13+580	K 13+560	9,50	33,02	313,69
K 1+930	K 13+560	K 13+540	9,50	33,04	313,88
K 1+950	K 13+540	K 13+520	9,50	33,06	314,07
K 1+970	K 13+520	K 13+500	9,50	33,08	314,26
K 1+990	K 13+500	K 13+480	9,50	33,10	314,45
K 2+010	K 13+480	K 13+460	9,50	33,12	314,64
K 2+030	K 13+460	K 13+440	9,50	33,14	314,83
K 2+050	K 13+440	K 13+420	9,50	33,16	315,02
K 2+070	K 13+420	K 13+400	9,50	33,18	315,21
K 2+090	K 13+400	K 13+380	9,50	33,20	315,40
K 2+110	K 13+380	K 13+360	9,50	33,22	315,59
K 2+130	K 13+360	K 13+340	9,50	33,24	315,78
K 2+150	K 13+340	K 13+320	9,50	33,26	315,97
K 2+170	K 13+320	K 13+300	9,50	33,28	316,16
K 2+190	K 13+300	K 13+280	9,50	33,30	316,35
K 2+210	K 13+280	K 13+260	9,50	33,32	316,54
K 2+230	K 13+260	K 13+240	9,50	33,34	316,73
K 2+250	K 13+240	K 13+220	9,50	33,36	316,92
K 2+270	K 13+220	K 13+200	9,50	33,38	317,11
K 2+290	K 13+200	K 13+180	9,50	33,40	317,30
K 2+310	K 13+180	K 13+160	9,50	33,42	317,49
K 2+330	K 13+160	K 13+140	9,50	33,44	317,68
K 2+350	K 13+140	K 13+120	9,50	33,46	317,87
K 2+370	K 13+120	K 13+100	9,50	33,48	318,06
K 2+390	K 13+100	K 13+080	9,50	33,50	318,25
K 2+410	K 13+080	K 13+060	9,50	33,52	318,44
K 2+430	K 13+060	K 13+040	9,50	33,54	318,63
K 2+450	K 13+040	K 13+020	9,50	33,56	318,82
K 2+470	K 13+020	K 13+000	9,50	33,58	319,01
K 2+490	K 13+000	K 12+980	9,50	33,60	319,20
K 2+510	K 12+980	K 12+960	9,50	33,62	319,39
K 2+530	K 12+960	K 12+940	9,50	33,64	319,58
K 2+550	K 12+940	K 12+920	9,50	33,66	319,77

DISTANCIA DESDE LA CANTERA AL PUNTO INICIAL			K 15+490	31,10 KM	
DISTANCIA DEL K15+490 AL PUNTO DE DESCARGUE	DESDE	HASTA	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 2+570	K 12+920	K 12+900	9,50	33,68	319,96
K 2+590	K 12+900	K 12+880	9,50	33,70	320,15
K 2+610	K 12+880	K 12+860	9,50	33,72	320,34
K 2+630	K 12+860	K 12+840	9,50	33,74	320,53
K 2+650	K 12+840	K 12+820	9,50	33,76	320,72
K 2+670	K 12+820	K 12+800	9,50	33,78	320,91
K 2+690	K 12+800	K 12+780	9,50	33,80	321,10
K 2+710	K 12+780	K 12+760	9,50	33,82	321,29
K 2+730	K 12+760	K 12+740	9,50	33,84	321,48
K 2+750	K 12+740	K 12+720	9,50	33,86	321,67
K 2+770	K 12+720	K 12+700	9,50	33,88	321,86
K 2+790	K 12+700	K 12+680	9,50	33,90	322,05
K 2+810	K 12+680	K 12+660	9,50	33,92	322,24
K 2+830	K 12+660	K 12+640	9,50	33,94	322,43
K 2+850	K 12+640	K 12+620	9,50	33,96	322,62
K 2+870	K 12+620	K 12+600	9,50	33,98	322,81
K 2+890	K 12+600	K 12+580	9,50	34,00	323,00
K 2+910	K 12+580	K 12+560	9,50	34,02	323,19
K 2+930	K 12+560	K 12+540	9,50	34,04	323,38
K 2+950	K 12+540	K 12+520	9,50	34,06	323,57
K 2+970	K 12+520	K 12+500	9,50	34,08	323,76
K 2+990	K 12+500	K 12+480	9,50	34,10	323,95
K 3+010	K 12+480	K 12+460	9,50	34,12	324,14
K 3+030	K 12+460	K 12+440	9,50	34,14	324,33
K 3+050	K 12+440	K 12+420	9,50	34,16	324,52
K 3+070	K 12+420	K 12+400	9,50	34,18	324,71
K 3+090	K 12+400	K 12+380	9,50	34,20	324,90
K 3+110	K 12+380	K 12+360	9,50	34,22	325,09
K 3+130	K 12+360	K 12+340	9,50	34,24	325,28
K 3+150	K 12+340	K 12+320	9,50	34,26	325,47
K 3+170	K 12+320	K 12+300	9,50	34,28	325,66
K 3+190	K 12+300	K 12+280	9,50	34,30	325,85
K 3+210	K 12+280	K 12+260	9,50	34,32	326,04
K 3+230	K 12+260	K 12+240	9,50	34,34	326,23
K 3+250	K 12+240	K 12+220	9,50	34,36	326,42
K 3+270	K 12+220	K 12+200	9,50	34,38	326,61
K 3+290	K 12+200	K 12+180	9,50	34,40	326,80
K 3+310	K 12+180	K 12+160	9,50	34,42	326,99
K 3+330	K 12+160	K 12+140	9,50	34,44	327,18
K 3+350	K 12+140	K 12+120	9,50	34,46	327,37
K 3+370	K 12+120	K 12+100	9,50	34,48	327,56
K 3+390	K 12+100	K 12+080	9,50	34,50	327,75
K 3+410	K 12+080	K 12+060	9,50	34,52	327,94
K 3+430	K 12+060	K 12+040	9,50	34,54	328,13
K 3+450	K 12+040	K 12+020	9,50	34,56	328,32
K 3+470	K 12+020	K 12+000	9,50	34,58	328,51
K 3+490	K 12+000	K 11+980	9,50	34,60	328,70
K 3+510	K 11+980	K 11+960	9,50	34,62	328,89
K 3+530	K 11+960	K 11+940	9,50	34,64	329,08
K 3+550	K 11+940	K 11+920	9,50	34,66	329,27
K 3+570	K 11+920	K 11+900	9,50	34,68	329,46
K 3+590	K 11+900	K 11+880	9,50	34,70	329,65
K 3+610	K 11+880	K 11+860	9,50	34,72	329,84
K 3+630	K 11+860	K 11+840	9,50	34,74	330,03
K 3+650	K 11+840	K 11+820	9,50	34,76	330,22
K 3+670	K 11+820	K 11+800	9,50	34,78	330,41
K 3+690	K 11+800	K 11+780	9,50	34,80	330,60
K 3+710	K 11+780	K 11+760	9,50	34,82	330,79
K 3+730	K 11+760	K 11+740	9,50	34,84	330,98
K 3+750	K 11+740	K 11+720	9,50	34,86	331,17
K 3+770	K 11+720	K 11+700	9,50	34,88	331,36
K 3+790	K 11+700	K 11+680	9,50	34,90	331,55
K 3+810	K 11+680	K 11+660	9,50	34,92	331,74
K 3+830	K 11+660	K 11+640	9,50	34,94	331,93
K 3+850	K 11+640	K 11+620	9,50	34,96	332,12

DISTANCIA DESDE LA CANTERA AL PUNTO INICIAL			K 15+490	31,10 KM	
DISTANCIA DEL K15+490 AL PUNTO DE DESCARGUE	DESDE	HASTA	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 3+870	K 11+620	K 11+600	9,50	34,98	332,31
K 3+890	K 11+600	K 11+580	9,50	35,00	332,50
K 3+910	K 11+580	K 11+560	9,50	35,02	332,69
K 3+930	K 11+560	K 11+540	9,50	35,04	332,88
K 3+950	K 11+540	K 11+520	9,50	35,06	333,07
K 3+970	K 11+520	K 11+500	9,50	35,08	333,26
K 3+990	K 11+500	K 11+480	9,50	35,10	333,45
K 4+010	K 11+480	K 11+460	9,50	35,12	333,64
K 4+030	K 11+460	K 11+440	9,50	35,14	333,83
K 4+050	K 11+440	K 11+420	9,50	35,16	334,02
K 4+070	K 11+420	K 11+400	9,50	35,18	334,21
K 4+090	K 11+400	K 11+380	9,50	35,20	334,40
K 4+110	K 11+380	K 11+360	9,50	35,22	334,59
K 4+130	K 11+360	K 11+340	9,50	35,24	334,78
K 4+150	K 11+340	K 11+320	9,50	35,26	334,97
K 4+170	K 11+320	K 11+300	9,50	35,28	335,16
K 4+190	K 11+300	K 11+280	9,50	35,30	335,35
K 4+210	K 11+280	K 11+260	9,50	35,32	335,54
K 4+230	K 11+260	K 11+240	9,50	35,34	335,73
K 4+250	K 11+240	K 11+220	9,50	35,36	335,92
K 4+270	K 11+220	K 11+200	9,50	35,38	336,11
K 4+290	K 11+200	K 11+180	9,50	35,40	336,30
K 4+310	K 11+180	K 11+160	9,50	35,42	336,49
K 4+330	K 11+160	K 11+140	9,50	35,44	336,68
K 4+350	K 11+140	K 11+120	9,50	35,46	336,87
K 4+370	K 11+120	K 11+100	9,50	35,48	337,06
K 4+390	K 11+100	K 11+080	9,50	35,50	337,25
K 4+410	K 11+080	K 11+060	9,50	35,52	337,44
K 4+430	K 11+060	K 11+040	9,50	35,54	337,63
K 4+450	K 11+040	K 11+020	9,50	35,56	337,82
K 4+470	K 11+020	K 11+000	9,50	35,58	338,01
K 4+490	K 11+000	K 10+980	9,50	35,60	338,20
K 4+510	K 10+980	K 10+960	9,50	35,62	338,39
K 4+530	K 10+960	K 10+940	9,50	35,64	338,58
K 4+550	K 10+940	K 10+920	9,50	35,66	338,77
K 4+570	K 10+920	K 10+900	9,50	35,68	338,96
K 4+590	K 10+900	K 10+880	9,50	35,70	339,15
K 4+610	K 10+880	K 10+860	9,50	35,72	339,34
K 4+630	K 10+860	K 10+840	9,50	35,74	339,53
K 4+650	K 10+840	K 10+820	9,50	35,76	339,72
K 4+670	K 10+820	K 10+800	9,50	35,78	339,91
K 4+690	K 10+800	K 10+780	9,50	35,80	340,10
K 4+710	K 10+780	K 10+760	9,50	35,82	340,29
K 4+730	K 10+760	K 10+740	9,50	35,84	340,48
K 4+750	K 10+740	K 10+720	9,50	35,86	340,67
K 4+770	K 10+720	K 10+700	9,50	35,88	340,86
K 4+790	K 10+700	K 10+680	9,50	35,90	341,05
K 4+810	K 10+680	K 10+660	9,50	35,92	341,24
K 4+830	K 10+660	K 10+640	9,50	35,94	341,43
K 4+850	K 10+640	K 10+620	9,50	35,96	341,62
K 4+870	K 10+620	K 10+600	9,50	35,98	341,81
K 4+890	K 10+600	K 10+580	9,50	36,00	342,00
K 4+910	K 10+580	K 10+560	9,50	36,02	342,19
K 4+930	K 10+560	K 10+540	9,50	36,04	342,38
K 4+950	K 10+540	K 10+520	9,50	36,06	342,57

DISTANCIA DESDE LA CANTERA AL PUNTO INICIAL			K 15+490	31,10 KM	
DISTANCIA DEL K15+490 AL PUNTO DE DESCARGUE	DESDE	HASTA	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 4+970	K 10+520	K 10+500	9,50	36,08	342,76
K 4+990	K 10+500	K 10+480	9,50	36,10	342,95
K 5+010	K 10+480	K 10+460	9,50	36,12	343,14
K 5+030	K 10+460	K 10+440			
			TOTAL		79871,25

Σ2.375

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12495

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.1	**DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ALTO	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K 9+035	1,30	1,10	9,87	1,00	14,11
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K8+400	1,30	1,74	10,00	1,00	22,62
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K 6+853	1,30	1,10	10,00	1,00	14,30
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K6+020	1,30	1,70	10,00	1,00	22,10
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K 5+870	1,30	1,85	10,50	1,00	25,25
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K5+470	1,30	1,00	9,50	1,00	12,35
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K4+196	1,30	2,33	9,10	1,00	27,56
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K4+138	1,30	1,70	10,99	1,00	24,29
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K 2+332	1,30	2,78	9,30	1,00	33,61
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K1+492	1,30	1,00	7,50	1,00	9,75
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO K 0+704	1,30	1,10	8,00	1,00	11,44
PASAN:				**SUBTOTAL**	217,38
				TOTAL	217,38

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: ~~52202-81335~~

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12496

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

ABSCISA	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
K 09+035	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	1,1	9,87	1	14,11
K 08+400	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	1,74	10	1	22,62
K 6+853	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	1,1	10	1	14,30
K 6+020	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	1,7	10	1	22,10
K 5+870	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	1,85	10,5	1	25,25
K 5+470	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	1	9,5	1	12,35
K 4+196	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	2,33	9,1	1	27,56
K 4+138	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	1,7	10,99	1	24,29
K 2+332	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	2,78	9,3	1	33,61
K 1+492	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	1	7,5	1	9,75
K +704	**DEMOLICION ALCANTARILLA**				
	1,30	1,1	8	1	11,44
	TOTAL				217,38

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12497

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	**EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		TOTAL
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K10+035	5,00	2,00	1,50		15,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K9+035	5,00	2,00	1,50		15,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K8+400	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K7+870	5,00	2,00	1,50		15,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K7+605	5,00	2,00	1,50		15,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K6+853	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K6+020	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K5+870	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K5+470	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K4+680	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K4+196	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K4+138	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K3+476	10,00	2,00	1,50		30,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	330,00
				TOTAL	330,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12498

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		
CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		TOTAL
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K2+332	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K1+492	10,00	2,00	1,50		30,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K0+704	10,00	1,8485	1,50		27,73
PASAN: 330,00				SUBTOTAL	87,73
				TOTAL	417,73

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1249

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE

ABSCISA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
K 10+035	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	5,00	2,0	1,50	15,00
K 09+035	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	5,00	2,0	1,50	15,00
K 8+400	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 7+870	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	5,00	2,0	1,50	15,00
K 7+605	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	5,00	2,0	1,50	15,00
K 06+853	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 06+020	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 5+870	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 5+470	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 4+680	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 04+196	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 4+138	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 3+150	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 2+332	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K 1+492	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,50	30,00
K +704	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	1,8485	1,50	27,73
	TOTAL			417,73

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12500

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 03

CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.3	EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		TOTAL
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K7+870	10,00	2,00	1,375		27,50
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K7+605	10,00	2,00	1,375		27,50
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K6+853	10,00	2,00	1,325		26,50
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K6+020	10,00	2,00	1,300		26,00
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K5+870	10,00	2,00	1,300		26,00
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K5+470	10,00	2,00	1,300		26,00
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K4+680	10,00	2,00	1,300		26,00
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K4+196	10,00	2,00	1,300		26,00
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K4+138	10,00	2,00	1,300		26,00
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K3+476	10,00	2,00	1,345		26,90
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K2+332	10,00	2,00	1,500		30,00
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K1+492	10,00	2,00	1,300		26,00
EXCAVACION MECANICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO - ALCANTARILLA K0+704	10,00	2,00	1,300		26,00
PASAN:				SUBTOTAL	346,40
				TOTAL	346,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12501

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	EXCAVACIÓN MECÁNICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)

ABSCISA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
K 7+870	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,375	27,50
K 7+605	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,375	27,50
K 06+853	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,325	26,50
K 06+020	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,300	26,00
K 5+870	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,300	26,00
K 5+470	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,300	26,00
K 4+680	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,300	26,00
K 04+196	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,300	26,00
K 4+138	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,300	26,00
K 3+476	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,000	1,345	26,90
K 2+332	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,500	30,00
K 1+492	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0	1,300	26,00
K +704	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO			
	10,00	2,0000	1,300	26,00
	TOTAL			346,40

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

125C2

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3	
CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H 0-2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		TOTAL
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 15+212	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 14+984	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 14+365	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 13+005	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 12+350	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 11+500	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 10+424	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 10+035	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 9+035	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 8+675	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 8+400	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 7+870	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 7+605	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 6+853	11,00	2,50	0,22		6,05
PASAN:				SUBTOTAL	84,70
				TOTAL	84,70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12563

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		
CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.4	**EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H 0-2.00 M INCLUYE CARGUE**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		TOTAL
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 6+020	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 5+870	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 5+470	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 4+680	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 4+196	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 4+138	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 3+476	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 2+332	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 1+492	11,00	2,50	0,22		6,05
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO K 0+704	11,00	2,50	0,22		6,05
PASAN: 84,70				**SUBTOTAL**	60,50
				TOTAL	145,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12504

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO

ABSCISA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
K 15+212	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 14+984	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 14+365	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 13+005	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 12+350	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 11+500	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 10+424	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 10+035	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 09+035	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 8+675	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 8+400	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 7+870	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 7+605	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 06+853	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 06+020	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 5+870	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 5+470	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 4+680	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 04+196	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 4+138	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 3+150	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 2+332	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K 1+492	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
K +704	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO			
	11,00	2,5	0,22	6,05
	TOTAL			145,20

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12505

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Nombre: JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ENGATIVA

Cédula: **4.179.150**

Licencia Profesional No: **01-17103**



Resolución: **02-7104 - 30/03/2017**

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA

Presidente

12506

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 475440/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ENGATIVA** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 4179150** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-17103** con fecha de expedición del **30 de Marzo de 2017.**

Que el(la) Señor(a) **JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ENGATIVA**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-17103** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **12 días del mes de Agosto de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

12587

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Nombre FREDY GONZALO ACOSTA FERRO

Cédula 1.121.818.555

Licencia Profesional No 01-20180

De fecha 08/05/2020

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA

SENA



R 02-1018

Presidente

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía
Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694
http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email: Info@cpnt.gov.co

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 447164/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **FREDY GONZALO ACOSTA FERRO** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1121818555** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-20180** con fecha de expedición del **8 de Mayo de 2020.**

Que el(la) Señor(a) **FREDY GONZALO ACOSTA FERRO**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-20180** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **20 días del mes de Agosto de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

Fredy Acosta.

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

12509

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5


MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		
CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
3.5	**TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**		**M3/KM**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA	VOLUMEN	TOTAL
TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO					7.177,30
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO					
TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE EXCAVACIÓN MECÁNICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO					3.764,00
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN MECÁNICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO					
TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO					1.485,20
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO					
PASAN:				**SUBTOTAL**	12.426,50
				TOTAL	12.426,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12510

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META", con código BPIN 2021005500214.

Que el sitio designado para la disposición final de los residuos provenientes de las actividades de excavación cuenta con la debida autorización del Secretario de Protección Ecológica y Ambiental del municipio de Castilla La Nueva. Esta autorización se otorgó a través del Oficio P.C.V.A Número 12, emitido el 5 de octubre de 2023. En dicho documento se enumeran los terrenos aptos para la disposición de material de relleno no contaminado, entre los cuales se encuentra el predio Finca El Triunfo, este predio se sitúa a 0.850 kilómetros de distancia, accediendo desde el costado izquierdo por la abscisa K14+260. Y la Finca Las Vegas ubicado en el K0+960. El cálculo de esta distancia se realiza tomando en consideración el punto medio hasta la entrada y la distancia desde esta última hasta el predio, estos ubicados en la Vereda El Turuy.

Como soporte de la presente certificación se adjunta en cuatro (4) folios:

- Plano de distancia los predios.
- P.C.V.A Oficio 12 Respuesta de la solicitud autorización para disponer material de relleno.

Dada en Villavicencio, a los 30 (treinta) días del mes de agosto de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

CONSORCIO INTER AIM



Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

12512

Castilla La Nueva-Meta, 05 de octubre de 2023 **P.C.V.A Oficio 12**

SEÑOR:
José Alexis Parra M.
Consorcio Halcón
Castilla La Nueva- Meta

Asunto: Respuesta de la solicitud de autorización para disponer material de relleno.

Reciba un cordial saludo de parte de la administración municipal y de la Secretaría de Protección Ecológica, en atención a su solicitud de radicación Id-control 59077 de fecha 19 de septiembre de 2023, se realizó visitas por parte de un profesional de la Secretaría al lugar objeto del requerimiento ubicados en la vereda del Turuy del Municipio de Castilla la Nueva.

De acuerdo al contratista el área a utilizar con material de relleno se localiza entre las siguientes coordenadas.

1. N 3° 48' 03.2" W 73° 40' 14.3"	2. N 3° 47' 43.21" W 73° 39' 26.98"
3. N 3° 47' 16.19" W 73° 38' 36.25"	4. N 3° 47' 17.79" W 73° 38' 37.01"
5. N 3° 47' 16.19" W 73° 38' 36.25	6. N 3° 47' 21.0" W 73° 34' 44.08"
7. N 3° 46' 40.51" W 73° 35' 22.86"	8. N 3° 47' 21.0" W 73° 34' 44.08"
9. N 3° 47' 23.05" W 73° 34' 33.07"	10. N 3° 47' 20.04" W 73° 34' 32.05"

Powered by CamScanner

12513

De acuerdo a la solicitud y la información suministrada, me permito informar los usos de suelo de los siguientes predios conforme el vigente Esquema Ordenamiento Territorial tienen aprobación según- EOT (Acuerdo No. 005 / 2016):

Clase de los suelos: RURALES
Usos de suelos: PECUARIOS

1. Predio Finca el triunfo - Abel Rubiano Montenegro **APROBADO**

2. Predio Finca Valparaíso – Eloísa Muñoz **APROBADO**

3. Predio Finca casa lote – Lisenia Amaya **APROBADO**

4. Predio Finca casa Lote 2- Alberto Gómez **APROBADO**

5. Predio Finca el Delirio – Ismael Bernal **APROBADO**

Relleno solo para el camellón desde el inicio de la vía principal 9 metros

6. Predio Santa lucia – Leonor Castillo **APROBADO**

Relleno solo para el piso de la vivienda

7. Predio Finca casa lote 3 -Olga Gutiérrez **APROBADO**

8. Predio Finca San Juan- Arnulfo Traslaviña **APROBADO**

Relleno solo para dos estanques de pescado alevinos

9. Predio Finca la Victoria – Gonzalo Gómez **APROBADO**

Relleno para camellón en un potrero

10. Finca las vegas – Ariel Baquero **APROBADO**

Relleno para camellón desde la vía hasta la entrada de la vivienda, corral ganadero.

11. Predio Finca Paraíso – Dawer Medina **APROBADO**

Relleno para camellón desde la vía hasta la entrada de la vivienda

12. Predio San Rafael - Pablo Melo **APROBADO**

13. Predio Finca Naranjito – Jairo Rivera **APROBADO**

Powered by CamScanner

12514

Relleno para un costado del corral ganadero

14. Predio Finca Santa Rosa – Wilson Ramírez **APROBADO**

Relleno para camellón y nivelación para una alcantarilla

En atención a su solicitud y la información encontrada en campo, me permito informar cuales son los predios **APTOS** para disposición de material vegetal no contaminado, los cuales deben estar lejos de Bosque, nacederos, caños o ríos rigiéndose estrictamente en las coordenadas tomadas en campo.

Cordialmente,

RAMIRO MARTINEZ ORTIZ
Secretario de Protección Ecológica y Ambiental

Juliana Vargas Molina– Ing. Ambiental – Secretaría de Protección Ecológica y Ambiental.	**Firma:** Juliana Vargas

Powered by CamScanner

12515

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO

DISTANCIA DEL PREDIO LAS VEGAS AL	K +960	0,00 KM	
DISTANCIA DEL PREDIO EL TRIUNFO AL	K 14+260	0,85 KM	
ALCANTARILLA	**VOLUMEN M3**	**DISTANCIA KM**	**ACARREO**
PREDIO LAS VEGAS			
K 15+212	30,00	14,25	427,50
K 14+984	30,00	14,02	420,60
K 14+365	30,00	13,41	402,30
K 13+005	30,00	12,05	361,50
K 12+350	30,00	11,39	341,70
K 11+500	30,00	10,54	316,20
PREDIO EL TRIUNFO			
K 10+424	30,00	4,69	140,70
K 10+035	30,00	5,08	152,40
K 9+035	30,00	6,08	182,40
K 8+675	30,00	6,44	193,20
K 8+400	30,00	6,71	201,30
K 7+870	30,00	7,24	217,20
K 7+605	30,00	7,51	225,30
K 6+853	30,00	8,26	247,80
K 6+020	30,00	9,09	272,70
K 5+870	30,00	9,24	277,20
K 5+470	30,00	9,64	289,20
K 4+680	30,00	10,43	312,90
K 4+196	30,00	10,91	327,30
K 4+138	30,00	10,97	329,10
K 3+150	30,00	11,96	358,80
K 2+332	30,00	12,78	383,40
K 1+492	30,00	13,62	408,60
K +704	26,926	14,41	388,00
	TOTAL		7177,30

Σ 716,93

Nota: No se cobra el volumen total de la excavación mecánica en conglomerado, ya que el ítem correspondiente al transporte del mismo queda sin cantidades disponibles para cobrar.

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12516

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECÁNICA HUMEDAD EN CONGLOMERADO

DISTANCIA DEL PREDIO EL TRIUNFO AL		K 14+260	0,85 KM	
ABSCISA DESCARGUE	ALCANTARILLA	VOLUMEN M3	DISTANCIA KM	ACARREO
PREDIO EL TRIUNFO				
K 14260 + 0,85	K 8+400	30,00	6,71	201,30
K 14260 + 0,85	K 7+870	27,50	7,24	199,10
K 14260 + 0,85	K 7+605	27,50	7,51	206,53
K 14260 + 0,85	K 6+853	26,50	8,26	218,89
K 14260 + 0,85	K 6+020	26,00	9,09	236,34
K 14260 + 0,85	K 5+870	26,00	9,24	240,24
K 14260 + 0,85	K 5+470	26,00	9,64	250,64
K 14260 + 0,85	K 4+680	26,00	10,43	271,18
K 14260 + 0,85	K 4+196	26,00	10,91	283,66
K 14260 + 0,85	K 4+138	26,00	10,97	285,22
K 14260 + 0,85	K 3+476	26,90	11,63	312,85
K 14260 + 0,85	K 2+332	30,00	12,78	383,40
K 14260 + 0,85	K 1+492	26,00	13,62	354,12
K 14260 + 0,85	K +704	22,2435	14,41	320,53
		TOTAL		3.764,00

5,11

$373,64

Nota: No se cobra el volumen total de la excavación mecánica humedad en conglomerado, ya que el ítem correspondiente al transporte del mismo queda sin cantidades disponibles para cobrar.

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

12517

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO

DISTANCIA DEL PREDIO LAS VEGAS AL		K +960	0,00 KM	
DISTANCIA DEL PREDIO EL TRIUNFO AL		K 14+260	0,85 KM	
DISTANCIA DE LA ALCANTARILLA AL PREDIO	ALCANTARILLA	VOLUMEN M3	DISTANCIA KM	ACARREO
PREDIO LAS VEGAS				
K 14+252	K 15+212	6,05	14,25	86,21
K 14+024	K 14+984	6,05	14,02	84,82
K 13+405	K 14+365	6,05	13,41	81,13
K 12+045	K 13+005	6,05	12,05	72,90
K 11+390	K 12+350	6,05	11,39	68,91
K 10+540	K 11+500	6,05	10,54	63,77
K 9+464	K 10+424	6,05	9,46	57,23
PREDIO EL TRIUNFO				
K 9+075	K 10+035	6,05	5,08	30,73
K 8+075	K 9+035	6,05	6,08	36,78
K 7+715	K 8+675	6,05	6,44	38,96
K 5+861	K 8+400	6,05	6,71	40,60
K 6+391	K 7+870	6,05	7,24	43,80
K 6+656	K 7+605	6,05	7,51	45,44
K 7+408	K 6+853	6,05	8,26	49,97
K 8+241	K 6+020	6,05	9,09	54,99
K 8+391	K 5+870	6,05	9,24	55,90
K 8+791	K 5+470	6,05	9,64	58,32
K 9+581	K 4+680	6,05	10,43	63,10
K 10+065	K 4+196	6,05	10,91	66,01
K 10+123	K 4+138	6,05	10,97	66,37
K 11+111	K 3+150	6,05	11,96	72,36
K 11+929	K 2+332	6,05	12,78	77,32
K 12+769	K 1+492	6,05	13,62	82,40
K 13+557	K +704	6,05	14,41	87,18
		TOTAL		1485,20

E 145,20

FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-17103
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta.

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

11518

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
3.6	**SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)**		**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LONGITUD	BASE MENOR	ESPESOR	BASE MAYOR	CANTIDAD	TOTAL
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K8+400						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K7+870						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K7+605						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K6+853						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
PASAN:				SUBTOTAL		10,089
				TOTAL		10,09

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12519

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**
CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
3.6	**SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)**		**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LONGITUD	BASE MENOR	ESPESOR	BASE MAYOR	CANTIDAD	TOTAL
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K6+020						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K4+680						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K4+196						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
PASAN: 10,09				SUBTOTAL		7,567
				TOTAL		17,66

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12520


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**
CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
3.6	**SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)**		**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	LONGITUD	BASE MENOR	ESPESOR	BASE MAYOR	CANTIDAD	TOTAL
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K4+138						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K3+476						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K2+332						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K1+492						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,710
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI) - ALCANTARILLA K0+704						
Cuerpo	8,00	1,51	0,15		1,00	1,812
Solera	1,05	1,51	0,15	3,00	2,00	0,355
PASAN: 17,66				**SUBTOTAL**		12,26
				TOTAL		29,91

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12521


CONSORCIO HALCÓN

ANEXO

ESQUEMA SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)

12522

SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)
PARCIAL #3

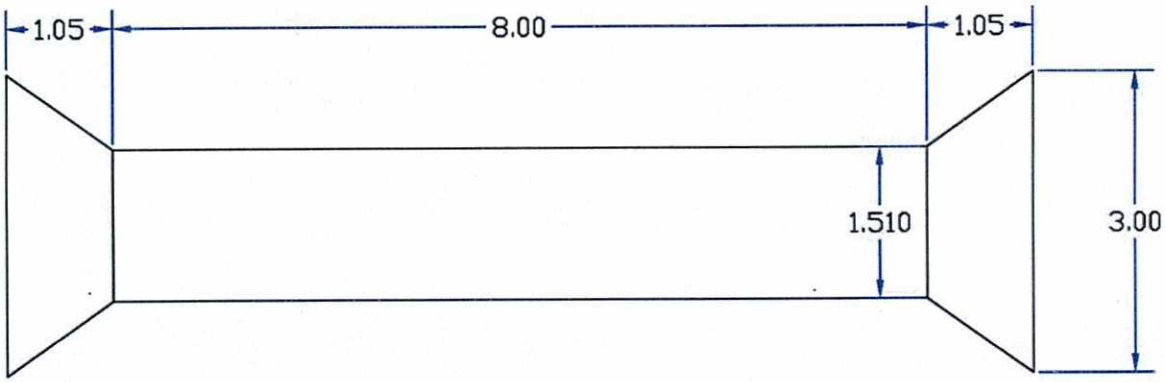


CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		

CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ALCANTARILLA K 8+400					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN:				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	13,56

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12524

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ALCANTARILLA K 7+870					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: **13,56**				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	27,12

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12525

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		


ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3
CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ALCANTARILLA K 7+605					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: 27,12				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	40,68

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12526

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ALCANTARILLA K 6+853					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: 40,68				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	54,24

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12527

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ALCANTARILLA K 6+020					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: 54,24				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	67,8

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1252

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**		

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ALCANTARILLA K 4+680					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: 67,8				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	81,36

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12529

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ALCANTARILLA K 4+196					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: 81,36				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	94,92

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12530

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3
CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ALCANTARILLA K 4+138					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: 94,92				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	108,48

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12531

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3
CAPITULO:	OBRAS DE DRENAJE

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ALCANTARILLA K 3+476					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,11	1,00	13,41
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: 108,48				**SUBTOTAL**	13,56
				TOTAL	122,04

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12532

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3
CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.7	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ALCANTARILLA K 2+332					
PLACA INFERIOR	8,00	1,51	0,20	1,00	2,42
PLACA SUPERIOR	8,00	1,51	0,15	1,00	1,81
NUCLEO (CON TUBO DE 0,97m^2)	8,00	1,51	1,084	1,00	13,09
DESCUENTO DEL TUBO	8,00			-0,97	-7,76
ALETAS	1,50	0,25	1,05	4,00	1,58
SOLERA	FIGURA IRREGULAR V=0,562m^3			2,00	1,12
DENTELLON	3,00	0,25	0,40	2,00	0,6
BORDILLO	1,51	0,50	0,25	2,00	0,38
PASAN: 122,04				**SUBTOTAL**	13,24
				TOTAL	135,28

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12533

CONSORCIO HALCÓN


ANEXO

BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI)

12534

BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI)


PARCIAL #3

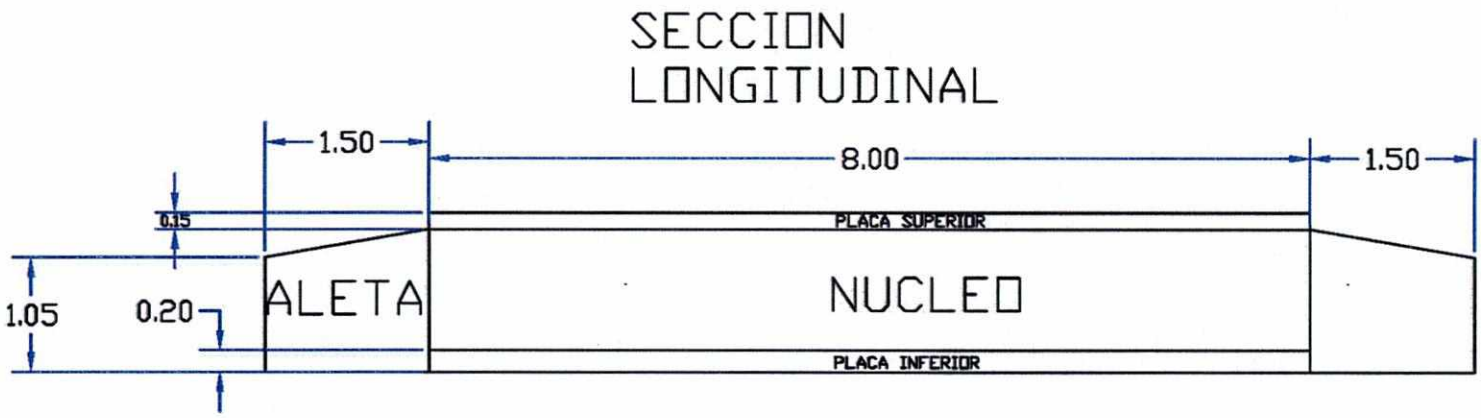

12535

BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI)

PARCIAL #3

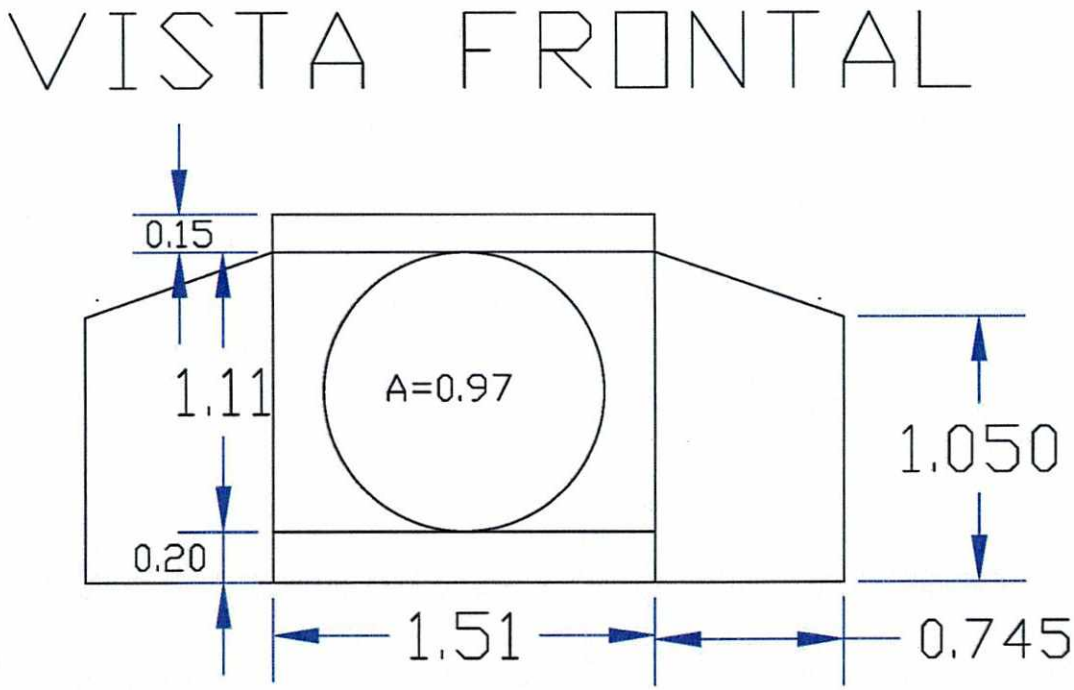

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.8	**TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION**	**ML**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 8+400	K 8+400	1	4	4
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 7+870	K 7+870	1	4	4
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 7+605	K 7+605	1	4	4
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 6+853	K 6+853	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 6+020	K 6+020	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 4+680	K 4+680	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 4+196	K 4+196	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 4+138	K 4+138	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 3+476	K 3+476	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 2+332	K 2+332	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K 1+492	K 1+492	1	8	8
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401	K +704	K +704	1	8	8
PASAN:				**SUBTOTAL**	84
				TOTAL	84

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12537

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023


CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No 3**		

CAPITULO:	**OBRAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.9	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.**	**KG**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	CANTIDAD	PESO	TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 8+400	K 8+400	0,5	804,61	402,305
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 7+870	K 7+870	0,5	804,61	402,305
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 7+605	K 7+605	0,5	804,61	402,305
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 6+853	K 6+853	1	804,61	804,610
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 6+020	K 6+020	1	804,61	804,610
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 4+680	K 4+680	1	804,61	804,610
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 4+196	K 4+196	1	804,61	804,610
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 4+138	K 4+138	1	804,61	804,610
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa	K 3+476	K 3+476	1	384,59	384,590
PASAN:				SUBTOTAL	5614,56
				TOTAL	5614,56

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12538

ACERO DE REFUERZO ALCANTARILLA RESUMEN PEDIDO COMPLETO

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

REFERENCIA	DIAMETRO	LONGITUD (m)	PESO (Kg)
17023	#2		
17024	#3	30,6	17,13
17025	#4	787,48	787,48
		TOTAL BARRAS FIGURADAS	65,62

RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR

REFERENCIA	DIAMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO (Kg)
17917	#4	12.00	6.0	72.00
			TOTAL ESTANDAR	72.00

PESO TOTAL DEL PEDIDO = 804.61 Kg

OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR INTERVENTORIA

12539

No. 4-1

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

PLACA INFERIOR (Es 1) Peso/Elemento= 171.60Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
0.50 0.20 5.30 5.70 0.20 0.50 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	7	#4	12.40	86.8	Transversal Placa inferior con dentellon figurado
1.40 G1 G2 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	54	#4	1.80	97.2	Refuerzo placa inferior

PLACA SUPERIOR (Es 1) Peso/Elemento= 171.60Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
0.20 5.80 0.20 2.60 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	7	#4	8.80	61.6	Transversal placa superior

Powered by CamScanner

CONSORCIO HALCÓN

DESPIECE ACERO ELEMENTO POR ELEMENTO

12541

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
1.40 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	54	#4	1.80	97.2	Refuerzo placa superior

SOLERA (Son 2) Peso/Elemento= 20.20Kg Peso 2 elementos=40.40Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
1.54 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	1.94	3.88	Refuerzo zarpa (Total =2)
1.77 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	2.17	4.34	Refuerzo zarpa (Total =2)
1.95 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	2.35	4.7	Refuerzo zarpa (Total =2)

Powered by CamScanner




12592

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO


2.15 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	2.55	5.1	Refuerzo zarpa (Total =2)
2.33 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	2.73	5.46	Refuerzo zarpa
2.50 G1(90°)=0.20m G2(90°)=0.20m	2	#4	2.90	5.8	Refuerzo zarpa
0.20 0.50 0.50 G1(90°)=0.20m	4	#4	1.20	4.8	Refuerzo dentellón (Total =4)

Powered by CamScanner

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

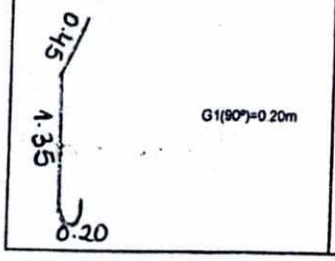DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	4	#4	1.50	6	Refuerzo zarpa (Total =4)
	16	#4	1.80	28.8	Refuerzo bordillo (Total =16)
	16	#4	2.00	32	Refuerzo aletas (externo) (Total = 16)





DENTELLON (Son 2) Peso/Elemento= 43.00Kg Peso 2 elementos=86.00Kg

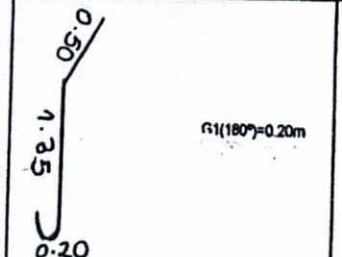DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	16	#4	2.05	32.8	Refuerzo aletas (interno) (Total = 16)

Powered by CamScanner

12599

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

	G2(90°)=0.20m	8	#4	1.54	12.32	Refuerzo vertical aletas (Total =8)
	G2(90°)=0.20m	8	#4	1.50	12	Refuerzo vertical aletas (Total =8)
		8	#4	1.46	11.68	Refuerzo vertical aletas (Total =8)
		8	#4	1.42	11.36	Refuerzo vertical aletas (Total =8)

Powered by CamScanner

12595

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO


1.18 (e2)	8	#4	1.38	11.04	Refuerzo vertical aletas (Total =8)
1.14 (e2)	8	#4	1.34	10.72	Refuerzo vertical aletas (Total =8)
1.10 (e2)	8	#4	1.30	10.4	Refuerzo vertical aletas (Total =8)
1.06 (e2)	8	#4	1.26	10.08	Refuerzo vertical aletas (Total =8)

Powered by CamScanner

ACERO DE REFUERZO
ALCANTARILLA
ELEMENTO POR ELEMENTO

	8	#4	1.60	12.8	Guía soporte aletas (Total = 8)

BORDILLO (Son 2) Peso/Elemento= 21.52Kg Peso 2 elementos=43.04Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	18	#3	1.70	17.13	Fleje para bordillo (Total = 18)
0.20 + 2.70 + 0.20	6	#4	3.10	18.6	Amarre para dentellon (Total = 6)

TUBERIA (Es 1) Peso/Elemento= 71.83Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
0.20 2.70 5.80 0.20	4	# 4	8.90	35.6	Amarre para muros forrando el tubo de 36" Muro 1
0.20 2.70 5.80 0.20	4	# 4	8.90	35.6	Amarre para muros forrando el tubo de 36" Muro 2
0.20 1.40 0.18	54	# 4	1.80	97.2	Refuerzo vertical para muros forrando el tubo

ALETAS (Son 4) Peso/Elemento= 43.66Kg Peso 4 elementos=174.64Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
0.20 1.40 0.20	12	#4	1.80	21.6	Amarre para bordillo (Total = 12)

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Powered by CamScanner

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA - PMT

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	19/04/2024 a 20/08/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 24.039.734.150,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023
NIT:	901.666.148-8	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	gerencia@camelingenieria.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	APOYO A LA SUPERVISION:	JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	251-2023

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha		OBRA EJECUTADA						
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
PMT 1	PERSONAL												
PMT 1,1	CONDUCTOR CAMIONETA	MES	$ 1.907.575,00	$ 31.953.495,99	0,00	$ -	3,89	$ 10.717.878,68	0,21	$ 6.743.620,00	4,10	$ 17.461.498,68	54,65%
PMT 1,2	INSPECTORA SISO	MES	$ 2.778.835,00	$ 42.142.211,00	0,00	$ -	2,67	$ 11.458.278,00	0,21	$ 8.820.338,00	2,88	$ 20.278.616,00	48,12%
PMT 1,3	CONTROLADOR VIAL	MES	$ 1.335.094,00	$ 26.701.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,45	$ 11.994.447,00	0,45	$ 11.994.447,00	44,92%
PMT 1,4	AYUDANTE	MES	$ 1.335.094,00	$ 14.686.034,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,36	$ 5.340.376,00	0,36	$ 5.340.376,00	36,36%
	SUBTOTAL			**$ 115.483.620,99**		**$ -**		**$ 22.176.156,68**		**$ 32.898.781,00**		**$ 55.074.937,68**	
PMT 2	MATERIALES												
PMT 2,1	COMBUSTIBLE CAMIONETA	GLN	$ 16.000,00	$ 34.819.677,86	0,00	$ -	159,40	$ 4.279.817,58	0,23	$ 7.915.467,42	159,63	$ 12.195.285,00	35,02%
	SUBTOTAL			**$ 34.819.677,86**		**$ -**		**$ 4.279.817,58**		**$ 7.915.467,42**		**$ 12.195.285,00**	
PMT 3	MAQUINARIA												
PMT 3,1	CAMIONETA	DIA	$ 283.333,33	$ 25.316.012,15			51,19	$ 25.316.012,15	0,00	$ -	51,19	$ 25.316.012,15	100,00%
	SUBTOTAL			**$ 25.316.012,15**		**$ -**		**$ 25.316.012,15**		**$ -**		**$ 25.316.012,15**	
PMT 4	SEÑALIZACIÓN												
PMT 4,1	SEÑAL INFORMATIVA, PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA	UND	$ 100.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	$ -	23,00	$ 2.300.000,00	0,00	$ -	23,00	$ 2.300.000,00	92,00%
PMT 4,2	CINTA DE DEMARCACIÓN "PELIGRO NO PASE" ROLLO X 500 MTS	UND	$ 17.000,00	$ 1.207.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 17.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 17.000,00	1,41%
PMT 4,3	BARRICADAS	UND	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.500.000,00	83,33%
PMT 4,4	MALETINES	UND	$ 200.000,00	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.200.000,00	37,50%
PMT 4,5	SEÑALIZACIÓN VIAL TUBULAR	UND	$ 38.000,00	$ 1.178.000,00	0,00	$ -	19,00	$ 722.000,00	0,00	$ -	19,00	$ 722.000,00	61,29%
PMT 4,6	PALETAS PARE Y SIGA	UND	$ 15.000,00	$ 15.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL			**$ 9.900.000,00**		**$ -**		**$ 5.739.000,00**		**$ -**		**$ 5.739.000,00**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS			**$ 185.519.311,00**		**$ -**		**$ 57.510.986,41**		**$ 40.814.248,42**		**$ 98.325.234,83**	
	VALOR TOTAL PMT			**$ 185.519.311,00**		**$ -**		**$ 57.510.986,41**		**$ 40.814.248,42**		**$ 98.325.234,83**	

CONDICIONES GENERALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
			RELACION DE ACTAS		NETO PARCIAL	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$	185.519.311,00				
VALOR ADICIONAL						
VALOR TOTAL	$	185.519.311,00	ACTA 1	$ 37.103.862,20	$	37.103.862,20
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$	185.519.311,00	ACTA 2	$ 20.407.124,21	$	20.407.124,21
ANTICIPO 0%	$	-	ACTA 3			
PRESENTE ACTA	$	40.814.248,42	PRESENTE ACTA	$ 40.814.248,42	$	40.814.248,42
ACUMULADO	$	98.325.234,83	TOTALES	$ 98.325.234,83	$	98.325.234,83

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1548

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA - PMT

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	98.325.234,83	53,00
POR EJECUTAR	$	87.194.076,17	47,00
TOTALES	$	185.519.311,00	100,00

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500214 (Registro Presupuestal No. 1002-2.3.24.02.0600.115-00AD / 1003.2.3.24.020600.117.2.02.05.310 de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ -		$ -
1	PAGO PARCIAL N°1	$ 37.103.862,20	$ 37.103.862,20	$ 37.103.862,20
2	PAGO PARCIAL N°2	$ 20.407.124,21	$ 20.407.124,21	$ 57.510.986,41
3	PRESENTE ACTA	$ 40.814.248,42	$ 40.814.248,42	$ 98.325.234,83
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 87.194.076,17		$ 185.519.311

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE

NOTAS
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.666.148-8 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°0775 DE 2022 representado legalmente por la Union Temporal o Consorcio HALCON , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____ NO X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: 20 SET. 2024

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 522028-1335

Firma:
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 215835-T

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 189523-T

12594

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 3
CAPITULO:	PMT 1 - PERSONAL

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMT 1,1	CONDUCTOR CAMIONETA	MES

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION			
	MES	VALOR MES	%	TOTAL
CONDUCTOR CAMIONETA	ABRIL 2024	$ 1.907.575,00	82,12%	$ 1.566.468,00
CONDUCTOR CAMIONETA	MAYO 2024	$ 1.907.575,00	93,78%	$ 1.788.899,00
CONDUCTOR CAMIONETA	JUNIO 2024	$ 1.907.575,00	92,53%	$ 1.765.149,00
CONDUCTOR CAMIONETA	JULIO 2024	$ 1.907.575,00	85,09%	$ 1.623.104,00
PASAN:			SUBTOTAL	$ 6.743.620,00
			TOTAL	$ 6.743.620,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12550

ABRIL 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONDUCTOR CAMIONETA	JONATHAN ALEXANDER BUITRAGO	1123512577	$ 1.907.575,00	$ 1.566.468,00
SUBTOTAL					**$ 1.566.468,00**
MAYO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONDUCTOR CAMIONETA	JONATHAN ALEXANDER BUITRAGO	1123512577	$ 1.907.575,00	$ 1.788.899,00
SUBTOTAL					**$ 1.788.899,00**
JUNIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONDUCTOR CAMIONETA	JONATHAN ALEXANDER BUITRAGO	1123512577	$ 1.907.575,00	$ 1.765.149,00
SUBTOTAL					**$ 1.765.149,00**
JULIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONDUCTOR CAMIONETA	JONATHAN ALEXANDER BUITRAGO	1123512577	$ 1.907.575,00	$ 1.623.104,00
SUBTOTAL					**$ 1.623.104,00**
TOTAL					**$ 6.743.620,00**

Firma: Paola Andrea

PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
Contador de Obra
MP: 215835-T
Consorcio Halcon

Firma aprobó:

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador de Interventoría
MP: 189521-T
Consorcio Inter AIM

1255 1

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/04/01 - 2024/04/30**
Comprobante Número:**2643**

Nombre: **JONATHAN ALEXANDER BUITRAGO RAMIREZ**
Identificación: **1123512577**
Cargo: **CONDUCTOR DE CAMIONETA**
Salario básico: **$1,400,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,400,000.00	Fondo de salud	0	$ 61,064.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 61,064.00
Horas extras diurnas 125%	17.00	$ 126,596.00			
Total Ingresos		**$ 1,688,596.00**	**Total Deducciones**		**$ 122,128.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,566,468.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12552

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/05/01 - 2024/05/30**
Comprobante Número:**3041**

Nombre: **JHONNATAN ALEXANDER BUITRAGO RAMIREZ**
Identificación: **1123512577**
Cargo: **CONDUCTOR DE CAMIONETA**
Salario básico: **$1,400,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,400,000.00	Fondo de salud	0	$ 70,735.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 70,735.00
Horas extras diurnas 125%	32.00	$ 238,298.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 83,404.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 46,667.00			
Total Ingresos		**$ 1,930,369.00**	**Total Deducciones**		**$ 141,470.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,788,899.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12553

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/06/01 - 2024/06/30**
Comprobante Número:**3356**

Nombre: **JHONNATAN ALEXANDER BUITRAGO RAMIREZ**
Identificación: **1123512577**
Cargo: **CONDUCTOR DE CAMIONETA**
Salario básico: **$1,400,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,400,000.00	Fondo de salud	0	$ 69,702.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 69,702.00
Prima de servicios	0.00	$ 933,344.00			
Horas extras diurnas 125%	46.00	$ 342,553.00			
Total Ingresos		**$ 2,837,897.00**	**Total Deducciones**		**$ 139,404.00**

NETO A PAGAR	$ 2,698,493.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1255 4

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número:**3551**

Nombre: **JHONNATAN ALEXANDER BUITRAGO RAMIREZ**
Identificación: **1123512577**
Cargo: **CONDUCTOR DE CAMIONETA**
Salario básico: **$1,400,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,400,000.00	Fondo de salud	0	$ 63,526.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 63,526.00
Horas extras diurnas 125%	19.00	$ 141,489.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 46,667.00			
Total Ingresos		**$ 1,750,156.00**	**Total Deducciones**		**$ 127,052.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,623,104.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12555

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 3
CAPITULO:	PMT 1 - PERSONAL

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMT 1,2	INSPECTORA SISO	MES

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION			
	MES	VALOR MES	%	TOTAL
INSPECTORA SISO	ABRIL 2024	$ 2.778.835,00	80,50%	$ 2.236.893,00
INSPECTORA SISO	MAYO 2024	$ 2.778.835,00	84,37%	$ 2.344.552,00
INSPECTORA SISO	JUNIO 2024	$ 2.778.835,00	78,38%	$ 2.178.169,00
INSPECTORA SISO	JULIO 2024	$ 2.778.835,00	74,16%	$ 2.060.724,00
PASAN:			SUBTOTAL	$ 8.820.338,00
			TOTAL	$ 8.820.338,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12556

ABRIL 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR DESCUENTO**
PAGO NOMINA	INSPECTORA SISO	ANGELA AMADO PARRA	1123511721	$ 2.778.835,00	$ 2.236.893,00
SUBTOTAL					**$ 2.236.893,00**
MAYO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR DESCUENTO**
PAGO NOMINA	INSPECTORA SISO	ANGELA AMADO PARRA	1123511721	$ 2.778.835,00	$ 2.344.552,00
SUBTOTAL					**$ 2.344.552,00**
JUNIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	INSPECTORA SISO	ANGELA AMADO PARRA	1123511721	$ 2.778.835,00	$ 2.178.169,00
SUBTOTAL					**$ 2.178.169,00**
JULIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	INSPECTORA SISO	ANGELA AMADO PARRA	1123511721	$ 2.778.835,00	$ 2.060.724,00
SUBTOTAL					**$ 2.060.724,00**
TOTAL					**$ 8.820.338,00**

Firma:

PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
Contador de Obra
MP: 215835-T
Consorcio Halcon

Firma aprobó:

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador de Interventoría
MP: 189521-T
Consorcio Inter AIM

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/04/01 - 2024/04/30**
Comprobante Número:**2635**

Nombre: **ANGELA MARITZA AMADO PARRA**
Identificación: **1123511721**
Cargo: **INSPECTOR SST**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 90,213.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 90,213.00
Horas extras diurnas 125%	24.00	$ 255,319.00			
Total Ingresos		**$ 2,417,319.00**	**Total Deducciones**		**$ 180,426.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,236,893.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12558

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/05/01 - 2024/05/30**
Comprobante Número:**3034**

Nombre: **ANGELA MARITZA AMADO PARRA**
Identificación: **1123511721**
Cargo: **INSPECTOR SST**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 94,894.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 94,894.00
Horas extras diurnas 125%	35.00	$ 372,340.00			
Total Ingresos		**$ 2,534,340.00**	**Total Deducciones**		**$ 189,788.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,344,552.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12559

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/06/01 - 2024/06/30**
Comprobante Número:**3349**

Nombre: **ANGELA MARITZA AMADO PARRA**
Identificación: **1123511721**
Cargo: **INSPECTOR SST**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 87,660.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 87,660.00
Prima de servicios	0.00	$ 1,200,667.00			
Horas extras diurnas 125%	18.00	$ 191,489.00			
Total Ingresos		**$ 3,554,156.00**	**Total Deducciones**		**$ 175,320.00**

NETO A PAGAR	$ 3,378,836.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12560

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número:**3546**

Nombre: **ANGELA MARITZA AMADO PARRA**
Identificación: **1123511721**
Cargo: **INSPECTOR SST**
Salario básico: **$2,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0	$ 82,553.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 82,553.00
Horas extras diurnas 125%	6.00	$ 63,830.00			
Total Ingresos		**$ 2,225,830.00**	**Total Deducciones**		**$ 165,106.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,060,724.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1256 1

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 3
CAPITULO:	PMT 1 - PERSONAL

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMT 1,3	CONTROLADOR VIAL	MES

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION			
	MES	VALOR MES	CANTIDAD	TOTAL
CONTROLADOR VIAL	ABRIL 2024	$ 1.335.094,00	2,00	$ 2.670.188,00
CONTROLADOR VIAL	MAYO 2024	$ 1.335.094,00	3,00	$ 4.005.282,00
CONTROLADOR VIAL	JUNIO 2024	$ 1.335.094,00	2,00	$ 2.670.188,00
CONTROLADOR VIAL	JULIO 2024	$ 1.335.094,00	1,98	$ 2.648.789,00
PASAN:			SUBTOTAL	$ 11.994.447,00
			TOTAL	$ 11.994.447,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12562

ABRIL 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	ANA LISENIA AYALA FRANCO	1122120737	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	AYCEDY ALBAN ALZATE	40362804	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 2.670.188,00**
MAYO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	ANA LISENIA AYALA FRANCO	1122120737	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	AYCEDY ALBAN ALZATE	40362804	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	WENDY PAOLA LIZCANO CARRANZA	1065982194	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 4.005.282,00**
JUNIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	ANA LISENIA AYALA FRANCO	1122120737	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	AYCEDY ALBAN ALZATE	40362804	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 2.670.188,00**
JULIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	ANA LISENIA AYALA FRANCO	1122120737	$ 1.335.094,00	$ 1.313.695,00
PAGO NOMINA	CONTROLADOR VIAL	AYCEDY ALBAN ALZATE	40362804	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 2.648.789,00**
TOTAL					**$ 11.994.447,00**

Firma: Paola Andrea

PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
Contador de Obra
MP: 215835-T
Consorcio Halcon

Firma aprobó: alejcanty

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador de Interventoría
MP: 189521-T
Consorcio Inter AIM

12563

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/04/01 - 2024/04/30**
Comprobante Número: **2651**

Nombre: **ANA LISENIA AYALA FRANCO**
Identificación: **1122120737**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 57,698.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 57,698.00
Horas extras diurnas 125%	3.00	$ 20,745.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 77,447.00			
Hora extra diurna dominical o festiva	4.00	$ 44,255.00			
Total Ingresos		**$ 1,604,447.00**	**Total Deducciones**		**$ 115,396.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,489,051.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12564

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/04/01 - 2024/04/30**
Comprobante Número:**2630**

Nombre: **AYCEDY ALBAN ALZATE**
Identificación: **40362804**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 58,638.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 58,638.00
Horas extras diurnas 125%	24.00	$ 165,957.00			
Total Ingresos		**$ 1,627,957.00**	**Total Deducciones**		**$ 117,276.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,510,681.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1256

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/05/01 - 2024/05/30**
Comprobante Número: **3048**

Nombre: **ANA LISENIA AYALA FRANCO**
Identificación: **1122120737**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 70,218.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 70,218.00
Horas extras diurnas 125%	42.00	$ 290,426.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 77,447.00			
Hora extra diurna dominical o festiva	4.00	$ 44,255.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,917,461.00**	**Total Deducciones**		**$ 140,436.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,777,025.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1256 6

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/05/01 - 2024/05/30**
Comprobante Número: **3029**

Nombre: **AYCEDY ALBAN ALZATE**
Identificación: **40362804**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 65,129.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 65,129.00
Horas extras diurnas 125%	30.00	$ 207,447.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 77,447.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,790,227.00**	**Total Deducciones**		**$ 130,258.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,659,969.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

2562

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/05/01 - 2024/05/30**
Comprobante Número: **3028**

Nombre: **WENDY PAOLA LIZCANO CARRANZA**
Identificación: **1065982194**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 62,695.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 62,695.00
Horas extras diurnas 125%	18.00	$ 124,468.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 77,447.00			
Hora extra diurna dominical o festiva	2.00	$ 22,128.00			
Total Ingresos		**$ 1,729,376.00**	**Total Deducciones**		**$ 125,390.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,603,986.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12568

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/06/01 - 2024/06/30**
Comprobante Número: **3360**

Nombre: **ANA LISENIA AYALA FRANCO**
Identificación: **1122120737**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00
Prima de servicios	0.00	$ 640,377.00
Horas extras diurnas 125%	20.00	$ 138,298.00
Total Ingresos		**$ 2,240,675.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 57,532.00
Fondo de pensión	0	$ 57,532.00
Total Deducciones		**$ 115,064.00**

NETO A PAGAR	$ 2,125,611.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12569

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/06/01 - 2024/06/30**
Comprobante Número:**3344**

Nombre: **AYCEDY ALBAN ALZATE**
Identificación: **40362804**
Cargo: **CONTROLADORA VIAL**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 72,523.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 72,523.00
Prima de servicios	0.00	$ 855,834.00			
Horas extras diurnas 125%	39.00	$ 269,681.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	16.00	$ 154,894.00			
Hora extra diurna dominical o festiva	8.00	$ 88,511.00			
Total Ingresos		**$ 2,830,920.00**	**Total Deducciones**		**$ 145,046.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,685,874.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12578

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: 2024/07/01 - 2024/07/30
Comprobante Número: 3540

Nombre: AYCEDY ALBAN ALZATE
Identificación: 40362804
Cargo: CONTROLADORA VIAL
Salario básico: $1,300,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 54,287.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 54,287.00
Horas extras diurnas 125%	2.00	$ 13,830.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,519,163.00**	**Total Deducciones**		**$ 108,574.00**

NETO A PAGAR	$ 1,410,589.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12571

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: 2024/07/01 - 2024/07/30
Comprobante Número: 3555

Nombre: ANA LISENIA AYALA FRANCO
Identificación: 1122120737
Cargo: CONTROLADORA VIAL
Salario básico: $1,300,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	28.00	$ 1,213,333.00	Fondo de salud	0	$ 50,543.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	28.00	$ 151,200.00	Fondo de pensión	0	$ 50,543.00
Horas extras diurnas 125%	1.00	$ 6,915.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,414,781.00**	**Total Deducciones**		**$ 101,086.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 2 dias por valor de $ 86,667.00

NETO A PAGAR	$ 1,313,695.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12572

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023


CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 3
CAPITULO:	PMT 1 - PERSONAL

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMT 1,4	AYUDANTE	MES

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION			
	MES	VALOR MES	CANTIDAD	TOTAL
AYUDANTE	ABRIL 2024	$ 1.335.094,00	1,00	$ 1.335.094,00
AYUDANTE	MAYO 2024	$ 1.335.094,00	1,00	$ 1.335.094,00
AYUDANTE	JUNIO 2024	$ 1.335.094,00	1,00	$ 1.335.094,00
AYUDANTE	JULIO 2024	$ 1.335.094,00	1,00	$ 1.335.094,00
PASAN:			SUBTOTAL	$ 5.340.376,00
			TOTAL	$ 5.340.376,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA


Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12577

ABRIL 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR DESCUENTO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE	EDUAR STIBEN ALBAN MONROY	1095484660	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 1.335.094,00**
MAYO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR DESCUENTO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE	EDUAR STIBEN ALBAN MONROY	1095484660	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 1.335.094,00**
JUNIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE	EDUAR STIBEN ALBAN MONROY	1095484660	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 1.335.094,00**
JULIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR MES**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE	EDUAR STIBEN ALBAN MONROY	1095484660	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 1.335.094,00**
TOTAL					**$ 5.340.376,00**

Firma: Paola Andrea

PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
Contador de Obra
MP: 215835-T
Consorcio Halcon

Firma aprobó:

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador de Interventoría
MP: 189521-T
Consorcio Inter AIM

12574

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/04/01 - 2024/04/30**
Comprobante Número: **2636**

Nombre: **EDUAR STIBEN ALBAN MONROY**
Identificación: **1095484660**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 53,106.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 53,106.00
Horas extras diurnas 125%	4.00	$ 27,660.00			
Total Ingresos		**$ 1,489,660.00**	**Total Deducciones**		**$ 106,212.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,383,448.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12575

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/05/01 - 2024/05/30**
Comprobante Número:**3059**

Nombre: **EDUAR STIBEN ALBAN MONROY**
Identificación: **1095484660**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,256,667.00	Fondo de salud	0	$ 62,843.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 156,600.00	Fondo de pensión	0	$ 62,843.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Horas extras diurnas 125%	28.00	$ 193,617.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 77,447.00			
Total Ingresos		**$ 1,727,664.00**	**Total Deducciones**		**$ 125,686.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1 dias por valor de $ 43,333.00

NETO A PAGAR	**$ 1,601,978.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1576

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/06/01 - 2024/06/30**
Comprobante Número: **3350**

Nombre: **EDUAR STIBEN ALBAN MONROY**
Identificación: **1095484660**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 56,426.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,426.00
Prima de servicios	0.00	$ 809,170.00			
Horas extras diurnas 125%	16.00	$ 110,638.00			
Total Ingresos		**$ 2,381,808.00**	**Total Deducciones**		**$ 112,852.00**

NETO A PAGAR	$ 2,268,956.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12572

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número: **3547**

Nombre: **EDUAR STIBEN ALBAN MONROY**
Identificación: **1095484660**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,256,667.00	Fondo de salud	0	$ 52,553.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 156,600.00	Fondo de pensión	0	$ 52,553.00
Horas extras diurnas 125%	2.00	$ 13,830.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,470,430.00**	**Total Deducciones**		**$ 105,106.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1 dias por valor de $ 43,333.00

NETO A PAGAR	**$ 1,365,324.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

2578

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 3
CAPITULO:	PMT 2 - MATERIALES

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,1	COMBUSTIBLE CAMIONETA	GALON

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION			
	VALOR GALON	CANTIDAD	VALOR MES	TOTAL
COMBUSTIBLE CAMIONETA ABRIL 2024	$ 15.640,00	118,31	$ 1.850.436,00	$ 1.850.436,00
COMBUSTIBLE CAMIONETA MAYO 2024	$ 15.640,00	118,29	$ 1.850.038,00	$ 1.850.038,00
COMBUSTIBLE CAMIONETA JUNIO 2024	$ 15.640,00	151,55	$ 2.370.175,42	$ 2.370.175,42
COMBUSTIBLE CAMIONETA JULIO 2024	$ 15.640,00	117,96	$ 1.844.818,00	$ 1.844.818,00
PASAN:			SUBTOTAL	$ 7.915.467,42
			TOTAL	$ 7.915.467,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12529

MES	DESCRIPCIÓN	PLACA	FACTURA ELECTRONICA	CANTIDAD	VALOR GALON	VALOR TOTAL	VALOR DESCUENTO PMT
ABRIL 2024	COMBUSTIBLE CAMIONETA	LIQ 622	FVE5176	118,314322	$ 15.640,00	$ 1.850.436,00	$ 1.850.436,00
MAYO 2024	COMBUSTIBLE CAMIONETA	LIQ 622	FVE5270	118,288875	$ 15.640,00	$ 1.850.038,00	$ 1.850.038,00
JUNIO 2024	COMBUSTIBLE CAMIONETA	LIQ 623	FVE5432	150,17752	$ 15.640,00	$ 2.348.776,42	$ 2.348.776,42
JULIO 2024	COMBUSTIBLE CAMIONETA	LIQ 622	FVEI38870	117,955115	$ 15.640,00	$ 1.844.818,00	$ 1.844.818,00
TOTAL DESCUENTO PMT							**$ 7.894.068,42**

Firma:

JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
Residente de obra
MP. 25202-119961
Consorcio Halcon

Firma aprobó:

JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA
Residente de interventoría
MP. 25202-68176
Consorcio Inter AIM

12580

INVERCON DEL LLANO S.A.S.
NIT: 901.129.789-6 Regimen Comun
CRA 7 No. 19 - 25 Barrio Villa Marlen Guamal (Meta)
CEL: 310 309 2866 Tel: 675 5613)
Correo: edsisabelbiomax@hotmail.com)

Factura electrónica de venta

No. FVE5176

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO HALCON	**22/04/2024**	**$ 1.850.436**
NIT No. : 901666148-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 5 24 50	-	
TELEFONO : 3106965106	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : YOPAL **PAIS :** Colombia	22/04/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
VAL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGUN RELACION DE VALES	1 UND	$ 1.851.890		$ 1.851.890

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.851.890
Ret. por venta de derivados del petróleo - Reg. Ordinario de tributación	$ 1.453.945	0,10%	-$ 1.454
VALOR TOTAL :			$ 1.850.436

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Amort. CxP # 1	Id.: 28050501;ANTICII	$ 1.850.436

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

SALDO PENDIENTE CONSUMO MARZO 2024
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764061393454. Prefijo: FVE. Rango: 4401 al 6900. Vigencia: 6/12/2023 hasta 6/12/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.
Resolución Dian 18763003110397 facturación electronica fecha 03/Ene/2020 numeración desde 1 hasta 600

este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun art: 774 numeral 6 del codigo de comercio.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
JEU3psNcV/Jey9QVEZ3KR0lEsEGAbDnLz60H6i12UHM/aDZj14dk0x8b6ck+KfnnVweHwF8kE0rRW/4YdezBc5Lfem/bKq+yGlxWEmm6dhvBiJKvTJvU8E9a/6bMtuGQiAaZ0epKkszA/ZqLz5gASrxJcskuCDXNFFDz6XDU3hwIL+OCWYZ8pRILIlVDlwKRW5PqCQQWS/0GtSOy1J8P7xkqP+FdBxSuzphrxZg1/4Z6/O+DNNTLROZOmUicw8DYdJMyUfjeKWaNbM9V5JVcr0n28DpZNvy29fa97HiD90UEJpBiXJlimRQShOzYfoAlNRg+glrRCpXjpvEhTWynrg==

CUFE: b2f18ef25e080a8288ddf2a287c1ed26f5a3f718afc544f660370226c8cebd9f0b948aca8bd4e0870197631ee5459f7f
Fecha emisión: 2024-04-22 18:06:29 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-22 18:07:36-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

hse1

INVERCON DEL LLANO S.A.S.
NIT: 901.129.789-6 Regimen Comun
CRA 7 No. 19 - 25 Barrio Villa Marlen Guamal (Meta)
CEL: 310 309 2866 Tel: 675 5613)
Correo: edsisabelbiomax@hotmail.com)

Factura electrónica de venta
No. **FVE5270**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO HALCON	**07/05/2024**	**$ 1.850.038**
NIT No. : 901666148-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 5 24 50	-	
TELEFONO : 3106965106	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : YOPAL **PAIS :** Colombia	07/05/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
VAL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGUN RELACION DE VALES	1 UND	$ 1.851.890		$ 1.851.890

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.851.890
Ret. por venta de derivados del petróleo - Reg. Ordinario de tributación	$ 1.851.890	0,10%	-$ 1.852
VALOR TOTAL :			$ 1.850.038

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Amort. CxP # 1	Id.: 28050501;ANTICII	$ 1.850.038

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

SALDO PENDIENTE CONSUMO MARZO 2024
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764061393454. Prefijo: FVE. Rango: 4401 al 6900. Vigencia: 6/12/2023 hasta 6/12/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.
Resolución Dian 18763003110397 facturación electronica fecha 03/Ene/2020 numeración desde 1 hasta 600

este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun art: 774 numeral 6 del codigo de comercio.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
dKoSn5byc0nAsL3uczdBwOTpE0jV/Ncg/Vg+KkGlWltdKVfA/7ri0f/Nsg123VMuUgxcKaYTPmnXJ0nSx8ZNlspLbwyk6dSqxc1fGD8D4pDhWz4GX23appPvz4wE
tNcs8OrFu3Ljw4FYVBSSQNtLYXO6G/cGRm7o3BiY14quQlyysLkdNZ6RAzfHDKVrkpGtpDuvrKopa7BFkqTD3dMuwkUcX1auTsYJnq2r6AuGLz8xtXZ13YXFfly
Ej2oClcjJCvS7unt2ITNpznt8eLjCjeABPewGPmw/CgTHofUpdDvpBfTd79U58K0U+4RO/z8l76guel3D/BvmHnBlqYUS9A==

CUFE: 96f443f4e2eb3db48a61d4cf9f9e9c4af751f6a9067b945ee6d0f2690ab39d41c41c6f489320a6b8c11aeb3f559e41ba
Fecha emisión: 2024-05-07 18:30:55 **Fecha validación DIAN:** 2024-05-07 18:32:00-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

12582

INVERCON DEL LLANO S.A.S.
NIT: 901.129.789-6 Regimen Comun
CRA 7 No. 19 - 25 Barrio Villa Marlen Guamal (Meta)
CEL: 310 309 2866 Tel: 675 5613)
Correo: edsisabelbiomax@hotmail.com)

Factura electrónica de venta
No. **FVE5432**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO HALCON	**01/06/2024**	**$ 15.300.469**
NIT No. : 901666148-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 5 24 50	-	
TELEFONO : 3106965106	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : YOPAL **PAIS :** Colombia	01/06/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
VAL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGUN RELACION DE VALES	1 UND	$ 15.315.785		$ 15.315.785

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 15.315.785
Ret. por venta de derivados del petróleo - Reg. Ordinario de tributación	$ 15.315.785	0,10%	-$ 15.316
VALOR TOTAL :			$ 15.300.469

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Amort. CxP # 1	Id.: 28050501;ANTICII	$ 15.300.469

VALOR (en letras) : QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 MAYO 2024

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764061393454. Prefijo: FVE. Rango: 4401 al 6900. Vigencia: 6/12/2023 hasta 6/12/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.
Resolución Dian 18763003110397 facturación electronica fecha 03/Ene/2020 numeración desde 1 hasta 600

este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun art: 774 numeral 6 del codigo de comercio.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ZDxGQzKSz6WbYUZjV0MWduu6DH7WPODmyzzeX543sGVFDuWvRFJo98Or840uHt0XcDNO4L1U8cscu8PPCvqMVj3KrvhxF4NtS0/R8UqlhJR5n3+Zhs20i
QgyDv8dV8kdS0hUi1dMMIFbsbOFq5DA7cHfzLIvBgIRBDR77F66v6BleqEBRGqKLfMX0vs46s28Dwi8AVoiOtT0ZStlloEmBQtjapsxjFvgwCzCckGPVrtZdC6Lwr
lliEB98/O/b6ebUlWJzdpMFv938xfgowAhwXxbktJkyB438C5zKBKfiFsWwKA9O6Jb5uDZoYo7mtSmK/CbDvlk1o+tSTkgD6Q7iw==

CUFE: f938c8ced8b81de2a7253a527057b59e975454582905a24c88bcee4cef4148235b59694f8c0b220e0abc8f15e48aca05
Fecha emisión: 2024-06-01 14:13:27 **Fecha validación DIAN:** 2024-06-01 14:14:36-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

12583

Factura Electrónica de Venta No

FVEI38870

Fecha Validación DIAN: 2024-07-31 16:49:38

Fecha Emisión: 2024-07-31 16:49:38

INVERCON DEL LLANO SAS

SANTA ISABEL

NIT: 901129789-6 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764072143473 de 2024-06-04
De FVEI-1 A FVEI-2500000 - Desde: 2024-06-04 Hasta: 2026-06-04
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 7 19 25
Guamal - Meta - Colombia
Telefono: 3103075000
E-mail: edsisabelbiomax@hotmail.com

CC o NIT: 901666148 - 8
Cliente: CONSORCIO HALCON
Dirección: CRA 5 N 24 50
Ciudad: Yopal
Telefono: 3106965106
E-mail: CONSORCIOHALCON@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-07-31

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	117.955	galón	15,640	0	0	1,844,818	1,844,818			1,844,818
2	15101505	DIESEL	139.851	galón	9,529	0	0	1,332,619	1,332,619			1,332,619
3	15101505	DIESEL	1,311.941	galón	9,530	0	0	12,502,799	12,502,799			12,502,799

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Subtotal:	15,680,236
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	15,680,236
Impuestos:	
Total Factura:	15,680,236

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2024
PLACA VEHÍCULO(S): LIQ622, SVD905, SPV424, SMI122, WSJ957, SQI397, SQI405, SPV432

SON: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS COP

Firma Digital:

O1hL4FWH7ur3DZix18R3g4jWLSCn4qqjMUncF1gHsXIs0UR2R+euYtPSNRczfGXtxN9Uj9d7/Z90NkRBxDVGcSPFYbCPXuJRSQ89hbXZWmpjQp5G/RkuyX0Flh1aTH8IXR9YgV39gClKs2o
NSnnIzVpOb3hnJgpb6hxg7wc9ZsupnHEkB5JrCkzQr2X79qov9/RbUhu9nX45Z6v5TJDTekWFVupr3dvk9F0/CueEFcZkdK1LhJxL++S7KoLLXjjaGXqYVMiikZVEo8Y1cQTDQXrUVRHPMOjK
fwO3oc2IQmm+YjM9BBDi8OGHEvp9NjE1SC1dM+M2wDUlXj2cTZs2DA==

12824

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS - PMT

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	**2021005500214**
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	11/03/2025
OBJETO CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"		
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	251-2023		

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS PMT

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		
			Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado

Mediante el presente documento, BORIS JOSE GAITAN CUERVO representante legal de CONSORCIO INTER AIM quien ejerce la Interventoria del proyecto y DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ representante legal de CONSORCIO HALCON Contratista de Obra, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS PMT

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
PMT 1.3	CONTROLADOR VIAL	MES	$ 1.335.094,00
PMT 1.4	AYUDANTE	MES	$ 1.335.094,00

NOTAS:

1. Los precios unitarios correspondientes a los Item de IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N°100-37-088-2023 y los costos vigentes determinados con el estudio de mercado.

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta los que interviene en ella, el día 01 ABR 2024

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12585

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

112-ECP-FR-005-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**APROBACIÓN DE PRECIOS**	
CAPITULO:	**PMT 1 PERSONAL**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
PMT 1,3	**CONTROLADOR VIAL**	MES

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1					
2					
				Subtotal	**$ 0,00**

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
3					
4					
5					
				Subtotal	**$ 0,00**

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
6	CONTROLADOR VIAL	1	MES	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
				Subtotal	**$ 1.335.094,00**

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
7						
					Subtotal	**$ 0,00**
					Total Costo Directo	**$ 1.335.094,00**

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 01 ABR 2024

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1.SPG

1.1 PERSONAL PROFESIONAL						
CÓDIGO	TIPO	CATEGORÍA	TARIFA MÁXIMA MENSUAL	VALOR DÍA	PROFESIONAL (AÑOS)	EXPERIENCA ESPECÍFICA (AÑOS)
T01	PROFESIONAL	1	$ 14.586.156,00	$ 486.205,00	Mínimo 12	Mínimo 10
T02	PROFESIONAL	2	$ 11.114.805,00	$ 370.494,00	Mínimo 10	Mínimo 7
T03	PROFESIONAL	3	$ 9.381.445,00	$ 312.715,00	Mínimo 8	Mínimo 5
T04	PROFESIONAL	4	$ 7.989.201,00	$ 266.307,00	Mínimo 6	Mínimo 4
T05	PROFESIONAL	5	$ 7.203.555,00	$ 240.119,00	Mínimo 4	Mínimo 3
T06	PROFESIONAL	6	$ 6.424.083,00	$ 214.136,00	Mínimo 3	Mínimo 1
T07	PROFESIONAL	7	$ 4.857.422,00	$ 161.914,00	Mínimo 2	
T08	PROFESIONAL	8	$ 4.584.221,00	$ 152.807,00	Mínimo 1	

Estudios de posgrado con título		
NIVEL DE ESTUDIOS	Exp. Profesional (años)	Exp. Especifica (años)
ESPECIALIZACIÓN	2	1,0
MAESTRÍA	3	1,5
DOCTORADO	4	2

T41

1.2 PERSONAL TECNICO, AUXILIAR Y ADMINSTRATIVO					
CÓDIGO GRUPO	GRUPO	CÓDIGO	TIPO	TARIFA MÁXIMA MENSUAL	VALOR DÍA
401	Oficial	T09	OFICIAL	$ 2.001.596,00	$ 66.720,00
401	Oficial	T10	PLOMERO ELECTRICISTA	$ 2.333.803,00	$ 77.793,00
402	Ayudante	T11	AYUDANTE	$ 1.335.094,00	$ 44.503,00
405	Profesional	T12	ADMINISTRADOR	$ 3.950.959,00	$ 131.699,00
406	Técnico	T13	TECNOLOGO EN AREAS DE INGENIERIA	$ 4.067.962,00	$ 135.599,00
406	Técnico	T14	AUXILIAR DE INGENIERIA	$ 3.576.966,00	$ 119.232,00
406	Técnico	T15	LABORATORISTA INSPECTOR	$ 3.758.739,00	$ 125.291,00
406	Técnico	T16	LABORATORISTA AUXILIAR	$ 2.630.491,00	$ 87.683,00
406	Técnico	T17	OPERADOR EQUIPO PERFORACION	$ 3.376.389,00	$ 112.546,00
406	Técnico	T18	OPERARIO	$ 2.668.099,00	$ 88.937,00
406	Técnico	T19	OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO	$ 2.256.498,00	$ 75.217,00
406	Técnico	T20	INSPECTOR 1	$ 3.085.968,00	$ 102.866,00
406	Técnico	T21	INSPECTOR 2	$ 2.778.835,00	$ 92.628,00
406	Técnico	T22	BATIMETRISTA INSPECTOR	$ 4.239.290,00	$ 141.310,00
406	Técnico	T23	BATIMETRISTA AUXILIAR	$ 3.478.767,00	$ 115.959,00
406	Técnico	T24	AUXILIAR ADMIN - ALMACENISTA	$ 2.818.532,00	$ 93.951,00
406	Técnico	T25	SECRETARIA	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
406	Técnico	T26	SECRETARIA 1	$ 2.289.927,00	$ 76.331,00
406	Técnico	T27	SECRETARIA 2	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
408	Maestro	T28	MAESTRO DE OBRA	$ 4.003.192,00	$ 133.440,00
409	Conductor	T29	CONDUCTOR	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
409	Conductor	T30	MOTORISTA	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
410	Vigilante de obra	T31	CELADOR ARMADO*	$ 13.031.915,00	$ 434.397,00
412	Comisión topográfica	T32	TOPOGRAFO INSPECTOR	$ 4.239.290,00	$ 141.310,00
412	Comisión topográfica	T33	TOPOGRAFO AUXILIAR	$ 3.478.767,00	$ 115.959,00
412	Comisión topográfica	T34	CADENERO 1	$ 2.630.491,00	$ 87.683,00
412	Comisión topográfica	T35	CADENERO 2	$ 2.289.927,00	$ 76.331,00
414	Otra Mano de obra	T36	DIBUJANTE 1	$ 3.750.382,00	$ 125.013,00
414	Otra Mano de obra	T37	DIBUJANTE 2	$ 3.031.645,00	$ 101.055,00

*24 HORAS POR 30 DIAS DIVIDIDOS EN 3 TURNOS DE 8 HORAS DIARIAS INCLUYE PRESTACIONES DE LEY, ADMINISTRACION Y SERVICIOS SEGÚN RESOLUCION 224 DE 2008 SUPERVIGILANCIA CISCULAR EXTERNA 0435 DE DIC 30 DE 2014 TARIFAS 2015 CELADURIA PARA (3) TURNOS

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1252

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

112-ECP-FR-005-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	APROBACIÓN DE PRECIOS	
CAPITULO:	PMT 1 PERSONAL	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMT 1,4	AYUDANTE	MES

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1					
2					
				Subtotal	**$ 0,00**

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
3					
4					
5					
				Subtotal	**$ 0,00**

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
6	AYUDANTE	1	MES	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
				Subtotal	**$ 1.335.094,00**

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
7						
					Subtotal	**$ 0,00**
					Total Costo Directo	**$ 1.335.094,00**

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 01 ABR 2024

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12508

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

PRECIOS DE REFRENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

1.1 PERSONAL PROFESIONAL						
CÓDIGO	TIPO	CATEGORÍA	TARIFA MÁXIMA MENSUAL	VALOR DÍA	PROFESIONAL (AÑOS)	EXPERIENCA ESPECÍFICA (AÑOS)
T01	PROFESIONAL	1	$ 14.586.156,00	$ 486.205,00	Mínimo 12	Mínimo 10
T02	PROFESIONAL	2	$ 11.114.805,00	$ 370.494,00	Mínimo 10	Mínimo 7
T03	PROFESIONAL	3	$ 9.381.445,00	$ 312.715,00	Mínimo 8	Mínimo 5
T04	PROFESIONAL	4	$ 7.989.201,00	$ 266.307,00	Mínimo 6	Mínimo 4
T05	PROFESIONAL	5	$ 7.203.555,00	$ 240.119,00	Mínimo 4	Mínimo 3
T06	PROFESIONAL	6	$ 6.424.083,00	$ 214.136,00	Mínimo 3	Mínimo 1
T07	PROFESIONAL	7	$ 4.857.422,00	$ 161.914,00	Mínimo 2	
T08	PROFESIONAL	8	$ 4.584.221,00	$ 152.807,00	Mínimo 1	

Estudios de posgrado con título		
NIVEL DE ESTUDIOS	Exp. Profesional (años)	Exp. Especifica (años)
ESPECIALIZACIÓN	2	1,0
MAESTRÍA	3	1,5
DOCTORADO	4	2

T41

1.2 PERSONAL TECNICO, AUXILIAR Y ADMINSTRATIVO					
CÓDIGO GRUPO	GRUPO	CÓDIGO	TIPO	TARIFA MÁXIMA MENSUAL	VALOR DÍA
401	Oficial	T09	OFICIAL	$ 2.001.596,00	$ 66.720,00
401	Oficial	T10	PLOMERO ELECTRICISTA	$ 2.333.803,00	$ 77.793,00
402	Ayudante	T11	AYUDANTE	$ 1.335.094,00	$ 44.503,00
405	Profesional	T12	ADMINISTRADOR	$ 3.950.959,00	$ 131.699,00
406	Técnico	T13	TECNOLOGO EN AREAS DE INGENIERIA	$ 4.067.962,00	$ 135.599,00
406	Técnico	T14	AUXILIAR DE INGENIERIA	$ 3.576.966,00	$ 119.232,00
406	Técnico	T15	LABORATORISTA INSPECTOR	$ 3.758.739,00	$ 125.291,00
406	Técnico	T16	LABORATORISTA AUXILIAR	$ 2.630.491,00	$ 87.683,00
406	Técnico	T17	OPERADOR EQUIPO PERFORACION	$ 3.376.389,00	$ 112.546,00
406	Técnico	T18	OPERARIO	$ 2.668.099,00	$ 88.937,00
406	Técnico	T19	OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO	$ 2.256.498,00	$ 75.217,00
406	Técnico	T20	INSPECTOR 1	$ 3.085.968,00	$ 102.866,00
406	Técnico	T21	INSPECTOR 2	$ 2.778.835,00	$ 92.628,00
406	Técnico	T22	BATIMETRISTA INSPECTOR	$ 4.239.290,00	$ 141.310,00
406	Técnico	T23	BATIMETRISTA AUXILIAR	$ 3.478.767,00	$ 115.959,00
406	Técnico	T24	AUXILIAR ADMIN - ALMACENISTA	$ 2.818.532,00	$ 93.951,00
406	Técnico	T25	SECRETARIA	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
406	Técnico	T26	SECRETARIA 1	$ 2.289.927,00	$ 76.331,00
406	Técnico	T27	SECRETARIA 2	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
408	Maestro	T28	MAESTRO DE OBRA	$ 4.003.192,00	$ 133.440,00
409	Conductor	T29	CONDUCTOR	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
409	Conductor	T30	MOTORISTA	$ 1.907.575,00	$ 63.586,00
410	Vigilante de obra	T31	CELADOR ARMADO*	$ 13.031.915,00	$ 434.397,00
412	Comisión topográfica	T32	TOPOGRAFO INSPECTOR	$ 4.239.290,00	$ 141.310,00
412	Comisión topográfica	T33	TOPOGRAFO AUXILIAR	$ 3.478.767,00	$ 115.959,00
412	Comisión topográfica	T34	CADENERO 1	$ 2.630.491,00	$ 87.683,00
412	Comisión topográfica	T35	CADENERO 2	$ 2.289.927,00	$ 76.331,00
414	Otra Mano de obra	T36	DIBUJANTE 1	$ 3.750.382,00	$ 125.013,00
414	Otra Mano de obra	T37	DIBUJANTE 2	$ 3.031.645,00	$ 101.055,00

*24 HORAS POR 30 DIAS DIVIDIDOS EN 3 TURNOS DE 8 HORAS DIARIAS INCLUYE PRESTACIONES DE LEY, ADMINISTRACION Y SERVICIOS SEGÚN RESOLUCION 224 DE 2008 SUPERVIGILANCIA CISCULAR EXTERNA 0435 DE DIC 30 DE 2014 TARIFAS 2015 CELADURIA PARA (3) TURNOS

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

12509

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA - PAGA

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	19/04/2024 a 20/08/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL", "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 24.039.734.150,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	0250 DE 2023
NIT:	901.666.148-8	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	gerencia@camelingenieria.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	251-2023

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha		OBRA EJECUTADA						
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
PMA 1	**PERSONAL**												
PMA 1.1	AYUDANTE	MES	$ 1.335.094,00	$ 21.361.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,84	$ 17.924.596,36	0,84	$ 17.924.596,36	83,91%
	SUBTOTAL			**$ 21.361.504,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 17.924.596,36**		**$ 17.924.596,36**	
PMA 2	**MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES**												
PMA 2.1	SERVICIO DE BAÑOS	MES	$ 700.000,00	$ 10.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,97	$ 10.144.618,96	0,97	$ 10.144.618,96	96,62%
	SUBTOTAL			**$ 10.500.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 10.144.618,96**		**$ 10.144.618,96**	
PMA 3	**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES**												
PMA 3.1	SERVICIO DE ASEO	MES	$ 40.000,00	$ 200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,73	$ 146.000,00	0,73	$ 146.000,00	73,00%
PMA 3.2	KIT DE DERRAME	UND	$ 165.000,00	$ 495.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 495.000,00	1,00	$ 495.000,00	100,00%
	SUBTOTAL			**$ 200.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 641.000,00**		**$ 641.000,00**	
PMA 4	**BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS**												
PMA 4.1	APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND	$ 7.951.552,00	$ 7.951.552,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
PMA 4.2	COMPENSACION FORESTAL	UND	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
	SUBTOTAL			**$ 27.951.552,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
PMA 5	**ATENCION A LA COMUNIDAD**												
PMA 5.1	OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	MES	$ 1.800.000,00	$ 12.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,78	$ 9.774.704,36	0,78	$ 9.774.704,36	77,58%
	SUBTOTAL			**$ 12.500.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 9.774.704,36**		**$ 9.774.704,36**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS			**$ 72.613.056,0**		**$ -**		**$ -**		**$ 38.484.919,68**		**$ 38.484.919,68**	
	VALOR TOTAL PAGA			**$ 72.613.056,0**		**$ -**		**$ -**		**$ 38.484.919,68**		**$ 38.484.919,68**	

CONDICIONES GENERALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			RELACIÓN DE ACTAS	NETO PARCIAL
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 72.613.056,00			
VALOR ADICIONAL				
VALOR TOTAL	$ 72.613.056,00		$ -	
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 72.613.056,00			
ANTICIPO 0%	$ -			
PRESENTE ACTA	$ 38.484.919,68	PRESENTE ACTA	$ 38.484.919,68	$ 38.484.919,68
ACUMULADO	$ 38.484.919,68	TOTALES	$ 38.484.919,68	$ 38.484.919,68

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12890

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA - PAGA

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	38.484.919,68	53,00
POR EJECUTAR	$	34.128.136,32	47,00
TOTALES	$	72.613.056,00	100,00

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 20211301010978 (Registro Presupuestal No. 1002-2,3,24,02,0600,134,00 AR de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ -		$ -
		$ -	$ -	$ -
1	PRESENTE ACTA	$ 38.484.919,68	$ 38.484.919,68	$ 38.484.919,68
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 34.128.136,32		$ 72.613.056,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

NOTAS
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.666.148-8 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°0775 DE 2022 representado legalmente por la Union Temporal o Consorcio HALCON , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____ NO X.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el dia: 20 SET. 2024

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma: Paola Andrea
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 215835-T

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma: alejandra
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 189921-T

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

16821

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 03

CAPITULO:	PMA 1 - PERSONAL	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMA 1.1	AYUDANTE	MES

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION				
	MES	VALOR MES	%		TOTAL
AYUDANTE 1	SEPTIEMBRE	$ 1.335.094,00	54,39%		$ 726.130,56
AYUDANTE 1	OCTUBRE	$ 1.335.094,00	93,13%		$ 1.243.379,00
AYUDANTE 1	NOVIEMBRE	$ 1.335.094,00	95,05%		$ 1.269.052,80
AYUDANTE 1	DICIEMBRE	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
AYUDANTE 1	ENERO	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
AYUDANTE 2	ENERO	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
AYUDANTE 2	FEBRERO	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
AYUDANTE 1	MARZO	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
AYUDANTE 2	MARZO	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
AYUDANTE 1	ABRIL	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
AYUDANTE 2	ABRIL	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
AYUDANTE 1	MAYO	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
AYUDANTE 2	MAYO	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
AYUDANTE 2	JULIO	$ 1.335.094,00	100,00%		$ 1.335.094,00
PASAN:				SUBTOTAL	$ 17.924.596,36
				TOTAL	$ 17.924.596,36

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12542

SEPTIEMBRE 2023					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	BRAYAN STEVEN RAMIREZ PARRA	1006795098	$ 1.207.806,00	$ 726.130,56
SUBTOTAL					**$ 726.130,56**
OCTUBRE 2023					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	BRAYAN STEVEN RAMIREZ PARRA	1006795098	$ 1.335.094,00	$ 1.243.379,00
SUBTOTAL					**$ 1.243.379,00**
NOVIEMBRE 2023					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	EFREY AYALA FRANCO	17422791	$ 1.335.094,00	$ 1.269.052,80
SUBTOTAL					**$ 1.269.052,80**
DICIEMBRE2023					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	EFREY AYALA FRANCO	17422791	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 1.335.094,00**
ENERO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	EFREY AYALA FRANCO	17422791	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	AYUDANTE 2	MARLIUN SOSA SOSSA	1007166728	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 2.670.188,00**
FEBRERO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	EFREY AYALA FRANCO	17422791	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 1.335.094,00**
MARZO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	EFREY AYALA FRANCO	17422791	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	AYUDANTE 2	MARLIUN SOSA SOSSA	1007166728	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 2.670.188,00**
ABRIL 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	EFREY AYALA FRANCO	17422791	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	AYUDANTE 2	MARLIUN SOSA SOSSA	1007166728	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 2.670.188,00**
MAYO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	EFREY AYALA FRANCO	17422791	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
PAGO NOMINA	AYUDANTE 2	MARLIUN SOSA SOSSA	1007166728	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 2.670.188,00**
JULIO 2024					
DESCRIPCION	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COBRADO**
PAGO NOMINA	AYUDANTE 1	MARLIUN SOSA SOSSA	1007166728	$ 1.335.094,00	$ 1.335.094,00
SUBTOTAL					**$ 1.335.094,00**
TOTAL					**$ 17.924.596,36**

FIRMA:

PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
Contador de Obra
MP: 215835-T
Consorcio Halcon

FIRMA APROBÓ:

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador de Interventoría
MP: 189521-T
Consorcio Inter AIM

12593

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2023/09/01 - 2023/09/30**
Comprobante Número:**302**

Nombre: **BRAYAN STEVEN RAMIREZ PARRA**
Identificación: **1006795098**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	$ 46,400.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 46,400.00
Total Ingresos		**$ 1,300,606.00**	**Total Deducciones**		**$ 92,800.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,207,806.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12594

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: 2023/10/01 - 2023/10/30
Comprobante Número: 361

Nombre: BRAYAN STEVEN RAMIREZ PARRA
Identificación: 1006795098
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Salario básico: $1,160,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	$ 47,947.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 47,947.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 38,667.00			
Total Ingresos		$ 1,339,273.00	Total Deducciones		$ 95,894.00

NETO A PAGAR	$ 1,243,379.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1295

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2023/11/01 - 2023/11/30**
Comprobante Número: **1257**

Nombre: **EFREY AYALA FRANCO**
Identificación: **17422791**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,160,000.00	Fondo de salud	0	$ 54,100.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 140,606.00	Fondo de pensión	0	$ 54,100.00
Horas extras diurnas 125%	16.00	$ 98,723.00			
Hora extra recargo dominical o festivo	8.00	$ 69,106.00			
Horas extras nocturnas dominical o festiva	2.00	$ 24,681.00			
Total Ingresos		**$ 1,493,116.00**	**Total Deducciones**		**$ 108,200.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,384,916.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1596

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2023/12/01 - 2023/12/30**
Comprobante Número:**1584**

Nombre: **EFREY AYALA FRANCO**
Identificación: **17422791**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,160,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	28.00	$ 1,082,667.00	Fondo de salud	0	$ 49,372.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	28.00	$ 131,232.00	Fondo de pensión	0	$ 49,372.00
Prima de servicios	0.00	$ 273,147.00			
Horas extras diurnas 125%	11.00	$ 67,872.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 38,667.00			
Vacaciones disfrutadas	1.00	$ 40,048.00			
Total Ingresos		**$ 1,633,633.00**	**Total Deducciones**		**$ 98,744.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1 dias por valor de $ 38,667.00

NETO A PAGAR	**$ 1,534,889.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12897

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/01/01 - 2024/01/30**
Comprobante Número:**1661**

Nombre: **EFREY AYALA FRANCO**
Identificación: **17422791**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	28.00	$ 1,213,333.00	Fondo de salud	0	$ 57,808.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	28.00	$ 151,200.00	Fondo de pensión	0	$ 57,808.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 6,118.00			
Horas extras diurnas 125%	21.00	$ 145,213.00			
Vacaciones disfrutadas	1.00	$ 44,881.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,604,078.00**	**Total Deducciones**		**$ 115,616.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1 dias por valor de $ 43,333.00

NETO A PAGAR	**$ 1,488,462.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1259

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/01/01 - 2024/01/30**
Comprobante Número:**1663**

Nombre: **MARLIUN SOSA SOSSA**
Identificación: **1007166728**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	27.00	$ 1,170,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	27.00	$ 145,800.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 6,647.00
Vacaciones disfrutadas	1.00	$ 44,828.00
Horas extras diurnas 125%	21.00	$ 145,213.00
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	2.00	$ 86,667.00
Total Ingresos		**$ 1,642,488.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 59,735.00
Fondo de pensión	0	$ 59,735.00
Total Deducciones		**$ 119,470.00**

NETO A PAGAR	$ 1,523,018.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

h599

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/02/01 - 2024/02/29**
Comprobante Número:**1937**

Nombre: **EFREY AYALA FRANCO**
Identificación: **17422791**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,574.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 60,574.00
Horas extras diurnas 125%	31.00	$ 214,362.00	Dia 30 febrero	0	$ 43,334.00
Total Ingresos		**$ 1,676,362.00**	**Total Deducciones**		**$ 164,482.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,511,880.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12800

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/03/01 - 2024/03/30**
Comprobante Número:**2330**

Nombre: **EFREY AYALA FRANCO**
Identificación: **17422791**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,256,667.00	Fondo de salud	0	$ 55,319.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 156,600.00	Fondo de pensión	0	$ 55,319.00
Horas extras diurnas 125%	12.00	$ 82,979.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,539,579.00**	**Total Deducciones**		**$ 110,638.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1 dias por valor de $ 43,333.00

NETO A PAGAR	**$ 1,428,941.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12601

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/03/01 - 2024/03/30**
Comprobante Número:**2332**

Nombre: **MARLIUN SOSA SOSSA**
Identificación: **1007166728**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,256,667.00	Fondo de salud	0	$ 55,596.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 156,600.00	Fondo de pensión	0	$ 55,596.00
Horas extras diurnas 125%	13.00	$ 89,894.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,546,494.00**	**Total Deducciones**		**$ 111,192.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1 dias por valor de $ 43,333.00

NETO A PAGAR	**$ 1,435,302.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12602

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/04/01 - 2024/04/30**
Comprobante Número:**2632**

Nombre: **EFREY AYALA FRANCO**
Identificación: **17422791**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 52,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 52,000.00
Total Ingresos		**$ 1,462,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 104,000.00**

NETO A PAGAR	$ 1,358,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12603

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/04/01 - 2024/04/30**
Comprobante Número:**2634**

Nombre: **MARLIUN SOSA SOSSA**
Identificación: **1007166728**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,256,667.00	Fondo de salud	0	$ 53,106.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 156,600.00	Fondo de pensión	0	$ 53,106.00
Horas extras diurnas 125%	4.00	$ 27,660.00			
Incapacidad por enfermedad general al 100%	1.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,484,260.00**	**Total Deducciones**		**$ 106,212.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,378,048.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

12604

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/05/01 - 2024/05/30**
Comprobante Número:**3031**

Nombre: **EFREY AYALA FRANCO**
Identificación: **17422791**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,256,667.00	Fondo de salud	0	$ 58,638.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 156,600.00	Fondo de pensión	0	$ 58,638.00
Horas extras diurnas 125%	24.00	$ 165,957.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,622,557.00**	**Total Deducciones**		**$ 117,276.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1 dias por valor de $ 43,333.00

NETO A PAGAR	**$ 1,505,281.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1260S

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/05/01 - 2024/05/30**
Comprobante Número:**3033**

Nombre: **MARLIUN SOSA SOSSA**
Identificación: **1007166728**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,256,667.00	Fondo de salud	0	$ 58,196.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 156,600.00	Fondo de pensión	0	$ 58,196.00
Horas extras diurnas 125%	16.00	$ 110,638.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Licencia por luto	1.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,610,571.00**	**Total Deducciones**		**$ 116,392.00**

NETO A PAGAR	$ 1,494,179.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

2606

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
Nit 901666148

Periodo de Pago: **2024/07/01 - 2024/07/30**
Comprobante Número:**3963**

Nombre: **MARLIUN SOSA SOSSA**
Identificación: **1007166728**
Cargo: **AYUDANTE DE OBRA**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	29.00	$ 1,256,667.00	Fondo de salud	0	$ 53,383.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	29.00	$ 156,600.00	Fondo de pensión	0	$ 53,383.00
Horas extras diurnas 125%	5.00	$ 34,574.00			
DIA 31 DEL PERSONAL	0.00	$ 43,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,491,174.00**	**Total Deducciones**		**$ 106,766.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1 dias por valor de $ 43,333.00

NETO A PAGAR	**$ 1,384,408.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

1260

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**Parcial N° 03**		

CAPITULO:	**PMA 2 - MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
PMA 2.1	**SERVICIO DE BAÑOS**	**MES**

DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCION**				
	MES	**VALOR MES**	**CANTIDAD**	**% COBRADO**	**TOTAL**
SERVICIO DE BAÑOS	NOVIEMBRE	$ 700.000,00	3,00	100%	$ 2.100.000,00
SERVICIO DE BAÑOS	FEBRERO	$ 700.000,00	2,00	84%	$ 1.176.000,00
SERVICIO DE BAÑOS	MARZO	$ 700.000,00	2,00	69%	$ 960.464,80
SERVICIO DE BAÑOS	ABRIL	$ 700.000,00	2,00	69%	$ 960.464,80
SERVICIO DE BAÑOS	MAYO	$ 700.000,00	2,00	84%	$ 1.176.000,00
SERVICIO DE BAÑOS	JUNIO	$ 700.000,00	2,00	150%	$ 2.100.000,00
SERVICIO DE BAÑOS	JULIO	$ 700.000,00	3,00	80%	$ 1.671.689,36
PASAN:				**SUBTOTAL**	$ 10.144.618,96
				TOTAL	$ 10.144.618,96

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12608

MES	DESCRIPCIÓN	No. TRANSACCION	EMPRESA	VALOR COBRADO
NOVIEMBRE 2023	SERVICIO DE BAÑOS	710A32123331015X	TRANSPORTES BCS	$ 590.400,00
		710A32123331015Z	TRANSPORTES BCS	$ 590.400,00
		710A32123331015Y	TRANSPORTES BCS	$ 919.200,00
FEBRERO 2024	SERVICIO DE BAÑOS	710A3212404700E5	TRANSPORTES BCS	$ 1.176.000,00
MARZO 2024	SERVICIO DE BAÑOS	710A321240610166	TRANSPORTES BCS	$ 960.464,80
ABRIL 2024	SERVICIO DE BAÑOS	710A32124068000G	TRANSPORTES BCS	$ 960.464,80
MAYO 2024	SERVICIO DE BAÑOS	710A32124068000H	TRANSPORTES BCS	$ 1.176.000,00
JUNIO 2024	SERVICIO DE BAÑOS	710A3212407200E2	TRANSPORTES BCS	$ 2.100.000,00
JULIO 2024	SERVICIO DE BAÑOS	710A32124192018Z	TRANSPORTES BCS	$ 1.671.689,36
TOTAL				$ 10.144.618,96

FIRMA:

OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
Director de Obra
MP. 52202-81335
Consorcio Halcón

FIRMA APROBÓ:

MANUEL HUMBERTO CORREDOR C
Director de Interventoria
MP. 01194-0290
Consorcio Inter AIM

12609

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Hoy

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAISA ROLI OLARTE	**No. Producto**	89021366561
No. Identificación	11221229884	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	11
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/11/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/11/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$590,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A32123331015X
Estado	DEB	**Información**	TRANSP
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OX1004JXWO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12610

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Hoy

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAISA ROLI OLARTE	**No. Producto**	89021366561
No. Identificación	11221229884	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	12
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/11/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/11/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$590,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
VA	0	**No. Transacción**	710A32123331015Z
Estado	DEB	**Información**	TRANSP
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OX1004JXWO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12611

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Hoy

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAISA ROLI OLARTE	**No. Producto**	89021366561
No. Identificación	11221229884	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	11
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/11/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/11/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,180,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A32123331015Y
Estado	DEB	**Información**	TRANSP
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OX1004JXWO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12612

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/16 12:02

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAISA ROLY OLARTE
No. Identificación	1122122988
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	710857467
Fecha Pago/Débito	2024/02/16
Fecha Transacción	2024/02/16
Valor Transacción	$1,176,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OBO004QMNO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	89021366561
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	11
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	710A3212404700E5
Información Adicional	BCS SAS
Fecha Cobro	-
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

1263

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/07 10:54

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAISA ROLY OLARTE
No. Identificación	1122122988
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	710857467
Fecha Pago/Débito	2024/03/01
Fecha Transacción	2024/03/01
Valor Transacción	$1,176,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OCA004ITCO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Produ[illegible] Destino	89021366561
Entidad Fi[illegible]nciera	BANCOLOMBIA
No. Compr[illegible]ante	4
Forma de [illegible]go	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al be[illegible]ficiario	N
Estado de [illegible]iso	-
Fecha de A[illegible]so	-
Medio Util[illegible]do	-
No. Transa[illegible]ión	710A321240610166
Informaci[illegible] Adicional	BCS SAS
Fecha Cob[illegible]	2024/03/01
No. Factur[illegible]	-
Oficina Pa[illegible]	-
Usuario Cr[illegible]dor	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/08 10:00

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAISA ROLY OLARTE
No. Identificación	1122122988
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	710857467
Fecha Pago/Débito	2024/03/08
Fecha Transacción	2024/03/07
Valor Transacción	$1,136,016.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OCG004OEPN
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Produ Destino	89021366561
Entidad Fi nciera	BANCOLOMBIA
No. Compr ante	13
Forma de go	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al b ficiario	N
Estado de iso	-
Fecha de so	-
Medio Uti do	-
No. Trans ión	710A32124068000G
Informaci Adicional	BCS SAS
Fecha Cob	-
No. Factur	-
Oficina Pa	-
Usuario C dor	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

1261S

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/03/07	2024/03/08

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAISA ROLY OLARTE	**No. Producto**	89021366561
No. Identificación	1122122988	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	14
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/03/08	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/03/07	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,176,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A32124068000H
Estado	DEB	**Información**	BCS SAS
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCG004OEPN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

1261G

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/12 18:41

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAISA ROLY OLARTE
No. Identificación	1122122988
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	710857467
Fecha Pago/Débito	2024/03/12
Fecha Transacción	2024/03/12
Valor Transacción	$6,898,416.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OCK004SOCO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Produ Destino	89021366561
Entidad F nciera	BANCOLOMBIA
No. Comp ante	3
Forma de go	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al b ficiario	N
Estado de iso	-
Fecha de so	-
Medio Uti do	-
No. Trans ión	710A3212407200E2
Informac Adicional	BCS SAS
Fecha Co	-
No. Factur	-
Oficina Pa	-
Usuario C dor	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12617

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/07/10	2024/07/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAISA ROLY OLARTE	**No. Producto**	89021366561
No. Identificación	1122122988	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	63
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/07/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/07/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$4,885,135.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A321241920182
Estado	DEB	**Información**	TRANSP RESID MAYO BANOS
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OGJ004N4KO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ

12618

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**Parcial N° 03**
CAPITULO:	**PMA 3 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMA 3.1	**SERVICIO DE ASEO**	**MES**

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION				
	MES	VALOR MES	%		TOTAL
SERVICIO DE ASEO	ENERO 2024	$ 40.000,00	89,75%		$ 35.900,00
SERVICIO DE ASEO	FEBRERO 2024	$ 40.000,00	181,75%		$ 72.700,00
SERVICIO DE ASEO	ABRIL 2024	$ 40.000,00	93,50%		$ 37.400,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	$ 146.000,00
				TOTAL	$ 146.000,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12619

MES	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	EMPRESA	VALOR DESCUENTO PMT
ENERO 2024	SERVICIO DE ASEO	2009502699	AGUAS DE CASTILLA SA ESP	$ 35.900,00
FEBRERO 2024	SERVICIO DE ASEO	2009510092	AGUAS DE CASTILLA SA ESP	$ 72.700,00
ABRIL 2024	SERVICIO DE ASEO	2009513566	AGUAS DE CASTILLA SA ESP	$ 37.400,00
TOTAL DESCUENTO PMT				**$ 146.000,00**

FIRMA:

OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
Director de Obra
MP. 52202-81335
Consorcio Halcón

FIRMA APROBÓ:

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
Director de Interventoría
MP. 01194-0290
Consorcio Inter AIM

CREDIBANCO ES SU RED
CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS SIELCVNS

Banco de Bogotá
Cambiando Contigo
Banco Bogota

PUNTO DE SERVICIO
No.K 0000200054* DT00032 402000111336954701

AUTORIZACION NUMERO 111337
TRANS: 008505 01/02/2024 11:13:37
RECIBO: 004796 TER: 0000A3PT

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00017018 AGUAS DE CASTILLA SA ESP
FACTURA 4157709998611719802005043229390000
0003590096202401O9
VALOR: $ 35,900.00

TRANSACCION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: $0
NACIONAL DT 8000 518877

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN CASO DE RECLAMACION
COPIA CLIENTE
AUTOCAJA

AS DE CASTILLA SA ESP
ILLA LA NUEVA-META

CALLE 5 Nº 7-13 BARRIO CENTRO
3165250154-3164067747
aguasdecastillasa.esp@gmail.com

ON FCA SANTA ANA TURUY
000 Codigo Interno 5043229
Estrato UNICO

Lectura Actual		U
Lectura Anterior		0
Consumo Mes		U
0 6 0	PROMEDIO	0

CODIGO RUTA: 07023900

FACTURA No.: 2009502699

PERIODO DE FACTURACION
DICIEMBRE 2023

Fecha De Expedicion	21/12/2023
Primer Pago	02/01/2024
Segundo Pago	09/01/2024
Fecha Lectura	02/11/2023 - 02/12/2023
VALOR A PAGAR	**$35,900**

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor
Tipo de Consumo Aseo

ULTIMOS CONSUMOS

JUNIO 2023	0	SEPTIEMBRE 2023	0
JULIO 2023	0	OCTUBRE 2023	0
AGOSTO 2023	0	NOVIEMBRE 2023	0

Fecha Pago Anterior — Fecha Pago Actual

ACUEDUCTO

STO REAL	COSTO TOTAL	SUBSI-/APORTE(+)	SUB TOTAL
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00		0.00	0
icto			0

ALCANTARILLADO

OSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBSI-/APORTE(+)	SUB TOTAL
0.00	0.00		
0.00	0.00		
Cons Suntuario >22 0	0.00	0.00	
Cargo Fijo Alcantarillado	0.00		0.00

Subtotal Servicio de Alcantarillado 0

ASEO

Concepto	Valor	Tonelada De Residuos	Valor
CFT Costo Fijo Total	5.225	TFA Toneladas De Residuos Sordos Aprovechables Afor Por Susc	0.0000
CVNA Costo Variable De Residuos No Aprovechados	13.966	TFA Toneladas De Residuos Aprovechadas Afectadas Por Suscriptor	0.0000
CVA Costo Variable De Residuos Efectivamente Aprovechados	4.223	Incentivo Viat	510
TRN Tonelada De Residuos Solidos No Aprovechables Por	0.0510	Subsidio(-)	0
TRA Toneladas De Residuos Aprovechadas Por Suscr	0.0162	Contribucion(+)	76.50

Subtotal Servicio de Aseo 35,887

OTROS COBROS

Ajuste a la Centena $ 13

Total Otros Cobros	$ 13
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	35,887
TOTAL FACTURA	35,900

FECHA DE PAGO
SELLO

CANCELADO

FIRMA GERENTE

Conforme al articulo 140 de la Ley 142/1994 y la clausula 14 del contrato de condiciones uniformes establecidos los servicios seran suspendidos por el NO pago oportuno de la factura.

Señor usuario: De no recibir la factura reclame la misma en la oficina de servicios públicos. Lo anterior no lo exime del pago oportuno. #YoAhorroAgua

---

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: CONSORCIO HALCON

Direccion: CAMPAMENTO HALCON FCA SANTA ANA TURUY

Nit: 900258798-1

C. Catastral: 00000000000000000000

Uso: COMERCIAL Estrato: UNICO

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	0
Alcantarillado	0
Aseo	35,887
Otros	13

[MENSAJE2]

FORMA DE PAGO

Código Banco Cheque Nro Cuenta Nro Efectivo
Cheque

VALOR A PAGAR $35,900

FECHA DE PAGO

AGUAS DE CASTILLA SA ESP
CASTILLA LA NUEVA-META
Direccion:CALLE 5 Nº 7-13 BARRIO CENTRO
Celular:3165250154-3164067747
Correo:aguasdecastillasa.esp@gmail.com

TOTAL $35,900

VALOR A PAGAR	**$35,900**
Primer Pago	02/01/2024
Segundo Pago	09/01/2024
Codigo Interno	5043229
Ruta	07023900
Numero Factura	2009502699

SELLO DEL BANCO

(415)7709998611719(8020)05043229(3900)0000035900(96)20240109

14

AGUAS DE CASTILLA SA ESP
CASTILLA LA NUEVA-META

Aguas de Castilla

Direccion:CALLE 5 N° 7-13 BARRIO CENTRO
Celular:3165250154-3164067747
Correo:aguasdecastillasa.esp@gmail.com

Nit: 900258798-1

CODIGO RUTA:	FACTURA No.
07023900	2009510092

PERIODO DE FACTURACION
FEBRERO 2024

Fecha De Expedición: 27/02/2024
Primer Pago: PAGO INMEDIATO
Segundo Pago: PAGO INMEDIATO
Fecha Lectura: 02/01/2024 - 02/02/2024

VALOR A PAGAR $72,700

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: CONSORCIO HALCON
Direccion: CAMPAMENTO HALCON FCA SANTA ANA TURUY
C. Catastral: 00000000000000000000 Codigo Interno: 5043229
Uso: COMERCIAL Estrato: UNICO
Periodos de Atraso: 1

Lectura Actual	0
Lectura Anterior	0
Consumo M3	0
PROMEDIO	0

0 0 0 0 0 0 0

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-16	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Cons Complementario 16-32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Cons Suntuario >32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo Fijo Acueducto		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Acueducto					**0**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-16	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Cons Complementario 16-32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Cons Suntuario >32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo Fijo Alcantarillado		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**0**

ASEO

Concepto	Valor	Tonelada De Residuos	Valor
CFT Costo Fijo Total	5.225	TFN Toneladas De Residuos Solidos	0.0000

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:
Tipo de Consumo: Real

ULTIMOS CONSUMOS

AGOSTO 2023	0	NOVIEMBRE 2023	0
SEPTIEMBRE 2023	0	DICIEMBRE 2023	0
OCTUBRE 2023	0	ENERO 2024	0

Fecha Pago Anterior: Valor Pago Anterior: 0

OTROS COBROS

Deuda Anterior	36,000
Ajuste a la Centena	9
Recargos	180

CYBER CORDOBA
Nit. 31.021.545
Cel. 311 449 4552
CANCELADO

Total Otros Cobros	**$ 36,171**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**36,529**

1262

5

EMPRESAS PÚBLICAS DE CASTILLA LA NUEVA SA ESP
CASTILLA LA NUEVA-META

Direccion:CALLE 5 N° 7-13 BARRIO CENTRO
Celular:3165250154-3164067747
Correo:factura.aguasdecastillasa.esp@gmail.com

Nit: 900258798-1

CODIGO RUTA:	FACTURA No.
07023900	2009513566

PERIODO DE FACTURACION
MARZO 2024

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: CONSORCIO HALCON
Direccion: CAMPAMENTO HALCON FCA SANTA ANA TURUY
C. Catastral: 00000000000000000000 Codigo Interno: 5043229
Uso COMERCIAL Estrato: UNICO

Periodos de Atraso 0

Lectura Actual	0
Lectura Anterior	0
Consumo M3	0
PROMEDIO	0

0 0 0 0 0 0 0

Fecha De Expedición: 04/04/2024
Primer Pago: 08/04/2024
Segundo Pago: 10/04/2024
Fecha Lectura: 02/02/2024 - 02/03/2024
VALOR A PAGAR $37,400

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:
Tipo de Consumo Real

ULTIMOS CONSUMOS

SEPTIEMBRE 2023	0	DICIEMBRE 2023	0
OCTUBRE 2023	0	ENERO 2024	0
NOVIEMBRE 2023	0	FEBRERO 2024	0

Fecha Pago Anterior: 08/03/2024 Valor Pago Anterior: 72,700

OTROS COBROS

Ajuste a la Centena 45

CANCELADO
Nash Sanchez

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Cons Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Cons Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Acueducto		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Acueducto					**0**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Cons Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Cons Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Alcantarillado		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**0**

ASEO

Concepto	Valor	Tonelada De Residuos	Valor
CFT Costo Fijo Total	5,429	TFN Toneladas De Residuos Solidos Aprovechables Afor Por Susc	0.0000
CVNA Costo Variable De Residuos No Aprovechados	14,516	TFA Toneladas De Residuos Aprovechadas Aforadas Por Suscriptor	0.0000
CVA Costo Variable De Residuos Efectivamente Aprovechados	4,387	Incentivo Viat	572
TRN Tonelada De Residuos Solidos No Aprovechables Por	0.0510	Subsidio(-)	0
TRA Tonelada De Residuos Aprovechadas Por Suscr	0.0182	Contribucion(+)	% 50
Subtotal Servicio de Aseo			**37,355**

Total Otros Cobros	**$ 45**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**37,355**
TOTAL FACTURA	**37,400**

FECHA DE PAGO
SELLO

FIRMA GERENTE

Conforme al artículo 140 de la Ley 142/1994 y la cláusula 14 del contrato de condiciones uniformes establecidos los servicios serán suspendidos por el NO pago oportuno de la factura.

Señor usuario: De no recibir la factura reclame la misma en la oficina de servicios públicos. Lo anterior; no lo exime del pago oportuno. #YoAhorroAgua

1162

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**Parcial N° 03**
CAPITULO:	**PMA 3 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMA 3.2	**KIT DE DERRAME**	**UND**

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION				
	MES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% COBRADO	TOTAL
KIT DE DERRAME	ABRIL 2024	$ 165.000,00	1,00	100,00%	$ 165.000,00
KIT DE DERRAME	JULIO 2024	$ 165.000,00	2,00	100,00%	$ 330.000,00
PASAN:				SUBTOTAL	$ 495.000,00
				TOTAL	$ 495.000,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1262

MES	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	EMPRESA	VALOR DESCUENTO PMT
ABRIL 2024	KIT DE DERRAME	FV 2575	COLDIND	$ 165.000,00
JULIO 2024	KIT DE DERRAME	FE 23958	FERRETODO	$ 330.000,00
TOTAL DESCUENTO PMT				$ 495.000,00

FIRMA:

OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
Director de Obra
MP. 52202-81335
Consorcio Halcón

FIRMA APROBÓ:

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
Director de Interventoría
MP. 01194-0290
Consorcio Inter AIM

INVERSIONES COLDIND SAS
NIT 901.144.936-5
CRA 37 # 2 2 - 87
Tel: 6706321 - 3178789940
Villavicencio - Colombia
ventascoldind@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2575

Señores	CONSORCIO HALCÒN		
NIT	901.666.148-8	**Teléfono**	(608) 3106965106 - Ext. 000
Dirección	CR 5 24-50	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 16:24
Expedición	27/04/2024, 08:57
Vencimiento	19/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LB	2.00	68,907.56	26,184.87	160,554.62	2,5 %
2	KIT CONTROL DERRAME	1.00	205,882.35	39,117.65	239,852.94	2,5 %
3	BOTIQUIN TIPO B	2.00	285,714.29	108,571.43	665,714.29	2,5 %
4	CUELLO ORTOPEDICO TIPO AMBU ADULTO	1.00	37,815.13	7,184.87	44,054.62	2,5 %
5	CHALECOS REFLECTIVO NARANJA	10.00	10,084.03	19,159.66	117,478.99	2,5 %
6	CHALECOS REFLECTIVO VERDE	6.00	10,084.03	11,495.80	70,487.39	2,5 %
7	BOLSA JUMBO PAQUETE*6 COLOR NEGRA	24.00	5,462.18	24,907.56	152,722.69	2,5 %
8	BOLSA JUMBO PAQUETE*6 COLOR VERDE	24.00	5,462.18	24,907.56	152,722.69	2,5 %
9	BOLSA JUMBO PAQUETE*6 COLOR BLANCA	24.00	5,462.18	24,907.56	152,722.69	2,5 %
10	BOLSA JUMBO PAQUETE*6 COLOR ROJA	24.00	5,462.18	24,907.56	152,722.69	2,5 %

Total items: 10

Valor en Letras:
Un millón ochocientos noventa y nueve mil doscientos un pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
TRANSFERENCIA $ 1,899,201.68

Total Bruto	1,638,655.48
IVA 19%	311,344.52
Retefuente 2.5%	40,966.39
ReteICA 6.00	9,831.93
Total a Pagar	1,899,201.68

Observaciones:
Esta factura electronica tiene efectos de titulo valor de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable (Decreto 1349 de 2016; Art. 772 a 779 Codigo de Comercio.).

Favor realizar transferencia o consignar en la cuenta de Ahorros N°099170038394 Banco Davivienda a nombre de INVERSIONES COLDIND SAS, e informar su pago al telefono 3134829908-3178789940 o al Email: tesoreriacoldind@gmail.com.

"CAMBIOS POR TALLA, COLOR O MODELO SE REALIZAN HASTA 8 DIAS DESPUES DE LA COMPRA"
"MERCANCIA MARCADA, BORDADA, MODIFICADA O CON OJALES ABIERTOS NO TIENE CAMBIO"
"NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764050599646 aprobado en 20230617 prefijo FV desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa
CUFE: 658fc4e54ad868fc77962041536deeca7d5d124145d5d94beffffda5ee44e401e535f95c68757b222dce73c8a30cabf2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FERRETODO
PEDRO PINZÓN

JOSÉ ANTONIO FORERO PINZON
NIT: 97.601.540 - 8
Responsable de IVA
Carrera 33 32 06
Villavicencio - Meta
668 60 77 - 321 790 81 32
314 398 45 83
pedropinzon2013@hotmail.com
Tarifa ICA: 3 x 1000
Cód. CIIU: 4752

Nombre: CONSORCIO HALCÓN
Razon Social: CONSORCIO HALCÓN
Direccion: CR 5 24 50 **Ciudad:** YOPAL
Nit: 901666148-8 **Telefono:**
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:** 3106965106

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE -23958
Fecha Factura: 31/07/2023 12:00:0
Fecha Vencimiento: 31/07/2023
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	ASTRED	AVISOS SEÑALIZACION TRIPODE LAM. CAL.20 ANG 1"	UNIDAD	21.00	84,033.61	0.00	1,764,705.88	335,294.11	19	2,100,000.00
2	BARRNVA	BARRICADA NVA	UNIDAD	8.00	252,100.84	0.00	2,016,806.72	383,193.27	19	2,400,000.00
3	CPELI500	CINTA PELIGRO 500MTS AMARILLA	UNIDAD	5.00	16,806.72	0.00	84,033.61	15,966.38	19	100,000.00
4	PALS	PALETA SIGA-PARE 30CM	UNIDAD	4.00	12,605.04	0.00	50,420.16	9,579.83	19	60,000.00
5	COLOMBC	COLOMBINA NUEVA BASE CONICA	UNIDAD	40.00	31,932.77	0.00	1,277,310.92	242,689.07	19	1,520,000.00
6	BTTB	BOTIQUIN PARA OBRA TIPO B	UNIDAD	2.00	504,201.68	0.00	1,008,403.36	191,596.63	19	1,200,000.00
7	KD5GL	KIT DE DERRAME 10 GALONES	UNIDAD	2.00	138,655.46	0.00	277,310.92	52,689.07	19	330,000.00
8	PE56LTX4	PUNTO ECOLOGICO 53 LT X 3 CANECAS	UNIDAD	2.00	277,310.92	0.00	554,621.84	105,378.15	19	660,000.00

Son: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	7,033,613	1,336,386

Subtotal:	7,033,613
Descuentos:	0
Iva:	1,336,387
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	175,840
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	21,101
Total:	8,173,059

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

CUFE: 8a6486493ba20df49f0ec58d125a053cb45b4a6b94cb7cda5f0c259f987304c91b0d275f104d29b86fdc4530398f22a1

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	Consignar en la cuenta bancaria 041-9903-9429 CTA AHORRROS BANCOLOMBIA
No. 18764067491108 / 2024-03-18 vence 2024-09-18 de: FE 32658 - 50000	31/07/202316:40:28 Fecha de Validacion : 31/07/202316:40:28	CONSIGNACION : 8,173,05	

12627

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500214
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	**Parcial N° 03**
CAPITULO:	**PMA 5 - ATENCION A LA COMUNIDAD**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PMA 5.1	**OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD**	**MES**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	MES	VALOR MES	%		TOTAL
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	OCTUBRE 2023	$ 1.800.000,00	44,25%		$ 796.470,00
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	NOVIEMBRE 2023	$ 1.800.000,00	22,26%		$ 400.701,48
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	DICIEMBRE 2023	$ 1.800.000,00	75,00%		$ 1.350.000,00
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	DICIEMBRE 2023	$ 1.800.000,00	25,00%		$ 450.000,00
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	ENERO 2024	$ 1.800.000,00	91,71%		$ 1.650.695,36
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	FEBRERO 2024	$ 1.800.000,00	75,00%		$ 1.350.000,00
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	FEBRERO 2024	$ 1.800.000,00	23,50%		$ 422.989,36
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	MARZO 2024	$ 1.800.000,00	26,29%		$ 473.195,36
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	JUNIO 2024	$ 1.800.000,00	78,37%		$ 1.410.749,00
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	JUNIO 2024	$ 1.800.000,00	6,66%		$ 119.903,80
ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	JULIO 2024	$ 1.800.000,00	75,00%		$ 1.350.000,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	$ 9.774.704,36
				TOTAL	$ 9.774.704,36

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-81335

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-68176

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

12628

MES	DESCRIPCIÓN	No. TRANSACCION	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR DESCUENTO PMA
OCTUBRE 2023	ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A32123300005F	ALBEIRO RUBIANO	$ 796.470,00
NOVIEMBRE 2023	ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A32123300005E	ALBEIRO RUBIANO	$ 400.701,48
DICIEMBRE 2023	ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A32123325000B	JOSE MIGUEL GURANOPOLUS	$ 1.350.000,00
	ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A321233600059	JOSE MIGUEL GURANOPOLUS	$ 450.000,00
ENERO 2024	ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A321240040053	ABEL RUBIANO	$ 1.650.695,36
FEBRERO 2024	ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A321240540162	JOSE MIGUEL GURANOPOLUS	$ 1.350.000,00
		710A321240540163	JOSE MIGUEL GURANOPOLUS	$ 422.989,36
MARZO 2024	ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A321240820165	JOSE MIGUEL GURANOPOLUS	$ 473.195,36
JUNIO 2024	ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A3212413100SR	JOSE MIGUEL GURANOPOLUS	$ 1.410.749,00
		710A32124164000F	JOSE MIGUEL GURANOPOLUS	$ 119.903,80
JULIO 2024	ALQUILER OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	710A32124201000C	JOSE MIGUEL GURANOPOLUS	$ 1.350.000,00
TOTAL DESCUENTO PMT				**$ 9.774.704,36**

FIRMA:

OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
Director de Obra
MP. 52202-81335
Consorcio Halcón

FIRMA APROBÓ:

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
Director de Interventoría
MP. 01194-0290
Consorcio Inter AIM

12629

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Hoy

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALBEIRO RUBIANO	**No. Producto**	89054296461
No. Identificación	1123510173	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	14
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/10/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/10/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$796,470.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A3212330000SF
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OV1004L4AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12630

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Hoy

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALBEIRO RUBIANO	**No. Producto**	89054296461
No. Identificación	1123510173	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	13
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/10/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/10/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$796,470.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	710A3212330000SE
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OV1004L4AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

12631
