AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	116
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCÓN** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. **CONTRATO N° 775 22 PY 215-21 PARCIAL N°6 C1-2 C116**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
689	LISTA DE CHEQUEO	22219-22220
690	ACTA DE PAGO DE OBRA	22221-22225
691	MEMORIAS DE CALCULO	22226-22310
692	INFORME DE OBRA	22311-22372
693	BITACORA DE OBRA	22373-22404
694	INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA	22405-22436

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	775 22 PY 215-21 PARCIAL N°6 C1-2 C116

Firma		Firma	
Nombre:	OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	Nombre:	MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTORA INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	NO
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI ✓
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI ✓
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI ✓
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI ✓
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	SI ✓
FACTURA	-	SI ✓
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI ✓
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI ✓
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	SI
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22219

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	SI
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 25202-54802

Firma
Nombre: VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE INTERVENTORIA BPIN 2021005500215
M.P. 25202195831 CND

Firma
OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA PROYECTO BPIN 2021005500215
M.P. 25202-78801 CND

Firma
Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK
RESPONSABLE DEL ARCHIVO

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.220

CONSORCIO HALCÓN

ACTA PAGO DE OBRA

No. 15

72221

CONTRATO N:	0775 DE 2022	**PROYECTO N:**	2021005500215
ACTA DE PAGO PARCIAL N:	6	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	6/09/2024 a 10/10/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL", "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 30.157.618.869,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	0250 DE 2023
NIT:	901.666.148-8	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	gerencia@ingcalderon.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	239- 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	14 OCT 2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 1 de fecha 13 junio 2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	PRELIMINARES													
1.1	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	26,34	$ 2.907.481,00	$ 76.583.050,00	26,34	$ 76.583.050,00	26,34	$ 76.583.050,00	0,00	$ 0,00	26,34	$ 76.583.050,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 76.583.050		$ 76.583.050		$ 76.583.050		$ -		$ 76.583.050	
2	EXCAVACIONES													
2.1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	12.821,17	$ 53.067,00	$ 680.381.028,00	12.957,34	$ 687.607.039,00	12.901,60	$ 684.649.207,20	55,74	$ 2.957.831,80	12.957,34	$ 687.607.039,00	100,00%
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	3.738,47	$ 40.581,00	$ 151.710.851,00	3.738,47	$ 151.710.851,00	2.935,29	$ 119.117.003,49	675,74	$ 27.422.204,94	3.611,03	$ 146.539.208,43	96,59%
2.3	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2,00 M INCLUYE CARGUE LAMINAS DE ACERO INTERMEDIAS DE 3MM	M3	119,84	$ 80.432,00	$ 9.638.971,00	30,00	$ 2.412.960,00	30,00	$ 2.412.960,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 2.412.960,00	100,00%
2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	11.913,91	$ 8.287,00	$ 98.730.572,00	11.913,91	$ 98.730.572,00	11.888,64	$ 98.521.159,68	25,27	$ 209.412,32	11.913,91	$ 98.730.572,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 940.461.422,00		$ 940.461.422,00		$ 904.700.330,37		$ 30.589.449,06		$ 935.289.779,43	
3	MATERIAL GRANULAR Y RELLENOS													
3.1	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	28.713,43	$ 151.465,00	$ 4.349.079.675,00	28.713,43	$ 4.349.079.675,00	22.690,00	$ 3.467.033.850,00	4.360,00	$ 660.367.400,00	27.050,00	$ 4.127.421.250,00	94,90%
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	24.633,36	$ 42.956,00	$ 1.058.150.612,00	50.293,34	$ 2.160.400.902,00	49.539,20	$ 2.128.005.875,20	320,00	$ 13.745.920,00	49.859,20	$ 2.141.751.795,20	99,14%
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	2.783.182,90	$ 1.879,00	$ 5.229.600.669,00	2.196.567,53	$ 4.127.350.379,00	1.991.709,41	$ 3.742.421.981,39	204.858,12	$ 384.928.397,61	2.196.567,53	$ 4.127.350.379,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 10.636.830.956,00		$ 10.636.830.956,00		$ 9.337.461.706,59		$ 1.059.061.717,61		$ 10.396.523.424,20	
4	PAVIMENTO FLEXIBLE													
4.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	12.645,25	$ 948.657,00	$ 11.996.004.929,00	12.645,25	$ 11.996.004.929,00	9.355,20	$ 8.874.875.966,40	2.136,00	$ 2.026.331.352,00	11.491,20	$ 10.901.207.318,40	90,87%
4.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	171.237,76	$ 4.631,00	$ 793.002.067,00	171.237,76	$ 793.002.067,00	126.685,00	$ 586.678.235,00	28.925,00	$ 133.951.676,00	155.610,00	$ 720.629.910,00	90,87%
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	739.747,10	$ 2.155,00	$ 1.594.155.001,00	739.747,10	$ 1.594.155.001,00	521.452,66	$ 1.123.730.482,30	144.703,30	$ 311.835.611,50	666.155,96	$ 1.435.566.093,80	90,05%
	SUBTOTAL				$ 14.383.161.997,00		$ 14.383.161.997,00		$ 10.585.284.683,70		$ 2.472.118.638,50		$ 13.057.403.322,20	
5	SEÑALIZACIÓN													
5.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	61.389,62	$ 4.953,00	$ 304.062.788,00	61.389,62	$ 304.062.788,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
5.2	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA (ML) A=0.12 M INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	3.241,33	$ 17.182,00	$ 55.692.532,00	3.241,33	$ 55.692.532,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
5.3	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	8.878,00	$ 13.385,00	$ 118.832.030,00	8.878,00	$ 118.832.030,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
5.4	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	232,00	$ 358.541,00	$ 85.501.512,00	232,00	$ 85.501.512,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022				PROYECTO N°				2021005500215						
5.5	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	117,00	$ 361.403,00	$ 42.284.151,00	117,00	$ 42.284.151,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
	SUBTOTAL				$ 606.373.613,00		$ 606.373.613,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
6	ESTRUCTURAS DE DRENAJE														
6.1	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3	2.113,56	$ 87.925,00	$ 185.834.763,00	2.113,56	$ 185.834.763,00	1.860,12	$ 163.551.051,00	253,44	$ 22.283.712,00	2.113,56	$ 185.834.763,00	100,00%	
6.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	79,23	$ 373.501,00	$ 29.592.484,00	79,23	$ 29.592.484,00	79,23	$ 29.592.484,00	0,00	$ 0,00	79,23	$ 29.592.484,00	100,00%	
6.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	68,75	$ 678.916,00	$ 46.669.225,00	84,78	$ 64.049.800,00	76,78	$ 51.896.830,48	17,98	$ 12.152.969,52	84,76	$ 64.049.800,00	100,00%	
6.4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	75.288,32	$ 8.973,00	$ 675.562.095,00	88.606,83	$ 804.042.084,00	79.101,19	$ 673.882.977,87	13.824,85	$ 124.050.379,05	88.926,04	$ 797.933.356,92	99,24%	
6.5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.063,72	$ 1.137.025,00	$ 1.209.478.233,00	925,62	$ 1.052.450.695,00	809,34	$ 920.229.813,50	116,28	$ 132.210.881,50	925,62	$ 1.052.450.695,00	100,00%	
6.6	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	460,62	$ 81.012,00	$ 36.935.987,00	615,97	$ 49.900.961,00	518,39	$ 41.995.810,68	97,58	$ 7.905.150,32	615,97	$ 49.900.961,00	100,00%	
	SUBTOTAL				$ 2.185.870.787,00		$ 2.185.870.787,00		$ 1.881.158.967,83		$ 298.603.092,30		$ 2.179.762.069,92		
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
7.1	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	1.070,00	$ 220.942,00	$ 236.407.940,00	1.070,00	$ 236.407.940,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
7.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	120,00	$ 288.618,00	$ 34.633.920,00	120,00	$ 34.633.920,00	45,00	$ 12.987.720,00	45,00	$ 12.987.720,00	90,00	$ 25.975.440,00	75,00%	
	SUBTOTAL				$ 271.041.860,00		$ 271.041.860,00		$ 12.987.720,00		$ 12.987.720,00		$ 25.975.440,00		
8	URBANISMO														
	PRELIMINARES														
8.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.20 M	M3	201,91	$ 18.617,00	$ 3.758.958,00	201,91	$ 3.758.958,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
	SUBTOTAL				$ 3.758.958,00		$ 3.758.958,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
9	EXCAVACIONES Y RELLENOS														
9.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	605,74	$ 72.389,00	$ 43.848.913,00	605,74	$ 43.848.913,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
9.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	504,78	$ 124.750,00	$ 62.971.305,00	504,78	$ 62.971.305,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
	SUBTOTAL				$ 106.820.218,00		$ 106.820.218,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
10	ANDENES														
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	801,30	$ 131.102,00	$ 105.052.033,00	801,30	$ 105.052.033,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
10.2	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	56,09	$ 747.323,00	$ 41.917.347,00	56,09	$ 41.917.347,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
10.3	LOSETA A-50, 0.40X0.40X0.06 TIPO ICU.	M2	713,04	$ 147.975,00	$ 105.512.094,00	713,04	$ 105.512.094,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
10.4	LOSETA A-40, 600X200X600 MM	M2	160,26	$ 152.410,00	$ 24.425.227,00	160,26	$ 24.425.227,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO	UN	8,00	$ 127.230,00	$ 1.017.840,00	8,00	$ 1.017.840,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO	ML	12,00	$ 127.230,00	$ 1.526.760,00	12,00	$ 1.526.760,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
10.7	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 27" CLASE II NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	110,60	$ 682.741,00	$ 75.511.155,00	110,60	$ 75.511.155,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%	
	SUBTOTAL				$ 354.962.456,00		$ 354.962.456,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

11	MOBILIARIO															
11.1	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	11,00	$ 1.101.402,00	$ 12.115.422,00	11,00	$ 12.115.422,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
11.2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31 SUMINISTRO E INSTALACION	UN	16,00	$ 726.309,00	$ 11.524.944,00	16,00	$ 11.524.944,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
11.3	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 150W FABRICADA EN ALUMINIO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO 18.000 LUMENS 3000K/4000K/5000K/5700K CON FOTO CELDA COMPLETA SUMINISTRO E INSTALACION	UN	18,00	$ 2.639.429,00	$ 47.509.722,00	18,00	$ 47.509.722,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
11.4	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	2,34	$ 991.867,00	$ 2.320.969,00	2,34	$ 2.320.969,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 73.471.057,00		$ 73.471.057,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P.1			0,00	-		0,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
N.P.2			0,00	-		0,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
N.P.3			0,00	-		0,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS								$ 0,00		$ -		$ -	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 22.625.447.155,73		$ 22.625.447.155,73		$ 17.402.188.136,02		$ 2.866.753.836,20		$ 20.269.951.944,33	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				$ 6.108.870.732,05		$ 6.108.870.732,05		$ 4.698.860.796,73		$ 798.326.234,15		$ 5.497.187.030,88	
	IMPREVISTOS (0%)				$ -		$ -		$ 0,00		$ -		$ -	
	UTILIDAD (4%)				$ 905.017.886,23		$ 905.017.886,23		$ 696.127.525,44		$ 118.270.053,21		$ 814.396.078,65	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 7.013.888.618,27		$ 7.013.888.618,27		$ 5.394.988.322,17		$ 916.596.787,36		$ 6.311.585.109,53	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 29.639.335.774,00		$ 29.639.335.774,00		$ 22.798.176.458,19		$ 3.872.240.617,56		$ 26.671.337.075,75	
12	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA (INCLUYE IVA 19%)	UND	1,00	$ 317.314.146,00	$ 317.314.146,00	1,00	$ 317.314.146,00	0,91	$ 288.755.872,86	0,00	$ 0,00	0,91	$ 288.755.872,86	91,00%
13	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE IVA 19%)	UND	1,00	$ 200.968.969,00	$ 200.968.969,00	1,00	$ 200.968.969,00	0,91	$ 182.881.761,79	0,00	$ 0,00	0,91	$ 182.881.761,79	91,00%
	SUBTOTAL				$ 518.283.115,00		$ 518.283.115,00		$ 471.637.634,65		$ 0,00		$ 471.637.634,65	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 30.157.618.889,00		$ 30.157.618.889,00		$ 23.269.814.092,84		$ 3.872.240.617,56		$ 27.142.174.710,40	

CONDICIONES GENERALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 30.157.618.889,00	RELACION DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
VALOR ADICIONAL		ACTA 1	$ 5.097.732.836,26	$ 1.294.824.140,41	$ 3.802.908.695,85
VALOR TOTAL	$ 30.157.618.889,00	ACTA 2	$ 4.815.970.499,56	$ 1.223.247.980,03	$ 3.592.696.323,53
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 30.157.618.889,00	ACTA 3	$ 4.444.272.928,05	$ 1.128.845.877,72	$ 3.315.426.350,33
ANTICIPO	$ 7.660.055.197,81	ACTA 4	$ 4.421.816.769,34	$ 1.123.141.459,41	$ 3.298.675.309,93
PRESENTE ACTA	$ 3.873.360.617,56	ACTA 5	$ 4.490.057.149,63	$ 1.140.474.516,01	$ 3.349.582.633,62
ACUMULADO	$ 27.142.174.710,40	PRESENTE ACTA	$ 3.873.360.617,56	$ 1.749.502.418,23	$ 2.123.858.199,33
		TOTALES	$ 27.142.174.710,40	$ 7.660.035.197,81	$ 19.483.139.512,59

4.22.22

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N:	0775 DE 2022

PROYECTO N:	2021005500215

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 27.143.174.710,40	90,00%
POR EJECUTAR	$ 3.014.444.178,60	10,00%
POR AMORTIZAR	$ -	0,00%
TOTALES	$ 30.157.618.889,00	100,00%

RELACION DE PAGOS PROYECTO N: 2021005500215 (Registro Presupuestal No. 1602-23-24-07-0400-319-00 Adic 2021)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 7.660.035.197,81			$ 7.660.035.197,81
1	PAGO PARCIAL N° 1	$ 5.097.732.836,26	$ 1.294.824.140,41	$ 3.802.908.695,85	$ 11.462.943.893,66
2	PAGO PARCIAL N° 2	$ 4.815.933.409,56	$ 1.223.247.066,03	$ 3.592.686.323,53	$ 15.055.630.217,19
3	PAGO PARCIAL N° 3	$ 4.444.273.928,05	$ 1.128.845.577,72	$ 3.315.428.350,33	$ 18.371.058.567,52
4	PAGO PARCIAL N° 4	$ 4.421.816.769,34	$ 1.123.141.459,41	$ 3.298.675.309,93	$ 21.669.733.877,44
5	PAGO PARCIAL N° 5	$ 4.490.057.149,63	$ 1.140.474.516,01	$ 3.349.582.633,62	$ 25.019.316.511,07
	PRESENTE ACTA	$ 3.873.360.617,56	$ 1.749.502.418,23	$ 2.123.858.199,33	$ 27.143.174.710,40
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 3.014.444.178,60			$ 30.157.618.889,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE)

NOTAS:
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.666.148-8, cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N° 0775 de 2022 representado legalmente por el Consorcio HALCON, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha ____. NO X.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: 14 OCT. 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 66202-81335

Firma:
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 215835-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-54602

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA SANCHEROS
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189571-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

82 232

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

MEMORIAS DE CALCULO

22.226

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		
CAPITULO:	**EXCAVACIONES**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	**EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K20+000	K20+020	20,00	0,80	16,00
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K20+020	K20+040	20,00	0,90	18,00
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K20+040	K20+060	20,00	0,50	10,00
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K20+060	K20+080	20,00	0,48	9,60
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	K20+080	K20+100	20,00	0,106884569999894	2,13769139999788
PASAN:				**SUBTOTAL**	55,7376913999979
				TOTAL	55,7376913999979

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-885410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.224

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VIAS

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 20+000	K 20+020	20	0,80	16,00
K 20+020	K 20+040	20	0,90	18,00
K 20+040	K 20+060	20	0,50	10,00
K 20+060	K 20+080	20	0,48	9,60
K 20+080	K 20+100	20	0,106884569999894	2,13769139999788
		TOTAL		55,7376913999979

Nota: No se cobra el volumen total de la excavación mecanica para cajas vias, ya que el ítem queda sin cantidades disponibles para cobrar.

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERREA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

27226

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
EXCAVACION
TERRENO NATURAL

20+000.00




Material	Area	Vol.
EXCAVACIÓN	0.80	16.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+020.00




Material	Area	Vol.
EXCAVACIÓN	0.90	18.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+040.00




Material	Area	Vol.
EXCAVACIÓN	0.50	10.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+060.00



Material	Area	Vol.
EXCAVACIÓN	0.48	9.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

20+080.00



Material	Area	Vol.
EXCAVACIÓN	0.11	2.14
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERREA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

22.229

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		

CAPITULO:	EXCAVACIONES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ABSCISA	ANCHO	ALTO	LONGITUD	TOTAL
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 4X2 No 42 (MEDIO)	K20+260	6,10	3,65	5,30	118,00 ✓
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 4X2 No 45 (MEDIO)	K20+595	6,10	3,65	5,30	118,00 ✓
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 4X2 No 47	K21+055	6,10	3,65	10,60	236,01 ✓
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 2X1 No 59	K25+147	6,20	1,55	10,60	101,87 ✓
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 60	K25+520	3,10	1,55	10,60	50,93 ✓
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA BOX COULVERT DE 1X1 No 61	K26+165	3,10	1,55	10,60	50,93 ✓
PASAN:				SUBTOTAL	675,74 ✓
				TOTAL	675,74 ✓

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2230

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
K 20+260	**MEDIO CUERPO - BOX COULVERT DE 4X2 No 42**				
	6,10	3,65	5,3	1	118,00
K 20+595	**MEDIO CUERPO - BOX COULVERT DE 4X2 No 45**				
	6,10	3,65	5,3	1	118,00
K 21+055	**BOX COULVERT DE 1X1 No 47**				
	6,10	3,65	10,6	1	236,01
K 25+147	**BOX COULVERT DE 1X1 No 59**				
	6,20	1,55	10,6	1	101,87
K 25+520	**BOX COULVERT DE 1X1 No 60**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
K 26+165	**BOX COULVERT DE 4x2.5 No 61**				
	3,10	1,55	10,6	1	50,93
	TOTAL				675,74

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERREA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

22.231

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 06
CAPITULO:	**EXCAVACIONES**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.4	**TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**	**VJ/KM**

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	VIAJE 7M³	TOTAL
TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO	K20+260	K 18+761	1498,81	16,86	25,27
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO					
PASAN:				SUBTOTAL	25,27
				TOTAL	25,27

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.232

BOX CULVERT	TALUD	VOLUMEN	VIAJE 7M^3	DISTANCIA KM	TOTAL
K 20+260	K 18+761	118,00	16,86	1,498813	25,27
		TOTAL			25,27

Nota: No se cobra el volumen total de la excavación mecánica en conglomerado, ya que el ítem correspondiente al transporte del mismo queda sin cantidades disponibles para cobrar.

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERREA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL META", con código BPIN 2021005500215.

Que, por la naturaleza biodegradable de los materiales sobrantes de las actividades de excavación, siendo materiales que representan una oportunidad para su reutilización y conforme a lo establecido en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), específicamente en el programa Actividades Constructivas, **proyecto 3. Manejo y disposición final de escombros** en el que se manifiesta que "*los residuos de material orgánico proveniente de las actividades, debe ser separado con el fin de conservarlo para reutilizarlo en las actividades de restauración de áreas intervenidas y revegetalización final*", se llevó a cabo la disposición final de estos residuos, al borde del terraplén los cuales son utilizados para la protección, estabilización, restauración y revegetalización de taludes, específicamente en el tramo K18+500 al K19+500.

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia en un folio.

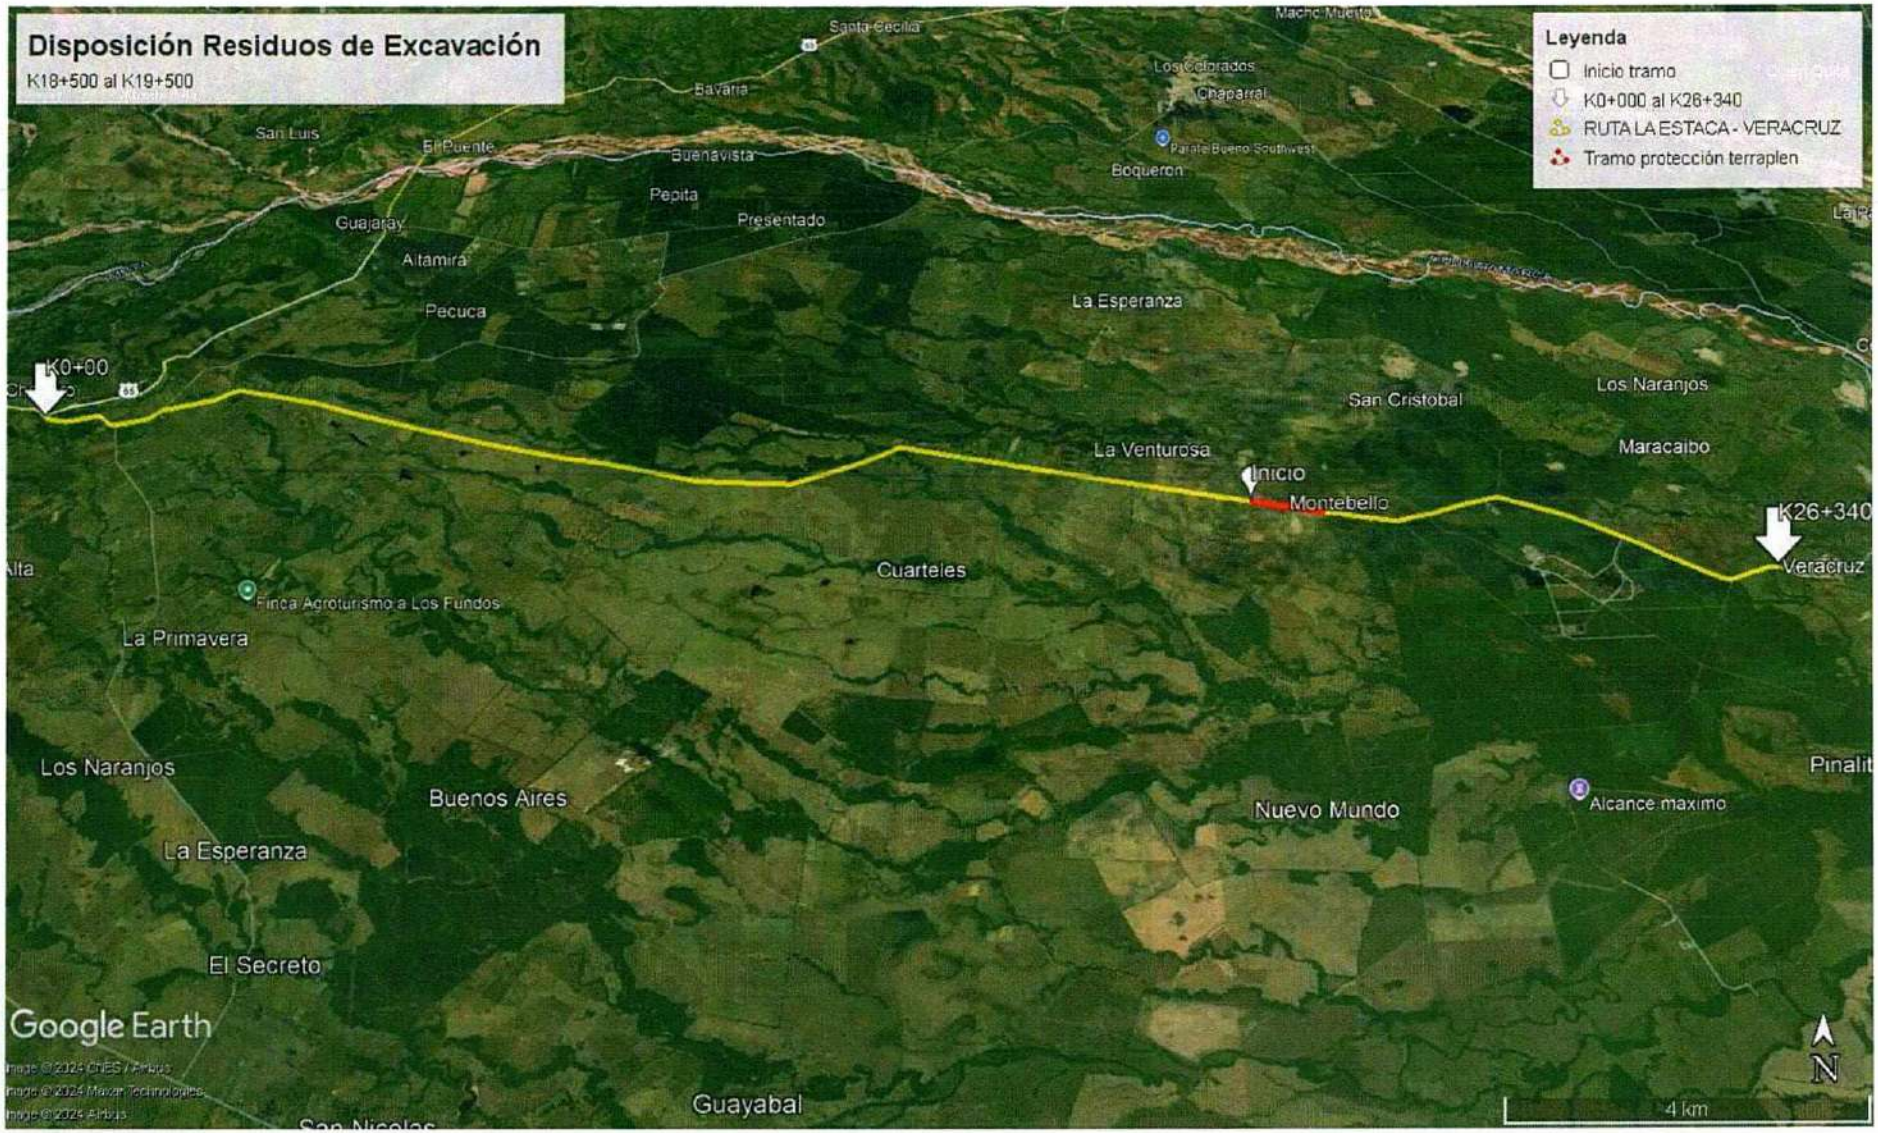
Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los diez (10) días del mes de octubre de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

Anexo: 1 Folio (Mapa fuente)

CONSORCIO INTER AIM



Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		
CAPITULO:	MATERIAL GRANULAR Y RELLENOS		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
3.1	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO,		M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 21+000	K 22+000	1000,00	1,09	1090,00
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 22+000	K 23+000	1000,00	1,09	1090,00
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 23+000	K 24+000	1000,00	1,09	1090,00
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	K 24+000	K 25+000	1000,00	1,09	1090,00
PASAN:				SUBTOTAL	4360,00
				TOTAL	4360,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

72236

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 21+000	K 21+020	20	1,09	21,80
K 21+020	K 21+040	20	1,09	21,80
K 21+040	K 21+060	20	1,09	21,80
K 21+060	K 21+080	20	1,09	21,80
K 21+080	K 21+100	20	1,09	21,80
K 21+100	K 21+120	20	1,09	21,80
K 21+120	K 21+140	20	1,09	21,80
K 21+140	K 21+160	20	1,09	21,80
K 21+160	K 21+180	20	1,09	21,80
K 21+180	K 21+200	20	1,09	21,80
K 21+200	K 21+220	20	1,09	21,80
K 21+220	K 21+240	20	1,09	21,80
K 21+240	K 21+260	20	1,09	21,80
K 21+260	K 21+280	20	1,09	21,80
K 21+280	K 21+300	20	1,09	21,80
K 21+300	K 21+320	20	1,09	21,80
K 21+320	K 21+340	20	1,09	21,80
K 21+340	K 21+360	20	1,09	21,80
K 21+360	K 21+380	20	1,09	21,80
K 21+380	K 21+400	20	1,09	21,80
K 21+400	K 21+420	20	1,09	21,80
K 21+420	K 21+440	20	1,09	21,80
K 21+440	K 21+460	20	1,09	21,80
K 21+460	K 21+480	20	1,09	21,80
K 21+480	K 21+500	20	1,09	21,80
K 21+500	K 21+520	20	1,09	21,80
K 21+520	K 21+540	20	1,09	21,80
K 21+540	K 21+560	20	1,09	21,80
K 21+560	K 21+580	20	1,09	21,80
K 21+580	K 21+600	20	1,09	21,80
K 21+600	K 21+620	20	1,09	21,80
K 21+620	K 21+640	20	1,09	21,80
K 21+640	K 21+660	20	1,09	21,80
K 21+660	K 21+680	20	1,09	21,80
K 21+680	K 21+700	20	1,09	21,80
K 21+700	K 21+720	20	1,09	21,80
K 21+720	K 21+740	20	1,09	21,80
K 21+740	K 21+760	20	1,09	21,80
K 21+760	K 21+780	20	1,09	21,80
K 21+780	K 21+800	20	1,09	21,80
K 21+800	K 21+820	20	1,09	21,80
K 21+820	K 21+840	20	1,09	21,80
K 21+840	K 21+860	20	1,09	21,80
K 21+860	K 21+880	20	1,09	21,80
K 21+880	K 21+900	20	1,09	21,80
K 21+900	K 21+920	20	1,09	21,80
K 21+920	K 21+940	20	1,09	21,80
K 21+940	K 21+960	20	1,09	21,80
K 21+960	K 21+980	20	1,09	21,80
K 21+980	K 22+000	20	1,09	21,80
K 22+000	K 22+020	20	1,09	21,80
K 22+020	K 22+040	20	1,09	21,80
K 22+040	K 22+060	20	1,09	21,80
K 22+060	K 22+080	20	1,09	21,80
K 22+080	K 22+100	20	1,09	21,80

22.237

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 22+100	K 22+120	20	1,09	21,80
K 22+120	K 22+140	20	1,09	21,80
K 22+140	K 22+160	20	1,09	21,80
K 22+160	K 22+180	20	1,09	21,80
K 22+180	K 22+200	20	1,09	21,80
K 22+200	K 22+220	20	1,09	21,80
K 22+220	K 22+240	20	1,09	21,80
K 22+240	K 22+260	20	1,09	21,80
K 22+260	K 22+280	20	1,09	21,80
K 22+280	K 22+300	20	1,09	21,80
K 22+300	K 22+320	20	1,09	21,80
K 22+320	K 22+340	20	1,09	21,80
K 22+340	K 22+360	20	1,09	21,80
K 22+360	K 22+380	20	1,09	21,80
K 22+380	K 22+400	20	1,09	21,80
K 22+400	K 22+420	20	1,09	21,80
K 22+420	K 22+440	20	1,09	21,80
K 22+440	K 22+460	20	1,09	21,80
K 22+460	K 22+480	20	1,09	21,80
K 22+480	K 22+500	20	1,09	21,80
K 22+500	K 22+520	20	1,09	21,80
K 22+520	K 22+540	20	1,09	21,80
K 22+540	K 22+560	20	1,09	21,80
K 22+560	K 22+580	20	1,09	21,80
K 22+580	K 22+600	20	1,09	21,80
K 22+600	K 22+620	20	1,09	21,80
K 22+620	K 22+640	20	1,09	21,80
K 22+640	K 22+660	20	1,09	21,80
K 22+660	K 22+680	20	1,09	21,80
K 22+680	K 22+700	20	1,09	21,80
K 22+700	K 22+720	20	1,09	21,80
K 22+720	K 22+740	20	1,09	21,80
K 22+740	K 22+760	20	1,09	21,80
K 22+760	K 22+780	20	1,09	21,80
K 22+780	K 22+800	20	1,09	21,80
K 22+800	K 22+820	20	1,09	21,80
K 22+820	K 22+840	20	1,09	21,80
K 22+840	K 22+860	20	1,09	21,80
K 22+860	K 22+880	20	1,09	21,80
K 22+880	K 22+900	20	1,09	21,80
K 22+900	K 22+920	20	1,09	21,80
K 22+920	K 22+940	20	1,09	21,80
K 22+940	K 22+960	20	1,09	21,80
K 22+960	K 22+980	20	1,09	21,80
K 22+980	K 23+000	20	1,09	21,80
K 23+000	K 23+020	20	1,09	21,80
K 23+020	K 23+040	20	1,09	21,80
K 23+040	K 23+060	20	1,09	21,80
K 23+060	K 23+080	20	1,09	21,80
K 23+080	K 23+100	20	1,09	21,80
K 23+100	K 23+120	20	1,09	21,80
K 23+120	K 23+140	20	1,09	21,80
K 23+140	K 23+160	20	1,09	21,80
K 23+160	K 23+180	20	1,09	21,80
K 23+180	K 23+200	20	1,09	21,80
K 23+200	K 23+220	20	1,09	21,80
K 23+220	K 23+240	20	1,09	21,80
K 23+240	K 23+260	20	1,09	21,80

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 23+260	K 23+280	20	1,09	21,80
K 23+280	K 23+300	20	1,09	21,80
K 23+300	K 23+320	20	1,09	21,80
K 23+320	K 23+340	20	1,09	21,80
K 23+340	K 23+360	20	1,09	21,80
K 23+360	K 23+380	20	1,09	21,80
K 23+380	K 23+400	20	1,09	21,80
K 23+400	K 23+420	20	1,09	21,80
K 23+420	K 23+440	20	1,09	21,80
K 23+440	K 23+460	20	1,09	21,80
K 23+460	K 23+480	20	1,09	21,80
K 23+480	K 23+500	20	1,09	21,80
K 23+500	K 23+520	20	1,09	21,80
K 23+520	K 23+540	20	1,09	21,80
K 23+540	K 23+560	20	1,09	21,80
K 23+560	K 23+580	20	1,09	21,80
K 23+580	K 23+600	20	1,09	21,80
K 23+600	K 23+620	20	1,09	21,80
K 23+620	K 23+640	20	1,09	21,80
K 23+640	K 23+660	20	1,09	21,80
K 23+660	K 23+680	20	1,09	21,80
K 23+680	K 23+700	20	1,09	21,80
K 23+700	K 23+720	20	1,09	21,80
K 23+720	K 23+740	20	1,09	21,80
K 23+740	K 23+760	20	1,09	21,80
K 23+760	K 23+780	20	1,09	21,80
K 23+780	K 23+800	20	1,09	21,80
K 23+800	K 23+820	20	1,09	21,80
K 23+820	K 23+840	20	1,09	21,80
K 23+840	K 23+860	20	1,09	21,80
K 23+860	K 23+880	20	1,09	21,80
K 23+880	K 23+900	20	1,09	21,80
K 23+900	K 23+920	20	1,09	21,80
K 23+920	K 23+940	20	1,09	21,80
K 23+940	K 23+960	20	1,09	21,80
K 23+960	K 23+980	20	1,09	21,80
K 23+980	K 24+000	20	1,09	21,80
K 24+000	K 24+020	20	1,09	21,80
K 24+020	K 24+040	20	1,09	21,80
K 24+040	K 24+060	20	1,09	21,80
K 24+060	K 24+080	20	1,09	21,80
K 24+080	K 24+100	20	1,09	21,80
K 24+100	K 24+120	20	1,09	21,80
K 24+120	K 24+140	20	1,09	21,80
K 24+140	K 24+160	20	1,09	21,80
K 24+160	K 24+180	20	1,09	21,80
K 24+180	K 24+200	20	1,09	21,80
K 24+200	K 24+220	20	1,09	21,80
K 24+220	K 24+240	20	1,09	21,80
K 24+240	K 24+260	20	1,09	21,80
K 24+260	K 24+280	20	1,09	21,80
K 24+280	K 24+300	20	1,09	21,80
K 24+300	K 24+320	20	1,09	21,80
K 24+320	K 24+340	20	1,09	21,80
K 24+340	K 24+360	20	1,09	21,80
K 24+360	K 24+380	20	1,09	21,80
K 24+380	K 24+400	20	1,09	21,80
K 24+400	K 24+420	20	1,09	21,80

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 24+420	K 24+440	20	1,09	21,80
K 24+440	K 24+460	20	1,09	21,80
K 24+460	K 24+480	20	1,09	21,80
K 24+480	K 24+500	20	1,09	21,80
K 24+500	K 24+520	20	1,09	21,80
K 24+520	K 24+540	20	1,09	21,80
K 24+540	K 24+560	20	1,09	21,80
K 24+560	K 24+580	20	1,09	21,80
K 24+580	K 24+600	20	1,09	21,80
K 24+600	K 24+620	20	1,09	21,80
K 24+620	K 24+640	20	1,09	21,80
K 24+640	K 24+660	20	1,09	21,80
K 24+660	K 24+680	20	1,09	21,80
K 24+680	K 24+700	20	1,09	21,80
K 24+700	K 24+720	20	1,09	21,80
K 24+720	K 24+740	20	1,09	21,80
K 24+740	K 24+760	20	1,09	21,80
K 24+760	K 24+780	20	1,09	21,80
K 24+780	K 24+800	20	1,09	21,80
K 24+800	K 24+820	20	1,09	21,80
K 24+820	K 24+840	20	1,09	21,80
K 24+840	K 24+860	20	1,09	21,80
K 24+860	K 24+880	20	1,09	21,80
K 24+880	K 24+900	20	1,09	21,80
K 24+900	K 24+920	20	1,09	21,80
K 24+920	K 24+940	20	1,09	21,80
K 24+940	K 24+960	20	1,09	21,80
K 24+960	K 24+980	20	1,09	21,80
K 24+980	K 25+000	20	1,09	21,80
	TOTAL			4360,00

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERREA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

22.240

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL META", con código BPIN 2021005500215.

Que la fuente de material utilizada para las actividades de **BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS,** proviene en una dosificación del 90% del **Río Guayuriba,** específicamente de la **Mina Las Mercedes,** perteneciente a la planta de agregados procesados de **Murcia Construcciones S.A.S.,** localizada en el municipio de Villavicencio. Esta fuente resulta ser más cercana que la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría y entregados por la **Agencia para la Infraestructura del Meta.** La fuente inicial fue la mina de **Agremet** del Río Guayuriba, situada a 79,60 km del centroide, mientras que la fuente actual y certificada en este documento se encuentra a **46 km** al inicio del proyecto en el punto **abs k0+00.**

La dosificación correspondiente al 10% restante proviene del **Río Guacavia,** específicamente de **La Cabaña,** localizada en el municipio de Cumaral, la cual se encuentra ubicada a 17,60 km del punto **abs k1+900,** de la vía en intervención sentido vía nacional 65 a Veracruz.

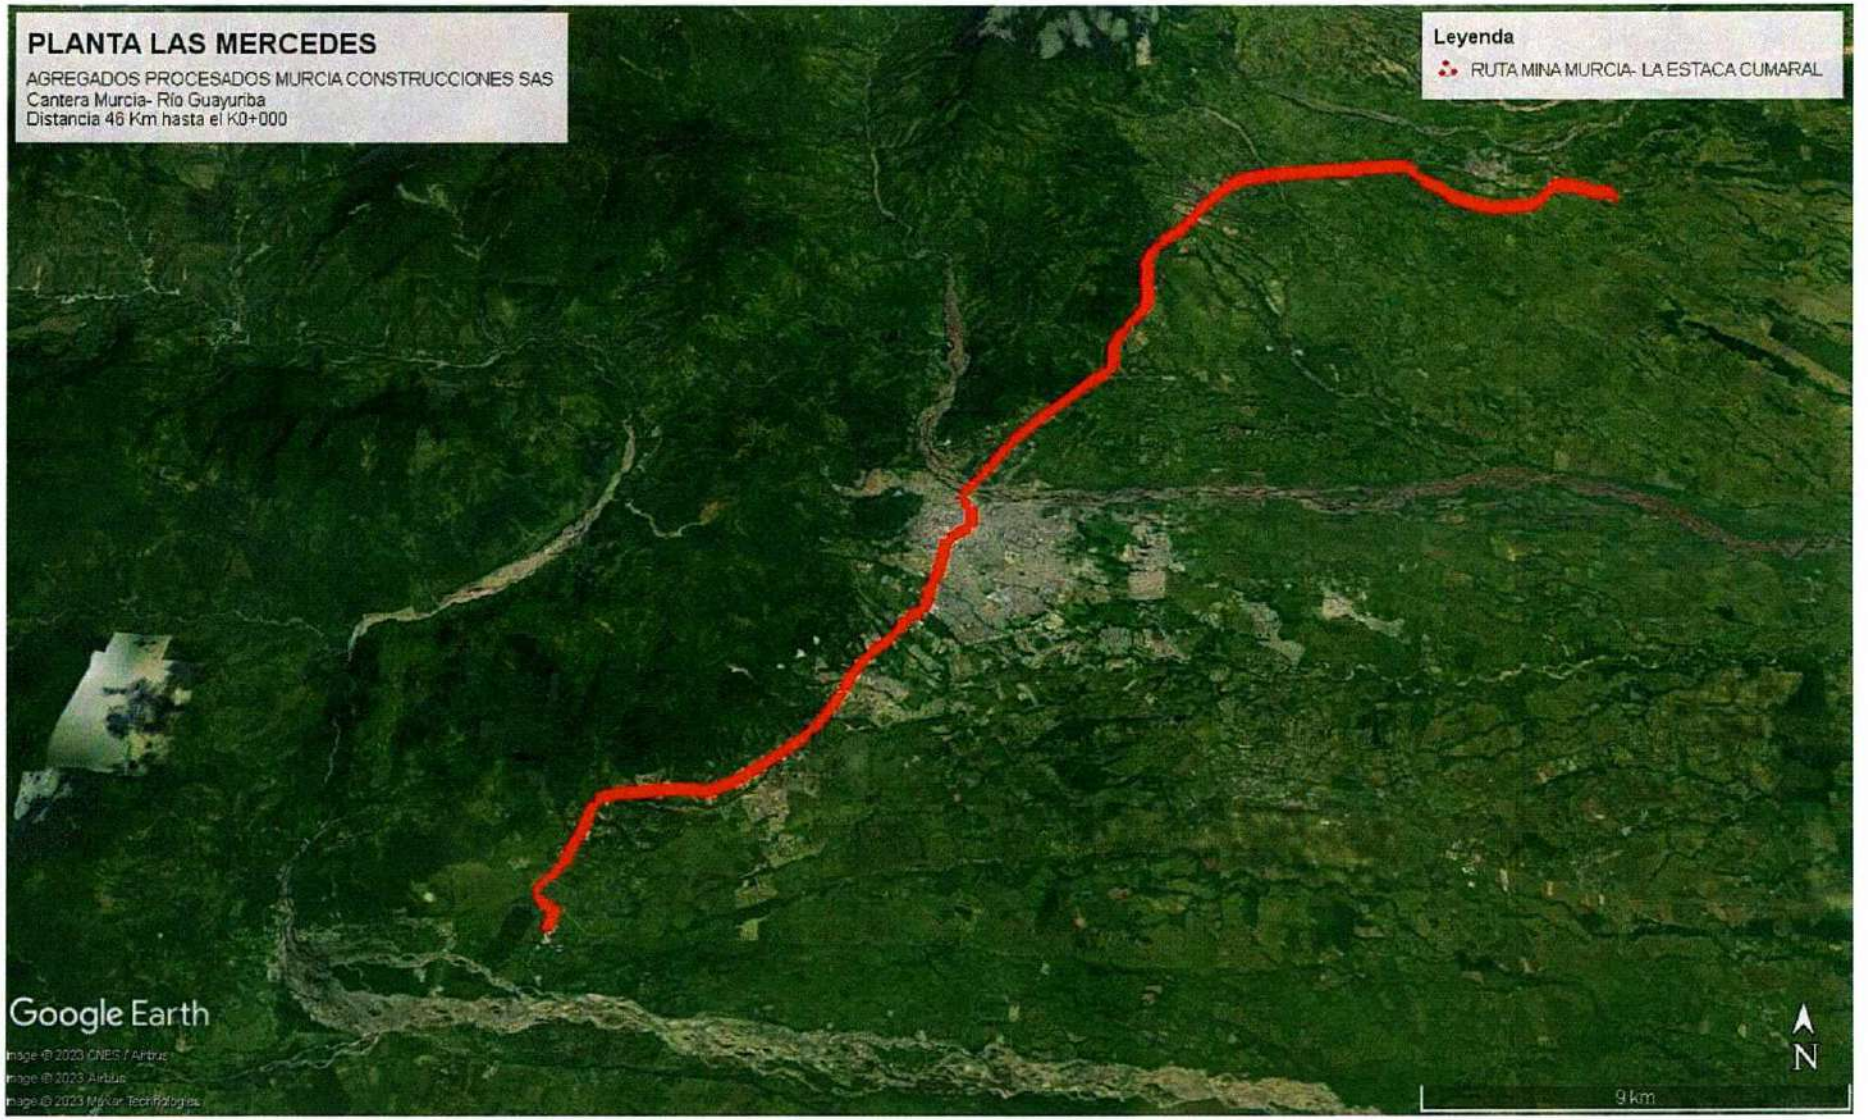
Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los diez (10) días del mes de octubre de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023


Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

Anexo: 2 Folio (Mapas fuente).

CONSORCIO INTER AIM



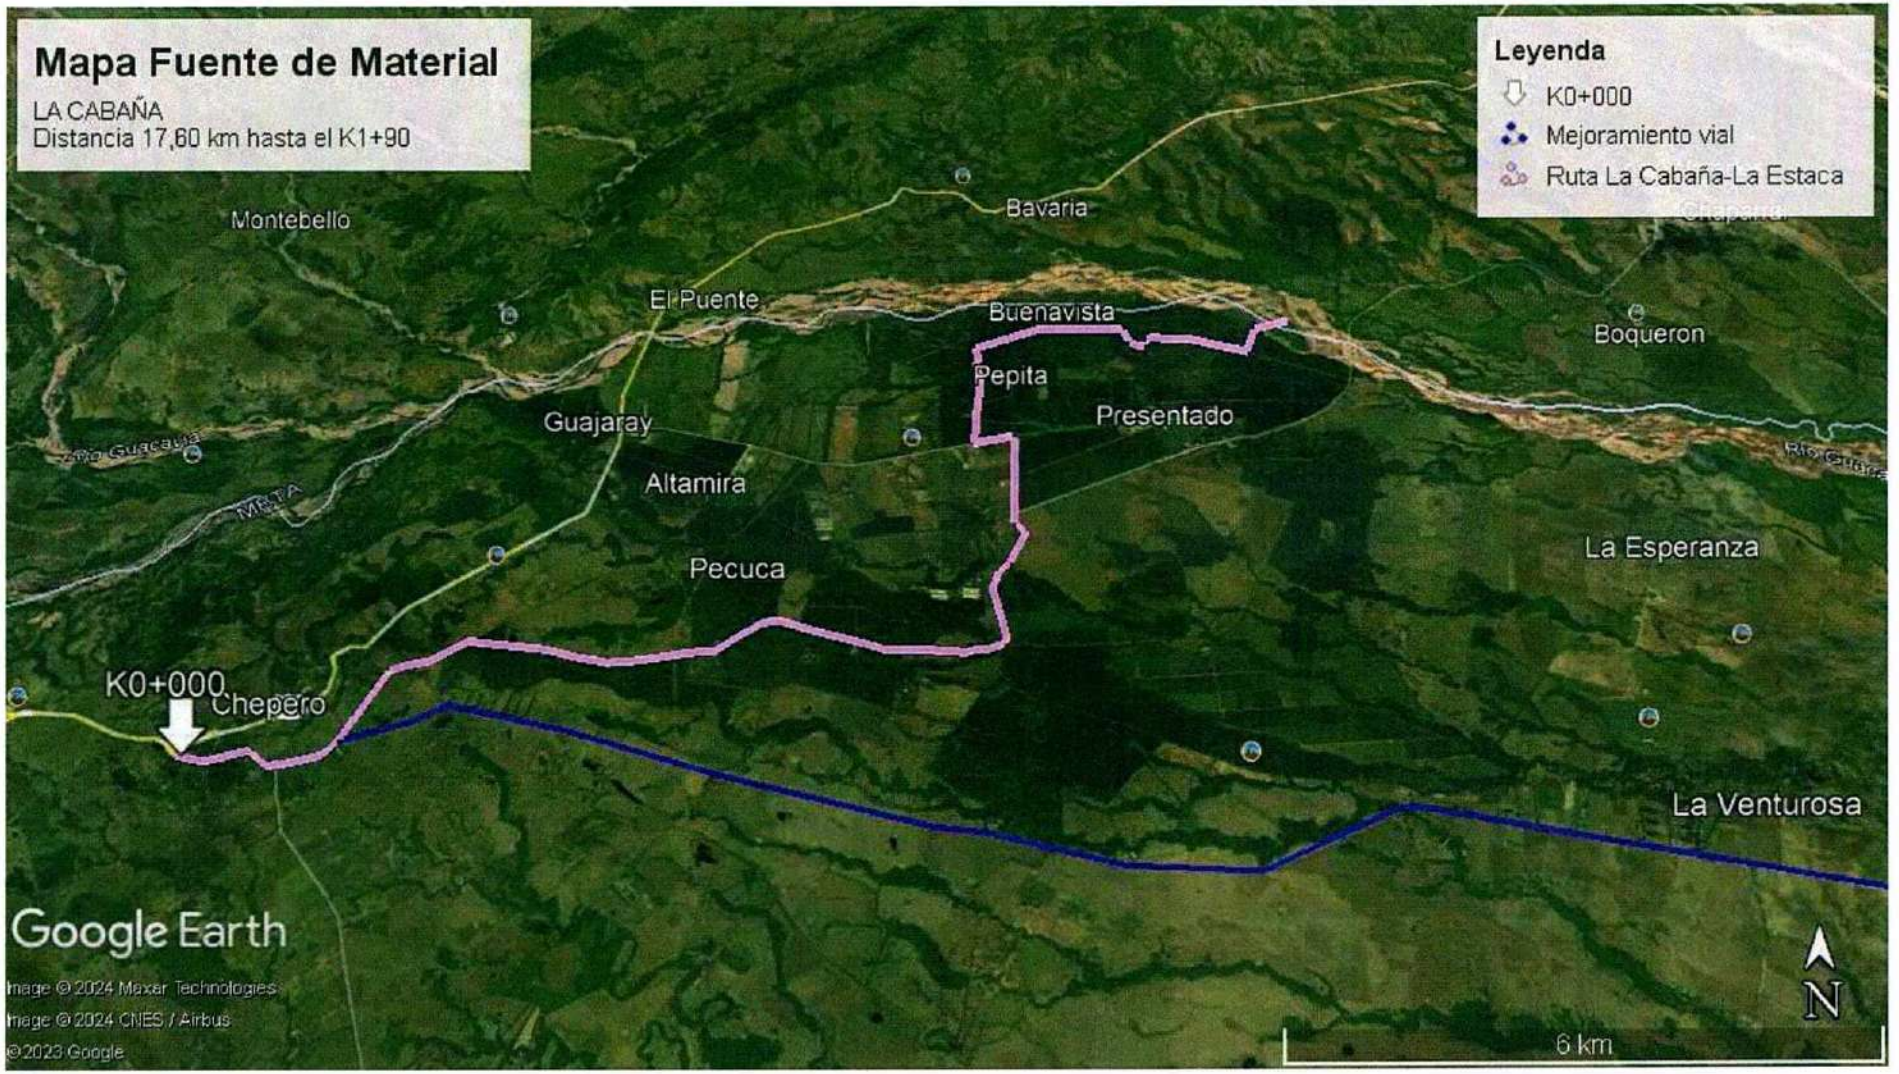Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com


Mapa Fuente de Material
LA CABAÑA
Distancia 17,60 km hasta el K1+90
Leyenda
K0+000
Mejoramiento vial
Ruta La Cabaña-La Estaca
Montebello
Bavaria
El Puente
Buenavista
Boqueron
Pepita
Presentado
Guajaray
Altamira
Pecuca
La Esperanza
K0+000
Chepero
La Venturosa
Google Earth
Image © 2024 Maxar Technologies
Image © 2024 CNES / Airbus
©2023 Google
N
6 km

22.243

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		

CAPITULO:	MATERIAL GRANULAR Y RELLENO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	AREA	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+500	K 25+520	20,00	1,60	32,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+520	K 25+540	20,00	2,62	52,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+540	K 25+560	20,00	2,04	40,80
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+560	K 25+580	20,00	1,90	38,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+580	K 25+600	20,00	1,32	26,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+600	K 25+620	20,00	0,97	19,40
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+620	K 25+640	20,00	0,75	15,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+640	K 25+660	20,00	0,85	17,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+660	K 25+680	20,00	0,76	15,20
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+680	K 25+700	20,00	0,85	17,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+700	K 25+720	20,00	1,03	20,60
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+720	K 25+740	20,00	0,75	15,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K 25+740	K 25+760	20,00	0,56	11,20
PASAN:				SUBTOTAL	320,00
				TOTAL	320,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.244

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 25+500	K 25+520	20	1,60	32,00
K 25+520	K 25+540	20	2,62	52,40
K 25+540	K 25+560	20	2,04	40,80
K 25+560	K 25+580	20	1,90	38,00
K 25+580	K 25+600	20	1,32	26,40
K 25+600	K 25+620	20	0,97	19,40
K 25+620	K 25+640	20	0,75	15,00
K 25+640	K 25+660	20	0,85	17,00
K 25+660	K 25+680	20	0,76	15,20
K 25+680	K 25+700	20	0,85	17,00
K 25+700	K 25+720	20	1,03	20,60
K 25+720	K 25+740	20	0,75	15,00
K 25+740	K 25+760	20	0,56	11,20
	TOTAL			320,00

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERREA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

22.245

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 2021005500215


PAVIMENTO
BASE GRANULAR
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL

25+500.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.80	32.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+520.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	2.62	52.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+540.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	2.04	40.80
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+560.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.90	38.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+580.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.32	26.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+600.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.97	19.40
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+620.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.75	15.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+640.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.85	17.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+660.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.76	15.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+680.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.85	17.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+700.00




Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	1.03	20.60
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+720.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.75	15.00
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

25+740.00



Material	Area	Vol.
RELLENO 3 PUL	0.56	11.20
PAVIMENTO	0.48	9.60
BASE GRANULAR	1.09	21.80

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERREA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCIO HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

22.246

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL META", con código BPIN 2021005500215.

Que la fuente de material utilizada en las actividades de **RELLENO** corresponde al **Río Guacavía**, específicamente de la cantera **La Esmeralda,** situada en el municipio de Cumaral. Esta fuente es la más cercana al proyecto mencionado, a una distancia de 6,0 km hasta el inicio del proyecto en el punto abs K0+00 y fue la inicialmente aprobada, así como se certifica en los estudios y diseños realizados por la consultoría, los cuales fueron entregados por la **Agencia para la Infraestructura del Meta.**

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la fuente de material en un folio.

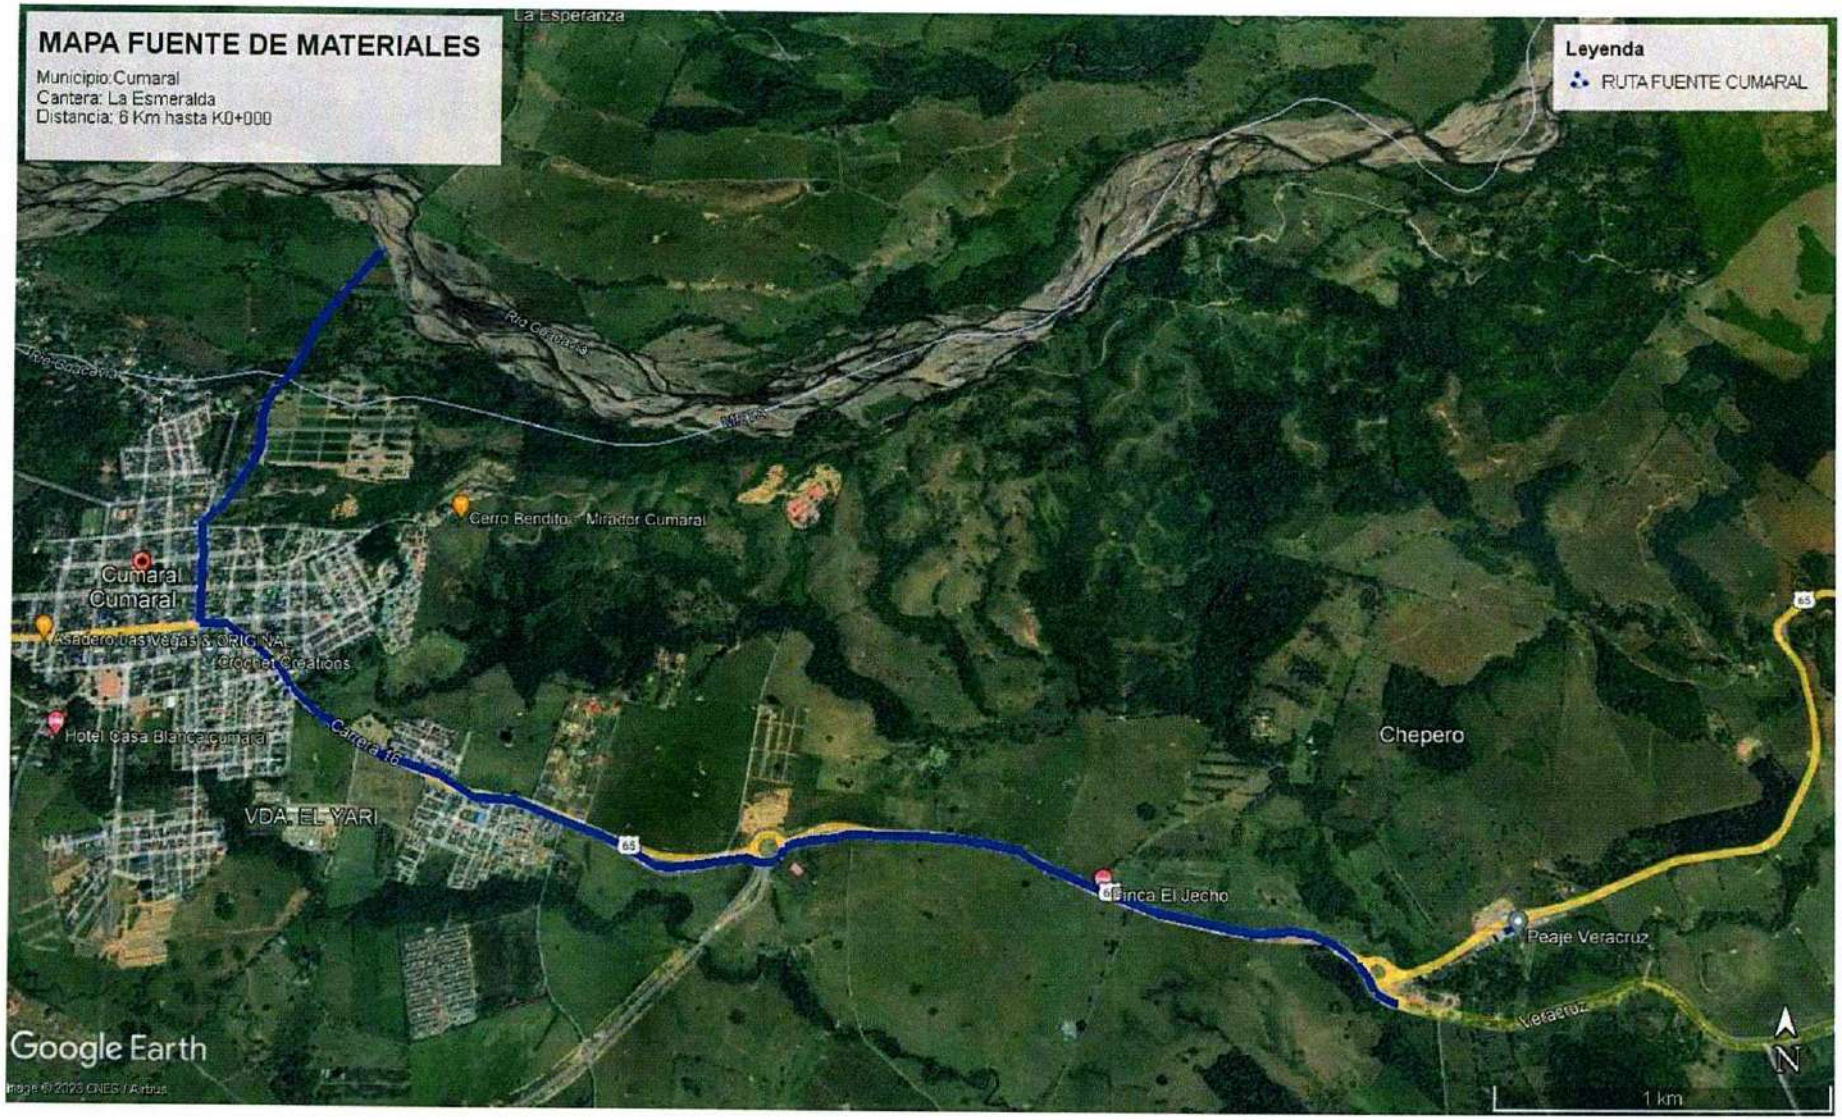
Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los diez (10) días del mes de octubre de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

Anexo: 1 Folio (Mapa fuente)

CONSORCIO INTER AIM



Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		
CAPITULO:	MATERIAL GRANULAR Y RELLENO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA	VOLUMEN	TOTAL
TRANSPORTE MATERIAL DE BASE					
	K21+000	K23+860	2.860,00	4.360,00	204.858,12
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MATERIAL DE BASE					
PASAN:				SUBTOTAL	204.858,115128
				TOTAL	204.858,115128

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.249

DESDE	VOLUMEN	% VOLUMEN		DISTANCIA		TOTAL
		Murcia 90%	La Cabaña 10%	Murcia	La Cabaña	
K 21+000	21,80	19,62	2,18	67,01	36,71	1394,76
K 21+020	21,80	19,62	2,18	67,03	36,73	1395,20
K 21+040	21,80	19,62	2,18	67,05	36,75	1395,64
K 21+060	21,80	19,62	2,18	67,07	36,77	1396,07
K 21+080	21,80	19,62	2,18	67,09	36,79	1396,51
K 21+100	21,80	19,62	2,18	67,11	36,81	1396,94
K 21+120	21,80	19,62	2,18	67,13	36,83	1397,38
K 21+140	21,80	19,62	2,18	67,15	36,85	1397,82
K 21+160	21,80	19,62	2,18	67,17	36,87	1398,25
K 21+180	21,80	19,62	2,18	67,19	36,89	1398,69
K 21+200	21,80	19,62	2,18	67,21	36,91	1399,12
K 21+220	21,80	19,62	2,18	67,23	36,93	1399,56
K 21+240	21,80	19,62	2,18	67,25	36,95	1400,00
K 21+260	21,80	19,62	2,18	67,27	36,97	1400,43
K 21+280	21,80	19,62	2,18	67,29	36,99	1400,87
K 21+300	21,80	19,62	2,18	67,31	37,01	1401,30
K 21+320	21,80	19,62	2,18	67,33	37,03	1401,74
K 21+340	21,80	19,62	2,18	67,35	37,05	1402,18
K 21+360	21,80	19,62	2,18	67,37	37,07	1402,61
K 21+380	21,80	19,62	2,18	67,39	37,09	1403,05
K 21+400	21,80	19,62	2,18	67,41	37,11	1403,48
K 21+420	21,80	19,62	2,18	67,43	37,13	1403,92
K 21+440	21,80	19,62	2,18	67,45	37,15	1404,36
K 21+460	21,80	19,62	2,18	67,47	37,17	1404,79
K 21+480	21,80	19,62	2,18	67,49	37,19	1405,23
K 21+500	21,80	19,62	2,18	67,51	37,21	1405,66
K 21+520	21,80	19,62	2,18	67,53	37,23	1406,10
K 21+540	21,80	19,62	2,18	67,55	37,25	1406,54
K 21+560	21,80	19,62	2,18	67,57	37,27	1406,97
K 21+580	21,80	19,62	2,18	67,59	37,29	1407,41
K 21+600	21,80	19,62	2,18	67,61	37,31	1407,84
K 21+620	21,80	19,62	2,18	67,63	37,33	1408,28
K 21+640	21,80	19,62	2,18	67,65	37,35	1408,72
K 21+660	21,80	19,62	2,18	67,67	37,37	1409,15
K 21+680	21,80	19,62	2,18	67,69	37,39	1409,59
K 21+700	21,80	19,62	2,18	67,71	37,41	1410,02
K 21+720	21,80	19,62	2,18	67,73	37,43	1410,46
K 21+740	21,80	19,62	2,18	67,75	37,45	1410,90
K 21+760	21,80	19,62	2,18	67,77	37,47	1411,33
K 21+780	21,80	19,62	2,18	67,79	37,49	1411,77
K 21+800	21,80	19,62	2,18	67,81	37,51	1412,20
K 21+820	21,80	19,62	2,18	67,83	37,53	1412,64
K 21+840	21,80	19,62	2,18	67,85	37,55	1413,08
K 21+860	21,80	19,62	2,18	67,87	37,57	1413,51
K 21+880	21,80	19,62	2,18	67,89	37,59	1413,95
K 21+900	21,80	19,62	2,18	67,91	37,61	1414,38
K 21+920	21,80	19,62	2,18	67,93	37,63	1414,82
K 21+940	21,80	19,62	2,18	67,95	37,65	1415,26
K 21+960	21,80	19,62	2,18	67,97	37,67	1415,69
K 21+980	21,80	19,62	2,18	67,99	37,69	1416,13
K 22+000	21,80	19,62	2,18	68,01	37,71	1416,56
K 22+020	21,80	19,62	2,18	68,03	37,73	1417,00
K 22+040	21,80	19,62	2,18	68,05	37,75	1417,44

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	TRANSPORTE MATERIAL DE BASE

DESDE	VOLUMEN	% VOLUMEN		DISTANCIA		TOTAL
		Murcia 90%	La Cabaña 10%	Murcia	La Cabaña	
K 22+060	21,80	19,62	2,18	68,07	37,77	1417,87
K 22+080	21,80	19,62	2,18	68,09	37,79	1418,31
K 22+100	21,80	19,62	2,18	68,11	37,81	1418,74
K 22+120	21,80	19,62	2,18	68,13	37,83	1419,18
K 22+140	21,80	19,62	2,18	68,15	37,85	1419,62
K 22+160	21,80	19,62	2,18	68,17	37,87	1420,05
K 22+180	21,80	19,62	2,18	68,19	37,89	1420,49
K 22+200	21,80	19,62	2,18	68,21	37,91	1420,92
K 22+220	21,80	19,62	2,18	68,23	37,93	1421,36
K 22+240	21,80	19,62	2,18	68,25	37,95	1421,80
K 22+260	21,80	19,62	2,18	68,27	37,97	1422,23
K 22+280	21,80	19,62	2,18	68,29	37,99	1422,67
K 22+300	21,80	19,62	2,18	68,31	38,01	1423,10
K 22+320	21,80	19,62	2,18	68,33	38,03	1423,54
K 22+340	21,80	19,62	2,18	68,35	38,05	1423,98
K 22+360	21,80	19,62	2,18	68,37	38,07	1424,41
K 22+380	21,80	19,62	2,18	68,39	38,09	1424,85
K 22+400	21,80	19,62	2,18	68,41	38,11	1425,28
K 22+420	21,80	19,62	2,18	68,43	38,13	1425,72
K 22+440	21,80	19,62	2,18	68,45	38,15	1426,16
K 22+460	21,80	19,62	2,18	68,47	38,17	1426,59
K 22+480	21,80	19,62	2,18	68,49	38,19	1427,03
K 22+500	21,80	19,62	2,18	68,51	38,21	1427,46
K 22+520	21,80	19,62	2,18	68,53	38,23	1427,90
K 22+540	21,80	19,62	2,18	68,55	38,25	1428,34
K 22+560	21,80	19,62	2,18	68,57	38,27	1428,77
K 22+580	21,80	19,62	2,18	68,59	38,29	1429,21
K 22+600	21,80	19,62	2,18	68,61	38,31	1429,64
K 22+620	21,80	19,62	2,18	68,63	38,33	1430,08
K 22+640	21,80	19,62	2,18	68,65	38,35	1430,52
K 22+660	21,80	19,62	2,18	68,67	38,37	1430,95
K 22+680	21,80	19,62	2,18	68,69	38,39	1431,39
K 22+700	21,80	19,62	2,18	68,71	38,41	1431,82
K 22+720	21,80	19,62	2,18	68,73	38,43	1432,26
K 22+740	21,80	19,62	2,18	68,75	38,45	1432,70
K 22+760	21,80	19,62	2,18	68,77	38,47	1433,13
K 22+780	21,80	19,62	2,18	68,79	38,49	1433,57
K 22+800	21,80	19,62	2,18	68,81	38,51	1434,00
K 22+820	21,80	19,62	2,18	68,83	38,53	1434,44
K 22+840	21,80	19,62	2,18	68,85	38,55	1434,88
K 22+860	21,80	19,62	2,18	68,87	38,57	1435,31
K 22+880	21,80	19,62	2,18	68,89	38,59	1435,75
K 22+900	21,80	19,62	2,18	68,91	38,61	1436,18
K 22+920	21,80	19,62	2,18	68,93	38,63	1436,62
K 22+940	21,80	19,62	2,18	68,95	38,65	1437,06
K 22+960	21,80	19,62	2,18	68,97	38,67	1437,49
K 22+980	21,80	19,62	2,18	68,99	38,69	1437,93
K 23+000	21,80	19,62	2,18	69,01	38,71	1438,36
K 23+020	21,80	19,62	2,18	69,03	38,73	1438,80
K 23+040	21,80	19,62	2,18	69,05	38,75	1439,24
K 23+060	21,80	19,62	2,18	69,07	38,77	1439,67
K 23+080	21,80	19,62	2,18	69,09	38,79	1440,11
K 23+100	21,80	19,62	2,18	69,11	38,81	1440,54
K 23+120	21,80	19,62	2,18	69,13	38,83	1440,98
K 23+140	21,80	19,62	2,18	69,15	38,85	1441,42
K 23+160	21,80	19,62	2,18	69,17	38,87	1441,85
K 23+180	21,80	19,62	2,18	69,19	38,89	1442,29

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	TRANSPORTE MATERIAL DE BASE

DESDE	VOLUMEN	% VOLUMEN		DISTANCIA		TOTAL
		Murcia 90%	La Cabaña 10%	Murcia	La Cabaña	
K 23+200	21,80	19,62	2,18	69,21	38,91	1442,72
K 23+220	21,80	19,62	2,18	69,23	38,93	1443,16
K 23+240	21,80	19,62	2,18	69,25	38,95	1443,60
K 23+260	21,80	19,62	2,18	69,27	38,97	1444,03
K 23+280	21,80	19,62	2,18	69,29	38,99	1444,47
K 23+300	21,80	19,62	2,18	69,31	39,01	1444,90
K 23+320	21,80	19,62	2,18	69,33	39,03	1445,34
K 23+340	21,80	19,62	2,18	69,35	39,05	1445,78
K 23+360	21,80	19,62	2,18	69,37	39,07	1446,21
K 23+380	21,80	19,62	2,18	69,39	39,09	1446,65
K 23+400	21,80	19,62	2,18	69,41	39,11	1447,08
K 23+420	21,80	19,62	2,18	69,43	39,13	1447,52
K 23+440	21,80	19,62	2,18	69,45	39,15	1447,96
K 23+460	21,80	19,62	2,18	69,47	39,17	1448,39
K 23+480	21,80	19,62	2,18	69,49	39,19	1448,83
K 23+500	21,80	19,62	2,18	69,51	39,21	1449,26
K 23+520	21,80	19,62	2,18	69,53	39,23	1449,70
K 23+540	21,80	19,62	2,18	69,55	39,25	1450,14
K 23+560	21,80	19,62	2,18	69,57	39,27	1450,57
K 23+580	21,80	19,62	2,18	69,59	39,29	1451,01
K 23+600	21,80	19,62	2,18	69,61	39,31	1451,44
K 23+620	21,80	19,62	2,18	69,63	39,33	1451,88
K 23+640	21,80	19,62	2,18	69,65	39,35	1452,32
K 23+660	21,80	19,62	2,18	69,67	39,37	1452,75
K 23+680	21,80	19,62	2,18	69,69	39,39	1453,19
K 23+700	21,80	19,62	2,18	69,71	39,41	1453,62
K 23+720	21,80	19,62	2,18	69,73	39,43	1454,06
K 23+740	21,80	19,62	2,18	69,75	39,45	1454,50
K 23+760	21,80	19,62	2,18	69,77	39,47	1454,93
K 23+780	21,80	19,62	2,18	69,79	39,49	1455,37
K 23+800	21,80	19,62	2,18	69,81	39,51	1455,80
K 23+820	21,80	19,62	2,18	69,83	39,53	1456,24
K 23+840	21,80	19,62	2,18	69,85	39,55	1456,68
K 23+860	14,6642	13,20	1,47	69,87	39,57	980,16
TOTAL						**204.858,115128**

FIRMA

DIEGO A BECERRA M

DIEGO ALEXANDER BECERREA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA G.

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

22.252

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		
CAPITULO:	PAVIMENTO FLEXIBLE		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
4.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN		M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 19+500	K 20+000	500,00	0,48	240,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 20+000	K 20+500	500,00	0,48	240,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 20+500	K 21+000	500,00	0,48	240,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 21+000	K 21+500	500,00	0,48	240,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 21+500	K 22+000	500,00	0,48	240,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 22+000	K 22+500	500,00	0,48	240,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 22+500	K 23+000	500,00	0,48	240,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 23+000	K 23+500	500,00	0,48	240,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	K 23+500	K 23+950	450,00	0,48	216,00
PASAN:				SUBTOTAL	2.136,00
				TOTAL	2.136,00

960

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22253

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 19+500	K 19+520	20	0,48	9,60
K 19+520	K 19+540	20	0,48	9,60
K 19+540	K 19+560	20	0,48	9,60
K 19+560	K 19+580	20	0,48	9,60
K 19+580	K 19+600	20	0,48	9,60
K 19+600	K 19+620	20	0,48	9,60
K 19+620	K 19+640	20	0,48	9,60
K 19+640	K 19+660	20	0,48	9,60
K 19+660	K 19+680	20	0,48	9,60
K 19+680	K 19+700	20	0,48	9,60
K 19+700	K 19+720	20	0,48	9,60
K 19+720	K 19+740	20	0,48	9,60
K 19+740	K 19+760	20	0,48	9,60
K 19+760	K 19+780	20	0,48	9,60
K 19+780	K 19+800	20	0,48	9,60
K 19+800	K 19+820	20	0,48	9,60
K 19+820	K 19+840	20	0,48	9,60
K 19+840	K 19+860	20	0,48	9,60
K 19+860	K 19+880	20	0,48	9,60
K 19+880	K 19+900	20	0,48	9,60
K 19+900	K 19+920	20	0,48	9,60
K 19+920	K 19+940	20	0,48	9,60
K 19+940	K 19+960	20	0,48	9,60
K 19+960	K 19+980	20	0,48	9,60
K 19+980	K 20+000	20	0,48	9,60
K 20+000	K 20+020	20	0,48	9,60
K 20+020	K 20+040	20	0,48	9,60
K 20+040	K 20+060	20	0,48	9,60
K 20+060	K 20+080	20	0,48	9,60
K 20+080	K 20+100	20	0,48	9,60
K 20+100	K 20+120	20	0,48	9,60
K 20+120	K 20+140	20	0,48	9,60
K 20+140	K 20+160	20	0,48	9,60
K 20+160	K 20+180	20	0,48	9,60
K 20+180	K 20+200	20	0,48	9,60
K 20+200	K 20+220	20	0,48	9,60
K 20+220	K 20+240	20	0,48	9,60
K 20+240	K 20+260	20	0,48	9,60
K 20+260	K 20+280	20	0,48	9,60
K 20+280	K 20+300	20	0,48	9,60
K 20+300	K 20+320	20	0,48	9,60
K 20+320	K 20+340	20	0,48	9,60
K 20+340	K 20+360	20	0,48	9,60
K 20+360	K 20+380	20	0,48	9,60
K 20+380	K 20+400	20	0,48	9,60
K 20+400	K 20+420	20	0,48	9,60
K 20+420	K 20+440	20	0,48	9,60
K 20+440	K 20+460	20	0,48	9,60
K 20+460	K 20+480	20	0,48	9,60
K 20+480	K 20+500	20	0,48	9,60
K 20+500	K 20+520	20	0,48	9,60
K 20+520	K 20+540	20	0,48	9,60
K 20+540	K 20+560	20	0,48	9,60
K 20+560	K 20+580	20	0,48	9,60
K 20+580	K 20+600	20	0,48	9,60

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 20+600	K 20+620	20	0,48	9,60
K 20+620	K 20+640	20	0,48	9,60
K 20+640	K 20+660	20	0,48	9,60
K 20+660	K 20+680	20	0,48	9,60
K 20+680	K 20+700	20	0,48	9,60
K 20+700	K 20+720	20	0,48	9,60
K 20+720	K 20+740	20	0,48	9,60
K 20+740	K 20+760	20	0,48	9,60
K 20+760	K 20+780	20	0,48	9,60
K 20+780	K 20+800	20	0,48	9,60
K 20+800	K 20+820	20	0,48	9,60
K 20+820	K 20+840	20	0,48	9,60
K 20+840	K 20+860	20	0,48	9,60
K 20+860	K 20+880	20	0,48	9,60
K 20+880	K 20+900	20	0,48	9,60
K 20+900	K 20+920	20	0,48	9,60
K 20+920	K 20+940	20	0,48	9,60
K 20+940	K 20+960	20	0,48	9,60
K 20+960	K 20+980	20	0,48	9,60
K 20+980	K 21+000	20	0,48	9,60
K 21+000	K 21+020	20	0,48	9,60
K 21+020	K 21+040	20	0,48	9,60
K 21+040	K 21+060	20	0,48	9,60
K 21+060	K 21+080	20	0,48	9,60
K 21+080	K 21+100	20	0,48	9,60
K 21+100	K 21+120	20	0,48	9,60
K 21+120	K 21+140	20	0,48	9,60
K 21+140	K 21+160	20	0,48	9,60
K 21+160	K 21+180	20	0,48	9,60
K 21+180	K 21+200	20	0,48	9,60
K 21+200	K 21+220	20	0,48	9,60
K 21+220	K 21+240	20	0,48	9,60
K 21+240	K 21+260	20	0,48	9,60
K 21+260	K 21+280	20	0,48	9,60
K 21+280	K 21+300	20	0,48	9,60
K 21+300	K 21+320	20	0,48	9,60
K 21+320	K 21+340	20	0,48	9,60
K 21+340	K 21+360	20	0,48	9,60
K 21+360	K 21+380	20	0,48	9,60
K 21+380	K 21+400	20	0,48	9,60
K 21+400	K 21+420	20	0,48	9,60
K 21+420	K 21+440	20	0,48	9,60
K 21+440	K 21+460	20	0,48	9,60
K 21+460	K 21+480	20	0,48	9,60
K 21+480	K 21+500	20	0,48	9,60
K 21+500	K 21+520	20	0,48	9,60
K 21+520	K 21+540	20	0,48	9,60
K 21+540	K 21+560	20	0,48	9,60
K 21+560	K 21+580	20	0,48	9,60
K 21+580	K 21+600	20	0,48	9,60
K 21+600	K 21+620	20	0,48	9,60
K 21+620	K 21+640	20	0,48	9,60
K 21+640	K 21+660	20	0,48	9,60
K 21+660	K 21+680	20	0,48	9,60
K 21+680	K 21+700	20	0,48	9,60
K 21+700	K 21+720	20	0,48	9,60
K 21+720	K 21+740	20	0,48	9,60
K 21+740	K 21+760	20	0,48	9,60

22.255

CONSORCIO HALCÓN

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 21+760	K 21+780	20	0,48	9,60
K 21+780	K 21+800	20	0,48	9,60
K 21+800	K 21+820	20	0,48	9,60
K 21+820	K 21+840	20	0,48	9,60
K 21+840	K 21+860	20	0,48	9,60
K 21+860	K 21+880	20	0,48	9,60
K 21+880	K 21+900	20	0,48	9,60
K 21+900	K 21+920	20	0,48	9,60
K 21+920	K 21+940	20	0,48	9,60
K 21+940	K 21+960	20	0,48	9,60
K 21+960	K 21+980	20	0,48	9,60
K 21+980	K 22+000	20	0,48	9,60
K 22+000	K 22+020	20	0,48	9,60
K 22+020	K 22+040	20	0,48	9,60
K 22+040	K 22+060	20	0,48	9,60
K 22+060	K 22+080	20	0,48	9,60
K 22+080	K 22+100	20	0,48	9,60
K 22+100	K 22+120	20	0,48	9,60
K 22+120	K 22+140	20	0,48	9,60
K 22+140	K 22+160	20	0,48	9,60
K 22+160	K 22+180	20	0,48	9,60
K 22+180	K 22+200	20	0,48	9,60
K 22+200	K 22+220	20	0,48	9,60
K 22+220	K 22+240	20	0,48	9,60
K 22+240	K 22+260	20	0,48	9,60
K 22+260	K 22+280	20	0,48	9,60
K 22+280	K 22+300	20	0,48	9,60
K 22+300	K 22+320	20	0,48	9,60
K 22+320	K 22+340	20	0,48	9,60
K 22+340	K 22+360	20	0,48	9,60
K 22+360	K 22+380	20	0,48	9,60
K 22+380	K 22+400	20	0,48	9,60
K 22+400	K 22+420	20	0,48	9,60
K 22+420	K 22+440	20	0,48	9,60
K 22+440	K 22+460	20	0,48	9,60
K 22+460	K 22+480	20	0,48	9,60
K 22+480	K 22+500	20	0,48	9,60
K 22+500	K 22+520	20	0,48	9,60
K 22+520	K 22+540	20	0,48	9,60
K 22+540	K 22+560	20	0,48	9,60
K 22+560	K 22+580	20	0,48	9,60
K 22+580	K 22+600	20	0,48	9,60
K 22+600	K 22+620	20	0,48	9,60
K 22+620	K 22+640	20	0,48	9,60
K 22+640	K 22+660	20	0,48	9,60
K 22+660	K 22+680	20	0,48	9,60
K 22+680	K 22+700	20	0,48	9,60
K 22+700	K 22+720	20	0,48	9,60
K 22+720	K 22+740	20	0,48	9,60
K 22+740	K 22+760	20	0,48	9,60
K 22+760	K 22+780	20	0,48	9,60
K 22+780	K 22+800	20	0,48	9,60
K 22+800	K 22+820	20	0,48	9,60
K 22+820	K 22+840	20	0,48	9,60
K 22+840	K 22+860	20	0,48	9,60
K 22+860	K 22+880	20	0,48	9,60
K 22+880	K 22+900	20	0,48	9,60
K 22+900	K 22+920	20	0,48	9,60

22,256

CONSORCIO HALCÓN

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 22+920	K 22+940	20	0,48	9,60
K 22+940	K 22+960	20	0,48	9,60
K 22+960	K 22+980	20	0,48	9,60
K 22+980	K 23+000	20	0,48	9,60
K 23+000	K 23+020	20	0,48	9,60
K 23+020	K 23+040	20	0,48	9,60
K 23+040	K 23+060	20	0,48	9,60
K 23+060	K 23+080	20	0,48	9,60
K 23+080	K 23+100	20	0,48	9,60
K 23+100	K 23+120	20	0,48	9,60
K 23+120	K 23+140	20	0,48	9,60
K 23+140	K 23+160	20	0,48	9,60
K 23+160	K 23+180	20	0,48	9,60
K 23+180	K 23+200	20	0,48	9,60
K 23+200	K 23+220	20	0,48	9,60
K 23+220	K 23+240	20	0,48	9,60
K 23+240	K 23+260	20	0,48	9,60
K 23+260	K 23+280	20	0,48	9,60
K 23+280	K 23+300	20	0,48	9,60
K 23+300	K 23+320	20	0,48	9,60
K 23+320	K 23+340	20	0,48	9,60
K 23+340	K 23+360	20	0,48	9,60
K 23+360	K 23+380	20	0,48	9,60
K 23+380	K 23+400	20	0,48	9,60
K 23+400	K 23+420	20	0,48	9,60
K 23+420	K 23+440	20	0,48	9,60
K 23+440	K 23+460	20	0,48	9,60
K 23+460	K 23+480	20	0,48	9,60
K 23+480	K 23+500	20	0,48	9,60
K 23+500	K 23+520	20	0,48	9,60
K 23+520	K 23+540	20	0,48	9,60
K 23+540	K 23+560	20	0,48	9,60
K 23+560	K 23+580	20	0,48	9,60
K 23+580	K 23+600	20	0,48	9,60
K 23+600	K 23+620	20	0,48	9,60
K 23+620	K 23+640	20	0,48	9,60
K 23+640	K 23+660	20	0,48	9,60
K 23+660	K 23+680	20	0,48	9,60
K 23+680	K 23+700	20	0,48	9,60
K 23+700	K 23+720	20	0,48	9,60
K 23+720	K 23+740	20	0,48	9,60
K 23+740	K 23+760	20	0,48	9,60
K 23+760	K 23+780	20	0,48	9,60
K 23+780	K 23+800	20	0,48	9,60
K 23+800	K 23+820	20	0,48	9,60
K 23+820	K 23+840	20	0,48	9,60
K 23+840	K 23+860	20	0,48	9,60
K 23+860	K 23+880	20	0,48	9,60
K 23+880	K 23+900	20	0,48	9,60
K 23+900	K 23+920	20	0,48	9,60
K 23+920	K 23+940	20	0,48	9,60
K 23+940	K 23+950	10	0,48	4,80
		TOTAL		2.136,00

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERREA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBO

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

22257

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL META", con código BPIN 2021005500215.

Que la fuente de material utilizada para las actividades de **MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19** proviene de **Triturados & Triturados Ltda.**, localizada en el municipio de Castilla La Nueva. Esta fuente no fue la inicialmente utilizada, ni aprobada en los estudios y diseños realizados por la consultoría y entregados por la **AIM**; la fuente inicialmente aprobada fue **Murcia y Murcia**. Sin embargo, debido a la necesidad de avanzar a un ritmo mucho mayor en la obra, el contratista propuso un cambio de proveedor por los constantes problemas presentados por el proveedor inicial. Aunque la planta de Triturados & Triturados Ltda. se encuentra a una distancia mayor del punto inicial del proyecto, el contratista asumirá el costo adicional de esta distancia, por lo que se continuará calculando el transporte a una distancia de 46 km hasta el inicio del proyecto en el punto abs K0+00.

Es importante mencionar que la nueva fuente de material ha sido evaluada y cumple con las especificaciones técnicas. El cambio de proveedor ha sido una medida necesaria para garantizar la continuidad y la calidad de la obra, evitando demoras significativas que podrían afectar la programación establecida.

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia en un folio.

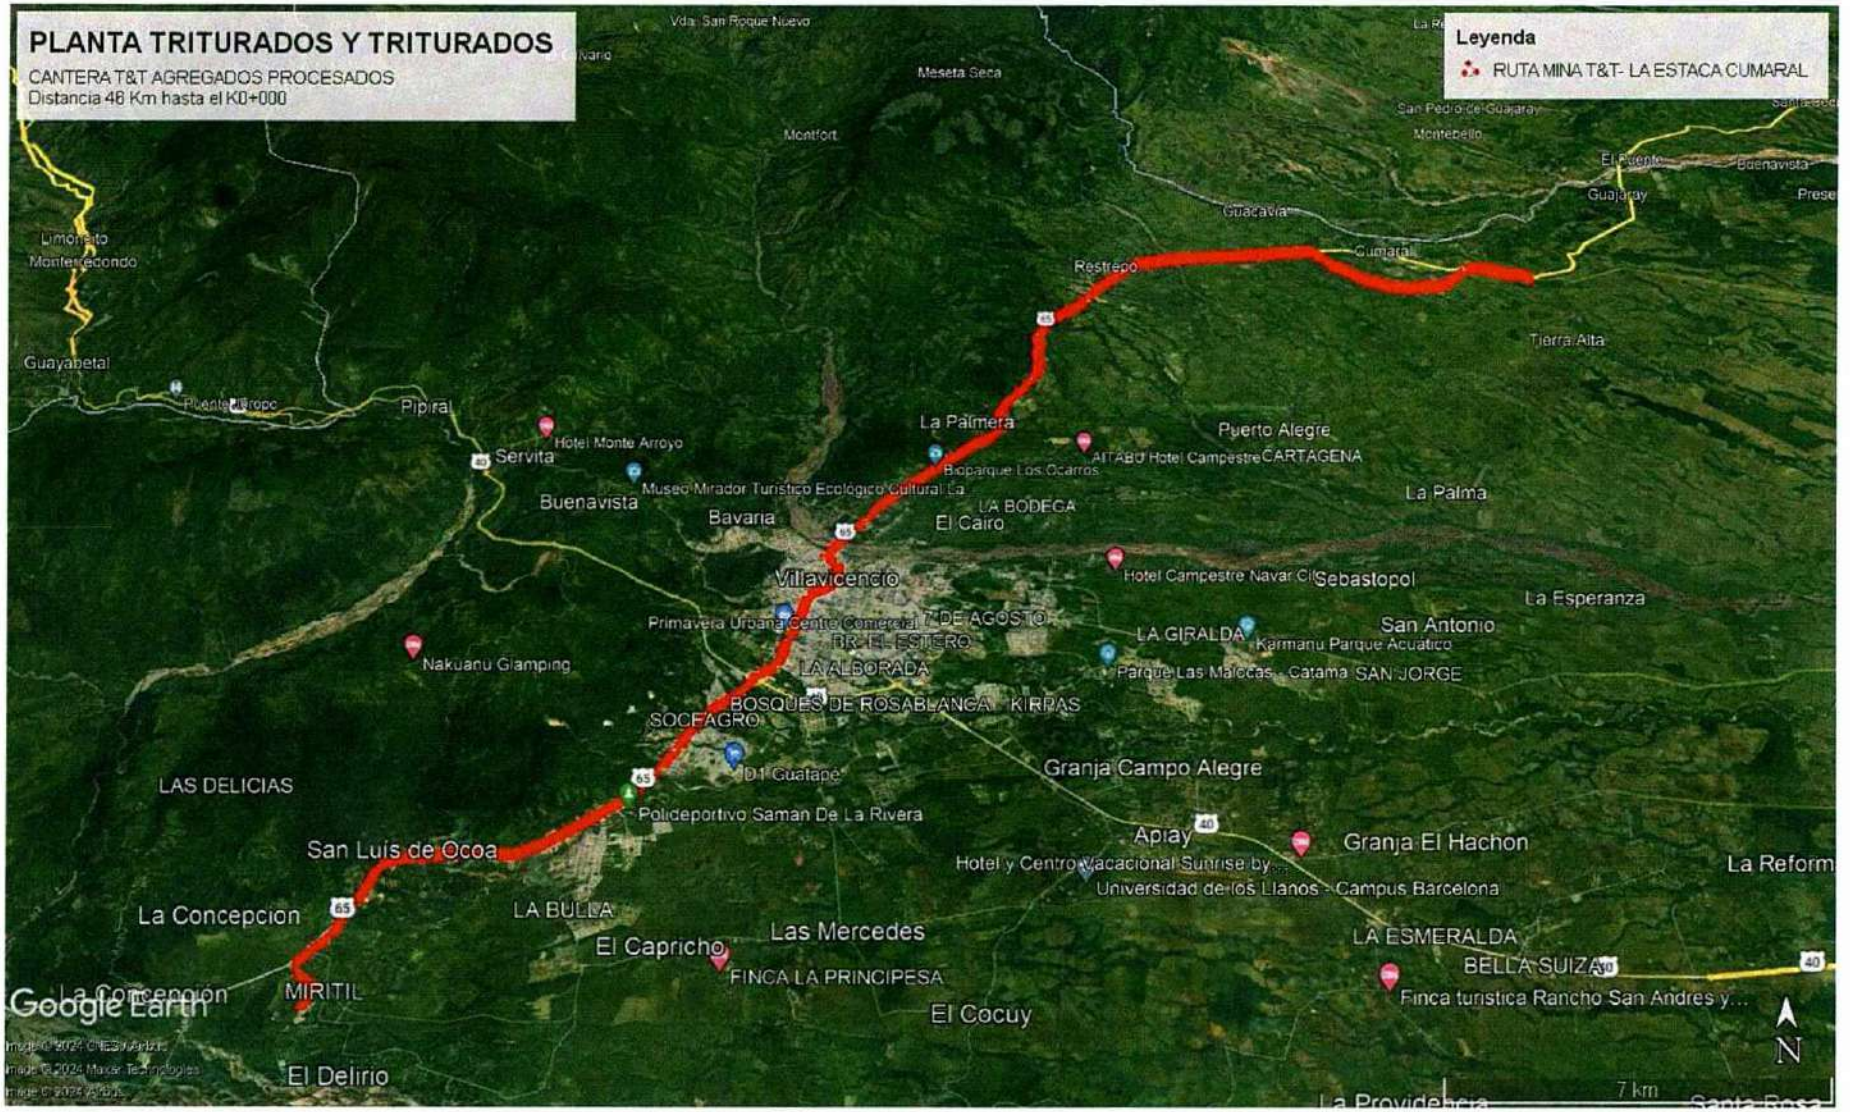
Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los diez (10) días del mes de octubre de 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022


Anexo: 1 Folio (Mapa fuente)

CONSORCIO INTER AIM



Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

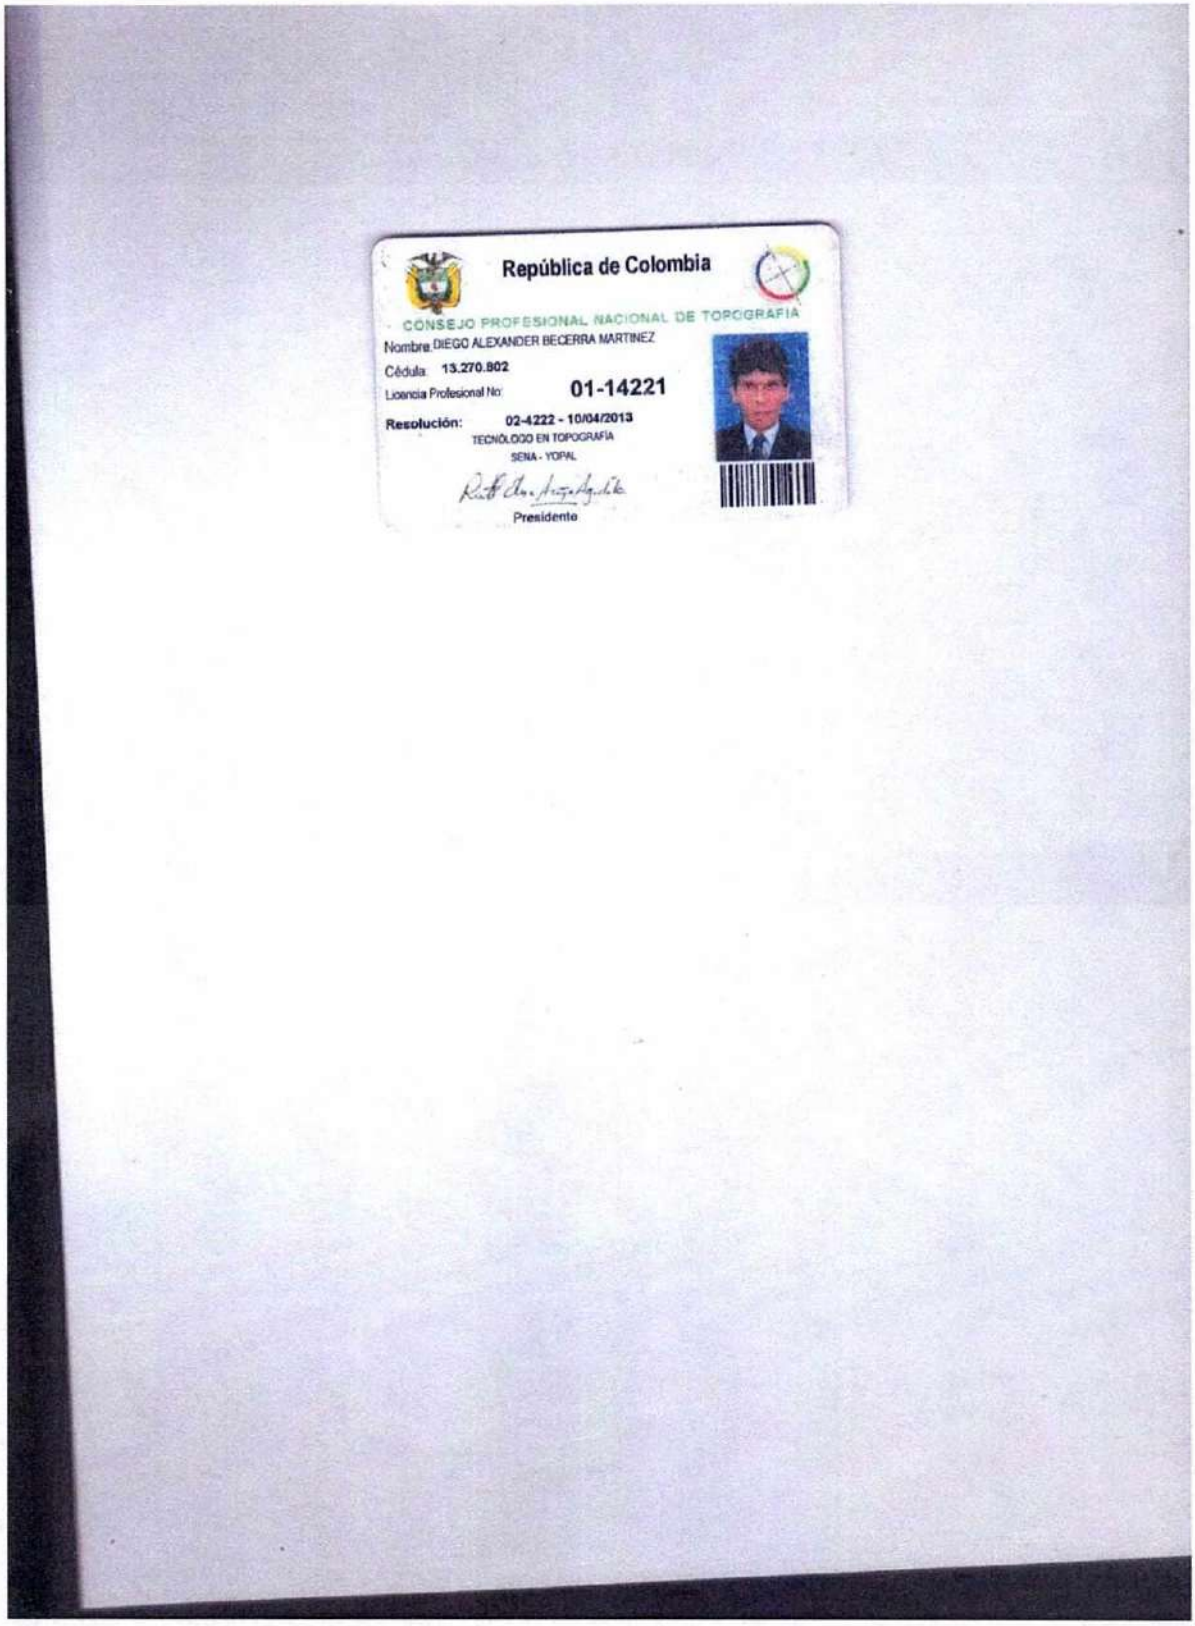22.294


República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA
Nombre DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ
Cédula 13.270.802
Licencia Profesional No: 01-14221
Resolución: 02-4222 - 10/04/2013
TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA - YOPAL
Presidente

22.260

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 490821/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 13270802** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-14221** con fecha de expedición del **10 de Abril de 2013.**

Que el(la) Señor(a) **DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-14221** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **9 días del mes de Octubre de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

DIEGO A BECERRA M

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

22.261

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: FANNY BARRERA GONZALEZ



Cédula: **46.370.853**

Licencia Profesional No.: **01-10580**

Resolución: **02-0581 - 22/02/2001**

Experiencia o fecha de grado: **18/09/1998**

TECNICO PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA DE MINAS Y OBRAS C.
SENA - SOGAMOSO

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución Motivada y el Certificado de Vigencia

la documentacion integra acredita al titular para ejercer la profesion de TOPOGRAFO en la Republica de Colombia de acuerdo a la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

CARLOS MARIO LOPERA GIRALDO
PRESIDENTE

ELIANA MARIA AVILA JIMENEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

Para cualquier informacion comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografia.Email:info@cpnt.org.calle 33 No 7-27 Of 502 Tel 2881490

22.262

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 421993/2023

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **FANNY BARRERA GONZALEZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 46370853** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TÉCNICO PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA DE MINAS Y OBRAS CIVILES** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-10580** con fecha de expedición del **22 de Febrero de 2001.**

Que el(la) Señor(a) **FANNY BARRERA GONZALEZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-10580** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **10 días del mes de Octubre de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

FANNY BARRERA G.
***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		

CAPITULO:	**PAVIMENTO FLEXIBLE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.2	**RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1**	**M2**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DESDE	**HASTA**	**DISTANCIA**	**ANCHO**	**TOTAL**
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 19+500	K 20+000	500,00	6,5	3.250,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 20+000	K 20+500	500,00	6,5	3.250,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 20+500	K 21+000	500,00	6,5	3.250,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 21+000	K 21+500	500,00	6,5	3.250,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 21+500	K 22+000	500,00	6,5	3.250,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 22+000	K 22+500	500,00	6,5	3.250,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 22+500	K 23+000	500,00	6,5	3.250,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 23+000	K 23+500	500,00	6,5	3.250,00
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	K 23+500	K 23+950	450,00	6,5	2.925,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	28.925,00
				TOTAL	28.925,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.264

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		
CAPITULO:	PAVIMENTO FLEXIBLE		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	DISTANCIA		TOTAL
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	K19+500	K 23+950	4.450,00		144.703,30
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE MEZCLAS ASFALTICAS					
PASAN:				SUBTOTAL	144.703,30
				TOTAL	144.703,30

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.265

DISTANCIA DE LA CANTERA AL K0+000			46 KM
DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 19+520	9,60	65,53	629,09
K 19+540	9,60	65,55	629,28
K 19+560	9,60	65,57	629,47
K 19+580	9,60	65,59	629,66
K 19+600	9,60	65,61	629,86
K 19+620	9,60	65,63	630,05
K 19+640	9,60	65,65	630,24
K 19+660	9,60	65,67	630,43
K 19+680	9,60	65,69	630,62
K 19+700	9,60	65,71	630,82
K 19+720	9,60	65,73	631,01
K 19+740	9,60	65,75	631,20
K 19+760	9,60	65,77	631,39
K 19+780	9,60	65,79	631,58
K 19+800	9,60	65,81	631,78
K 19+820	9,60	65,83	631,97
K 19+840	9,60	65,85	632,16
K 19+860	9,60	65,87	632,35
K 19+880	9,60	65,89	632,54
K 19+900	9,60	65,91	632,74
K 19+920	9,60	65,93	632,93
K 19+940	9,60	65,95	633,12
K 19+960	9,60	65,97	633,31
K 19+980	9,60	65,99	633,50
K 20+000	9,60	66,01	633,70
K 20+020	9,60	66,03	633,89
K 20+040	9,60	66,05	634,08
K 20+060	9,60	66,07	634,27
K 20+080	9,60	66,09	634,46
K 20+100	9,60	66,11	634,66
K 20+120	9,60	66,13	634,85
K 20+140	9,60	66,15	635,04
K 20+160	9,60	66,17	635,23
K 20+180	9,60	66,19	635,42
K 20+200	9,60	66,21	635,62
K 20+220	9,60	66,23	635,81
K 20+240	9,60	66,25	636,00
K 20+260	9,60	66,27	636,19
K 20+280	9,60	66,29	636,38
K 20+300	9,60	66,31	636,58
K 20+320	9,60	66,33	636,77
K 20+340	9,60	66,35	636,96
K 20+360	9,60	66,37	637,15
K 20+380	9,60	66,39	637,34
K 20+400	9,60	66,41	637,54
K 20+420	9,60	66,43	637,73
K 20+440	9,60	66,45	637,92
K 20+460	9,60	66,47	638,11
K 20+480	9,60	66,49	638,30
K 20+500	9,60	66,51	638,50
K 20+520	9,60	66,53	638,69
K 20+540	9,60	66,55	638,88
K 20+560	9,60	66,57	639,07
K 20+580	9,60	66,59	639,26
K 20+600	9,60	66,61	639,46
K 20+620	9,60	66,63	639,65

72.266

DISTANCIA DE LA CANTERA AL K0+000			46 KM
DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 20+640	9,60	66,65	639,84
K 20+660	9,60	66,67	640,03
K 20+680	9,60	66,69	640,22
K 20+700	9,60	66,71	640,42
K 20+720	9,60	66,73	640,61
K 20+740	9,60	66,75	640,80
K 20+760	9,60	66,77	640,99
K 20+780	9,60	66,79	641,18
K 20+800	9,60	66,81	641,38
K 20+820	9,60	66,83	641,57
K 20+840	9,60	66,85	641,76
K 20+860	9,60	66,87	641,95
K 20+880	9,60	66,89	642,14
K 20+900	9,60	66,91	642,34
K 20+920	9,60	66,93	642,53
K 20+940	9,60	66,95	642,72
K 20+960	9,60	66,97	642,91
K 20+980	9,60	66,99	643,10
K 21+000	9,60	67,01	643,30
K 21+020	9,60	67,03	643,49
K 21+040	9,60	67,05	643,68
K 21+060	9,60	67,07	643,87
K 21+080	9,60	67,09	644,06
K 21+100	9,60	67,11	644,26
K 21+120	9,60	67,13	644,45
K 21+140	9,60	67,15	644,64
K 21+160	9,60	67,17	644,83
K 21+180	9,60	67,19	645,02
K 21+200	9,60	67,21	645,22
K 21+220	9,60	67,23	645,41
K 21+240	9,60	67,25	645,60
K 21+260	9,60	67,27	645,79
K 21+280	9,60	67,29	645,98
K 21+300	9,60	67,31	646,18
K 21+320	9,60	67,33	646,37
K 21+340	9,60	67,35	646,56
K 21+360	9,60	67,37	646,75
K 21+380	9,60	67,39	646,94
K 21+400	9,60	67,41	647,14
K 21+420	9,60	67,43	647,33
K 21+440	9,60	67,45	647,52
K 21+460	9,60	67,47	647,71
K 21+480	9,60	67,49	647,90
K 21+500	9,60	67,51	648,10
K 21+520	9,60	67,53	648,29
K 21+540	9,60	67,55	648,48
K 21+560	9,60	67,57	648,67
K 21+580	9,60	67,59	648,86
K 21+600	9,60	67,61	649,06
K 21+620	9,60	67,63	649,25
K 21+640	9,60	67,65	649,44
K 21+660	9,60	67,67	649,63
K 21+680	9,60	67,69	649,82
K 21+700	9,60	67,71	650,02
K 21+720	9,60	67,73	650,21
K 21+740	9,60	67,75	650,40
K 21+760	9,60	67,77	650,59
K 21+780	9,60	67,79	650,78
K 21+800	9,60	67,81	650,98

22.267

DISTANCIA DE LA CANTERA AL K0+000			46 KM
DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 21+820	9,60	67,83	651,17
K 21+840	9,60	67,85	651,36
K 21+860	9,60	67,87	651,55
K 21+880	9,60	67,89	651,74
K 21+900	9,60	67,91	651,94
K 21+920	9,60	67,93	652,13
K 21+940	9,60	67,95	652,32
K 21+960	9,60	67,97	652,51
K 21+980	9,60	67,99	652,70
K 22+000	9,60	68,01	652,90
K 22+020	9,60	68,03	653,09
K 22+040	9,60	68,05	653,28
K 22+060	9,60	68,07	653,47
K 22+080	9,60	68,09	653,66
K 22+100	9,60	68,11	653,86
K 22+120	9,60	68,13	654,05
K 22+140	9,60	68,15	654,24
K 22+160	9,60	68,17	654,43
K 22+180	9,60	68,19	654,62
K 22+200	9,60	68,21	654,82
K 22+220	9,60	68,23	655,01
K 22+240	9,60	68,25	655,20
K 22+260	9,60	68,27	655,39
K 22+280	9,60	68,29	655,58
K 22+300	9,60	68,31	655,78
K 22+320	9,60	68,33	655,97
K 22+340	9,60	68,35	656,16
K 22+360	9,60	68,37	656,35
K 22+380	9,60	68,39	656,54
K 22+400	9,60	68,41	656,74
K 22+420	9,60	68,43	656,93
K 22+440	9,60	68,45	657,12
K 22+460	9,60	68,47	657,31
K 22+480	9,60	68,49	657,50
K 22+500	9,60	68,51	657,70
K 22+520	9,60	68,53	657,89
K 22+540	9,60	68,55	658,08
K 22+560	9,60	68,57	658,27
K 22+580	9,60	68,59	658,46
K 22+600	9,60	68,61	658,66
K 22+620	9,60	68,63	658,85
K 22+640	9,60	68,65	659,04
K 22+660	9,60	68,67	659,23
K 22+680	9,60	68,69	659,42
K 22+700	9,60	68,71	659,62
K 22+720	9,60	68,73	659,81
K 22+740	9,60	68,75	660,00
K 22+760	9,60	68,77	660,19
K 22+780	9,60	68,79	660,38
K 22+800	9,60	68,81	660,58
K 22+820	9,60	68,83	660,77
K 22+840	9,60	68,85	660,96
K 22+860	9,60	68,87	661,15
K 22+880	9,60	68,89	661,34
K 22+900	9,60	68,91	661,54
K 22+920	9,60	68,93	661,73
K 22+940	9,60	68,95	661,92
K 22+960	9,60	68,97	662,11
K 22+980	9,60	68,99	662,30

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS

DISTANCIA DE LA CANTERA AL K0+000			46 KM
DESDE	VOLUMEN	DISTANCIA	TOTAL
K 23+000	9,60	69,01	662,50
K 23+020	9,60	69,03	662,69
K 23+040	9,60	69,05	662,88
K 23+060	9,60	69,07	663,07
K 23+080	9,60	69,09	663,26
K 23+100	9,60	69,11	663,46
K 23+120	9,60	69,13	663,65
K 23+140	9,60	69,15	663,84
K 23+160	9,60	69,17	664,03
K 23+180	9,60	69,19	664,22
K 23+200	9,60	69,21	664,42
K 23+220	9,60	69,23	664,61
K 23+240	9,60	69,25	664,80
K 23+260	9,60	69,27	664,99
K 23+280	9,60	69,29	665,18
K 23+300	9,60	69,31	665,38
K 23+320	9,60	69,33	665,57
K 23+340	9,60	69,35	665,76
K 23+360	9,60	69,37	665,95
K 23+380	9,60	69,39	666,14
K 23+400	9,60	69,41	666,34
K 23+420	9,60	69,43	666,53
K 23+440	9,60	69,45	666,72
K 23+460	9,60	69,47	666,91
K 23+480	9,60	69,49	667,10
K 23+500	9,60	69,51	667,30
K 23+520	9,60	69,53	667,49
K 23+540	9,60	69,55	667,68
K 23+560	9,60	69,57	667,87
K 23+580	9,60	69,59	668,06
K 23+600	9,60	69,61	668,26
K 23+620	9,60	69,63	668,45
K 23+640	9,60	69,65	668,64
K 23+660	9,60	69,67	668,83
K 23+680	9,60	69,69	669,02
K 23+700	9,60	69,71	669,22
K 23+720	9,60	69,73	669,41
K 23+740	9,60	69,75	669,60
K 23+760	9,60	69,77	669,79
K 23+780	9,60	69,79	669,98
K 23+800	9,60	69,81	670,18
K 23+820	9,60	69,83	670,37
K 23+840	9,60	69,85	670,56
K 23+860	9,60	69,87	670,75
K 23+880	9,60	69,89	670,94
K 23+900	9,60	69,91	671,14
K 23+920	9,60	69,93	671,33
K 23+940	9,60	69,95	671,52
K 23+950	4,80	69,96	335,81
	TOTAL		144.703,30

FIRMA

DIEGO ALEXANDER BECERREA MARTINEZ
TOPOGRAFO CONTRATISTA
M.P. 01-14221
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FANNY BARRERA GONZALEZ
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-10580
CONSORCIO INTER AIM

22.269

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 20+260 (MEDIA)						
PLACA SUPERIOR	3,50	0,25	4,00		1	3,50
PLACA INFERIOR	3,50	0,50	4,00		1	7,00
BORDILLO		0,25	4,20	0,40	1	0,42
ESTRIBO CENTRAL		0,80	5,00	2,5	1	10,00
DENTELLON		0,80	5,00	0,85	1	3,40
MUROS	2,50	0,25	4,00		2,00	5,00
ALETAS		0,25	4,00	2	2	4,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	33,32
					TOTAL	33,32

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

22,270

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		
CAPITULO:	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 20+595						
PLACA SUPERIOR	6,10	0,25	5,30		1	8,08
PLACA INFERIOR	5,60	0,30	5,30		1	8,90
BORDILLO		0,20	4,20	0,40	1	0,34
ESTRIBO CENTRAL		0,80	6,80	2,5	1	13,60
DENTELLON		0,80	5,00	0,85	1	3,40
PASAN: 33,32					SUBTOTAL	34,32
					TOTAL	67,64

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

22.271

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		

CAPITULO:	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 21+055						
PLACA SUPERIOR	3,50	0,3445	9,00		1	10,85
PLACA INFERIOR	3,50	0,50	9,00		1	15,75
BORDILLO		0,35	4,20	0,40	2	1,18
ESTRIBO CENTRAL		0,80	10,00	2,5	1	20,00
DENTELLON		0,80	5,00	0,85	2	6,80
MUROS	2,50	0,35	9,00		2,00	15,75
ALETAS		0,30	4,00	2	4	9,60
PASAN: 67,64					SUBTOTAL	79,93
					TOTAL	147,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 25+147						
ALETAS	2,55	0,25	1,31	1,60	4	2,72
BORDILLO	0,25	0,25	1,40		2	0,18
SOLERA	4,35	0,30	1,27	1,80	2	2,34
DENTELLON	0,27	0,25	3,95		2	0,53
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: **147,57**					**SUBTOTAL**	35,29
					TOTAL	182,86

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		
CAPITULO:	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 25+520						
ALETAS	2,55	0,25	1,31	1,60	4	2,72
BORDILLO	0,25	0,25	1,40		2	0,18
SOLERA	4,35	0,30	1,27	1,80	2	2,34
DENTELLON	0,27	0,25	3,95		2	0,53
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: 182,86					SUBTOTAL	35,29
					TOTAL	218,15

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		
CAPITULO:	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
6.1	**DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS**		**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
DEMILICION MECANICA DE ALCANTARILLA K 26+165						
ALETAS	2,55	0,25	1,31	1,60	4	2,72
BORDILLO	0,25	0,25	1,40		2	0,18
SOLERA	4,35	0,30	1,27	1,80	2	2,34
DENTELLON	0,27	0,25	3,95		2	0,53
CAJON	1,80	2,55	8,00		1	36,72
DESCUENTO DE TUBERIA		0,90	-8,00		1	-7,20
PASAN: 218,15					**SUBTOTAL**	35,29
					TOTAL	253,44

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-335410

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 06
CAPITULO:	ESTRUCTURAS DE DRENAJE

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 20+260						
CAJON	4,40	0,10	6,00		1	2,64
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 20+595						
CAJON	4,40	0,10	5,30		1	2,33
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 21+055						
CAJON	4,40	0,10	10,60		1	4,66
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 25+147						
SOLERA	6,5	0,137	1,6	3,00	2	2,08
CAJON	3,00	0,136	6,50		1	2,65
PASAN:					SUBTOTAL	14,36
					TOTAL	14,36

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22276

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		
CAPITULO:	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	BASE MAYOR	ESPESOR	LONGITUD	BASE MENOR	CANTIDAD	TOTAL
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 25+520						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
SOLADO DE LIMPIEZA ALCANTARILLA K 26+165						
SOLERA	4,4	0,10	1,56	1,40	2	0,90
CAJON	1,40	0,10	6,50		1	0,91
PASAN: 14,36 ✓					SUBTOTAL	3,62 ✓
					TOTAL	17,98 ✓

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON PABLO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22277

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N° 06
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.4	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE**	**KG**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	PESO POR MODULO (KG)	CANT. MODULOS	BORDILLO/ DENTELLON/ ZARPA /ALETAS (KG)	SUB TOTAL	TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 20+260					
MEDIO CUERPO	902,05	1,00			902,05
ALETAS, SOLERA, DENTELLON, GUARDARUEDA (1 LADO)	594,95	1,00			594,95
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 20+595					
MEDIO CUERPO	902,05	1,00			902,05
ALETAS Y SOLERA (1 LLADO)	594,95	1,00			594,95
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 21+055					
MEDIO CUERPO	1804,10	1,00			1804,10
ALETAS, SOLERA, DENTELLON, GUARDARUEDA	1189,90	1,00			1189,90
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 25+147					
CUERPO	145,20	12,00		1742,40	1742,40
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			1189,90	1189,90	1189,90
PASAN:				**SUBTOTAL**	8.920,30
				TOTAL	8.920,30

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VASA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.278

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.4	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE**	**KG**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	PESO POR MODULO (KG)	CANT. MODULOS	BORDILLO/ DENTELLON/ ZARPA /ALETAS (KG)	SUB TOTAL	TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 25+520					
CUERPO	145,20	6,00		871,20	871,20
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 26+165					
CUERPO	145,20	6,00		871,20	871,20
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 23+790					
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 24+130					
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa Alcantarilla K 24+360					
BORDILLO / DENTELLON / ALETAS			632,43	632,43	632,43
PASAN: **8.920,30**				**SUBTOTAL**	4.904,55
				TOTAL	13.824,85

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

72.279

CONSORCIO HALCÓN

ACERO DE REFUERZO MEDIO
BOX CULVERT

ELEMENTO POR ELEMENTO

K 20+260




























K20+595

22,280



DESPIECE ELEMENTO POR ELEMENTO MEDIO BOX CULBERT OBRA ESPECIAL No 42 K 20+260

DIAGRAMA			DESCRIPCIÓN	SECCIONES	Cantidad (Un)	LONGITUD (m)	PESO x m(Kg)	Diametro	TOTAL (Kg)
	L:	4,35	PLACA SUPERIOR C2	1,00	29,00	4,75	1,00	1/2"	137,75
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	L:	6,90	PLACA SUPERIOR C1	1,00	19,00	7,30	1,00	1/2"	138,70
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,90	MUROS LATERALES C1	2,00	8,00	7,30	1,00	1/2"	116,80
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	2,60	MUROS LATERALES C5	2,00	29,00	3,00	1,00	1/2"	174,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	4,35	PLACA INFERIOR C4	1,00	42,00	4,85	1,00	1/2"	203,70
	G1:	0,25							
	G2:	0,25							
	L:	6,9	PLACA INFERIOR C3	1,00	19,00	6,90	1,00	1/2"	131,10
SUBTOTAL									**902,05**
G1	L:	0,17	GUARDARRUEDA	2,00	18,00	1,88	0,56	3/8	37,90
	L:	0,17							
	L:	0,67							
	L:	0,67							
	G1:	0,10							
	G2:	0,10							
	L:	4,4	GUARDARRUEDA	2,00	1,00	4,40	1,00	1/2"	8,80
	B:	4,40	GUARDARRUEDA	2,00	2,00	4,80	1,00	1/2"	19,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	0,60	DENTELLON	2,00	15,00	1,00	1,00	1/2"	30,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	3,80	DENTELLON	2,00	2,00	4,00	1,00	1/2"	16,00
	G1:	0,20							
	B:	4,50	SOLERA (S3)	2,00	1,00	4,90	1,00	1/2"	9,80
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	4,85	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,25	1,00	1/2"	10,50
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,20	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,60	1,00	1/2"	11,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,55	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,95	1,00	1/2"	11,90
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,85	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,25	1,00	1/2"	12,50
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,20	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,60	1,00	1/2"	13,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,55	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,95	1,00	1/2"	13,90
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,90	SOLERA (S3)	2,00	1,00	7,30	1,00	1/2"	14,60
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	7,15	SOLERA (S3)	2,00	1,00	7,55	1,00	1/2"	15,10
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	0,50	SOLERA (S2)	2,00	1,00	0,70	1,00	1/2"	1,40
	G1:	0,20							
	B:	0,75	SOLERA (S2)	2,00	1,00	0,95	1,00	1/2"	1,90
	G1:	0,20							
	B:	1,00	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,20	1,00	1/2"	2,40
	G1:	0,20							
	B:	1,25	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,45	1,00	1/2"	2,90
	G1:	0,20							
	B:	1,55	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20							
	B:	1,55	SOLERA (S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20							

72281

	B:	1,55	SOLERA	(S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20								
	B:	1,55	SOLERA	(S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20								
	B:	1,55	SOLERA	(S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20								
	B:	1,55	SOLERA	(S1)	20,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	35,00
	G1:	0,20								
	B:	2,50	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	2,90	1,00	1/2"	5,80
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,60	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,00	1,00	1/2"	6,00
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,70	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,85	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,25	1,00	1/2"	6,50
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,95	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,35	1,00	1/2"	6,70
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,10	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,50	1,00	1/2"	7,00
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,35	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,75	1,00	1/2"	7,50
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,45	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,85	1,00	1/2"	7,70
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	1,00	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	1,80	1,00	1/2"	3,60
	G1:	0,60								
	G2:	0,20								
	B:	1,00	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	G1:	1,90								
	G2:	0,20								
	B:	1,00	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	G1:	2,40								
	G2:	0,20								
	B:	1,00	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	3,90	1,00	1/2"	7,80
	G1:	2,70								
	G2:	0,20								
	B:	2,50	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	2,90	1,00	1/2"	5,80
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,55	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	2,95	1,00	1/2"	5,90
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,60	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,00	1,00	1/2"	6,00
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,70	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,75	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,15	1,00	1/2"	6,30
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,85	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,25	1,00	1/2"	6,50
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,90	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,30	1,00	1/2"	6,60
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,00	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,40	1,00	1/2"	6,80
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,05	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,45	1,00	1/2"	6,90
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,15	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,55	1,00	1/2"	7,10
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,30	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,70	1,00	1/2"	7,40
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								

22.282

	B:	3,35	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,75	1,00	1/2"	7,50
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,45	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,85	1,00	1/2"	7,70
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	1,60	ALETAS	(A4)	2,00	1,00	2,05	1,00	1/2"	4,10
	G1:	0,25								
	G2:	0,20								
	B:	1,90	ALETAS	(A4)	2,00	1,00	2,35	1,00	1/2"	4,70
	G1:	0,25								
	G2:	0,20								
	B:	2,20	ALETAS	(A4)	2,00	1,00	2,65	1,00	1/2"	5,30
	G1:	0,25								
	G2:	0,20								
	B:	2,50	ALETAS	(A4)	2,00	1,00	2,95	1,00	1/2"	5,90
	G1:	0,25								
	G2:	0,20								
	B:	2,70	ALETAS	(A4)	25,00	1,00	3,15	1,00	1/2"	78,75
	G1:	0,25								
	G2:	0,20								
	B:	1,10	ALETAS	(A5)	2,00	12,00	1,30	1,00	1/2"	31,20
	G2:	0,20								
SUBTOTAL										594,95

TOTAL KG	1.497,00

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:



























ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-54802
CONSORCIO INTER AIM

22.283









DESPIECE ELEMENTO POR ELEMENTO MEDIO BOX CULBERT OBRA ESPECIAL No 45 K 20+595

DIAGRAMA			DESCRIPCIÓN	SECCIONES	Cantidad (Un)	LONGITUD (m)	PESO x m(Kg)	Diametro	TOTAL (Kg)
	L:	4,35	PLACA SUPERIOR C2	1,00	29,00	4,75	1,00	1/2"	137,75
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	L:	6,90	PLACA SUPERIOR C1	1,00	19,00	7,30	1,00	1/2"	138,70
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,90	MUROS LATERALES C1	2,00	8,00	7,30	1,00	1/2"	116,80
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	2,60	MUROS LATERALES C5	2,00	29,00	3,00	1,00	1/2"	174,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	4,35	PLACA INFERIOR C4	1,00	42,00	4,85	1,00	1/2"	203,70
	G1:	0,25							
	G2:	0,25							
	L:	6,9	PLACA INFERIOR C3	1,00	19,00	6,90	1,00	1/2"	131,10
SUBTOTAL									902,05
	L:	0,17	GUARDARRUEDA	2,00	18,00	1,88	0,56	3/8	37,90
	L:	0,17							
	L:	0,67							
	L:	0,67							
	G1:	0,10							
	G2:	0,10							
	L:	4,4	GUARDARRUEDA	2,00	1,00	4,40	1,00	1/2"	8,80
	B:	4,40	GUARDARRUEDA	2,00	2,00	4,80	1,00	1/2"	19,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	0,60	DENTELLON	2,00	15,00	1,00	1,00	1/2"	30,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	3,80	DENTELLON	2,00	2,00	4,00	1,00	1/2"	16,00
	G1:	0,20							
	B:	4,50	SOLERA (S3)	2,00	1,00	4,90	1,00	1/2"	9,80
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	4,85	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,25	1,00	1/2"	10,50
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,20	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,60	1,00	1/2"	11,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,55	SOLERA (S3)	2,00	1,00	5,95	1,00	1/2"	11,90
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,85	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,25	1,00	1/2"	12,50
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,20	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,60	1,00	1/2"	13,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,55	SOLERA (S3)	2,00	1,00	6,95	1,00	1/2"	13,90
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,90	SOLERA (S3)	2,00	1,00	7,30	1,00	1/2"	14,60
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	7,15	SOLERA (S3)	2,00	1,00	7,55	1,00	1/2"	15,10
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	0,50	SOLERA (S2)	2,00	1,00	0,70	1,00	1/2"	1,40
	G1:	0,20							
	B:	0,75	SOLERA (S2)	2,00	1,00	0,95	1,00	1/2"	1,90
	G1:	0,20							
	B:	1,00	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,20	1,00	1/2"	2,40
	G1:	0,20							
	B:	1,25	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,45	1,00	1/2"	2,90
	G1:	0,20							
	B:	1,55	SOLERA (S2)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20							
	B:	1,55	SOLERA (S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20							

22284

	B:	1,55	SOLERA	(S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20								
	B:	1,55	SOLERA	(S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20								
	B:	1,55	SOLERA	(S1)	2,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	3,50
	G1:	0,20								
	B:	1,55	SOLERA	(S1)	20,00	1,00	1,75	1,00	1/2"	35,00
	G1:	0,20								
	B:	2,50	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	2,90	1,00	1/2"	5,80
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,60	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,00	1,00	1/2"	6,00
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,70	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,85	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,25	1,00	1/2"	6,50
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,95	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,35	1,00	1/2"	6,70
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,10	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,50	1,00	1/2"	7,00
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,20	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,35	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,75	1,00	1/2"	7,50
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,45	ALETAS	(A1)	2,00	1,00	3,85	1,00	1/2"	7,70
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	1,00	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	1,80	1,00	1/2"	3,60
	G1:	0,60								
	G2:	0,20								
	B:	1,00	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	G1:	1,90								
	G2:	0,20								
	B:	1,00	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	G1:	2,40								
	G2:	0,20								
	B:	1,00	ALETAS	(A2)	2,00	1,00	3,90	1,00	1/2"	7,80
	G1:	2,70								
	G2:	0,20								
	B:	2,50	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	2,90	1,00	1/2"	5,80
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,55	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	2,95	1,00	1/2"	5,90
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,60	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,00	1,00	1/2"	6,00
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,70	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,10	1,00	1/2"	6,20
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,75	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,15	1,00	1/2"	6,30
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,85	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,25	1,00	1/2"	6,50
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	2,90	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,30	1,00	1/2"	6,60
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,00	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,40	1,00	1/2"	6,80
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,05	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,45	1,00	1/2"	6,90
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,15	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,55	1,00	1/2"	7,10
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,20	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,60	1,00	1/2"	7,20
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,30	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,70	1,00	1/2"	7,40
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								

22.285

	B:	3,35	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,75	1,00	1/2"	7,50
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	3,45	ALETAS	(A3)	2,00	1,00	3,85	1,00	1/2"	7,70
	G1:	0,20								
	G2:	0,20								
	B:	1,60	ALETAS	(A4)	2,00	1,00	2,05	1,00	1/2"	4,10
	G1:	0,25								
	G2:	0,20								
	B:	1,90	ALETAS	(A4)	2,00	1,00	2,35	1,00	1/2"	4,70
	G1:	0,25								
	G2:	0,20								
	B:	2,20	ALETAS	(A4)	2,00	1,00	2,65	1,00	1/2"	5,30
	G1:	0,25								
	G2:	0,20								
	B:	2,50	ALETAS	(A4)	2,00	1,00	2,95	1,00	1/2"	5,90
	G1:	0,25								
	G2:	0,20								
	B:	2,70	ALETAS	(A4)	25,00	1,00	3,15	1,00	1/2"	78,75
	G1:	0,25								
	G2:	0,20								
	B:	1,10	ALETAS	(A5)	2,00	12,00	1,30	1,00	1/2"	31,20
	G2:	0,20								
SUBTOTAL										**594,95**

TOTAL KG	**1.497,00**

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-54802
CONSORCIO INTER AIM

22.286

CONSORCIO HALCÓN

ACERO DE REFUERZO BOX CULVERT


















ELEMENTO POR ELEMENTO

K 21+055









72287

DESPIECE ELEMENTO POR ELEMENTO BOX CULBERT OBRA ESPECIAL No 47 K 21+055

DIAGRAMA			DESCRIPCIÓN	SECCIONES	Cantidad (Un)	LONGITUD (m)	PESO x m(Kg)	Diametro	TOTAL (Kg)
	L:	4,35	PLACA SUPERIOR C2	1,00	58,00	4,75	1,00	1/2"	275,50
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	L:	6,90	PLACA SUPERIOR C1	1,00	38,00	7,30	1,00	1/2"	277,40
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,90	MUROS LATERALES C1	2,00	16,00	7,30	1,00	1/2"	233,60
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	2,60	MUROS LATERALES C5	2,00	58,00	3,00	1,00	1/2"	348,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	4,35	PLACA INFERIOR C4	1,00	84,00	4,85	1,00	1/2"	407,40
	G1:	0,25							
	G2:	0,25							
	L:	6,9	PLACA INFERIOR C3	1,00	38,00	6,90	1,00	1/2"	262,20
SUBTOTAL									**1.804,10**
	L:	0,17	GUARDARRUEDA	2,00	36,00	1,88	0,56	3/8	75,80
	L:	0,17							
	L:	0,67							
	L:	0,67							
	G1:	0,10							
	G2:	0,10							
	L:	4,4	GUARDARRUEDA	2,00	2,00	4,40	1,00	1/2"	17,60
	B:	4,40	GUARDARRUEDA	2,00	4,00	4,80	1,00	1/2"	38,40
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	0,60	DENTELLON	2,00	30,00	1,00	1,00	1/2"	60,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	3,80	DENTELLON	2,00	4,00	4,00	1,00	1/2"	32,00
	G1:	0,20							
	B:	4,50	SOLERA (S3)	2,00	2,00	4,90	1,00	1/2"	19,60
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	4,85	SOLERA (S3)	2,00	2,00	5,25	1,00	1/2"	21,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	5,60	1,00	1/2"	22,40
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,55	SOLERA (S3)	2,00	2,00	5,95	1,00	1/2"	23,80
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	5,85	SOLERA (S3)	2,00	2,00	6,25	1,00	1/2"	25,00
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	6,60	1,00	1/2"	26,40
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,55	SOLERA (S3)	2,00	2,00	6,95	1,00	1/2"	27,80
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	6,90	SOLERA (S3)	2,00	2,00	7,30	1,00	1/2"	29,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	7,15	SOLERA (S3)	2,00	2,00	7,55	1,00	1/2"	30,20
	G1:	0,20							
	G2:	0,20							
	B:	0,50	SOLERA (S2)	2,00	2,00	0,70	1,00	1/2"	2,80
	G1:	0,20							
	B:	0,75	SOLERA (S2)	2,00	2,00	0,95	1,00	1/2"	3,80
	G1:	0,20							
	B:	1,00	SOLERA (S2)	2,00	2,00	1,20	1,00	1/2"	4,80
	G1:	0,20							
	B:	1,25	SOLERA (S2)	2,00	2,00	1,45	1,00	1/2"	5,80
	G1:	0,20							
	B:	1,55	SOLERA (S2)	2,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	7,00
	G1:	0,20							
	B:	1,55	SOLERA (S1)	2,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	7,00
	G1:	0,20							

	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	2,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	7,00
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	2,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	7,00
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	2,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	7,00
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	20,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	70,00
	B: 2,50 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	2,90	1,00	1/2"	11,60
	B: 2,60 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,00	1,00	1/2"	12,00
	B: 2,70 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,10	1,00	1/2"	12,40
	B: 2,85 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,25	1,00	1/2"	13,00
	B: 2,95 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,35	1,00	1/2"	13,40
	B: 3,10 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,50	1,00	1/2"	14,00
	B: 3,20 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,60	1,00	1/2"	14,40
	B: 3,35 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,75	1,00	1/2"	15,00
	B: 3,45 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,85	1,00	1/2"	15,40
	B: 1,00 G1: 0,60 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	2,00	1,80	1,00	1/2"	7,20
	B: 1,00 G1: 1,90 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	2,00	3,10	1,00	1/2"	12,40
	B: 1,00 G1: 2,40 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	2,00	3,60	1,00	1/2"	14,40
	B: 1,00 G1: 2,70 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	2,00	3,90	1,00	1/2"	15,60
	B: 2,50 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	2,90	1,00	1/2"	11,60
	B: 2,55 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	2,95	1,00	1/2"	11,80
	B: 2,60 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,00	1,00	1/2"	12,00
	B: 2,70 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,10	1,00	1/2"	12,40
	B: 2,75 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,15	1,00	1/2"	12,60
	B: 2,85 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,25	1,00	1/2"	13,00
	B: 2,90 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,30	1,00	1/2"	13,20
	B: 3,00 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,40	1,00	1/2"	13,60
	B: 3,05 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,45	1,00	1/2"	13,80
	B: 3,15 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,55	1,00	1/2"	14,20
	B: 3,20 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,60	1,00	1/2"	14,40
	B: 3,30 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,70	1,00	1/2"	14,80

22289

	B: G1: G2:	3,35 0,20 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,75	1,00	1/2"	15,00
	B: G1: G2:	3,45 0,20 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,85	1,00	1/2"	15,40
	B: G1: G2:	1,60 0,25 0,20	ALETAS (A4)	2,00	2,00	2,05	1,00	1/2"	8,20
	B: G1: G2:	1,90 0,25 0,20	ALETAS (A4)	2,00	2,00	2,35	1,00	1/2"	9,40
	B: G1: G2:	2,20 0,25 0,20	ALETAS (A4)	2,00	2,00	2,65	1,00	1/2"	10,60
	B: G1: G2:	2,50 0,25 0,20	ALETAS (A4)	2,00	2,00	2,95	1,00	1/2"	11,80
	B: G1: G2:	2,70 0,25 0,20	ALETAS (A4)	25,00	2,00	3,15	1,00	1/2"	157,50
	B: G2:	1,10 0,20	ALETAS (A5)	2,00	24,00	1,30	1,00	1/2"	62,40
SUBTOTAL									1.189,90

TOTAL KG	2.994,00

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-54802
CONSORCIO INTER AIM

22290

CONSORCIO HALCÓN

ACERO DE REFUERZO BOX CULVERT

ELEMENTO POR ELEMENTO



K 25+147

22.291

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2,CG60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE

BOX 1 X 1

Cantidad de acero elemento por elemento Box Culvert Proyecto. BPIN 2021005500215 - La Estaca - Veracruz

Diagrama	DIAMETRO	PESO ACERO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	PESO TOTAL
ACERO POR MODULO					
ANILLO INTERNO					
	#4	1	4,8	2	9,6
	#4	1	1,67	8	13,36
	#4	1	1,72	8	13,76
	#4	1	1,315	20	26,3
ANILLO EXTERNO					
	#4	1	5,58	6	33,48
	#4	1	1,315	20	26,3
	#4	1	0,8	28	22,4

PESO TOTAL POR MODULO	145,20

TOTAL BOX CULVERT			
CANTIDAD DE MODULOS	PESO POR MODULO	PESO ALETAS/BORDILLO/DENTELLON	PESO TOTAL BOX (KG)
12	145,20		1742,40


















FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON


























FIRMA:

ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-54802
CONSORCIO INTER AIM

DESPIECE ELEMENTO POR ELEMENTO BOX CULBERT OBRA ESPECIAL No 59 K25+147

	L: 0,17 L: 0,17 L: 0,67 L: 0,67 G1: 0,10 G2: 0,10	GUARDARRUEDA	2,00	36,00	1,88	0,56	3/8	75,80
	L: 4,4	GUARDARRUEDA	2,00	2,00	4,40	1,00	1/2"	17,60
	B: 4,40 G1: 0,20 G2: 0,20	GUARDARRUEDA	2,00	4,00	4,80	1,00	1/2"	38,40
	B: 0,60 G1: 0,20 G2: 0,20	DENTELLON	2,00	30,00	1,00	1,00	1/2"	60,00
	B: 3,80 G1: 0,20	DENTELLON	2,00	4,00	4,00	1,00	1/2"	32,00
	B: 4,50 G1: 0,20 G2: 0,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	4,90	1,00	1/2"	19,60
	B: 4,85 G1: 0,20 G2: 0,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	5,25	1,00	1/2"	21,00
	B: 5,20 G1: 0,20 G2: 0,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	5,60	1,00	1/2"	22,40
	B: 5,55 G1: 0,20 G2: 0,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	5,95	1,00	1/2"	23,80
	B: 5,85 G1: 0,20 G2: 0,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	6,25	1,00	1/2"	25,00
	B: 6,20 G1: 0,20 G2: 0,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	6,60	1,00	1/2"	26,40
	B: 6,55 G1: 0,20 G2: 0,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	6,95	1,00	1/2"	27,80
	B: 6,90 G1: 0,20 G2: 0,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	7,30	1,00	1/2"	29,20
	B: 7,15 G1: 0,20 G2: 0,20	SOLERA (S3)	2,00	2,00	7,55	1,00	1/2"	30,20
	B: 0,50 G1: 0,20	SOLERA (S2)	2,00	2,00	0,70	1,00	1/2"	2,80
	B: 0,75 G1: 0,20	SOLERA (S2)	2,00	2,00	0,95	1,00	1/2"	3,80
	B: 1,00 G1: 0,20	SOLERA (S2)	2,00	2,00	1,20	1,00	1/2"	4,80
	B: 1,25 G1: 0,20	SOLERA (S2)	2,00	2,00	1,45	1,00	1/2"	5,80
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S2)	2,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	7,00
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	2,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	7,00
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	2,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	7,00
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	2,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	7,00
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	2,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	7,00
	B: 1,55 G1: 0,20	SOLERA (S1)	20,00	2,00	1,75	1,00	1/2"	70,00
	B: 2,50 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	2,90	1,00	1/2"	11,60
	B: 2,60 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,00	1,00	1/2"	12,00
	B: 2,70 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,10	1,00	1/2"	12,40
	B: 2,85 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,25	1,00	1/2"	13,00
	B: 2,95 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,35	1,00	1/2"	13,40

22293

	B: 3,10 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,50	1,00	1/2"	14,00
	B: 3,20 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,60	1,00	1/2"	14,40
	B: 3,35 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,75	1,00	1/2"	15,00
	B: 3,45 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A1)	2,00	2,00	3,85	1,00	1/2"	15,40
	B: 1,00 G1: 0,60 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	2,00	1,80	1,00	1/2"	7,20
	B: 1,00 G1: 1,90 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	2,00	3,10	1,00	1/2"	12,40
	B: 1,00 G1: 2,40 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	2,00	3,60	1,00	1/2"	14,40
	B: 1,00 G1: 2,70 G2: 0,20	ALETAS (A2)	2,00	2,00	3,90	1,00	1/2"	15,60
	B: 2,50 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	2,90	1,00	1/2"	11,60
	B: 2,55 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	2,95	1,00	1/2"	11,80
	B: 2,60 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,00	1,00	1/2"	12,00
	B: 2,70 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,10	1,00	1/2"	12,40
	B: 2,75 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,15	1,00	1/2"	12,60
	B: 2,85 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,25	1,00	1/2"	13,00
	B: 2,90 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,30	1,00	1/2"	13,20
	B: 3,00 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,40	1,00	1/2"	13,60
	B: 3,05 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,45	1,00	1/2"	13,80
	B: 3,15 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,55	1,00	1/2"	14,20
	B: 3,20 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,60	1,00	1/2"	14,40
	B: 3,30 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,70	1,00	1/2"	14,80
	B: 3,35 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,75	1,00	1/2"	15,00
	B: 3,45 G1: 0,20 G2: 0,20	ALETAS (A3)	2,00	2,00	3,85	1,00	1/2"	15,40
	B: 1,60 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	2,00	2,05	1,00	1/2"	8,20
	B: 1,90 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	2,00	2,35	1,00	1/2"	9,40
	B: 2,20 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	2,00	2,65	1,00	1/2"	10,60
	B: 2,50 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	2,00	2,00	2,95	1,00	1/2"	11,80
	B: 2,70 G1: 0,25 G2: 0,20	ALETAS (A4)	25,00	2,00	3,15	1,00	1/2"	157,50
	B: 1,10 G2: 0,20	ALETAS (A5)	2,00	24,00	1,30	1,00	1/2"	62,40
SUBTOTAL								1.189,90

TOTAL KG	2.994,00

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCÓN

FIRMA:

ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-54802
CONSORCIO INTER AIM

22.294

CONSORCIO HALCÓN

ACERO DE REFUERZO BOX CULVERT

ELEMENTO POR ELEMENTO













K 25+520

K 26+165



















22295

CONSORCIO HIALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2,CG60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE

ACERO BOX 1X1

Diagramas	Cantidad	Diametro	Longitud	Peso
ALETAS				
	8	#4	2,35	18,80
	8	#4	2,31	18,48
	8	#4	2,27	18,16
	8	#4	2,23	17,84
	8	#4	2,19	17,52
	8	#4	2,15	17,20
	8	#4	2,11	16,88
	8	#4	2,07	16,56
	8	#4	2,03	16,24
	8	#4	1,99	15,92
	8	#4	1,95	15,60
	8	#4	1,91	15,28
	8	#4	1,87	14,96
	48	#4	2	96,00
	8	#4	1,4	11,20
Sub total	**160**			**326,64**
BORDILLOS				
B1 	12	#4	1,7	20,40
	12	#3	1,6	10,75
Sub total	**24**			**31,15**

22.296

ZARPA Y DENTELLON				
	12	#4	4,6	55,20
	4	#4	4,33	17,32
	4	#4	3,85	15,40
	4	#4	3,37	13,48
	4	#4	2,89	11,56
	4	#4	2,41	9,64
	4	#4	1,94	7,76
	24	#4	1,7	40,80
	4	#4	1,75	7,00
	4	#4	1,48	5,92
	4	#4	1,23	4,92
	4	#4	0,95	3,80
	4	#4	0,7	2,80
	4	#4	1,75	7,00
	4	#4	1,48	5,92
	4	#4	1,23	4,92
	4	#4	0,95	3,80
	4	#4	0,7	2,80
	26	#4	1,05	27,30
	26	#4	1,05	27,30
Sub total	152			274,64



TOTAL ALETAS, BORDILLOS, DENTELLON		
Cantidad de elementos		Peso
336		632,43

22.297

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2,CG60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE

BOX 1 X 1

Cantidad de acero elemento por elemento Box Culvert Proyecto. BPIN 2021005500215 - La Estaca - Veracruz

Diagrama	DIAMETRO	PESO ACERO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	PESO TOTAL
ACERO POR MODULO					
ANILLO INTERNO					
	#4	1	4,8	2	9,6
	#4	1	1,67	8	13,36
	#4	1	1,72	8	13,76
	#4	1	1,315	20	26,3
ANILLO EXTERNO					
	#4	1	5,58	6	33,48
	#4	1	1,315	20	26,3
	#4	1	0,8	28	22,4

PESO TOTAL POR MODULO	145,20

TOTAL BOX CULVERT			
CANTIDAD DE MODULOS	PESO POR MODULO	PESO ALETAS/BORDILLO/DENTELLON	PESO TOTAL BOX (KG)
5	145,20	632,43	1358,43
5,5	145,20	632,43	1431,03
6	145,20	632,43	1503,63
6,5	145,20	632,43	1576,23

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-54802
CONSORCIO INTER AIM

22.298

CONSORCIO HALCÓN

ACERO DE REFUERZO BOX CULVERT

ELEMENTO POR ELEMENTO

K 23+790
















K 24+130

K24+360



















22.299

CONSORCIO HIALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2,CG60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE

ACERO BOX 1X1

Diagramas	Cantidad	Diametro	Longitud	Peso
ALETAS				
	8	#4	2,35	18,80
	8	#4	2,31	18,48
	8	#4	2,27	18,16
	8	#4	2,23	17,84
	8	#4	2,19	17,52
	8	#4	2,15	17,20
	8	#4	2,11	16,88
	8	#4	2,07	16,56
	8	#4	2,03	16,24
	8	#4	1,99	15,92
	8	#4	1,95	15,60
	8	#4	1,91	15,28
	8	#4	1,87	14,96
	48	#4	2	96,00
	8	#4	1,4	11,20
Sub total	**160**			**326,64**
BORDILLOS				
B1 	12	#4	1,7	20,40
	12	#3	1,6	10,75
Sub total	**24**			**31,15**

22.300

ZARPA Y DENTELLON					
	12	#4	4,6	55,20
	4	#4	4,33	17,32
	4	#4	3,85	15,40
	4	#4	3,37	13,48
	4	#4	2,89	11,56
	4	#4	2,41	9,64
	4	#4	1,94	7,76
	24	#4	1,7	40,80
	4	#4	1,75	7,00
	4	#4	1,48	5,92
	4	#4	1,23	4,92
	4	#4	0,95	3,80
	4	#4	0,7	2,80
	4	#4	1,75	7,00
	4	#4	1,48	5,92
	4	#4	1,23	4,92
	4	#4	0,95	3,80
	4	#4	0,7	2,80
	26	#4	1,05	27,30
	26	#4	1,05	27,30
Sub total	**152**			**274,64**

TOTAL ALETAS, BORDILLOS, DENTELLON		
Cantidad de elementos		**Peso**
336		632,43

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-54802
CONSORCIO INTER AIM

2230/

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.5	**BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	VOLUMEN POR MODULO	**CANTIDAD DE MODULOS**	**VOL. ALETAS/ZARPA/DENTELLON/GUARDARUEDA**	**SUB TOTAL**	**TOTAL**
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 20+260	**LONGITUD**	**ANCHO / ALTO**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	
PLACA SUPERIOR E INFERIOR (MEDIO CUERPO)	3,5	4,5	0,35	2	11,03
MUROS (MEDIO CUERPO)	3,5	2	0,25	2	3,50
SOLERA DEL DESCOLE	5,78	1,6	0,25	1	2,31
DENTELLON DEL DESCOLE	4,5	0,45	0,3	1	0,61
ALETAS DEL DESCOLE	2,5	2,05	0,2	2	2,05
GUARDARRUEDA DERECHO	4,5	0,4	0,28	1	0,50
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 20+595	**LONGITUD**	**ANCHO / ALTO**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	
PLACA SUPERIOR E INFERIOR (MEDIO CUERPO)	3,5	4,5	0,35	2	11,03
MUROS (MEDIO CUERPO)	3,5	2	0,25	2	3,50
SOLERA DEL DESCOLE	5,78	1,6	0,25	1	2,31
DENTELLON DEL DESCOLE	4,5	0,45	0,3	1	0,61
ALETAS DEL DESCOLE	2,5	2,05	0,2	3	3,08
GUARDARRUEDA DERECHO	4,5	0,4	0,28	1	0,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	41,03
				TOTAL	41,03

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

27307

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		

CAPITULO:	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VOLUMEN POR MODULO	CANTIDAD DE MODULOS	VOL. ALETAS/ZARPA/DENTELLON/GUARDARUEDA	SUB TOTAL	TOTAL
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 21+055	**LONGITUD**	**ANCHO / ALTO**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	
PLACA SUPERIOR E INFERIOR	7	4,5	0,35	2	22,05
MUROS	7	2	0,25	2	7,00
SOLERA	5,78	1,6	0,25	2	4,62
DENTELLON	4,5	0,45	0,3	2	1,22
ALETAS	2,5	2,05	0,2	4	4,10
GUARDARRUEDA IZQUIERDO	4,5	0,4	0,28	2	1,01
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 25+147					
CUERPO (DOBLE)	1,339	12		1	16,07
ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA			6,72		6,72
Concreto 20,7 Mpa - Alcantarilla K 25+520					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	6	4,430401901893	12,4644019	12,464401901893
PASAN: **41,03**				**SUBTOTAL**	75,245401901893
				TOTAL	116,277901901893

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.303

CONSORCIO HALCÓN

CONCRETO POR MODULOS
BOX CULVERT

K 21+055

K 25+147

K 25+520

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

LOSA SUPERIOR					
LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL M3
1,3	1,4	0,2	0,4	1	0,36
LOSA INFERIOR					
LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL M3
1,3	1,4	0,25	0,5	1	0,46
PAREDES LATERALES					
LONGITUD	ALTO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL M3
1,3	1	0,2	0,26	2	0,52

VOLUMEN TOTAL POR MODULO	1,339

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON





FIRMA:

ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-54802
CONSORCIO INTER AIM

22.305

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

CONCRETO ZARPA, DENTELLON, BORDILLO Y ALETAS BOX CULVERT 1 X 1

DIAGRAMA	DESCRIPCION	BASE MAYOR	BASE MENOR	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN m3
	ZARPA	4,20	1,60	2,15	0,25	2,00	3,118
	DENTELLON	4,20		0,45	0,25	2,00	0,945
	BORDILLO	0,30	0,25	0,72	0,20	2,00	0,079
	ALETAS	1,92	1,30	2,00	0,20	4,00	2,576
						TOTAL m3	6,718

TOTAL BOX CULVERT 1X1			
CANTIDAD DE MODULOS	VOLUMEN POR MODULO	VOLUMEN ALETAS/ZARPA/DENTELLON/GUARD ARUEDA	VOL. TOTAL BOX (KG)
5	1,339	6,718	13,41
5,5	1,339	6,718	14,08
6	1,339	6,718	14,75
6,5	1,339	6,718	15,42

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-54802
CONSORCIO INTER AIM

CONSORCIO HALCÓN

CONCRETO BOX CULVERT

K 20+260

K 20+595

22.307

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

CONCRETO MEDIO CUERPO DE BOX CULVERT 4X2

DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ESPESOR	CANTIDAD	VOLUMEN m3
PLACA INFERIOR Y SUPERIOR	3,50	4,50		0,35	2,00	11,03
MURO	3,50		2,00	0,25	2,00	3,50
					TOTAL m3	14,53

FIRMA:

ING. OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 52202-81335
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-54802
CONSORCIO INTER AIM

22.308

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	**Parcial N° 06**		

CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.6	**RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, COMPACTACIÓN MANUAL**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K20+595 (MEDIO)	1,00	3,65	3,80		13,87
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K20+260 (MEDIO)	1,00	3,65	3,80		13,87
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K21+055	1,00	3,65	7,60		27,74
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K25+147	1,00	3,06	7,60		23,26
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K25+520	0,80	1,55	7,60		9,42
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO BOX COULVERT K26+165	0,80	1,55	7,60		9,42
PASAN:				**SUBTOTAL**	97,58
				TOTAL	97,58

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-73964 CND

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22309

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N° 06		
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DIAS			CANTIDAD	TOTAL
MANEJO DE AGUA DE EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLAS	45,00			1	45
PASAN:				SUBTOTAL	45,00
				TOTAL	45,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.310

CONSORCIO HALCÓN

INFORME DE OBRA

22.311

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL No. 06
Periodo de 06/09/2024 a 10/10/2024
Fecha de Presentación: 14 OCT. 2024

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 30.157.618.889,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 30.157.618.889,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
CORREO ELECTRÓNICO:	gerencia@camelingenieria.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRÓNICO:	consorciointeraim@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA No. 1 (12 julio 2024 al 11 de octubre 2024)	3 MESES
PRORROGA No. 2 (11 de octubre de 2024 al 30 de diciembre 2024)	2 MESES 19 DIAS
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.312

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

REINICIO:			N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:			30/12/2024
17	Meses	19	Días

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	Cumaral	**VEREDA:**	Veracruz
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	N/A
COMUNA:	N/A	N/A	N/A

COORDENADAS:

PUNTO	DESCRIPCIÓN	COORD. ESTE	COORD. NORTE
1	Cruce vía nacional ruta 65	671867,41	470949,38
2	Centro poblado de Veracruz	696793,17	468276,77

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

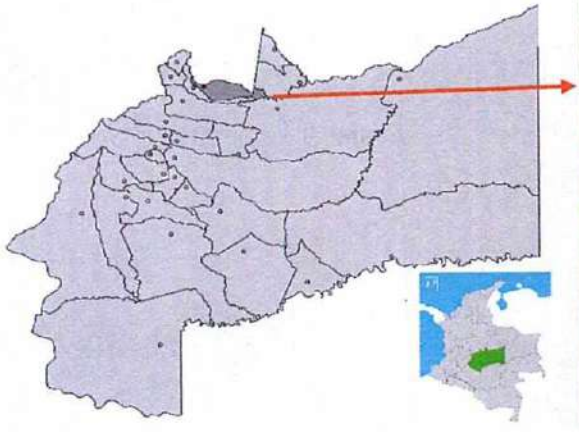


Ilustración 1 Localización, Departamento del meta - Municipio Cumaral (Fernando, 2007)



Ilustración 2 Municipio Cumaral, vía que comunica el centro poblado de Veracruz con el cruce de la vía nacional ruta 65 en el municipio de Cumaral (Fuente Google Earth)

22313

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

A. INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 13 junio 2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	PRELIMINARES													
1.1	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	26,34	$ 2.907.481,00	$ 76.583.050,00	26,34	$ 76.583.050,00	26,34	$ 76.583.050,00	0,00	$ 0,00	26,34	$ 76.583.050,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 76.583.050**		**$ 76.583.050**		**$ 76.583.050**		**$ -**		**$ 76.583.050**	
2	EXCAVACIONES													
2.1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	12.821,17	$ 53.067,00	$ 680.381.028,00	12.957,34	$ 687.607.039,00	12.901,60	$ 684.649.207,20	55,74	$ 2.957.831,80	12.957,34	$ 687.607.039,00	100,00%
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	3.738,47	$ 40.581,00	$ 151.710.851,00	3.738,47	$ 151.710.851,00	2.935,29	$ 119.117.003,49	675,74	$ 27.422.204,94	3.611,03	$ 146.539.208,43	96,59 %

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.314

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

2.3	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2,00 M INCLUYE CARGUE LAMINAS DE ACERO INTERMEDIAS DE 3MM	M3	119,84	$ 80.432,00	$ 9.638.971,00	30,00	$ 2.412.960,00	30,00	$ 2.412.960,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 2.412.960,00	100,00%
2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	11.913,91	$ 8.287,00	$ 98.730.572,00	11.913,91	$ 98.730.572,00	11.888,64	$ 98.521.159,68	25,27	$ 209.412,32	11.913,91	$ 98.730.572,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 940.461.422,00**		**$ 940.461.422,00**		**$ 904.700.330,37**		**$ 30.589.449,06**		**$ 935.289.779,43**	
3	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENOS**													
3.1	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	28.713,43	$ 151.465,00	$ 4.349.079.675,00	28.713,43	$ 4.349.079.675,00	22.890,00	$ 3.467.033.850,00	4.360,00	$ 660.387.400,00	27.250,00	$ 4.127.421.250,00	94,90%
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	24.633,36	$ 42.956,00	$ 1.058.150.612,00	50.293,34	$ 2.160.400.902,00	49.539,20	$ 2.128.005.875,20	320,00	$ 13.745.920,00	49.859,20	$ 2.141.751.795,20	99,14%
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	2.783.182,90	$ 1.879,00	$ 5.229.600.669,00	2.196.567,53	$ 4.127.350.379,00	1.991.709,41	$ 3.742.421.981,39	204.858,12	$ 384.928.397,61	2.196.567,53	$ 4.127.350.379,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 10.636.830.956,00**		**$ 10.636.830.956,00**		**$ 9.337.461.706,59**		**$ 1.059.061.717,61**		**$ 10.396.523.424,20**	
4	**PAVIMENTO FLEXIBLE**													
4.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	12.645,25	$ 948.657,00	$ 11.996.004.929,00	12.645,25	$ 11.996.004.929,00	9.355,20	$ 8.874.875.966,40	2.136,00	$ 2.026.331.352,00	11.491,20	$ 10.901.207.318,40	90,87%

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

4.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	171.237,76	$ 4.631,00	$ 793.002.067,00	171.237,76	$ 793.002.067,00	126.685,00	$ 586.678.235,00	28.925,00	$ 133.951.675,00	155.610,00	$ 720.629.910,00	90,87 %
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	739.747,10	$ 2.155,00	$ 1.594.155.001,00	739.747,10	$ 1.594.155.001,00	521.452,66	$ 1.123.730.482,30	144.703,30	$ 311.835.611,50	666.155,96	$ 1.435.566.093,80	90,05 %
	SUBTOTAL				**$ 14.383.161.997,00**		**$ 14.383.161.997,00**		**$ 10.585.284.683,70**		**$ 2.472.118.638,50**		**$ 13.057.403.322,20**	
5	**SEÑALIZACIÓN**													
5.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	61.389,62	$ 4.953,00	$ 304.062.788,00	61.389,62	$ 304.062.788,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
5.2	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA (ML) A=0.12 M INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	3.241,33	$ 17.182,00	$ 55.692.532,00	3.241,33	$ 55.692.532,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
5.3	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	8.878,00	$ 13.385,00	$ 118.832.030,00	8.878,00	$ 118.832.030,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
5.4	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	232,00	$ 368.541,00	$ 85.501.512,00	232,00	$ 85.501.512,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%

22.316

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

5.5	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	117,00	$ 361.403,00	$ 42.284.151,00	117,00	$ 42.284.151,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 606.373.013,00**		**$ 606.373.013,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
6	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**													
6.1	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3	2.113,56	$ 87.925,00	$ 185.834.763,00	2.113,56	$ 185.834.763,00	1.860,12	$ 163.551.051,00	253,44	$ 22.283.712,00	2.113,56	$ 185.834.763,00	100,00%
6.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	79,23	$ 373.501,00	$ 29.592.484,00	79,23	$ 29.592.484,00	79,23	$ 29.592.484,00	0,00	$ 0,00	79,23	$ 29.592.484,00	100,00%
6.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	68,75	$ 675.916,00	$ 46.469.225,00	94,76	$ 64.049.800,00	76,78	$ 51.896.830,48	17,98	$ 12.152.969,52	94,76	$ 64.049.800,00	100,00%
6.4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	75.288,32	$ 8.973,00	$ 675.562.095,00	89.606,83	$ 804.042.084,00	75.101,19	$ 673.882.977,87	13.824,85	$ 124.050.379,05	88.926,04	$ 797.933.356,92	99,24%
6.5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.063,72	$ 1.137.025,00	$ 1.209.476.233,00	925,62	$ 1.052.450.695,00	809,34	$ 920.239.813,50	116,28	$ 132.210.881,50	925,62	$ 1.052.450.695,00	100,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

6.6	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	480,62	$ 81.012,00	$ 38.935.987,00	615,97	$ 49.900.961,00	518,39	$ 41.995.810,68	97,58	$ 7.905.150,32	615,97	$ 49.900.961,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.185.870.787,00**		**$ 2.185.870.787,00**		**$ 1.881.158.967,53**		**$ 298.603.092,39**		**$ 2.179.762.059,92**	
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													
7.1	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	1.070,00	$ 220.942,00	$ 236.407.940,00	1.070,00	$ 236.407.940,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
7.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	120,00	$ 288.616,00	$ 34.633.920,00	120,00	$ 34.633.920,00	45,00	$ 12.987.720,00	45,00	$ 12.987.720,00	90,00	$ 25.975.440,00	75,00 %
	SUBTOTAL				**$ 271.041.860,00**		**$ 271.041.860,00**		**$ 12.987.720,00**		**$ 12.987.720,00**		**$ 25.975.440,00**	
8	**URBANISMO**													
	PRELIMINARES													
8.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.20 M	M3	201,91	$ 18.617,00	$ 3.758.958,00	201,91	$ 3.758.958,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.758.958,00**		**$ 3.758.958,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**													
9.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	605,74	$ 72.389,00	$ 43.848.913,00	605,74	$ 43.848.913,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
9.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	504,78	$ 124.750,00	$ 62.971.305,00	504,78	$ 62.971.305,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

	SUBTOTAL				**$ 106.820.218,00**		**$ 106.820.218,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
10	**ANDENES**													
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	801,30	$ 131.102,00	$ 105.052.033,00	801,30	$ 105.052.033,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.2	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	56,09	$ 747.323,00	$ 41.917.347,00	56,09	$ 41.917.347,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.3	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU.	M2	713,04	$ 147.975,00	$ 105.512.094,00	713,04	$ 105.512.094,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.4	LOSETA A-40; 600X200X600 MM.	M2	160,26	$ 152.410,00	$ 24.425.227,00	160,26	$ 24.425.227,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO	UN	8,00	$ 127.230,00	$ 1.017.840,00	8,00	$ 1.017.840,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO	ML	12,00	$ 127.230,00	$ 1.526.760,00	12,00	$ 1.526.760,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
10.7	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 27" CLASE II NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	110,60	$ 682.741,00	$ 75.511.155,00	110,60	$ 75.511.155,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 354.962.456,00**		**$ 354.962.456,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
11	**MOBILIARIO**													

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

61322

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

11.1	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UN	11,00	$ 1.101.402,00	$ 12.115.422,00	11,00	$ 12.115.422,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
11.2	BANCA EN CONCRETRO SIN ESPALDAR TIPO M31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 720.309,00	$ 11.524.944,00	16,00	$ 11.524.944,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
11.3	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 150W FABRICADA EN ALUMINIO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO 18.000 LUMENS 3000K/4000K/5000K/5700K,CON FOTO CELDA COMPLETA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18,00	$ 2.639.429,00	$ 47.509.722,00	18,00	$ 47.509.722,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
11.4	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,34	$ 991.867,00	$ 2.320.969,00	2,34	$ 2.320.969,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 73.471.057,00**		**$ 73.471.057,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	ÍTEMS NO PREVISTOS													
N.P. 1			0,00	-		0,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
N.P. 2			0,00	-		0,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
N.P. 3			0,00	-		0,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS								**$ 0,00**		$ -		$ -	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 22.625.447.155,73**		**$ 22.625.447.155,73**		**$ 17.403.188.136,02**		**$ 2.956.763.830,20** ✓		**$ 20.359.951.966,22**	✓
	ADMINISTRACIÓN (27%)				**$ 6.108.870.732,05**		**$ 6.108.870.732,05**		**$ 4.698.860.796,73**		**$ 798.326.234,15** ✓		**$ 5.497.187.030,88**	✓

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

02322

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

	IMPREVISTOS (0%)				$ -		$ -		$ 0,00		$ -		$ -	
	UTILIDAD (4%)				$ 905.017.886,23		$ 905.017.886,23		$ 696.127.525,44		$ 118.270.553,21 ✓		$ 814.398.078,65	✓
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 7.013.888.618,27		$ 7.013.888.618,27		$ 5.394.988.322,17		$ 916.596.787,36 ✓		$ 6.311.585.109,53	✓
	VALOR TOTAL OBRA				$ 29.639.335.774,00		$ 29.639.335.774,00		$ 22.798.176.458,19		$ 3.873.360.617,56 ✓		$ 26.671.537.075,75	✓
12	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA (INCLUYE IVA 19%)	UND	1,00	$ 317.314.146,00	$ 317.314.146,00	1,00	$ 317.314.146,00	0,91	$ 288.755.872,86	0,00	$ 0,00	0,91	$ 288.755.872,86	91,00 %
13	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE IVA 19%)	UND	1,00	$ 200.968.969,00	$ 200.968.969,00	1,00	$ 200.968.969,00	0,91	$ 182.881.761,79	0,00	$ 0,00	0,91	$ 182.881.761,79	91,00 %
	SUBTOTAL				$ 518.283.115,00		$ 518.283.115,00		$ 471.637.634,65		$ 0,00		$ 471.637.634,65	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 30.157.618.889,00		$ 30.157.618.889,00		$ 23.269.814.092,84		$ 3.873.360.617,56 ✓		$ 27.143.174.710,40 ✓	90%


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

28.22

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

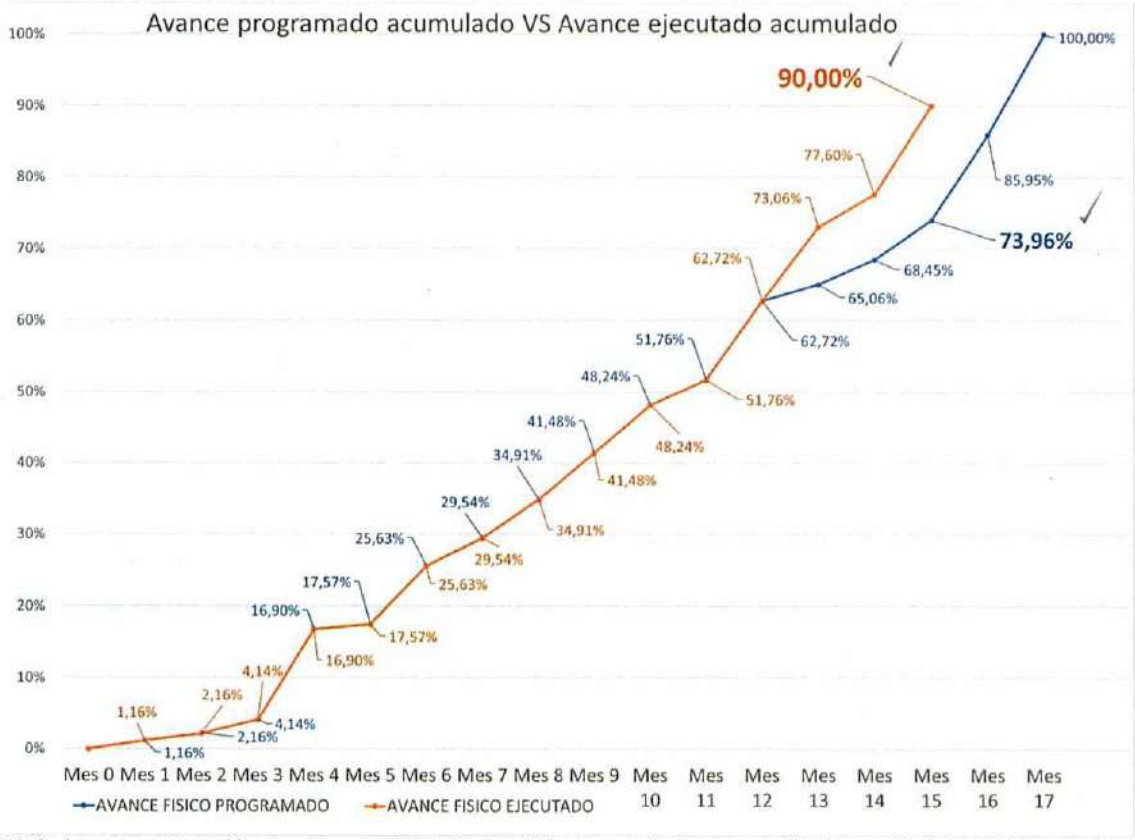Grafica Avance Físico



NOTA: La presente gráfica corresponde al ajuste del porcentaje de avance de las actividades, de acuerdo con la prórroga No. 2 al proyecto BPIN 2021005500215, aprobada mediante el acta de comité del 19 de septiembre de 2024, esta prórroga por un plazo de dos (2) meses y diecinueve (19) días, con lo cual el plazo total de ejecución será de 17 meses.

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, Comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

2.1 **Gestión técnica y documental correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024**

RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
13/09/2024	CIAIM 121-2024	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL Nº 5 PROYECTO	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22-322

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		BPIN 2021005500215, RADICADA A TRAVÉS DEL OFICIO AD-193-24.		
24/09/2024	CIAIM 124-2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022, PROYECTOS BPIN 2021005500214 - 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON C.C.P AIM
24/09/2024	CIAIM 127-2024	SOLICITUD DE INICIO ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS - PROYECTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
3/09/2024	AD-189-24	ENTREGA DEL PLAN DE COMPENSACION FORESTAL SOLICITADO POR CORMACARENA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN NO PS-GJ.1.2.6.22.0817. PROYECTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
6/09/2024	AD-190-24	INFORME BLOQUEOS QUE ENTORPECEN EL NORMAL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
6/09/2024	AD-193-24	RADICACIÓN ACTA PARCIAL No. 5 PROYECTO BPIN 2021005500215 CUMARAL-META	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
9/09/2024	AD-196-24	RESPUESTA A OFICIO CIAIM 113-2024 SOBRE LA RESTAURACIÓN DE CERRAMIENTOS PROYECTO BPIN 2021005500215.	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
9/09/2024	AD-198-24	REPORTE SOBRE AVANCE DE ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22323

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		PROYECTO BPIN 2021005500215.		
10/09/2024	AD-194-24	RADICACIÓN ACTUALIZACIÓN AIU PROYECTO BPIN 2021005500215-CUMARAL, META.	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS

FECHA OFICIO	ASUNTO	INVOLUCRADOS
03/09/2024	AUTORIZAR Y COMPROMETERSE CON EL DESARROLLO DEL PLAN DE COMPENSACIÓN FORESTAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META. PROYECTO BPIN 2021005500215 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO PS-GJ.1.2.6.22.0817 EXPEDIENTE NO 3.37.3.022.081 OTORGADA POR LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"; A LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META "AIM".	CONSORCIO INTER AIM /CONSORCIO HALCON/ MARGARITA CELY DE DIAZ PROPIETARIO PREDIO EL SOCORRO SAN CRISTOBAL/ HENRY CELY DIAZ SUBGERENTE DEL PREDIO EL SOCORRO SAN CRISTOBAL
19/09/2024	PRORROGA No. 2 AL PROYECTO BPIN 2021005500215 DEL CONTRATO DE OBRA No. 0775 DE 2022	AIM/ CONSORCIO INTER AIM /CONSORCIO HALCON
30/09/2024	COMITÉ DE SEGUMIENTO AL PROYECTO BPIN 2021005500215.	AIM/ CONSORCIO INTER AIM /CONSORCIO HALCON

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

3.1 Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024

Durante este periodo no se presentaron problemas en la ejecución del proyecto.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.324

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

4. ESTADO DEL TIEMPO
Frecuencia.

4.1 Durante el 06/09/2024 al 30/09/2024

ESTADO	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIA	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
NUBLADO																						2.5	9		
TORMENTA																									
LLUVIOSO																						2	2		
SOLEADO	10	9		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	7		9.5	9.5	9.5	11	5			9.5

OBSERVACIONES:
Durante el mes se cuenta con días soleados, nublados y lluviosos. Predomina el día soleado.

4.2 Durante el 01/10/2024 al 10/10/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIA	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
NUBLADO										
TORMENTA										
LLUVIOSO										
SOLEADO	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5

OBSERVACIONES:
Durante este periodo se cuenta con días soleados. Predomina el día soleado.

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

2. EXCAVACIONES

2.1 Excavación mecánica para cajas vías (incluye cargue)

Se realiza la excavación de las cajas para los sobreanchos de vía por ambas márgenes junto con la comisión topográfica realizando la actividad conforme al diseño geométrico autorizado, utilizando una excavadora, el equipo de topografía marca un lineamiento establecido en el diseño geométrico, marcando con estacas la banca y puntos necesarios para iniciar con la excavación en la cual se retira todo el material orgánico que presenta el suelo natural. En esta actividad se tiene en cuenta el ancho de la calzada, profundidad y largo de la caja. Para el desarrollo de la actividad es necesario una excavadora, un vibro compactador, volquetas doble troque. Se emplea el PMT y PMA autorizado.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22325

2.2 Excavación mecánica en conglomerado (incluye cargue)

Las excavaciones son los trabajos que dan lugar a la explanada bajo la rasante inicial del terreno; del transporte a vertedero o al lugar de empleo de los productos resultantes de estas operaciones; de la nivelación de la plataforma y el perfilado de los taludes. Antes de iniciar labores se debe tener en cuenta: Expropiaciones y servidumbres, Identificación y desvío de servicios afectados, Planeamiento y ejecución de accesos, vertederos y zonas de acopio.
Acto seguido se realiza el replanteo, Estaquillar la expropiación o zona destinada. Materialización de las estaciones de los ejes del proyecto cada 20 m. mediante estacas, con indicación en cada estaca de la estación y cota a excavar, obtener la documentación topográfica del terreno, perfiles transversales. Materialización mediante estacas cada 20 m., de los arranques de talud; con indicación en cada estaca de estación, cota a excavar e inclinación de los taludes.
Procedemos a la ejecución ubicando las excavadoras en un plano más alto que el de los camiones, alrededor de 2 ó 3 m. El trabajo se realiza arrancando el material y cargando en una sola maniobra con un giro de 90o o menor si es posible. Un camión debe esperar mientras carga otro, ya que el coste de la excavadora es del orden de al menos dos veces el de un camión.
Con la excavadora se empujan las tierras, dejándolas en montón. A continuación, las palas atacan el montón, cargando los productos en camiones. Cuando se trabaja en zonas bastantes planas u onduladas, se utilizan con buenos resultados las traíllas remolcadas por tractores que arrancan, cargan y transportan el material.

2.4 Transporte disposición final de escombros y sobrantes

El material sobrante extraído de la excavación es retirado y transportado en volquetas para ser dispuesto como protección de los taludes de la vía.

3. MATERIAL GRANULAR Y RELLENOS

3.1 Base granular clase a norma invias. suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador.

Se instala base granular clase A norma invias. Esta capa del pavimento tiene como función primordial, distribuir y transmitir las cargas ocasionadas por el tránsito en la capa de rodadura a la subbase. Se realiza el suministro de agregados granulares en conformidad con los alineamientos verticales, pendientes y dimensiones indicadas en los planos de diseño. Las capas instaladas no serán mayores a 20 cm, ni menores a 10 cm, el material será esparcido con un contenido de humedad de ±2% con respecto a la humedad optima, en un espesor necesario para que después de ser compactado tenga el espesor de diseño. Este proceso se realiza utilizando una motoniveladora para producir una capa de espesor uniforme, se instalan estacas para la nivelación de los extremos, controlando los espesores, esparcimiento y compactación del material con vibro compactador. La compactación se realiza gradualmente,

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22326

en las tangentes, desde los bordes hacia el centro y en las curvas desde el bore interior al exterior, paralelamente al eje de la carretera y traslapando uniformemente la mitad del ancho de la pasada anterior. El proceso se realiza alternadamente hasta lograr una densidad que cumpla con la del Proctor. La base es suministrada por la mina Las Mercedes (Murcia) del rio Guayuriba en un 90% y de la mina La Cabaña del río Guacavía un 10%.

3.2 Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño Max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado.

Luego del descapote, limpieza y excavación de cajas, Se realiza el relleno para sobre anchos de vía con material mixto de río sin procesar tamaño máximo de 3", instalando capas de un espesor uniforme con un espesor no mayor a 20 cm para luego ser compactado, se instala la siguiente capa si la anterior es aprobada por compactación y nivelación. Para el desarrollo de la actividad se utiliza una excavadora de neumáticos 310L, vibro compactador, volquetas doble troque y volquetas sencillas. Se emplea el PMT y PAGA autorizado. El relleno es suministrado por la mina La Esmeralda (Cooextracom) del rio Guacavia.

3.3 Transporte de material granular

Se realiza transporte de material granular base desde la mina la Cabaña (10%) y desde la mina las Mercedes (90%) en volquetas doble troque hasta el acopio del campamento y la vía, el material granular relleno mixto de 3" desde la mina la Esmeralda al acopio del campamento de obra utilizando volquetas sencillas y volquetas doble troque del campamento de obra a la vía. En el acopio se dispone de una excavadora 320 para conformar el stock y cargar las volquetas.

4. PAVIMENTO FLEXIBLE:

4.1 Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 incluye suministro, colocación y compactación

Una vez se realiza el riego de imprimación con emulsión asfáltica se procede a instalar la mezcla asfáltica, las mezclas asfálticas sirven para soportar directamente las acciones de los neumáticos y transmitir las cargas inferiores, proporcionando unas condiciones adecuadas de rodadura. La fabricación de la mezcla asfáltica en caliente es un proceso industrial, realizado en plantas productoras.
Al tener en obra la mezcla asfáltica se procede a extender a lo largo de la vía y compactarla adecuadamente hasta la densidad mínima especificada en las normas. Se instala con una maquina autopropulsada finisher, diseñada para colocar la sección transversal proyectada sobre la superficie en un ancho y un espesor determinados, y proporcionando una compactación inicial. Se debe controlar la temperatura y aplicación para obtener un resultado de calidad y una carpeta asfáltica de larga vida. Para la compactación se realiza con vibrocompactador, la primera compactación se realiza sobre la carpeta recién colocada sobre toda la carpeta, se realiza una compactación intermedia antes del enfriamiento de la

mezcla logrando la densidad y la impermeabilidad requerida. Por último, la compactación final para eliminar marcas sobre la superficie y alcanzar la suavidad final.

4.2 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 O CRL-1

Al tener la capa de base preparada y aprobada, se realiza el riego de imprimación con un ligante asfaltico y un material secante que cumplan con la especificación, se cubre toda la superficie de la capa base. La función de la imprimación es proteger la base una vez ha sido compactada, el material utilizado es de tipo rebajado, de curado medio, cumpliendo con las especificaciones AASHTO M-82. El material asfaltico para el riego de imprimación es aplicado dentro de los límites de temperatura para obtener la penetración deseada. El riego se realiza a una temperatura por encima de 10°C durante las horas más calurosas del día, con superficie seca, libre de lluvias. La penetración normal de riego debe ser de 8 a 10 mm. La base imprimada se cierra al tránsito durante 24 horas.

4.3 Transporte de mezclas asfálticas

Se transporta en volquetas previamente impregnada con un antiadherente para evitar que la mezcla no se adhiera al cajón, se debe cubrir con una lona para evitar que el aire frío se cuele hacia la carga. Una vez llega la volqueta a la obra, interventoría debe verificar la temperatura de llegada, se procede a depositar la mezcla en la tolva de la finisher. Al llegar la mezcla a la obra la interventoría realiza una inspección visual para notar diferencias, entre las diferencias a encontrar se encuentran las siguientes:

- Humo azul. El humo azul que asciende de la mezcla del camión puede ser un indicador de que se ha sobrecalentado la mezcla.
- Apariencia dura. Una carga que aparezca dura o presente un pico alto puede estar fría para cumplir con especificaciones.
- Apariencia opaca y magra. Una mezcla con estas características puede contener muy poco asfalto, o contener un exceso de finos.
- Vapor ascendente. El exceso de humedad aparece, frecuentemente, como vapor ascendente en la mezcla
- Segregación. La segregación de agregados puede ocurrir durante la pavimentación debido a un manejo inadecuado de la mezcla o puede ocurrir antes de que la mezcla llegue a la finisher.

6. ESTRUCTURA DE DRENAJE

6.1 Demolición mecánica de alcantarillas

La demolición consiste en la reducción de masas de material utilizado en una construcción a dimensiones susceptibles de ser retiradas del área del proyecto, de acuerdo con los planos de diseño autorizados. Una vez localizadas las demoliciones según los planos deben realizarse con previa autorización de interventoría seleccionando y separando los materiales susceptibles de aprovechamiento de los que deben ser depositados en sitios

aceptados por la autoridad ambiental competente. Se limitará solo el espacio a trabajar, para la demolición mecánica de alcantarillas se utiliza una retroexcavadora y una volqueta para retirar el material sobrante.

6.3 Solado, limpieza en concreto (13,8 Mpa) 2000 Psi

Al terminar la demolición de alcantarillas existentes se excava el excedente que representa el nuevo diseño de la alcantarilla dejando el terreno uniforme y con la pendiente necesaria para que el agua producto de las precipitaciones o estancadas circulen. Una vez listo el terreno se funde una placa de 0,10m de espesor por el ancho y largo estipulado en el diseño estructural, con la dosificación del diseño a una resistencia de 2000 Psi.

6.4 Acero de refuerzo fy=4200 mpa (4200 kg/cm2, g60) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre.

Se continúa con el armado del acero de refuerzo fy=4200 Mpa #4 (1/2") para los módulos de box coulverts prefabricados de 1m x 1m, ubicándolo con los espacios y cantidades entregadas por el diseñador, luego se dispone en la formaleta para luego ser fundidos. Para los box culvert en sitio, una vez se excave y se funda el solado se procede a armar el acero con la cantidad, separación y diámetros de diseño, iniciando con placa inferior, muros, aletas, solera, dentellon, placa superior y bordillos.

6.5 Box, aletas, muros armados concreto 20,7 mpa (3000 psi) suministro y construcción.

Se continúa con la construcción de módulos para los Box Coulverts de 1m x 1m prefabricados, utilizando la dosificación del diseño de mezcla de 3000 PSI aprobado. Para los box culvert en sitio, una vez se tiene armado el acero y puesta la formaleta se procede a fundir la placa inferior, seguidamente solera, muros, aletas, dentellon, placa superior y bordillos. Se toman muestras del concreto para verificar las resistencias de diseño.

6.6 Relleno para estructuras con recebo, compactación manual

Se realiza el relleno con material de recebo en las obras de arte, se procede con la compactación del material granular manualmente.

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.2 Manejo agua con motobomba 6" autocebante diesel

Para la construcción de obras de drenaje se utiliza la motobomba cuando se encuentra agua en las alcantarillas a intervenir y que no permiten realizar la construcción de la nueva alcantarilla, retirando el agua que se va acumulando, permitiendo el desarrollo de la actividad.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22329

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

3. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

3.1 Durante el 01/09/2024 al 30/09/2024

a. RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR- MINA LA ESMERALDA

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guacavía en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de relleno tipo SBG-50.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	20/09/2024	INV E-213
Límite líquido	20/09/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	20/09/2024	INV E-126
Equivalente de arena	20/09/2024	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	20/09/2024	INV E-211
Pérdidas en el ensayo de solidez del sulfato	20/09/2024	INV E-220
Desgaste en la máquina de los Ángeles	20/09/2024	INVE -218
Desgaste por abrasión en el equipo Micro Deval	20/09/2024	INVE -238
Proctor modificado	20/09/2024	INVE -141 INVE -142
Resistencia del material, CBR	23/09/2024	INV E-148
Densidad	24/09/2024	INVE -161

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22330

b. BASE GRANULAR

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guayuriba en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la base granular tipo BG-40.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	20/09/2024	INV E-213
Límite líquido	20/09/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	20/09/2024	INV E-126
Equivalente de arena	20/09/2024	INV E-133
Resistencia mecánica por el método de 10% de finos	20/09/2024	INVE -224
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	20/09/2024	INV E-211
Desgaste en la máquina de los Ángeles	20/09/2024	INVE -218
Resistencia al desgaste por abrasión en Micro Deval	20/09/2024	INVE -238
Pérdidas en el ensayo de solidez del sulfato	20/09/2024	INV E-220
Caras fracturadas	20/09/2024	INV E-227
Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados	20/09/2024	INVE -239
Índice de alargamiento y aplanamiento	20/09/2024	INVE -230
Proctor modificado	20/09/2024	INVE -141 INVE -142
Resistencia del material, CBR	23/09/2024	INV E-148

c. MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

En el laboratorio GEOLAB RL se llevaron a cabo ensayos para verificar la calidad de la mezcla asfáltica colocada para la construcción de la capa de rodadura, de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas por el Instituto Nacional de vías (INVIAS).

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Análisis granulométrico de los agregados extraídos de mezclas asfálticas	02/09/2024	INV E-782
Contenido de asfalto	02/09/2024	INV E-729
Estabilidad mínima	02/09/2024	INV E-748
Flujo	02/09/2024	INV E-748
Relación estabilidad/flujo	02/09/2024	INV E-748
Vacíos en los agregados minerales	02/09/2024	INV E-799
Vacíos con aire	02/09/2024	INV E-799
Vacíos llenos de asfalto	02/09/2024	INV E-799

Por otra parte, el proveedor de la mezcla asfáltica emite los resultados del control de laboratorio realizado a las muestras cuando salen de la planta.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Análisis granulométrico de los agregados extraídos de mezclas asfálticas	02/09/2024	INV E-782
Contenido de asfalto	02/09/2024	INV E-729
Estabilidad mínima	02/09/2024	INV E-748
Flujo	02/09/2024	INV E-748
Relación estabilidad/flujo	02/09/2024	INV E-748
Vacíos en los agregados minerales	02/09/2024	INV E-799
Vacíos con aire	02/09/2024	INV E-799
Vacíos llenos de asfalto	02/09/2024	INV E-799

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.332

d. RIEGO DE IMPRIMACIÓN

En el presente mes se llevó a cabo la instalación del riego de imprimación. Esta fase específica se centró en establecer una conexión óptima entre la base granular y la capa de mezcla asfáltica. La capa ligante desempeña un papel fundamental al preparar la superficie granular de manera que favorezca una adherencia efectiva entre las distintas capas del pavimento.

e. ESTRUCTURAS DE CONCRETO

- **RESISTENCIA MEZCLA DE CONCRETO**

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia de la mezcla de concreto a 7,14 y 28 días.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 14 días 3000 psi- Zarpa, Dentellón- Obra 53	05/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Zarpa, Dentellón- Obra 53	19/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días 3000 psi- Zarpa, Dentellón, Muro- Obra 54	04/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 14 días 3000 psi- Zarpa, Dentellón, Muro- Obra 54	11/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Zarpa, Dentellón, Muro- Obra 54	25/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días 3000 psi- Muros, aletas obras 53 y 45.	10/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 14 días 3000 psi- Muros, aletas obras 53 y 45.	17/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días 3000 psi- Muros, obra 42.	25/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días 3000 psi- Zarpas obra 57	25/09/2024	INV E-410

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

En el laboratorio del proveedor GRAVICON se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia de la mezcla de concreto en planta a 7 y 28 días.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	29/08/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	02/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	03/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	06/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	09/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	10/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	11/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	12/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	13/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	17/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	19/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días 3000 psi- Planta	03/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	24/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días 3000 psi- Planta	04/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días 3000 psi- Planta	25/09/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días 3000 psi- Planta	06/09/2024	INV E-410

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.334

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

4. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

4.1. Durante el 01/09/2024 al 30/09/2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	AUTOCUIDADO
02/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PREVENGAMOS LA CAIDA AL MISMO NIVEL BASANDONOS EN UNA CULTURA SEGURA Y DE AUTOCUIDADO
03/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO LOCATIVO
04/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ENFERMEDADES POR CALOR
05/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	QUE DEBEMOS TENER EN LA MOCHILA DE EMERGENCIA
06/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	COMO USAR EL PROTECTOR SOLAR
07/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	FACTORES DE SEGURIDAD PSICOSOCIAL
08/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IMPORTANCIA PAUSAS ACTIVAS
09/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	INICIATIVA Y SENTIDO DE RESPONSABILIDAD
10/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
11/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	5 CUALIDADES DE UN EXCELENTE EMPLEADO
12/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
13/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	10 COMPROMISOS DE LA SEGURIDAD VIAL
14/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	USO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA/ CAPACITACIÓN RIESGO QUIMICO
16/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PELIGROS AL MOMENTO DE CONDUCIR
17/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO PSICOSOCIAL
18/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
19/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LINEA DE FUEGO
20/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ESPACIOS CONFINADOS
21/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SIMULACRO TRES FACTORES VIALES

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.335

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

23/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA AMBIENTAL PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y CUIDADO DEL AGUA.
24/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO LOCATIVO, ORDEN Y ASEO
25/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	EXPOSICION AL RUIDO
26/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	HIGIENE POSTURAL Y DESPLAZAMIENTOS
27/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA
28/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PROTEJA SUS MANOS
30/09/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	GOLPE DE CALOR COMO PREVENIR

INSPECCIONES		
FECHA	**ACTIVIDAD SST REALIZADA**	**OBSERVACIÓN /ACCIÓN**
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION CARROTANQUE AGUA/COMBUSTIBLE	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION TURBO NPR	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION CAMIONETA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION VOLQUETA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024	INSPECCION BUSETON	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.336

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024		
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION CAMABAJA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION EXCAVADORA ORUGADA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION RETROCARGADOR/ PAJARITA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024	INSPECCION MINICARGADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION DE MOTONIVELADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION MEZCLADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024	INSPECCION CANGURO	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL

22.837

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024		
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION PLANTA ELECTRICA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION TALADRO	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION PULIDORA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION TRONZADORA/CORTADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCIÓN MOTOBOMBA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08-09-2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCIÓN VIBRADOR DE CONCRETO	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-09-2024 AL 08/09/2024 09-09-2024 AL 15-09-2024 16-09-2024 AL 22-09-2024 23-09-2024 AL 29-09-2024 30-09-2024	INSPECCION HERRAMIENTA MENOR	SEMANAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.338

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

09-09-2024 23-09-2024	INSPECCION UNIDADES SANITARIAS	QUINCENAL
09-09-2024 23-09-2024	INSPECCION LOCATIVA	QUINCENAL
18-09-2024	INSPECCION DE DOTACIÓN Y EPP	MENSUAL
18-09-2024	INSPECCION BOTIQUÍN Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	MENSUAL
18-09-2024	INSPECCION EXTINTORES	MENSUAL
18-09-2024	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL DE CONTROL DE DERRAMES	MENSUAL

Anexo: Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL

5. MANEJO AMBIENTAL

5.1. Durante el 01/09/2024 al 30/09/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Conformación del grupo de gestión ambiental	100%	En el mes de septiembre, el Consorcio Halcón cuenta con el personal idóneo para la implementación de los seis programas y los diecinueve proyectos establecidos en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) que aplican para el proyecto de mejoramiento vial en el municipio de Cumaral, Meta.
	100%	El día 3 de septiembre de 2024, se realiza entrega del Plan de Compensación Forestal (PCF) a través de correo electrónico a la Interventoría Consorcio Inter AIM, en cumplimiento a lo requerido en el oficio CIAM 102-2024 y a lo estipulado en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.22.0817 Expediente No 3.37.3.022.081 del 14 de julio de 2022.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.339

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		El requerimiento CIAIM 105 – 2024, se atiende de acuerdo con los tiempos establecidos en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.24.0745 Expediente No. 3.37.2.8.024.005 del 5 de agosto de 2024; por lo tanto, en el mes de septiembre, se avanza en el diligenciamiento de la valla informativa, en virtud de lo requerido en el artículo 6°; esta valla será instalada en el mes de octubre de 2024. El requerimiento CIAIM 127 – 2024, relacionado con solicitud de manejo apropiado de residuos sólidos generados; se atiende en campo el día 29 de septiembre de 2024, con el desarrollo de una jornada de recolección de residuos de asfalto y material sobrante, ubicados en el tramo vial y se acopian temporalmente en el campamento de obra Halcón.
Capacitación y concientización para el personal de obra	100%	Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto relacionado con capacitación y concienciación para el personal de obra, en especial con el listado de temas propuestos, en el mes de septiembre, se avanzó en la ejecución de las charlas en el campamento de obra Halcón; en las charlas se logró socializar el PAGA; la protección de la fauna y flora silvestre observada en la vía, el manejo integral de los residuos sólidos generados en las actividades diarias de la obra, el cuidado del agua y además se desarrolla charla diaria de seguridad: Prevengamos la caída al mismo nivel basándonos en una cultura segura y de autocuidado.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22840

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

	100%	En el mes de septiembre, se desarrollaron tres (3) charlas al personal en obra. Las charlas en este mes se realizaron sin costo económico alguno para el trabajador en espacios abiertos al inicio de la jornada laboral.
Cumplimiento de requerimientos legales	100%	El proyecto cuenta con el permiso de ocupación de cauce, el permiso de aprovechamiento forestal, el permiso de concesión de aguas superficiales, el permiso de cierres temporales de vías: Plan de Manejo de Tráfico (PMT), la autorización de sitios de disposición final de sobrantes, y los permisos para ubicación temporal de campamentos y/o sitios de acopio (Contratos de arrendamiento de inmuebles rurales y certificados de uso del suelo expedidos por la Alcaldía Municipal de Cumaral, Meta).
Manejo integral de materiales de construcción	0%	En el mes de septiembre, no se reciben PQRS relacionados al manejo de los materiales de construcción.
	100%	De acuerdo con lo establecido en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), en el mes, se acataron las medidas de manejo de materiales pétreos, y Mezcla Densa en Caliente (MDC-19), por lo tanto, la cantidad de material de construcción requerido en este periodo es igual a la cantidad del material que fue suministrado.
Señalización frentes de obras y sitios temporales	100%	En el mes de septiembre, se cuenta con la señalización de todos los frentes de obra, se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.341

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		de tránsito y función de las controladoras viales, todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra se encuentran limpios y bien colocados durante todo el transcurso de ésta, se maneja señalización de tipo preventiva, reglamentaria e informativa. Las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias cumplen con la reglamentación necesaria de forma, color, contraste y textos.
Manejo y disposición final de escombros	0%	Actualmente, los RCD son acopiados en el campamento Halcón (Predio Barcelona), se cuenta con el contrato de arrendamiento con el propietario y el certificado de uso del suelo expedido por la secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Cumaral, Meta. Los RCD serán entregados a la empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP, con la cual se celebró contrato de prestación de servicios en el mes de mayo de 2024.
	0%	En el mes de septiembre, no se reciben PQRS relacionados con la disposición final de RCD.
Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	100%	En el mes de septiembre, fue necesario dar disposición final a los residuos sólidos generados por el Consorcio Halcón en el campamento y en las actividades de obra, por medio del servicio prestado por la empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. identificada con NIT. 822.006.587-0.
	100%	En el campamento de obra se cuenta con tres (3) puntos ecológicos; uno cerca de la oficina del campamento de

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22342

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		obra, y dos en el taller del equipo de mecánicos.
Manejo de aguas superficiales	100%	Actualmente, el proyecto de mejoramiento vial cuenta con el permiso de ocupación de cauce entregado por Cormacarena a través del acto administrativo: Resolución No. PS-GJ 1.2.6.22.0817 Expediente No 3.37.3.022.081 del 14 de Julio de 2022. Adicionalmente, se dispone del permiso de concesión de aguas superficiales, otorgado por Cormacarena a la AIM, a través del acto administrativo: Resolución No. PS-GJ.1.2.6.24.0745 Expediente No. 3.37.2.8.024.005 del 5 de agosto de 2024.
	100%	En el mes de septiembre, se ha logrado la instalación de box culvert respetando los diseños presentados ante Cormacarena en el permiso de ocupación de cauce, con el objeto de minimizar los impactos ambientales en la construcción de las obras de arte.
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	100%	El manejo del agua residual de las baterías sanitarias lo realiza la empresa Soluciones Integrales de América S.A.S identificada con NIT. 901.108.301-6, quienes cuentan con los permisos ambientales otorgados por Cormacarena, a través del acto administrativo: Resolución No. PS.GJ.1.2.6.22.2329. Expediente No. PM-GA. 3.5.2.11.020.021 del 30 de diciembre de 2022. La empresa Soluciones Integrales de América S.A.S., entrega los certificados de la disposición de las aguas residuales del mes de agosto del año 2024, debido

		a que la empresa emite el certificado posterior a la presentación del presente informe, por lo que se relaciona mes vencido, y además se anexan las constancias del servicio de aseo y/o mantenimiento de unidades sanitarias portátiles del mes de septiembre del año 2024.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	95%	De acuerdo con el diseño del mejoramiento vial, y el inventario forestal del área de intervención establecido en el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por Cormacarena: Resolución No. PS-GJ.1.2.6.22.0817 Expediente No 3.37.3.022.081 del 14 de julio de 2022, ya fue finalizada esta actividad.
	0%	En el mes de septiembre, no se genera material proveniente del descapote.
Recuperación de áreas afectadas	0%	En el mes de septiembre, no se presenta afectación de áreas, por lo tanto, no fue necesaria la intervención de áreas de la zona del proyecto de mejoramiento vial.
Protección de fauna	100%	En el mes de septiembre, se realizan dos charlas ambientales relacionadas con la protección de la fauna y flora silvestre.
	100%	En el mes, se avanzó en la construcción de pasos de fauna a través de la construcción de box culvert.
Protección de ecosistemas sensibles	0%	Comparando con el estado inicial de la línea base, el proyecto se desarrolla dentro de áreas de protección calificadas como ecosistemas estratégicos como lo son humedales o zonas inundables, por lo que en el mes no se han intervenido y se protegen las áreas ambientalmente sensibles.

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	100%	La infraestructura del campamento (Predio Barcelona, Vereda Cuarteles) es completa y funcional, incluyendo señalización, baterías sanitarias, cerramiento perimetral, oficina, almacén, área de estacionamiento para maquinaria, vehículos, y puntos ecológicos. La instalación de baterías sanitarias portátiles cumple en la obra.
	50%	El 03 de septiembre de 2024, se tramita el paz y salvo de recibo a satisfacción con la señora Faride Pérez López propietaria del predio Lote Chepero, ubicado en la Vereda Chepero de Cumaral, Meta, con el fin de no generar pasivos a futuro.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	En el período, se reportan mantenimientos preventivos y correctivos para los vehículos y la maquinaría dispuesta en obra.
	100%	Las actividades programadas se realizan en su totalidad, se cuenta con un contrato para abastecimiento con el proveedor de combustible Puma Energy Colombia, cumpliendo las especificaciones requeridas alejado de oficinas y bodegas, no se permite fumar ni usar equipos móviles al momento de tanquear.
	100%	Los vehículos dispuestos en la obra cuentan con los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigentes.
Atención a la comunidad	0%	En el mes de septiembre, no se reciben PQRS de la comunidad del AID del proyecto de mejoramiento vial.

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Información y divulgación	0%	En el mes de septiembre, no se reciben PQRS de la comunidad del AID del proyecto de mejoramiento vial.
	0%	En el mes, no fue necesario realizar acciones de divulgación.
Contratación de mano de obra.	94%	En el mes, se contó con trabajadores del AID, la contratación de mano de obra se ejecuta según los requerimientos previos del residente de obra, por medio de comunicación directa con la comunidad para la presentación de las hojas de vida que se demanden. Se contratan trabajadores del área de influencia directa del proyecto y el personal debe contar con certificado de residencia emitido por la Alcaldía Municipal de Cumaral o por las Juntas de Acción Comunal (JAC), para finalizar, los aspirantes a trabajo se deben postular en el portal del servicio público de empleo. Para este indicador se tiene en cuenta la Mano de Obra No Calificada de la región (MONC).
Protección del patrimonio arqueológico y cultural	0%	Conforme a la normatividad aplicable, en el mes de septiembre, no se intervino monumentos religiosos, esculturas, monumentos históricos, o bienes de interés cultural.

Anexo: Formato 112-ECP-FR-016-INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

22.346

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA-MES
OSCAR MAURICIO VÁSQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	50%
NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	100%
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	25%
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	20%
HÉCTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	20%
HÉCTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20%
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VÍAS	40%
LUZ AYDA PERILLA SEGURA	PROFESIONAL SISO	100%
ALEXANDRA ARISMENDI NIETO	PROFESIONAL SISO	100%
ROQUE ALBA GONZÁLEZ	ASESOR AMBIENTAL	50%
YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO	100%
DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTINEZ	TOPÓGRAFO	100%
KAREN ALEJANDRA HERNÁNDEZ CANO	CADENERO 1	100%
WILMAR CORREDOR BONILLA	CADENERO 2	100%

ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
TATIANA ISABEL AGUIRRE RODRIGUEZ	RESIDENTE SST	100%
MARÍA CLAUDIA VALBUENA MELO	RESIDENTE SOCIAL	100%
ASTRID CAROLINA RIOS AVILA	INGENIERA AUXILIAR	100%
VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	33%

22.347

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

CLAUDIA ANDREA MORALES PEREZ	AUXILIAR CONTABLE	33%
PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ	ANALISTA CONTABLE	33%
JAVIER RICARDO ROMERO RAVELO	DIBUJANTE	33%

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA – MES
EDWIN ALEJANDRO HUERTAS GUTIERREZ	GUARDA DE SEGURIDAD	100%
CARLOS FELIPE BEJARANO RIVERA	GUARDA DE SEGURIDAD	100%

OBRA

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA – MES
GONZALO PIERNAGORDA	JEFE DE FRENTE	100%
CAMPO ELIAS BOHORQUEZ CASTAÑEDA	CONDUCTOR CARROTANQUE	100%
DIANA PATRICIA ROJAS CRUZ	CADENERO 2	100%
ANDRES FELIPE LOPEZ AMAYA	OPERADOR RETROEXCAVADORA	100%
MILTON YOVANY CONTRERAS	OPERADOR MULTIPLE	100%
ALIRIO SALAZAR PINEDA	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
DAIRON ALEJANDRO BAQUERO HERNANDEZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
ROBINSON RODRIGUEZ BUITRAGO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
BRANDON STIVEN BELTRAN GOMEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA GRUPO 2	100%
PABLO ARTURO GARCIA MARTINEZ	OPERADOR RETROCARGADOR	100%
LUIS GUSTAVO CONRADO MONTENEGRO	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	100%

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22-348

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ANGELA MARIA VALENCIA DELGADILLO	APUNTA VIAJES	100%
JOHANA RAMIREZ BOLAÑOS	CONTROLADOR VIAL	100%
DORA SUSANA RINCON FLOREZ	CONTROLADORA VIAL	100%
EIDER ANDRES CASTILLO DAZA	CADENERO 1	100%
JOSE EULICES CARDENAS PERILLA	CONDUCTOR CAMIONETA	100%
NELSON LUIS BERNAL BARRETO	CONDUCTOR NPR	100%
HENRY VANEGAS NOVOA	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
FABIO ALEXANDER VALENCIA MELO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
LEANDRO ALFREDO SOTO RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS OVIDIO PEÑA PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	100%
MARIO LADINO PARRADO	AYUDANTE DE OBRA - CEREO	100%
PEDRO ANDRES PEREZ PEREZ	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	100%
HECTOR FORERO	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	100%
JOSE MANUEL HERNANDEZ CUESTA	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	100%
INGRID PAOLA ROZO DUCUARA	AYUDANTE DE OBRA	100%
EDGAR FABIAN BELTRAN DUARTE	CADENERO 2	100%
BRAYAN ANDRES RODRIGUEZ BRAVO	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOHAN ESTEBAN CASTRO ACEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	100%
KAROL XIOMARA VARGAS BARRIOS	CONTROLADORA VIAL	100%

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ALEX FERNANDO FRANCO CASTRILLON	ALMACENISTA	100%
NANCY MILENY TUPANTEVE RICAURTE	CONTROLADORA VIAL	100%
YORMAN XIRAUS GARCIA TORRES	AYUDANTE DE OBRA	100%
MICHAEL CAMILO MONTAÑA URREA	AYUDANTE DE OBRA	100%
TEODORO HERBIN PEREZ TUMAY	AYUDANTE DE OBRA	100%
ROBERT EDILBERTO ENRIQUEZ	MAESTRO DE OBRA	100%
FRANKLIN HERNAN ROJAS GRANADOS	AYUDANTE DE OBRA	100%
HUMBERTO TIBADUIZA AVELLANEDA	SUPERVISOR DE EQUIPOS Y OPERACIONES	100%
ARNEY YESID AVELLA LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	100%
DIONEL QUEVEDO QUEVEDO	OFICIAL DE CONSTRUCCION	100%
JORGE ALIRIO GUTIERREZ SALAMANCA	AYUDANTE DE OBRA	100%
EDWIN LEONARDO DELGADO AMADO	AYUDANTE DE OBRA	100%
MAYERLI MINA GONZALEZ	CONTROLADORA VIAL	100%
YEFERSON CAMILO LONDOÑO AREVALO	AYUDANTE DE OBRA	100%
LUIS GABRIEL PINEDA ZAPATA	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	100%
ANDRES FELIPE GARCIA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
OSCAR MAURICIO BEJARANO LEAL	AYUDANTE DE OBRA	100%
GERMAN RAIGOSO GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSELIN ALARCON TORRES	SUPERVISOR DE OBRA	100%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.350

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

CAROLINA CRISTANCHO MOLANO	CONTROLADORA VIAL	100%
ANYI MARSELA NOVOA MONTERO	CONTROLADORA VIAL	100%
JOSE IVAN URREA ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	100%
JHON HAROLD MEDINA	AYUDANTE DE OBRA - CEREO	100%
BRAHAN ALEJANDRO VARON BUSTOS	AYUDANTE DE OBRA	100%
EDWIN ALBERTO MORENO	AYUDANTE	100%
ALCIRA URREA ROJAS	CONTROLADORA VIAL	100%
LINA MARCELA SANCHEZ	CONTROLADORA VIAL	100%
JHON MAURICIO CELEITA RAMIREZ	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
PEDRO LUIS PARRADO ROJAS	OPERADOR VIBRO COMPACTADOR	100%
HAMINTON FILARDO RAMIREZ BALANTA	AYUDANTE DE OBRA	100%
WILLER FERNEY VARGAS	OFICIAL DE CONSTRUCCION	100%
SONIA ISABEL ROMERO LADINO	CONTROLADORA VIAL	100%
YONER EBREDY CORDOBA	TOPOGRAFO	100%
BIBIER ANDRES RAMIREZ CASTIBLANCO	AYUDANTE DE OBRA	100%
PAULA XIMENA GARCIA REITA	CONTROLADORA VIAL	100%

SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA – MES
FREDY ALEXANDER CAICEDO MORENO	CONDUCTOR DE BUS	100%

22351

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

GUILLERMO MESA MONTAÑEZ	CONDUCTOR DE CAMABAJA	100%
LUIS ALEJANDRO MORALES GONZALEZ	CONDUCTOR CARROTANQUE	100%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACIÓN DE PERSONAL OBRA

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°:

2.1 Durante el 01/08/2024 al 31/08/2024

9472810586,9472765676,9473480648,9472693700,9472159212,9474174782,9472811293,9473450688,9473396454,9472593247,9472764823,9472765273,9472767742,80223264.

3. GESTIÓN SOCIAL

2.1 Durante el 01/09/2024 al 30/09/2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	118
Empleos directos generados:	91
Empleos indirectos generados:	27

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	90
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	66
Género	Femenino	25
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	2
Total		91

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.352

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DÍAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
PRORROGA N° 1 - 01 ABRIL 2024	3 MESES 0 DIAS	Debido a la insuficiencia en el suministro por parte del proveedor de mezcla y emulsión asfálticas, se han experimentado retrasos en la programación y avance de obra. El proveedor de material de 3" ha enfrentado demoras en las entregas debido a restricciones logísticas de la mina. Esta falta de suministro durante un periodo afectó significativamente la programación y el avance de la obra.	2919-3068
PRORROGA N° 2 - 19 SEPTIEMBRE 2024	2 MESES 19 DIAS	Las condiciones climáticas adversas han afectado significativamente el desarrollo de la obra, especialmente en el capítulo de pavimento flexible. Las constantes lluvias han impedido la instalación de la mezcla asfáltica según la programación aprobada para el proyecto. Teniendo en cuenta que en aras de garantizar la estabilidad de la obra y cumplir con los procesos constructivos, la instalación de la mezcla densa en caliente no puede realizarse bajo condiciones de lluvia y suelo saturado. Se estima llegar al K18+000 a mediados de septiembre 2024, sin embargo, considerando que la fecha de finalización del proyecto es el 11 de octubre 2024, aún faltando 8 km de pavimento por instalar, resultando inviable en tan corto tiempo.	-

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.353

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
ACTA DE MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO DE OBRA No 775 DE 2022 – 13 JUNIO 2024	$30.157.618.889,0	Se requiere realizar la modificación de cantidades acorde con la realidad actual y de esta manera optimizar los recursos garantizando la ejecución de todas las actividades necesarias para la óptima ejecución de la obra para el proyecto 2021005500215. Se realiza un balance de mayores y menores cantidades de obra, el valor del ajuste de mayores cantidades de obra es de $1.266.501.838,60 y menores cantidades de obra por un valor de $1.266.501.838,60 presentando un balance de cantidades del proyecto. - La modificación no presenta disminución en la cantidad de beneficiarios - No se presenta reducción en la meta producto - No se presenta modificación en las fuentes de financiación del proyecto de inversión - No se presenta incremento del valor inicial del proyecto - No se presenta disminución del valor final del proyecto	3069-3270

2. GARANTÍAS:

PERFECCIONAMIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	31/05/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	26/12/2022	26/11/2025	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	26/12/2022	26/05/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	26/12/2022	26/11/2025	$ 11.296.457.000,00

22.354

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Estabilidad de la obra	26/05/2025	26/05/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	26/05/2025	$ 5.648.228.500,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS A ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/07/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	26/12/2022	26/11/2025	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	26/12/2022	26/05/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	26/12/2022	26/11/2025	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	26/05/2025	26/05/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	26/05/2025	$ 5.648.228.500,00

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANT.	143502923	04/08/2023		$7.660.035.197,81			$7.660.035.197,81
1	16023	24/12/2023	16,90%	$5.097.732.836,26	$ 1.294.824.140,41	$ 3.802.908.695,85	$11.462.943.893,66
2	5824	08/05/2024	15,97%	$4.815.933.409,56	$ 1.223.247.086,03	$ 3.592.686.323,53	$ 15.055.630.217,19
3	13924	08/07/2024	14,74%	$4.444.273.928,05	$ 1.128.845.577,72	$ 3.315.428.350,33	$ 18.371.058.567,52
4	19524	23/08/2024	14,66%	$ 25.914.155,75	$ 6.582.195,56	$ 19.331.960,19	$ 18.390.390.527,71
	22724	23/08/2024		$ 4.395.902.613,59	$ 1.116.559.263,85	$ 3.279.343.349,74	$ 21.669.733.877,44
5	23524	24/09/2024	14,89%	$ 4.433.046.006,98	$ 1.125.993.685,77	$ 3.307.052.321,21	$ 24.976.786.198,65
	23624	24/09/2024		$ 57.011.142,65	$ 14.480.830,23	$ 42.530.312,41	$ 25.019.316.511,06
TOTALES			77,16%				$ 25.019.316.511,06

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *12/07/2023 AL 10/10/2024*

Avance físico ejecutado 90,00% y avance financiero ejecutado 77,16%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

72.355

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
2.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	55,74 KM	0,43%
			
	OBSERVACIONES: Excavación mecánica para sobreanchos de la via		

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.356

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	675,74 M3 ✓	18,08% ✓



OBSERVACIONES: Excavación mecánica en conglomerado.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

72357

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
2.4	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	25,27 VJ/KM	0,21%




OBSERVACIONES: Transporte de excavación mecánica en conglomerado.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	**EJECUTADO**	**%**
3.1	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	4.360,00 M3	15,18%



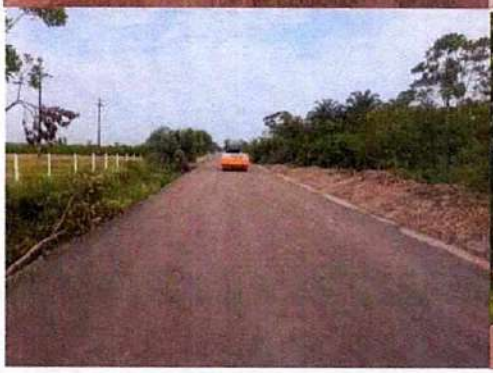


OBSERVACIONES: Base granular clase a norma invias.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.358

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	**EJECUTADO**	**%**
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	320,00 M3	0,64%



OBSERVACIONES: Relleno sobre la vía con material mixto de río sin procesar, tamaño Max. 3".

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.359

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	**EJECUTADO**	**%**
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.	204.858,12 M3/KM ✓	9,33% ✓
			
	OBSERVACIONES: Transporte de material granular.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.360

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4	**PAVIMENTO FLEXIBLE**	**EJECUTADO**	**%**
4.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	2.136,00 M3 ✓	16,89% ✓






OBSERVACIONES: Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC 19.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.361

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4	**PAVIMENTO FLEXIBLE**	**EJECUTADO**	**%**
4.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 O CRL-1	28.925,00 M2	16,89%



OBSERVACIONES: Instalación del riego de imprimación con emulsión asfáltica.

GOBERNACIÓN DEL META


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22362

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4	**PAVIMENTO FLEXIBLE**	**EJECUTADO**	**%**
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	144.703,30 M3/KM ✓	19,56 % /

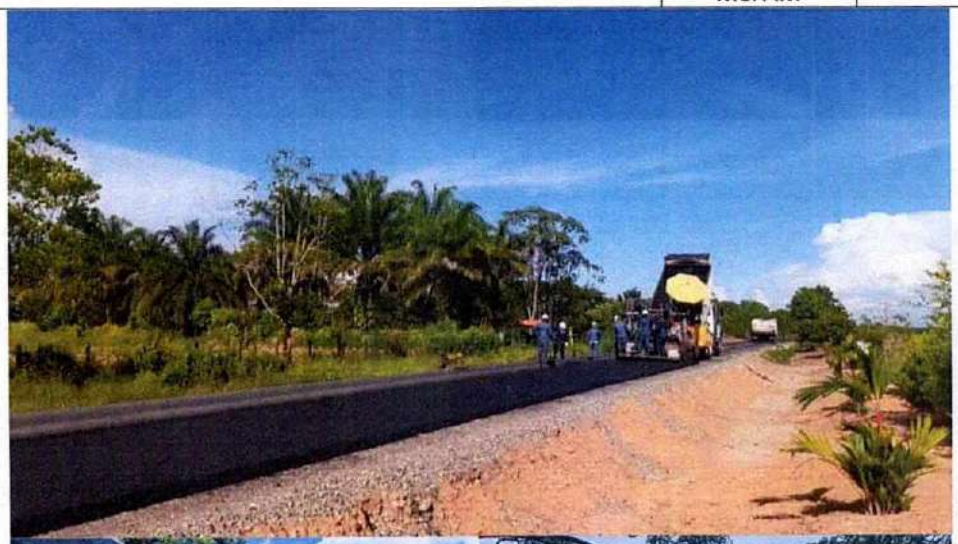





OBSERVACIONES: Transporte de mezclas asfálticas desde la planta de T&T .

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22363

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
6.1	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ALCANTARILLAS	253,44 M3	11,99 %



OBSERVACIONES: Demolición mecánica de alcantarillas.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22364

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
6.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 18,8 Mpa 2000 Psi	17,98 M3	18,97%
			
	OBSERVACIONES: Solado de limpieza en concreto de 2000 Psi		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

72 365

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
6.4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	13.824,85 KG	15,43%



OBSERVACIONES: Armado de acero de refuerzo para Box Culverts.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22366

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
6.5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	116,28 M3	12,56%



OBSERVACIONES: Instalación y fundida de módulos para Box Culverts

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22367

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
6.6	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, COMPACTACIÓN MANUAL	97,58 M3	15,84%





OBSERVACIONES: Relleno para estructuras con recebo.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

72368

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**EJECUTADO**	**%**
7.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL.	45,00 DIAS	37,50%
			
	OBSERVACIONES: Manejo de agua con motobomba.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22369

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El presente informe de obra para pago de acta parcial No. 6 justifica las actividades realizadas por el consorcio Halcón, para el proyecto identificado con el BPIN 2021005500215 durante el periodo del 06 de septiembre de 2024 al 10 de octubre de 2024, para un pago parcial de obra correspondiente al 12,84% equivalente a $ 3. 873.360.617,56 (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE)

Se valoran las actividades correspondientes al 12,84% de las obras ejecutadas las cuales son:

2 EXCAVACIONES

2.1 Excavación mecánica para cajas vías (incluye cargue). Se ejecutaron 55,74 m^3

2.2 Excavación mecánica en conglomerado (incluye cargue). Se ejecutaron 675,74 m^3

2.4 Transporte disposición final de escombros y sobrantes. Se ejecutaron 25,27 Vj/Km

3 MATERIAL GRANULAR Y RELLENOS

3.1 Base granular clase A norma Invias. Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador. Se instalaron 4.360,00 m^3

3.2 Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño Max 3". Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado. Se instalaron 320,00 m^3

3.3 Transporte de material granular. Se ejecutaron 204.858,12 M^3/Km

4 PAVIMENTO FLEXIBLE

4.1 Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 Incluye suministro, colocación y compactación. Se instalaron 2.136,00 m^3

4.2 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 o CRL-1. Se instalaron 28.925,00 m^2

4.3 Transporte de mezclas asfálticas. Se ejecutaron 144.703,30 m^3/Km

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22370

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

6.ESTRUCTURAS DE DRENAJE

6.1 Demolición mecánica de alcantarillas. Se ejecutaron 253,44 m^3 ✓

6.3 Solado, limpieza en concreto 13,8 MPa (2000 PSI). Se ejecutaron 17,98 m^3 ✓

6.4 Acero de refuerzo FY=4200 MPa (4200KG/CM2, CG60) Incluye suministro, figurado, armado colocación y amarre. Se instalaron 13.824,85 KG ✓

6.5 Box, aletas, muros armados concreto 20,7 MPa (3000 PSI) suministro y construcción. Se instalaron 116,28 m^3 ✓

6.6 Relleno para estructuras con recebo, compactación manual. Se instalaron 97,58 m^3 ✓

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.2 Manejo agua con motobomba 6" autocebante diesel. Se utilizaron 45,00 DIAS ✓

El consorcio Halcón informa que los anexos correspondientes a los resultados de los ensayos de laboratorio se entregan mes a mes en los informes mensuales. Sin embargo, en la parcial de obra se encuentran los soportes de los ensayos de laboratorio de obra correspondientes a las actividades ejecutadas entre el 06 de septiembre de 2024 y el 10 de octubre de 2024. Es importante mencionar que los informes se presentan con cierre a último día del mes. Esto asegura que todos los resultados de los ensayos estén debidamente documentados y disponibles para su revisión.

Se están realizando las actividades conforme al diseño entregado, optimizando los procesos productivos de materiales que requiere la ejecución del proyecto para cumplir con todas las especificaciones.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22871

INFORME ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500215**

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Acta parcial de obra

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 10 días del mes octubre del 2024.

Firma

Nombre: OSCAR MAURICIO VÁSQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma

Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964 CND

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22372

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

22373

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	06	09	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	17:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	4	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	18	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	SI		Retrocargador	1	
CELADOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Cisterna	1	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	8	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI		Volquetas	7	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto RLO 3"	m3	instalacion Relleno 3"		SI	SI
Transporte material granular	m3/km	Transporte relleno		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.374

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	06	09	2024	7:00	17:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- instalación de relleno mixto de río sin procesar tamaño max. 3".
- Transporte material granular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522026-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	07	09	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Mañana y tarde soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	4	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	SI		Retrocargador	1	
CELADOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Cisterna	1	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	8	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI		Volquetas	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular clase A	m3	Cereo de base.		SI	SI
Transporte granular.	m3/km	Transporte de base.		SI	SI
Solado de limpieza	m3	Con concreto 2000 PSI		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.375

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	07	09	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cerco de base clase A.
- Transporte de material granular, base clase A.
- Solado de limpieza en obra de arte con concreto de 2000 PSI.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	09	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado durante todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	2	
OFICIAL	4	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	Si		Retrocargador	1	
CELADOR	2	Si		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Cisterna	1	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	8	Si		Turbo	1	
OTRO	5	Si		Volquetas	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular clase A	m^3	Cereo base		Si	Si
Relleno mixto de rio	m^3	instalacion		Si	Si
Transporte granular	m^3/Km	Transporte a la via		Si	Si
Acero refuerzo	Kg.	en obra de arte		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.376

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	09	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cereo de base granular clase A norma invias.
- Instalación de material B" para ampliación de hombros
- Transporte de material granular.
- Acero de refuerzo en obra 42.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	10	09	2024	7:00	16:30.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	2	
OFICIAL	4	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	Si		Retrocargador	1	
CELADOR	2	Si		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Aspersora	1	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Turbo	1	
OTRO	5	Si		Volquetas	5	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto de no $\frac{3}{8}$"	m^3	Instalación en la via		Si	Si
Transporte granular	m^3/km	Transporte relleno		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22377

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	10	09	2024	7:00	16:30.

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Lleno con material mixto de rio sin procesar tamaño maximo 3" en la via.
- Transporte de material granular relleno 3" a la via.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	11	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	2	
OFICIAL	4	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	Si		Retrocargador	1	
CELADOR	2	Si		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Cisterna	1	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Turbo	1	
OTRO	5	Si		Volquetas.	5	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación en conglomer	m^3	Excavación obra		Si	Si
Demolición mecánica	m^3	Demolición obra		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.378

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	11	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Excavación mecánica en conglomerado para obra No 58.
- Demolición mecánica de alcantarillas obra No 58.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73904 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	12	09	2024	7:00	16:30.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias		0 hrs.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	2	
OFICIAL	4	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	Si		Retrocargador	1	
CELADOR	2	Si		Retroexcavadura	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Cisterna	1	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Turbo	1	
OTRO	5	Si		Volquetas	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Solado limpieza concreto.	m^3	Solado 2000PSI.		Si	Si
Base granular A.	m^3	Cereo base clase A.		Si	Si
Transporte granular	m^3/km	Transporte base.		Si	Si.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.379

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	12	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Solado de limpieza en concreto 2000PSI en obra No. 58.
- Cereo de base granular clase A.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	13	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora		
OFICIAL	4	SI		Vibrocompactador		
OPERARIO	16	SI		Carrotanque		
AYUDANTE	22	SI		Retrocargador		
CELADOR	2	SI		Retroexcavadora		
TOPÓGRAFO	1	SI		Cisterna		
CADENERO	4	SI		Camioneta		
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo		
OTRO	5	SI		Volqueta		

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box, aletas, muros concreto	m^3	instalación módulos		SI	SI
Base granular clase A	m^3	Cereo base		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

72380

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	13	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el cereo de base granular clase A norma invias.
- Instalación de módulos prefabricados en Obra No 58.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	14	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	2	
OFICIAL	4	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Cargotanque	2	
AYUDANTE	22	Si		Retroexcavadora	1	
CELADOR	2	Si		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Cisterna	1	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Turbo	1	
OTRO	5	Si		Volquetas	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 3"	m^3	Relleno con mat. granular		Si	Si
Transporte granular	m^3/Km	Transporte relleno		Si	Si
Acero refuerzo	Kg	Amarres en obra		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22381

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	14	09	2024	7:00	16:30.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Lleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3".
- Transporte de material granular.
- Acero de refuerto en obra 58
- Concreto de módulos obra 58.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	16	09	2024	7:00	16:30.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	SI		Retrocargador	1	
CELADOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
TOPOGRAFO	1	SI		Cisterna	1	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI		Volquetas	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 8"	m3	Cereo		SI	SI
Transporte granular	m3/km	Para cereo -		SI	SI
Acero reforzado	kg	Obra arte		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22382

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	16	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Instalación de material mixto de río tamaño max 3" para cereo de la subrasante.
- Transporte material granular mixto rio 3".
- Amarre acero de refuerzo. 58.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	17	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	Si		Retrocargador	1	
CELADOR	2	Si		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Cisterna	1	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Turbo	1	
OTRO	5	Si		Volquetas DT	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación en Conglomerado	m^3	En obra de arte		SI	SI
Relleno mixto de no 3"	m^3	cerco sobrasante		SI	SI
Demolición mecánica	m^3	De alcantarilla		SI	SI
Solado limpieza	m^3	Obra de arte		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22383

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	17	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Excavación mecanica en conglomerado en la obra 59
- Cereo de subrasante material granular 3".
- Transporte material granular para cereo.
- Demolición mecánica de alcantarilla existente 59.
- Solado de limpieza en obra 89.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	18	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el día.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	Si		Retrocargador	1	
CELADOR	2	Si		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Cisterna	1	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Turbo	1	
OTRO	5	Si		Volquetas OT.	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 3"	m3	Cereo		Si	Si
Transporte granular	m3/km	Para cereo		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22384

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	18	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cereo de sobrasante con material granular mixto de rio tamaño max 3"
- Transporte material granular

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522026-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	19	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	SI		Retrocargador	1	
CELADOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Cisterna	1	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI		Volquetas	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto 3"	m³	Instalacion para cereo		SI	SI
Transporte granular	m3/Km	Transporte a la via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22385

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	19	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cereo de subrasante K23+600.
- Transporte material granular mpto de rio para cereo.
- Se cargan seis modulos para obra 59

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	20	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado todo el dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	22	SI		Retrocargador	1	
CELADOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Cisterna	1	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI		Volquetas DT	5	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box, aletas, muros, concreto	m^3	en obra de arte		SI	SI
Excavación conglomerado	m^3	En obra de arte		SI	SI
Solado limpieza concreto	m^3	en obra de arte		SI	SI
Relleno material mixto	m^3	cercO.		SI	SI
Transporte granular	m^3/km	Para cercO.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22386

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	20	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cereo de sub rasante K24+000.
- Fundida concreto en obra 58, Zarpa y dentellones.
- Excavación mecánica en obra 59.
- Solado limpieza concreto 2000 PSI. obra 59.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335416 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	21	09	2024	7:00	14:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	14:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motonwelodora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	17	SI		Retrocargador	1	
CELADOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Cisterna	1	
CADENERO	4	SI		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Camioneta	1	
OTRO	6	SI		Volqueta	5	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 3"	m3	Instalación en vía		SI	SI
Relleno Recebo	m3	En obra		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22387

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	21	09	2024	7:00	14:00.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- instalación, conformación y compactación de material de afirmado de 3" K24+850.
- Lleno con material de recebo en obra 59. Aproches.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	23	09	2024	7:00	16:30.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado durante el día.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Retrocargador	1	
CELADOR	2	SI		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Cisterna	1	
CADENERO	4	SI		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Camioneta	1	
OTRO	6	SI		Volquetas DT	5.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 3"	m3	Cereo subrasante		SI	SI
Transporte granulares	m3/KM	Transporte relleno		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22386

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	23	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cereo de la Subrasante.
- Transporte material granular.
- Encofrado de aletas y guardaruedas obra 59.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01104-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	24	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motosoldadora	2	
OFICIAL	3	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	Si		Cisterna	1	
CELADOR	2	Si		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Retroexcavadora	1	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Turbo	1	
OTRO	6	Si		Volqueta DT	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 8"	m^3	Para cereo		Si	Si
Box, aletas, muros concreto	m^3	En obra de arte		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22389

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	24	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cereo de material granular 3" mixto de rio subrasante 1< 24T850
- Fundida en concreto de aletas y guardarueda obra 58.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MEGA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	25	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado. con lloviznas dispersas.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Cisterna	1	
CELADOR	2	SI		Retrocargadora	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Retroexcavadora	1	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo	1	
OTRO	6	SI		Volquetas DT	5.	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion conglomerado	m3	en obra de arte		SI	SI
Relleno con material producto de no. 3"	m3	Para cerco.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22390

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	25	09	2024	7:00	16:30.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cereo de la Subrasante entre K24+850 al K25+200.
- Excavación mecánica en obra Nº 59.
- limpieza mecánica de canal existente costado derecho entre K18+750 al K19+000.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	26	09	2024	7:00	18:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	18:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Cisterna	1	
CELADOR	2	SI		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Retroexcavadora	1	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo.	1	
OTRO	6	SI		Volquetas	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular clase A	m^3	Cercado e instalación		SI	SI
Transporte granular	m^3/km	Transporte base		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22391

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	26	09	2024	7:00	18:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cercado de base granular clase A norma invias y aplicación.
- Transporte de material granular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522928-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	27	09	2024	7:00	18:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	14:00	18:00		Dia nublado en horas de la mañana con lluvias sobre el medio dia, en la tarde nublado con lloviznas dispersas.
TORMENTA				
LLUVIOSO	12:00	14:00		
SOLEADO	7:00	12:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladura	2	
OFICIAL	3	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Carrotanques	2	
AYUDANTE	16	Si		Asterna	1	
CELADOR	2	Si		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Retroexcavadora	1	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Turbo	1	
OTRO	6	Si		Volquetas DT	5	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular clase A	m³	instalación base		SI	SI
Transporte granular	m³/km	Transporte base		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22392

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	27	09	2024	7:00	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Instalación base granular para lleno de tacos.
- Transporte base granular clase A a la vía.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73954 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522026-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	26	09	2024	7:00	18:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	16:00		Nublado en la mañana con llovizna en las tardes y lluvias fuertes en la noche
TORMENTA				
LLUVIOSO	16:00	19:00		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	Si		Turbo	1	
CELADOR	2	Si		Cisterna	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	4	Si		Retroexcavadora	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Retrocargador	1	
OTRO	6	Si		Volquetas DT	5.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular clase A	m^3	Base para cerco		Si	Si
Transporte granular	m^3/km	Transporte base		Si	Si

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	28	09	2024	7:00	18:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cereo de base granular clase A norma invias en Lavia.
- Transporte material granular base.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73954 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	30	09	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motonivelladora	2	
OFICIAL	3	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	16	Si		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	16	Si		Retrocargador	1	
CELADOR	2	Si		Cisterna	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Carrotanque	2	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Turbo	1	
OTRO	5	Si		Volqueta DT	5.	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular Clase A	M3	Cere de base		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22394

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	30	09	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Cereo de base granular clase A norma invias.
- Transporte de base.
- Instalación de sacos para protección de hombros en la vía pavimentada. aproximadamente KL5+200 al KL5+500 Carril izquierdo.
- Recolección y limpieza de vía.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73904 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024

22.395

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	01	10	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	15	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Retroexcavadora	1	
CELADOR	2	SI		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Volqueta DT	5	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular clase A	m^3	Instalación base.		SI	SI
Mezcla densa en caliente	m^3	Instalación MDC-19		SI	SI
Riego con emulsión asfaltica	m^2	Riego de imprimación		SI	SI
Transporte Granulares	m^3/Km	Transporte base.		SI	SI
Transporte asfaltico.	m^3/Km	Transporte asfalto		SI	SI.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	7:00	10	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza instalación y transporte de base granular clase A, norma invias a la vía.
- Se realiza instalación de mezcla asfaltica MDC-19. en la vía.
- Se realiza riego de imprimación con emulsión asfaltica.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	02	10	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	15	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Retroexcavadora	1	
CELADOR	2	SI		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Volqueta DT	5	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular clase A.	m^3	instalación de base granular en la via		SI	SI
Mezcla Densa en Caliente	m^3	instalación de mezcla asfaltica en la via		SI	SI
Riego de imprimación con emulsion asfaltica	m^2	imprimación ECL-1		SI	SI
Demolición mecanica	m^3	Demolición obra de arte.		SI	SI
T. Granular	m^3/Km	Transporte de base granular		SI	SI
Transporte. mezclas asfalticas	m^3/Km	Transporte. mezcla asfaltica		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.397

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	02	10	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se transporta e instala base granular clase A norma invias.
- Se instala y transporta mezcla asfaltica MDC-19 en la vía.
- Se realiza el riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-1. sobre la vía.
- Se realiza demolición mecanica de alcantarilla existente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	03	10	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	15	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Retroexcavadora	1	
CELADOR	2	SI		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Volquetas DT	5	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box, Aletas, Muros armados Concreto 20,7 MPa.	m^3	Para Box culvert.		SI	SI
Base granular clase A - norma invias	m^3	Para la estructura		SI	SI
MDC-19.	m^3	instalacion de mezcla asfaltica		SI	SI
Riego de imprimacion	m^2	con emulsion asfaltica CRL-1		SI	SI
Solado limpieza	m^3	Para Box Culvert.		SI	SI
Acero refuerzo	Kg	Para Box Culvert.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.398

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	03	10	2024	7:00	16:30.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se funde concreto y armado de acero en obra de arte.
- Se realiza solado de limpieza. concreto 2000 PSI.
- Instalación de base granular clase A norma invias.
- instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19.
- Transporte de mezclas asfalticas
- Riego de imprimación con emulsion asfáltica CRL-1.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	04	10	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	15	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Retroexcavadora	1	
CELADOR	2	SI		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Volqueta DT	5	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular	m^3	Para la estructura		SI	SI
Mezcla densa en caliente	m^3	Para la estructura		SI	SI
Riego imprimación	m^2	Con emulsion asfaltica CRL-1		SI	SI
Box, aletas, muros concreto	m^3	Obras de arte		SI	SI
Transporte granular	m^3/km	Transporte base		SI	SI
Transporte de mezclas asfalticas	m^3/km	Transporte mezcla asfaltica		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.399

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	04	10	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se transporta e instala base granular clase A norma invias en la via.
- Riego de imprimación con emulsion asfáltica ECL-1.
- Instalación de mezcla asfatica tipo MDE-19 en la via.
- Se funde obra de arte.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	05	10	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	15	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Retroexcavadora	1	
CELADOR	2	SI		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Volqueta Dr	5	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo.	1	
OTRO	5	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular.	m^3	Para la estructura		SI	SI
MDC-19	m^3	Para la estructura		SI	SI
Riego imprimación	m^2	Para la estructura		Si	SI
Transporte mezcla asfaltica	m^3/Km	Transporte MDC-19		SI	SI
Transporte granulares	m^3/Km	Transporte base		Si	SI

22400

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	05	10	2024	7:00	16:30.

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza instalación de base granular clase A norma invias.

- Se instala mezcla densa en caliente tipo MDC-19. en Lavia.

- Riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-1.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	07	10	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	6:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	15	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Retroexcavadora	1	
CELADOR	2	SI		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Volqueta 8M	5	
CADENERO	1	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo	1	
OTRO	3	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular clase A.	m^3	Para la estructura		SI	SI
Mezcla densa en Caliente.	m^3	Para la via.		SI	SI
Riego de imprimación	m^2	Con emulsión asfaltica.		SI	SI
Transporte material granular.	m^3/Km	De base granular		SI	SI
Transporte mezclas asfalticas	m^3/Km	De mezcla asfatica		SI	SI

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	07	10	2024	7:00	16:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza cereo e instalacion de base granular clase A norma invias - y el transporte.

Se instala mezcla densa en caliente tipo MDC-19. en la via.

-Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	08	10	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	15	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Retroexcavadora	1	
CELADOR	2	SI		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Volqueta DT	5	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Mezcla Densa en caliente	m^3	Instalacion MDC-19		SI	SI
Riego de imprimacion	m^2	Riego con emulsion asfatica		SI	SI
Transporte mezclas asfalticas.	m^3/km	Para La via		SI	SI

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	09	10	2024	7:00	16:30.

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza instalación de mezcla asfaltica tipo MDC-19 en la via.

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1

Transporte de mezclas asfalticas.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	09	10	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado, mañana nublada
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	15	SI		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	SI		Retroexcavadora	1	
CELADOR	2	SI		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Volqueta PT	5	
CADENERO	4	SI		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		Turbo	1	
OTRO	5	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular	m^3	Para la estructura		SI	SI
Mezcla Densa en Caliente	m^3	Mezcla tipo MDC-19		SI	SI
Riego imprimacion	m^2	Con emulsion asfatica		SI	SI
Transporte material granular	m^3/Km	Transporte de base		SI	SI
Transporte de mezclas asfalticas	m^3/km	Transporte de MDC-19 a la via.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22403

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	09	10	2024	7:00	16.30.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza cereo, transporte e instalación de base granular clase A norma invias en la vía.

- Instalación de mezcla asfaltica tipo MDC-2a en la vía.

- Riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-1.

- Transporte de mezclas asfalticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	10	10	2024	7:00	18:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
TIEMPO DE EJECUCION	17 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia nublado con lloviznas por sectores Predomina soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	(8:00)		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	15	Si		Carrotanque	2	
AYUDANTE	16	Si		Retroexcavadora	1	
CELADOR	2	Si		Retrocargador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Volquetas DT	5	
CADENERO	4	Si		Camioneta	1	
CONTROLADOR VIAL	9	Si		Turbo.	1	
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Base granular clase A.	m^3	Para la estructura		Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Transporte de base		Si	Si
Mezcla densa en caliente.	m^3	Instalacion MDC-19		Si	Si
Riego Imprimación	m^2	Con emulsion asfaltica		Si	Si
Transporte mezclas asfalticas	m^3/Km	Transporte asfalto.		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.4104

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUMARAL	10	10	2024	7:00	18:00.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza cercо, transporte e instalacion de base granular clase A norma invias.

Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1.

Transporte de mezclas asfalticas.

Instalacion de mezcla densa en caliente tipo MDC-19.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202- 335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 522028-1335	
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-54802	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA

22.405

CONTRATO N°	0775 de 2022	**PROYECTO N°**	2021005500215
INFORME N°	6	**PERIODO INFORME:**	6/09/2021 a 10/10/2024

OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL" "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICAEL CENTRO POBLADO PINALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUYDESDE ELPUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE DE LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+400 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA ENEL DEPARTAMENTO DEL META."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON
NIT:	901666148-8
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@camellingenieria.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 de 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO:	consorcioInteraim@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	239-2023

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Dias
FECHA DE INICIACIÓN:				12/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN				11/07/2024

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	17	Meses	19 Dias	12/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN				30/12/2024

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2021005500215	$ 30.157.618.889,00		$ 30.157.618.889
2				$ -
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$ 30.157.618.889,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO 1:	$ 7.660.035.197,81		
FECHA PAGO ANTICIPO	11/08/2023	No. COMPROBANTE:	CC-967-1
VALOR ANTICIPO 2:	$ -		
FECHA PAGO ANTICIPO		No. COMPROBANTE:	
FIDUCIA (SI APLICA):			
BANCO :			
CUENTA DE AHORROS :			

INFORME DE INVERSIÓN

ITEM	CHEQUE/COMPROBANTE NO.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 1						
PAGO No 1						
1		31/08/2023	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 97.027.840,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
2		31/08/2023	GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS	$ 172.312.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
3		31/08/2023	CONSORCIO HALCON	$ 108.557.939,00	4	Transporte de materiales
PAGO No 2						
4		5/09/2023	CONSORCIO HALCON	$ 123.425.770,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
5		5/09/2023	CONSORCIO HALCON	$ 202.472.106,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
6		27/09/2023	DIAMANTE SAS	$ 347.907.960,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
7		27/09/2023	CONSORCIO HALCON	$ 29.740.896,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
8		27/09/2023	DOING COMPANY S.A	$ 48.657.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
9		27/09/2023	MAPEI COLOMBIA SAS	$ 12.418.152,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
10		27/09/2023	DIAMANTE SAS	$ 877.342.040,00	4	Transporte de materiales
11		27/09/2023	MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 989.750.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
PAGO No 3						

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22406

CONTRATO N°		0775 de 2022		PROYECTO N°		2021005500215	
12		19/10/2023	CONSORCIO HALCON	$	93.730.148,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
PAGO No 4							
13		7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	13.880.383,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
14		7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	14.776.333,00	4	Transporte de materiales
15		7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	73.498.877,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
16		7/11/2023	DOING COMPANY S.A	$	69.510.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
17		7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	10.653.586,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
18		7/11/2023	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	$	43.848.765,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
19		7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	138.356.760,00	4	Transporte de materiales
PAGO No 5							
20		15/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	8.302.392,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
21		15/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	25.531.100,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
22		15/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	88.722.620,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
23		15/11/2023	MARTIN DUEÑAS CARLOS ARTURO	$	7.270.224,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
24		15/11/2023	DIAMANTE SAS	$	138.105.238,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
25		15/11/2023	CAMEL INGENIERIA SERVICIOS LTDA	$	627.668.613,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
26		15/11/2023	PLANTA Y EQUIPOS HG SAS	$	5.720.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
27		15/11/2023	SERVIEQUIPOS TLC SAS	$	9.533.324,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
28		15/11/2023	SERVIEQUIPOS TLC SAS	$	9.533.324,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
29		15/11/2023	BERMUDEZ MARTINEZ ANA BEATRIZ	$	4.098.360,00	4	Transporte de materiales
30		15/11/2023	SANCHEZ GARCIA OSCAR	$	5.352.960,00	4	Transporte de materiales
31		15/11/2023	URREGO MORERA NORELA	$	83.640,00	4	Transporte de materiales
32		15/11/2023	GARZON ALDANA GUILLERMO	$	2.927.400,00	4	Transporte de materiales
33		15/11/2023	BEJARANO URREGO SALOMON ALVARO	$	4.182.000,00	4	Transporte de materiales
34		15/11/2023	BEJARANO URREGO SALOMON ALVARO	$	5.771.160,00	4	Transporte de materiales
35		15/11/2023	MARTINEZ GOMEZ FABIO NEFTALY	$	7.109.400,00	4	Transporte de materiales
36		15/11/2023	MORENO SANABRIA JOSE PATROCINIO	$	4.600.200,00	4	Transporte de materiales
37		15/11/2023	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN DAVID	$	3.429.240,00	4	Transporte de materiales
38		15/11/2023	PARRADO RAUL	$	6.189.360,00	4	Transporte de materiales
39		15/11/2023	ROMERO LOPEZ HARVEY	$	1.254.600,00	4	Transporte de materiales
PAGO No 6							

CONTRATO N°		0775 de 2022		PROYECTO N°		2021005500215	
40		30/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 177.382.266,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
41		30/11/2023	DOING COMPANY S A	$ 49.650.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
42		30/11/2023	INVERSIONES COLDIND SAS	$ 25.341.282,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
43		30/11/2023	DOING COMPANY SA	$ 39.720.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
44		30/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 3.775.493,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
45		30/11/2023	SANCHEZ GARCIA OSCAR OSWALDO	$ 4.265.640,00	4	Transporte de materiales
46		30/11/2023	GARZON ALDANA GUILLERMO	$ 4.265.640,00	4	Transporte de materiales
47		30/11/2023	BEJARANO URREGO SALOMON ALVARO	$ 4.349.280,00	4	Transporte de materiales
48		30/11/2023	BEJARANO URREGO SALOMON ALVARO	$ 3.512.880,00	4	Transporte de materiales
49		30/11/2023	MARTINEZ GOMEZ FABIO NEFTALI	$ 5.436.600,00	4	Transporte de materiales
50		30/11/2023	MORENO SANABRIA JOSE PATRICIO	$ 3.847.440,00	4	Transporte de materiales
51		30/11/2023	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN DAVID	$ 4.014.720,00	4	Transporte de materiales
52		30/11/2023	PARRADO RAUL	$ 2.007.360,00	4	Transporte de materiales
53		30/11/2023	ROMERO LOPEZ HARVEY	$ 1.672.800,00	4	Transporte de materiales
54		30/11/2023	ASOTRANSCUMARE	$ 3.931.080,00	4	Transporte de materiales
55		30/11/2023	BERMUDEZ MARTINEZ ANA BEATRIZ	$ 4.683.840,00	4	Transporte de materiales
INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 2						
PAGO No 7						
56		6/12/2023	COMPRA DE MATERIALES	$ 6.395.400,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
57		6/12/2023	COMPRA DE MATERIALES	$ 4.119.150,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
58		4/12/2023	COMPRA DE MATERIALES	$ 9.633.363,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
59		4/12/2023	COMPRA DE MATERIALES	$ 7.292.440,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
60		4/12/2023	REMBOLSABLE	$ 5.312.504,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
61		4/12/2023	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO DEL 27 DE NOV AL 26 DE DICIEMBRE EN CUMARAL	$ 5.720.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
62		4/12/2023	ALQUILER DE EQUIPO MENOR	$ 2.210.082,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
63		4/12/2023	REMBOLSABLE	$ 17.172.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
64		4/12/2023	TRANSPORTE DE CAMIONETA DEL 21DE OCT AL 20 DE NOV	$ 7.872.000,00	4	Transporte de materiales
65		4/12/2023	TRANSPORTE DE MATERIAL MES DE OCTUBRE	$ 9.020.000,00	4	Transporte de materiales

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22.408

CONTRATO N°		0775 de 2022		PROYECTO N°		2021005500215	
66		4/12/2023	MAQUINARIA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES EDUVAL SAS	$	7.988.600,00	4	Transporte de materiales
67		4/12/2023	REEMBOLSABLE	$	44.020.239,00	4	Transporte de materiales
PAGO No 8							
68		13/12/2023	COOEXTRACOM	$	9.579.465,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
69		13/12/2023	REEMBOLSABLE	$	21.570.885,00	4	Transporte de materiales
70		13/12/2023	COOEXTRACOM	$	40.542.768,00	4	Transporte de materiales
71		13/12/2023	SERVIEQUIPOS TLC SAS	$	95.784.000,00	4	Transporte de materiales
72		13/12/2023	REEMBOLSABLE	$	91.293.552,00	4	Transporte de materiales
PAGO No 9							
73		19/12/2023	ANA BEATRIZ BERMUDEZ MARTINEZ	$	4.683.840,00	4	Transporte de materiales
74		19/12/2023	OSCAR SANCHEZ	$	4.683.840,00	4	Transporte de materiales
75		19/12/2023	GUILLERMO GARZON	$	5.436.600	4	Transporte de materiales
76		19/12/2023	SALOMON BEJARANO	$	6.022.080,00	4	Transporte de materiales
77		19/12/2023	FABIO MARTINEZ	$	6.607.560,00	4	Transporte de materiales
78		19/12/2023	JOSE MORENO	$	6.774.840,00	4	Transporte de materiales
79		19/12/2023	SALOMON BEJARANO	$	5.018.400,00	4	Transporte de materiales
80		19/12/2023	RAUL PARRADO	$	5.018.400,00	4	Transporte de materiales
81		19/12/2023	ASOTRANSCUMARE	$	3.429.240,00	4	Transporte de materiales
PAGO No 10							
82		21/12/2023	ANA BEATRIZ BERMUDEZ MARTINEZ	$	3.931.080,00	4	Transporte de materiales
83		21/12/2023	OSCAR OSWALDO SANCHEZ GARCIA	$	2.256.280,00	4	Transporte de materiales
84		21/12/2023	GUILLERMO ANTONIO GARZON ALDANA	$	4.516.560,00	4	Transporte de materiales
85		21/12/2023	SALOMON ALVARO BEJARANO URREGO	$	5.771.160,00	4	Transporte de materiales
86		21/12/2023	FABIO NEFTALI MARTINEZ GOMEZ	$	3.094.680,00	4	Transporte de materiales
87		21/12/2023	SALOMON ALVARO BEJARANO URREGO	$	4.600.200,00	4	Transporte de materiales
88		21/12/2023	RAUL PARRADO	$	2.258.280,00	4	Transporte de materiales
89		21/12/2023	HARBEY ROMERO	$	250.920,00	4	Transporte de materiales
90		21/12/2023	JUAN DAVID MARTINEZ	$	250.920,00	4	Transporte de materiales
91		21/12/2023	NORELA URREGO	$	1.672.800,00	4	Transporte de materiales
92		21/12/2023	JOSE PATRICIO MORENO	$	4.014.720,00	4	Transporte de materiales
PAGO No 11							
93		22/12/2023	RAMIREZ ISIDRO	$	8.000.000,00	4	Transporte de materiales
94		22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$	171.904.587,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales

22.409

CONTRATO N°		0775 de 2022		PROYECTO N°		2021005500215	
95		22/12/2023	HERNANDO GONZALEZ	$	7.232.400,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
96		22/12/2023	COLMEDICOS IPS SAS	$	7.049.336,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
97		22/12/2023	YESID OSWALDO PUERTO	$	6.075.000,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
98		22/12/2023	ERIKA PEREZ	$	1.148.400,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
99		22/12/2023	CONSTRUCCIONES GMI SAS	$	609.649.902,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
100		22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$	32.052.530,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
101		22/12/2023	COEXTRACOM	$	10.536.435,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
102		22/12/2023	CARLOS MARTIN	$	7.608.175,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
103		22/12/2023	MARIA EDILMA PUERTA	$	5.616.216,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
104		22/12/2023	SAMSACOL SAS	$	2.745.600,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
105		22/12/2023	CARLOS ENRIQUE GUERRERO	$	17.172.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
106		22/12/2023	JM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	$	13.349.820,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
107		22/12/2023	SERVIEQUIPOS TLC SAS	$	11.439.990,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
108		22/12/2023	SERVIEQUIPOS TLC SAS	$	10.486.667,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
109		22/12/2023	OMAR LEONARDO CLAVIJO	$	1.850.760,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
110		22/12/2023	RAFAEL BARRAGAN	$	1.726.200,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
111		22/12/2023	DIAMANTE SAS	$	177.799.640,00	4	Transporte de materiales
112		22/12/2023	COEXTRACOM	$	44.592.912,00	4	Transporte de materiales
113		22/12/2023	CONJA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$	19.616.000,00	4	Transporte de materiales
114		22/12/2023	MAQUINARIA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION EDUVAL SAS	$	12.988.800,00	4	Transporte de materiales
115		22/12/2023	CONSTRUCCIONES OCIMAC SAS	$	12.792.000,00	4	Transporte de materiales
116		22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$	4.000.000,00	4	Transporte de materiales
117		22/12/2023	ASOTRANSCUMARE	$	3.429.240,00	4	Transporte de materiales
PAGO No 12							
118		2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$	127.602.799,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
119		2/02/2024	SIDERURGICO REYNA SAS	$	147.650.024,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
120		2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$	108.594.404,00	4	Transporte de materiales
PAGO No 13							
121		22/02/2024	CONSORCIO HALCON	$	30.374.470,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
122		22/02/2024	CONSORCIO HALCON	$	28.713.120,00	4	Transporte de materiales
INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 3							
PAGO No. 14							
123		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$	11.650.735,78	1	Pago de honorarios salarios y jornales
124		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$	2.773.260,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
125		8/03/2024	GRAVAS Y CONCRETOS SAS	$	40.324.663,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
126		8/03/2024	INVERCON DEL LLANO SAS	$	10.949.040,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
127		8/03/2024	PUMA ENERGY	$	62.164.399,34	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
128		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$	9.445.704,34	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
129		8/03/2024	PLANTAS Y EQUIPOS HG	$	5.720.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos

CONTRATO N°		0775 de 2022		PROYECTO N°		2021005500215	
130		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$	110.240.345,00	4	Transporte de materiales
131		8/03/2024	FABIO NEFTALI MARTINEZ GOMEZ	$	7.443.960,00	4	Transporte de materiales
132		8/03/2024	MARCELA VELASQUEZ ROBAYO	$	2.425.560,00	4	Transporte de materiales
133		8/03/2024	JUAN DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ	$	7.778.520,00	4	Transporte de materiales
134		8/03/2024	SALOMON BEJARANO	$	3.596.520,00	4	Transporte de materiales
135		8/03/2024	CARLOS JULIO CHAPARRO	$	3.763.800,00	4	Transporte de materiales
136		8/03/2024	SERVIEQUIPOS TLC SAS	$	80.886.396,00	4	Transporte de materiales
PAGO No. 15							
137		20/03/2024	CONSORCIO HALCON	$	28.000.000,00	4	Transporte de materiales
PAGO No. 16							
138		26/04/2024	CONSORCIO HALCON	$	8.944.026,35	4	Transporte de materiales
IMPUESTO DE GUERRA							
139		22/02/2024	CONSORCIO HALCON- IMPUESTO DE GUERRA	$	383.001.760,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
TOTAL				$	7.277.033.437,81		

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada

RESUMEN DE CUMARAL

ITEM	DESCRIPCION	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de honorarios salarios y jornales	766.003.519,78		766.003.519,78	766.003.519,78	-
2	Compra de materiales, insumos y accesorios	2.298.010.559,34		2.298.010.559,34	2.028.670.719,34	269.339.840,00
3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos	2.298.010.559,34		2.298.010.559,34	2.298.010.559,34	-
4	Transporte de materiales	2.298.010.559,35		2.298.010.559,35	2.189.452.620,35	108.557.939,00
	TOTALES	7.660.035.197,81		7.660.035.197,81	7.282.137.418,81	377.897.779,00

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 14 OCT. 2024

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 215835-T

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 180524-T

Nota: Anexar copia de Tarjeta profesional y Vigencia de la tarjeta Profesional de los contadores respectivamente
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22411

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-AGO-2023 a 31-AGO-2023
Extracto:	9929173	**Mes:**	agosto 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 11.816,72 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 0,00
Total adiciones	$ 7.277.033.437,81
Total egresos	$ 379.422.870,12
Rendimientos	$ 62.938.576,27
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 6.960.549.143,96

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 60.653.978,25	
11 AGO 23	ADICION	$ 7.277.033.437,81	621.099,7904159
11 AGO 23	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 2.284.598,02	194,9920064

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 434.231,76	36,7572722
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 108.557.939,00	9.189,3179663
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. GRUPO SIDERURGICO REINA	$ 172.312.000,00	14.586,0337070
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 689.248,00	58,3441348
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. CEMENTOS ARGOS S.A	$ 97.027.840,00	8.213,3069360
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 388.111,36	32,8532277
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-AGO-2023 a 31-AGO-2023
Extracto:	9929173	**Mes:**	agosto 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	13.37%	**Último año**	13.82%
Semestral	12.51%	**Últimos 2 años**	8.66%
Año Corrido	15.15%	**Últimos 3 años**	N/A

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056531	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 11.957,81 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 6.960.549.143,96
Total adiciones	$ 1.525.091,12
Total egresos	$ 2.705.471.612,28
Rendimientos	$ 78.562.382,23
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 4.335.165.005,03

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 78.560.649,92	
22 SEP 23	ADICION	$ 1.525.091,12	127,7355772
22 SEP 23	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 1.732,30	0,1450910

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
05 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3193953
05 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0606361
05 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 809.888,42	68,3962258
05 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 202.472.106,00	17.099,0565227
05 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0606361
05 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3193953
05 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 493.703,08	41,6939253
05 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 123.425.770,00	10.423,4813342
05 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 251.754,31	21,2610085
05 SEP 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 62.938.576,27	5.315,2520333
05 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0606361
05 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3193953
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 29.740.898,00	2.488,7546140
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 118.963,59	9,9550183
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

22414

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056531	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 49.672,61	4,1566646
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. MAPEI COLOMBIA SAS	$ 12.418.152,00	1.039,1661034
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. DOING COMPANY S. A.	$ 48.657.000,00	4.071,6770978
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 194.628,00	16,2867084
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.391.631,84	116,4534495
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. DIAMANTE SAS	$ 347.907.960,00	29.113,3623708
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 989.750.000,00	82.823,4870121
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.959.000,00	331,2939480
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.509.368,16	293,6682073
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. DIAMANTE SAS	$ 877.342.040,00	73.417,0518364
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	15.54%	**Último año**	14.07%
Semestral	10.60%	**Últimos 2 años**	9.26%
Año Corrido	15.19%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

22415

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-OCT-2023 a 31-OCT-2023
Extracto:	10170916	**Mes:**	octubre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.057,59 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 4.335.165.005,03
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 172.990.700,35
Rendimientos	$ 34.893.696,12
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 4.197.068.000,80

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 34.893.696,12	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
06 OCT 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 78.562.382,23	6.573,5478702
06 OCT 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 314.249,53	26,2941916
06 OCT 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164512
06 OCT 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600772
20 OCT 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 93.730.148,00	7.817,1630722
20 OCT 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 374.920,59	31,2686521
20 OCT 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3154216
20 OCT 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0598817
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	10.28%	**Último año**	14.37%
Semestral	10.72%	**Últimos 2 años**	9.75%
Año Corrido	14.68%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

22416

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275010	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.218,72 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 4.197.068.000,80
Total adiciones	$ 14.185.218,82
Total egresos	$ 1.723.858.234,44
Rendimientos	$ 48.234.737,48
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 2.535.629.722,65

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 48.234.737,48	
20 NOV 23	ADICION	$ 3.429.240,00	281,6377408
20 NOV 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1265510
20 NOV 23	ADICION	$ 7.270.224,00	597,0913271
20 NOV 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.080,90	2,3883656
30 NOV 23	ADICION	$ 3.429.240,00	280,7711634
30 NOV 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1230847

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 175.395,06	14,4834921
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 43.848.765,00	3.620,8730285
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 293.995,51	24,2770900
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 73.498.877,00	6.069,2724494
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 10.653.586,00	879,7347475
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22417

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre: FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 10275010
Clase de Inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 114601
No. de encargo fiduciario: 18700000057
Fecha: 01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Mes: noviembre 2023
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 42.614,34	3,5189387
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 278.040,00	22,9595414
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 69.510.000,00	5.739,8853585
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 59.105,33	4,8807052
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 14.776.333,00	1.220,1763407
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 553.427,04	45,7000110
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 138.356.760,00	11.425,0027474
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 55.521,53	4,5847679
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 13.880.383,00	1.146,1920177
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
10 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 34.893.696,12	2.874,9918634
10 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0591581
10 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3116098
10 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 139.574,78	11,4999671
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. OSCAR OSWALDO SANCHEZ	$ 5.352.960,00	440,3723758
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 21.411,84	1,7614895
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. ASOTRANSCUMARE SAS	$ 3.429.240,00	282,1135532
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1284542
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 334,56	0,0275233
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. NORELA URREGO MORERA	$ 83.640,00	6,8808184
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. HARVEY ROMERO LOPEZ	$ 1.254.600,00	103,2122756
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 5.018,40	0,4128491
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensorio/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22418

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre: FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 10275010
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 114601
No. de encargo fiduciario: 18700000057
Fecha: 01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Mes: noviembre 2023
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 11.709,60	0,9633146
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. QUILLERMO ALBERTO GARZ	$ 2.927.400,00	240,8286430
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.510.674,45	206,5458498
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CAMEL INGENIERIA Y SERVI	$ 627.668.613,00	51.636,4625003
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 22.880,00	1,8822707
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. PLANTAS Y EQUIPOS HG SAS	$ 5.720.000,00	470,5676839
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. FABIO NEFTALY MARTINEZ	$ 7.109.400,00	584,8695616
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 28.437,60	2,3394782
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 552.420,95	45,4460572
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. DIAMAN7E SAS	$ 138.105.238,00	11.361,5143332
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.080,90	2,3924007
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS ARTURO MARTIN	$ 7.270.224,00	598,1000821
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.728,00	1,3761637
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 4.182.000,00	344,0409186
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 23.084,64	1,8991059
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 5.771.160,00	474,7764676
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.393,44	1,3486404
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. ANA BEATRIZ MARTINEZ	$ 4.098.360,00	337,1601002
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22419

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275010	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. RAUL EDUARDO PARRADO	$ 6.189.360,00	509,1805595
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 24.757,44	2,0367222
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SERVIEQUIPOS TLC SAS	$ 9.533.324,00	784,2787054
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 38.133,30	3,1371152
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. JOSE PATRICIO MORENO	$ 4.600.200,00	378,4450104
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 18.400,80	1,5137800
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 122.556.112,00	10.082,3331777
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 490.224,45	40,3293329
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SERVIEQUIPOS TLC SAS	$ 9.533.324,00	784,2787054
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 38.133,30	3,1371152
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. JUAN DAVID MARTINEZ R	$ 3.429.240,00	282,1135532
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1284542
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
29 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3097399
29 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1233976
29 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0588031
29 NOV 23	RETIRO BENEFIC. ASOTRANSCUMARE SAS	$ 3.429.240,00	280,8493988
29 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0588031
29 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3097399
29 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS ARTURO MARTIN	$ 7.270.224,00	595,4199880
29 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.080,90	2,3816803
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. DOING COMPANY S. A.	$ 39.720.000,00	3.252,0997686
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 158.880,00	13,0083991
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fil Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22420

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275010	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.029,44	0,6574154
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. RAUL EDUARDO PARRADO	$ 2.007.360,00	164,3538517
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 4.349.280,00	356,1000121
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 17.397,12	1,4244000
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 709.529,06	58,0931342
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 177.382.266,00	14.523,2836408
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. OSCAR OSWALDO SANCHEZ	$ 4.265.640,00	349,2519350
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 17.062,56	1,3970077
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 6.691,20	0,5478462
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. HARVEY ROMERO LOPEZ	$ 1.672.800,00	136,9615431
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. INVERSIONES COLDIND S.A.	$ 25.341.282,00	2.074,8332661
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 101.365,13	8,2993332
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.058,88	1,3148308
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. JUAN DAVID MARTINEZ R	$ 4.014.720,00	328,7077035
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. QUILLERMO ALBERTO GARZ	$ 4.265.640,00	349,2519350
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 17.062,56	1,3970077
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 3.512.880,00	287,6192406
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 14.051,52	1,1504770
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 18.735,36	1,5339693

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22421

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275010	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. ANA BEATRIZ MARTINEZ	$ 4.683.840,00	383,4923207
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. ASOTRANSCUMARE SAS	$ 3.931.080,00	321,8596263
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 15.724,32	1,2874385
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 21.746,40	1,7805001
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. FABIO NEFTALY MARTINEZ	$ 5.436.600,00	445,1250152
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 3.775.493,00	309,1208437
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 15.101,97	1,2364832
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. DOING COMPANY S. A.	$ 49.650.000,00	4.065,1247108
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 198.600,00	16,2604988
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. JOSE PATRICIO MORENO	$ 3.847.440,00	315,0115492
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 15.389,76	1,2600462
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	17.53%	**Último año**	15.01%
Semestral	12.20%	**Últimos 2 años**	10.45%
Año Corrido	14.93%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasosociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

72422

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1646	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.431,82 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 2.535.629.722,65
Total adiciones	$ 39.405.587,63
Total egresos	$ 1.743.146.537,07
Rendimientos	$ 33.095.703,06
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 864.984.476,28

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 33.095.703,06	
12 DIC 23	ADICION	$ 12.792.000,00	1.043,1559111
12 DIC 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 51.168,00	4,1726236
21 DIC 23	ADICION	$ 8.000.000,00	647,7118508
21 DIC 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 32.000,00	2,5908474
29 DIC 23	ADICION	$ 698.170,12	56,2038239
29 DIC 23	ADICION	$ 7.013.139,50	564,5690734
29 DIC 23	ADICION	$ 10.819.110,01	870,9558555

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 17.172.000,00	1.402,9676249
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 68.688,00	5,6118705
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 2.210.082,00	180,5656589
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.840,33	0,7222628
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 21.250,02	1,7361455
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22423

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1646	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 5.312.504,00	434,0362869
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 7.988.800,00	652,6920430
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 31.955,20	2,6107682
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 4.119.150,00	336,5382071
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.476,60	1,3461528
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 9.020.000,00	736,9419972
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 36.080,00	2,9477680
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 25.581,60	2,0900394
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 6.395.400,00	522,5098502
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 7.872.000,00	643,1493794
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 31.488,00	2,5725975
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.169,76	2,3831953
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 7.292.440,00	595,7988136
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 176.080,96	14,3859705
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 44.020.239,00	3.596,4925552
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 39.333,45	3,2135777
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 9.833.363,00	803,3944755
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 51.168,00	4,1804710
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22424

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1646	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 12.792.000,00	1.045,1177416
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 22.880,00	1,8693163
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 5.720.000,00	467,3290714
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 383.136,00	31,2322684
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. SERVIEQUIPOS TLC SAS	$ 95.784.000,00	7.808,0671096
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 91.293.552,00	7.442,0172543
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 365.174,21	29,7680692
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 86.283,54	7,0336139
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 21.570.885,00	1.758,4034671
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. COEXTRACOM	$ 40.542.768,00	3.304,9429273
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 162.171,07	13,2197715
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. COEXTRACOM	$ 9.579.465,00	780,8935270
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 38.317,86	3,1235741
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
15 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0583818
15 DIC 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 48.234.737,48	3.922,0468208
15 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 192.938,95	15,6881873
15 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3075207
19 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 5.436.600,00	441,1939545
19 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 21.746,40	1,7647758
19 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3069189
19 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0582675
19 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 6.774.840,00	549,7955432
19 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 27.099,36	2,1991822
19 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3069189
19 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0582675

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22425

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1646	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

19 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3069189
19 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0582675
19 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 24.088,32	1,9548286
19 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 6.022.080,00	488,7071495
19 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3069189
19 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1131663
19 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0582675
19 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 3.429.240,00	278,2915713
19 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0582675
19 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 18.735,36	1,5204222
19 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3069189
19 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 4.683.840,00	380,1055608
19 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 5.018.400,00	407,2559580
19 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3069189
19 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 20.073,60	1,6290238
19 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0582675
19 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 18.735,36	1,5204222
19 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3069189
19 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0582675
19 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 4.683.840,00	380,1055608
19 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3069189
19 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 8.000.000,00	649,2204016
19 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 32.000,00	2,5968816
19 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0582675
19 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 20.073,60	1,6290238
19 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3069189
19 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 5.018.400,00	407,2559580
19 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0582675
19 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 26.430,24	2,1448814
19 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 6.607.560,00	536,2203446
19 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0582675
19 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3069189
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. FABIO NEFTALY MARTINEZ	$ 3.094.680,00	250,5576138
21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 12.378,72	1,0022305
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058
21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. RAUL EDUARDO PARRADO	$ 2.258.280,00	182,8393398

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22426

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1646	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 9.033,12	0,7313574
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058
21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. JOSE PATRICIO MORENO	$ 4.014.720,00	325,0477152
21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.058,88	1,3001909
21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058
21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 9.033,12	0,7313574
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058
21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. OSCAR OSWALDO SANCHEZ	$ 2.258.280,00	182,8393398
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. JUAN DAVID MARTINEZ R	$ 250.920,00	20,3154822
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058
21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.003,68	0,0812619
21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058
21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. ANA BEATRIZ MARTINEZ	$ 3.931.080,00	318,2758878
21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 15.724,32	1,2731036
21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058
21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 18.400,80	1,4898020
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 4.600.200,00	372,4505070
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. HARVEY ROMERO LOPEZ	$ 250.920,00	20,3154822
21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.003,68	0,0812619
21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058
21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058
21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 23.084,64	1,8690244
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 5.771.160,00	467,2560906
21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058
21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 18.066,24	1,4627147
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. QUILLERMO ALBERTO GARZ	$ 4.516.560,00	365,6786796
21 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 6.691,20	0,5417462
21 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3062058

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22427

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1646	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

21 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0581321
21 DIC 23	RETIRO BENEFIC. NORELA URREGO MORERA	$ 1.672.800,00	135,4365480
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. ISIDRO RAMIREZ MARTI	$ 8.000.000,00	646,6114936
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 32.000,00	2,5864460
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. ASOTRANSCUMARE SAS	$ 3.429.240,00	277,1732498
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1086930
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 53.399,28	4,3160735
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. JM PROYECTOS DE INGENIER	$ 13.349.820,00	1.079,0183812
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 171.904.587,00	13.894,4352198
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 687.618,35	55,5777410
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 22.464,86	1,8157546
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. MARIA EDILMA PUERTAS CAR	$ 5.616.216,00	453,9387270
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 711.198,56	57,4836454
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. DIAMANTE SAS	$ 177.799.640,00	14.370,9113480
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 128.210,12	10,3627671
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 32.052.530,00	2.590,6917872
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 24.300,00	1,9640824
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. YESID OSWALDO PUERTO	$ 6.075.000,00	491,0206030
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 6.904,80	0,5580904
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22428

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1646	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. RAFAEL ALBERTO BARRAGAN	$ 1.726.200,00	139,5225950
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 28.197,34	2,2790905
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. COLMEDICOS	$ 7.049.336,00	569,7727100
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.438.599,61	197,1033170
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSTRUCCIONES GMI SAS	$ 609.649.902,00	49.275,8292139
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSTUCCIONES OCIMAQ SAS	$ 12.792.000,00	1.033,9317783
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 51.168,00	4,1357271
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. COEXTRACOM	$ 44.592.912,00	3.604,2861791
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 178.371,65	14,4171449
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. ERIKA YURLEY PEREZ CA	$ 1.148.400,00	92,8210799
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 4.593,60	0,3712843
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. SERVICIOS AMBIENTALES Y	$ 2.745.600,00	221,9170646
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 10.982,40	0,8876683
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONJA INGENIERIA Y CONST	$ 19.616.000,00	1.585,4913823
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 78.464,00	6,3419655
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. HERNANDO JOSE GONZALEZ E	$ 7.232.400,00	584,5691208
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 28.929,60	2,3382765
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 68.688,00	5,5518063
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS ENRIQUE GUERRERO	$ 17.172.000,00	1.387,9515710

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22429

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre: FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 1646
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 114601
No. de encargo fiduciario: 18700000057
Fecha: 01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Mes: diciembre 2023
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 51.955,20	4,1993537
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. MAQUINARIA TRANSPORTE Y	$ 12.988.800,00	1.049,8384210
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 41.946,67	3,3903999
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. SERVIEQUIPOS TLC SAS	$ 10.486.667,00	847,5999265
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS ARTURO MARTIN	$ 7.608.175,00	614,9416750
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 30.432,70	2,4597667
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.000,00	1,2932230
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 4.000.000,00	323,3057468
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. COEXTRACOM	$ 10.536.435,00	851,6224966
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 42.145,74	3,4064900
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 45.759,96	3,6986145
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. SERVIEQUIPOS TLC SAS	$ 11.439.990,00	924,6536276
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 7.403,04	0,5983613
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. OMAR LEONARDO CLAVIJO	$ 1.850.760,00	149,5903360
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	22.58%	**Último año**	15.56%
Semestral	14.68%	**Últimos 2 años**	11.34%
Año Corrido	15.56%	**Últimos 3 años**	N/A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22430

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-ENE-2024 a 31-ENE-2024
Extracto:	1767	**Mes:**	enero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.551,71 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 864.984.476,28
Total adiciones	$ 7.152.973,59
Total egresos	$ 33.232.585,87
Rendimientos	$ 8.235.458,34
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 847.140.322,33

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 8.230.514,24	
29 ENE 24	ADICION	$ 7.152.973,59	570,4447097
29 ENE 24	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 4.944,09	0,3942881

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
16 ENE 24	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 33.095.703,06	2.647,0317567
16 ENE 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 132.382,81	10,5881268
16 ENE 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3024886
16 ENE 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0574265
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	11.96%	**Último año**	15.00%
Semestral	15.12%	**Últimos 2 años**	11.66%
Año Corrido	11.96%	**Últimos 3 años**	N/A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-FEB-2024 a 29-FEB-2024
Extracto:	1856	**Mes:**	febrero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.648,56 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 847.140.322,33
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 453.001.956,45
Rendimientos	$ 3.546.807,38
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 397.685.173,27

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 3.546.807,38	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
02 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 434.377,62	34,5940786
02 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3012006
02 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0571819
02 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 108.594.404,00	8.648,5195745
02 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 590.600,10	47,0357250
02 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3012006
02 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0571819
02 FEB 24	RETIRO BENEFIC. GRUPO SIDERURGICO REYNA	$ 147.650.024,00	11.758,9311761
02 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0571819
02 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3012006
02 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 510.411,20	40,6494358
02 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 127.602.799,00	10.162,3588718
09 FEB 24	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 8.235.458,34	654,9019050
09 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0570970
09 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3007530
09 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 32.941,83	2,6196074
22 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 28.713.120,00	2.273,1651851

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22432

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-FEB-2024 a 29-FEB-2024
Extracto:	1856	**Mes:**	febrero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

22 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0568427
22 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2994140
22 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 114.852,48	9,0926607
22 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0568427
22 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 121.497,88	9,6187649
22 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 30.374.470,00	2.404,6912254
22 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2994140
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	10.16%	**Último año**	13.55%
Semestral	14.62%	**Últimos 2 años**	11.89%
Año Corrido	11.09%	**Últimos 3 años**	N/A

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

22433

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Extracto:	1998	**Mes:**	marzo 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.762,92 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 397.685.173,27
Total adiciones	$ 1.968.563,91
Total egresos	$ 392.344.549,68
Rendimientos	$ 1.562.249,21
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 8.871.436,70

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 1.562.249,21	
27 MAR 24	ADICION	$ 136.882,81	10,7378629
27 MAR 24	ADICION	$ 1.831.681,10	143,6874402

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 2.773.260,00	218,5360036
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 11.093,04	0,8741440
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. MARCELA VELASQUEZ RO	$ 2.425.560,00	191,1368529
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 9.702,24	0,7645474
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. FABIO NEFTALY MARTINEZ	$ 7.443.960,00	586,5924108
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.775,84	2,3463696
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 15.055,20	1,1863667

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22434

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Extracto:	1998	**Mes:**	marzo 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO CHAPARRO	$ 3.763.800,00	296,5916684
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 323.545,58	25,4957552
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. SERVIEQUIPOS TLC SAS	$ 80.886.396,00	6.373,9388748
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 14.386,08	1,1336393
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 3.596.520,00	283,4098164
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. PUMA ENERGY COLOMBIA COM	$ 62.164.399,34	4.898,6245052
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 248.657,60	19,5944982
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 11.650.735,78	918,0910682
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 46.602,94	3,6723640
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 43.796,16	3,4511866
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. INVERCON DEL LLANO SAS	$ 10.949.040,00	862,7966525
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 110.240.345,00	8.687,0630331
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 440.961,38	34,7482521
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 31.114,08	2,4518245
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. JUAN DAVID MARTINEZ R	$ 7.778.520,00	612,9561146
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 161.298,65	12,7105148
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. GRAVAS Y ARENAS PARA CON	$ 40.324.663,00	3.177,6287462
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 9.445.704,34	744,3321136
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 37.782,82	2,9773287
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No: 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

22.435

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Extracto:	1998	**Mes:**	marzo 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. PLANTAS Y EQUIPOS HG SAS	$ 5.720.000,00	450,7424260
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 22.880,00	1,8029697
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
11 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565300
11 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2977668
11 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 14.187,23	1,1169979
11 MAR 24	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 3.546.807,38	279,2494545
20 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0564107
20 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2971384
20 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 112.000,00	8,7994446
20 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 28.000.000,00	2.199,8611455
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	11.18%	**Último año**	12.23%
Semestral	13.88%	**Últimos 2 años**	12.18%
Año Corrido	11.12%	**Últimos 3 años**	N/A

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

22436
