ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102019-1

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP-001-2024 LOTE 2 de 2024

CONTRATO No:	LP-001-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES DP 2024
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) – LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA
VALOR INICIAL:	$ 14,858,229,465.61
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 14,858,229,465.61
PLAZO CONTRACTUAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	19 DE JULIO DEL 2024 - 18 DESEPTIEMBRE DEL 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9,34%
% DE AVANCE ACUMULADO:	12.22%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA**														
4070	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	750.00	$ 76,947.00	$ 57,710,250.00	983.11	$ 75,647,365.17	618.20	$ 47,568,635.40	244.91	$ 18,845,089.77	863.11	$ 66,413,725.17	120.00	$ 9,233,640.00
1499	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2177.00	$ 12,133.00	$ 26,413,541.00	4,116.66	$ 49,971,701.78	1,372.45	$ 16,651,935.85	2,446.21	$ 29,679,865.93	3,818.66	$ 46,331,801.78	300.00	$ 3,639,900.00
6646	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	726.00	$ 49,589.00	$ 36,001,614.00	1,237.94	$ 61,388,206.66	689.63	$ 34,198,062.07	548.31	$ 27,190,144.59	1,237.94	$ 61,388,206.66	-	$ -
6647	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	80.00	$ 16,931.00	$ 1,354,480.00	80.00	$ 1,354,480.00	-	$ -	63.73	$ 1,079,012.63	63.73	$ 1,079,012.63	16.27	$ 275,467.37
578	DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL	GL	7.00	$ 225,000.00	$ 1,575,000.00	7.00	$ 1,575,000.00	5.00	$ 1,125,000.00	2.00	$ 450,000.00	7.00	$ 1,575,000.00	-	$ -
AD-04	DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML	356.00	$ 40,551.00	$ 14,436,156.00	607.91	$ 24,651,358.41	150.04	$ 6,084,272.04	366.87	$ 14,876,945.37	516.91	$ 20,961,217.41	91.00	$ 3,690,141.00
127	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	31517.00	$ 4,397.00	$ 138,580,249.00	31,517.00	$ 138,580,249.00	7,392.58	$ 32,505,174.26	10,403.90	$ 45,745,948.30	17,796.48	$ 78,251,122.56	13,720.52	$ 60,329,126.44
2526	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0,25	M2	20643.64	$ 11,068.00	$ 228,483,752.18	20,643.64	$ 228,483,752.18	4,937.53	$ 54,648,582.04	7,731.21	$ 85,569,032.28	12,668.74	$ 140,217,614.32	7,974.90	$ 88,266,137.86
3813	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	1895.00	$ 8,546.00	$ 16,194,670.00	1,895.00	$ 16,194,670.00	901.04	$ 7,700,287.84	561.29	$ 4,796,784.34	1,462.33	$ 12,497,072.18	432.67	$ 3,697,597.82
2600	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	6.00	$ 62,106.00	$ 372,636.00	6.00	$ 372,636.00	4.00	$ 248,424.00	2.00	$ 124,212.00	6.00	$ 372,636.00	-	$ -
1868	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1155.00	$ 12,026.00	$ 13,890,030.00	1,025.26	$ 12,329,776.76	951.28	$ 11,440,093.28	73.98	$ 889,683.48	1,025.26	$ 12,329,776.76	-	$ -
1625	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	510.00	$ 27,398.00	$ 13,972,980.00	674.65	$ 18,484,060.70	508.95	$ 13,944,212.10	165.70	$ 4,539,848.60	674.65	$ 18,484,060.70	-	$ -
5724	EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO	M3	11371.10	$ 69,179.00	$ 786,640,985.02	11,371.10	$ 786,640,985.02	-	$ -	843.15	$ 58,328,273.85	843.15	$ 58,328,273.85	10,527.95	$ 728,312,711.17
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	14130.00	$ 38,532.00	$ 544,457,160.00	630.00	$ 24,275,160.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	630.00	$ 24,275,160.00
268	EXCAVACIÓN DE 0,30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	2265.00	$ 9,610.00	$ 21,766,650.00	2,265.00	$ 21,766,650.00	36.00	$ 345,960.00	-	$ -	36.00	$ 345,960.00	2,229.00	$ 21,420,690.00
6058	RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS, CON RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA ESPALDON DE GEOSACOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M3	945.00	$ 141,236.00	$ 133,468,020.00	945.00	$ 133,468,020.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	945.00	$ 133,468,020.00
2602	NIVELACION Y COMPACTACION DE RELLENO EN GRAVA TRITURADA CANCHA E=0,10 MTS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO, AL 95% (PARA CANCHA)	M2	7200.00	$ 13,012.00	$ 93,686,400.00	7,200.00	$ 93,686,400.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,200.00	$ 93,686,400.00
AD-42	RELLENOS CON GRAVA O ROCA TRITURADA LIMPIA DE 0,02 a 0,06 mts MEDIO FILTRANTE PARA CANCHA	M3	432.00	$ 78,732.00	$ 34,012,223.78	432.00	$ 34,012,223.78	-	$ -	-	$ -	-	$ -	432.00	$ 34,012,223.78
2	**CAPITULO - ESTRUCTURA**														
2142	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0,20 METROS	ML	5775.00	$ 54,520.00	$ 314,853,000.00	5,775.00	$ 314,853,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,775.00	$ 314,853,000.00
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3	415.00	$ 1,115,428.00	$ 462,902,620.00	365.00	$ 407,131,220.00	60.44	$ 67,416,468.32	86.39	$ 96,361,824.92	146.83	$ 163,778,293.24	218.17	$ 243,352,926.76
6742	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	162.00	$ 636,842.00	$ 103,168,404.00	162.00	$ 103,168,404.00	8.46	$ 5,387,683.32	24.37	$ 15,519,839.54	32.83	$ 20,907,522.86	129.17	$ 82,260,881.14
214	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS	ML	2265.00	$ 116,689.00	$ 264,300,585.00	2,265.00	$ 264,300,585.00	-	$ -	211.10	$ 24,633,047.90	211.10	$ 24,633,047.90	2,053.90	$ 239,667,537.10
3009	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE LOS NIVELES DE LA CAPA DRENANTE, CON UNA EMULSIÓN ASFÁLTICA CATÓNICA SUPERESTABLE LENTA EN FRIO.	M2	7200.00	$ 2,726.00	$ 19,627,200.00	7,200.00	$ 19,627,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,200.00	$ 19,627,200.00
912	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,20 X 0,30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS	ML	851.00	$ 115,996.00	$ 98,712,596.00	851.00	$ 98,712,596.00	-	$ -		$ -	-	$ -	851.00	$ 98,712,596.00
4733	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0,15 X (0,30 - 0,50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	855.00	$ 72,401.00	$ 61,902,855.00	855.00	$ 61,902,855.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	855.00	$ 61,902,855.00
1141	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7560.00	$ 112,610.00	$ 851,331,600.00	7,560.00	$ 851,331,600.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,560.00	$ 851,331,600.00
7038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	12500.00	$ 24,205.00	$ 302,562,500.00	12,500.00	$ 302,562,500.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,500.00	$ 302,562,500.00
2021	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI	M3	50.00	$ 793,720.00	$ 39,686,000.00	50.00	$ 39,686,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	50.00	$ 39,686,000.00
AD-09	PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	35.00	$ 1,328,517.00	$ 46,498,095.00	35.00	$ 46,498,095.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35.00	$ 46,498,095.00
AD-10	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI 30X30	M3	13.00	$ 994,648.00	$ 12,930,424.00	13.00	$ 12,930,424.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13.00	$ 12,930,424.00
AD-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR AZUL-BLANCO 11,8X0,95 MT 2M UPVC, INCLUYE TOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	1265.00	$ 138,254.00	$ 174,891,310.00	1,265.00	$ 174,891,310.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,265.00	$ 174,891,310.00
6874	LOSA ALIGERADA CON METALDECK EN CONCRETO DE 3000 PSI (PARA MÓDULO DE VENTA)	M2	200.00	$ 200,371.00	$ 40,074,200.00	200.00	$ 40,074,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	200.00	$ 40,074,200.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Se[illegible]ones Actualizadas [illegible]a de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
AD-12	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE	ML	545.00	$ 340,197.00	$ 185,407,365.00	545.00	$ 185,407,365.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	545.00	$ 185,407,365.00
2152	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1500 PSI E=0,15 METROS	M2	18.00	$ 121,889.00	$ 2,194,002.00	18.00	$ 2,194,002.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	18.00	$ 2,194,002.00
8755	PAVIMENTO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	18.00	$ 156,159.00	$ 2,810,862.00	18.00	$ 2,810,862.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	18.00	$ 2,810,862.00
3432	REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS.	UN	30.00	$ 634,496.00	$ 19,034,880.00	30.00	$ 19,034,880.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30.00	$ 19,034,880.00
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	53240,00	$ 7,736.00	$ 411,864,640.00	53,240.00	$ 411,864,640.00	3,913,87	$ 30,277,698,32	16,201,10	$ 125,331,709.60	20,114,97	$ 155,609,407.92	33,125.03	$ 256,255,232.08
3	CAPITULO - MAMPOSTERIA														
AD-13	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2,00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	6225.00	$ 134,597.00	$ 837,866,325.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
544	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	1170.00	$ 15,941.00	$ 18,650,970.00	1,170.00	$ 18,650,970.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,170.00	$ 18,650,970.00
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	6225.00	$ 24,112.00	$ 150,097,200.00	6,225.00	$ 150,097,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,225.00	$ 150,097,200.00
4	CAPITULO - ACABADOS														
8062	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS	M2	775.00	$ 105,835.00	$ 82,022,125.00	775.00	$ 82,022,125.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	775.00	$ 82,022,125.00
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	6225.00	$ 19,487.00	$ 121,306,575.00	6,225.00	$ 121,306,575.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,225.00	$ 121,306,575.00
1687	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	118.00	$ 39,825.00	$ 4,699,350.00	118.00	$ 4,699,350.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	118.00	$ 4,699,350.00
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	666.42	$ 3,875.00	$ 2,582,362.27	666.42	$ 2,582,362.27	-	$ -	-	$ -	-	$ -	666.42	$ 2,582,362.27
AD-17	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	1837.00	$ 70,070.00	$ 128,718,590.00	1,837.00	$ 128,718,590.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,837.00	$ 128,718,590.00
1788	PINTURA EN ESMALTE DE TUBERÍA, INCLUYE ANTICORROSIVO, PULIDA Y LIJADA PARA PARALES DEL CUADRILATERO	ML	30.00	$ 4,860.00	$ 145,800.00	30.00	$ 145,800.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30.00	$ 145,800.00
7657	ENCHAPE PARED EGEO BLANCO DE 0.30 X 0.60 METROS O SIMILAR (INCLUYE BISELADA, WIN DE ALUMINO Y EMBOQUILLADA)	M2	265.00	$ 75,147.00	$ 19,913,955.00	265.00	$ 19,913,955.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	265.00	$ 19,913,955.00
AD-18	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA CANCHA DE PISO)	M2	975.00	$ 137,529.00	$ 134,090,775.00	975.00	$ 134,090,775.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	975.00	$ 134,090,775.00
AD-19	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA EPOXICO SINTÉTICO (PARA PISTA DE PITINAJE Y CANCHA DE HOCKEY)	M2	1250.00	$ 402,064.00	$ 502,580,000.00	1,250.00	$ 502,580,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,250.00	$ 502,580,000.00
2184	PISO EN CERAMICA TIPO NANTES DE 0.55X0.55 MTS	M2	185.00	$ 75,442.00	$ 13,956,770.00	185.00	$ 13,956,770.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	185.00	$ 13,956,770.00
6615	SOCALO EN CERAMICA	ML	150.00	$ 25,055.00	$ 3,758,250.00	150.00	$ 3,758,250.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150.00	$ 3,758,250.00
604	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	285.00	$ 69,990.00	$ 19,947,150.00	285.00	$ 19,947,150.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	285.00	$ 19,947,150.00
5	CAPITULO - EQUIPAMENTO														
3687	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).	UN	28.00	$ 2,875,365.00	$ 80,510,220.00	28.00	$ 80,510,220.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28.00	$ 80,510,220.00
3883	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISEÑO)	ML	120.00	$ 692,491.00	$ 83,098,920.00	120.00	$ 83,098,920.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	120.00	$ 83,098,920.00
2012	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS	PR	2.00	$ 3,207,600.00	$ 6,415,200.00	2.00	$ 6,415,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 6,415,200.00
2008	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	PR	4.00	$ 1,379,905.00	$ 5,519,620.00	4.00	$ 5,519,620.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 5,519,620.00
2013	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL INCLUYE PARALES EN TUBERIA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1.00	$ 778,750.00	$ 778,750.00	1.00	$ 778,750.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 778,750.00
AD-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	320.00	$ 442,004.00	$ 141,441,280.00	320.00	$ 141,441,280.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	320.00	$ 141,441,280.00
8026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 MTS.	UN	2.00	$ 2,308,348.00	$ 4,616,696.00	2.00	$ 4,616,696.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 4,616,696.00
6	CAPITULO - JUEGOS INFANTILES														
AD-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.	M2	1465.00	$ 238,895.00	$ 349,981,175.00	1,465.00	$ 349,981,175.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,465.00	$ 349,981,175.00
AD-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.	M2	2930.00	$ 295,296.00	$ 865,217,280.00	2,458.10	$ 725,866,683.47	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,458.10	$ 725,866,683.47
7	CAPITULO - GYM BIOSALUDABLE														
3711	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	1.00	$ 3,515,378.00	$ 3,515,378.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
AD-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1.00	$ 9,058,543.00	$ 9,058,543.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
AD-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1.00	$ 9,971,761.00	$ 9,971,761.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
AD-34	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT	UN	1.00	$ 9,755,223.00	$ 9,755,223.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
AD-35	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA BANCA DE PECHO	UN	1.00	$ 10,936,427.00	$ 10,936,427.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
AD-36	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1.00	$ 9,163,591.00	$ 9,163,591.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	CAPITULO - INSTALACIONES														
6877	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	12.00	$ 568,530.00	$ 6,822,360.00	12.00	$ 6,822,360.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 6,822,360.00
282	PUNTO DE AGUA EN PVC DE 1/2"	UN	24.00	$ 41,294.00	$ 991,056.00	24.00	$ 991,056.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24.00	$ 991,056.00
6686	PUNTO SANITARIO 2"	UN	12.00	$ 80,730.00	$ 968,760.00	12.00	$ 968,760.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 968,760.00
293	PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4"	UN	12.00	$ 111,984.00	$ 1,343,808.00	12.00	$ 1,343,808.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 1,343,808.00
7255	SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERÍA ETM	UN	18.00	$ 112,116.00	$ 2,018,088.00	18.00	$ 2,018,088.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	18.00	$ 2,018,088.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6779	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	14.00	$ 104,213.00	$ 1,458,982.00	14.00	$ 1,458,982.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 1,458,982.00
1462	INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES	UN	18.00	$ 35,695.00	$ 642,510.00	18.00	$ 642,510.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	18.00	$ 642,510.00
3632	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	8.00	$ 160,168.00	$ 1,281,344.00	8.00	$ 1,281,344.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 1,281,344.00
9	**CAPITULO - URBANISMO**														
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UN	2.00	$ 3,289,178.00	$ 6,578,356.00	2.00	$ 6,578,356.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 6,578,356.00
2104	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD,PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0,50 X 0,70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0,50 X 0,50 X 0,20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	10.00	$ 328,536.00	$ 3,285,360.00	10.00	$ 3,285,360.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 3,285,360.00
3978	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 8" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	756.00	$ 152,180.00	$ 115,048,080.00	756.00	$ 115,048,080.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	756.00	$ 115,048,080.00
AD-38	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS INTERIORES EN ESPINA DE PESCADO DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 4" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	1735.00	$ 167,105.00	$ 289,927,175.00	1,735.00	$ 289,927,175.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,735.00	$ 289,927,175.00
16	**CAPITULO - PROVISIONES**														
AD-39	ACCESORIOS DE CUADRILATERO	GL	1.00	$ 21,651,300.00	$ 21,651,300.00	1.00	$ 21,651,300.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 21,651,300.00
AD-40	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MURO A DOS MANOS	M2	280.00	$ 36,965.00	$ 10,350,200.00	280.00	$ 10,350,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	280.00	$ 10,350,200.00
5829	TERRENO DE JUEGO (GRAMA BERMUDA 419)	M2	9948.00	$ 97,333.00	$ 968,268,684.00	9,948.00	$ 968,268,684.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,948.00	$ 968,268,684.00
NP	**CAPITULO - NO PREVISTOS**														
NP - 01	DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO EN ZONA POSTERIOR A AULAS DE CLASE EN COLEGIO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE COLUMNAS	M2	-	$ 35,807.54	$ -	160.04	$ 5,730,638.70	-	$ -	160.04	$ 5,730,638.70	160.04	$ 5,730,638.70	-	$ -
NP - 02	BANNER DE CERRAMIENTO	M2	-	$ 94,131.26	$ -	157.12	$ 14,789,903.57	-	$ -	157.12	$ 14,789,903.57	157.12	$ 14,789,903.57	-	$ -
NP - 03	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3	-	$ 1,170,006.16	$ -	175.00	$ 204,751,078.00	-	$ -	55.03	$ 64,385,438.98	55.03	$ 64,385,438.98	119.97	$ 140,365,639.02
NP - 04	SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20	M3	-	$ 159,049.27	$ -	29.23	$ 4,649,010.16	-	$ -	29.23	$ 4,649,010.16	29.23	$ 4,649,010.16	-	$ -
NP - 05	DEMOLICIÓN DE MURO A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	-	$ 18,699.49	$ -	1,028.45	$ 19,231,490.49	-	$ -	797.15	$ 14,906,298.45	797.15	$ 14,906,298.45	231.30	$ 4,325,192.04
NP - 06	TALA DE ARBOLES INCLUYE DISPOSICION FINAL (ALTURA DE 9 A 11 MTS Y PERIMETRO PROMEDIO A ALTURA DE PECHO DE 1,20 MTS)	UND	-	$ 978,160.92	$ -	11.00	$ 10,759,770.12	-	$ -	11.00	$ 10,759,770.12	11.00	$ 10,759,770.12	-	$ -
NP - 07	PODA DE ARBOLES INCLUYE DISPOSICION FINAL (ALTURA DE 9 A 11 MTS Y PERIMETRO PROMEDIO A ALTURA DE PECHO DE 1,20 MTS)	UND	-	$ 602,552.24	$ -	30.00	$ 18,076,567.20	-	$ -	30.00	$ 18,076,567.20	30.00	$ 18,076,567.20	-	$ -
NP - 08	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO	M2	-	$ 115,917.52	$ -	2,900.00	$ 336,160,808.00	-	$ -	259.43	$ 30,072,482.21	259.43	$ 30,072,482.21	2,640.57	$ 306,088,325.79
NP - 09	RELLENO DE CELDAS CON GROUTING	ML	-	$ 32,048.59	$ -	7,250.00	$ 232,352,277.50	-	$ -	377.20	$ 12,088,728.15	377.20	$ 12,088,728.15	6,872.80	$ 220,263,549.35
NP - 10	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3	-	$ 57,670.00	$ -	10,500.00	$ 605,535,000.00	-	$ -	4,586.76	$ 264,518,449.20	4,586.76	$ 264,518,449.20	5,913.24	$ 341,016,550.80

COSTO DIRECTO	**$ 11,429,407,281.24**		**$ 11,355,920,478.93**		**$ 329,542,488.84**		**$ 993,938,549.85**		**$ 1,323,481,038.69**		**$ 10,032,439,440.24**
COSTO INDIRECTO (AIU 30%)	**$ 3,428,822,184.37**		**$ 3,406,776,143.68**		**$ 98,862,746.65**		**$ 298,181,564.96**		**$ 397,044,311.61**		**$ 3,009,731,832.07**
DISEÑOS ESTRUCTURALES OBRAS CIVILES **(NP-D01)**			**$ 30,196,250.00**		**$ -**		**$ 30,196,250.00**		**$ 30,196,250.00**		**$ -**
DISEÑO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS, ESTADIO Y MODULOS DE SERVICIO **(NP-D02)**			**$ 8,025,750.00**		**$ -**		**$ 8,025,750.00**		**$ 8,025,750.00**		**$ -**
DISEÑO CARCAMO DE AGUA LLUVIA, INCLUYE ESTUDIO HIDROLÓGICO **(NP-D03)**			**$ 2,160,843.00**		**$ -**		**$ 2,160,843.00**		**$ 2,160,843.00**		**$ -**
DISEÑO GEOMÉTRICO PISTA DE PATINAJE INCLUIDA CARTA AVAL PARA HOMOLOGACIÓN **(NP-D04)**			**$ 55,150,000.00**		**$ -**		**$ 55,150,000.00**		**$ 55,150,000.00**		**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 14,858,229,465.61**		**$ 14,858,229,465.61**		**$ 428,405,235.49**		**$ 1,387,652,957.81**		**$ 1,816,058,193.30**		**$ 13,042,171,272.31**

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 15 dias del mes de **OCTUBRE** de 2024.

ROBERTO CARLOS DONADO ARCE
CONSORCIO PARQUES DP 2024
REPRESENTANTE LEGAL

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO RADA ALTAHONA
EDUBAR S.A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALBERTO VÁSQUEZ
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 4070	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

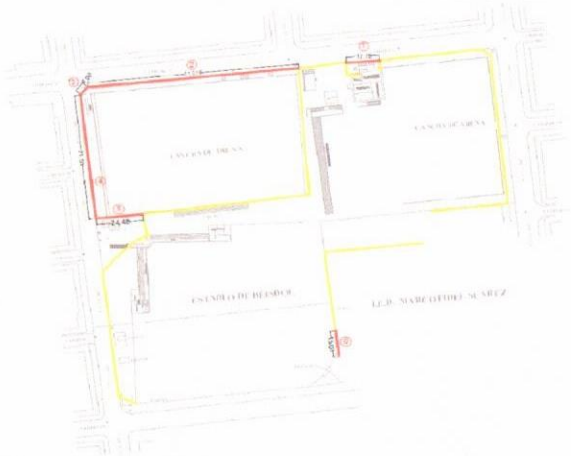

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ZONA 1 -Carrera 7C (Comisaría de familia)	17.75				1.00	17.75		
ZONA 2 - Carrera 7C (Cancha No. 01)	110.16				1.00	110.16		
ZONA 3 - Esquina Calle 38B - Carrera 7C	6.00				1.00	6.00		
ZONA 4 - Calle 38B (Cancha No. 01)	71.55				1.00	71.55		
ZONA 5 - Cancha No. 01 - Estadio de beisbol	24.45				1.00	24.45		
ZONA 6 - Estadio de beisbol - Colegio	15.00				1.00	15.00		


Cantidad contractual según Modificativa No. 01	983.11
Acumulado anterior	618.20
Acumulado a presente acta	863.11
Obra por ejecutar	120.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	244.91
				OBSERVACIONES:	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02

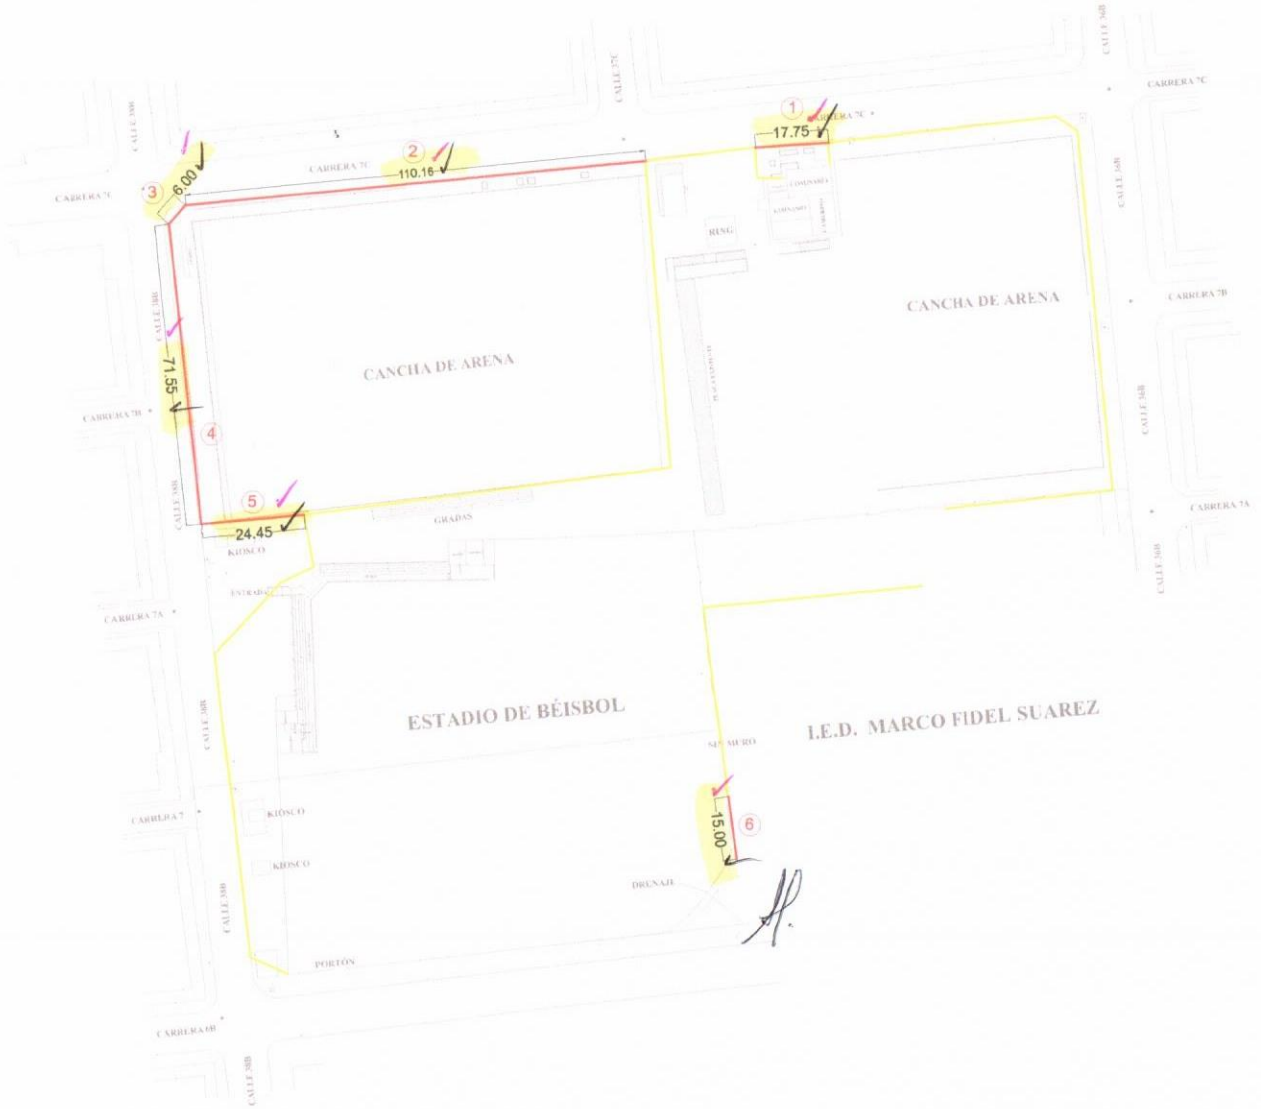

4070. SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1499	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

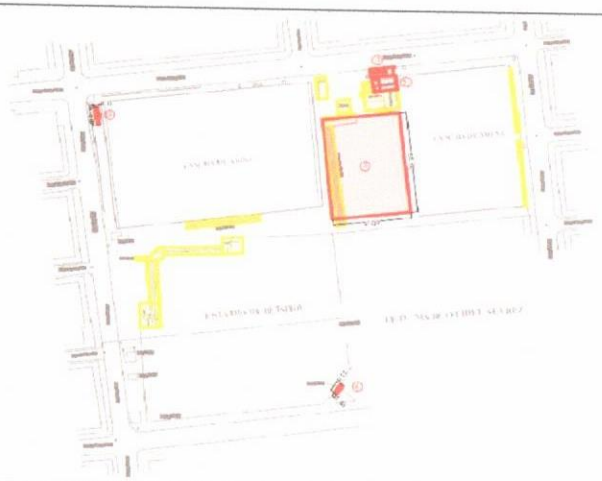

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1 - Exterior comisaria de familia (Los descuentos corresponden a jardineras)	11.98	4.62			1.00		55.35	
	4.28	1.23			-1.00		-5.26	
	4.26	1.48			-1.00		-6.30	
	1.39	1.01			0.50		0.70	
ZONA 2 - Comisaría de familia	8.76	8.08			1.00		70.78	
	6.80	3.03			1.00		20.60	
ZONA 3 - Pista de patinaje	55.80	41.00			1.00		2287.80	
ZONA 4 - Fondo de estadio de beisbol	6.11	1.83			1.00		11.18	
ZONA 5 - Esquina calle 38B con carrera 7C	10.05	1.13			1.00		11.36	

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	4,118.66
Acumulado anterior	1372.45
Acumulado a presente acta	3818.66
Obra por ejecutar	300.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	2,446.21
OBSERVACIONES:	

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA


Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02

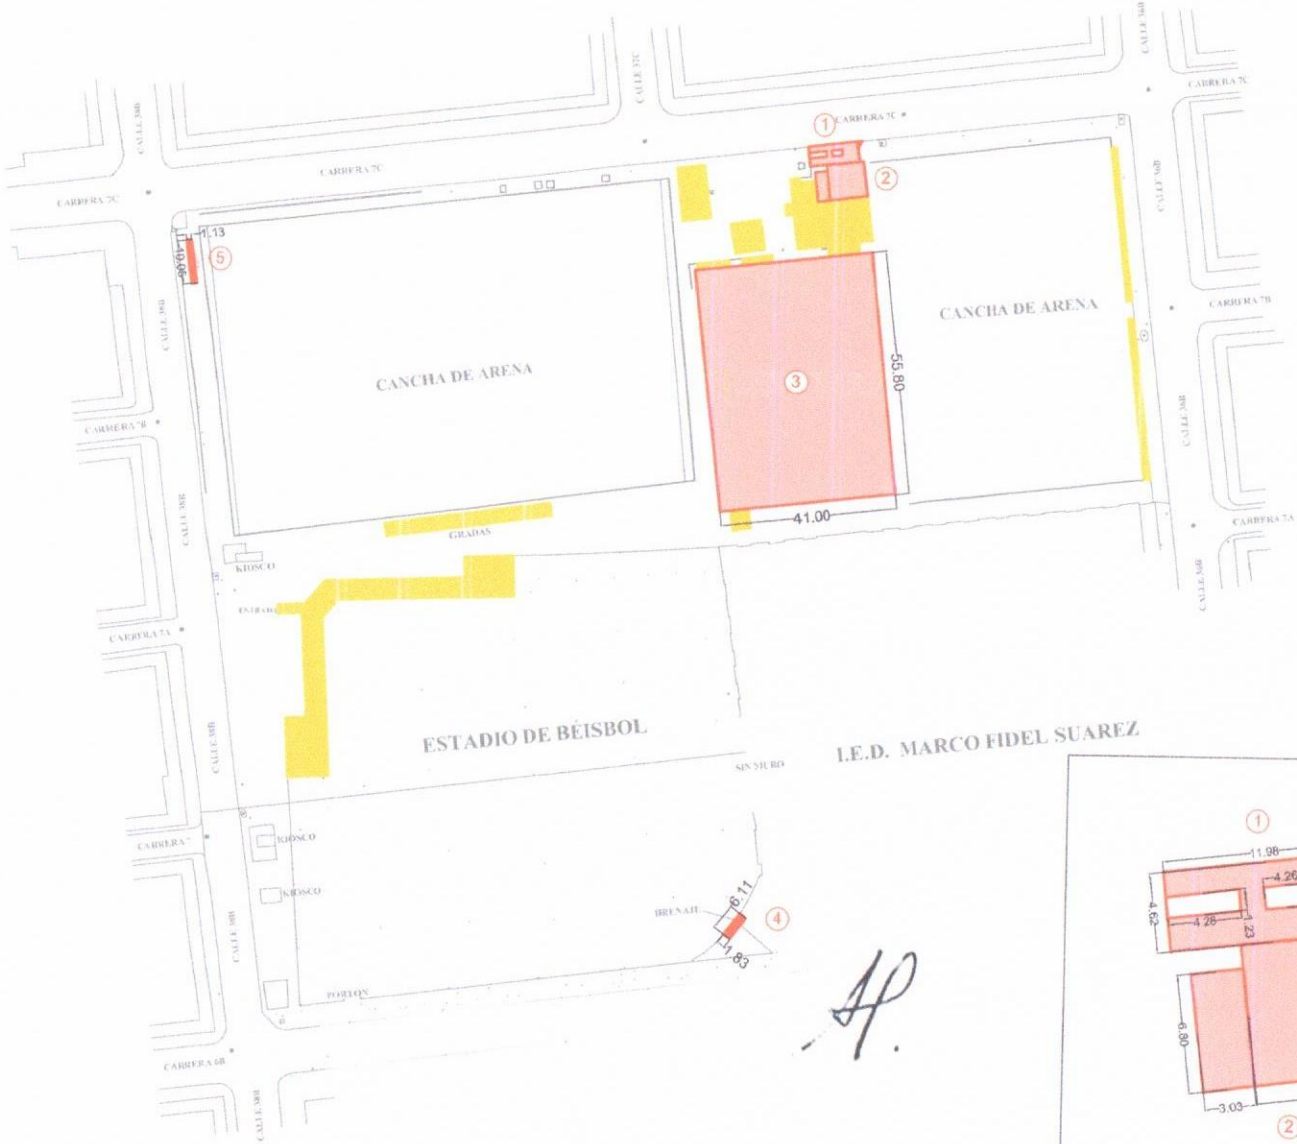

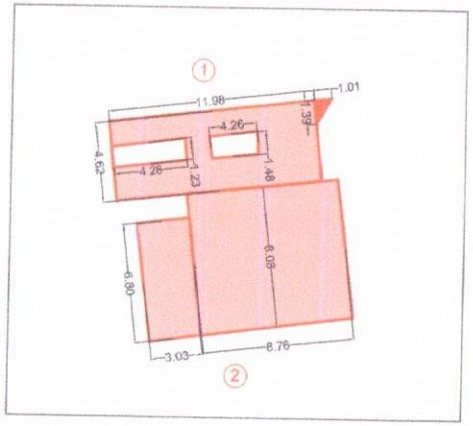

1499. DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL

Acumulado

Presente acta


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 6646	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

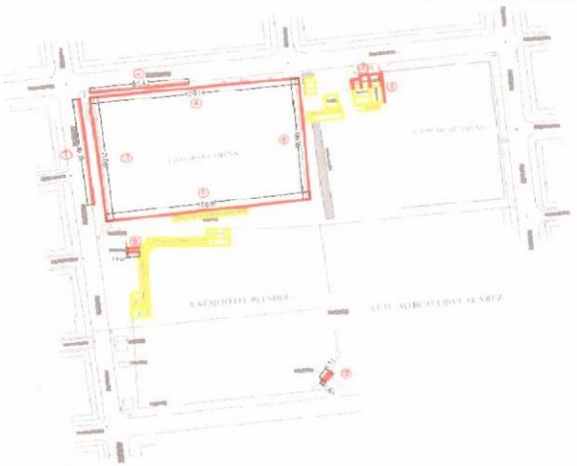

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 - Calle 38B / Cancha No. 01	60.78				1.00	60.78		
ZONA 2 - Carrera 7C / Cancha No. 01	51.42				1.00	51.42		
ZONA 3 - Cancha No. 01	71.58				1.00	71.58		
ZONA 4 - Cancha No. 01	109.14				1.00	109.14		
ZONA 5 - Cancha No. 01	106.87				1.00	106.87		
ZONA 6 - Cancha No. 01	69.88				1.00	69.88		
ZONA 7 - Comisaria de familia	10.82				1.00	10.82		
	6.83				1.00	6.83		
	6.79				1.00	6.79		
	6.73				1.00	6.73		
ZONA 8 - Lateral a comisaría de familia	18.16				1.00	18.16		
ZONA 9 - Acceso a estadio de beisbol	5.63				2.00	11.26		
	2.17				1.00	2.17		
ZONA 10 - Fondo de estadio de beisbol	6.11				2.00	12.22		
	1.83				2.00	3.66		

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	1,237.94
Acumulado anterior	689.63
Acumulado a presente acta	1237.94
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA: 548.31
				OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02



6646. DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 6647	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE JARDINERAS


UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

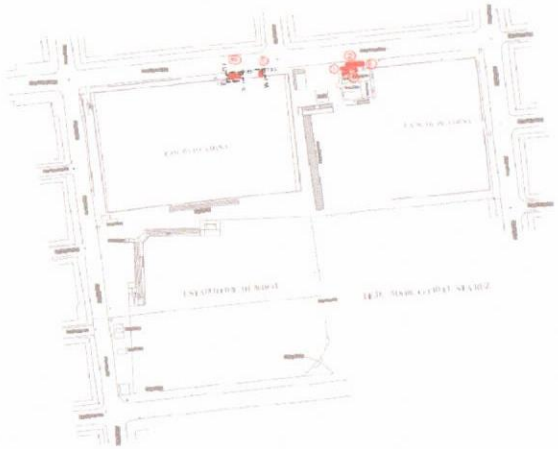

REGISTRO FOTOGRÁFICO

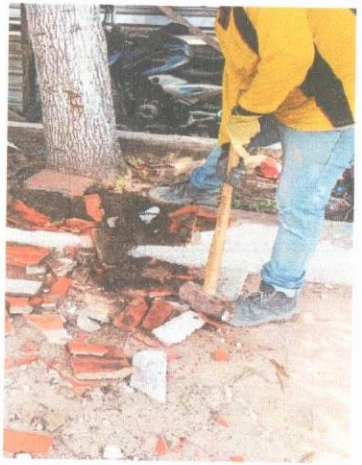



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 - Jardinera frente a comisaría de familia	1.44				2.00	2.88		
	1.37				2.00	2.74		
ZONA 2 - Jardinera frente a comisaría de familia	4.28				2.00	8.56		
	4.90				2.00	9.80		
ZONA 3 - Jardinera frente a comisaría de familia	2.46				2.00	4.92		
	1.30				2.00	2.60		
ZONA 4 - Jardinera frente a comisaría de familia	1.06				1.00	1.06		
	2.43				1.00	2.43		
	2.30				1.00	2.30		
	4.12				1.00	4.12		
	1.56				1.00	1.56		
ZONA 5 - Jardinera cancha No. 01	1.83				2.00	3.66		
	1.55				2.00	3.10		
ZONA 6 - Jardinera cancha No. 01	1.82				2.00	3.64		
	1.62				2.00	3.24		
	1.83				2.00	3.66		
	1.73				2.00	3.46		

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	80.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	63.73
Obra por ejecutar	16.27

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA: 63.73
				OBSERVACIONES:



6647. DEMOLICION DE JARDINERAS

Acumulado

Presente acta


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 578 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

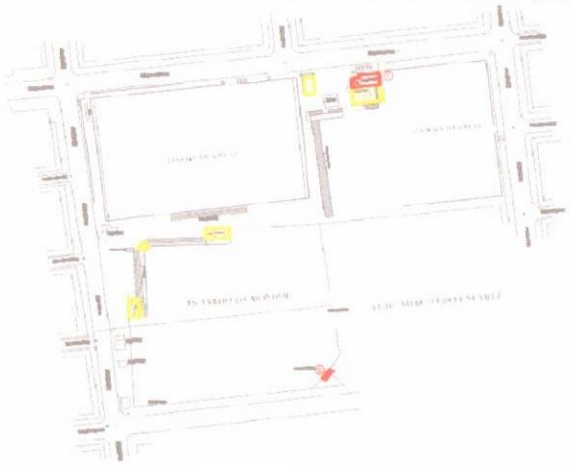

REGISTRO FOTOGRÁFICO

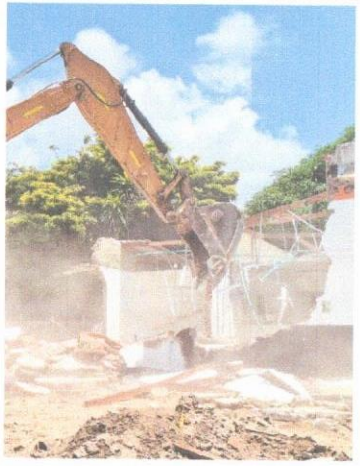



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES GL	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1- Comisaría de familia ✓					1.00	1.00 ✓		
ZONA 2- Fondo estadio de beisbol ✓					1.00	1.00 ✓		

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	7.00
Acumulado anterior	5.00
Acumulado a presente acta	7.00 ✓
Obra por ejecutar	0.00 ✓

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	2.00 ✓
				OBSERVACIONES:	



578. DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	AD-04	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

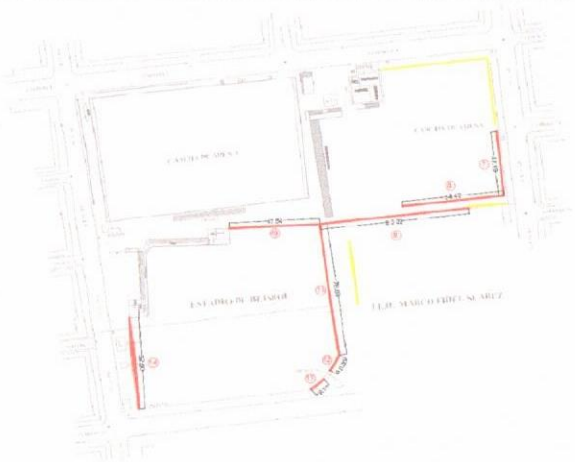

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 - Cancha No. 02 / Calle 36B	37.19				1.00	37.19		
ZONA 2 - Cancha No. 02 / Preescolar	54.43				1.00	54.43		
ZONA 3 - Pista de patinaje / Colegio	80.02				1.00	80.02		
ZONA 4 - Cancha No. 01 / Estadio de beisbol	47.54				1.00	47.54		
ZONA 5 - Estado de beisbol / Colegio	76.03				1.00	76.03		
ZONA 6 - Fondo de estadio de beisbol	10.05				1.00	10.05		
ZONA 7 - Fondo de estadio de beisbol	9.11				1.00	9.11		
ZONA 8 - Calle 38B / Estadio de beisbol	52.50				1.00	52.50		

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	607.91
Acumulado anterior	150.04
Acumulado a presente acta	516.91
Obra por ejecutar	91.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. ~~RESIDENTE DE OBRA~~ M	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	366.87
				OBSERVACIONES:	

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02



AD-04. DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL

Acumulado Presente acta

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 127	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1 - Gimnasio y camerino(Carrera 7C)	16.46	8.52			1.00		140.24	
ZONA 2 - Comisaría de familia	19.00	14.60			1.00		277.40	
ZONA 3 - Entrada estadio de beisbol	41.75	15.35			1.00		640.86	
ZONA 4 - Jaula de bateo lateral a Cancha No.01	59.27	19.50			1.00		1155.77	
ZONA 5 - Estadio de beisbol	105.13	77.90			1.00		8189.63	

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	31,517.00
Acumulado anterior	7392.58
Acumulado a presente acta	17796.48
Obra por ejecutar	13720.52

Observación: Se toma el valor promedio de longitudes y anchos, para simplificar procedimientos matemáticos y cálculos correspondientes.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**10,403.90**
				OBSERVACIONES:	



127. NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25
CÓDIGO DEL ITEM:	2526		

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

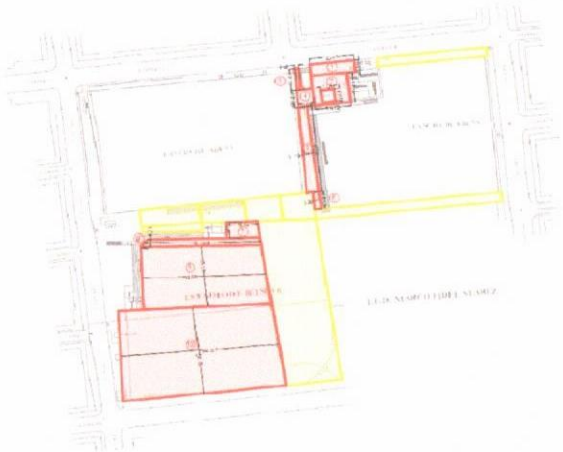

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ZONA 1	23.81	6.86			1.00		163.34	
ZONA 2	19.12	17.04			1.00		325.80	
	7.01	6.97			-1.00		-48.86	
ZONA 3	12.18	2.20			1.00		26.80	
ZONA 4	10.06	8.89			1.00		89.43	
ZONA 5	49.58	5.76			1.00		285.58	
ZONA 6	10.13	3.38			1.00		34.24	
ZONA 7	18.14	9.48			1.00		171.97	
ZONA 8	61.00	4.21			1.00		256.81	
ZONA 9	65.05	35.13			1.00		2285.21	
ZONA 10	82.57	50.15			1.00		4140.89	

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	20,643.64
Acumulado anterior	4937.53
Acumulado a presente acta	12668.74
Obra por ejecutar	7974.90

Observación: Se toma el valor promedio de longitudes y anchos, para simplificar procedimientos matemáticos y cálculos correspondientes.

TOTAL PRESENTE ACTA:	7,731.21

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02



2526. DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.
CÓDIGO DEL ITEM:	3813		

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

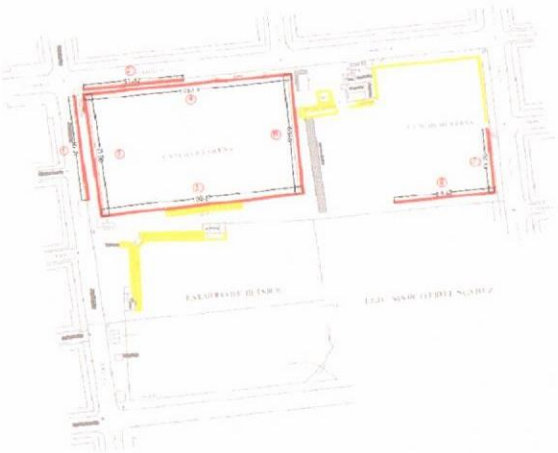

REGISTRO FOTOGRÁFICO

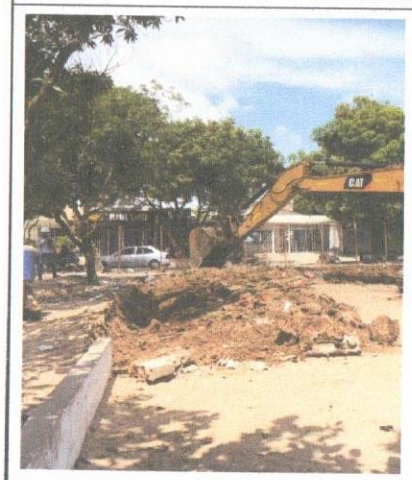



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 - Calle 38B / Cancha No. 01	60.78				1.00	60.78		
ZONA 2 - Carrera 7C / Cancha No. 01	51.42				1.00	51.42		
ZONA 3 - Cancha No. 01 / Calle 38B	71.58				1.00	71.58		
ZONA 4 - Cancha No. 01 / Carrera 7C	109.14				1.00	109.14		
ZONA 5 - Cancha No. 01 / Estadio de beisbol	106.87				1.00	106.87		
ZONA 6 - Cancha No. 01 / Pista de patinaje	69.88				1.00	69.88		
ZONA 7 - Cancha No. 02 / Calle 36B	37.19				1.00	37.19		
ZONA 8 - Cancha No. 02 / Colegio preescolar	54.43				1.00	54.43		

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	1,895.00
Acumulado anterior	901.04
Acumulado a presente acta	1462.33
Obra por ejecutar	432.67

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	561.29
				OBSERVACIONES:	

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02



3813. DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.

Acumulado Presente acta

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2600	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES UND	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1 - Cancha No. 01					1.00	1.00		
ZONA 2 - Cancha No. 01					1.00	1.00		

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	6.00
Acumulado anterior	4.00
Acumulado a presente acta	6.00
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	2.00
				OBSERVACIONES:	

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02



2600. DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2		**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".	
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1868	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

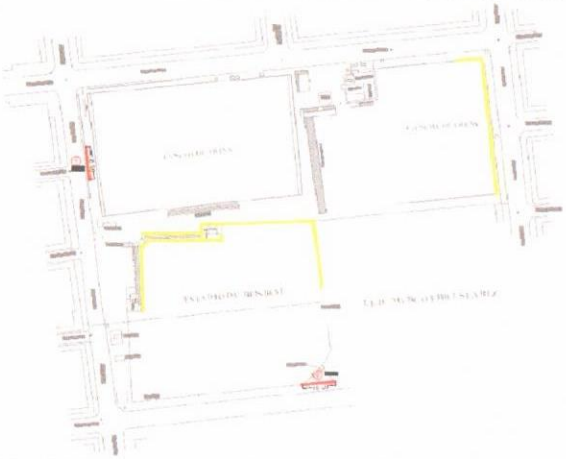

REGISTRO FOTOGRÁFICO






LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1 - Cancha No. 01 / Calle 38B	18.90		2.20		1.00		41.58	
ZONA 2 - Fondo de estadio de beisbol	18.00		1.80		1.00		32.40	

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	1,025.26
Acumulado anterior	951.28
Acumulado a presente acta	1025.26
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	73.98
				OBSERVACIONES:	

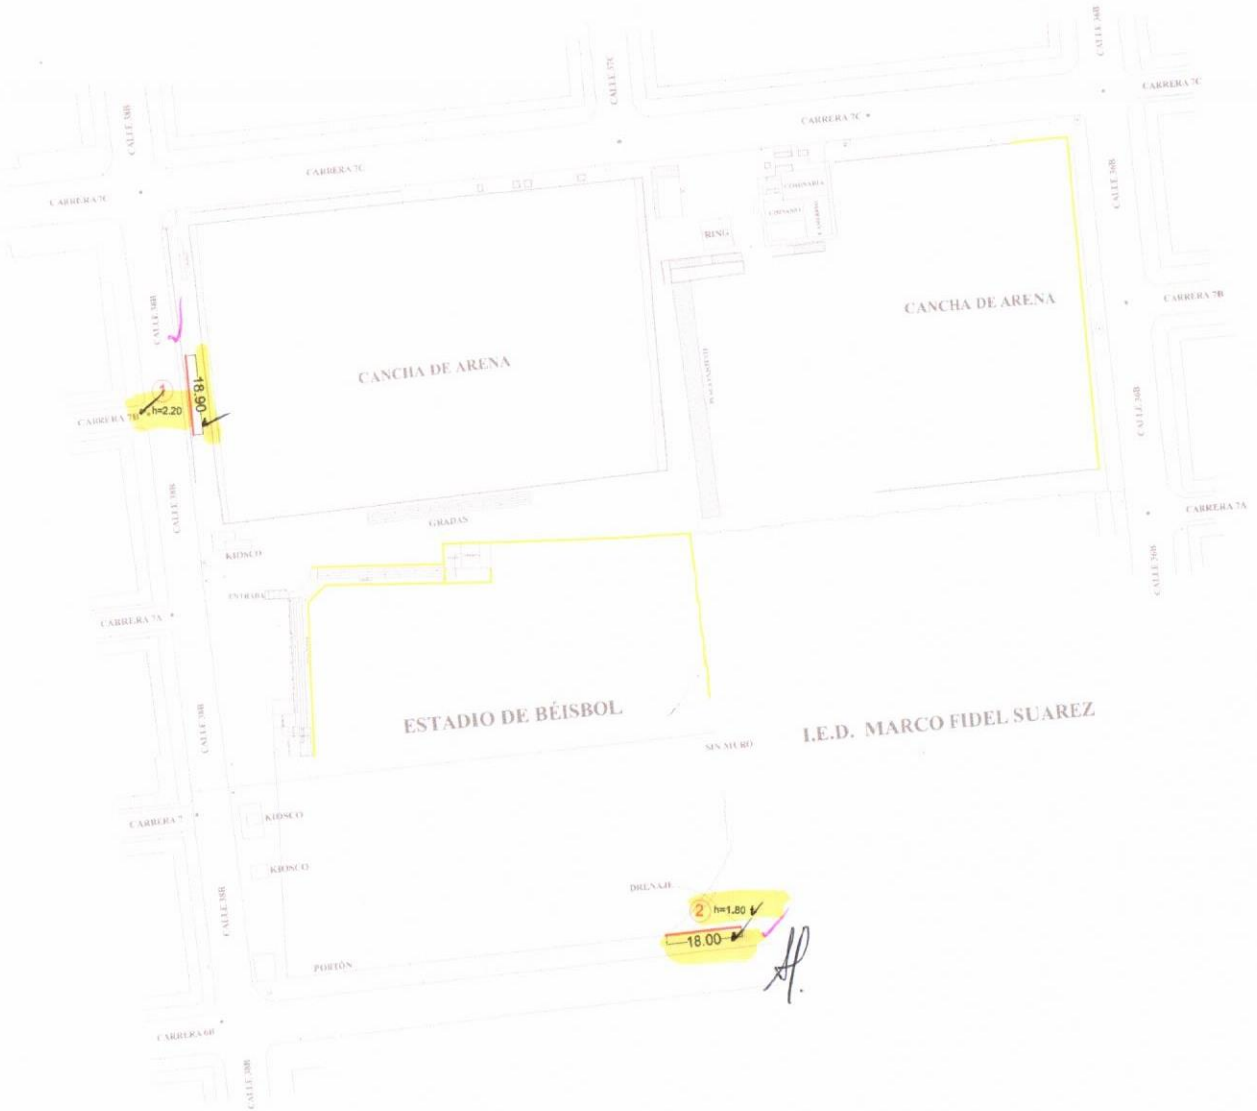

1868. DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 1625	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

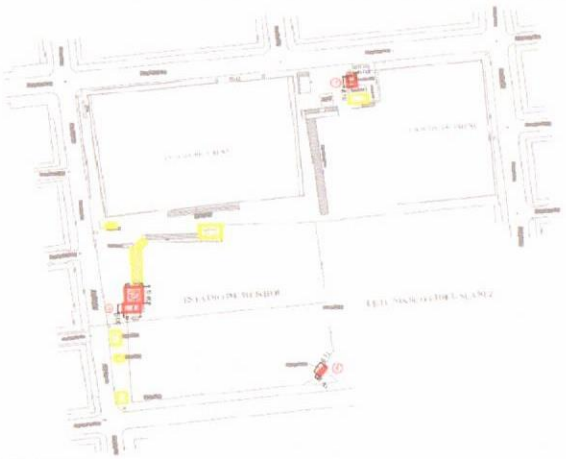

REGISTRO FOTOGRÁFICO

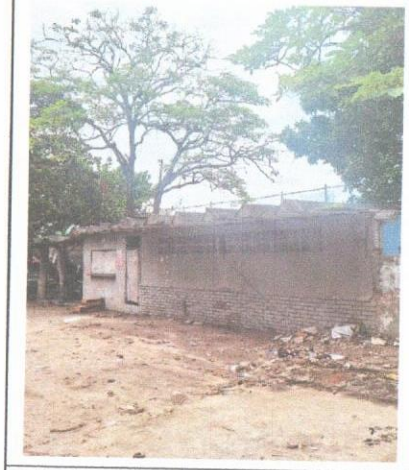



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1 - Oficina de futbol / Carrera 7C	6.19	4.76			1.00		29.46	
ZONA 2 - Kiosco estadio de beisbol	9.40	8.73			1.00		82.06	
ZONA 3 - Camerino estadio de beisbol	8.60	5.00			1.00		43.00	
ZONA 4 - Fondo estadio de beisbol	6.11	1.83			1.00		11.18	

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	674.65
Acumulado anterior	508.95
Acumulado a presente acta	674.65
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	165.70
				OBSERVACIONES:	

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02



1625. DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	5724	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA


REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

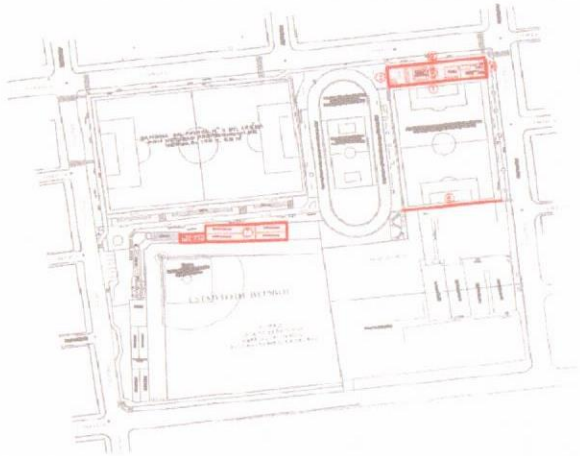

REGISTRO FOTOGRÁFICO





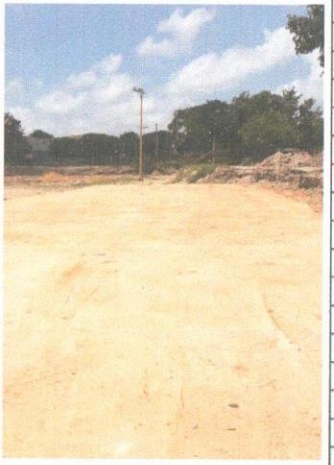

LOCALIZACION	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1 - MODULO DE SERVICIO (Cimentación muro Norte cancha No. 02 arena)	20.36			20.36
ZONA 2 - MODULO DE SERVICIO (Cimentación muro Norte área de boxeo)	65.02			65.02
ZONA 3 - MODULO DE SERVICIO (Cimentación Oeste - Norte área de boxeo)	12.96			12.96
ZONA 4 - MODULO DE SERVICIO (Cimentación Este - Norte área de boxeo)	7.73			7.73
ZONA 5 - MODULO DE SERVICIO (Relleno entre muros zona de boxeo)	374.65			374.65
ZONA 6 - CANCHA No. 02 / COLEGIO (Cimentación muro Sur cancha de arena No. 02)	71.08			71.08
ZONA 7 - ESTADIO DE BEISBOL (Jaula de bateo Estadio de beisbol / Cancha No. 01)	235.93			235.93
ZONA 8 - ESTADIO DE BEISBOL (Dugout Estadio de beisbol / Cancha No. 01)	55.42			55.42

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	11,371.10
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	843.15
Obra por ejecutar	10527.95

Observaciones: Ver anexos, carteras topográficas de relleno.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	843.15
				OBSERVACIONES:	



5724. EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO


Acumulado Presente acta

RELLENO CIMENTACION MURO NORTE CANCHA #2 DE ARENA							
ABSCISADO	LONGITUD	COTAS EJE		PROMEDIO ALTURA	ALTURA	ANCHO	VOLUMEN
		SUPERIOR	INFERIOR				
0		33.35	32.60	0.75			
	10				0.59	1.20	7.08
10		33.03	32.60	0.43			
	10				0.49	1.20	5.94
20		33.16	32.60	0.56			
	10				0.58	1.20	7.02
30		33.21	32.60	0.61			
	10				0.65	1.20	7.8
40		33.29	32.60	0.69			
	10				0.73	1.20	8.76
50		33.37	32.60	0.77			
	2.67				0.78	1.20	2.52
52.67		33.4	32.60	0.80			
SOLADO	-52.67				0.05	0.8	-2.11
ZAPATA	-52.67				0.35	0.8	-14.75
MURO	-52.67				0.24	0.15	-1.90
TOTAL VOLUMEN							20.36 ✓ ZONA 1.

ELABORÓ: JOSE JULIO REBOLLEDO
TOPOGRAFO

REVISÓ: SAMUEL PATRÓN
RESIDENTE ADMINISTRATIVO

RA 7C

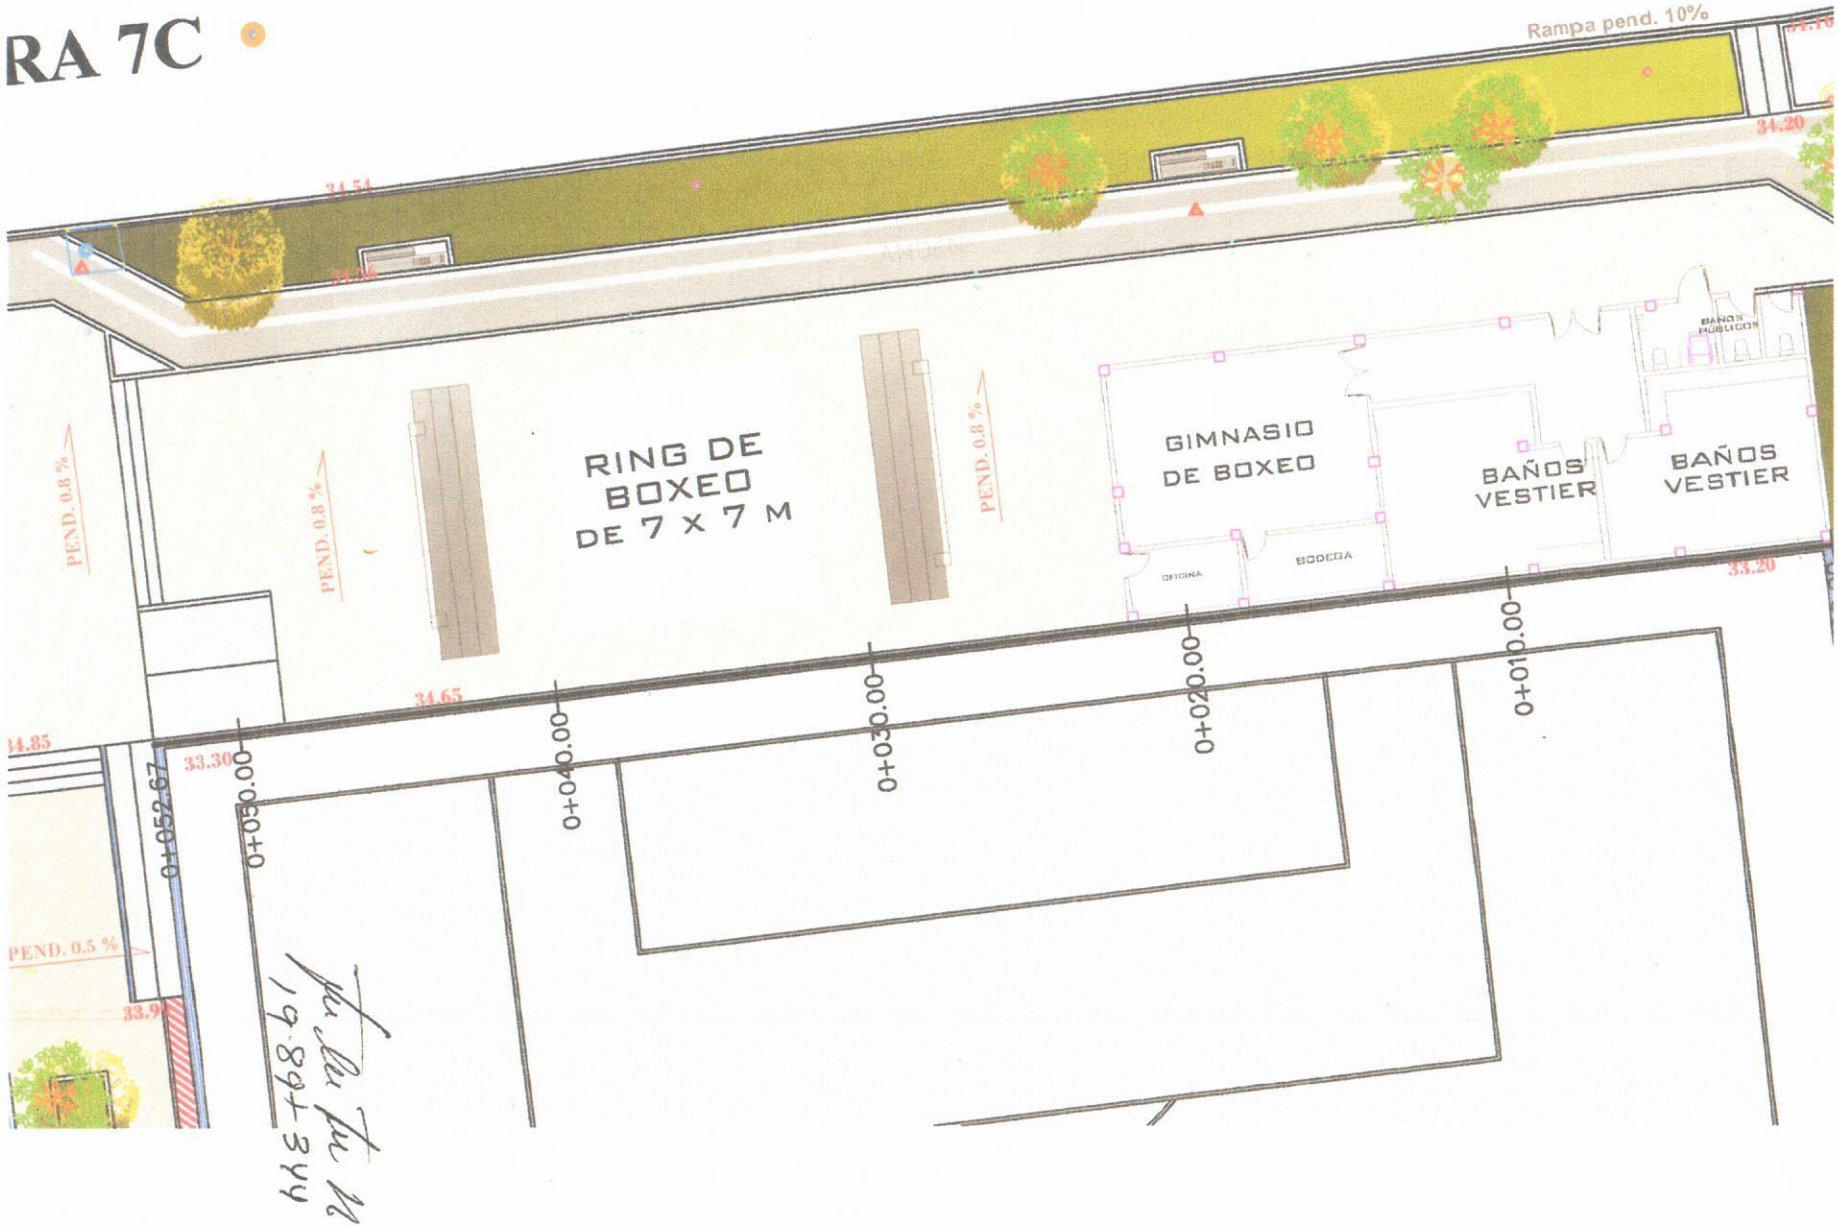
Rampa pend. 10%
34.54
34.20
RING DE
BOXEO
DE 7 X 7 M
PEND. 0.8 %
PEND. 0.8 %
PEND. 0.8 %
GIMNASIO
DE BOXEO
OFICINA
BODEGA
BAÑOS
VESTIER
BAÑOS
VESTIER
BAÑOS
PUBLICOS
34.65
33.30
33.20
0+052.67
0+050.00
0+040.00
0+030.00
0+020.00
0+010.00
PEND. 0.5 %
33.9
19.89+3.44

RELLENO CIMENTACION MURO NORTE AREA DE BOXEO							
ABSCISADO	LONGITUD	COTAS EJE		PROMEDIO ALTURA	ALTURA	ANCHO	VOLUMEN
		SUPERIOR	INFERIOR				
0		33.85	32.81	1.04			
	10				1.165	1.20	13.98
10		34.1	32.81	1.29			
	10				1.39	1.20	16.62
20		34.29	32.81	1.48			
	10				1.49	1.20	17.82
30		34.3	32.81	1.49			
	10				1.51	1.20	18.06
40		34.33	32.81	1.52			
	10				1.53	1.20	18.36
50		34.35	32.81	1.54			
	2.67				1.54	1.20	4.93
52.67		34.35	32.81	1.54			
SOLADO	-52.67				0.05	0.8	-2.11
ZAPATA	-52.67				0.35	0.8	-14.75
MURO	-52.67				1	0.15	-7.90
TOTAL VOLUMEN							65.02 ✓ ZONA 2


RELLENO CIMENTACION OESTE NORTE AREA DE BOXEO							
ABSCISADO	LONGITUD	COTAS		PROMEDIO ALTURA	ALTURA	ANCHO	VOLUMEN
		EJE					
		SUPERIOR	INFERIOR				
0		34.35	32.81	1.54			
	10				1.37	1.20	16.44
10		34.01	32.81	1.20			
	1.27				0.89	1.20	1.36
11.27		33.4	32.81	0.59			
SOLADO	-11.27				0.05	0.8	-0.45
ZAPATA	-11.27				0.35	0.8	-3.16
MURO	-11.27				0.73	0.15	-1.23
TOTAL VOLUMEN							12.96 ✓ ZONA 3

EXCAVACION CIMENTACION ESTE NORTE AREA DE BOXEO							
ABSCISADO	LONGITUD	COTAS		PROMEDIO ALTURA	ALTURA	ANCHO	VOLUMEN
		EJE					
		SUPERIOR	INFERIOR				
0		33.85	32.81	1.04			
	10				0.915	1.20	10.98
10		33.6	32.81	0.79			
	1.27				0.66	1.20	1.01
11.27		33.35	32.81	0.54			
SOLADO	-11.27				0.05	0.8	-0.45
ZAPATA	-11.27				0.35	0.8	-3.16
MURO	-11.27				0.39	0.15	-0.66
TOTAL VOLUMEN							7.73 ✓ ZONA 4


ELABORÓ: JOSE JULIO REBOLLEDO
TOPOGRAFO

REVISÓ: SAMUEL PATRÓN
RESIDENTE ADMINISTRATIVO

RA 7C

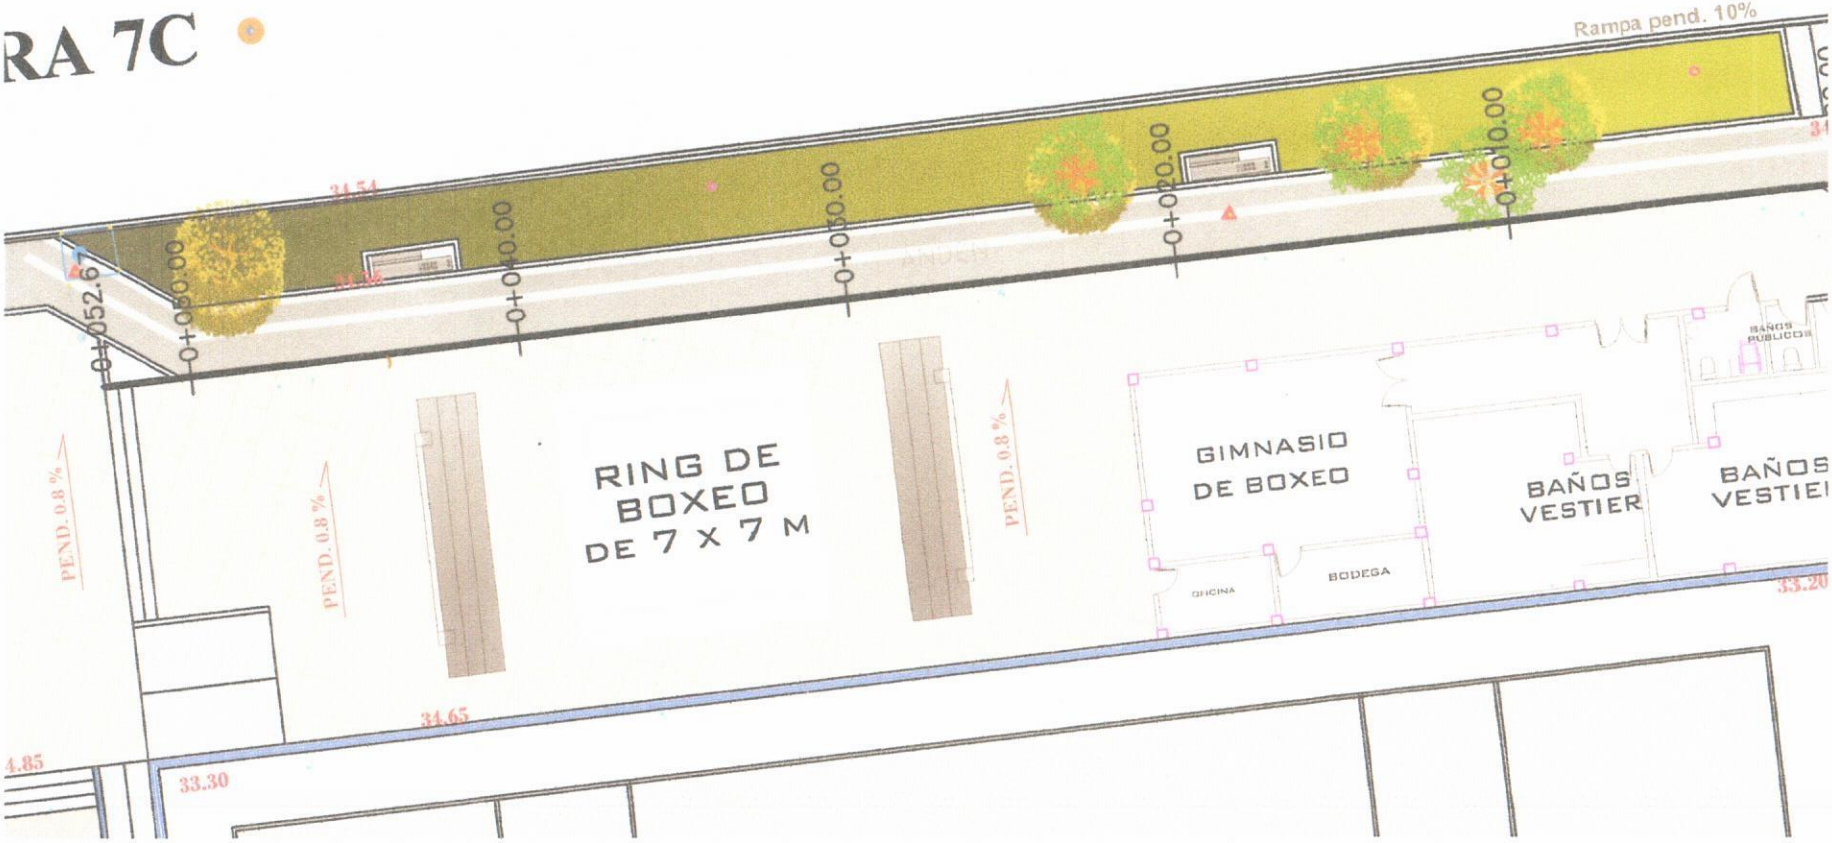
Rampa pend. 10%
RING DE BOXEO DE 7 X 7 M
GIMNASIO DE BOXEO
OFICINA
BODEGA
BAÑOS PUBLICOS
PEND. 0.8 %
PEND. 0.8 %
PEND. 0.8 %
34.65
33.30
4.85
33.20

34.70
34.73
0+000.00
0+005.00
0+010.00
0+011.27
34.85
33.30
PEND. 0.8 %
PEND. 0.8 %
PEND. 0.8 %

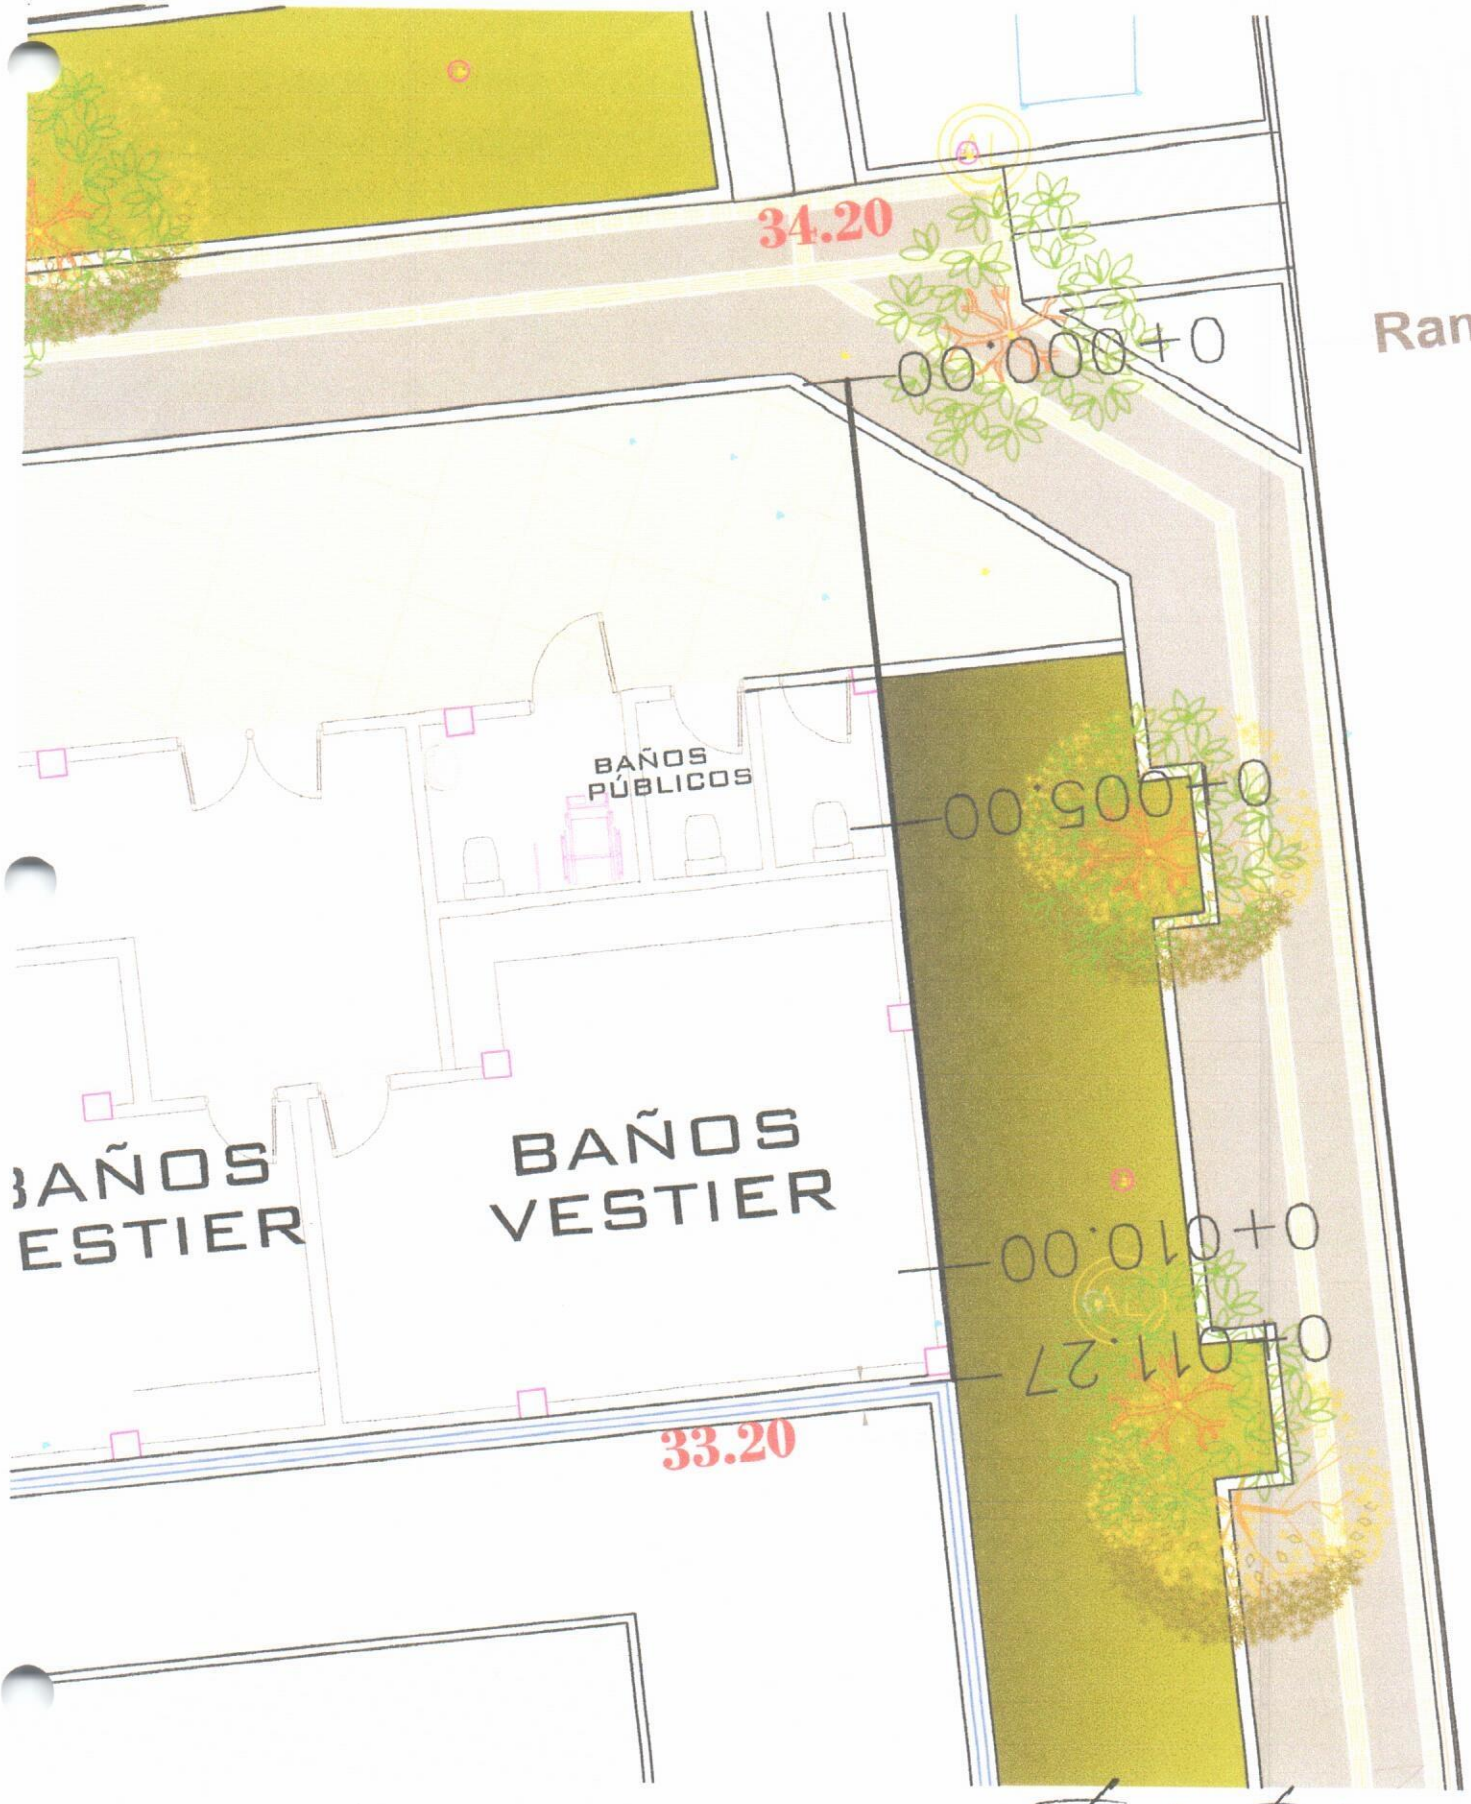

Fuente tu b
19.89+.344

RELLENO ENTRE MUROS ZONA DE BOXEO											
ABSCISADO	LONGITUD	COTAS						PROMEDIO ALTURA	ALTURA	ANCHO	VOLUMEN
		IZQUIERDA		EJE		DERECHA					
		SUPERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR				
0		33.53	33.30	33.65	33.30	33.58	33.35	0.23			
	10								0.51	11.20	57.12
10		33.87	32.98	34.01	33.32	34.03	33.34	0.79			
	10								0.77	11.20	86.52
20		33.92	33.11	34.08	33.30	34.08	33.38	0.75			
	10								0.73	11.20	82.04
30		33.91	33.16	34.05	33.32	34.12	33.45	0.71			
	10								0.66	11.20	73.64
40		33.93	33.24	34.01	33.45	34.12	33.60	0.60			
	10								0.54	11.20	60.20
50		33.91	33.32	33.92	33.58	34.10	33.75	0.47			
	2.29								0.59	11.20	15.13
52.29		34.3	33.35	34.16	33.58	34.27	33.80	0.71			
TAL VOLUMEN											374.65


✓ ZONA 5

19.894+344

ELABORÓ: JOSE JULIO REBOLLEDO
TOPOGRAFO

REVISÓ: SAMUEL PATRÓN
RESIDENTE ADMINISTRATIVO

RA 7C

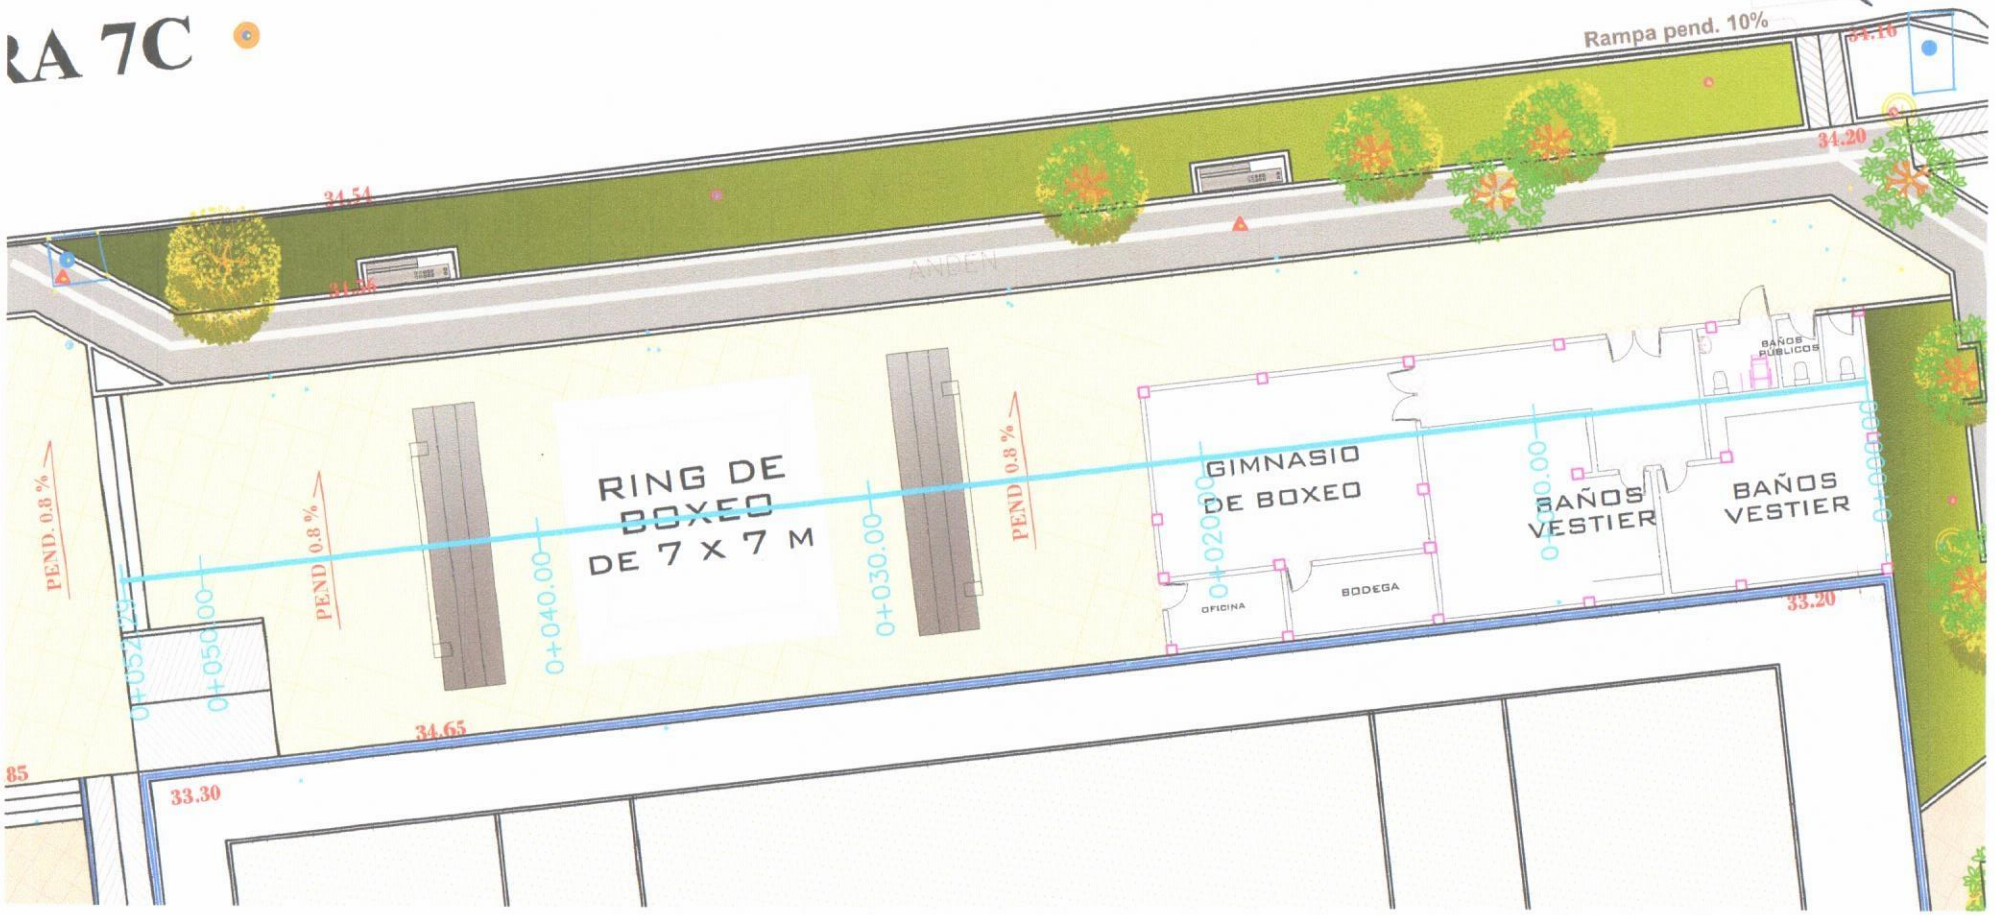
Rampa pend. 10%
34.54
34.16
34.20
ANDEN
RING DE BOXEO DE 7 X 7 M
PEND. 0.8 %
PEND 0.8 %
PEND 0.8 %
0+040.00
0+030.00
0+020.00
0+000.00
GIMNASIO DE BOXEO
BAÑOS PUBLICOS
BAÑOS VESTIER
BAÑOS VESTIER
OFICINA
BODEGA
33.20
34.65
33.30

RELLENO CIMENTACION CARCAMO MURO SUR CANCHA DE ARENA #2									
ABSCISADO	LONGITUD	COTAS				PROMEDIO ALTURA	ALTURA	ANCHO	VOLUMEN
		EJE		DERECHA					
		SUPERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR				
0		31,36	31,00	31,36	31,00	0,36			
	10						0,41	2,80	11,48
10		31,46	31,00	31,46	31,00	0,46			
	10						0,51	2,80	14,28
20		31,56	31,00	31,56	31,00	0,56			
	10						0,61	2,80	17,08
30		31,66	31,00	31,66	31,00	0,66			
	10						0,71	2,80	19,88
40		31,76	31,00	31,76	31,00	0,76			
	10						0,81	2,80	22,68
50		31,86	31,00	31,86	31,00	0,86			
	2,67						0,89	2,80	6,62
52,67		31,91	31,00	31,91	31,00	0,91			
SOLADO	-52,67						0,05	0,9	-2,37
ZAPATA	-52,67						0,35	0,9	-16,59
MURO	-52,67						0,25	0,15	-1,98
TOTAL VOLUMEN									71,08 ✓

ZONA 6

19·897344



Tu derecha
1989+344

EXCAVACION JAULA DE BATEO					
ABSCISA	LONG	AREA	VOL ENTRE SECCION	VOLUMEN INCREMENTA	
0,00		10,37			VER SECCIONES
10,00	10	5,73	80,50	80,50	VER SECCIONES
20,00	10	7,96	68,45	148,95	VER SECCIONES
30,00	10	4,62	62,90	211,85	VER SECCIONES
40,00	10	8,36	64,90	276,75	VER SECCIONES
47,69	7,69	16,08	93,97	370,72	VER SECCIONES


TOTAL			370,72	

RELLENO JAULA DE BATEO					
ABSCISA	LONG	AREA	VOL ENTRE SECCION	VOLUMEN INCREMENTA	
0,00		4,91			VER SECCIONES
10,00	10	5,56	52,35	52,35	VER SECCIONES
20,00	10	5,84	57,00	109,35	VER SECCIONES
30,00	10	4,74	52,90	162,25	VER SECCIONES
40,00	10	4,26	45,00	207,25	VER SECCIONES
47,69	7,69	3,20	28,68	235,93	VER SECCIONES

TOTAL			235,93 ✓		ZONA 7


19.897.344


35.18
PEND. 2.3 %
PEND. 2.3 %
0+047.80
0+040.00
0+030.00
0+020.00
0+010.00
0+000.00
JAULA DE BATEO
JAULA DE BATEO
JAULA DE BATEO
22.00
amiento en malla electrosoldada
altura de 2.4 metros, sobre
nte en bloque en concreto
zardado y cimentación de viga
) x 0.30 Mts.
34.80
Terreno de juego
Piso en grama
sintética

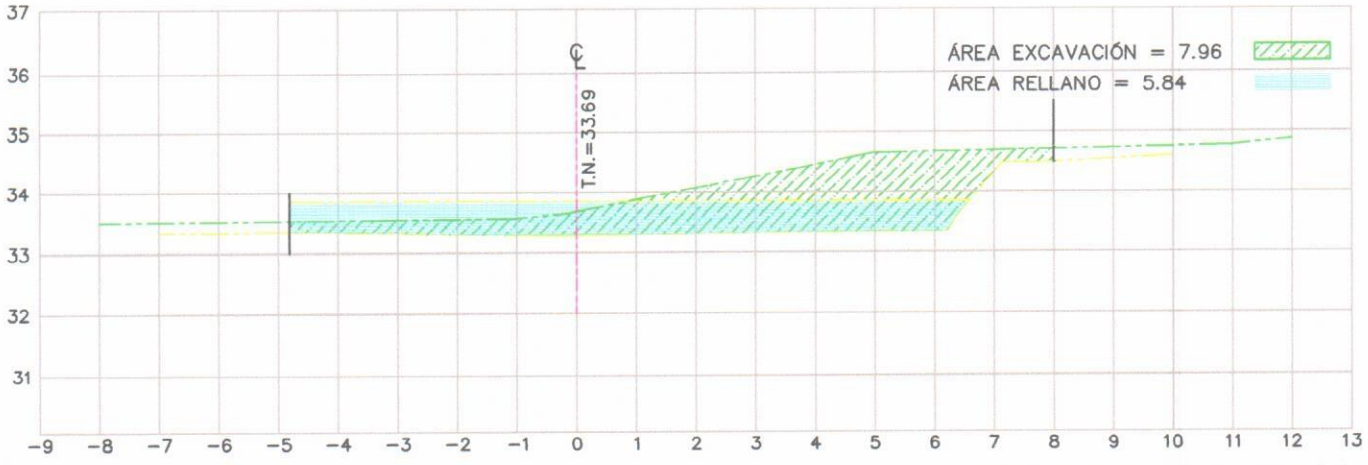


ESTACION 0+020.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

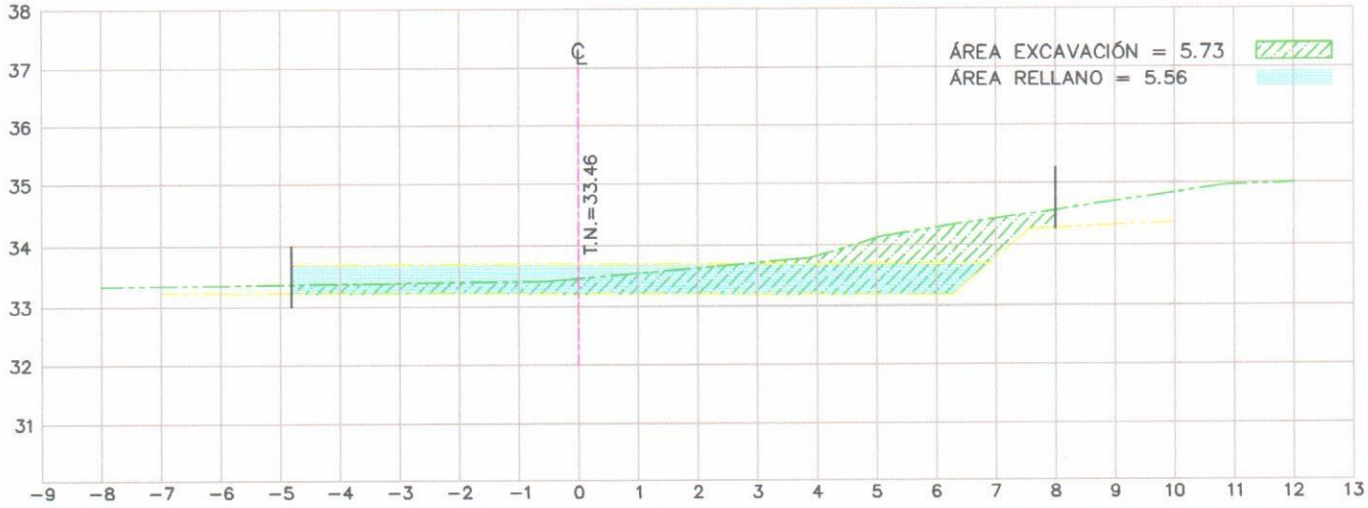


ESTACION 0+010.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

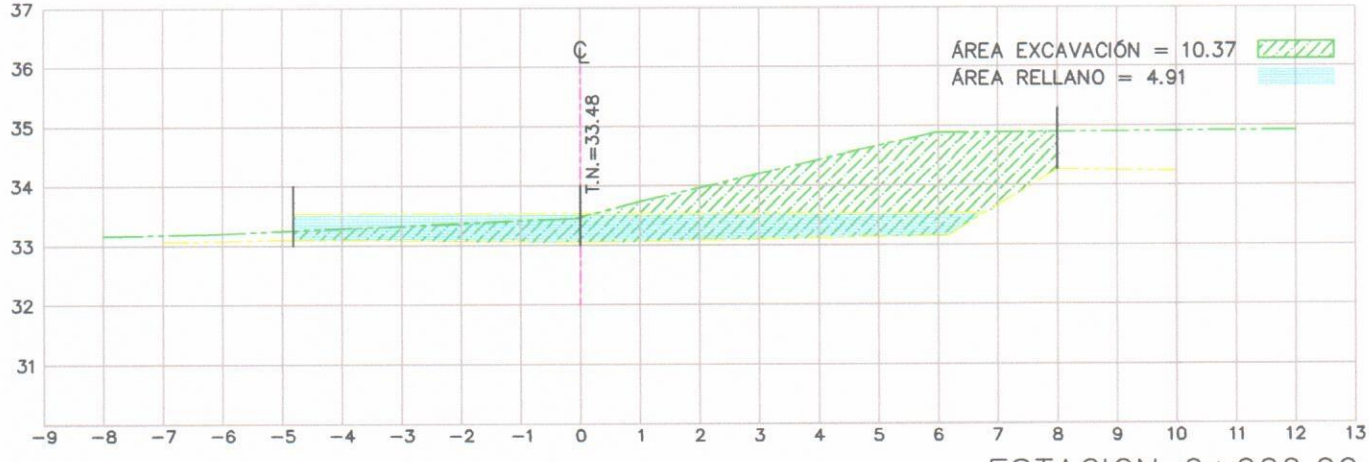


ESTACION 0+000.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

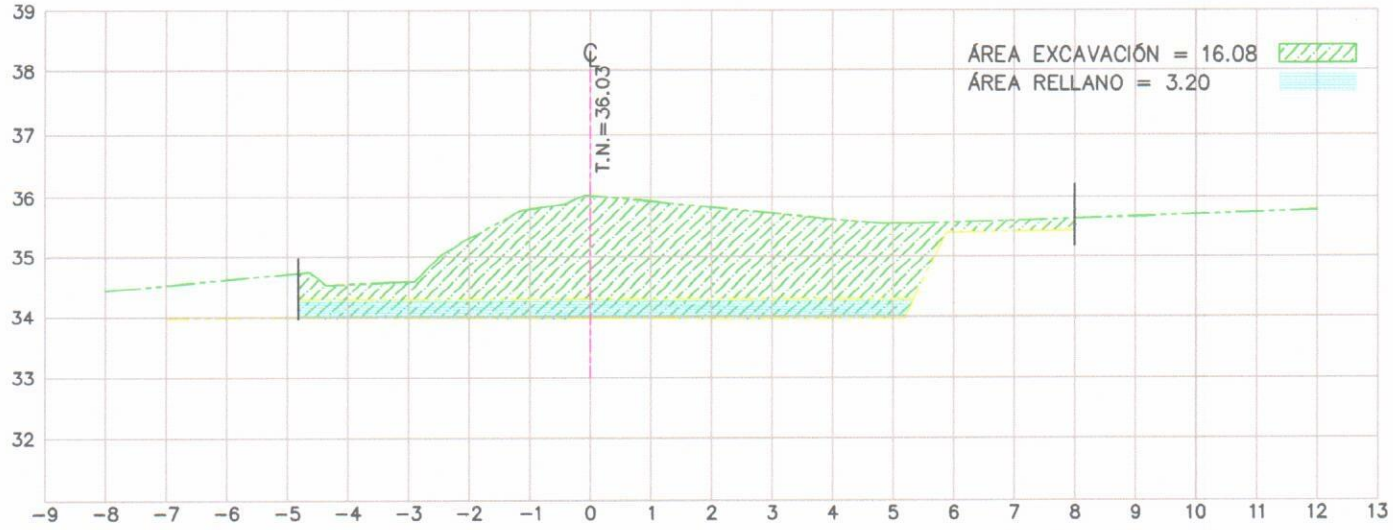


ESTACION 0+047.69

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

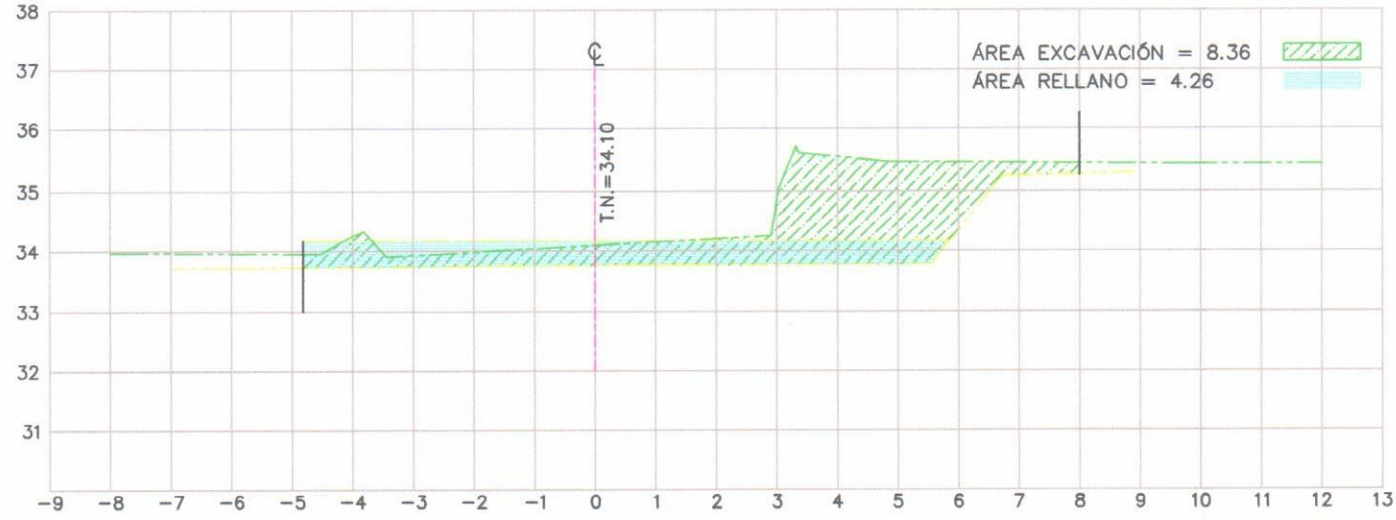

ESTACION 0+040.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

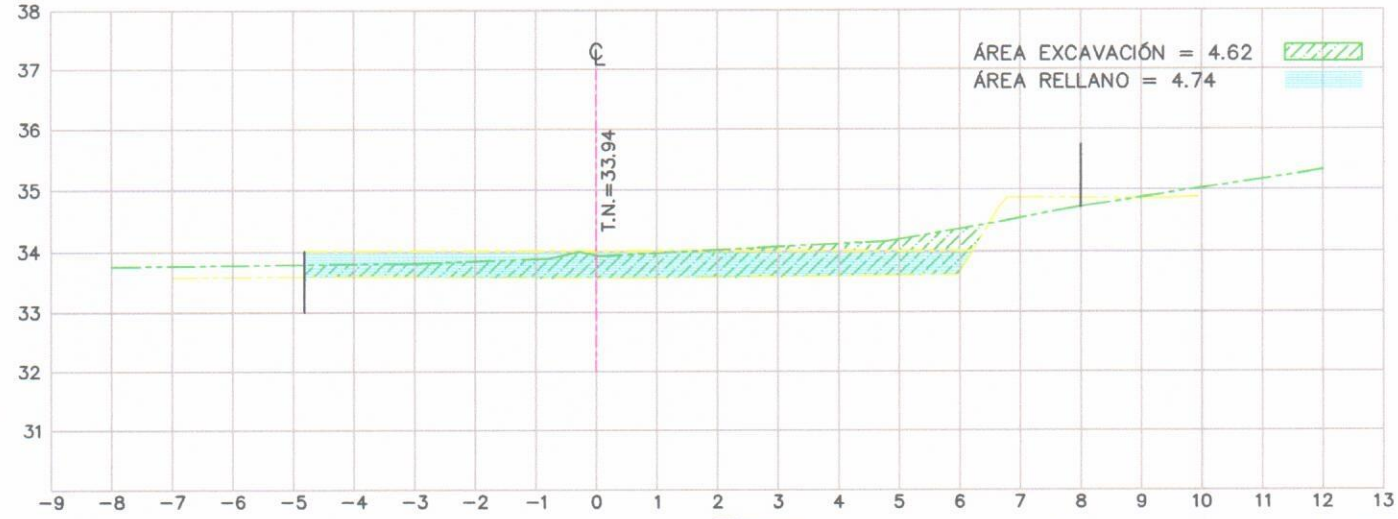


ESTACION 0+030.00


ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

EXCAVACION DUGOUT					
ABSCISA	LONG	AREA	VOL ENTRE SECCION	VOLUMEN INCREMENTA	
0,00		15,74			VER SECCIONES
5,00	5	10,31	65,13	65,13	VER SECCIONES
10,00	5	10,41	51,80	116,93	VER SECCIONES
13,86	3,86	10,86	41,05	157,98	VER SECCIONES
TOTAL			157,98		

RELLENO DUGOUT					
ABSCISA	LONG	AREA	VOL ENTRE SECCION	VOLUMEN INCREMENTA	
0,00		4,14			VER SECCIONES
5,00	5	4,27	21,03	21,03	VER SECCIONES
10,00	5	3,83	20,25	41,28	VER SECCIONES
13,86	3,86	3,50	14,15	55,42	VER SECCIONES
TOTAL			55,42 ✓		ZONA 8.


19892344

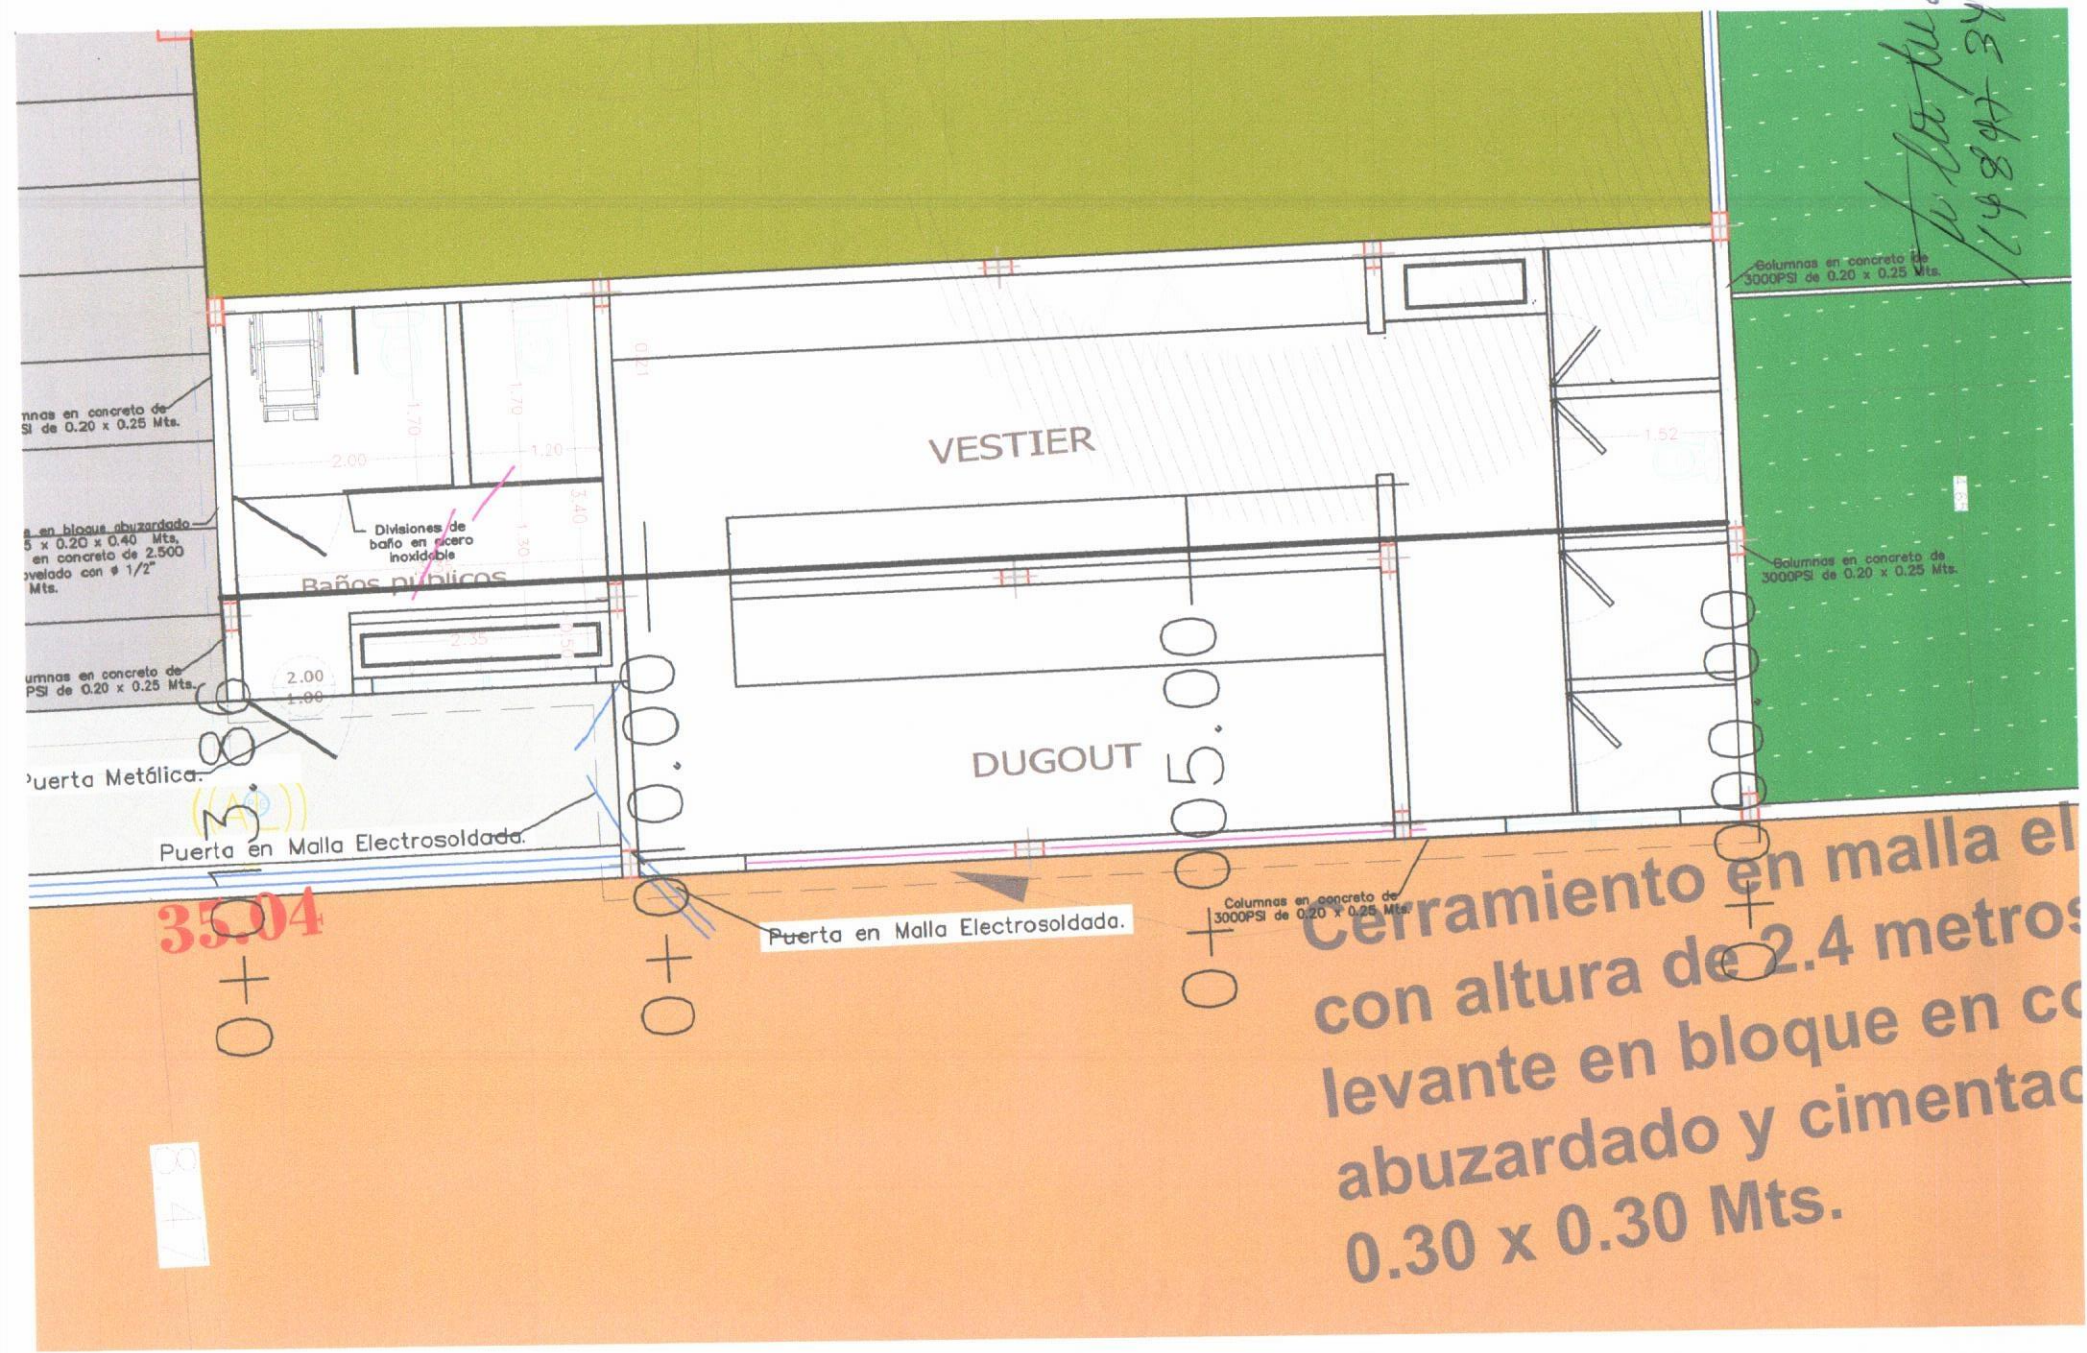
VESTIER
DUGOUT
Baños publicos
Divisiones de baño en acero inoxidable
Columnas en concreto de 3000PSI de 0.20 x 0.25 Mts.
Columnas en concreto de 3000PSI de 0.20 x 0.25 Mts.
Columnas en concreto de 3000PSI de 0.20 x 0.25 Mts.
Puerta Metálica.
Puerta en Malla Electrosoldada.
Puerta en Malla Electrosoldada.
Columnas en concreto de 3000PSI de 0.20 x 0.25 Mts.
3504
Cerramiento en malla el
con altura de 2.4 metros
levante en bloque en co
abuzardado y cimentac
0.30 x 0.30 Mts.

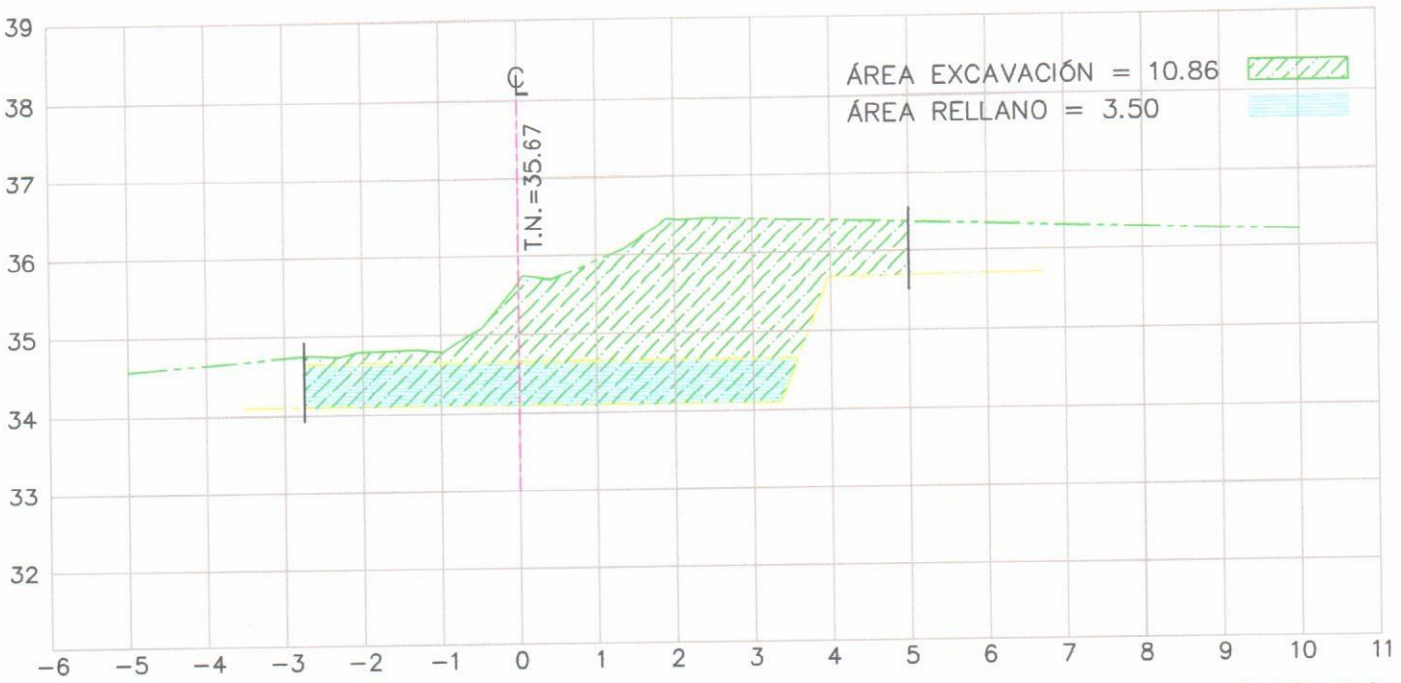

ESTACION 0+013.86

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

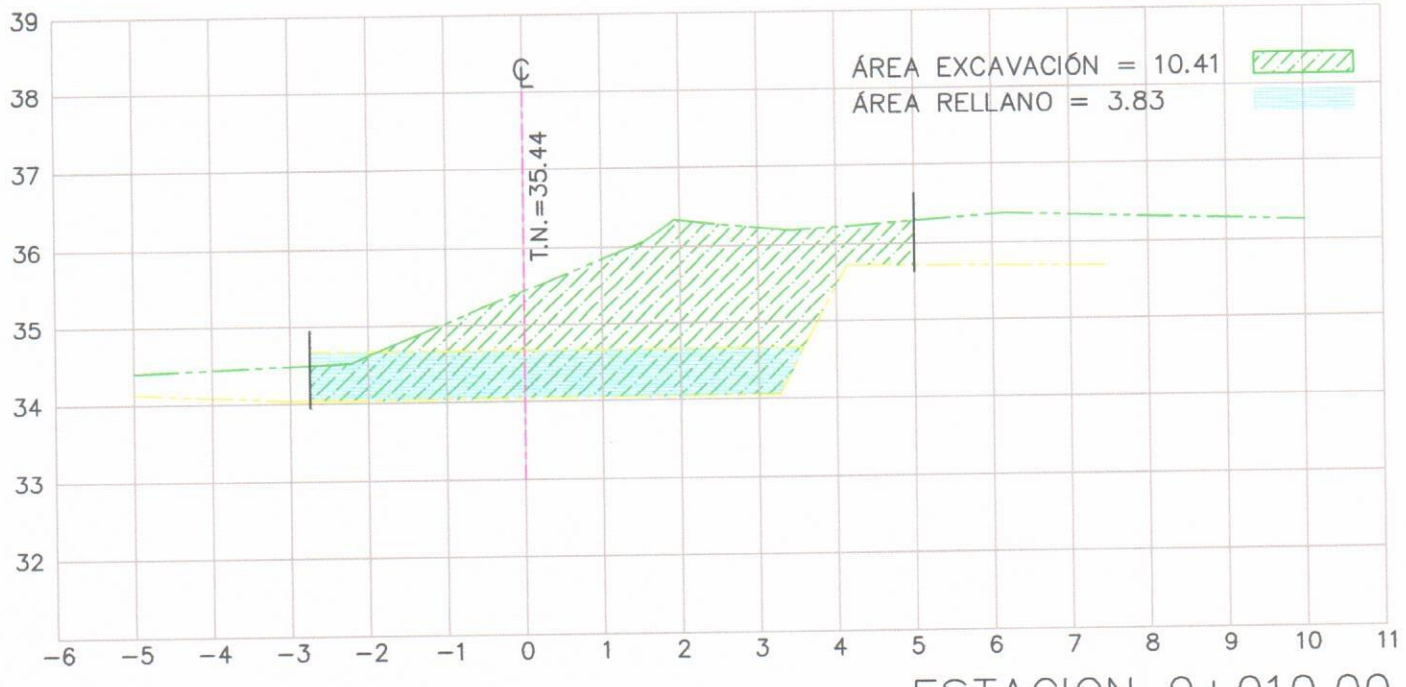

ESTACION 0+010.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8901020181

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 4647	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

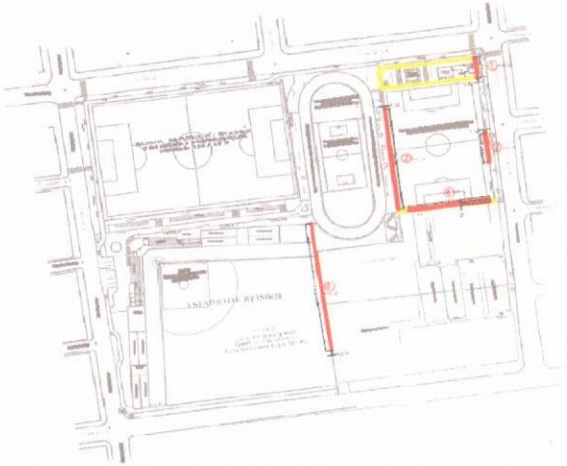

REGISTRO FOTOGRÁFICO

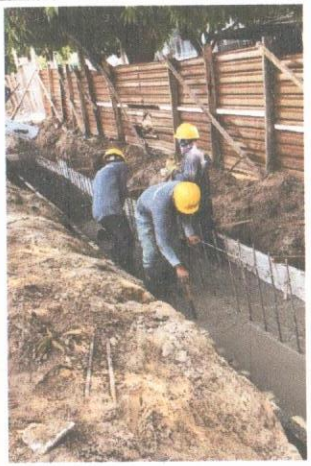




LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 - ZARPA (Modulo de servicio)	12.22	0.80	0.35		1.00			3.42
ZONA 2 - ZARPA (cancha No. 02 / pista de patinaje)	58.50	1.05	0.35		1.00			21.50
ZONA 3 - ZARPA (Cancha No. 02 / calle 36B)	16.80	1.05	0.35		1.00			6.17
ZONA 4 - Fondo de carcamo	44.55	1.40	0.15		1.00			9.36
ZONA 5 - ZARPA (Estadio de beisbol / Colegio)	74.80	0.50	0.30		1.00			11.22
ZONA 6 - MURO (Modulo de servicio)	11.57	0.15	1.20		1.00			2.08
ZONA 7 - MURO (Modulo de servicio)	52.40	0.15	1.20		1.00			9.43
ZONA 8 - MURO (Modulo de servicio)	11.57	0.15	1.20		1.00			2.08
ZONA 9 - MURO (Modulo de servicio)	52.40	0.15	1.20		1.00			9.43
ZONA 10 - MURO (cancha No. 02 / pista de patinaje)	58.50	0.20	1.00		1.00			11.70

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	365.00
Acumulado anterior	60.44
Acumulado a presente acta	146.83
Obra por ejecutar	218.17


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	86.39
				OBSERVACIONES:	

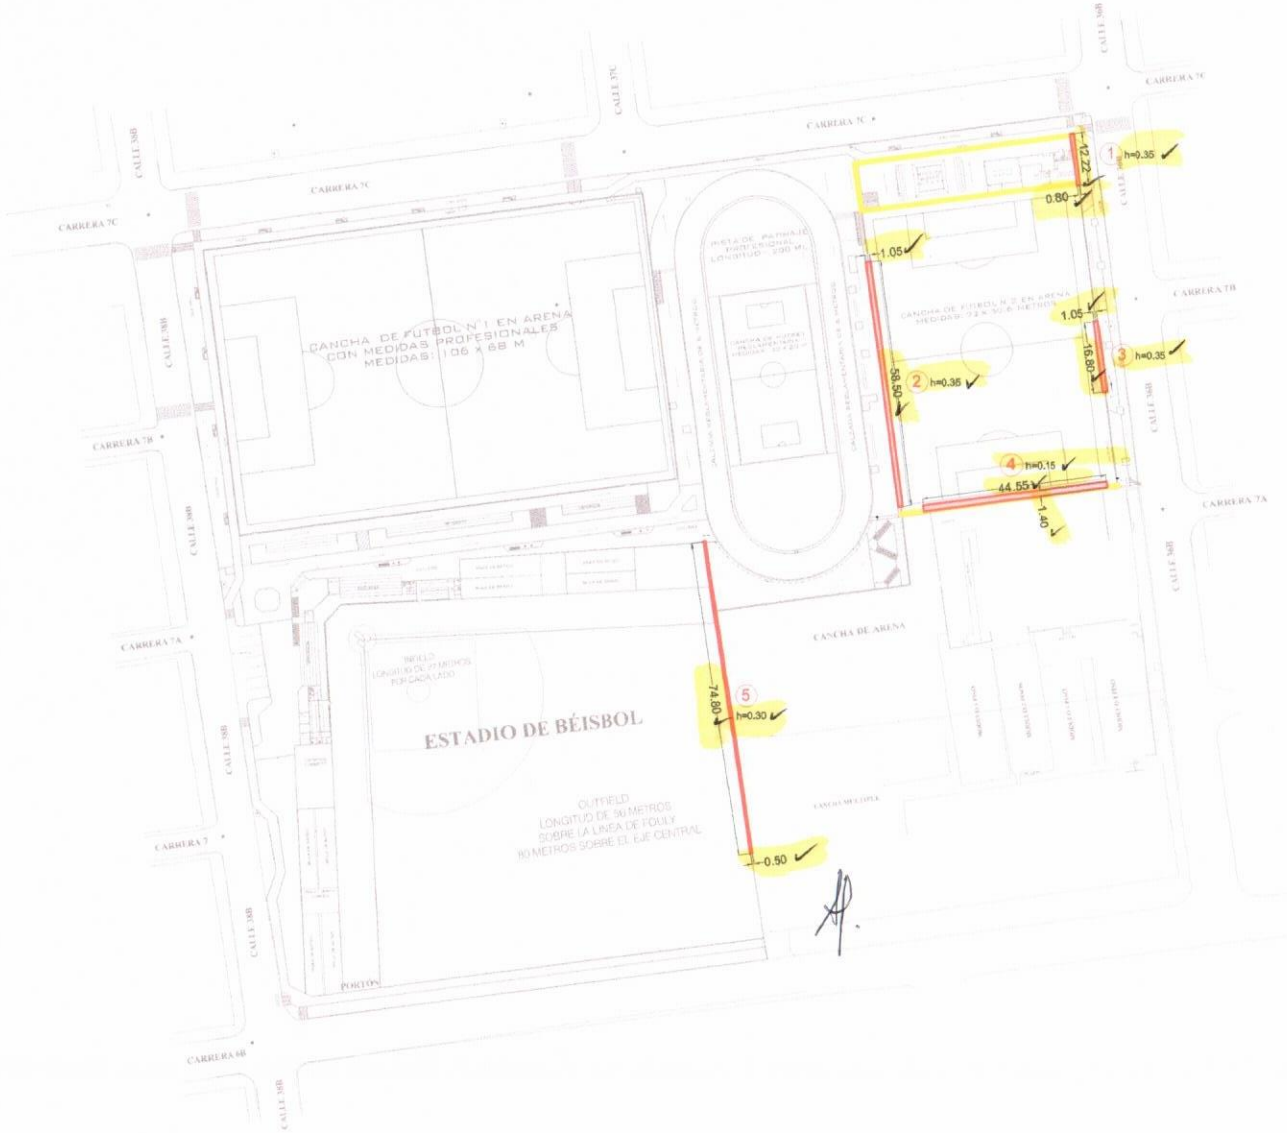

4647. CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA (ZARPA DE MURO)

Acumulado Presente acta

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02

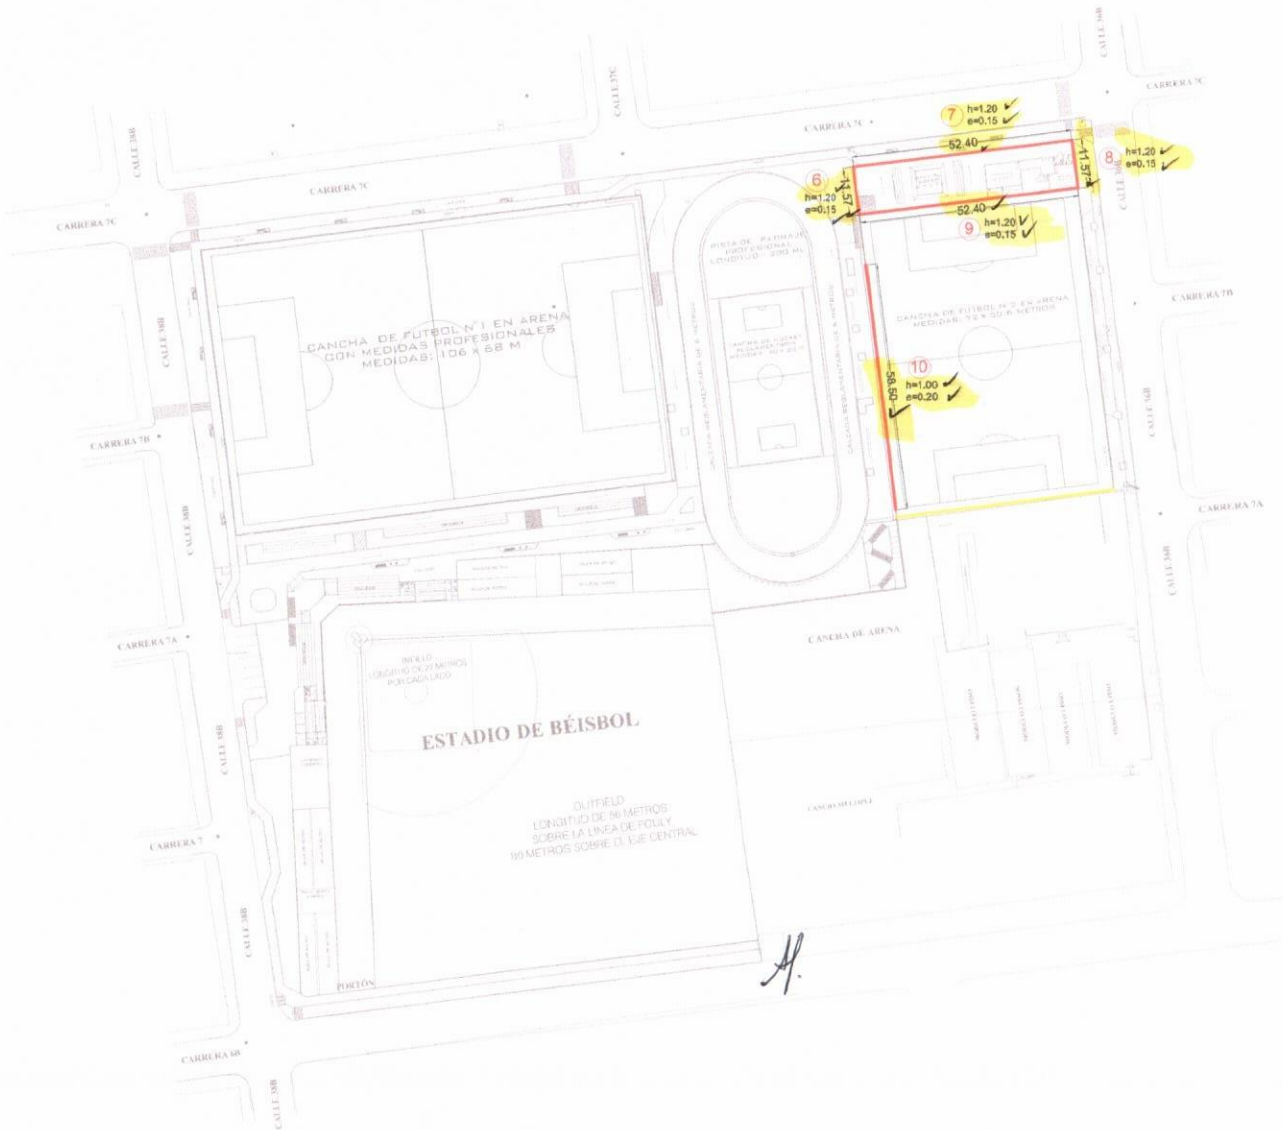

4647. CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA (MURO)

Acumulado Presente acta

INGEVALT S&P S.A.S
Ingeniería y Laboratorio

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA I.N.V.E - 418-13

CODIGO	NTC 2871
REVISIÓN	
FECHA	

PROYECTO : POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA
ORDENADOR : CONSORCIO PARQUES DP 2024
CONSTRUCCIÓN : VARIOS
DESCRIPCIÓN: CONCRETO HIDRAULICO

LOCALIZACIÓN : BARRIO LA MAGDALENA - BARRANQUILLA / ATLANTICO
ABSCISA : PR :
APIQUE : REGISTRO :
ESTUDIO RESISTENCIA A LA COMPRESION

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA DE LA MAQUINA (KG/F)	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA (PSI)	% RESISTENCIA OBTENIDA	% RESISTENCIA PROMEDIO	OBSERVACIONES
3	ZARPA	26-jun-24	24-jul-24	28	176,72	15,0	30,0	444,20	45295,1	3000	3662	122,1	121,4	
4	ZARPA	26-jun-24	24-jul-24	28	176,72	15,0	30,0	439,60	44826,0	3000	3624	120,8		
7	MURO	29-jun-24	27-jul-24	28	176,72	15,0	30,0	428,70	43714,5	3000	3534	117,8	116,9	
8	MURO	29-jun-24	27-jul-24	28	176,72	15,0	30,0	422,30	43061,9	3000	3481	116,0		
9	SOLADO	06-jul-24	13-jul-24	7	176,72	15,0	30,0	212,60	21678,8	2000	1752	87,6	88,7	
10	SOLADO	06-jul-24	13-jul-24	7	176,72	15,0	30,0	218,00	22229,5	2000	1797	89,8		
13	MURO	09-jul-24	16-jul-24	7	176,72	15,0	30,0	321,00	32732,4	3000	2646	88,2	87,6	
14	MURO	09-jul-24	16-jul-24	7	176,72	15,0	30,0	316,50	32273,5	3000	2609	87,0		
21	ZARPA	13-jul-24	20-jul-24	7	176,72	15,0	30,0	312,20	31835,0	3000	2573	85,8	85,3	
22	ZARPA	13-jul-24	20-jul-24	7	176,72	15,0	30,0	308,50	31457,7	3000	2543	84,8		
21	MURO	18-jul-24	25-jul-24	7	176,72	15,0	30,0	298,90	30478,8	3000	2464	82,1	82,7	
22	MURO	18-jul-24	25-jul-24	7	176,72	15,0	30,0	302,70	30866,3	3000	2495	83,2		

UBALDO VARGAS GERONIMO
COORDINADOR DE LABORATORIO

INGEVALT S&P S.A.S Ingeniería y Laboratorio	DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA I.N.V. E – 161 – 07	200-04.33-F-21
		REVISIÓN
		0

PROCEDENCIA: Polideportivo la magdalena **MUESTRA No:** 3

MATERIAL: Material seleccionado

LOCALIZACIÓN: Módulo de servicio

CLIENTE: Consorcio parques DP 2024 **FECHA DE ENSAYO:** 13/08/2024

LOCALIZACIÓN					
HORA					
ABSCISA					
COTA					
CALZADA					
CARRIL					
MARGEN	IZQ	DER	IZQ		
CAPA No.	3	3	3		
ENSAYO No.	**1**	**2**	**3**		
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)	6730	6700	6638		
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (g)	3670	3453	3454		
PESO ARENA USADA (g)	3060	3247	3184		
CONSTANTE DEL CONO (g)	1641	1641	1641		
PESO ARENA EN EL HUECO (g)	1419	1606	1543		
DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm3)	1,410	1,410	1,410		
VOLUMEN DEL HUECO (cm3)	1006	1139	1094		
VOLUMEN MATERIAL RETENIDO 3/4" (g/cm^3)					
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO PASA 3/4"(g)	2143	2432	2358		
HUMEDAD (%)	7,8%	8,0%	8,2%		
VOLUMEN MATERIAL PASA 3/4" (g/cm^3)	1006,4	1139,0	1094,3		
DENSIDAD HUMEDA (g/cm^3)	2,129	2,135	2,155		
DENSIDAD SECA (**Di**) (g/cm3)	1,975	1,977	1,991		
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO (**De**) (g/m3)	2,045				
COMPACTACION DEL TERRENO (%)	96,6	96,7	97,4		

OBSERVACIONES:

UBALDO VARGAS GERONIMO
COORDINADOR DE LABORATORIO


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 6742	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

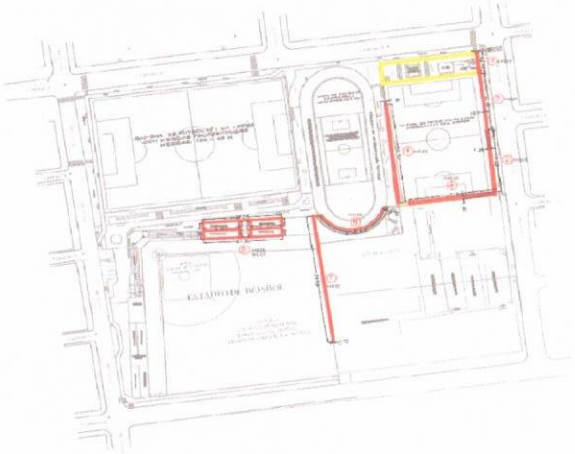

REGISTRO FOTOGRÁFICO






LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 - Zarpa modulo de servicio / Calle 36B	12.42	1.00	0.05		1.00			0.62
ZONA 2 - Viga cancha No. 02 / Calle 36B	33.40	0.50	0.05		1.00			0.84
ZONA 3 - Zarpa cancha No. 02 / Calle 36B	37.30	1.25	0.05		1.00			2.33
ZONA 4 - Zarpa Cancha No. 02 / Pista de patinaje	58.50	1.25	0.05		1.00			3.66
ZONA 5 - Carcamo cancha No. 02 / Colegio	47.15	1.40	0.05		1.00			3.30
ZONA 6 - Zarpa de cabecera pista de patinaje	47.60	2.75	0.05		1.00			6.55
ZONA 7 - Zarpa estadio de beisbol / Colegio	74.80	0.70	0.05		1.00			2.62
ZONA 8 - Vigas jaula de bateo estadio de beisbol	48.05	0.50	0.05		1.00			1.20
	21.80	0.50	0.05		1.00			0.55
	21.80	0.50	0.05		1.00			0.55
	47.60	0.50	0.05		1.00			1.19
	9.15	0.50	0.05		1.00			0.23
	9.55	0.50	0.05		1.00			0.24
	9.65	0.50	0.05		1.00			0.24
	10.10	0.50	0.05		1.00			0.25

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	162.00
Acumulado anterior	8.46
Acumulado a presente acta	32.83
Obra por ejecutar	129.17

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	24.37
				OBSERVACIONES:	

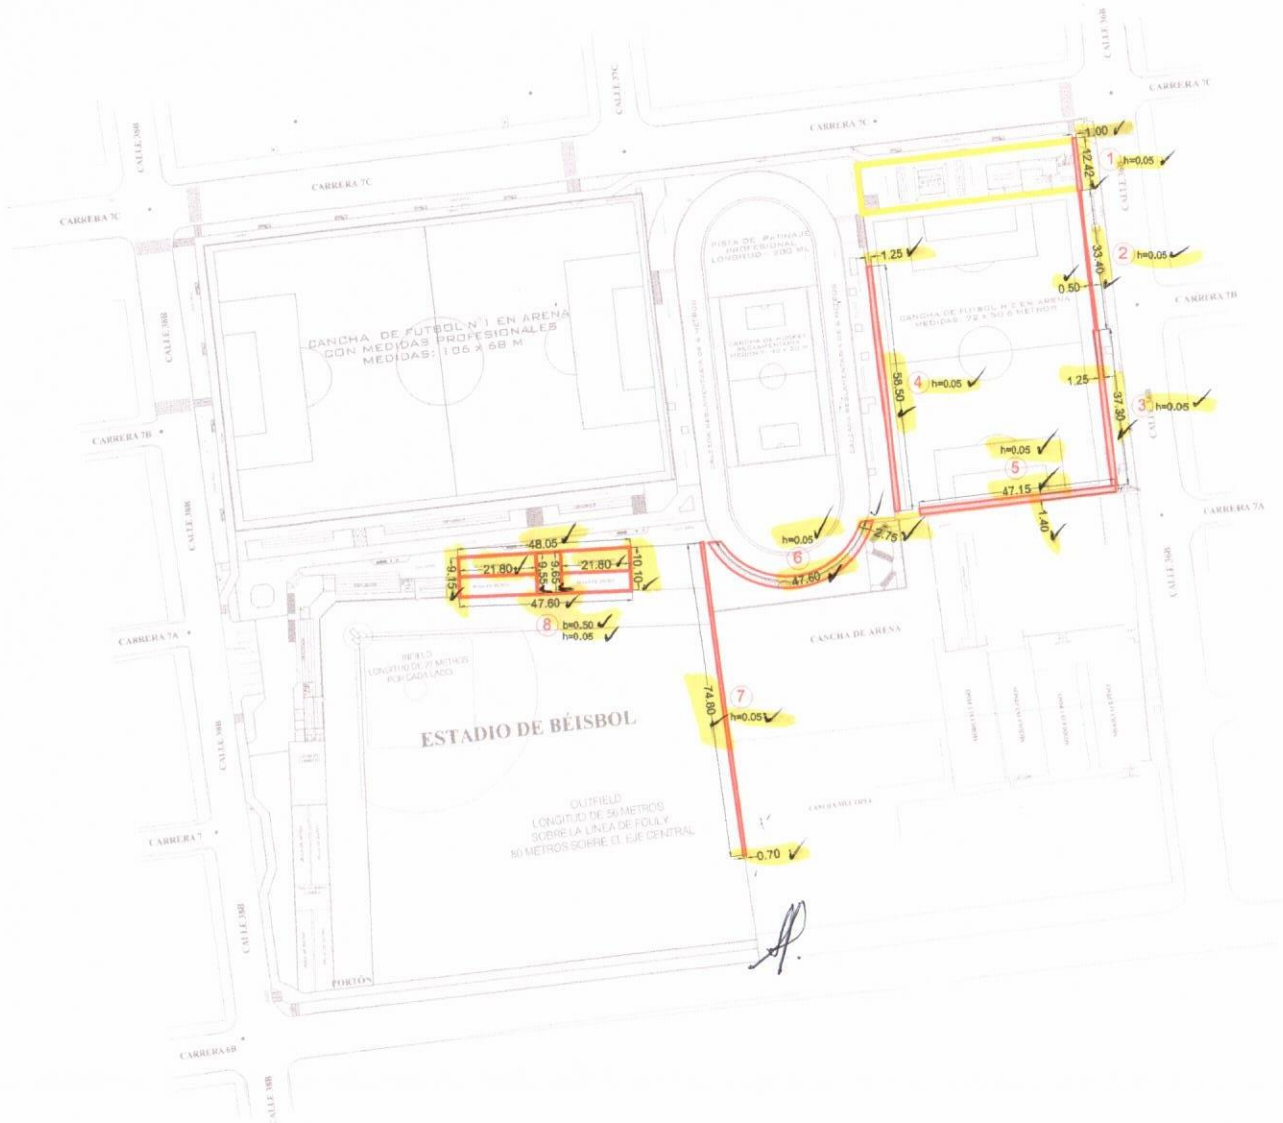

6742. SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: ESTRUCTURA / **CÓDIGO DEL ITEM:** 214		**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

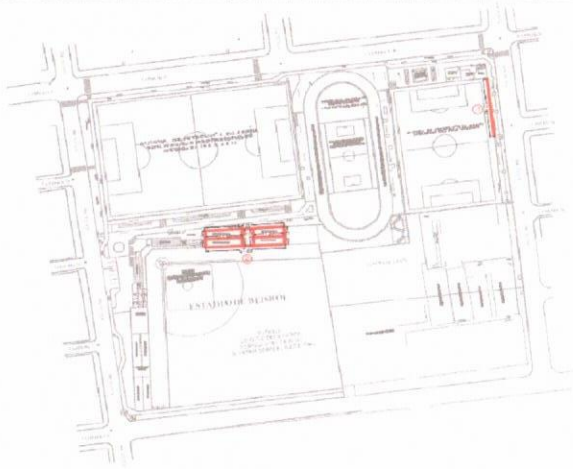

REGISTRO FOTOGRÁFICO






LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 - Viga cancha No. 02 / Calle 36B	33.40				1.00	33.40		
ZONA 2 - Vigas jaula de bateo estadio de beisbol	48.05				1.00	48.05		
	21.80				1.00	21.80		
	21.80				1.00	21.80		
	47.60				1.00	47.60		
	9.15				1.00	9.15		
	9.55				1.00	9.55		
	9.65				1.00	9.65		
	10.10				1.00	10.10		

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	**2,265.00**
Acumulado anterior	**0.00**
Acumulado a presente acta	**211.10**
Obra por ejecutar	**2053.90**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	211.10
				OBSERVACIONES:	

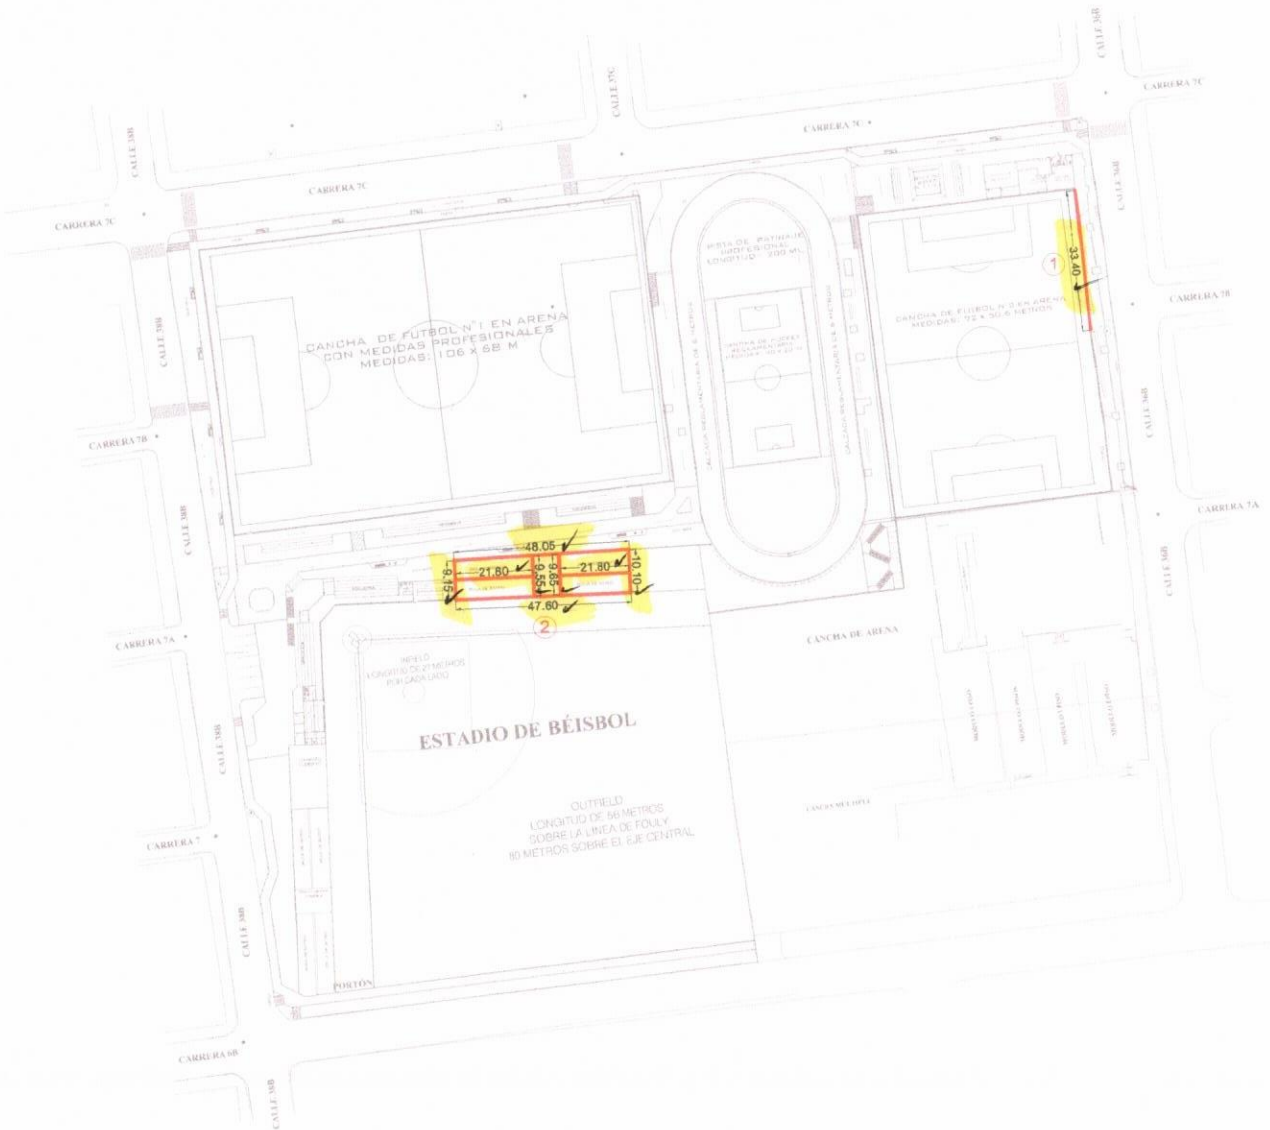

214.VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	78	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

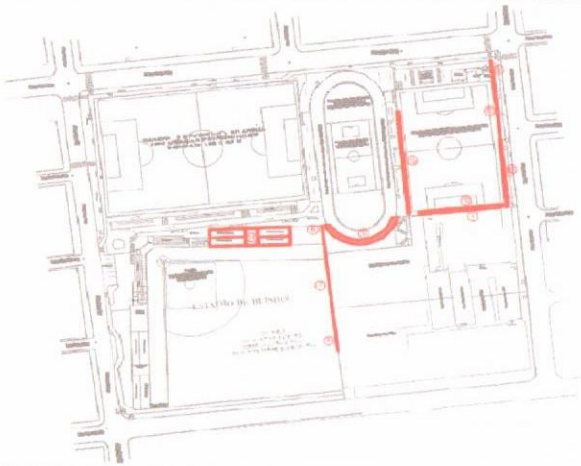

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	DIAM	PESO (KG)	UND	CANT.	TOTALES KG	M2	M3
ZONA 1 CANCHA No. 02 / COLEGIO PREESCOLAR	LEVANTE (Traslapos)	1.50	#3	0.56		90.00	75.60		
	COLUMNETA (Traslapo)	2.60	#4	1.00		40.00	104.00		
	COLUMNETA (Estribos)	0.94	#3	0.56		190.00	100.02		
ZONA 5 (MODULO DE SERVICIO CALLE 36B) (L= 12.22 M; H=2.40 M)	ZARPA (Transversal)	1.05	#4	1.00		63.00	66.15		
	ZARPA (Longitudinal)	6.00	#3	0.56		10.00	33.60		
		1.60	#3	0.56		5.00	4.48		
	MURO (Transversal)	2.40	#4	1.00		63.00	151.20		
	MURO (Longitudinal)	6.00	#3	0.56		20.00	67.20		
		1.60	#3	0.56		10.00	8.96		
ZONA 6 (ZARPA COLEGIO ESTADIO DE BEISBOL) TIPO 1= 4.00 MTS	ZARPA (Transversal)	1.20	#3	0.56		28.00	18.82		
	ZARPA (Longitudinal)	3.85	#4	1.00		6.00	23.10		
	LEVANTE (Vertical)	2.00	#4	1.00		5.00	10.00		
	LEVANTE (Traslapo)	2.00	#4	1.00		5.00	10.00		
	LEVANTE (Horizontal)	3.85	#2	0.25		8.00	7.70		
	COLUMNA (Vertical)	2.00	#4	1.00		8.00	16.00		
	COLUMNA (Traslapo)	2.00	#4	1.00		8.00	16.00		
	COLUMNA (Estribos)	0.94	#3	0.56		40.00	21.06		
ZONA 7 (ZARPA COLEGIO ESTADIO DE BEISBOL) TIPO 2= 11.40 MTS	ZARPA (Transversal)	1.20	#3	0.56		385.00	258.72		
	ZARPA (Longitudinal)	6.00	#4	1.00		60.00	360.00		
	LEVANTE (Vertical)	2.00	#4	1.00		75.00	150.00		
	LEVANTE (Traslapo)	2.00	#4	1.00		75.00	150.00		
	LEVANTE (Horizontal)	6.00	#2	0.25		80.00	120.00		
	COLUMNA (Vertical)	2.00	#4	1.00		80.00	160.00		
	COLUMNA (Traslapo)	2.00	#4	1.00		80.00	160.00		
	COLUMNA (Estribos)	0.94	#3	0.56		400.00	210.56		
ZONA 8 (ZARPA COLEGIO ESTADIO DE BEISBOL) TIPO 3 = 13.50 MTS	ZARPA (Transversal)	1.20	#3	0.56		91.00	61.15		
	ZARPA (Longitudinal)	6.00	#4	1.00		12.00	72.00		
	ZARPA (Longitudinal)	3.00	#4	1.00		6.00	18.00		
	LEVANTE (Vertical)	2.00	#4	1.00		20.00	40.00		
	LEVANTE (Traslapo)	2.00	#4	1.00		20.00	40.00		
	LEVANTE (Horizontal)	6.00	#2	0.25		16.00	24.00		
	LEVANTE (Horizontal)	2.50	#2	0.25		8.00	5.00		
	COLUMNA (Vertical)	2.00	#4	1.00		20.00	40.00		
	COLUMNA (Traslapo)	2.00	#4	1.00		20.00	40.00		
	COLUMNA (Estribos)	0.94	#3	0.56		100.00	52.64		

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 78	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	DIAM	PESO (KG)	UND	CANT.	TOTALES KG	M2	M3
ZONA 9 CABECERA PISTA DE PATINAJE	ZARPA(Transversal inferior)	2.80	#4	1.00		239.00	669.20		
	ZARPA(Transversal superior)	2.80	#4	1.00		318.00	890.40		
	ZARPA (longitudinal inferior)	6.00	#4	1.00		90.00	540.00		
	ZARPA (longitudinal superior)	6.00	#4	1.00		90.00	540.00		
	Soportes de zarpa (Burros)	1.00	#4	1.00		29.60	29.60		
	MURO (Transversal exterior)	4.50	#4	1.00		239.00	1075.50		
	MURO (Transversal interior)	4.50	#5	1.56		318.00	2232.36		
	MURO (Longitudinal exterior)	6.00	#3	0.56		90.00	302.40		
	MURO (Longitudinal interior)	6.00	#3	0.56		90.00	302.40		
ZONA 10 CARCAMO CANCHA No. 02 / COLEGIO PREESCOLAR	MODULO 1 - Transversal	3.35	#4	1.00		40.00	134.00		
	MODULO 2 - Transversal	3.25	#4	1.00		40.00	130.00		
	MODULO 3 - Transversal	3.15	#4	1.00		40.00	126.00		
	MODULO 4 - Transversal	3.05	#4	1.00		40.00	122.00		
	MODULO 5 - Transversal	2.95	#4	1.00		40.00	118.00		
	MODULO 6 - Transversal	2.85	#4	1.00		40.00	114.00		
	MODULO 7 - Transversal	2.75	#4	1.00		40.00	110.00		
	MODULO 8 - Transversal	2.65	#4	1.00		40.00	106.00		
	MODULO 9 - Transversal	2.55	#4	1.00		40.00	102.00		
	FONDO - Longitudinal	6.00	#3	0.56		90.00	302.40		
	MUROS - Longitudinal	6.00	#3	0.56		100.00	336.00		
ZONA 11 VIGAS CALLE 36B	VIGA - Longitudinal	6.00	#4	1.00		24.00	144.00		
	VIGA - Longitudinal	1.15	#4	1.00		4.00	4.60		
	VIGA - Estribos	0.90	#3	0.56		168.00	84.67		
	COLUMNA - Vertical	1.20	#4	1.00		60.00	72.00		
	COLUMNA - Estribos	0.94	#3	0.56		90.00	47.38		
ZONA 12 MURETE (CANCHA No. 02 CALLE 36B)	ZARPA (Transversal Superior)	1.30	#4	1.00		85.00	110.50		
	ZARPA (Transversal Inferior)	1.30	#4	1.00		85.00	110.50		
	ZARPA (Longitudinal superior)	6.00	#4	1.00		15.00	90.00		
	ZARPA (Adicional Superior)	1.40	#4	1.00		5.00	7.00		
	ZARPA (Longitudinal Inferior)	6.00	#4	1.00		15.00	90.00		
	ZARPA (Adicional Inferior)	1.40	#4	1.00		5.00	7.00		
	MURO (Vertical)	1.20	#4	1.00		85.00	102.00		
	MURO (Longitudinal)	6.00	#3	0.56		5.00	16.80		
	MURO (Adicional Longitudinal)	1.40	#3	0.56		6.00	4.70		

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 78	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO FOTOGRÁFICO




REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	DIAM	PESO (KG)	UND	CANT.	TOTALES KG	M2	M3
ZONA 13 MURETE (CANCHA No. 02 / PISTA DE PATINAJE)	ZARPA (Transversal Superior)	1.30	#4	1.00		294.00	382.20		
	ZARPA (Transversal Inferior)	1.30	#4	1.00		294.00	382.20		
	ZARPA (Longitudinal superior)	6.00	#4	1.00		110.00	660.00		
	ZARPA (Adicional Superior)	1.50	#4	1.00		10.00	15.00		
	ZARPA (Longitudinal Inferior)	6.00	#4	1.00		110.00	660.00		
	ZARPA (Adicional Inferior)	1.50	#4	1.00		10.00	15.00		
	MURO (Vertical)	2.00	#4	1.00		294.00	588.00		
	MURO (Longitudinal)	6.00	#3	0.56		77.00	258.72		
	MURO (Adicional Longitudinal)	1.50	#3	0.56		7.00	5.88		
ZONA 14 VIGAS ESTADIO DE BESIBOL	Viga - Longitudinal	6.00	#4	1.00		144.00	864.00		
	Viga - Longitudinal	4.60	#4	1.00		4.00	18.40		
	Viga - Estribos	0.90	#3	0.56		957.00	482.33		

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	53,240.00
Acumulado anterior	3913.87
Acumulado a presente acta	20114.97
Obra por ejecutar	33125.03

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	16,201.10
				OBSERVACIONES:	

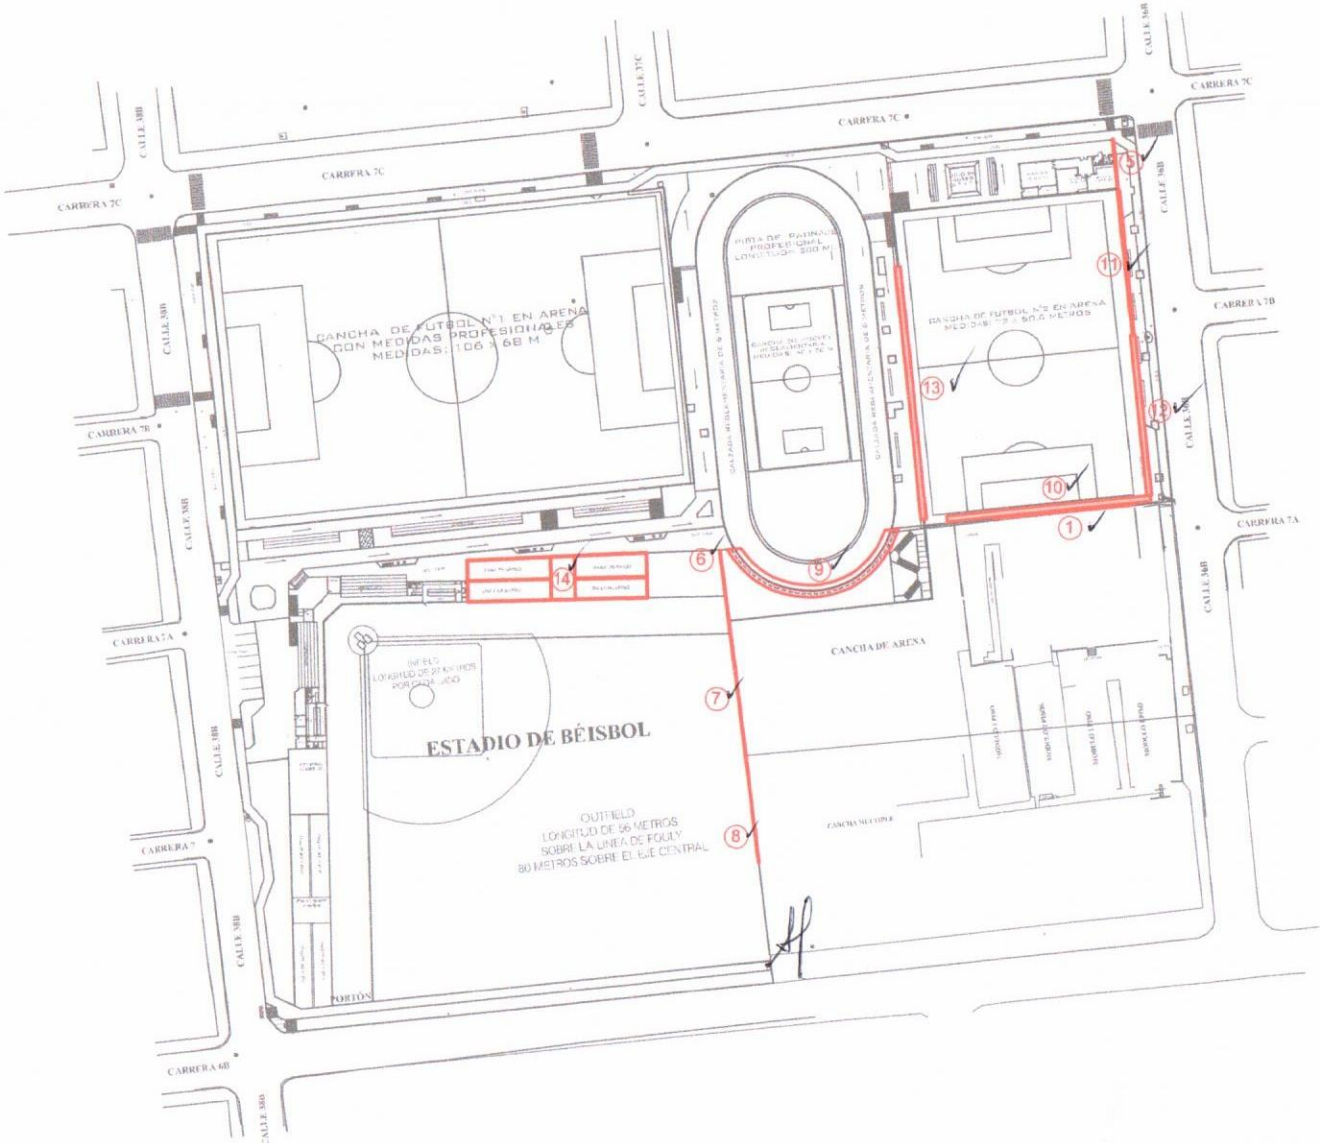

78. ACERO DE REFUERZO FIGURADO


Acumulado Presente acta

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**


NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02


① MURO COLEGIO / CANCHA PEQUEÑA

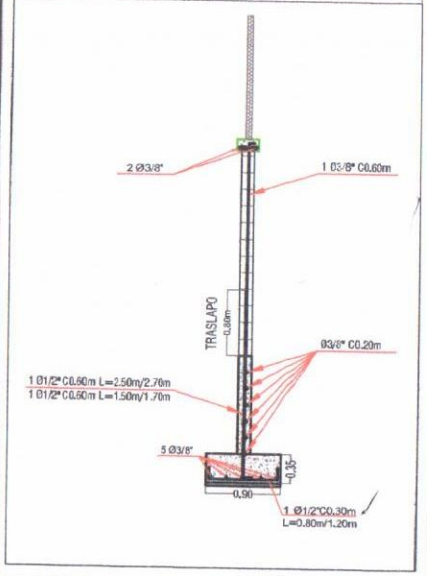

②③④⑤ MURO MODULO DE SERVICIO (H = 1.00 MTS - 1.70 MTS)

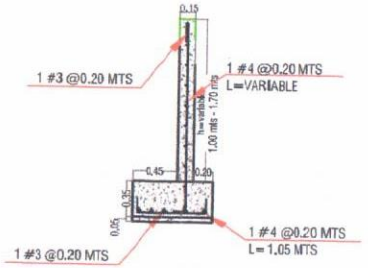


⑥⑦⑧ DETALLE MURO DE CERRAMIENTO ENTRE EL COLEGIO Y LA CANCHA
ESC 1:20

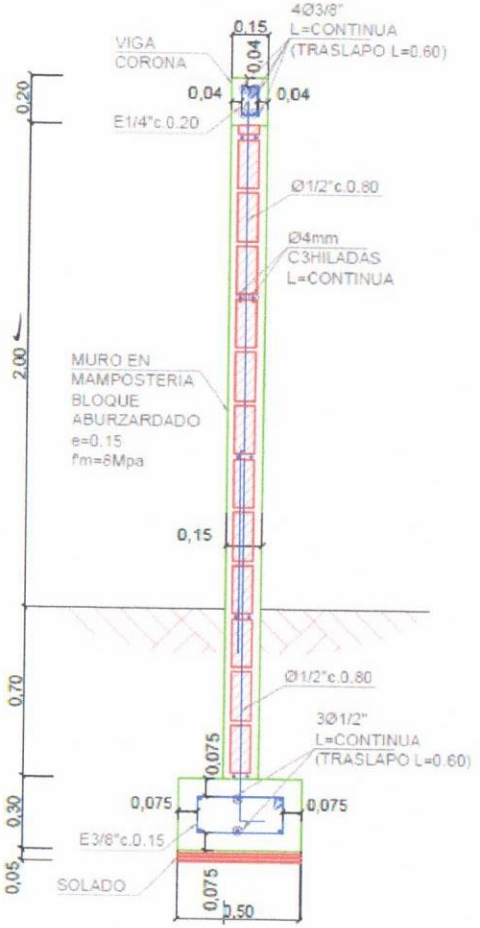


NOTA: RELLENAR LAS CELDAS CON MORTERO DE INYECCION - f'cR= 17.5 MPa


⑨

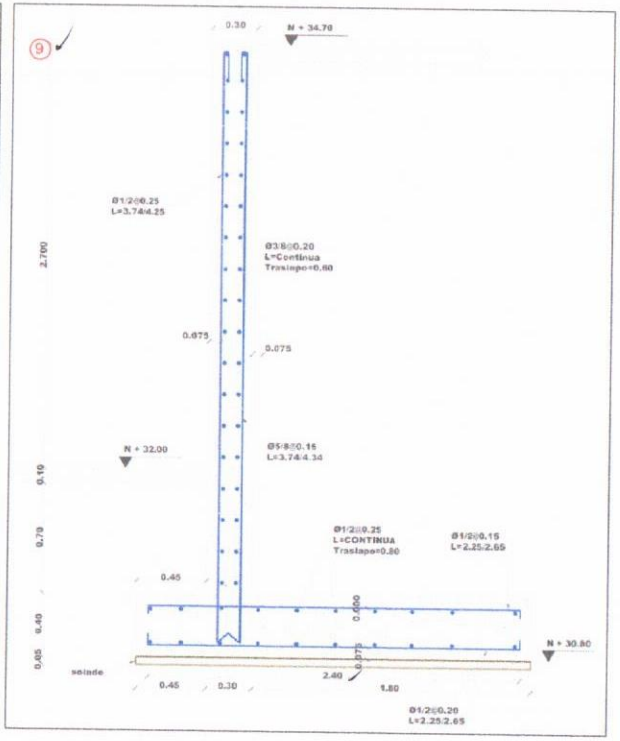


⑩ CANAL PERIMETRAL

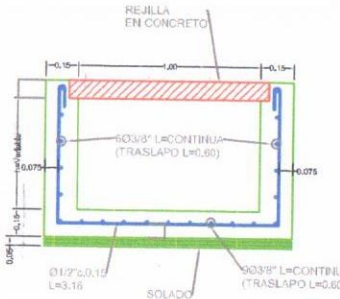


⑫⑬ MURO MODULO DE SERVICIO (H = 1.00 MTS - 1.70 MTS)

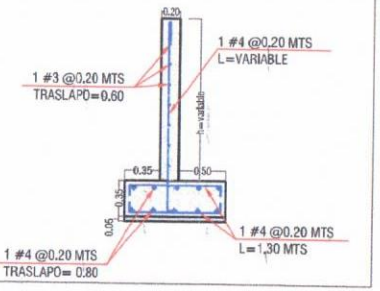

⑪⑭ DIMENSIONES DE VIGA Y RECUBRIMIENTO DE ACERO



DETALLE DE ACERO DE REFUERZO



78. ACERO DE REFUERZO FIGURADO

Acumulado

Presente acta


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP - 01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO EN ZONA POSTERIOR A AULAS DE CLASE EN COLEGIO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE COLUMNAS

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

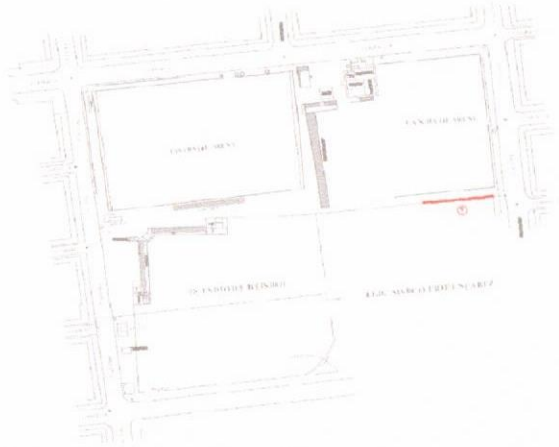

REGISTRO FOTOGRÁFICO

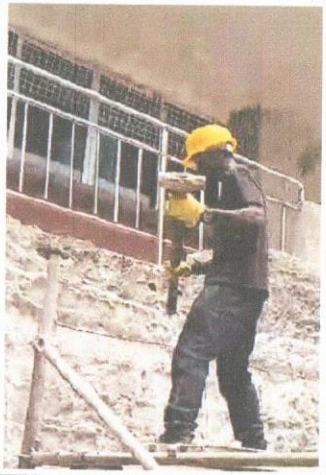




LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 Cancha de arena No. 02 / Colegio (Preescolar)	4.31		4.00		1.00		17.24	
	3.29		4.00		1.00		13.16	
	4.15		4.00		1.00		16.60	
	3.60		4.00		1.00		14.40	
	4.65		4.00		1.00		18.60	
	3.96		4.00		1.00		15.84	
	4.72		4.00		1.00		18.88	
	3.80		4.00		1.00		15.20	
	4.68		4.00		1.00		18.72	
	0.30		4.00		8.00		9.60	
	0.45		4.00		1.00		1.80	

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	160.04
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	160.04
Obra por ejecutar	0.00

Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA: 160.04
				OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02

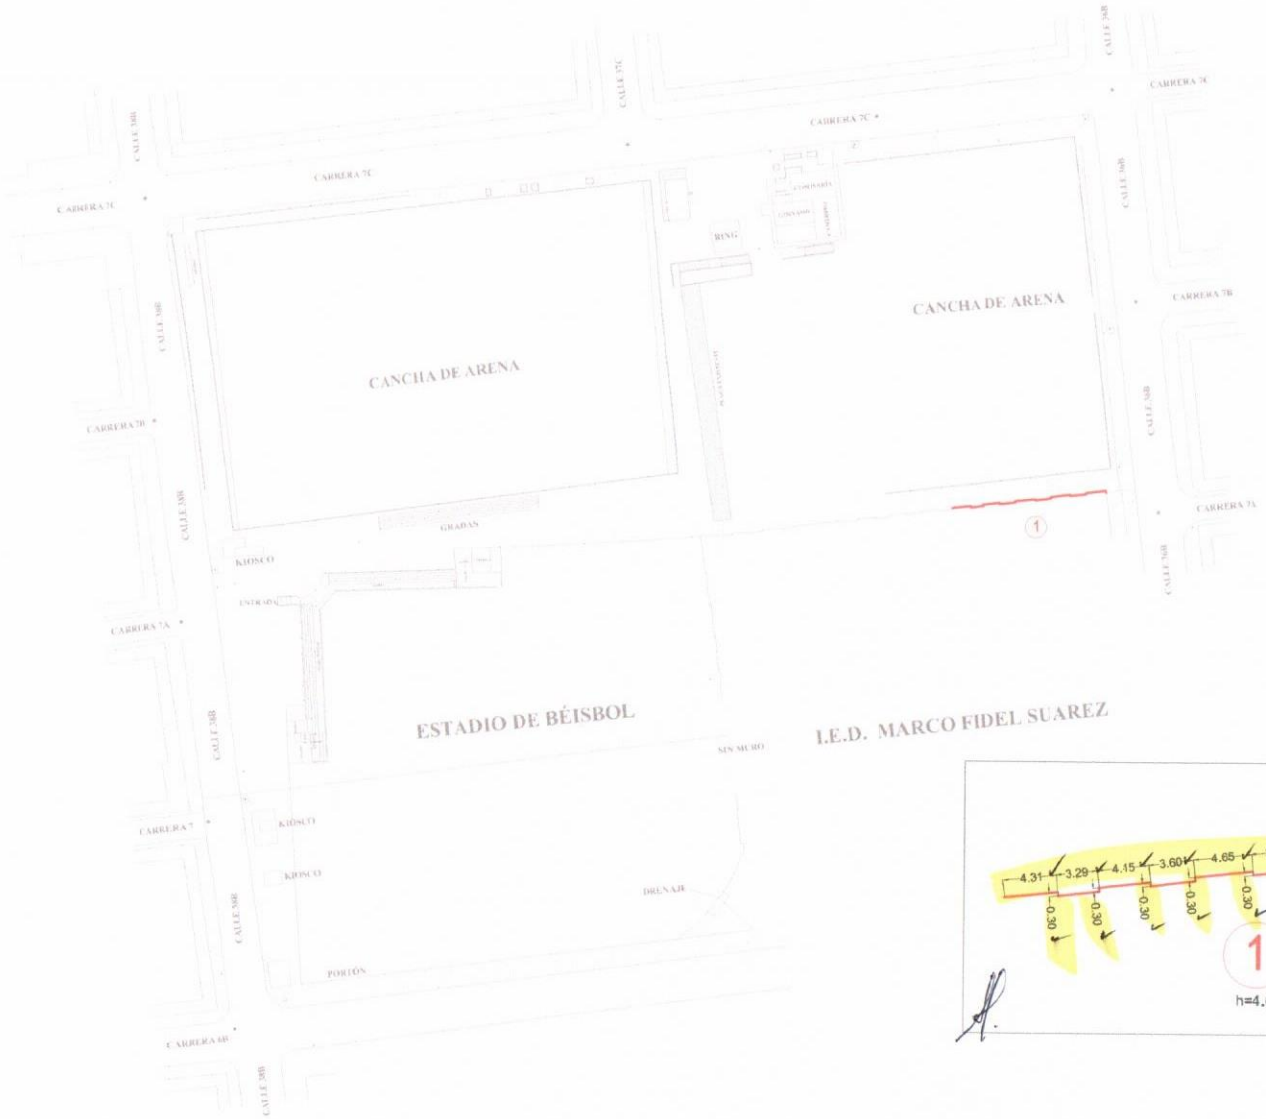

NP- 01. DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO EN ZONA POSTERIOR A AULAS DE CLASE EN COLEGIO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE COLUMNAS

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP - 02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	BANNER DE CERRAMIENTO

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

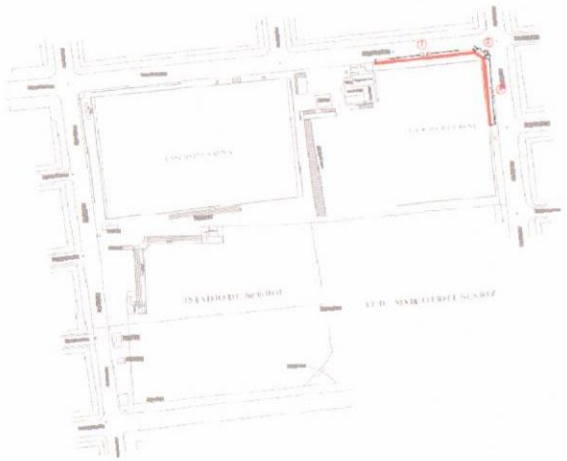

REGISTRO FOTOGRÁFICO




LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1 - Carrera 7C / Cancha No. 02	53.20		1.60		1.00		85.12	
ZONA 2 - Esquina Carrera 7C / Calle 36B	6.00		1.60		1.00		9.60	
ZONA 3 - Calle 36B / Cancha No. 02	39.00		1.60		1.00		62.40	

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	157.12
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	157.12
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. ~~RESIDENTE DE OBRA~~	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	157.12
				OBSERVACIONES:	

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02

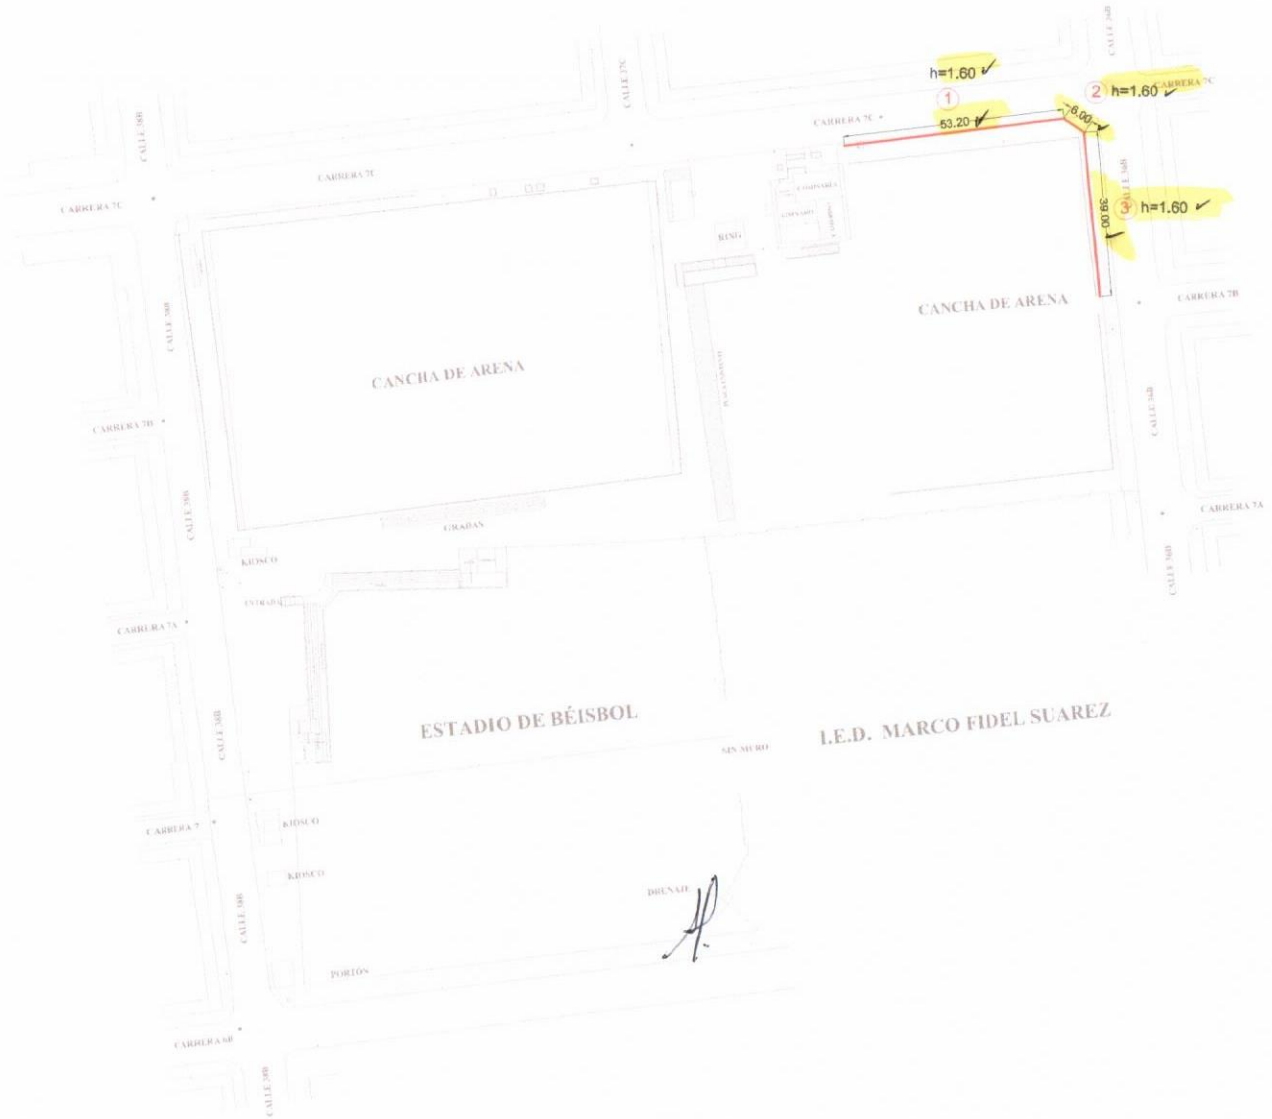

NP- 02. BANNER DE CERRAMIENTO

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP - 03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

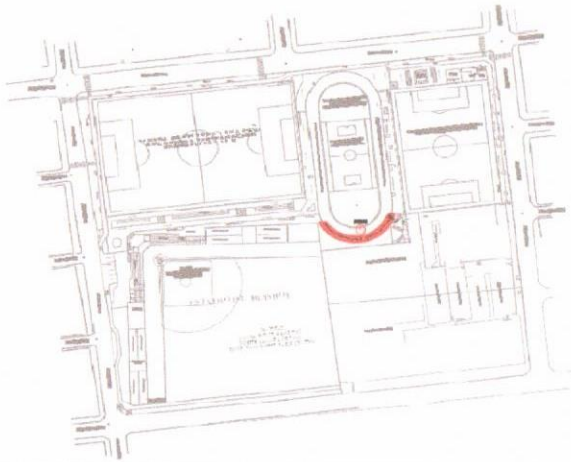


REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1 - ZARPA (Cabecera pista de patinaje)	47.60	2.55	0.40		1.00			48.55
ZONA 2 - MURO (Cabecera pista de patinaje)	9.00	0.30	2.40		1.00			6.48


Cantidad contractual según Modificativa No. 01	175.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	55.03
Obra por ejecutar	119.97

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CÁLCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	55.03
				OBSERVACIONES:	

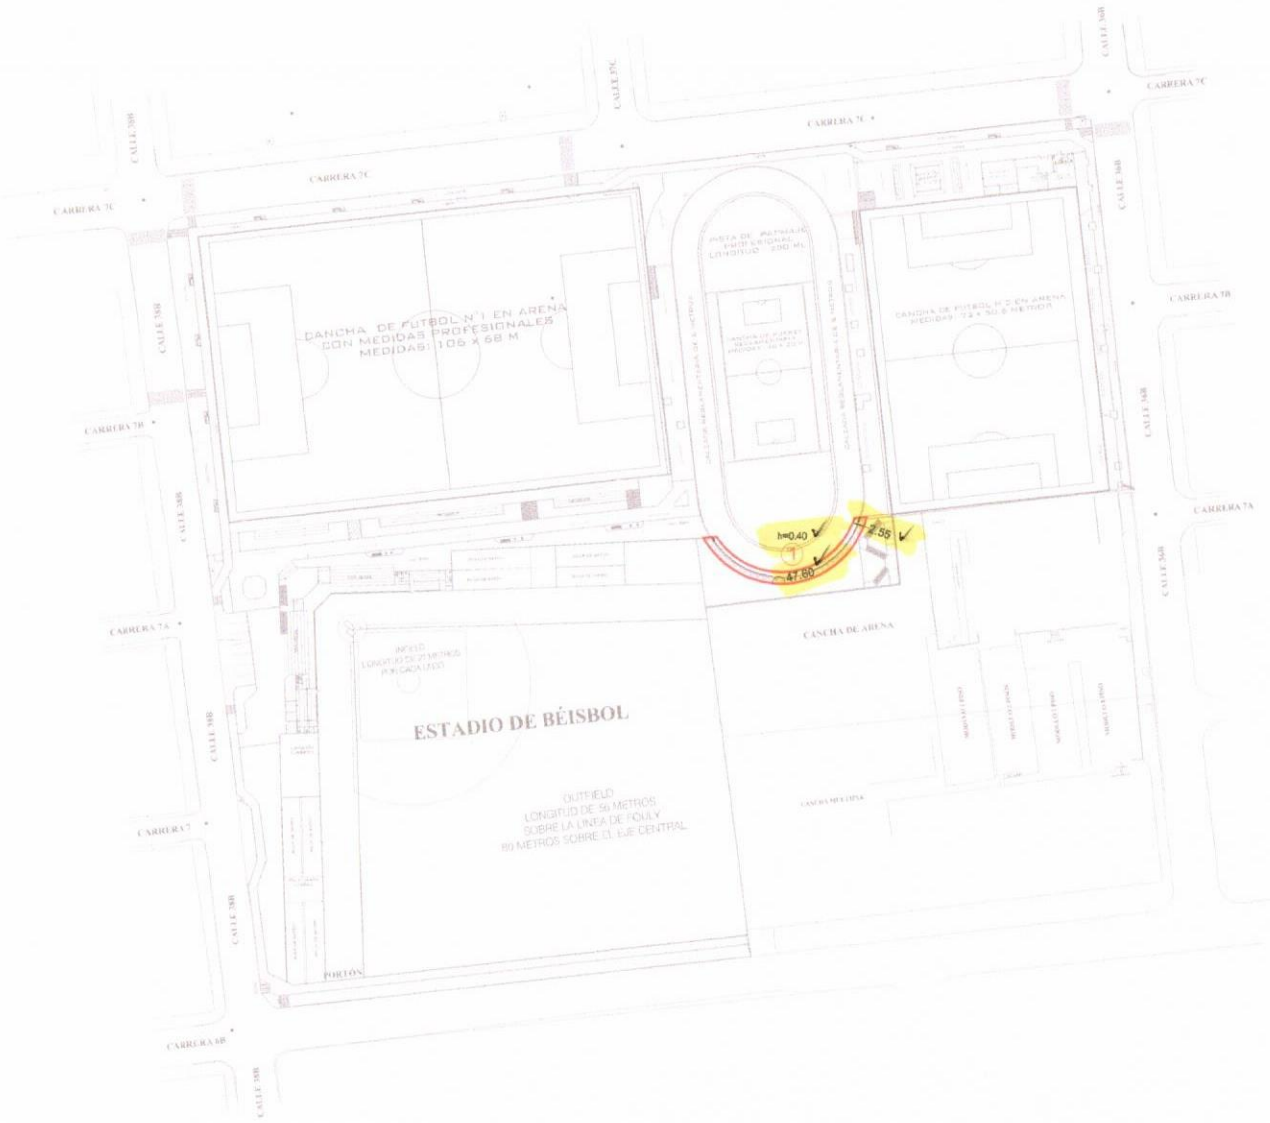

NP- 03. CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA (ZARPA DE MURO)

Acumulado Presente acta

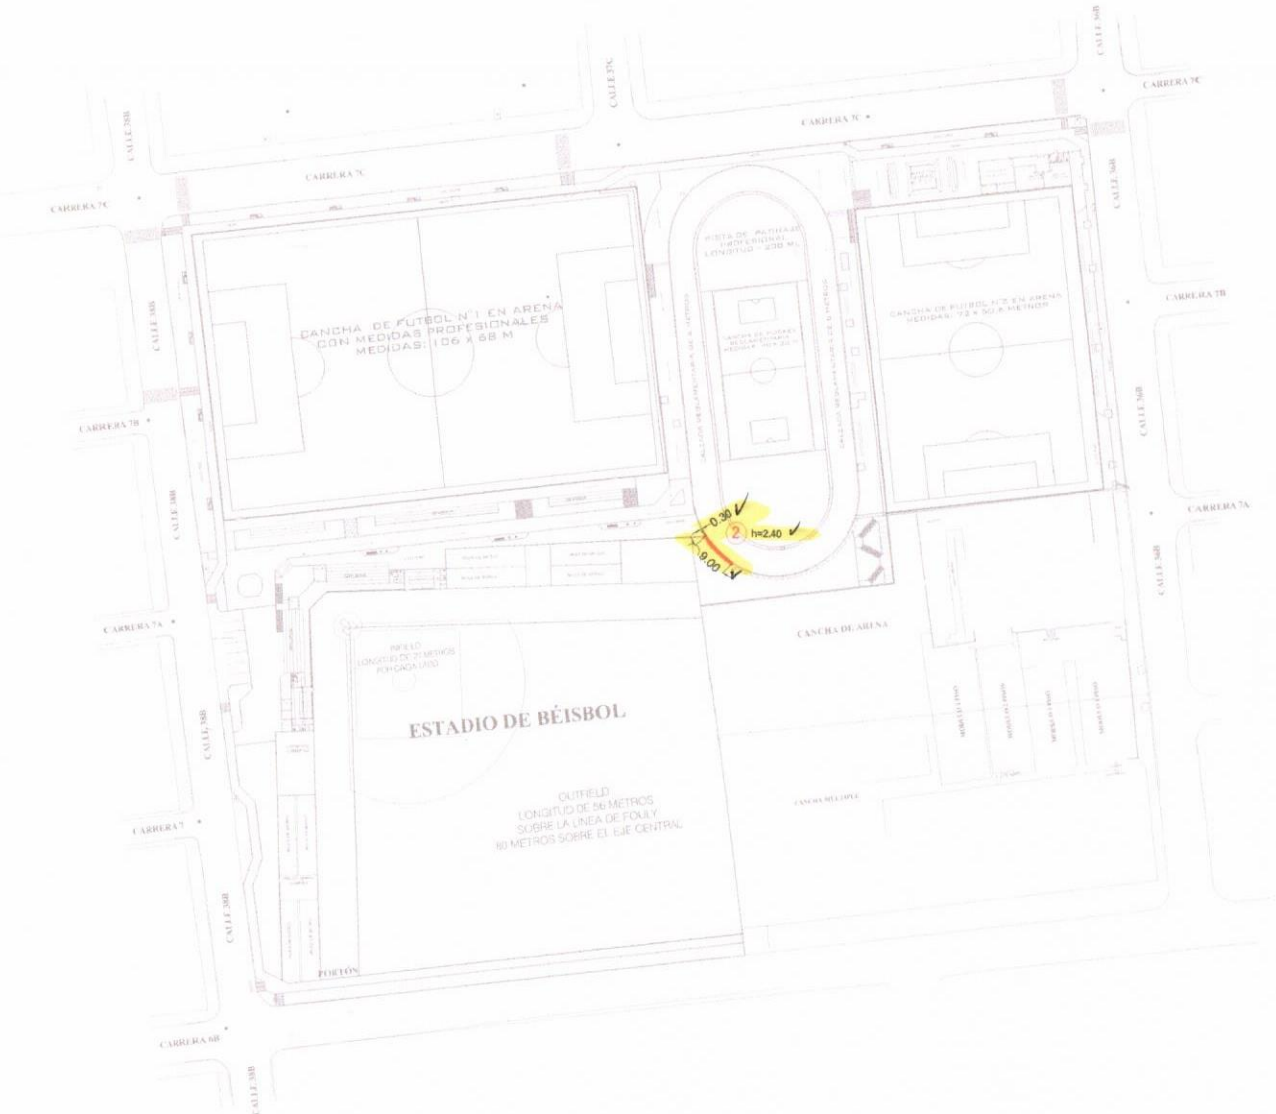

NP- 03. CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA (MURO)

Acumulado Presente acta


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP - 04	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

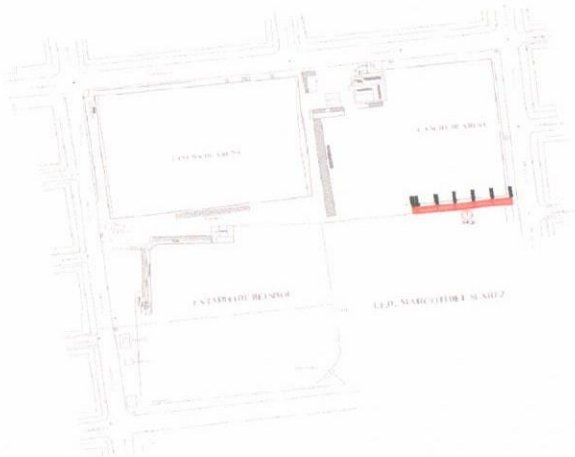

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1 - CANCHA No. 02 / COLEGIO (Cimentación muro sur cancha No. 02 arena)	52.20	2.80	0.20		1.00			29.23

Cantidad contractual según Modificativa No. 01	29.23
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	29.23
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

TOTAL PRESENTE ACTA:	29.23
OBSERVACIONES:	




NP- 04. SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20

Acumulado Presente acta

SUELO CEMENTO CIMENTACION MURO SUR CANCHA #2 DE ARENA									
ABSCISADO	LONGITUD	COTAS				PROMEDIO ALTURA	ALTURA	ANCHO	VOLUMEN
		EJE		DERECHA					
		SUPERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR				
0		31.00	30.80	31.00	30.80	0.20			
	10						0.2	2.80	5.6
10		31.00	30.80	31.00	30.80	0.20			
	10						0.20	2.80	5.6
20		31.00	30.80	31.00	30.80	0.20			
	10						0.20	2.80	5.6
30		31.00	30.80	31.00	30.80	0.20			
	10						0.20	2.80	5.6
40		31.00	30.80	31.00	30.80	0.20			
	10						0.20	2.80	5.6
50		31.00	30.80	31.00	30.80	0.20			
	2.2						0.20 ✓	2.80 ✓	1.23
52.2 ✓		31.00	30.80	31.00	30.80	0.20			
TOTAL VOLUMEN									29.23 ✓

ELABORÓ: JOSE JULIO REBOLLEDO
TOPOGRAFO

REVISÓ: SAMUEL PATRÓN
RESIDENTE ADMINISTRATIVO

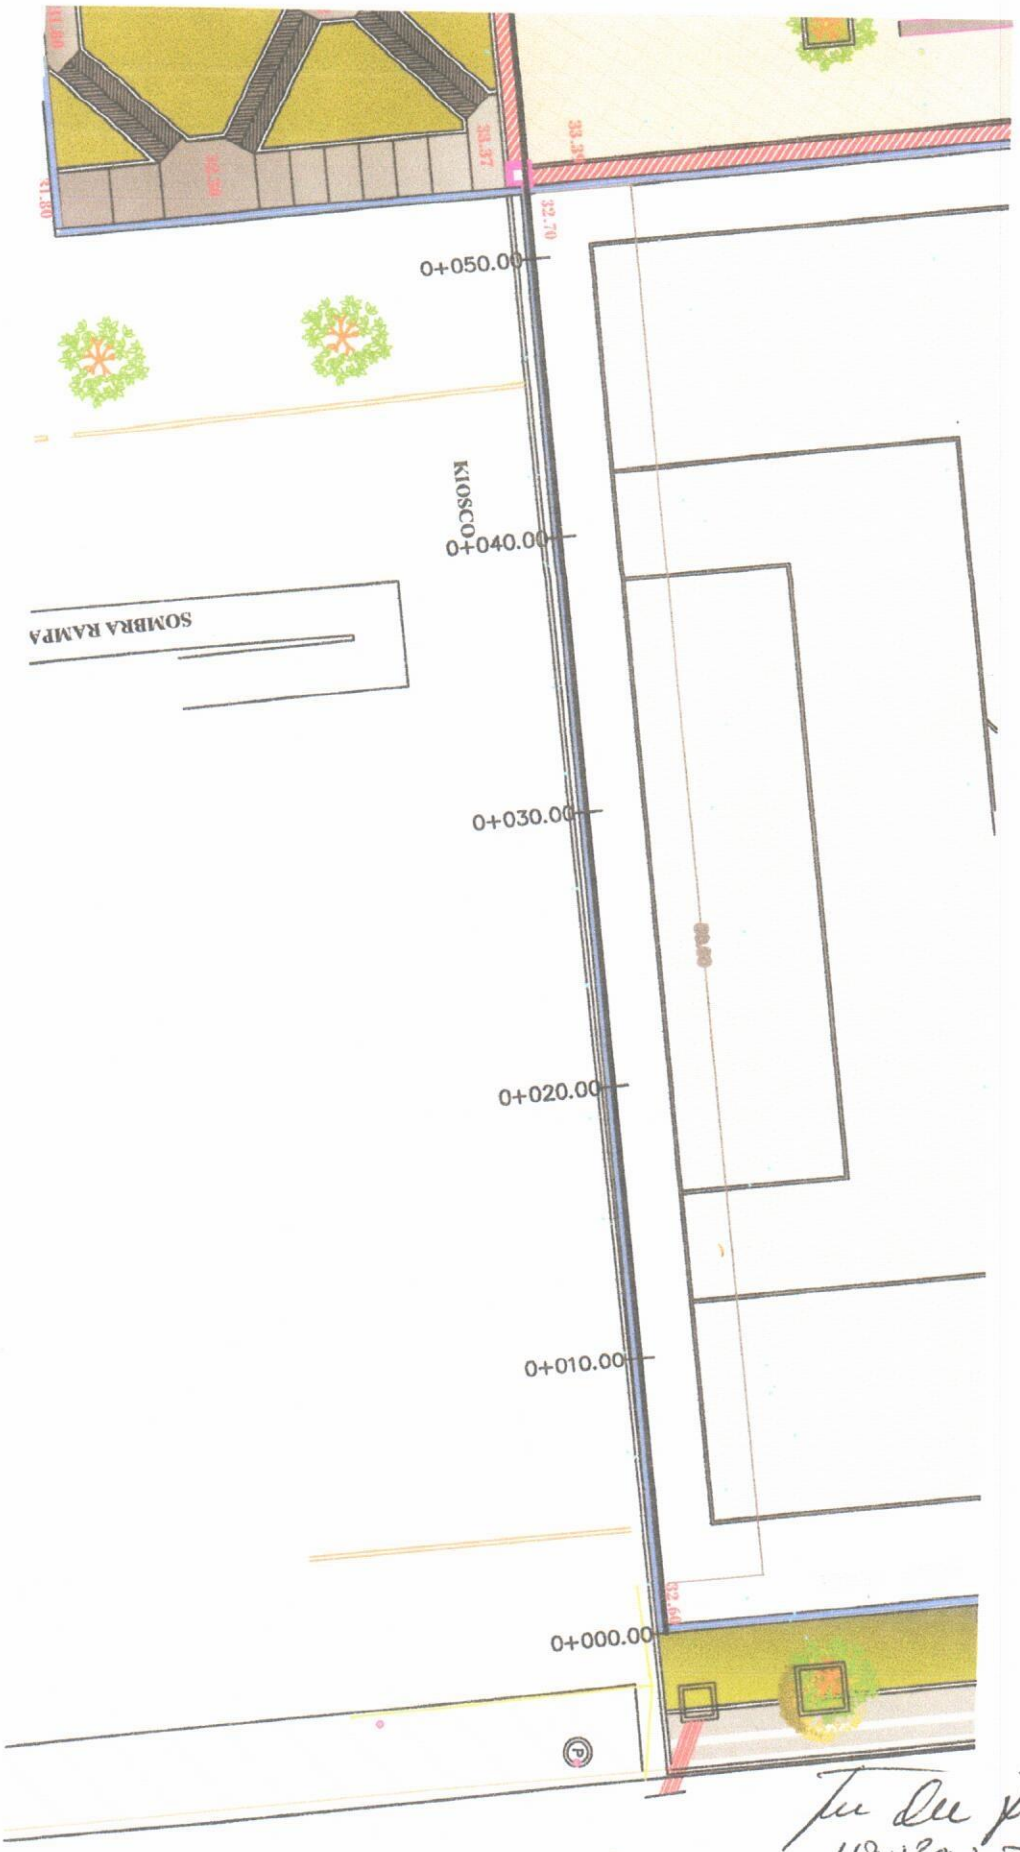

Tu de Stuck
1989+34 M


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP - 05	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE MURO A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

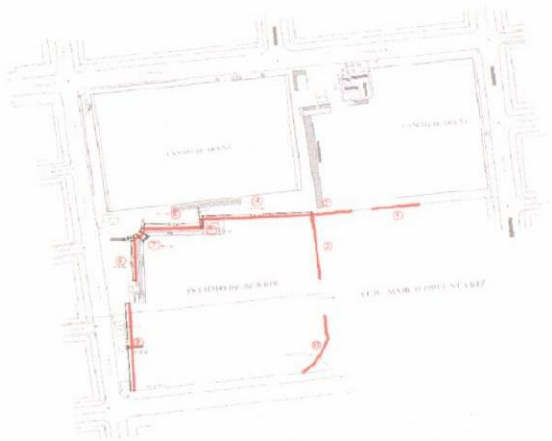

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
ZONA 1 - Pista de patinaje / Preescolar	0.30		3.90		8.00		9.36	
	3.49		3.90		1.00		13.61	
	4.06		3.90		1.00		15.83	
	3.30		3.90		1.00		12.87	
	4.44		3.90		1.00		17.32	
	3.36		3.90		1.00		13.10	
	4.14		3.90		1.00		16.15	
	3.35		3.90		1.00		13.07	
ZONA 2 - Pista de patinae / Colegio	0.30		3.90		6.00		7.02	
	4.12		3.90		1.00		16.07	
	3.34		3.90		1.00		13.03	
	3.98		3.90		1.00		15.52	
	3.68		3.90		1.00		14.35	
	4.23		3.90		1.00		16.50	
	3.25		3.90		1.00		12.68	
ZONA 3 - Estadio de beisbol / Colegio	8.71		2.90		1.00		25.26	
	0.29		2.90		1.00		0.84	
	3.70		2.90		1.00		10.73	
	0.22		2.90		1.00		0.64	
	3.89		2.90		1.00		11.28	
	0.28		2.90		1.00		0.81	
	3.83		2.90		1.00		11.11	
	0.26		2.90		1.00		0.75	
	3.95		2.90		1.00		11.46	
	0.29		2.90		1.00		0.84	
	3.53		2.90		1.00		10.24	
	0.23		2.90		1.00		0.67	
	4.03		2.90		1.00		11.69	
	0.25		2.90		1.00		0.73	
	3.52		2.90		1.00		10.21	
	0.30		2.90		1.00		0.87	
	3.79		2.90		1.00		10.99	
ZONA 4 - Estadio de beisbol / Cancha No. 01	58.89		1.90		1.00		111.89	
ZONA 5 - Estadio de beisbol / Cancha No. 01	4.86		1.90		1.00		9.23	
ZONA 6 - Estadio de beisbol / Cancha No. 01	31.90		1.90		1.00		60.61	

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES:


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP - 05	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE MURO A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

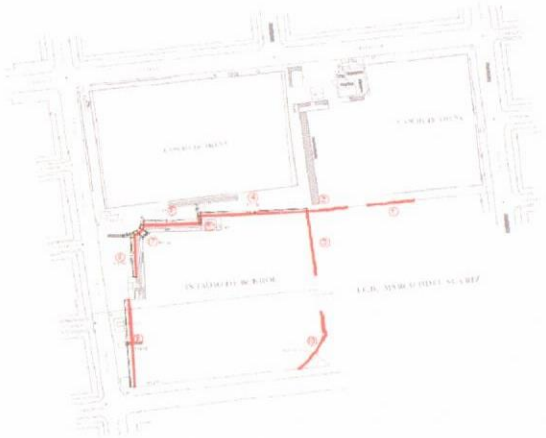

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 7 - Entrada estadio de beisbol	2.80		1.90		1.00		5.32	
	3.35		1.90		1.00		6.37	
	2.66		1.90		1.00		5.05	
ZONA 8 - Estadio de beisbol / Calle 38B	23.89		2.90		1.00		69.28	
ZONA 9 - Estadio de beisbol / Calle 38B	52.50		2.46		1.00		129.15	
ZONA 10 - Fondo de estadio de beisbol / Colegio / Carrera 6B	2.94		1.80		1.00		5.29	
	3.29		1.80		1.00		5.92	
	2.88		1.80		1.00		5.18	
	4.26		1.80		1.00		7.67	
	1.82		1.80		1.00		3.28	
	3.06		1.80		1.00		5.51	
	3.10		1.80		1.00		5.58	
	3.89		1.80		1.00		7.00	
	0.52		1.80		1.00		0.94	
	2.55		1.80		1.00		4.59	
	0.75		1.80		1.00		1.35	
	7.94		1.80		1.00		14.29	
	0.30		1.80		1.00		0.54	
	3.87		1.80		1.00		6.97	
	0.30		1.80		1.00		0.54	


Cantidad contractual según Modificativa No. 01	1,028.45
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	797.15
Obra por ejecutar	231.30

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	797.15
				OBSERVACIONES:	


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**


NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02

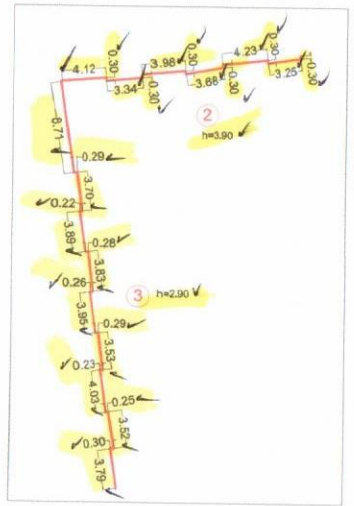





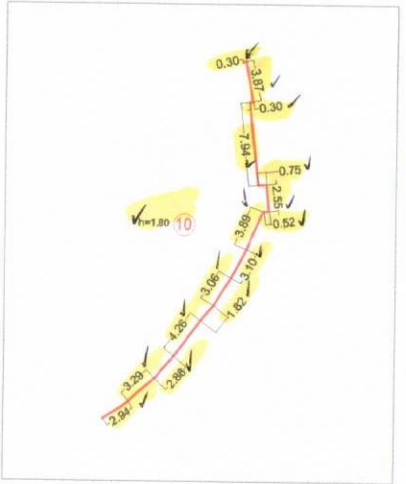

NP- 05. DEMOLICIÓN DE MURO A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

Acumulado

Presente acta

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°02

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	19 DE JULIO A 18 SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP - 06 ✓	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	TALA DE ARBOLES INCLUYE DISPOSICION FINAL (ALTURA DE 9 A 11 MTS Y PERIMETRO PROMEDIO A ALTURA DE PECHO DE 1.20 MTS)

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION SEGÚN INVENTARIO FORESTAL	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES UND	TOTALES M2	TOTALES M3
ARBOL 18 - Gliricidia sepium ✓					1.00	1.00 ✓		
ARBOL 19 - Mangifera indica ✓					1.00	1.00 ✓		
ARBOL 20 - Mangifera indica ✓					1.00	1.00 ✓		
ARBOL 105 - Albizia guachapele ✓					1.00	1.00 ✓		
ARBOL 106 - Albizia guachapele ✓					1.00	1.00 ✓		
ARBOL 107 - Terminalia catappa ✓					1.00	1.00 ✓		
ARBOL 117 - Mangifera indica ✓					1.00	1.00 ✓		
ARBOL 118 - Mangifera indica ✓					1.00	1.00 ✓		
ARBOL 119 - Mangifera indica ✓					1.00	1.00 ✓		
ARBOL 120 - Mangifera indica ✓					1.00	1.00 ✓		
ARBOL 121 - Mangifera indica ✓					1.00	1.00 ✓		

Cantidad contractual según Modificativa No. 01 ✓	11.00 ✓
Acumulado anterior ✓	0.00 ✓
Acumulado a presente acta ✓	11.00 ✓
Obra por ejecutar ✓	0.00 ✓

OBSERVACIONES: Ver anexo, **RESOLUCIÓN No. 1327**, del 01 de Agosto del 2024.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	11.00 ✓
				OBSERVACIONES:	

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 02



NP- 06. TALA DE ARBOLES INCLUYE DISPOSICION FINAL (ALTURA DE 9 A 11 MTS Y PERIMETRO PROMEDIO A ALTURA DE PECHO DE 1.20 MTS)

Acumulado Presente acta
