
OFICINA ORIP FLORENCIA CAQUETA

Id	Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**1**		**OFICINA ORIP BUENAVENTURA**	**105 días?**	**jue 5/09/24**	**mar 31/12/24**	
2	2		VISITA, DIAGNOSTICO Y LOGISTA	30 días	jue 5/09/24	mar 8/10/24	
3	**3**		**PRELIMINARES**	**72 días?**	**mar 8/10/24**	**vie 27/12/24**	
4	4		DESMONTE DE CIELORRASO	30 días	mar 8/10/24	lun 11/11/24	2
5	5		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	5 días	mar 8/10/24	lun 14/10/24	4CC
6	6		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	30 días	mar 8/10/24	lun 11/11/24	4CC
7	7		DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	10 días	jue 31/10/24	lun 11/11/24	4CC+20 días
8	8		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	5 días	lun 14/10/24	sáb 19/10/24	5
9	9		DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	5 días	mié 16/10/24	mar 22/10/24	8CC+2 días
10	10		INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	5 días	jue 28/11/24	mar 3/12/24	16
11	11		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	65 días	mar 8/10/24	vie 20/12/24	4CC
12	12		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	5 días	sáb 19/10/24	vie 25/10/24	8
13	13		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	2 días	jue 26/12/24	vie 27/12/24	50CC
14	14		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	1 día?	mar 8/10/24	mié 9/10/24	4CC
15	**15**		**CIELORRASOS**	**30 días**	**vie 25/10/24**	**mié 27/11/24**	
16	16		CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC	30 días	vie 25/10/24	mié 27/11/24	4CC+15 días
17	17		**PISOS**	5 días	sáb 19/10/24	vie 25/10/24	
18	18		ALISTADO DE PISO 2CM	5 días	sáb 19/10/24	vie 25/10/24	8
19	**19**		**RED ELÉCTRICA**	**5 días**	**jue 28/11/24**	**mar 3/12/24**	
20	20		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	5 días	jue 28/11/24	mar 3/12/24	16
21	21		SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	20CC
22	22		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	20CC
23	**23**		**RED HIDRÁULICA**	**3 días**	**vie 25/10/24**	**mar 29/10/24**	
24	24		PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml	3 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24	12
25	25		PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	3 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24	12
26	**26**		**RED SANITARIA**	**3 días**	**vie 25/10/24**	**mar 29/10/24**	
27	27		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	3 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24	12
28	**28**		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**2 días**	**jue 26/12/24**	**vie 27/12/24**	
29	29		ASEO GENERAL DE OBRA	2 días	jue 26/12/24	vie 27/12/24	37
30	**30**		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**75 días**	**mar 8/10/24**	**mar 31/12/24**	
31	31		DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	1 día	lun 14/10/24	mar 15/10/24	4CC+5 días
32	32		DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	5 días	mar 8/10/24	lun 14/10/24	4CC
33	33		MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	1 día	vie 11/10/24	sáb 12/10/24	8CC-2 días
34	34		ESPEJO BISELADO 5MM	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24	37
35	35		CERÁMICA FORMATO 30X60CM	15 días	vie 25/10/24	lun 11/11/24	12
36	36		MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	15 días	lun 11/11/24	mié 27/11/24	7
37	37		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	60 días	sáb 19/10/24	mié 25/12/24	4CC+10 días
38	38		SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	3 días	mar 3/12/24	vie 6/12/24	20
39	39		TUBERÍA PVCP 1"	5 días	mar 15/10/24	lun 21/10/24	31
40	40		TUBERÍA PVCP 3/4"	3 días	mié 16/10/24	sáb 19/10/24	39CC+1 día
41	41		PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA. Pron	1 día	mar 29/10/24	mié 30/10/24	25
42	42		JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	1 día	lun 11/11/24	mar 12/11/24	35
43	43		LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	1 día	lun 11/11/24	mar 12/11/24	35
44	44		MESON EN ACERO INOXIDABLE	5 días	lun 11/11/24	sáb 16/11/24	35
45	45		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PAF	1 día	lun 11/11/24	mar 12/11/24	44CC
46	46		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PAF	1 día	mar 22/10/24	mié 23/10/24	35CC-3 días
47	47		SANITARIO TIPO AHORRADOR	1 día	lun 11/11/24	mar 12/11/24	35
48	48		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN COB	10 días	mar 15/10/24	vie 25/10/24	31
49	49		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX (PR	1 día	vie 18/10/24	sáb 19/10/24	48CC+3 días
50	50		FIN	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	37

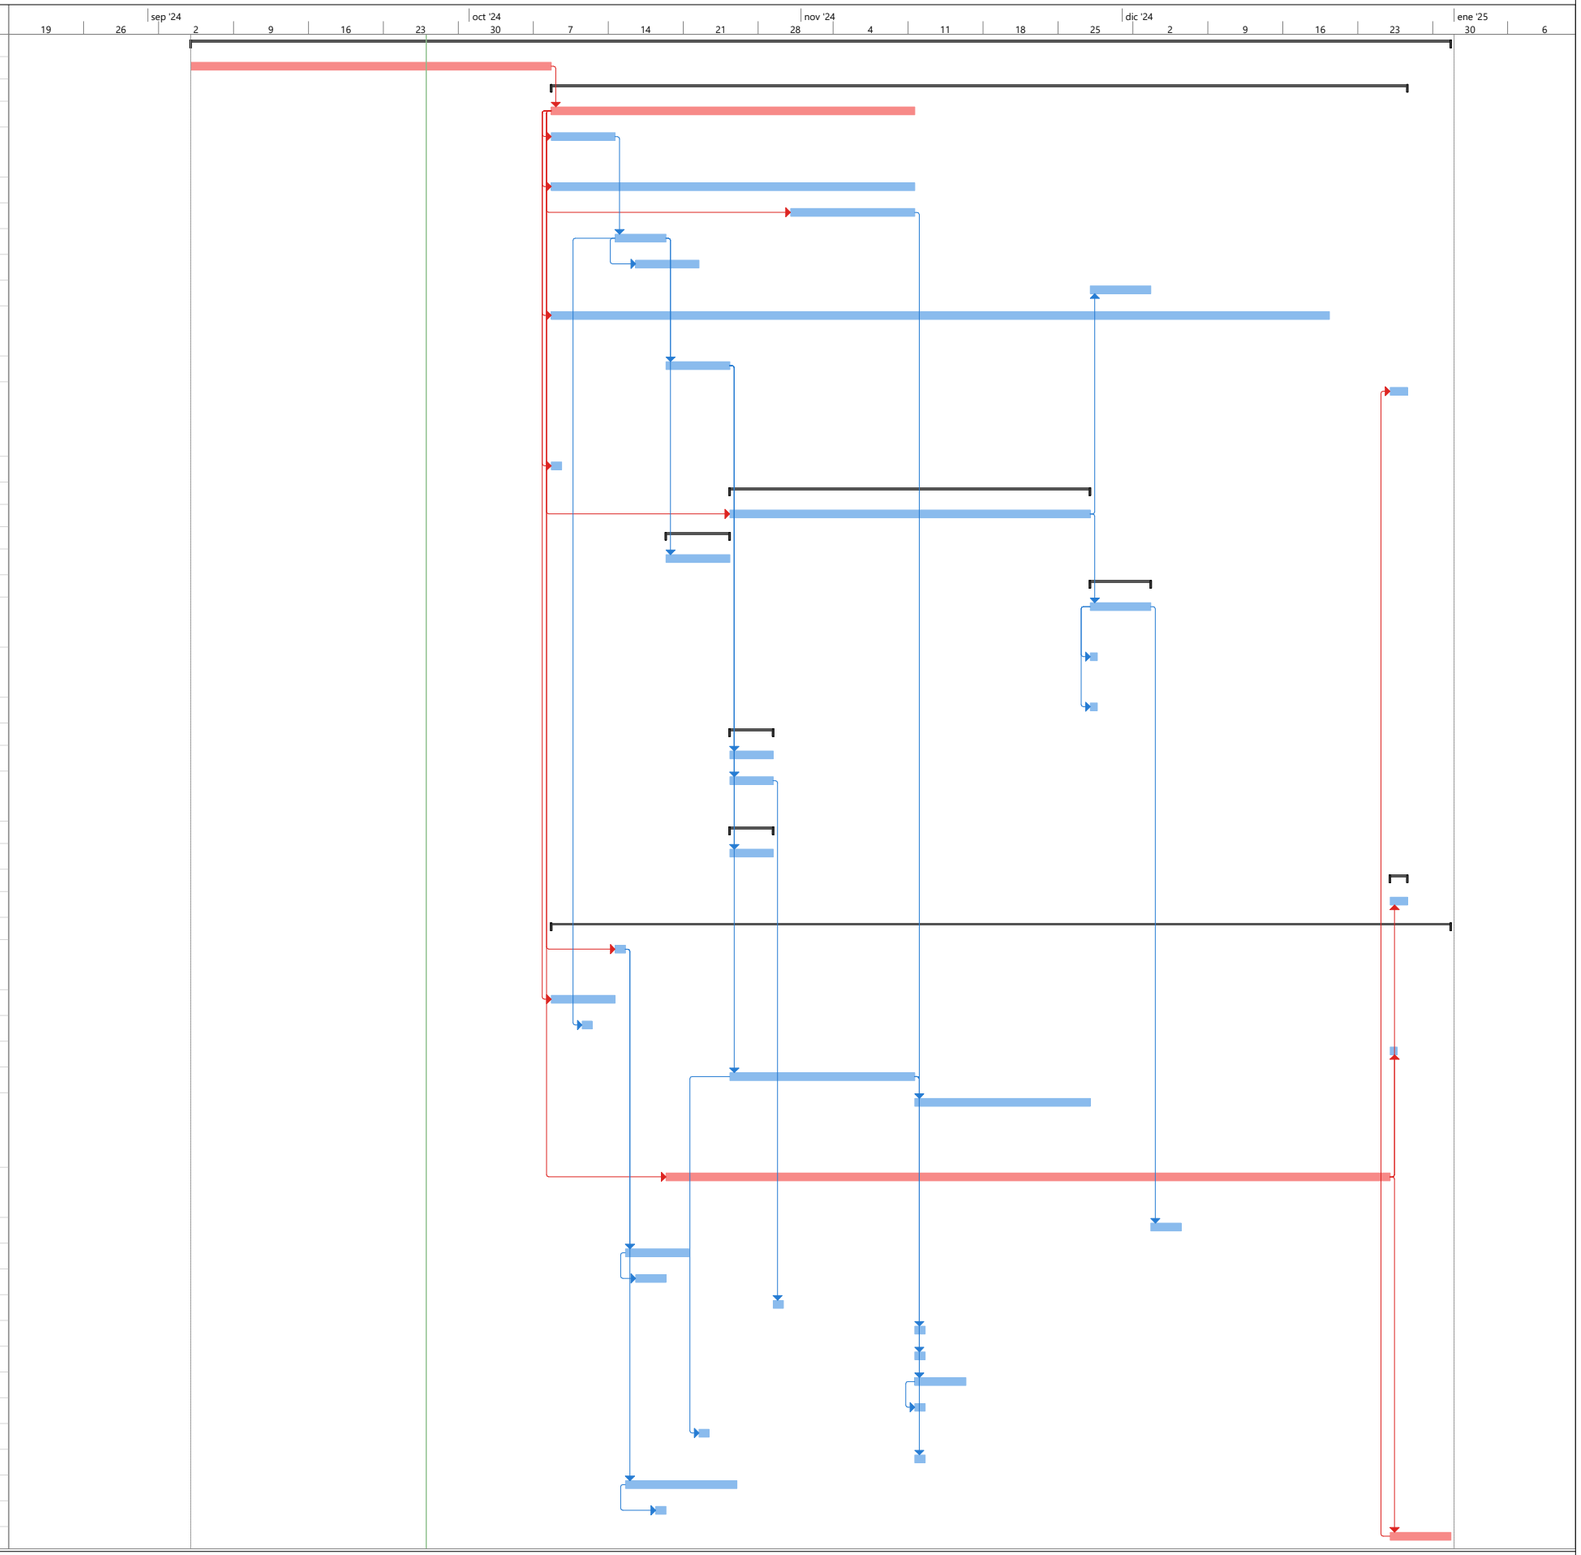

Proyecto: OFICINA ORIP FLORENCIA CAQUETA
Fecha: vie 27/09/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	
