
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1		**MANTENIMIENTO CERETE**	**185 días**	**$ 122.886.426,04**	**jue 5/09/24**	**mar 31/12/24**		
2		INICIO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20 días	0,00	jue 5/09/24	mar 1/10/24		6;14
3		**PRELIMINARES**	**67 días**	**$ 11.677.826,22**	**jue 5/09/24**	**mar 19/11/24**		
4		DESMONTE DE CIELORRASO	3 días	$ 111.345,25	mar 8/10/24	jue 10/10/24	6	7;15
5		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	$ 56.273,27	jue 5/09/24	jue 5/09/24		17
6		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	5 días	$ 404.470,40	jue 3/10/24	mar 8/10/24	2;14	4
7		DESMONTE DE CUBIERTA	9 días	$ 4.692.771,31	jue 12/09/24	mié 25/09/24	4	8;9CC
8		DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SUCCIÓN VARIABLE)	5 días	$ 4.821.737,53	mié 16/10/24	mar 22/10/24	7	23;51;53
9		DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	1 día	$ 48.683,42	jue 10/10/24	vie 11/10/24	7CC	45
10		DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	10 días	$ 131.240,79	mar 22/10/24	vie 1/11/24	8	11CC
11		DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	1 día	$ 124.927,55	mar 22/10/24	mié 23/10/24	10CC	12
12		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	3 días	$ 460.172,10	mié 23/10/24	mar 29/10/24	11	46;53
13		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	55 días	$ 164.317,75	jue 5/09/24	mar 19/11/24	4	24
14		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	2 días	$ 245.497,88	mar 1/10/24	mié 2/10/24	2	6
15		**CARPINTERIA EN MADERA**	**26 días**	**$ 7.015.274,48**	**mié 4/12/24**	**mar 31/12/24**		
16		MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	2 días	$ 730.718,62	mié 4/12/24	vie 6/12/24	19CC	17FF
17		MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	1 día	$ 2.492.185,24	jue 5/12/24	vie 6/12/24	16FF	41FF
18		HOJA PUERTA EN MADERA 55CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	24 días	$ 2.753.480,66	mié 4/12/24	mar 31/12/24	16;CC+20 días	19CC
19		MARCO PUERTA EN MADERA 53CM-75CM	9 días	$ 1.036.880,84	mié 4/12/24	vie 13/12/24	18CC	19CC
20		**CELORRASOS**	**0 días**	$ 1.681.340,40	**jue 5/09/24**	**vie 13/09/24**		
21		CELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CM060CM	8 días	$ 1.681.340,40	jue 5/09/24	vie 13/09/24		22FF
22		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**15 días**	$ 2.142.060,86	**lun 28/11/24**	**mié 4/12/24**		
23		PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	15 días	$ 2.142.060,86	lun 18/11/24	mié 4/12/24	47	27
24		**CUBIERTA**	**56 días**	$ 24.903.366,29	**mar 22/10/24**	**lun 23/12/24**		
25		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	55 días	$ 24.903.366,29	mar 22/10/24	lun 23/12/24	8	62
26		**ENCHAPES MUROS**	**18 días**	$ 586.462,77	**mié 4/12/24**	**lun 16/12/24**		
27		RESANE	10 días	$ 586.462,77	mié 4/12/24	lun 16/12/24	23	28FF
28		**PINTURAS**	**18 días**	$ 8.155.645,73	**mié 11/12/24**	**mar 31/12/24**		
29		VINILO TIPO 1, 5 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	18 días	$ 8.155.645,73	mié 11/12/24	mar 31/12/24	31;CC+45 días;53;27FF	41FF;42FF;43FF;CC+5 días
30		**PISOS**	**0 días**	$ 801.716,21	**mar 12/11/24**	**jue 21/11/24**		
31		PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	8 días	$ 801.716,21	mar 12/11/24	jue 21/11/24	65	18CC+20 días
32		**RED ELECTRICA**	**1 día**	$ 4.171.286,39	**jue 12/09/24**	**vie 13/09/24**		
33		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	1 día	$ 1.737.379,44	jue 12/09/24	vie 13/09/24	21FF	34FF
34		LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTEMPERIE DE SOBREPONER	1 día	$ 546.674,80	jue 12/09/24	vie 13/09/24	33FF	35FF
35		TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	1 día	$ 115.892,75	jue 12/09/24	vie 13/09/24	34FF	66FF
36		**RED HIDRAULICA**	**18 días**	$ 272.171,30	**jue 5/09/24**	**mar 17/09/24**		
37		LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería	10 días	$ 272.171,30	jue 5/09/24	mar 17/09/24	3	39
38		**RED SANITARIA**	**5 días**	$ 553.401,08	**mar 17/09/24**	**lun 23/09/24**		
39		SANITARIO TIPO AHORRADOR	5 días	$ 553.401,08	mar 17/09/24	lun 23/09/24	37	41FF
40		**ASEO DEMOLICION**	**185 días**	$ 1.972.869,41	**jue 5/09/24**	**mar 31/12/24**		
41		ASEO GENERAL DE OBRA	5 días	$ 1.494.523,20	mar 31/12/24	mar 31/12/24	26FF;28FF;42FF;43FF;72	
42		SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	$ 508.571,41	mar 31/12/24	mar 31/12/24	26FF	41FF
43		PODA CESPED	1 día	$ 0,00	jue 5/09/24	jue 5/09/24		41FF
44		**ADICIONALES DIAGNÓSTICOS**	**68 días**	$ 11.300.882,66	**mar 22/10/24**	**vie 27/12/24**		
45		DESMONTE VENTANA METÁLICA	1 día	$ 56.137,79	sáb 16/11/24	lun 18/11/24	52;9	59
46		DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	5 días	$ 76.722,65	mar 29/10/24	jue 31/10/24	12	47
47		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	15 días	$ 481.344,77	jue 31/10/24	lun 18/11/24	46	48;23
48		GESTION DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	30 días	$ 1.235.865,70	lun 18/11/24	vie 20/12/24	47	41
49		HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	11 días	$ 1.327.504,92	sáb 7/12/24	vie 20/12/24	50CC	59CC
50		MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	5 días	$ 577.887,26	sáb 7/12/24	vie 13/12/24	61	49CC
51		RECAPA PARATOLE/MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFORZADO PUR ELEMO	60 días	$ 2.344.111,73	mar 22/10/24	vie 27/12/24	9	29;CC+8 días
52		ALISTADO DE PISO 4CM	8 días	$ 1.115.404,57	jue 7/11/24	sáb 16/11/24	52	64;45
53		CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	9 días	$ 470.171,46	mar 29/10/24	jue 7/11/24	12	52;65;54
54		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	24 días	$ 2.412.020,12	jue 7/11/24	mié 4/12/24	53	55
55		TUBERÍA PVCS 4"	8 días	$ 708.852,80	mié 4/12/24	vie 13/12/24	54	
56		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**181 días**	$ 47.465.087,28	**mar 30/08/24**	**mar 31/12/24**		
57		BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	30 días	$ 1.798.905,59	vie 13/12/24	lun 23/12/24	56CC	59
58		REJA TIPO BANCO	40 días	$ 2.297.464,17	vie 15/11/24	lun 16/12/24	70CC	57CC
59		VENTANERIA EN ALUMINIO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	10 días	$ 720.336,66	jue 19/12/24	lun 30/12/24	57;45;49CC	61FF
60		CAMA LISTA ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	4 días	$ 1.048.666,19	sáb 14/12/24	lun 16/12/24	69FC-15 días	
61		CERÁMICA FORMATO 30X60CM	15 días	$ 1.680.142,58	mar 12/11/24	sáb 7/12/24	65	50;70FF
62		ANTICORROSIVO SOBRE LA MINA LINEAL	4 días	$ 1.481.302,10	lun 23/12/24	jue 26/12/24	25	63
63		ESMALTE SOBRE LA MINA LINEAL	4 días	$ 4.431.372,12	jue 26/12/24	mar 31/12/24	62	64FC-10 días
64		PISO GRES 30,5X30,5CM	55 días	$ 2.098.651,82	sáb 16/11/24	mié 25/12/24	52	71
65		ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	4 días	$ 446.161,60	jue 7/11/24	mar 12/11/24	53	61;31
66		SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT	4 días	$ 1.181.660,67	mar 10/09/24	vie 13/09/24	35FF	41FF
67		CANALETA PLASTICA 100X45MM	5 días	$ 422.138,05	jue 26/12/24	lun 30/12/24	26FC-5 días	
68		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	6 días	$ 1.934.100,89	mié 11/12/24	mié 18/12/24	69FC-18 días	
69		caja en concreto en fibrocemento PT N° 8	10 días	$ 13.426.038,18	vie 27/12/24	mar 31/12/24	61FC-15 días;68FC	61FC-15 días;68FC
70		**menos en acero inoxidable 3,2 M**	20 días	$ 2.550.485,28	vie 15/11/24	sáb 7/12/24	61FF	58CC
71		PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM	5 días	$ 6.016.401,10	jue 26/12/24	mar 31/12/24	64	41FF
72		FIN	0 días	$ 0,00	mar 31/12/24	mar 31/12/24	41	

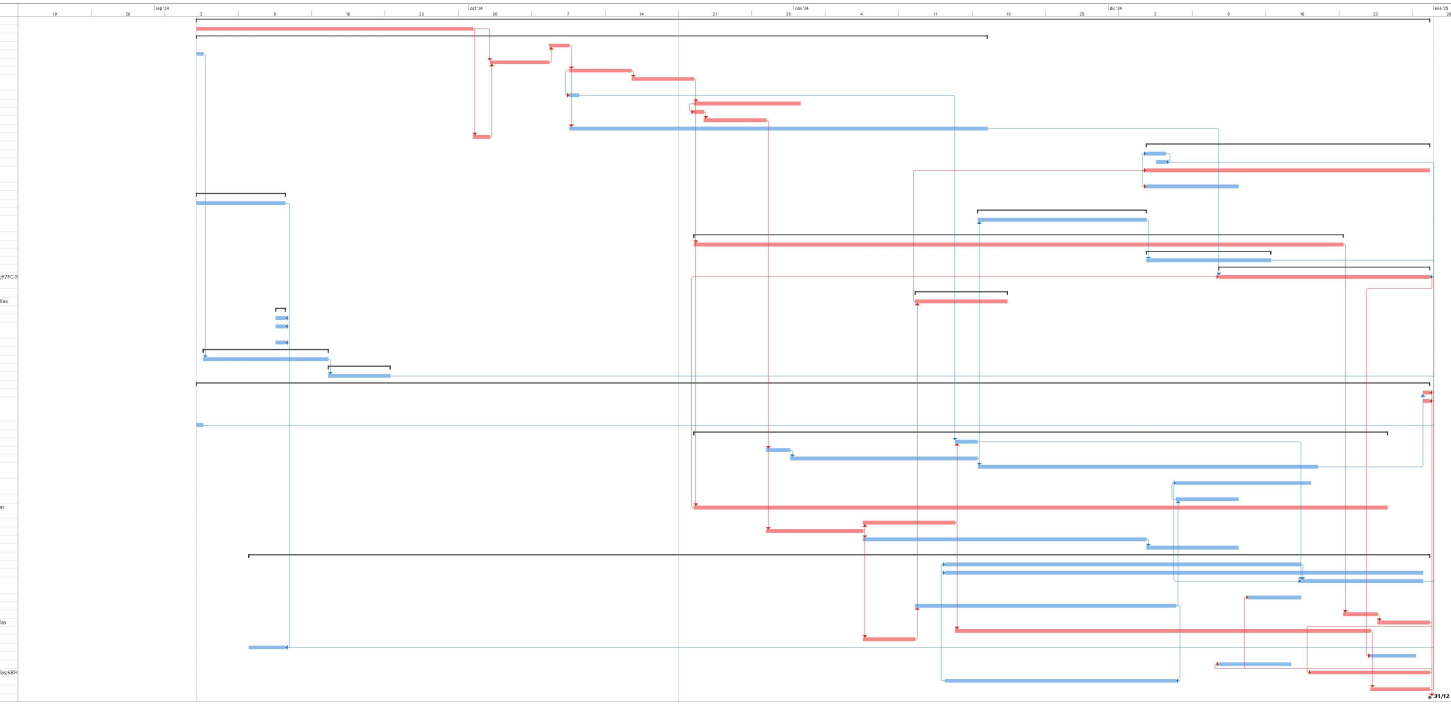

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: lun 21/10/24

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Hito al comienzo | Tareas externas | Fecha límite | Duración crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | sólo duración | Resumen manual | sólo fin | Hito externo | Tareas críticas | Progreso
