
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesores
1		**MANTENIMIENTO CERETE**	**135 días**	**$ 122.866.420,00**	**jue 5/09/24**	**mar 31/12/24**		
2		INICIO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20 días	0,00	jue 5/09/24	mar 1/10/24		614
3		**PRELIMINARES**	**67 días**	**$ 8.881.548,17**	**mar 1/10/24**	**sáb 14/12/24**		
4		DESMONTE DE CIELORRASO	2 días	$ 111.345,60	mar 8/10/24	jue 10/10/24	6	7;13
5		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	$ 56.273,57	vie 11/10/24	sáb 14/12/24	3BCC	39
6		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	5 días	$ 434.470,40	jue 3/10/24	mar 8/10/24	2;14	4
7		DESMONTE DE CUBIERTA	9 días	$ 456.313,77	jue 12/10/24	mié 16/10/24	4	8;9CC
8		DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SUCCIÓN VARIABLE)	5 días	$ 446.437,18	mié 16/10/24	mar 22/10/24	7	23;54;55
9		DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	1 día	$ 48.683,42	jue 10/10/24	vie 11/10/24	7CC	47
10		DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	10 días	$ 131.240,79	mar 22/10/24	vie 1/11/24	8	11CC
11		DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	1 día	$ 124.327,55	mar 22/10/24	mié 23/10/24	10CC	12
12		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	3 días	$ 460.127,10	mié 23/10/24	mar 29/10/24	11	48;56
13		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	35 días	$ 771.193,45	jue 10/10/24	mar 19/11/24	4	30
14		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	2 días	$ 245.497,88	mar 1/10/24	mié 2/10/24	2	6
15		**CARPINTERIA MADERA**	**26 días**	**$ 7.026.274,48**	**mié 6/12/24**	**mar 31/12/24**		
16		MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	2 días	$ 730.718,62	mié 4/12/24	vie 6/12/24	19CC	17FF
17		MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	1 día	$ 2.492.185,24	jue 5/12/24	vie 6/12/24	16FF	41FF
18		HOJA PUERTA EN MADERA 53CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	24 días	$ 2.753.480,86	mié 4/12/24	mar 31/12/24	16CC;20 días	19CC
19		MARCO PUERTA EN MADERA 53CM-75CM	8 días	$ 1.038.860,84	mié 4/12/24	vie 13/12/24	18CC	19CC
20		**CELORRASOS**	**8 días**	**$ 1.661.348,40**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**		
21		CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CM060CM	8 días	$ 1.661.345,40	lun 23/12/24	mar 31/12/24	26	34FF
22		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**15 días**	**$ 2.141.068,84**	**lun 28/11/24**	**mié 4/12/24**		
23		PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	15 días	$ 2.141.060,84	lun 18/11/24	mié 4/12/24	49	28
24		**CUBIERTA**	**56 días**	**$ 4.760.473,15**	**mar 22/10/24**	**lun 23/12/24**		
25		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	55 días	$ 2.243.942,40	mar 22/10/24	lun 23/12/24	8	26CC
26		TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	35 días	$ 2.498.550,75	mar 22/10/24	lun 23/12/24	25CC	9;23
27		**ENCHAPE MADERA**	**18 días**	**$ 1.160.926,96**	**mié 6/12/24**	**lun 30/12/24**		
28		RESANE	10 días	$ 1.148.925,53	mié 4/12/24	lun 16/12/24	23	30FF
29		**PINTURAS**	**18 días**	**$ 10.431.987,76**	**mié 11/12/24**	**mar 31/12/24**		
30		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	18 días	$ 10.431.987,76	mié 11/12/24	mar 31/12/24	34CC;45 días;53;28FF	41FF;44FF
31		**PISOS**	**8 días**	**$ 1.882.137,76**	**mar 12/11/24**	**jue 21/11/24**		
32		PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	8 días	$ 1.032.157,76	mar 12/11/24	jue 21/11/24	63	18CC+20 días
33		**RED ELECTRICA**	**1 día**	**$ 4.171.286,87**	**mar 31/12/24**	**mar 31/12/24**		
34		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	1 día	$ 1.737.779,43	mar 31/12/24	mar 31/12/24	21;FF	35FF
35		LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	1 día	$ 949.674,89	mar 31/12/24	mar 31/12/24	34;FF	36FF
36		TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	1 día	$ 113.832,75	mar 31/12/24	mar 31/12/24	35;FF	68FF
37		**RED HIDRAULICA**	**11 días**	**$ 990.274,77**	**vie 13/12/24**	**mié 25/12/24**		
38		PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	9 días	$ 126.103,38	vie 13/12/24	jue 19/12/24	38	3CC
39		LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería	10 días	$ 272.171,39	sáb 14/12/24	mié 25/12/24	3	41
40		**RED SANITARIA**	**5 días**	**$ 913.633,38**	**jue 26/12/24**	**mar 31/12/24**		
41		SANITARIO TIPO AHORRADOR	5 días	$ 511.411,08	jue 26/12/24	mar 31/12/24	39	43FF
42		**ASEO DEMOLICIÓN**	**1 día**	**$ 2.020.013,52**	**mar 31/12/24**	**mar 31/12/24**		
43		ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	$ 1.444.325,20	mar 31/12/24	mar 31/12/24	30FF;42FF;44FF;45FF;70	
44		SUMINISTRO E INSTALACION AVISO OPSP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	$ 508.573,42	mar 31/12/24	mar 31/12/24	30FF	40FF
45		PODA CESPED	1 día	$ 55.114,70	mar 31/12/24	mar 31/12/24	53FF	40FF
46		**ADICIONALES DIAGNÓSTICAS**	**60 días**	**$ 47.261.981,11**	**mar 22/10/24**	**mar 31/12/24**		
47		DESMONTE VENTANA METÁLICA	1 día	$ 56.137,79	sáb 14/11/24	lun 25/11/24	55;9	62
48		DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	5 días	$ 518.899,52	mar 29/10/24	jue 31/10/24	12	49
49		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	15 días	$ 580.389,45	jue 31/10/24	lun 18/11/24	48	50;20
50		GESTION DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	30 días	$ 1.210.864,71	lun 18/11/24	vie 20/12/24	49	45
51		HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	11 días	$ 1.327.504,93	sáb 7/12/24	vie 20/12/24	52CC	61CC
52		MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	5 días	$ 577.887,27	sáb 7/12/24	vie 13/12/24	63	51CC
53		LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	5 días	$ 7.755.802,08	jue 26/12/24	mar 31/12/24	67	49FF
54		BICAPA MANTO e.2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	60 días	$ 30.949.860,93	mar 22/10/24	vie 27/12/24	8	30CC+45 días
55		ALISTADO DE PISO 4CM	8 días	$ 1.026.190,43	jue 7/11/24	sáb 16/11/24	56	64;47
56		CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	9 días	$ 470.171,46	mar 29/10/24	lun 7/11/24	12	55;65;57
57		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	24 días	$ 2.612.020,13	jue 7/11/24	mié 4/12/24	56	58
58		TUBERÍA PVCS 4"	8 días	$ 535.002,45	mié 4/12/24	vie 13/12/24	57	59
59		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**48 días**	**$ 20.038.902,56**	**jue 7/11/24**	**mar 31/12/24**		
60		BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	30 días	$ 1.728.665,34	vie 15/11/24	jue 19/12/24	61CC	62
61		REJA TIPO BANCO	40 días	$ 4.035.279,78	vie 15/11/24	lun 30/12/24	66CC	60CC
62		VENTANERIA EN ALUMINIO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	10 días	$ 720.334,96	jue 19/12/24	lun 30/12/24	60;67;51CC	46FF
63		CERÁMICA FORMATO 300X60CM	23 días	$ 2.915.896,76	mar 12/11/24	sáb 7/12/24	65	52;68FF
64		PISO GRES 30.5X30.5CM	35 días	$ 1.931.661,96	sáb 16/11/24	mié 25/12/24	55	69
65		ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	4 días	$ 596.242,10	jue 7/11/24	mar 12/11/24	56	63;32
66		SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT	1 día	$ 461.257,51	mar 31/12/24	mar 31/12/24	36FF	43FF
67		CANALETA PLASTICA 100X45MM	3 días	$ 422.536,05	lun 23/12/24	mié 25/12/24	26	53
68		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL SILVER GREY	20 días	$ 7.230.052,24	vie 13/12/24	sáb 7/12/24	61FF	61CC
69		PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6MM	5 días	$ 6.041.461,31	jue 26/12/24	mar 31/12/24	64	43FF
70		FIN	0 días	$ 0,00	mar 31/12/24	mar 31/12/24	43	

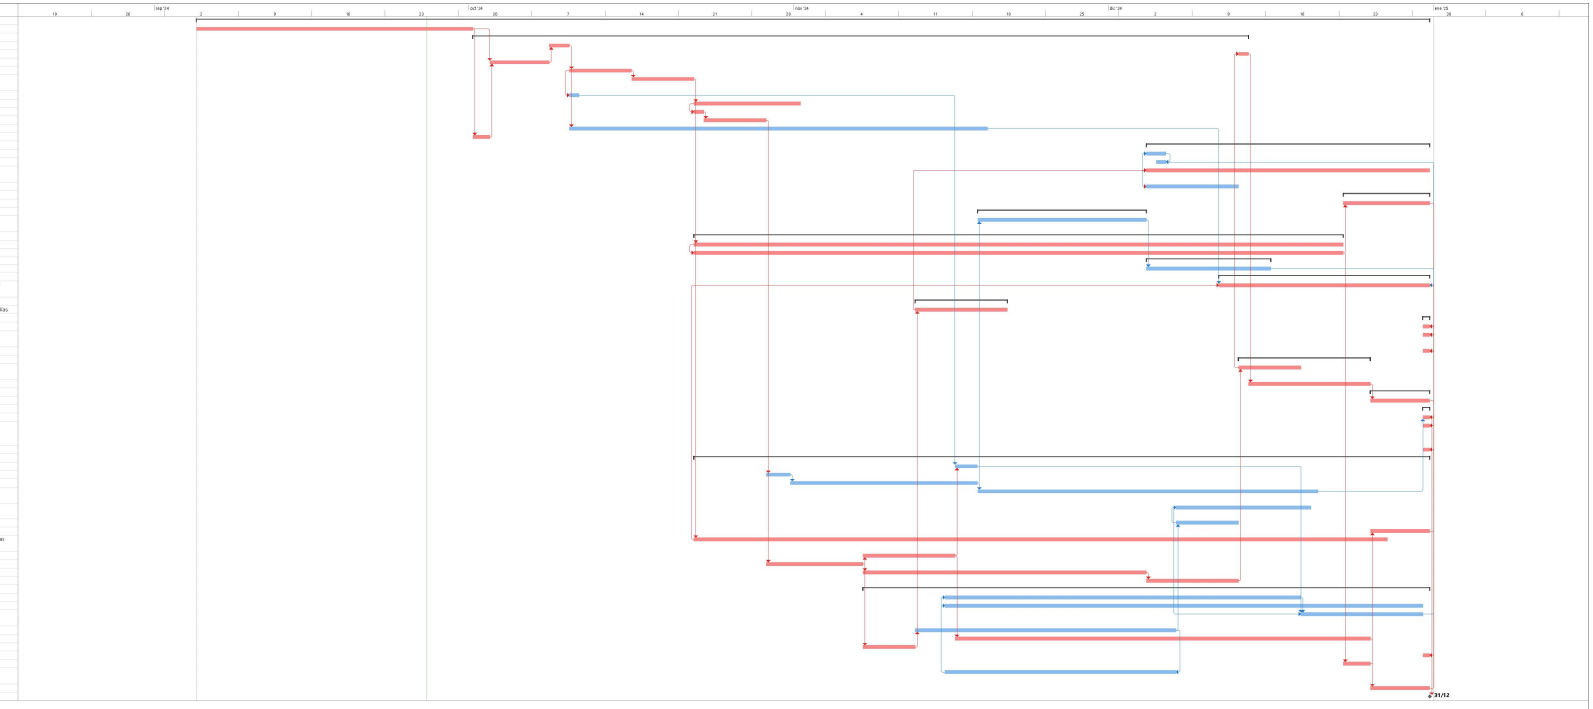

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: vie 27/9/24

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Hito al comienzo | Tareas externas | Fecha límite | Duración crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | sólo duración | Resumen manual | sólo fin | Hito externo | Tareas críticas | Progreso
