
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1		**MANTENIMIENTO SAHAGÚN**	**101 días**	**$ 90.574.413,00**	**jue 5/09/24**	**mar 31/12/24**		
2		INICIO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	27 días	$ 0,00	jue 5/09/24	vie 4/10/24		12
3		**PRELIMINARES**	**77 días**	**$ 5.967.163,10**	**vie 6/10/24**	**lun 30/12/24**		
4		DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	1 día	$ 234.825,30	lun 30/12/24	lun 30/12/24	9CC	49DC
5		DESMONTE DE CIELORRASO	6 días	$ 787.793,37	mié 9/10/24	mié 16/10/24	6	8;47
6		DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	$ 307.037,95	mar 8/10/24	mié 9/10/24	12	5
7		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	2 días	$ 276.408,09	mié 23/10/24	vie 25/10/24	8	10;41
8		DEMOLICIÓN DE MURO (0-15-20CM)	6 días	$ 746.600,48	mié 16/10/24	mié 23/10/24	5	7
9		INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	$ 63.317,56	lun 30/12/24	lun 30/12/24	42	4CC
10		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	6 días	$ 834.963,75	vie 25/10/24	jue 31/10/24	7	17;11
11		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	20 días	$ 2.471.699,41	jue 31/10/24	vie 22/11/24	10	64FF
12		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	2 días	$ 245.497,88	vie 4/10/24	lun 7/10/24	2	6
13		**CARPINTERIA EN MADERA**	**9 días**	**$ 2.288.333,45**	**vie 22/11/24**	**lun 30/12/24**		
14		MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33.8CM	6 días	$ 730.718,92	vie 29/12/24	jue 24/12/24	23CC	15
15		MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	3 días	$ 1.557.614,53	jue 26/12/24	lun 30/12/24	14	64FF
16		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**15 días**	**$ 1.957.225,84**	**jue 31/10/24**	**lun 18/11/24**		
17		PAÑETE MUROS 1:3 E=0.02M Incluye Filos y Dilataciones	15 días	$ 1.957.225,84	jue 31/10/24	lun 18/11/24	10	19
18		**ENCHAPE MUROS**	**5 días**	**$ 584.662,78**	**lun 18/11/24**	**vie 22/11/24**		
19		RESANE	5 días	$ 584.662,78	lun 18/11/24	vie 22/11/24	17	64CC
20		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**29 días**	**$ 3.729.516,61**	**lun 18/11/24**	**vie 20/12/24**		
21		MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	29 días	$ 3.729.516,61	lun 18/11/24	vie 20/12/24	48CC	23
22		**PINTURAS**	**10 días**	**$ 3.058.571,37**	**vie 22/12/24**	**mar 31/12/24**		
23		VINILO TIPO 2, 2 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidady durabilidad	10 días	$ 3.058.571,37	vie 20/12/24	mar 31/12/24	21	14CC
24		**PISOS**	**5 días**	**$ 567.167,33**	**jue 19/12/24**	**mié 25/12/24**		
25		AJUSTADO DE PISO 2CM	5 días	$ 567.167,33	jue 19/12/24	mié 25/12/24	62CC-4 días	51CC
26		**RED ELECTRICA**	**21 días**	**$ 3.214.495,70**	**lun 2/12/24**	**jue 26/12/24**		
27		LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	20 días	$ 3.059.248,14	lun 2/12/24	jue 26/12/24	58FF	28CC
28		LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	$ 155.243,56	lun 2/12/24	mar 3/12/24	27CC	64FF
29		**RED HIDRAULICA**	**20 días**	**$ 2.399.989,53**	**jue 28/11/24**	**vie 20/12/24**		
30		TUBERIA PVCP 1/2"	2 días	$ 237.345,32	jue 28/11/24	vie 29/11/24	31	31
31		VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	1 día	$ 130.838,14	vie 29/11/24	lun 2/12/24	30	32
32		PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml	1 día	$ 188.155,07	lun 2/12/24	lun 2/12/24	31	33
33		PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS/BOTIQUÍN/BIDÉ. Promedio 3 ml	1 día	$ 63.195,15	mar 3/12/24	mar 3/12/24	32	34
34		PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS. Promedio 3 ml	1 día	$ 62.083,57	mar 3/12/24	mié 4/12/24	33	35
35		PUNTO DE AGUA FRÍA DUCHA/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	2 días	$ 252.206,76	mié 4/12/24	vie 6/12/24	34	37
36		TAPA REGISTRO 20X20CM	1 día	$ 129.286,01	jue 19/12/24	vie 20/12/24	28	62
37		LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería	5 días	$ 546.342,77	vie 6/12/24	jue 12/12/24	35	38
38		LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	4 días	$ 529.695,60	jue 12/12/24	mar 17/12/24	37	39
39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE PARA LAVAMANOS	2 días	$ 263.841,14	mar 17/12/24	jue 19/12/24	38	36
40		**RED SANITARIA**	**18 días**	**$ 2.071.628,21**	**vie 25/10/24**	**lun 18/11/24**		
41		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	10 días	$ 1.044.808,05	vie 25/10/24	mié 27/11/24	7	10
42		SANITARIO TIPO AHORRADOR	8 días	$ 1.026.820,16	vie 29/12/24	lun 30/12/24	36	9
43		**ASEO GENERALIZADO**	**5 días**	**$ 1.409.857,03**	**mié 25/12/24**	**lun 30/12/24**		
44		ASEO GENERAL DE OBRA	5 días	$ 1.098.243,90	lun 30/12/24	lun 30/12/24	65FF;15FF;31FF;49FF;65	
45		SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO ORP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	$ 508.573,42	mié 25/12/24	mié 25/12/24	64	64FF
46		**ADICIONALES DIAGNÓSTICAS**	**67 días**	**$ 89.774.193,92**	**mié 16/10/24**	**lun 30/12/24**		
47		DESMONTE DE CUBIERTA	29 días	$ 3.910.641,93	mié 16/10/24	lun 18/11/24	5	48
48		DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	27 días	$ 4.911.028,08	lun 18/11/24	lun 30/12/24	47	1;4CC;21CC
49		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	1 día	$ 380.779,43	lun 30/12/24	lun 30/12/24	4CC	64FF
50		RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	5 días	$ 904.489,95	mar 24/12/24	lun 30/12/24	63	58FF
51		CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	6 días	$ 748.068,71	lun 2/12/24	lun 30/12/24	52FF	54CC
52		TEJA DE FIBROCEMENTO PT NO. 5	5 días	$ 1.108.748,16	mar 24/12/24	lun 30/12/24	53;61CC	51FF;62CC
53		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	10 días	$ 16.602.246,23	lun 18/11/24	mar 24/12/24	48CC	52FF;52.62CC
54		FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22	2 días	$ 3.395.985,45	lun 23/12/24	mié 25/12/24	51CC	58;45
55		CERÁMICA FORMATO 30X60CM	30 días	$ 6.109.572,89	jue 19/12/24	lun 30/12/24	25CC	56CC
56		PISO CERRAMIZO ANTIDESLIZANTE	9 días	$ 1.703.814,19	jue 19/12/24	lun 30/12/24	55CC	64FF
57		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**37 días**	**$ 23.353.851,35**	**lun 18/11/24**	**lun 30/12/24**		
58		CIELO RASO EN TABILLAS EN PVC DE 7MM	2 días	$ 7.381.460,76	mié 25/12/24	lun 30/12/24	54;64	23FF
59		BAJANTE AGUAS LLUVIA PVC 4"	21 días	$ 1.846.366,70	jue 5/12/24	lun 30/12/24	58FF	64FF
60		ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LIENAL	20 días	$ 3.655.534,74	lun 18/11/24	mar 10/12/24	53CC	61CC
61		ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	22 días	$ 2.907.714,75	lun 18/11/24	jue 12/12/24	60CC	52CC
62		AJUSTADO DE PISO 4 CM IMPERMEABILIZADO	5 días	$ 1.223.733,23	mar 24/12/24	lun 30/12/24	52CC	25CC-4 días
63		REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	1 día	$ 4.178.853,12	mar 19/11/24	mar 24/12/24	53FF	50
64		MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	11 días	$ 1.499.187,85	lun 18/11/24	vie 29/11/24	19CC	58
65		FIN	0 días	$ 0,00	lun 30/12/24	lun 30/12/24	64	

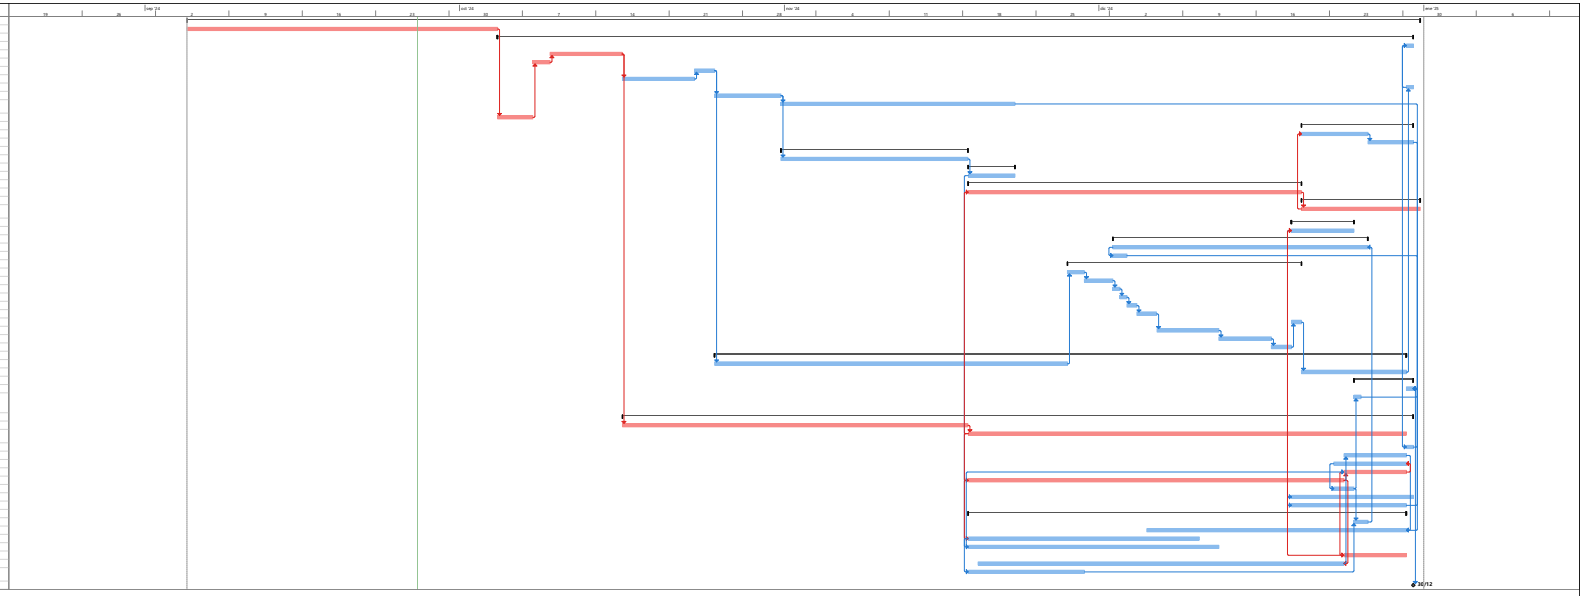

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: vie 27/09/24

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Hito externo | Tareas críticas | Progreso
