
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		**MONTELÍBANO**	**50,5 días**	**mar 22/10/24**	**mar 31/12/2**	**$ 30.698.985,00**		
2		**1 PRELIMINARES**	**18 días**	**mar 22/10/24**	**vie 15/11/24**	$ 1.782.804,17		
3		1,04 DESMONTE DE CIELORRASO	8 días	mar 22/10/24	vie 1/11/24	$ 135.050,29		
4		1,10 DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	5 días	vie 1/11/24	vie 8/11/24	$ 409.383,94	3	
5		1,11 DESMONTE DE CUBIERTA	10 días	vie 1/11/24	vie 15/11/24	$ 1.238.369,94	3	
6		**2 CARPINTERÍA EN MADERA**	**3 días**	**mar 22/10/2**	**vie 25/10/24**	$ 163.200,14		
7		2,18 CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	3 días	mar 22/10/24	vie 25/10/24	$ 163.200,14		
8		**4 CARPINTERÍA EN MADERA**	**10 días**	**vie 1/11/24**	**vie 15/11/24**	$ 1.993.614,48		
9		4,02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	10 días	vie 1/11/24	vie 15/11/24	$ 1.993.614,48	3	
10		**6 CUBIERTAS**	**10 días**	**vie 15/11/24**	**vie 29/11/24**	$ 6.468.284,22		
11		6,22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	10 días	vie 15/11/24	vie 29/11/24	$ 6.468.284,22	5	
12		**7 ENCHAPE MUROS**	**8 días**	**vie 29/11/24**	**mié 11/12/2**	$ 684.616,45		
13		7,01 ESTUCO EXTERIOR	8 días	vie 29/11/24	mié 11/12/24	$ 469.728,56	11	
14		7,02 ESTUCO PLASTICO INTERIOR	8 días	vie 29/11/24	mié 11/12/24	$ 214.887,89	11	
15		**10 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**7 días**	**mié 11/12/24**	**vie 20/12/24**	$ 2.915.115,06		
16		10,04 PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	7 días	mié 11/12/24	vie 20/12/24	$ 1.736.024,94	13	
17		10,05 PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]	7 días	mié 11/12/24	vie 20/12/24	$ 1.179.090,12	13	
18		**13 PINTURAS**	**12 días**	**mié 11/12/2**	**vie 27/12/24**	$ 4.152.503,35		
19		13,10 VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad. Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	12 días	mié 11/12/24	vie 27/12/24	$ 4.152.503,35	14	
20		**15 RED ELÉCTRICA**	**4 días**	**vie 8/11/24**	**jue 14/11/24**	$ 3.489.671,95		
21		15,10 LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	4 días	vie 8/11/24	jue 14/11/24	$ 3.489.671,95	4	
22		**16 RED HIDRÁULICA**	**5 días**	**vie 29/11/24**	**vie 6/12/24**	$ 189.890,63		
23		16,23 LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	5 días	vie 29/11/24	vie 6/12/24	$ 189.890,63	11	
24		**17 RED SANITARIA**	**6 días**	**vie 15/11/24**	**lun 25/11/24**	$ 734.520,34		
25		17,19 SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	6 días	vie 15/11/24	lun 25/11/24	$ 734.520,34	5	
26		**19 ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**4,5 días**	**mié 25/12/2**	**mar 31/12/2**	$ 1.087.791,90		
27		19,01 ASEO GENERAL DE OBRA	4 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24	$ 358.759,67	19FC-2 días	
28		19,02 SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	3 días	mié 25/12/24	vie 27/12/24	$ 508.573,42	19FC-6 días	
29		19,06 PODA CESPED	3 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24	$ 220.458,81		
30		**20 ADICIONALES**	**37,5 días**	**vie 8/11/24**	**mar 31/12/2**	$ 326.380,68		
31		20,3 DESMONTE REFLECTOR EXTERIOR	2 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24	$ 67.060,03	4	
32		20,4 REINSTALACION REFLECTOR EXTERIOR	2 días	mar 12/11/24	jue 14/11/24	$ 134.120,06	31	
33		20,5 DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION AVISO EXTERIOR INSTITUCIONAL	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24	$ 125.200,59	28	
34		**21 ADICIONALES DIAGNOSTICAS**	**34 días**	**mar 22/10/24**	**lun 9/12/24**	$ 6.710.591,63		
35		1,44 DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E1-3 CM)	5 días	mar 22/10/24	mar 29/10/24	$ 769.946,58		
36		5,03 PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E3CM	5 días	mar 29/10/24	mar 5/11/24	$ 1.928.080,44	35	
37		6,21 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	6 días	vie 29/11/24	lun 9/12/24	$ 2.778.533,55	11	
38		11,04 MONOCAPA MANTO ASFALTICO PARA VIGACANAL	5 días	vie 15/11/24	vie 22/11/24	$ 1.234.031,06	5	

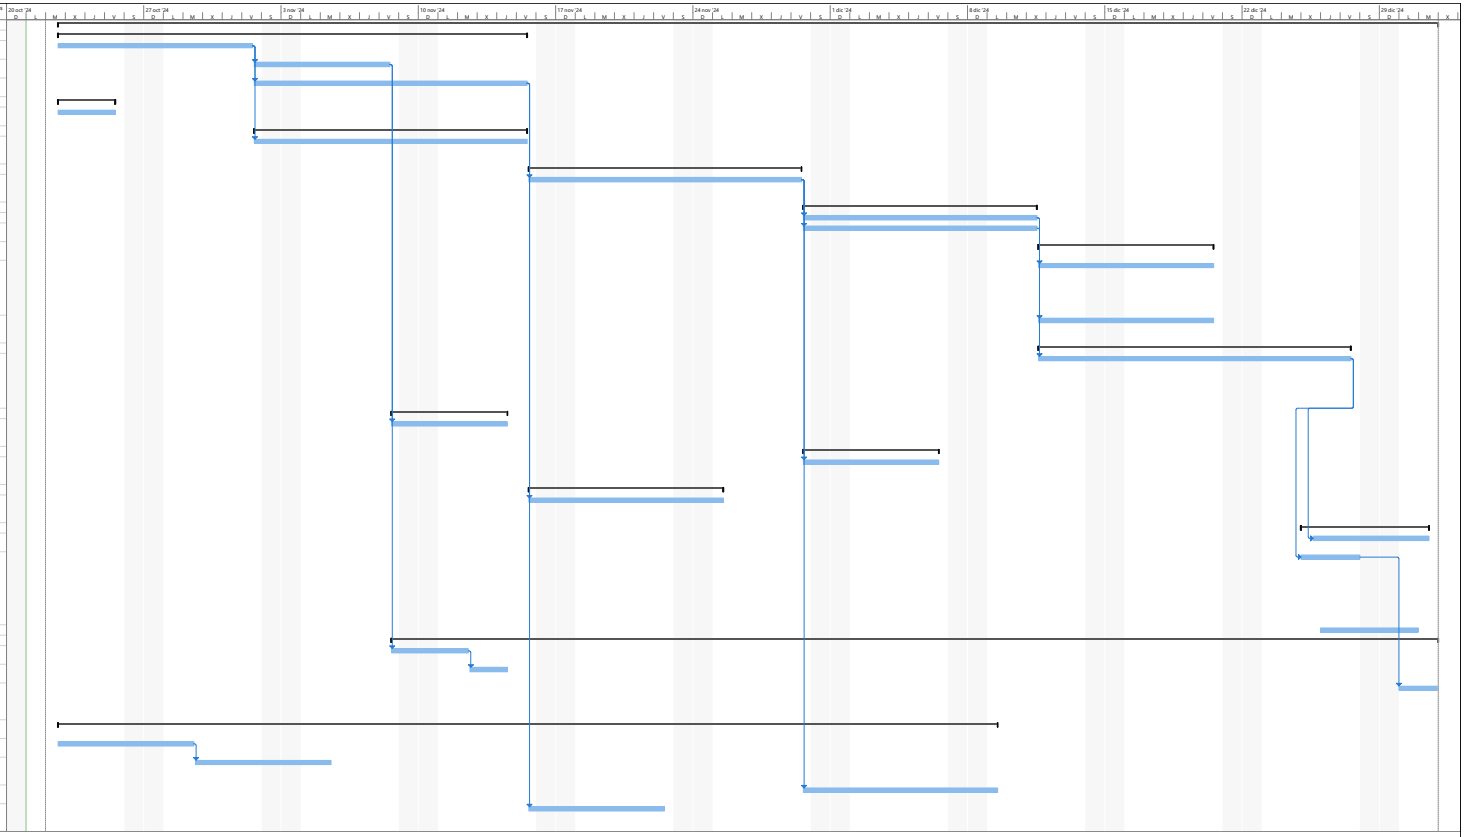

Proyecto: PROGRAMACIÓN MO
Fecha: lun 21/10/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
