
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1		**MANTENIMIENTO PLATO**	**101 días**	**$ 202.235.746,00**	**jue 5/09/24**	**mar 31/12/24**		
2		INICIO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	28 días	$ 0,00	jue 5/09/24	lun 7/10/24		12
3		**PRELIMINARES**	**69 días**	**$ 6.052.409,74**	**lun 7/10/24**	**lun 23/12/24**		
4		DESMONTE DE CIELORRASO	29 días	$ 1.882.691,90	mié 9/10/24	lun 11/11/24	12	35;10
5		DESMONTE VENTANA EN MADERA	2 días	$ 199.646,30	mié 18/12/24	vie 20/12/24	36	6
6		DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	1 día	$ 57.103,20	vie 20/12/24	vie 20/12/24	5	7
7		DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	1 día	$ 53.540,17	sáb 21/12/24	lun 23/12/24	6	15
8		DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=0.60-0.CM)	1 día	$ 63.776,10	vie 11/11/24	sáb 16/11/24	10	11;30
9		DEMOLICIÓN DE PARETE MURO (c=1- 6CM)	2 días	$ 102.436,70	sáb 23/11/24	mar 26/11/24	11	17
10		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	4 días	$ 514.107,80	lun 11/11/24	vie 15/11/24	4	8
11		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	6 días	$ 761.720,86	sáb 16/11/24	vie 22/11/24	8	9
12		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	3 días	$ 327.130,11	lun 7/10/24	mié 9/10/24	2	4
13		**CARPINTERIA EN MADERA**	**6 días**	**$ 2.105.192,23**	**lun 23/12/24**	**lun 30/12/24**		
14		HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM INCLUYE CERRADURA	6 días	$ 1.127.324,93	lun 23/12/24	lun 30/12/24	15CC	18FF
15		MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	6 días	$ 577.687,30	lun 23/12/24	lun 30/12/24	7	14CC
16		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**24 días**	**$ 4.585.320,08**	**mar 26/11/24**	**lun 23/12/24**		
17		PARETE MUROS 1.0 E=10M Incluye Filos y Dilataciones	24 días	$ 4.535.320,08	mar 26/11/24	lun 23/12/24	9	19CC
18		**ENCHAPES MUROS**	**8 días**	**$ 991.790,28**	**mar 26/11/24**	**mié 4/12/24**		
19		ESTUCO PLASTICO INTERIOR	8 días	$ 991.790,28	mar 26/11/24	mié 4/12/24	17CC	23
20		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**31 días**	**$ 1.466.687,80**	**jue 19/12/24**	**mar 31/12/24**		
21		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE (2 MANOS)	31 días	$ 1.466.687,80	jue 19/12/24	mar 31/12/24	40FF	22FF
22		**PINTURAS**	**10 días**	**$ 15.079.680,69**	**mié 4/12/24**	**jue 26/12/24**		
23		VINILO TIPO 2, 2 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima blx y durabilidad	20 días	$ 15.079.680,69	mié 4/12/24	jue 26/12/24	19	22FF
24		**PISOS**	**15 días**	**$ 1.875.838,57**	**lun 2/12/24**	**mié 18/12/24**		
25		PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE	9 días	$ 1.032.201,63	lun 9/12/24	mié 18/12/24	35	44CC
26		AJUSTADO DE PISO 2CM	3 días	$ 843.636,94	lun 2/12/24	mié 4/12/24	27	35
27		**RED ELECTRICA**	**5 días**	**$ 6.979.363,90**	**jue 26/12/24**	**mar 31/12/24**		
28		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	5 días	$ 6.979.363,90	jue 26/12/24	mar 31/12/24	41FF	32FF
29		**RED SANITARIA**	**11 días**	**$ 1.403.909,88**	**sáb 16/11/24**	**jue 28/11/24**		
30		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS-LLUVIAS	11 días	$ 1.403.909,88	sáb 16/11/24	jue 28/11/24	8	37
31		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**9 días**	**$ 2.388.979,92**	**mié 25/12/24**	**mar 31/12/24**		
32		ASEO GENERAL DE OBRA	5,1 días	$ 1.830.406,50	mar 31/12/24	mar 31/12/24	28FF,33FF,34FF,23FF,5	
33		SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	4 días	$ 558.573,42	mié 25/12/24	lun 30/12/24	54FF	31FF
34		**ADICIONALES DIAGNÓSTICAS**	**45 días**	**$ 136.480.407,55**	**lun 11/11/24**	**mar 31/12/24**		
35		DESMONTE DE CUBIERTA	26 días	$ 8.255.799,63	lun 11/11/24	mar 10/12/24	4	36CC
36		DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	30 días	$ 11.161.429,50	lun 11/11/24	mié 18/12/24	35CC	43CC+15 días;5
37		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	2 días	$ 168.830,70	jue 28/11/24	lun 2/12/24	30	24;39;50
38		INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	2 días	$ 184.032,48	mié 25/12/24	jue 26/12/24	44CC;50;52FF	32
39		GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	20 días	$ 7.455.098,24	lun 23/12/24	mar 24/1/24	37	32
40		VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO SISTEMA 50-20 VIDRIO TRANSPARENTE 5MM	25 días	$ 4.803.713,07	mar 3/12/24	mar 31/12/24	41FF	23FF
41		CIELO RASO EN TABLILLA DE PVC DE 7MM	32 días	$ 39.337.199,46	mar 26/11/24	mar 31/12/24	54CC	28FF,48FF,40FF
42		CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	22 días	$ 2.996.274,64	mié 4/12/24	lun 30/12/24	54FF	55
43		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	22 días	$ 37.732.273,25	jue 28/11/24	lun 23/12/24	36CC+15 días	46FF
44		CERAMICA FORMATO 30 X 60	16 días	$ 6.036.960,28	lun 9/12/24	jue 26/12/24	25CC	38CC
45		MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO.5	8 días	$ 611.192,64	mié 4/12/24	lun 9/12/24	26	25
46		ANTICORROSIVO SOBRE LA MINA LINEAL	26 días	$ 8.308.693,50	sáb 23/11/24	lun 23/12/24	43FF	47FF
47		ESMALTE SOBRE LA MINA LINEAL	26 días	$ 6.744.804,25	mar 26/11/24	lun 23/12/24	36FF	54CC
48		LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPARE DE SOBREPONER	4 días	$ 524.5.01,10	jue 26/12/24	mar 31/12/24	41FF	49FF
49		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	2 días	$ 310.977,05	lun 30/12/24	mar 31/12/24	48FF	55
50		TUBERIA PVCP 1/2"	8 días	$ 674.690,65	lun 2/12/24	lun 9/12/24	37	38;51
51		TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	19 días	$ 1.490.700,87	jue 5/12/24	jue 26/12/24	50	52FF
52		SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE REGISTRO METALICA 1/2" ROSCADA- BOLA MANUA	1 día	$ 132.7.79,60	jue 26/12/24	jue 26/12/24	51FF	39FF
53		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**30 días**	**$ 23.483.195,56**	**mar 26/11/24**	**lun 30/12/24**		
54		Tejo en Fibrocemento 3* 3* 8	30 días	$ 23.483.195,56	mar 26/11/24	lun 30/12/24	47CC	43FF,45CC,39FF
55		FIN	0 días	$ 0,00	mar 31/12/24	mar 31/12/24	32;48;42	

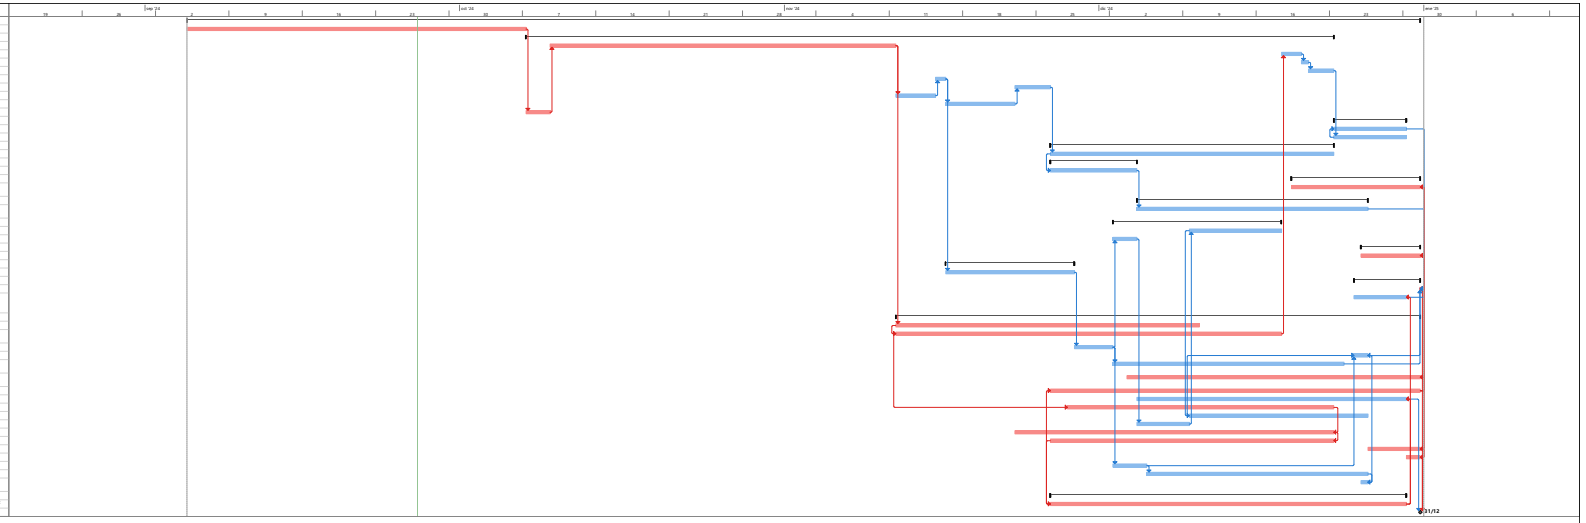

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: vie 27/09/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · sólo el comienzo · sólo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
