
Id	item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**1 PROGRAMACION SNR GUAPI-CAUCA**	**$ 96.896.687,00**	**76 días**	**mar 15/10/24**	**mar 31/12/2**	
2		**1.1 REALIZACION AL 31 DE DICIEMBRE**	**$ 96.896.687,00**	**76 días**	**mar 15/10/24**	**mar 31/12/2**	
3	**1**	**1.1.1 PRELIMINARES**	**$ 4.367.543,27**	**33 días**	**mar 15/10/24**	**sáb 16/11/2**	
4	1,04	1.1.1.1 DESMONTE DE CIELORRASO	$ 1.071.174,53	10 días	mar 15/10/24	jue 24/10/24	
5	1,10	1.1.1.2 DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	$ 562.902,91	8 días	jue 24/10/24	vie 1/11/24	4
6	1,55	1.1.1.3 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	$ 631.253,77	6 días	jue 24/10/24	mié 30/10/2	5CC
7	1,57	1.1.1.4 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	$ 309.647,03	4 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24	6CC
8	1.67	1.1.1.5 GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	$ 1.469.489,79	15 días	vie 1/11/24	sáb 16/11/24	5
9	1,73	1.1.1.6 CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	$ 323.075,24	3 días	mar 15/10/24	jue 17/10/24	4CC
10	**4**	**1.1.2 CIELORRASOS**	**$ 6.123.719,67**	**26 días**	**mié 4/12/24**	**mar 31/12/2**	
11	4,02	1.1.2.1 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	$ 6.123.719,67	26 días	mié 4/12/24	mar 31/12/2	21FF
12	**5**	**1.1.3 CONCRETOS Y MORTEROS**	**$ 2.253.324,47**	**22 días**	**lun 9/12/24**	**mar 31/12/2**	
13	5.02	1.1.3.1 PAÑETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	$ 2.253.324,47	22 días	lun 9/12/24	mar 31/12/2	11FF
14	**6**	**1.1.4 CUBIERTAS**	**$ 30.970.731,45**	**28 días**	**mar 3/12/24**	**mar 31/12/2**	
15	6,16	1.1.4.1 ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	$ 30.970.731,45	28 días	mar 3/12/24	mar 31/12/2	23FC+25 días
16	**12**	**1.1.5 MUROS - MAMPOSTERÍA**	**$ 715.030,47**	**15 días**	**mar 3/12/24**	**mié 18/12/2**	
17	12.02	1.1.5.1 ALFAGÍA EN CONCRETO 25CM	$ 715.030,47	15 días	mar 3/12/24	mié 18/12/2	15CC
18	**14**	**1.1.6 PISOS**	**$ 786.361,45**	**9 días**	**sáb 21/12/24**	**mar 31/12/2**	
19	14.13	1.1.6.1 ALISTADO DE PISO 2CM	$ 786.361,45	9 días	sáb 21/12/24	mar 31/12/2	15FF
20	**19**	**1.1.7 RED ELÉCTRICA**	**$ 549.121,95**	**1 día**	**mar 31/12/24**	**mar 31/12/2**	
21	19.01	1.1.7.1 ASEO GENERAL DE OBRA	$ 549.121,95	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/2	36FC-1 día
22	**20**	**1.1.8 ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 51.130.854,27**	**75,81 días**	**mar 15/10/24**	**mar 31/12/2**	
23	1.11	1.1.8.1 DESMONTE DE CUBIERTA	$ 3.345.363,30	23 días	mar 15/10/24	jue 7/11/24	4CC
24	1.15	1.1.8.2 DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIA	$ 3.437.095,78	23 días	jue 7/11/24	sáb 30/11/24	23
25	1.17	1.1.8.3 DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	$ 295.587,79	3 días	jue 7/11/24	sáb 9/11/24	23
26	6.21	1.1.8.4 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	$ 2.846.453,26	22 días	sáb 9/11/24	mar 3/12/24	25
27	6.22	1.1.8.5 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	$ 17.472.638,45	27 días	mar 3/12/24	mar 31/12/24	26
28	7.01	1.1.8.6 ESTUCO EXTERIOR	$ 1.783.716,11	17 días	vie 13/12/24	mar 31/12/24	13FF
29	10.02	1.1.8.7 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	$ 2.085.322,94	20 días	mié 11/12/24	mar 31/12/24	30FF
30	10.04	1.1.8.8 PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	$ 2.966.497,09	26 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	28FF
31	11.03	1.1.8.9 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON POLIUREA E=1,5MM	$ 6.576.126,65	20 días	mié 11/12/24	mar 31/12/24	29CC
32	12.1	1.1.8.10 MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	$ 1.843.476,73	18 días	sáb 2/11/24	vie 22/11/24	9CC+20 días
33	20.02	1.1.8.11 MANTENIMIENTO REJA METALICA	$ 765.680,86	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/2	29FF
34	NP-01	1.1.8.12 RETIRO DE PINTURA Y ESTUCO.INCLUYE APLICACIÓN DE IMPRIMANTE	$ 2.471.430,27	24 días	sáb 9/11/24	jue 5/12/24	25
35	NP-02	1.1.8.13 Mantenimiento de cieloraso en fibra mineral .Incluye nivelación de estructura, cambio de estructura en mal estado,instalación de cuelgas y reinstalación de laminas en buen estado.	$ 5.241.465,04	28 días	lun 2/12/24	mar 31/12/24	27FF
36		1.1.8.14 FIN ACTIVIDADES	$ 0,00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/2	

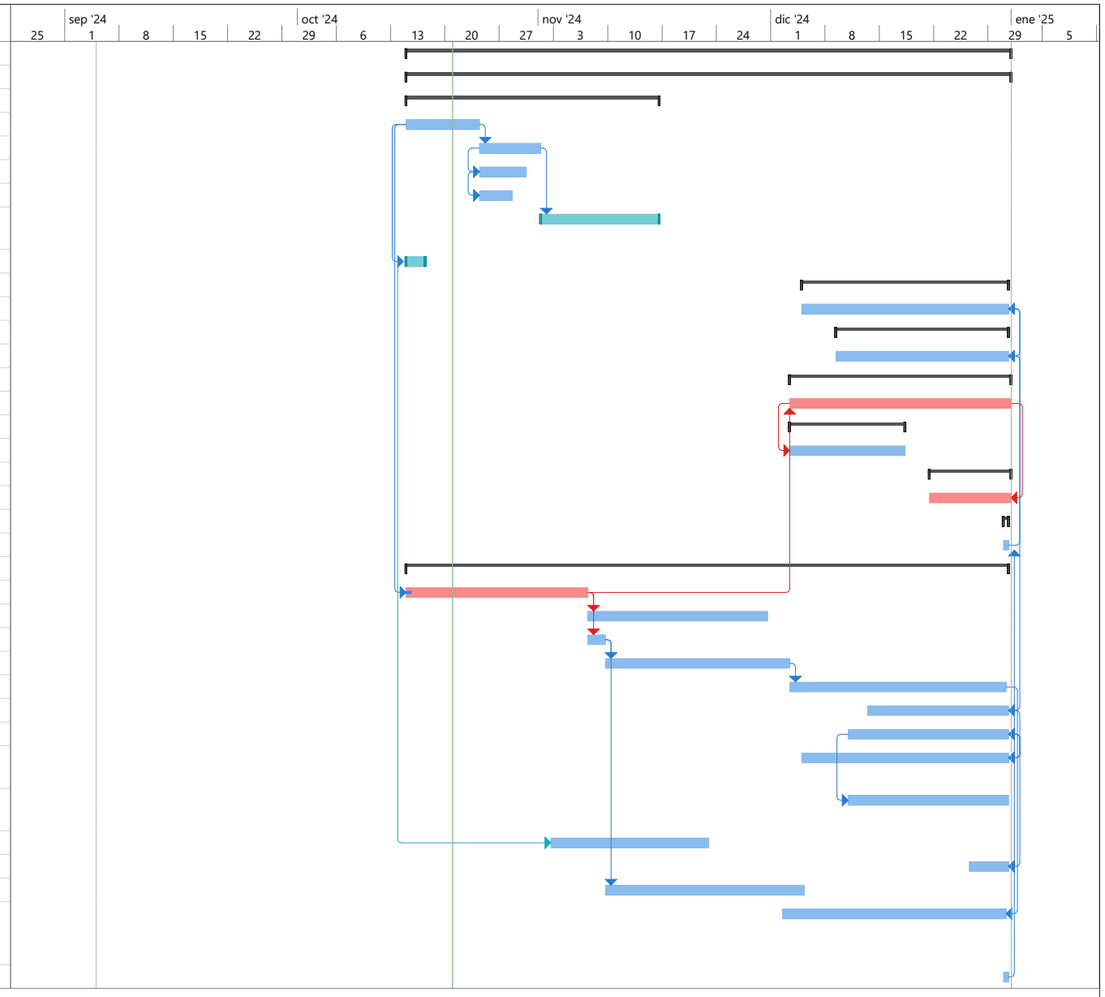

Proyecto: msproj11
Fecha: lun 21/10/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual
