
| Id | item | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **1 PROGRAMACION SNR LA UNION** | **$ 65.728.960,00** | **90 días** | **lun 30/09/24** | **mar 31/12/2** | | | |
| 2 | | **1.1 REALIZACION AL 31 DE DICIEMBRE** | **$ 65.728.960,00** | **90 días** | **lun 30/09/24** | **mar 31/12/2** | | | |
| 3 | **1** | **1.1.1 PRELIMINARES** | **$ 6.608.484,74** | **20 días** | **lun 30/09/24** | **sáb 19/10/2** | | | |
| 4 | 1,04 | 1.1.1.1 DESMONTE DE CIELORRASO | $ 832.810,13 | 10 días | lun 30/09/24 | mié 9/10/24 | | 5;39CC;8 | |
| 5 | 1,10 | 1.1.1.2 DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | $ 25.586,50 | 8 días | mié 9/10/24 | vie 18/10/24 | 4 | 6CC;9 | |
| 6 | 1,13 | 1.1.1.3 DESMONTE DE CUBIERTA MIXTA EN TEJA DE BARRO Y ONDULADA | $ 3.948.406,31 | 10 días | mié 9/10/24 | sáb 19/10/24 | 5CC | 7CC | |
| 7 | 1,14 | 1.1.1.4 DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE | $ 325.140,82 | 10 días | mié 9/10/24 | sáb 19/10/24 | 6CC | 20 | |
| 8 | 1,44 | 1.1.1.5 DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM) | $ 962.433,23 | 2 días | mié 9/10/24 | vie 11/10/24 | 4 | 18FC+5 días | |
| 9 | 1,57 | 1.1.1.6 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | $ 514.107,75 | 2 días | vie 18/10/24 | sáb 19/10/24 | 5 | 20FC+20 días;44 | |
| 10 | **2** | **1.1.2 CARPINTERÍA EN MADERA** | **$ 1.976.810,26** | **10 días** | **vie 20/12/24** | **mar 31/12/2** | | | |
| 11 | 2,09 | 1.1.2.1 MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM | $ 730.718,92 | 5 días | vie 20/12/24 | jue 26/12/24 | 27FF | 12 | |
| 12 | 2,10 | 1.1.2.2 MUEBLE BAJO MESÓN COCINA | $ 1.246.091,34 | 5 días | jue 26/12/24 | mar 31/12/2 | 11 | 46 | |
| 13 | **3** | **1.1.3 CARPINTERÍA METÁLICA** | **$ 752.695,55** | **4 días** | **vie 25/10/24** | **mié 30/10/2** | | | |
| 14 | 3,05 | 1.1.3.1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE | $ 752.695,55 | 4 días | vie 25/10/24 | mié 30/10/2 | 44 | 36 | |
| 15 | **4** | **1.1.4 CIELORRASOS** | **$ 12.293.955,96** | **14 días** | **mié 11/12/24** | **jue 26/12/24** | | | |
| 16 | 4.02 | 1.1.4.1 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM | $ 12.293.955,96 | 14 días | mié 11/12/24 | jue 26/12/24 | 20FF | 29FF | |
| 17 | **5** | **1.1.5 CONCRETOS Y MORTEROS** | **$ 2.410.100,55** | **25 días** | **jue 17/10/24** | **mar 12/11/2** | | | |
| 18 | 5,03 | 1.1.5.1 PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilatacione | $ 2.410.100,55 | 25 días | jue 17/10/24 | mar 12/11/2 | 8FC+5 días | 27 | |
| 19 | **6** | **1.1.6 CUBIERTAS** | **$ 19.078.034,30** | **45 días** | **sáb 9/11/24** | **jue 26/12/24** | | | |
| 20 | 6,22 | 1.1.6.1 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM | $ 19.078.034,30 | 45 días | sáb 9/11/24 | jue 26/12/24 | 9FC+20 días;7 | 22FF;16FF;24FF;40FF | |
| 21 | **7** | **1.1.7 ENCHAPE MUROS** | **$ 826.491,90** | **15 días** | **mar 10/12/24** | **jue 26/12/24** | | | |
| 22 | 7,02 | 1.1.7.1 ESTUCO PLASTICO INTERIOR | $ 826.491,90 | 15 días | mar 10/12/24 | jue 26/12/24 | 20FF | 36FF | |
| 23 | **10** | **1.1.8 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS** | **$ 4.005.634,94** | **31 días** | **lun 25/11/24** | **jue 26/12/24** | | | |
| 24 | 10,02 | 1.1.8.1 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | $ 3.150.794,60 | 31 días | lun 25/11/24 | jue 26/12/24 | 20FF | 25FF;38FF | |
| 25 | 10,05 | 1.1.8.2 PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS] | $ 854.840,34 | 10 días | lun 16/12/24 | jue 26/12/24 | 24FF | 32FF;27FF | |
| 26 | **13** | **1.1.9 PINTURAS** | **$ 11.113.337,24** | **10 días** | **lun 16/12/24** | **jue 26/12/24** | | | |
| 27 | 12,02 | 1.1.9.1 VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad | $ 11.113.337,24 | 10 días | lun 16/12/24 | jue 26/12/24 | 25FF;18 | 11FF | |
| 28 | **15** | **1.1.10 RED ELÉCTRICA** | **$ 546.303,83** | **10 días** | **lun 16/12/24** | **jue 26/12/24** | | | |
| 29 | 15,09 | 1.1.10.1 LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA | $ 235.326,78 | 10 días | lun 16/12/24 | jue 26/12/24 | 16FF | 30CC | |
| 30 | 15,46 | 1.1.10.2 BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO | $ 310.977,05 | 3 días | lun 16/12/24 | mié 18/12/2 | 29CC | 46 | |
| 31 | **16** | **1.1.11 RED HIDRÁULICA** | **$ 379.781,26** | **10 días** | **lun 16/12/24** | **jue 26/12/24** | | | |
| 32 | 16,23 | 1.1.11.1 LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE | $ 379.781,26 | 10 días | lun 16/12/24 | jue 26/12/24 | 25FF | 34;36 | |
| 33 | **17** | **1.1.12 RED SANITARIA** | **$ 70.264,88** | **1 día** | **jue 26/12/24** | **vie 27/12/24** | | | |
| 34 | 17,16 | 1.1.12.1 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" | $ 70.264,88 | 1 día | jue 26/12/24 | vie 27/12/24 | 32 | 46 | |
| 35 | **19** | **1.1.13 ASEO-SEÑALIZACIÓN** | **$ 439.297,56** | **1 día** | **lun 30/12/24** | **lun 30/12/24** | | | |
| 36 | 19,01 | 1.1.13.1 ASEO GENERAL DE OBRA | $ 439.297,56 | 1 día | lun 30/12/24 | lun 30/12/24 | 32;43;42FF;39FF | 46 | |
| 37 | **20** | **1.1.14 ITEMS NO PREVISTOS** | **$ 5.227.767,03** | **70 días** | **sáb 19/10/24** | **mar 31/12/2** | | | |
| 38 | NP1 | 1.1.14.1 MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL | $ 1.919.604,51 | 25 días | jue 14/11/24 | jue 26/12/24 | 24FF | 36FF | |
| 39 | NP2 | 1.1.14.2 CANALETA PLASTICA 100X45MM | $ 266.612,23 | 15 días | lun 9/12/24 | lun 23/12/24 | 4CC | 36FF | |
| 40 | NP3 | 1.1.14.3 CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm | $ 505.316,31 | 8 días | mar 17/12/24 | jue 26/12/24 | 20FF | 41 | |
| 41 | NP4 | 1.1.14.4 SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT | $ 212.770,06 | 2 días | jue 26/12/24 | sáb 28/12/24 | 40 | 42 | |
| 42 | NP5 | 1.1.14.5 GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | $ 988.686,04 | 2 días | sáb 28/12/24 | lun 30/12/24 | 41 | 36FF | |
| 43 | NP6 | 1.1.14.6 BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG | $ 537.807,66 | 5 días | jue 14/11/24 | mié 20/11/24 | 44CF | 36 | |
| 44 | NP7 | 1.1.14.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA ORINAL 2" | $ 90.293,52 | 6 días | sáb 19/10/24 | vie 25/10/24 | 9 | 45CC;14;43CF | |
| 45 | NP8 | 1.1.14.8 CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | $ 706.676,70 | 2 días | sáb 19/10/24 | mar 22/10/2 | 44CC | 36 | |
| 46 | | 1.1.14.9 FIN ACTIVIDADES | $ 0,00 | 0 días | mar 31/12/24 | mar 31/12/2 | 36;12;30;34 | | |

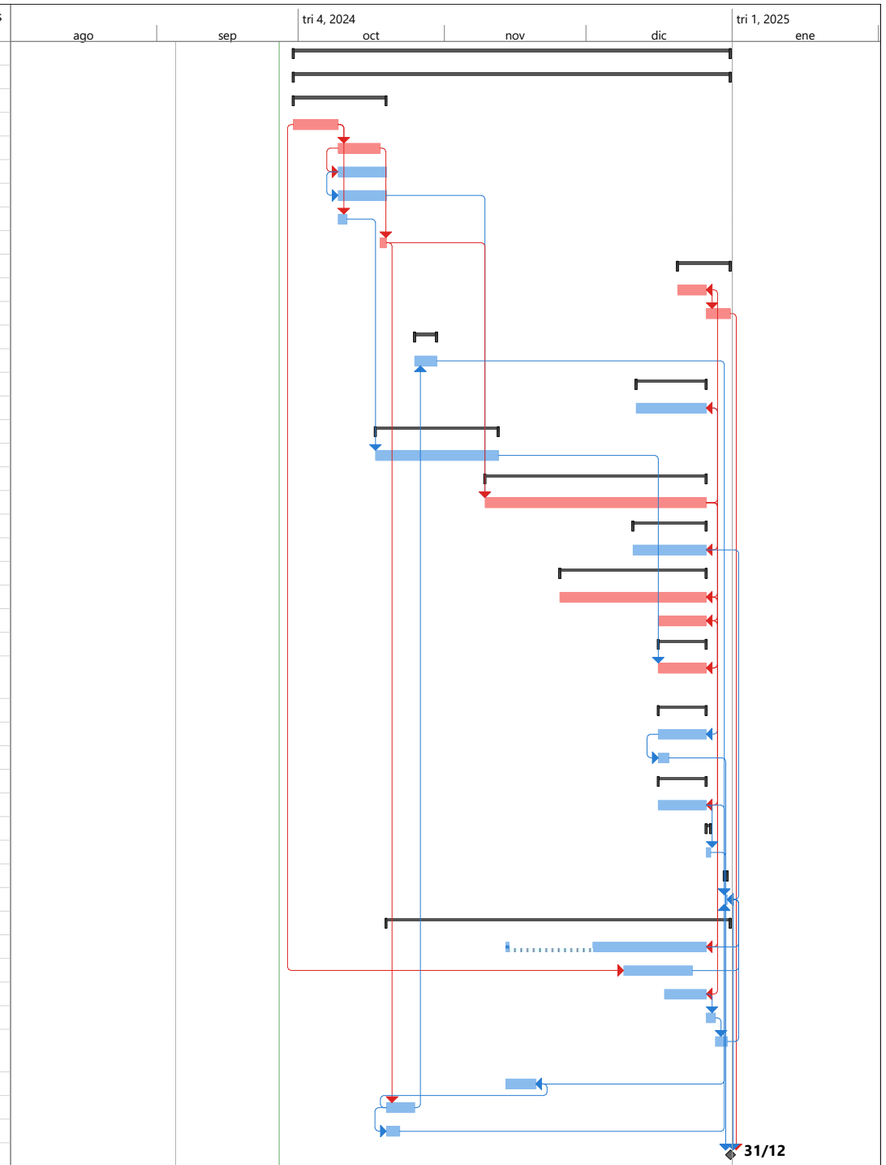


Proyecto: msproj11
Fecha: vie 27/09/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual
