
| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **OFICINA ORIP CARTAGO** | **105 días** | **jue 5/09/24** | **mar 31/12/24** | |
| 2 | | VISITA, DIAGNOSTICO Y LOGISTA | 35 días | jue 5/09/24 | lun 14/10/24 | |
| 3 | | **INICIO DEL PROYECTO** | 0 días | lun 14/10/24 | lun 14/10/24 | 2 |
| 4 | | **PRELIMINARES** | **54 días** | **lun 14/10/24** | **vie 13/12/24** | |
| 5 | | DESMONTE DE CIELORRASO | 1 día | lun 9/12/24 | mar 10/12/24 | 18 |
| 6 | | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | 1 día | mar 15/10/24 | mié 16/10/24 | 10 |
| 7 | | DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE | 1 día | mié 16/10/24 | jue 17/10/24 | 6 |
| 8 | | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 75 |
| 9 | | DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA | 2 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | 19 |
| 10 | | DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA AL | 1 día | lun 14/10/24 | mar 15/10/24 | 3 |
| 11 | | DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO | 8 días | mar 15/10/24 | jue 24/10/24 | 22 |
| 12 | | DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM) | 11 días | lun 14/10/24 | sáb 26/10/24 | 11FF;22CC |
| 13 | | DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM) | 4 días | mar 5/11/24 | vie 8/11/24 | 67 |
| 14 | | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM) | 2 días | sáb 26/10/24 | mar 29/10/24 | 12 |
| 15 | | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA | 2 días | mar 29/10/24 | jue 31/10/24 | 14 |
| 16 | | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | 1 día | mié 4/12/24 | mié 4/12/24 | 71 |
| 17 | | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | 2 días | mar 15/10/24 | jue 17/10/24 | 22 |
| 18 | | RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA | 4 días | mié 4/12/24 | lun 9/12/24 | 51;24 |
| 19 | | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M) | 3 días | mar 29/10/24 | jue 31/10/24 | 14 |
| 20 | | LLENO MATERIAL DE SITIO | 2 días | jue 7/11/24 | sáb 9/11/24 | 59 |
| 21 | | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN | 3 días | mar 10/12/24 | vie 13/12/24 | 9;13;67;20; |
| 22 | | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M | 1 día | lun 14/10/24 | mar 15/10/24 | 3 |
| 23 | | **CARPINTERÍA EN MADERA** | **6 días** | **lun 2/12/24** | **sáb 7/12/24** | |
| 28 | | **CARPINTERÍA METÁLICA** | **2 días** | **mié 4/12/24** | **vie 6/12/24** | |
| 29 | | DIVISIÓN SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE | 2 días | mié 4/12/24 | vie 6/12/24 | 16 |
| 30 | | **CIELORRASOS** | 2 días | **mar 10/12/24** | **jue 12/12/24** | |
| 31 | | CIELORRASO EN VINIL Y FOIL DE ALUMINIO 61CMX61CM | 2 días | mar 10/12/24 | jue 12/12/24 | 5 |
| 32 | | **CONCRETOS Y MORTEROS** | 5 días | **vie 8/11/24** | **jue 14/11/24** | |
| 33 | | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilate | 5 días | vie 8/11/24 | jue 14/11/24 | 13 |
| 34 | | **ENCHAPE MUROS** | 1 día | **lun 9/12/24** | **mar 10/12/24** | |
| 35 | | ESTUCO PLASTICO INTERIOR | 1 día | lun 9/12/24 | mar 10/12/24 | 18;33 |
| 36 | | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | 3 días | **mar 12/11/24** | **vie 15/11/24** | |
| 37 | | PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo | 3 días | mar 12/11/24 | vie 15/11/24 | 73;20 |
| 38 | | **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS** | 3 días | **mar 10/12/24** | **vie 13/12/24** | |
| 39 | | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | 3 días | mar 10/12/24 | vie 13/12/24 | 35 |
| 40 | | **PINTURAS** | 15 días | **mié 11/12/24** | **vie 27/12/24** | |
| 41 | | VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad | 15 días | mié 11/12/24 | vie 27/12/24 | 45;35 |
| 42 | | **PISOS** | **23 días** | **vie 15/11/24** | **mié 11/12/24** | |
| 43 | | PISO GRANITO MARMOL | 14 días | sáb 23/11/24 | lun 9/12/24 | 44 |
| 44 | | ALISTADO DE PISO 2CM | 7 días | vie 15/11/24 | sáb 23/11/24 | 37;70;33 |
| 45 | | GUARDAESCOBA GRANITO MARMOL 8-10 CM | 4 días | vie 6/12/24 | mié 11/12/24 | 15;43FF+2 |
| 46 | | **RED HIDRÁULICA** | **24 días** | **mié 6/11/24** | **mar 3/12/24** | |
| 47 | | TUBERÍA PVCP 1/2" | 1 día | vie 8/11/24 | sáb 9/11/24 | 52 |
| 48 | | PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 6;66 |
| 49 | | PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml | 1 día | mié 6/11/24 | jue 7/11/24 | 48 |
| 50 | | TAPA REGISTRO 20X20CM | 1 día | lun 2/12/24 | mar 3/12/24 | 69 |
| 51 | | TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | 7;47 |
| 52 | | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2 | 1 día | jue 7/11/24 | vie 8/11/24 | 49 |
| 53 | | **RED SANITARIA** | **28 días** | **lun 4/11/24** | **mié 4/12/24** | |
| 54 | | CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM | 1 día | jue 7/11/24 | vie 8/11/24 | 59;55;60 |
| 55 | | RED SANITARIA COLECTORA 6" | 1 día | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | 9 |
| 56 | | SALIDA SANITARIA INODORO 4" | 1 día | mié 6/11/24 | jue 7/11/24 | 60 |
| 57 | | SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" | 1 día | jue 7/11/24 | vie 8/11/24 | 59 |
| 58 | | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" | 1 día | vie 8/11/24 | sáb 9/11/24 | 57 |
| 59 | | TUBERÍA PVCS 2" | 1 día | mié 6/11/24 | jue 7/11/24 | 60 |
| 60 | | TUBERÍA PVCS 4" | 2 días | mar 5/11/24 | mié 6/11/24 | 55 |
| 61 | | SANITARIO TIPO AHORRADOR | 1 día | mié 4/12/24 | mié 4/12/24 | 71 |
| 62 | | **ASEO-SEÑALIZACIÓN** | **16 días** | **vie 13/12/24** | **mar 31/12/24** | |
| 63 | | ASEO GENERAL DE OBRA | 3 días | vie 27/12/24 | mar 31/12/24 | 29;31;41;61 |
| 64 | | SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALI | 1 día | vie 13/12/24 | sáb 14/12/24 | 39 |
| 65 | | **NO PREVISTOS** | **43 días** | **jue 31/10/24** | **mié 18/12/24** | |
| 66 | | DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE | 1 día | mar 5/11/24 | mar 5/11/24 | 9;67 |
| 67 | | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO | 4 días | jue 31/10/24 | mar 5/11/24 | 15 |
| 68 | | MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 día | vie 8/11/24 | sáb 9/11/24 | 54 |
| 69 | | CERÁMICA FORMATO 30X60CM | 8 días | vie 22/11/24 | lun 2/12/24 | 47;44FC-1 |
| 70 | | TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70 | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | 68 |
| 71 | | LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería | 1 día | mar 3/12/24 | mar 3/12/24 | 50 |
| 72 | | SALIDA SANITARIA BAÑO 2" | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | 58 |
| 73 | | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" | 1 día | lun 11/11/24 | mar 12/11/24 | 72 |
| 74 | | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA PARA VANOS DE PATIOS | 8 días | lun 9/12/24 | mié 18/12/24 | 18 |
| 75 | | DESMONTE DE MUEBLE BAJO DE COCINA | 1 día | mar 5/11/24 | mar 5/11/24 | 67 |
| 76 | | **FIN DEL PROYECTO** | 0 días | mar 31/12/24 | mar 31/12/24 | 63 |



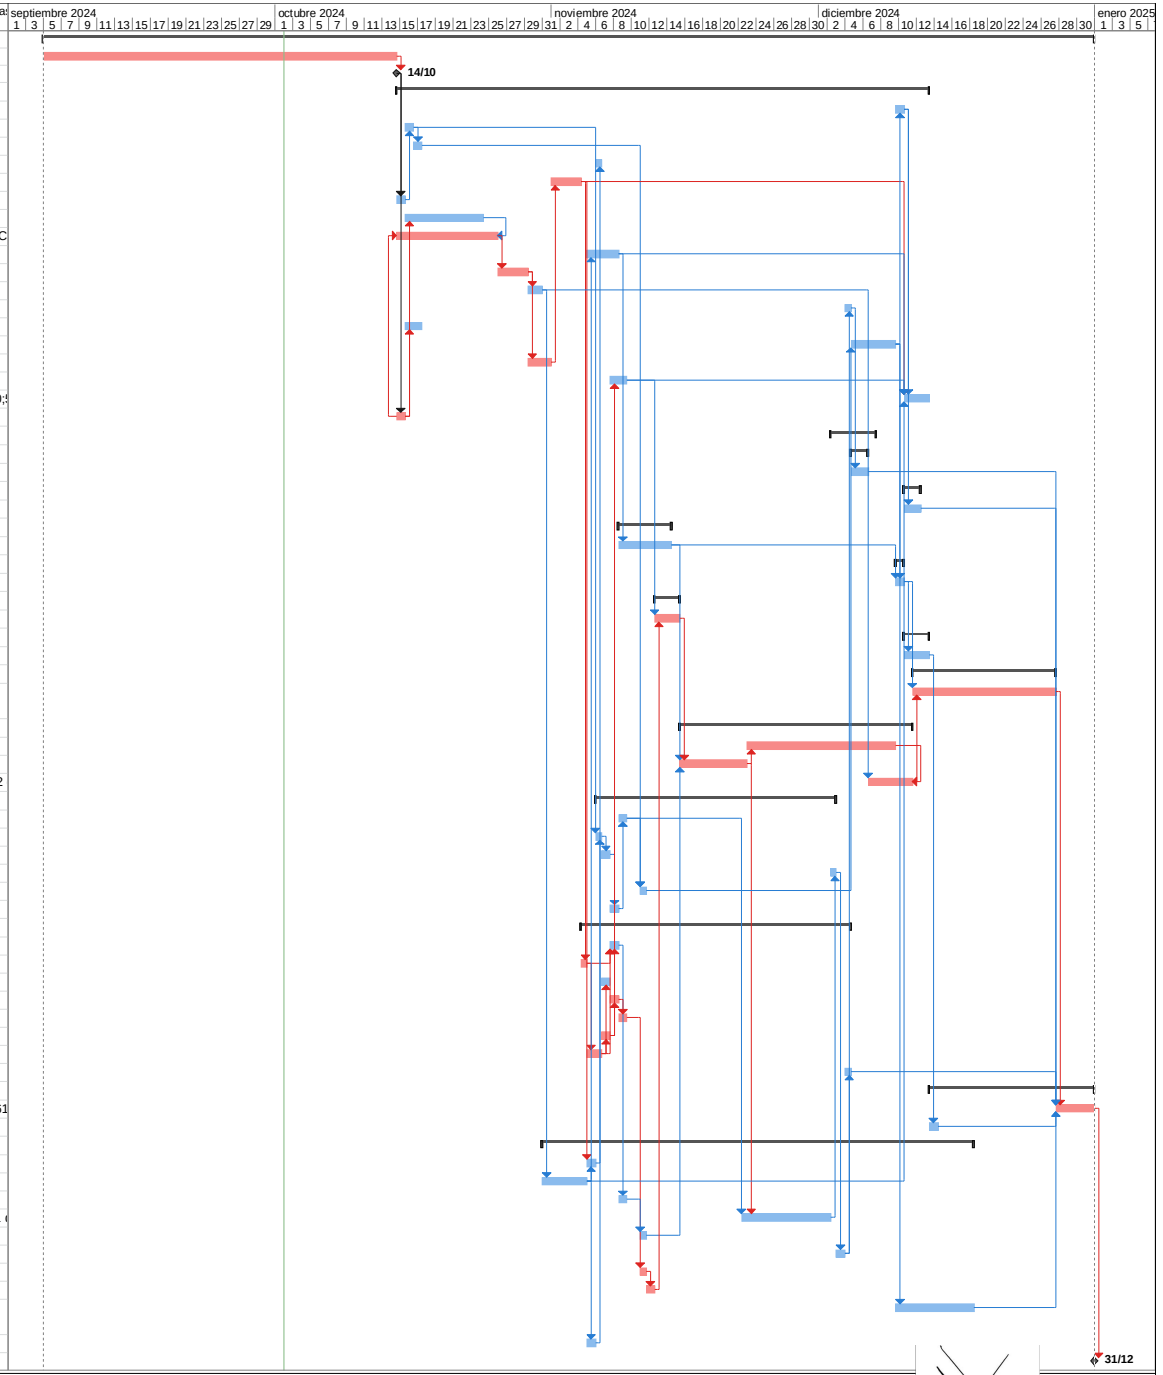


This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.
