Finalizan labores 5:00 pm
Nelbys Boten
Viernes 26 julio - 2024
Inicia pañete en menaje en la parte superior de la continua al muro, se funde viga en el muro del area de basura, estuco en el area de menaje en los mesones, resane de losa con Sika dur 32, pintura en vigas y columnas en area de cocina.
Nelbys Boten

Sabado 27 julio 2024.
Inician labores. 8:00 Am
Continua pañete en muros de menaje y Club de basura, enchape en filos de muros en menaje y cocina, resane de losa con Sika dur 32 finalizan labores 3:00 pm
Nelbys Boten

Lunes 29 julio 2024.
Inician labores con 5 trabajadores 8:00 Am, Continuan los resanes de la losa con Sikadur 32, Continua pañete en muros en menaje y Club de basura, inicia instalación de cielo raso en menaje. Finalizan labores 5:30 pm. Melbys Botero

Martes 30 de julio 2024.
Inician labores 6 trabajadores 8:00 Am, Continua pañete de muros en club de basura, estuco en muros ~~y cielo raso~~ en comedor, Continua instalación de cielo raso en menaje y club de basura. Finalizan labores 5:30 pm.
Melbys Botero

Miercoles 31 de julio 2024
Inician labores 6 trabajadores 8:00 Am, Continua estuco en

muros comedor, finaliza instalac
de cielo raso, se estuca cielo
raso en el area de menaje,
estuco y pintura en baño, se
estuca muro en el area de
menaje y basura, continuan
remates de enchape en cocina
se terminan los resanes en la
parte superior de los muros
Finaliza jornada laboral 5:30p

Nelbys Boter

BITACORA IED PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - SEDE 2.

27-06-2024

Estado del clima: Soleado

Se encuentran en la obra 4 trabajadores realizando demolición de muro, losa y pañete sobre muros, recolección de material RCD, fundida de pegón.

Contratista

Interventoría

28-06-2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: 4 trabajadores

Se ejecutan demolición de cubierta, instalación de perfiles metálicos, demolición de losa, pañete sobre muros.

Contratista

Interventoría

29-06-2024

Se continuan realizando las mismas actividades del día anterior, fundida de pegón

Contratista

Interventoría

30-06-2024

No se laboró (Domingo)

01-07-2024

Se encuentran en la obra 4 trabajadores realizan limpieza general, pañete sobre muro e instalación de cubierta, construcción de registro partición para cocina, excavación para zapata en comedor

Contratista

Interventoría

02-07-2024

Personal en obra: 5 trabajadores

Se ejecuta acopio de material RCD, retiro del mismo, pañete sobre muros e instalación de perfiles metálicos, corte de losa en concreto, excavación para zapata en comedor, fundida de la misma

Contratista

Interventoría

03-07-2024

Estado del clima: Soleado

Se encuentran 5 trabajadores en la obra ejecutando instalación de perfiles metálicos, demolición de losa, instalación de enchape acabado de material LCD, pañete sobre muros, filos de ventanas y puertas, mantenimiento de perfiles metálicos, creación para zapatas.

Contratista

Interventoría

04-07-2024

Estado del clima: Nublado

Se encuentran 5 trabajadores en la obra ejecutando pañete sobre muro, desmonte de cubierta, armado de columnas en zona de comedor, construcción de registro sanitario para cocina, fundida de zapatas y pedestales en comedor, corte y demolición de muro.

Contratista

Interventoría

05-07-2024

Estado del clima: Nublado

Se encuentran 9 trabajadores en la obra ejecutando enchape sobre muros, y limpieza del area, fundida de zapatas en pedestales corte y demolición de muro

Contratista

Interventoría

06-07-2024

Estado del clima: Soleado

Se encuentran en la obra 6 trabajadores realizando enchape instalación de estructura metálica, pañete de muros, limpieza del area, filos de ventanas y puertas

Contratista

Interventoría

08-07-2024

Estado del clima: Soleado

Se encuentran en obra 4 trabajadores realizando enchape, limpieza del area y pañete de muros, encofrado a cubierta, construcción de registro sanitario para cocina.

09-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Se encuentran en la obra 5 trabajadores realizando Pañete en sala de Profesores, instalación de Perfiles y cubierta, Enchapes en cubierta.

Manuel De La Hoz O.
Contratista

Interventoría

10-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Se encuentran en la obra 5 trabajadores realizando Pañete en sala de Profesores, instalación de Perfiles y cubierta.

Manuel De La Hoz O.
Contratista

Interventoría

11-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Se encuentran en la obra 6 trabajadores realizando Pañete, enchape, instalación de cubierta en sala de Profesores.

Manuel De La Hoz O
Contratista

Interventoría

12-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Se encuentran en la obra 6 trabajadores realizando las mismas actividades del día anterior y adicional limpieza general del area.

Manuel De La Hoz O.
Contratista

Interventoría

13-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Se encuentran en la obra 6 trabajadores realizando enchape, estuco interior y exterior, limpieza, pañete y filos de ventana

Manuel De La Hoz O.
Contratista

Interventoría

14-07-2024

Día sabado: NO se labora

15-07-2024

NO se labora

16-07-2024

Se encuentran en la obra 6 trabajadores realizando enchape plantilla, instalación de tubería en baño, cerramiento blando.

Contratista

Interventoría

17-07-2024

Se encuentran en la obra 6 trabajadores realizando las mismas actividades del día anterior.

Contratista

Interventoría

18-07-2024

Se encuentran en la obra 6 trabajadores realizando instalación de pisos, resane de muros, trampa de grasa, instalación de cubierta.


Contratista

Interventoría

16-07-2024

Se realiza visita con EQUIPO para definir actividades restantes.

* Sala de profesores:
- Instalar perfil aokconcel
- Emparejar textura de muros y plomos.
- Pulido de pisos
- 2Calo en pintura.
- acabados de muros.
- Instalación de ventana y puerta.
- Se definen los sgtes puntos electricos.

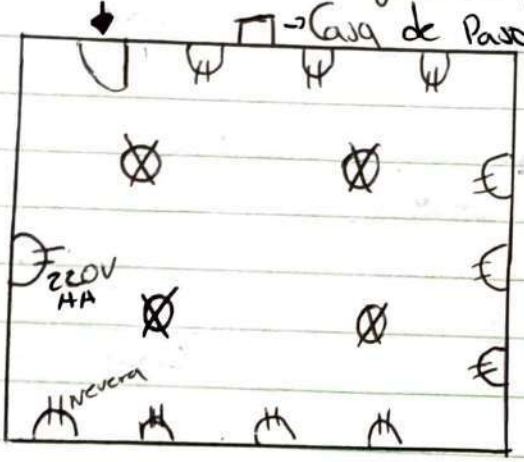

Nota: Altura punto AA 2.4 mts
Tomas Normales 0.4 - 0.5 mts

* Sala de profesores existentes.
- Desmonte de pta corrediza en acceso a sala de profesores.
- Demolición de muro
- Reparación de cielo raso pasillo
- Desmonte de mobiliario
- Desmonte de pta en madera.
- apertura de vano.

* Salon 11A y 11B.
- Desmonte de cielo raso.
- Reforzo de estructura.
- Instalación de cielo raso nuevo.
-

Salon 9B.
- Instalar perfiles ocultos.
- Pintar perfiles.

Interventoria. Ing. f. EPUBOTA SA,

19 de Julio 2024.
Estado del clima: Dia soleado
se encuentran en obra 4 trabajadores realizando las sigtes actividades:
- Estuco sobre muros
- Piso en granito y estructura metalica para la cubierta
- Inicio de instalaciones electricas y especificación de muros.

Contratista

Interventoria

20 - 07 - 2024
Estado del clima: Dia soleado
Trabajadores: 4.
se encuentran en la obra 4 obreros ejecutando las sigtes actividades
- Estuco sobre muros
- Piso en granito y estructura metalica para la cubierta
- Mantenimiento de estructuras metalica en cursos
- Vaciado de columnas restantes en area de camerinos e instalación de cubierta, Inicio de instalaciones electricas y especificación de muros.

Contratista

Interventoria

21 - 07 - 2024
Dia domingo. no laborado

Contratista

Interventoria

22-07-2024

Estado del clima: Día soleado

se encuentran en la obra 4 trabajadores ejecutando

- Fortalecimiento de estructuras metálicas en curso
- Vaciado de columnas restantes en área de comedor.
- Instalación de cubierta, instalación de wind para endoape
- Relleno con material de sitio, fundido de plantilla en área de Zapata

Manuel de la Hoz O.
Contratista

Interventoría

23-07-2024

Trabajadores: 4 obreros

Ejecutando las siguientes actividades:

- Vaciado de columnas restantes en área de comedor
- Instalación de cubierta restante en área de comedor
- Instalación de wind para endoape
- Instalación de piso en baño

Manuel de la Hoz O.
Contratista

Interventoría

24-07-2024

Trabajadores: 4 obreros

se encuentran en obra realizando piso en granito, vaciado de columnas e instalación de cubierta, instalación de wind para endoape, instalación de lavamanos y sanitario

Manuel de la Hoz O.
Contratista

Interventoría

25-07-2024

Trabajadores: 4 obreros

se encuentran en obra realizando las siguientes actividades

- Instalación de cubierta restante en área de comedor
- Endoape sobre muros en área de comedor
- Endoape sobre muros en área de cocina
- Instalación de wind para endoape

Manuel de la Hoz O.
Contratista

Interventoría

26-07-2024

Día sabado

Trabajadores en obra: 4 obreros - 3 electricos, 1 Maestro.

Actividades: - Estructuración de muros

- Estuco sobre muro
- Instalaciones electricas
- Instalación de Puertas y Ventanas
- Fundida de Zocalo en granito en cocina.
- Pañete en muro de fachada
- Instalación de Tablon rojo

Manuel de la Hoz O.
Contratista

Interventoria

27-07-2024

Día sabado

Trabajadores en obra: 4 obreros, 3 electricos, 1 Maestro

Actividades: - Pintura sobre muros.

- Escatificación de muro de fachada.
- Instalación de Tablon rojo.
- Fundida de Zocalo en granito.
- Pañete sobre muro
- Instalación de ventana

Manuel de la Hoz O.
Contratista

Interventoria

28-07-2024

Día sabado

Trabajadores en obra: 4 obreros

Actividades: Estuco sobre muros

- Pintura sobre muro
- Instalaciones electricas
- Fundida de Zocalo en granito

Manuel de la Hoz O.
Contratista

Interventoria

29-07-2024
Día sabado
Trabajadores en obra: 4 obreros
Actividades: Instalación de cielo raso
- Estuco sobre muro
- Pintura sobre muro
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de sanitario

Manuel De la Hoz O.
Contratista

Interventoría

30-07-2024
Día sabado
Trabajadores en obra: 4 obreros
Actividades: Instalaciones de cielo raso
- Zocalo en baldosa de granito
- Estuco sobre muro
- Pintura sobre muro
- Instalaciones eléctricas

Manuel De la Hoz O.
Contratista

Interventoría

31-07-2024
Día sabado
Trabajadores en obra: 4 obreros
Actividades: Instalaciones en cielo raso
- Zocalo en baldosa de granito
- Estuco sobre muro
- Pintura sobre muro
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones de lavamanos

Manuel De la Hoz O.
Contratista

Interventoría

BITACORA IED INSTITUTO TÉCNICO DE COMERCIO BARRANQUILLA- SEDE 1.

30-06-2024

DO de labores

01-07-2024

se encuentran en la obra 3 trabajadores realizando trabajo de altos y pesados.

Manuel M. Flores O.
contratista

Inspectoría

02-07-2024

Día sabado

Trabajadores en obra: 3 obreros

Actividades: - corte pofilado y pofilado de bloque.

- Demolición de muro de ramplotería Pozo viejo
- Desmonte de puntos eléctricos en secretaría y rectoría

Manuel M. Flores O.
contratista

Inspectoría

03-07-2024

Día soleado

Trabajadores en obra: 3 obreros

Actividades: fijo de ventana de secretaria

- Instalación de Puerta de madera

- Instalación de lavamanos y sanitario

Manuel Alfredo O.
Contratista

Interventoría

04-07-2024

Día soleado

Trabajadores en obra: 3 obreros

Actividades:

Instalaciones eléctricas

Manuel Alfredo O.
Contratista

Interventoría

05-07-2024

Día soleado

Trabajadores en obra: 3 obreros

Actividades: Instalaciones eléctricas

Manuel Alfredo O.
Contratista

Scanned with CamScanner

06-07-2024

Dia sabado

Trabajadores en obra: 3 obreros

Actividades: Instalaciones electricas

Manuel Alfonso O.
contratista

Interventoria

07-07-2024

NO se laborá (Domingo)

Manuel Alfonso O.
contratista

Interventoria

BITACORA IED SONIA AHUMADA.

01-07-2024

Personal en obra: 3 trabajadores, ejecutando levante de muros y demolición de pisos

Manuel Mc Hoo.
contratista

Interventoría

02-07-2024

Personal en obra: 3 trabajadores continuando las actividades: levante de muros y demolición de pisos

Manuel Mc Hoo.
contratista

Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

03-07-2024

Personal en obra: 5 trabajadores

Se encuentran realizando levante de muros, limpieza de area, pañete sobre muros, filos de puertas y ventanas

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoria

04-07-2024

Estado del clima: Soleado

Se encuentran 4 trabajadores en la obra realizando enchapes, pegues y limpieza general de area.

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoria

05-07-2024

Estado del clima: Soleado

5 obreros se encuentran ejecutando limpieza de material RCD, enchapes de muros, resanes y acopio de material, filos de puertas y ventanas

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

06-07-2024

Se encuentran en la obra 5 trabajadores realizando las siguientes actividades: Asseo de cocina
Limpieza del area
Enchape
Pegante de muro

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoria

08-07-2024

Estado del clima: Dia soleado

Se encuentran en la obra 4 trabajadores ejecutando pegante de muro y enchape, fundida de viga de amarre

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoria

09-07-2024

Estado del clima: Dia soleado

Se encuentran en la obra 3 trabajadores realizando pegante de muro, limpieza general y pañete sobre muros, filos de puertas y ventanas

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

10-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Se encuentran en la obra 4 trabajadores realizando armado de mesones, levante de muro y enchape, limpieza general de area.

Contratista

Inventario

11-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Se encuentran en la obra 4 trabajadores realizando levante de muro, limpieza del area, enchape.

Contratista

Inventario

12-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Se encuentran en la obra 5 trabajadores realizando instalaciones electricas, enchape, fundida de meson, levante de muro, limpieza general

Norma

13-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Se encuentran en la obra 2 trabajadores realizando Pañete de muro externo, limpieza general de cocina, cerramiento nuevo, instalación de tuberías, fr

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoría

14-07-2024

NO se laboró (Domingo)

15-07-2024

Se encuentran en la obra 3 trabajadores realizando resanta de mesones y pañete, refuerzo de cerramiento nuevo, fijes de puertas y ventanas, fundida de plantilla.

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoría

16-07-2024

Se encuentran en la obra 3 trabajadores realizando resanta de mesones, armados y fundida, enchape, demolición de pisos, fundida de plantilla

Manuel Mc Hoz O.

Norma

Scanned with CamScanner

16-07-2024

Se encuentran en la obra 3 trabajadores realizando levante de muretes, instalación de tuberías, demolición de pisos, armados y fundido, enchape, fundida de plantilla.

Manuel Mc Hoz O.

17-07-2024

Se encuentran en obra 4 trabajadores realizando instalación de perfiles para cubierta, pañete sobre muros, muros, enchape, fundido de plantilla

Contratista Manuel Mc Hoz O. Interventoría

18-07-2024

Se encuentran en la obra 2 trabajadores realizando las mismas actividades mencionadas anteriormente, Piso en granito, demolición de pisos para instalación de tuberías

Manuel Mc Hoz O.

Contratista Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

19-07-2024

Se encuentra en la obra 2 trabajadores realizando las mismas actividades mencionadas anteriormente: - Piso en granito, demolición de piso para instalación de tuberías

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoría

20-07-2024

No se laboró

21-07-2024

No se laboró

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoría

21-07-2024

Se encuentran en la obra 3 trabajadores realizando enchape de cocina, boceto de muro interno, piso en granito, instalación de piso en cocina.

Manuel Mc Hoz O.
Contratista

Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

23-07-2024

Se encuentran en la obra 3 trabajadores realizando enchape y levante de muro externo, instalación de cableado y tomas.

Contratista

Interventoría

21-07-2024

Se encuentran en obra 3 trabajadores realizando enchape, levante de muro interno y acabados sobre vigas, instalación de cableado y tomas, instalación de lavamanos y sanitario.

Contratista

Interventoría

25-07-2024

Se encuentran en obra 2 trabajadores realizando las mismas funciones del día anterior:

- Enchape, levante de muro interno y acabados sobre vigas, Piso en granito, instalación de cableado y tomas.

Contratista

Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

26-07-2024

Se encuentran en la obra 2 trabajadores realizando las mismas actividades: acabados sobre muro, fundido de zocalo en granito pulido.

Pintura e instalación de vinil.

Contratista

Interventoria

27-07-2024

Se encuentran en la obra 2 trabajadores realizando las mismas actividades: Acabados sobre muros, fundida de zocalo en granito pulido media caña.

Contratista

Interventoria

28-07-2024

Dia no laborado

Contratista

Interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

29-07-2024

Se encuentran en la obra 3 trabajadores realizando torete sobre muro, fundida de zocalo de granito, pulida, pintura e instalación de wind, instalación de lamparas

Manuel Mejías O.
contratista

1 inventario

30-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Trabajadores: 3 obreros

Actividad: Instalaciones eléctricas

- Piso en granito, pintura e instalación de wind
- fundida de viga sobre muro

Manuel Mejías O.
contratista

1 inventario

Norma

Scanned with CamScanner

31-07-2024

Estado del clima: Día soleado

Trabajadores: 4 obreros

Se encuentran realizando frente de muro, pañete sobre viga, estuco sobre muro y fundida de zócalo en granito pulido, pintura e instalación de piso, instalación de lamparas

Manuel Mejía O.
contratista

Inspección

BITACORA IED LA LIBERTAD.

29 Junio - Sábado
clima: Lluvias desde 12:30 - 4pm. Trabajadores: 7
- Fundida Vigas Cimentación
- Impermeabilización Vigas
- Levante Sobrecimiento.
- Reparación Cerramiento por fuerte lluvias.

30 Junio - Domingo
- No Actividades!

1 - Julio - Feriado Festivo.
- No Actividades.

2 Julio clima: lluvias desde 1pm - 3pm.
- Terminación Fundida Vigas Cimentación
- Levante Sobrecimiento. trabajadores: 6.

3 julio: clima: Mañana Soleada.
- Levante Sobrecimiento.
- Impermeabilización Vigas Cimentación.

4 Julio: clima: lluvioso en la mañana hasta 2pm.
- Levantes Sobrecimiento
- Impermeabilización. trabajadores: 6.

04-Julio 2024.
•Visita de seguimiento en obra.
se hace la observación de no realizar el levante lateral izquierdo del comedor hasta sea autorizado por todas las partes.
•se requiere más personal en obra, se observa retraso en la obra.

05 Julio 2024
- Lluvias fuertes desdes las 6 am - 2pm ≫ 3pm - 5pm. trabajadores: 5
- Solo hubo 1 hora sin Llover.

06 Julio 2024 Sábado.
- Levante de Sobrecimiento, trabajo extendido hasta las 6pm!
trabajadores: 5

07 Julio 2024 Domingo. clima: Mañana Soleado.
trabajadores: 3.
- Levante de Sobrecimiento y Relleno de Concreto.

8 Julio 2024 : Lunes
Personal: 7
- Iniciamos Levante Muros.
- Pañete Sobrecimiento.

- 9 Julio
- Levante Muros Perimetrales
- Pañete Sobrecimiento e Impermeabilizacion
Personal: 7

10 de Julio 2024.

Trabajadores: 7
Residente: 1

· Compromisos:
- bajar 20 cm de la plantilla interna: (excepto Comedor).
- Cerramiento antes del lunes. inicio de clases.
- Realizar apique para ~~pendiente.~~ Revisar recorrido de aguas lluvias.
- Programar Visita con clara y Alex. para definir manejo de aguas lluvias y niveles de ingresos.

Ing. Figueroa.
EDUBAR. SA.

Residente obra

Interventoria

11 Julio:
→ Se mantiene la Pared doblada en el Comedor. (Sed. edu).
- El Residente Jose fuentes mantiene nivel Inicial de Piso Trabajadores: 7 mientras hay Comité, ya que los niveles de la calle quedarian a nivel de Piso Si se bajan los 20 cm solicitados.

12 Julio:
- Se Inicio Instalacion de Cerramientos Interno y Externo.
- Levante De Muros, relleno de doblados. Trabajadores: 7
- Pañete Sobrecimiento

13 Julio: Sabado

Trabajadores: 7

- Levante Muros.
- Relleno dovelas.
- Impermeabilizacion Sobrecimiento
- Terminación de Cerramientos en Zinc y Superboard.

14 Julio Domingo

Trabajadores: 7

- Relleno Dovelas
- Levante Muros.
- Pañete Sobrecimiento terminado.
- Armado de Acero Vigas Amurre.

15 Julio (Feriado)

No Actividades

16 Julio

Trabajadores: 7

- Terminación Levante Muros Altura 2:00 am
- Armado de Acero Vigas Amurre
- Terminación Impermeabilizacion Sobrecimiento.

17/julio

Trabajadores: 7

- Terminación Relleno dovelas.
- Fundida Viga Amurres.
- Armado de Formaleta

18 Julio 2024.

Actividad:
- Fundida Viga Amarres. 20 mL.
- Nivelacion terreno -20 cm.

Trabajadores: 7.

19 Julio /2024.
Clima: Llovius A partir de la 1 pm - 6 pm.
- Formaleta para Viga.

Trabajadores. 7.

20 Julio Festivo.
- Levante Muros Sobre Viga. 20ml.
- Fundida Viga.

Trabajadores: 7.

21 Julio Domingo.
(No Actividades).

22 Julio

Trabajadores 7.

- Desencofrado Vigas (36 Horas).
- Fundida Vigas.

23 Julio 2024

- Fundida Vigas.
- Levante Muro Sobre Viga.

Trabajadores: 3. oficials
1 Ayudante

24 Julio. 2024.

- Pañete en muros
- Fundida vigas
- Levante Sobrevigas
- Levante Cuchillas.
-

Oficiales: 3
Ayudantes: 4.

25 Julio 2024 (Domingo).

- Pañete en muros (Internos)
- Levante Cuchillas
- Fundida Viga Corona

Trabajadores: 7

Norma

26-07-24.

Visita de seguimiento y control de obra por parte de Interventoría, contratista y sec. de educación, se define en obra
- Niveles de piso, Manteniendose la del área de comedor.
- Manejo de aguas lluvias por medio de canaletas en la cubierta y canal tipo Box en ándén del área de entrega de alimento y se manejara el nivel desde área de comedor hasta entrega de alimeto, se realizará con un recolector de aguas de lluvias. en el anden
- se hace la observación de realizar dintel en la parte inferior de los vanos para puertes y ventanas
- Vanos de entrega 2.00 x 1.00 y descomide 7.00 x 7a
- Media caña en Mezcla Mortero

Tener presente que los vanos deben tener una separación minima de .50 Mts. y tener en cuenta la norma.
- se debe dar continuidad a los dobles en lavante de cochilla para cubierta.
- se traslada el punto de lavamanos para el área de comedor y se realizará sobre mesón, 2 lavamanos.
- se notifica que está autorizado el cambio del piso en dos aulas, aulas 3 y 4, estas actividades de cambio de piso no son prioridad.

Una figueredo A
EDUPOSTOR S.A

David Cuello N
Sec. Educación

Contratista.

Interventoría.

26 Julio. 2024

- Continuamos Con las Siguientes Actividades:

- Levante Muros Sobrevigas (40 cm)
- Fundida de Viga Corona.
- Puñete Interno (Arcos recepción Alimentos).

27 Julio. 2024.

- Levante Muros
- Desencofrado de Vigas
- Fundida Vigas
- Puñete Interno.

28 Julio 2024 (Domingo)

No Actividades.

29 Julio 2024

- El Ingeniero Residente Recibe los planos hidrosanitarios definitivos.

- Fundida Vigas, Puñete Interno.

trabajadores: 7

Norma

30 Julio: 2024. Trabajadores: 7.

- Puñetes Interno.
- Fundida Vigas
- Replantro Red sanitaria.
- Fundida Vigas

31-07-24. Día Sabado.

3 oficiales, 4 Ayudantes

visita de seguimiento y control de actividades en la obra a la fecha no se ha cumplido con las conexiones Hidrosanitarias, se realiza actividad de puñete, fundida de viga corona, frente de cuchilla, el área de rancho queda de un ancho de .53 Mts y hacinto de .60 Mts implica que quede un topezón o Mochetica hacia la entrada de deposito de alimentos, la Medida del Vano Ventana en área de preparación de alimntos aún no concuerdan con lo estipulado en plano y lo normativo, los filos de Ventanas aún no se realizan, se solicita más personal puesto que aún no se ve avance significativo en obra. se aclara que los planos sanitario e Hidráulicos se entregaron el sabado 27-07-24

- El ingeniero Josi fuentes Recibe los planos Sanitarios el dia 29/07/24

Contratista.

1 Agosto 2024. Trabajadores: 7.

- Fundida Viga Corona.
- Puñete Interior.
- Levante 40 cm Sobre Vigas.

2 Agosto 2024 Trabajadores: 7.

- Levante cuchillos y muros.
- Puñete Interno.
- Fundida Viga Corona.
- Excavacion Red Sanitaria

3 Agosto 2024 Trabajadores 7.

- Excavacion Red Sanitaria.
- Puñete Interno.
- Fundida Viga Corona.

4 Agosto 2024 Trabajadores: 0.

- No Actividades.

5 Agosto 2024 Trabajadores. 8.

- Terminacion Excavacion.
- Instalacion Red Sanitaria Interna
- Puñete Interno.
- Viga Amarre Corona.
- Vanos Fundidos de Ventanas.

Norma

6 Agost 2024 Trabajadores : 8

- Instalación Red Sanitaria.
- Peñete Interno.
- Nivelación terreno.
- Fundida Unos Ventanas.

7 Agost 2024 (Festivo) Trabajadores : 6.

- Instalacion Red Sanitaria.
- Peñete Interno.
- Armado Encofrado.
- Fundida Vigas.

8 Agosto 2024 Trabajadores : 6.

- Peñete Interno
- Fundida Dintelas Ventanas.
- Nivelacion terreno interno
- Instalacion Agua potable.

9 agosto. 2024 Trabajadores : 6

· Se manda a demoler un cuarto de mano en la zona del Comedor, no tiene trabajar y se encuentra diplomado.

Interventora.

10 Agosto Sábado.

- Pañete Interno
- Pañete externo.
- Nivelacion terreno.
- Fundida Vigas Corona

Personal: 6.

11 Agosto Domingo Personal: 4.

- Pañete Interno.
- Construccion Registro Aguas Negras e Instalacion Tuberia.

12 Agosto Lunes Personal: 6.

- Pañete Interno, Pañete Externo.
- Nivelacion terreno.
- Relleno Anden.

13 Agosto Martes Personal 6.

- Continuamos Con la Actividad Pañete. Interno y Exterior.
- Nivelacion terreno.

14 Agosto Personal 6.

- Pañete exterior Con Impermeabilizante Sika 1
- Nivelacion terreno

15 Agosto

— En Campo Secretaria de educacion Solicita Cambiar la tuberia metalica de Agua Potable que viene de la Calle, tambien el Cambio de tuberia 4" Naranja que esta Conectada Al Alcantarillado.

Arq. [illegible]
SED.

Ing. [illegible]
SED

Ing Jose A [illegible]
Sub G

16 Agosto. Trabajadores: 6.
— Pañete exterior e Interior.
— Filos y Vanos.

[illegible]

17 Agosto. Trabajadores 6.
— Pañete exterior e Interior
— toma de filos.

[illegible]

18 Agosto.
No Actividades

[illegible]

19 Agosto
No Actividades

[illegible]

20 Agosto Trabajadores: 5
Actividades.
- Pañete
- Filos.

[illegible]

21 - Agosto - 24.

Personal = 2 oficiales, 5 Ayudantes.

Se realiza visita de seguimiento y control.
Se realiza actividad de pañete sobre muro Exterior y filos en vanos. de ventanas y puertas, Excavación de trampa de grasa.
Se reitera la importancia del uso de EPP del personal en obra. Se solicita más personal y más alcance en ejecución de las actividades, Es notable el retraso en la obra. En obra no se encuentran los perfiles metálicos ya se debería estar ejecutando actividad en cubierta y plantillas, falta también terminar los rellenos.

Dra Soledad.

Dayana Quintero.
Contratista.

22 Agosto.

Personal: 2 oficiales; 4 Ayudantes

- Toma de detalles de Pañete.
- Toma de filos y Vanos
- Toma De Niveles para Vanos.
- Excavación Trampa de Grasa y Registro Sanitario.

BITACORA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

FECHA 02/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 2 oficiales de obra
- 2 ayudantes de obra

Actividades.

- Filetes puertas y ventanas
- instalacion tuberia aguas lluvias 4".
- EXCAVACION registro sanitario 1,20x1.20x 1.50

Materiales

- PAG 160 x 60 x 2.00 E= 2,5 mm
- Soldadura
- Anticorrosivo
- thiner
- Pintura epoxica BLANCA.

NOTA: LLUVIA de 0 a 12PM.

Firma: Residente Contratista

Arq Contratista

FECHA 03/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 2 Oficiales de obra
- 2 Ayudante de obra

Actividades

- instalaciones de aguas lluvias 4"
- Estructura metalica

- Filetes puertas y ventanas.
Materiales: Estuco, pintura exterior, pintura interior

Firma: [illegible]
Residente de obra

Guillermo
Arq Contratista

Fecha 04/07/2024
Personal
Director de obra
Residente de obra
Maestro de obra
2 oficiales de obra
2 Ayudantes de obra
Actividades
* Estuco exterior
* Pañete filos vanos ventanas y puertas
* Plantilla concreto 3000 psi
* Estructura metalica Cubierta
* Orden y aseo
* Nueva dotacion implementos de seguridad y charla de seguridad.

Pedestal
* 8 fe 1/2" y estribos c/d 10cm 3/8"
* pedestal 40x40
* Zapata 1x1x0.35E fe 1/2 c/d 0.20 en anclaje
* parrilla con ganchos de 10 cm
* Flanche de 1/2" 6 pernos de 3/8"
* se realiza y autoriza portico columnas en pas 160x60x2.00 E=2.5mm y viga en pas embajonado

Fondo portico en eterboard.

Firma:
[illegible]
SEO
Alexander Carrillo

Guillermo
Arq Contratista

Nota: se da viabilidad a la construccion de la jardinera para disimular la tuberia de aguas lluvias viga cimiento 0.25 x 30 4 fe 1/2 y estribos de 3/8" c/d 10 cm + 1 alfajia :

Arq. Laura Ines de Arco
S. ejecucion.

Maria Olga Mesa
Hidraulica
3012652999

* Canales en pvc para cubierta.
* tema que se dialogo, fue el de la instalacion de gas para la cocina, donde se va a iniciar el tramite para la acometida.

Ing figueredo A
EDUBOBAR SA.

Gustavo A. Rojas P.
Edubar SA

FECHA 05/07/2024
Personal
Director de obra
Residente de obra
· MAESTRO de obra
2 oficiales obra gris
3 Ayudantes obra gris
1 oficial estuco
1 oficial estructura metalica
2 Ayudantes Estructura metalica
Actividades
*Figuracion ACERO

Nota: fuertes lluvias 7:30AM – 12:

firma: [redacted]
Residente de Obra

Guillermo Vz
Arq Contratista

Fecha: Julio 6 de 2024

->(Instalaciones)

* Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- MAESTRO de obra
- 2 oficiales de obra
- 3 Ayudantes de obra.

Actividades.
- Detalles de mampostería
- Filos y dilataciones.
- instalacion de tubería de aguas lluvias
- PLANTILLA en concreto de 3000 psi e=10 cms
- Estructura metalica cubierta

firma: [redacted]
Residente de obra

Guillermo Vz
Arq Contratista

Fecha: 08/07/2024

Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 2 oficiales de obra
- 2 ayudantes de obra

Actividades
- EXCAVACION ZAPATAS para columnas metalicas
- figuracion acero ZAPATAS y pedestales para columnas metalicas de soporte columnas.
- Figuracion acero para viga en concreto de 30x30 x 17.50 ml. "viga cimiento fachada"
- Estructura metalica cubierta
- Estuco plastico muros exteriores.

Firma: [signature] Residente de obra.

[signature] Arq Contratista

Fecha: 09/07/2024

Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 2 Oficiales de obra
- 2 ayudantes de obra
- 2 oficiales de estructura metalica
- 2 Ayudantes de estructura metalica
- 1 oficial de estuco y acabados.

Actividades
* visita por parte de gases del caribe, tema acometida Cocina.

* registro sanitario 1.20 x 2.20 x 1.50 - se realiza el Roompantimiento interno para el deslode.
* Elevado de zapatas adicionales en concreto de 3000 psi.
* Mensolas metalicas fabricación para aleros cubierta
* instalacion de platina 1/2" 20x20 con tornillo de anclaje. de 3/8 x 3"

Firma: [redacted]
Residente de obra

Guillermo V.
Arq Contratista

FECHA 10/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 2 Ayudante de obra
- 2 oficiales de obra
- 2 oficiales de metal Mecanica
- 2 Ayudantes de Metal Mecanica
- 1 oficial de acabados.

Actividades.

* Montaje estructura metalica perfiles PAG 150x60x 2000 e=3mm.
* Estuco Muros.
* Vaciado Viga 30x30x17.5 mL Concreto de 3000 psi Cimiento Jardinera.

Firma: [redacted]
Residente de obra

Guillermo V.
Arq Contratista.

* registro sanitario 1.20 x 1.20 x 1.50 - se realiza el compartimiento interno para el deslode.
* Elevado de zapatas adicionales en concreto de 3000 psi.
* Mensulas metalicas fabricación para aleros cubierta
* instalacion de platina 1/2" 20x20 con tornillo de anclaje. de 3/8 x 3"

Firma: [signature] Residente de obra

Guillermo Vz. Arq Contratista

FECHA 10/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 2 Ayudante de obra
- 2 oficiales de obra
- 2 oficiales de metal Mecanica
- 2 ayudantes de Metal Mecanica
- 1 oficial de acabados.

Actividades.

* Montaje estructura metalica perfiles PAS 150x150 200 e=3mm.
* Estuco Muros.
* Vaciado Viga 30x30x17.5 ml Concreto de 3000 psi cimiento Jardinera.

Firma: [signature] Residente de obra

Guillermo Vz. Arq Contratista.

Fecha 11/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- 2 Ayudantes de obra
- 2 oficiales de obra
- 3 oficiales de Metalmecanica.
- 1 Ayudante de Metalmecanica

Actividades

- Montaje de estructura metalica cubierta
- Estuco muros.
- Mampostería en Block 14*19*39 (JARDINERA)

Firma: [signature] 12/07/2024

[signature]
Arq Contratista

Fecha 12/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- 2 Ayudantes de obra
- 2 oficiales de obra
- 3 oficiales de Metalmecanica
- 1 Ayudante de Metalmecanica

Actividades.

- Montaje de estructura metalica cubierta
- Estuco muros.
- Pañete jardinera.

Firma: [signature] 12/07/2024.

[signature]
Arq Contratista

Fecha: 13/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra.
- 3 Oficiales Metalmecanica
- 1 Ayudante Metalmecanica
- 1 oficial Acabados

Actividades.

- Montaje cubierta upvc
- Aseo general de obra
- Estuco Muros

Firma: [signature]
92002178

[signature]
Arq Contratista.

[signature]

Fecha 15/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 3 Oficiales Metalmecanica
- 1 Ayudante Metalmecanico
- 1 oficial de acabados.

Actividades.

- Montaje cubierta upvc.
- Aseo general de obra
- Estuco Muros.

Firma: [signature]
92002178

[signature]
Arq Contratista.

[signature]

Fecha 16/07/2024

Personal

- Director de obra.
- Residente de obra
- 3 oficiales de obra
- 1 Ayudante de obra
- 3 oficiales de Metalmecanico
- 1 Ayudante de Metalmecanica

Actividades.

- Montaje Cubierta y detalles de Metalmecanica.
- Rampa de acceso. Alimentos
- Panete interior Jardinera
- Aseo general de obra.

firma: [illegible]

Arq Contratista

Se define punto de conexion Electrico para alimentar el tablero de la cocina, en cable 8 AWG con su respectiva proteccion, se le solicita que la tuberia sea empotrada el Area del enchape, Sobre la pared que no lleva enchape se continua en EMT.

Tablero de 12 Circuitos bifasico, la ubicacion en la zona de entrada de Alimentos.

Ing Emerson Londoño Edwar SA

Arq Contratista

FECHA: 17/07/2024
Personal
Director de obra
Residente de obra
Maestro de obra
1 oficial de obra
1 Ayudante de obra
Actividades
- Detalles de mampostería
- Detalles de parietes.
- PLACA E = 10 cm ESCALERA entre pasillo de circulación existente y Coliseo.

firma: [redacted] Residente de obra

Arq Contratista

FECHA: 18/07/2024
Personal
Director de obra
Residente de obra
Maestro de obra
1 oficial de obra
1 Ayudante de obra.
1 oficial electricidad.
Actividades.
* Instalacion tuberia de aguas lluvias hasta el bordillo de la via.
* Regatas tomas e interruptores puntos electricos

firma: [redacted] Residente de obra

Arq Contratista

Fecha 19/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra.
- 1 Oficial de obra.
- 1 Ayudante de obra.
- 1 oficial de electricidad.

Actividades

* ~~Enchape~~ muros cocina
* ENCHAPE de Pisos zona exterior edificacion
* instalacion Acometida principal electrica
* instalacion tablero electrico.

Firma: ~~Residente de obra~~ Arq Contratista

Fecha 20/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 2 Ayudantes de obra.
- 1 oficial de electricidad

Actividades.

* ENCHAPE muros cocina
* Mesones cocina.
* ENCHAPE Piso exterior.
* Fabricacion Lavatraperoy Lava ollas.
* instacion tuberia EMT circuitos electricos.

Firma: ~~Residente de obra~~ Arq Contratista

FECHA: 22/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- 1 Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 2 Ayudantes de obra
- 1 oficial de electricidad

Actividades

* ENCHAPE MUROS cocina
* ENCHAPE zonas de circulacion exterior-piso en granito
* instalacion tuberia EMT "electrica"

Firma: [signature]
Residente de obra

Arq Contratista

Fecha: 23/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 2 Ayudantes de obras
- 1 oficial de electricidad "Tecnico electrico"

* ENTREPAÑOS Mampaje E=0.10cm
* ENCHAPE cocina "MUROS"
* ENCHAPE piso en BALDOSA de granito.
* Cableado electrico.

Firmes: [signature]
Residente de obra

Arq Contratista

Fecha: 24/07/24
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 1 Ayudante de obra
- 1 oficial de electricidad.

Actividades.
* ASEO general de obra
* ENCHAPE LAVAMANOS y LAVAPAPAS.
* ENCHAPE MUROS cocina
* ENCHAPE PISO en BALDOSA de granito. zonas de circulacion exterior

Nota: visita por parte de edubar.

Firma: [signature]
Residente de obra

[signature]
Arq Contrat. sto

Fecha 25/07/24
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 1 Ayudante de obra

Actividades
* ENCHAPE de entrepaños menaje y Bodega de alimentos
* ENCHAPE piso en Baldosa de granito. piso exterior
* refrague piso de granito y MUROS EN ceramica.
* instalacion tomas y Breakers electricos.
* visita funcionario Secretaria de educacion.

Firma [signature]
Residente de obra

[signature]
Arq Contrat sto

Fecha 26/07/2024
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra
Actividades
- ENCHAPE MUROS
- Pañete JARDINERA

Firma: [redacted] Residente de obra

Fecha 27/07/2024
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra.
Actividades
- instalacion de reja metalica.
- Demolicion alfajia en mal estado
- instalacion zocalo.

Firma: [redacted] Residente de obra.

Fecha 29/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- Ayudante de Obra
- Oficial de obra

Actividades.

- Alfajía Jardinera
- Alfajía Muro Edificacion existente aulas de Clases.
- Banca en placa de concreto $\epsilon = 0,10$ cmt + fe $\frac{1}{2}$" c/d 20 cmts
- arreglo de muro edificacion existente pañete exterior zona deteriorada por Humedad AA.

Firma: Residente de obra

Fecha 30/07/2024

Personal.

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- Ayudante de obra
- oficial de obra

Actividades.

- Instalacion zocalo.
- instalacion lamparas.
- Detalles de estuco.

Firma: Residente de obra

Fecha: 31/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra.
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra.

Actividades

- ASEO General de obra
- Detalles de enchape
- ENCHAPE LAVAMANOS y LAVAPAPAS.
- instalacion tuberias de drenaje 1ra AA.

firma: [redacted] de obra

BITACORA IED CIUDADELA ESTUDIANTIL

Fecha: Jueves 27-06-2024

Entrada: 7:30 am / Asistencia: 10 trabajadores, 1 Residente

Salida: 5:00 pm / Clima: Lluvia 12:00 pm

* Actividades Realizadas: * descapote, * excavación, * retiro de material a volqueta.

Residente de Obra Inspector SST

Fecha: Viernes 28-06-2024

Entrada: 7:30 am / Asistencia: 9 trabajadores, 1 Residente

Salida: 5:00 pm / Clima: Lluvias

* Actividades Realizadas: * descapote, * excavación, * retiro de material a volqueta, * desmonte techo cocina, * desmonte muro cocina, * demolición piso comedor.

Residente de Obra Inspector SST

Fecha: Sabado 29-06-2024

Entrada: 7:30 am / Asistencia: 10 trabajadores, 1 Residente

Salida: 1:00 pm / Clima: Soleado/Nublado

* Actividades Realizadas: * descapote, * excavación, * retiro de material a volqueta.

Residente de Obra Inspector SST

Fecha: Lunes 01-07-2024

Entrada: 7:30 am / Asistencia: 6 trabajadores, 1 Residente

Salida: 2:00 pm / Clima: Soleado

* Actividades Realizadas: * descapote, * retiro de material a volqueta, desmonte cielo raso.

Residente de Obra Inspector SST

Fecha: Martes 02-07-2024

Entrada: 7:30 am / Asistencia: 9 trabajadores, 1 Residente

Salida: 5:00 pm / Clima: Lluvia fuerte 11:00 am

* Actividades Realizadas: * limpieza, * descapote, * excavación, * retiro de material a volqueta.

Residente de Obra Inspector SST

Scanned with CamScanner

Fecha: Miercoles 03-07-2024

Entrada: 7:30 am
Salida: 5:00 PM

Asistencia: 10 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Clima: Lluvia 11:30 am

- Actividades Realizadas: - excavación, - retiro de material a volqueta, - ingreso de acero a obra/almacen.

Residente de Obra | Inspector SST | Interventoría

Fecha: Jueves 04-07-2024

Entrada: 7:30 am
Salida: 4:45 pm

Asistencia: 9 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Clima: Nublado — Lluvia 11:45 - Soleado

- Actividades Realizadas: - descapote, - excavación, - retiro de material a volqueta, - demolición piso cocina.

Residente de Obra | Inspector SST | Interventoría

Fecha: Viernes 05-07-2024

Entrada: 7:30 am
Salida: 3:30 PM

Asistencia: 7 trabajadores, 1 SST, 1 Residente
Clima: Lluvia fuerte desde 7:00 am, lluvia fuerte a las 2 PM

- Actividades realizadas: - retiro de material a volqueta.

Residente de obra | Inspector SST | Interventoría

Fecha: Sabado 06-07-2024

Entrada: 7:30 am
Salida: 1:00 PM

Asistencia: 9 trabajadore, 1 Residente, 1 SST
Clima: Soleado / Nublado

Actividades Realizados: Retiro de material a volqueta.

Residente de obra | Inspector SST | Interventoría

4

Fecha: lunes 08-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 9 Trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 4:30 pm / Clima: Nublado / Claro
Actividades Realizadas: Retiro de material a volqueta
Doblaje de acero

Residente de obra | Inspector SST | Interventoría

Fecha: Martes 09-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 9 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 4:47 pm / Clima: Soleado
Actividades Realizadas: doblaje de acero, descapotaje, Sisado viga Cimentación

Residente de obra | Inspector SST | Interventoría

Fecha: Miercoles 10-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 9 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 4:50 pm / Clima: Nublado / Claro
Actividades Realizadas: doblaje de acero, descapotaje, trazado, Sisado viga de cimentación

Residente de obra | Inspector SST | Interventoría

Fecha: Jueves 11-07-24
Entrada: 7:00 am / Asistencia: 9 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 5:30 pm / Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Excavación, trazado, amarre de acero ingreso de material, viga de amarración

Residente de obra | Inspector SST | Interventoría

Scanned with CamScanner

Fecha: viernes 12-07-24
Entrada: 7:00 am / Asistencia: 9 trabajador, 1 Residente, 1 SST
Salida: 5:00 pm / clima: Soleado
Actividades Realizadas: Excavación, trazado, amarre de acero
Ingreso de material, viga de cimentación, soldado de zapatas

Residente de obra | Inpector SST | Interventoria

Fecha: Sabado 13-07-24
Entrada: 7:00 am / Asistencia: 10 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 3:00 pm / clima: soleado
Actividades Realizadas: amarre de acero, ingreso de material, trazado

Residente de obra | Inpector SST | Interventoria

Fecha: Domingo 14-07-24
Entrada: 7:00 am / Asistencias: 8 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 9:00 pm / clima: Soleado
Actividades Realizadas: Fundido de zapatas, mamposteria

Residente de obra | Inpector SST | Interventoria

Fecha: lunes 15-07-24
Entrada: 7:00 am / Asistencias: 6 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 5:00 pm / clima: Soleado
Actividades Realizadas: demolición de muro, amarre de acero
fundido de pedesta y vigas, mamposteria

Residente de obra | Inpector SST | Interventoria

Fecha: Martes 16-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 8 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 4:30 pm / clima: Soleado
Actividades Realizadas: Fundido de vigas y pedestal, mamposteria

Residente de obra | Inspector SST | Interventoria

Fecha: Miercoles 17-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 9 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 5:33 pm / clima: Soleado
Actividades Realizadas: armarre de acero, ingreso de material, Fundido de viga y pedestal, mamposteria
Secretaria solicita topografia, planimetria total del lote, e implantar sobre estos datos el diseño arquitectonico. El cerramiento en mamposteria con retranqueria.

cc 8.833.983
David cuello
Supervisor SED

Gustavo A. Rojas P.
Edubar SA

Inspector de obra.

Residente de obra | Inspector SST | Interventoria

Fecha: Jueves 18-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 7 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 4:58 pm / clima: Soleado
Actividades Realizadas: Fundido de viga y pedestal, mamposteria

Residente de obra | Inspector SST | Interventoria

Fecha: Viernes 19-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 4 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salido: 3:55 pm / clima: soleado
Actividades Realizadas: fundida de columna, mamposteria, pañete interno. Acond sobre Baile

Residente de obra | Inspector SST | Interventoria

Scanned with CamScanner

Fecha: Sabado 20-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 6 trabajadores, 1 Residente, 1SST
Salida: 1:40 pm / clima: Soleado
Actividades Realizadas: fundido de columna, mamposteria, Pared interna
Alcad sobre Pared

Residente de obra Inspector SST Interventoria

Fecha: Lunes 22-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 6 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 5:15 pm / clima: Soleado
Actividades Realizadas: mamposteria, Demolición/desmonte de cerchas
pared interna

Residente de obra Inspector SST Interventoria

Fecha: Martes 23-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 7 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 5:30 pm / clima: Soleado
Actividades Realizadas: mamposteria, demolición/desmonte de columnas techo.
Pared: ~~Alcad sobre Pared~~

Residente de obra Inspector SST Interventoria

Fecha: Miercoles 24-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 8 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 5:30 pm / clima: Soleado
Actividades Realizada: Mamposteria, desmonte de vigas cerchas, fundido de Columnas, cerramiento en lamina de zinc y tela verde, Pared.

Residente de obra Inspector SST Interventoria

Fecha: Jueves 25-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 8 trabajadores, 1 Residente, 1SST
Salida: 5:50 pm / clima: Soleado
Actividades Realizada: Mamposteria, desmonte de cerchas, topografia.
Pared: ~~Alcad sobre Pared~~

Residente de obra Inspector SST Interventoria

Scanned with CamScanner

Fecha: Viernes 26-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 8 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 5:20 pm / Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Mamposteria, demolición de columna, topografia.
Acord Sobre Pared

Residente de obra Inspector SST
Fecha: Sabado 27-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 8 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 12:30 pm / Clima: Soleado
Actividades Realizados: Mamposteria, Ingreso de material, topografia, pared.
Acord Sobre Pared

Residente de obra Inspector SST
Fecha: lunes 29-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 7 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: / Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Mamposteria, pared imperm., instalación de puntos sanitarios e hidraulicos, relleno de material seleccionado.
Se Realiza visita por parte de Edubar, Interventoria, Contratista se definen punto de conexion Electrica principal. a la cocina, se definen puntos abanico en el comedor y cocinas segun la ubicacion en el plano.

La acometida principal se define en calibre "4 AWG - #2F - #1N - #6-1T", El tablero se define de 12 circuitos.

IAG Emerson Sanchez
Edubar SA
Residente de obra
Interventoria Inspector.

Residente de obra Inspector SST Interventoria

Fecha: Martes 30-07-24
Entrada: 7:15 am / Asistencia: 6 trabajadora, 1 Residente, 1 SST
Salida 5:07 pm / Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Mamposteria, figurado de acero, pañete interm.

Residente de obra Inspector SST Interventoria

fecha: Miercoles 31-07-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 6 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 5:20 pm / Clima: Soleado
Actividades Realizados: Mamposteria, Montaje de vigas Dintel, pañete
NOTA: Se fue todo el dia la luz en el Colegio

Residente de obra Inspector SST Interventoria

Fecha: jueves 01-08-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 5 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 4:50 pm / Clima: Soleado
Actividades Realizada: Mamposteria, figurado de acero

Residente de obra Inspector SST Interventoria

Fecha: Viernes 02-08-24
Entrada: 7:30 am / Asistencia: 4 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 5:50 / Clima: Soleado
Actividades Realizada: Mamposteria, pañete

Residente de obra Inspector SST Interventoria

Fecha: Sabado 03-08-24
Entrada: 7:15 am / Asistencia: 4 trabajadores, 1 Residente, 1 SST
Salida: 12:50 pm / Clima: Soleado
Actividades Realizada: Mamposteria, trasnado de tuberia hidrosanitaria

Residente de obra Inspector SST Interventoria

Scanned with CamScanner

BITACORA IED BARRIO SIMÓN BOLÍVAR

FECHA: 02/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra.
- Maestro de obra

Actividad

- Visita de obra para verificar los alcances de la propuesta y el presupuesto

firma: [signature] Residente de obra

[signature] Asy Residente

[signature] Interventoría.

FECHA 03/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- MAESTRO de obra
- 1 Oficial de obra
- 2 Ayudantes de obra

Actividades

- Demolicion MURO DIVISORIO E=0,12
- Demolicion piso y plantilla existente
-

firma: [signature] Residente de obra

[signature] Asy Contratista

[signature] Interventoria

Fecha 04/07/2024
Personal
Director de obra
Residente de obra
MAESTRO de obra
1 oficial de obra
2 Ayudantes de obra
Actividades
- Desmonte cielo raso
- Desmonte LAMPARAS
- Desmonte puertas

firma: Residente de obra
Arq Contratista.
Catalina
Interventoria.

Fecha 05/07/2024
Personal
Director de obra
Residente de obra
Maestro de obra
1 oficial de obra
2 Ayudantes de obra.
- Actividades
- demolicion MURO MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO
- demolicion piso y plantilla
- ACARREO DE escombro

firma: Residente de obra
Arq Contratista
Catalina
Interventoria.

Fecha: 06/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra.
- Maestro de obra.

1 oficial de obra

2 Ayudante de obra

Actividades

- ACARREO DE ESCOMBROS.
- TRAZADO Y REPLANTEO
- Anclaje para mampostería

Firma: Residente de obra

Arq Contratista

Interventora.

Fecha: 08/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- MAestro de obra

1 oficial de obra

2 Ayudantes de Obra

Actividades

* MAmposteria BLOCK Tipo estructural E=0,14x0,19x
* ACARREO DE ESCOMBROS.

MAteriales

- MALLA PARA plantilla, ACERO CORRUGADO
- Arena y emina fracturada

firma: Residente de obra.

Arq Contratista

Fecha 09/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
1 oficial de obra
2 Ayudantes de obra

Actividades.

* Mamposteria muro divisorio
* Dobela en concreto gravilla
* ACARREO ESCOMBRO

Firma: Residente de obra

Arq Contratista.

Interventoria.

Fecha: 10/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
1 oficial de obra
2 Ayudante de obra

Actividades.

- Viga aerea
- ACARREO MATERIALES A 46 ML desde sitio de descar arena, triturado, BLOCK 0,14x0,19x0,39 y Baldosa de gr nito.

firma: Residente de obra

Arq Contratista

Fecha 11/09/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 2 Ayudantes de obra

Actividades

* Mampostería Block de 0.14 x 0.19 x 0.39.
* Dobelas en Concreto. grouting
* ACARREO DE MATERIALES.

Firma: _____ Residente de obra

Guillermo Vz — Arq Contratista.

Interventora.

Fecha 12/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra.
- 1 oficial de obra
- 2 Ayudantes de obra

Actividades

* Pañete en mortero 1:4 ALLANADO. MUROS.
* Plantilla con malla electrosoldada y concreto de 3000psi

Firma: _____ Residente de obra

Guillermo Vz — Arq Contratista

Interventora

FECHA 13/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- MAESTRO DE obra
- 1 oficial de obra
- 2 ayudantes de obra

Actividades

* Plantilla en concreto de 3000 psi e=10cm + malla electr
* Pañete allanado de 3000 psi
* ACARREO DE Materiales y ESCOMBRO.
* Retiro de escombros de demolicion en Volqueta de 8 mts^3 (3 viajes)

Firma: [signature]

Guillermo V.
Arq Contratista

[signature]
Interventora.

FECHA 15/07/2024

Personal

- Director de obra.
- Residente de obra.
- Maestro de obra.
- 2 oficiales de obra
- 2 Ayudantes de obra.
- 1 OFICIAL ELECTRICO.

ACTIVIDADES.

* INSTALACION piso de granito.
* ACARREO DE BALDOSAS de granito, arena y cemento
* regatas para instalaciones electricas.

Firma: [signature]
Residente de obra.

Guillermo
Arq Contratista

[signature]
Interventora

Fecha: 16/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 1 Ayudante de obra
- 1 oficial ELECTRICO

Actividades.

- Instalacion piso de granito 30x30
- instacion cableado para puntos electricos
- visita ingeniero electrico EDUBAR.

Firma: [redacted]
Residente de obra

Guillermo Vz.
Arquitecto

Interventoria.

FECHA 17/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 1 Ayudante de obra

actividades.

* instalacion piso de granito 30x30
* ACARREO DE materiales BALDOSAS, Arena y cemento del 1er piso al segundo piso

firma: [redacted]
Residente de obra

Guillermo Vz
Contratista Arquitecto

Interventoria

FECHA 18/07/2024

.Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 1 Ayudante de obra

Actividades de obra

* Resane piso de granito
* instalacion piso de granito.

Guillermo V. —
Arq. Contratista. —

Firma: ~~Interventor~~
Residente de obra

Interventoria

FECHA 19/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 2 Ayudantes de obra

Actividades.

* resague de piso en granito 30x30
* Pulida de Piso en granito.
* Organizacion tuberia de 1 3/4 Esquina Salon
* Tuberia de Media Empotrado en esquela. — Esquina —
* Tuberia de 1/2 organizacion. —

Interventoria.

Fecha 20/07/2024
- Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- Ayudante de obra
- oficial de obra

Actividades.
- Pulida de piso
- Detalles de mampostería.

Residente de obra

Fecha 22/07/2024
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra

Actividades.
- ESTUCO MUROS
- Escarcilada de muros con paños aventados.

Residente de obra

Fecha 23/07/2024
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- Maestro de obra
- oficial de obra
- Ayudante de obra

Actividades.
- ESTUCO MUROS
- Ayudante de obra

Residente de obra.

FECHA 24/07/2024
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- oficial de obra
- Ayudante de obra
Actividades
- ESTUCO MUROS
- ESCARCHADA de paredes, estuco y pintura en mal estado.

Residente de obra

FECHA 25/07/2024
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de Obra
- oficial de obra
- Ayudante de obra.
Actividades
- ESTUCO MUROS.
- ESCARCHADA de paredes, estuco y pintura en mal est

firma: Residente de obra

FECHA: 26/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra

Actividades.

- ESTUCO MUROS
- ASEO General de obra.

firma: Residente de obra

FECHA 27/07/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Maestro de obra
- Oficial de obra.
- Ayudante de obra

Actividades.

- Arreglo estructura metalica lona ya rota, con corrosion.

firma. Residente de obra

FECHA: 29/04/2024
Personal
Director de obra
Residente de obra
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudante de obra
Actividades.
- Arreglo de piedras los detalles piso.

firma: [signature] Residente de obra

FECHA: 30/07/2024
Personal
Director de obra
Residente de obra
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudante de obra
Actividades.
- ACARREO zocalo para piso en granito
- Detalles de Mamposteria Vanos puertas y ventanas

firmas: [signature] Residente de obra

FECHA: 31/07/2024.
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra
Actividades.
- trabajo de cableado electrico.

Firma: [redacted]
Residente de obra

Fecha: 01/08/2024

Personal

Director de obra

Residente de obra

Oficial de obra

Ayudante de obra

Actividades.

- Trabajo de cableado electrico.
- Acarreo material para cielo raso.

Firma: [redacted]
Residente de obra

Fecha: 02/08/2024

Personal

- Director de obra
- Residente de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra
- Actividades.
- instalacion zoccalos piso de granito.

Firma: [redacted]
Residente de obra

Fecha 03/08/2024.
- Director de obra
- Residente de obra
- oficial de obra
- Ayudante de obra
Personal auxiliar -> Oficial de acabados
- Pintura Anticorrosivo correas y cerramos metalicos
- instalacion zocalos.

Firma: Residente de obra

Fecha: 05/08/2024
Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Oficial de obra
- Ayudante de obra
- Personal Auxiliar -> oficial y Ayudante de acabados
- Actividades.
- Suministro e instalacion cielo raso en dry wall.
- regatas para instalacion tuberia de 1" + tubotex AA.

Firma: Residente de obra
