

DIAGRAMAS CIRCULARES


COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE E VERSALLES				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	6,98%	0%	-6,98%	31,15%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	28,36%	2%	-26,61%	31,15%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	46,53%	0%	-46,53%	31,15%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	52,26%	20,21%	-32,05%	31,15%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	54,24%	40,68%	-13,56%	31,15%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	61,07%	40,68%	-20,39%	31,15%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	78,75%	31,15%	-47,60%	31,15%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	85,33%	31,15%	-54,18%	31,15%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	45,56%	34,25%	-11,31%	31,15%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	50,27%	35,76%	-14,51%	35,76%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	53,43%	35,76%	-17,67%	35,76%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	59,88%	37,70%	-22,18%	35,76%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	61,61%	45,06%	-16,55%	45,06%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	63,34%	45,73%	-17,61%	45,06%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	67,88%	47,69%	-20,19%	45,06%

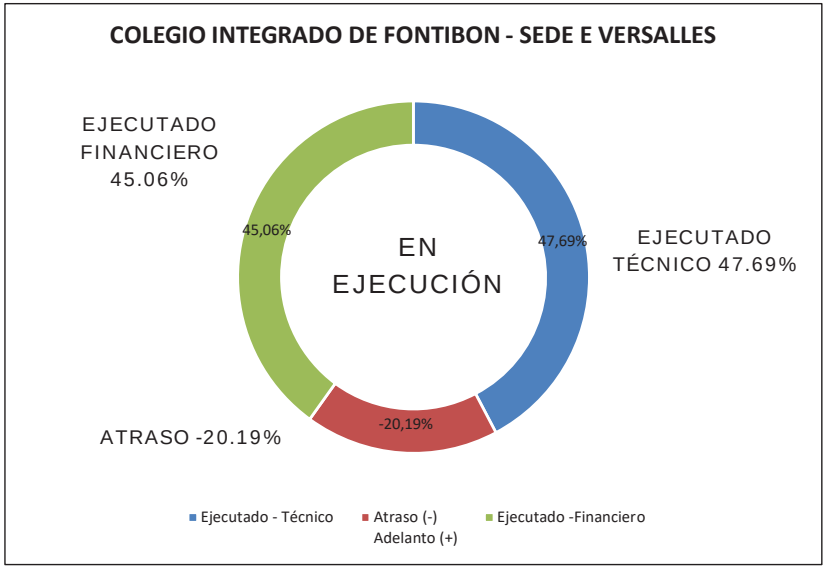


VILLEMAR DEL CARMEN SEDE A				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
O	0%	0%	0%	0%
NIO	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
L 6	8,67%	2,70%	-5,97%	0%
LIO	16,05%	5,83%	-10,22%	0%
LIO	11,80%	11,35%	-0,45%	0%
LIO	16,68%	11,35%	-5,33%	8,02%
L 3	6,21%	8,37%	2,16%	8,37%
	9,49%	20,51%	11,02%	8,37%
	21,90%	50,86%	28,96%	50,86%
	35,56%	50,86%	15,30%	50,86%
	49,89%	52,75%	2,86%	50,86%

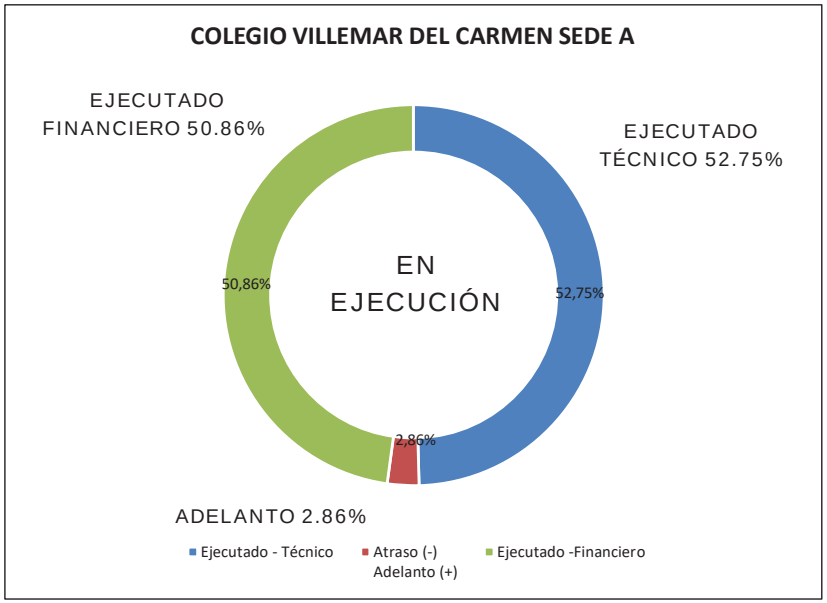


BRIEL BETANCOURTH MEJIA SEDE C VILLA MEJIA TAGASTE				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
O	0%	0%	0%	0%
IIO	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
L 6	1,15%	0%	-1,06%	0%
LIO	3,41%	0%	-3,32%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	3,05%	0%	-3,05%	0%
L 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0%	0%	0%	0%
	0%	18,10%	18,10%	18,10%
	3,05%	19,21%	16,16%	18,10%
	6,71%	30,14%	23,43%	18,10%

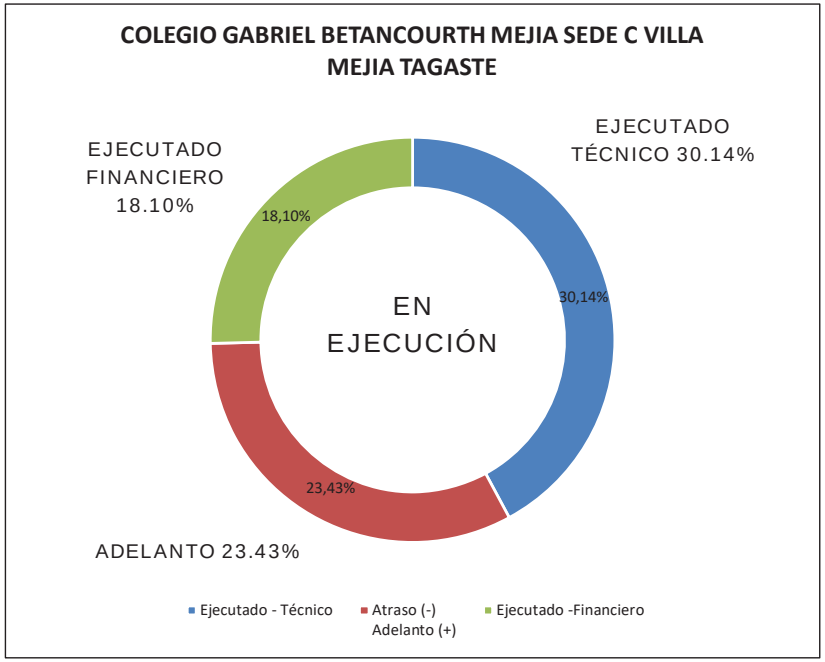


KENNEDY - SEDE A				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	10,16%	0%	-10,15%	0%
DE	12,65%	0%	-12,65%	0%
O	12,98%	0%	-12,98%	0%
NIO	19,71%	13,97%	-5,74%	0%
	21,12%	8,97%	-12,15%	16,71%
	25,52%	8,97%	-16,55%	16,71%
L 6	28,85%	19,99%	-8,86%	16,71%
LIO	33,88%	26,64%	-7,24%	16,71%
LIO	70,15%	47,70%	-22,45%	16,71%
LIO	80,89%	47,70%	-33,19%	46,10%
L 3	91,61%	78,20%	-13,41%	46,10%
	94,57%	82,95%	-11,62%	46,10%
	95,19%	100%	4,81%	100%
	95,80%	100%	4,20%	100%
	96,43%	100%	3,57%	100%

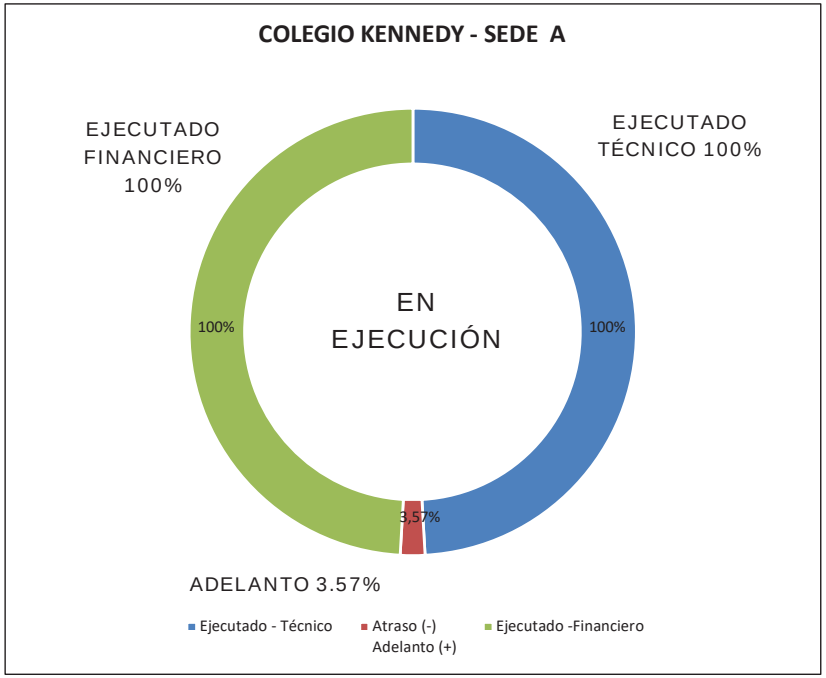


LA AMISTAD - SEDE A				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	7,95%	5,23%	-2,71%	4,89%
DE	31,42%	5,23%	-26,19%	4,89%
O	36,66%	5,23%	-31,43%	4,89%
IIO	41,91%	11,85%	-30,06%	4,89%
	48,28%	11,85%	-36,43%	9,20%
	54,66%	11,85%	-42,81%	9,20%
L 6	59,90%	14,73%	-45,17%	9,20%
LIO	66,76%	18,17%	-48,59%	9,20%
LIO	48,96%	22,71%	-26,25%	9,20%
LIO	53,65%	47,54%	-6,11%	47,54%
L 3	59,56%	68,62%	9,06%	47,54%
	60,24%	70,65%	10,41%	47,54%
	65,99%	84,59%	18,60%	84,59%
	85,16%	84,59%	-0,57%	84,59%
	99,43%	87,18%	-12,25%	84,59%

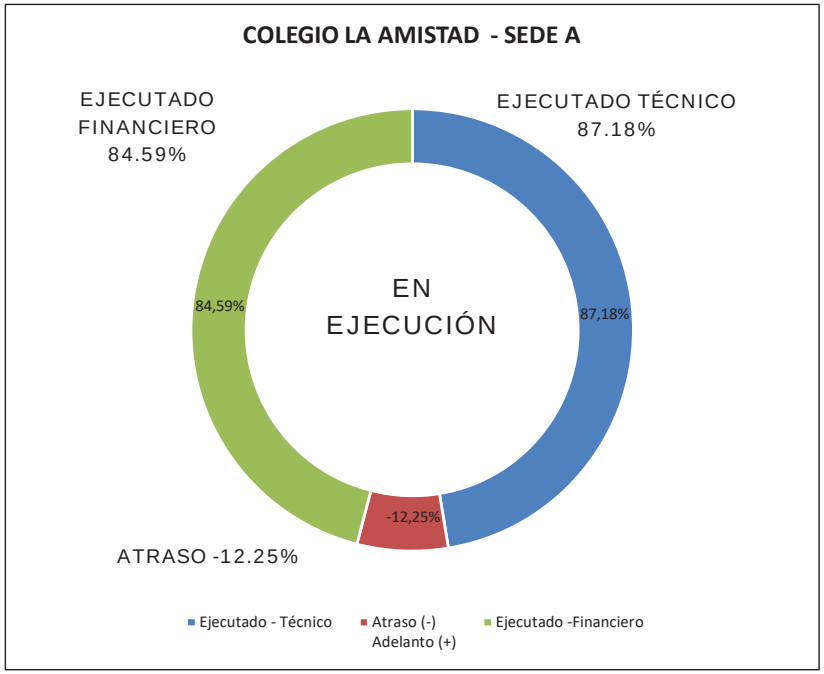


SAN RAFAEL - SEDE A				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0,00%	0,70%	0,70%	0,69%
DE	0,00%	0,70%	0,70%	0,69%
O	0,00%	0,70%	0,70%	0,69%
NIO	0,00%	3,88%	3,88%	0,69%
	3,30%	6,35%	3,05%	5,61%
	11,66%	6,35%	-5,31%	5,61%
L 6	13,02%	15,67%	2,65%	5,61%
LIO	15,14%	16,16%	1,02%	5,61%
LIO	21,96%	26,68%	4,72%	5,61%
LIO	30,78%	26,68%	-4,10%	21,14%
L 3	20,84%	22,85%	2,01%	21,14%
	23,23%	25,50%	2,27%	21,14%
	25,62%	33,79%	8,17%	33,79%
	43,80%	35,37%	-8,43%	33,79%
	44,66%	35,97%	-8,69%	33,79%

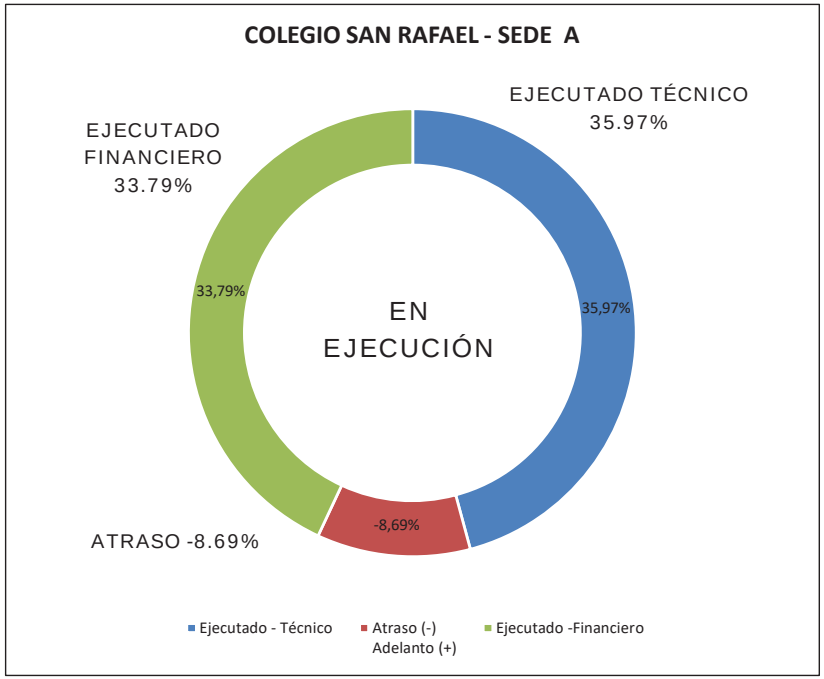


PAULO VI				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
O	0%	0%	0%	0%
NIO	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
L 6	0,55%	0,25%	-0,30%	0%
LIO	0,95%	1,34%	0,39%	0%
LIO	2,12%	2,37%	0,25%	0%
LIO	3,32%	2,37%	-0,95%	1,62%
L 3	3,19%	3,09%	-0,10%	1,62%
	5,89%	3,09%	-2,80%	1,62%
	10,44%	9,16%	-1,28%	9,16%
	13,31%	9,49%	-3,82%	9,16%
	15,98%	11,88%	-4,10%	9,16%

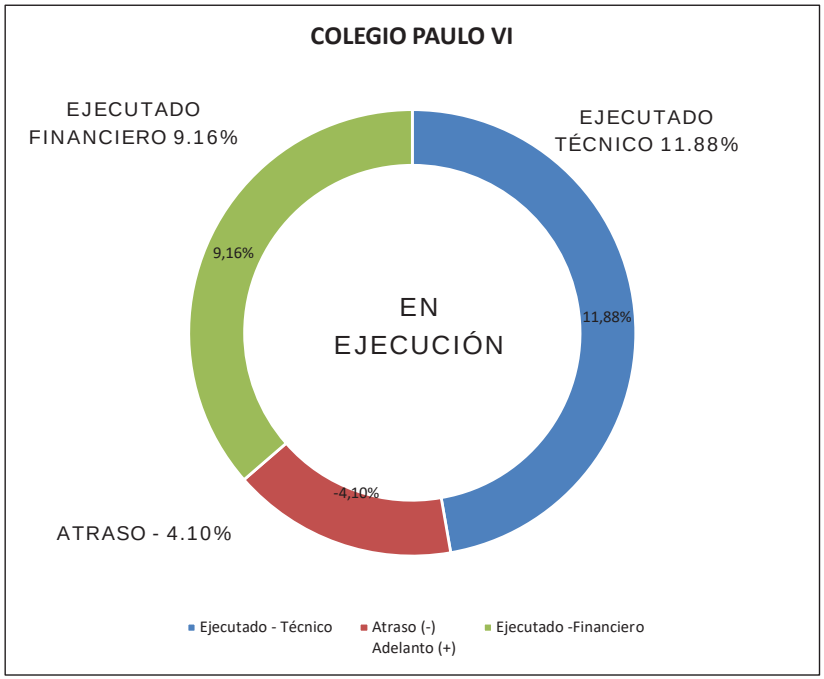


INEM SEDE A FRANCISCO DE PAULA SANTANDER				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	1,92%	1,11%	-0,81%	1,10%
DE	1,94%	1,11%	-0,83%	1,10%
O	2,03%	1,11%	-0,92%	1,10%
NIO	3,46%	1,31%	-2,15%	1,10%
	5,67%	2,38%	-3,29%	1,74%
	7,83%	2,38%	-5,45%	1,74%
L 6	7,49%	4,54%	-2,95%	1,74%
LIO	7,83%	5,59%	-2,24%	1,74%
LIO	10,15%	6,35%	-3,80%	1,74%
LIO	13,48%	15,41%	1,93%	15,41%
L 3	28,76%	33,19%	4,43%	15,41%
	34,01%	34,43%	0,42%	15,41%
	39,26%	50,34%	11,08%	50,34%
	44,52%	50,34%	5,82%	50,43%
	49,77%	52,41%	2,64%	50,34%

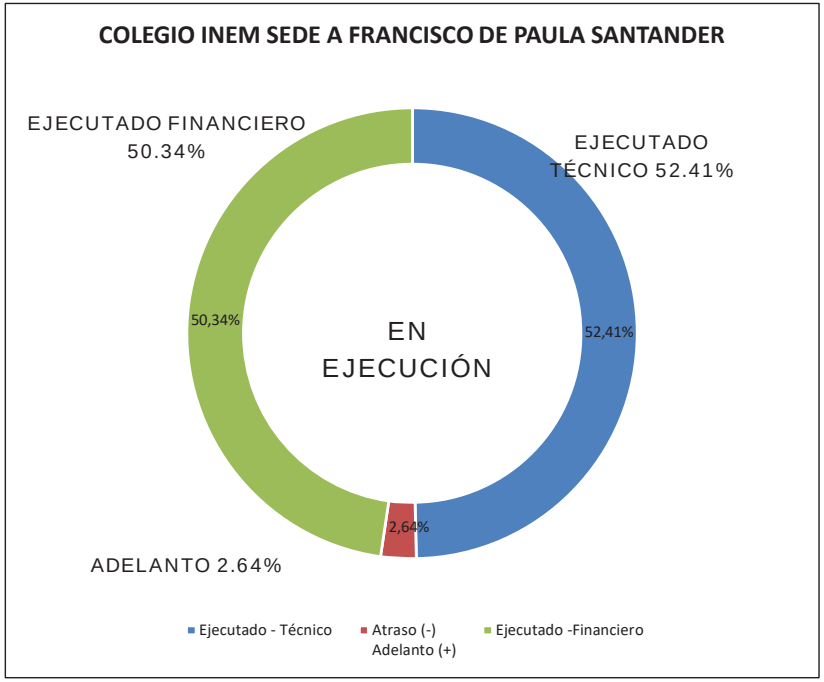


EL JAPON - SEDE A				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	16,69%	42,36%	25,67%	14,70%
DE	30,17%	42,36%	12,19%	14,70%
O	43,05%	42,36%	-0,69%	14,70%
IIO	51,50%	42,36%	-9,14%	14,70%
	58,10%	42,36%	-15,74%	41,64%
	64,70%	42,36%	-22,34%	41,64%
L 6	70,13%	47,45%	-22,68%	41,64%
LIO	77,37%	53,65%	-23,72%	41,64%
LIO	68,45%	55,21%	-13,24%	41,64%
LIO	72,93%	64,88%	-8,05%	64,88%
L 3	89,09%	72,99%	-16,10%	64,88%
	91,62%	72,99%	-18,63%	64,88%
	99,75%	81,44%	-18,31%	81,44%
	100%	81,44%	-18,56%	81,44%
	100%	85,67%	-14,33%	81,44%

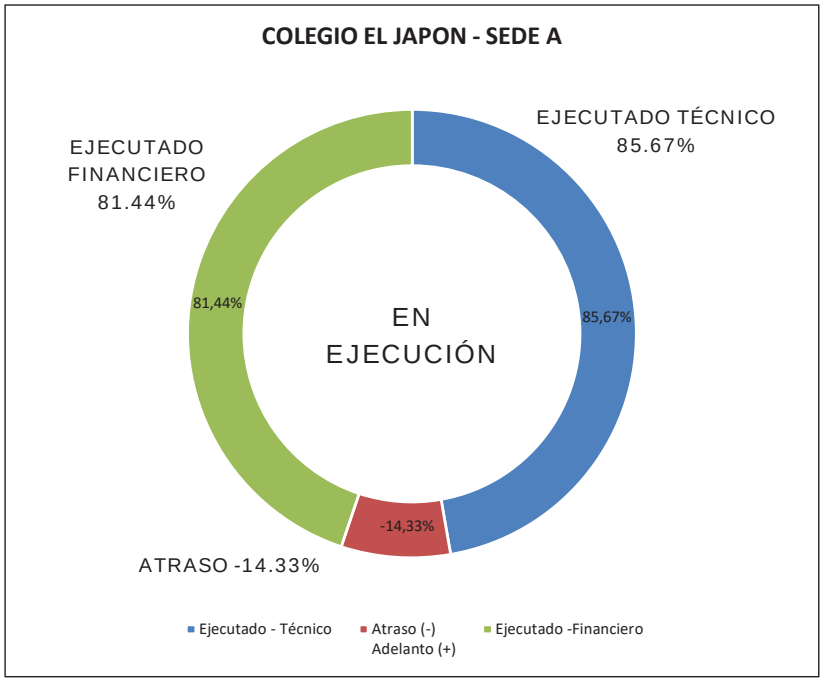


TOM ADAMS - SEDE A				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	5,13%	5,38%	0,25%	1,02%
DE	9,25%	5,38%	-3,87%	1,02%
O	13,83%	5,38%	-8,45%	1,02%
IIO	15,01%	5,38%	-9,63%	1,02%
	17,29%	5,38%	-11,91%	5,62%
	20,32%	5,38%	-14,94%	5,62%
L 6	25,21%	14,67%	-10,54%	5,62%
LIO	43,08%	20,84%	-22,24%	5,62%
LIO	36,55%	32,24%	-4,31%	5,62%
LIO	43,93%	32,24%	-11,69%	24,14%
L 3	50,60%	31,20%	-19,40%	24,14%
	55,76%	31,20%	-24,56%	24,14%
	59,90%	59,97%	0,07%	59,97%
	64,04%	62,24%	-1,80%	59,97%
	85,83%	63,82%	-22,01%	59,97%

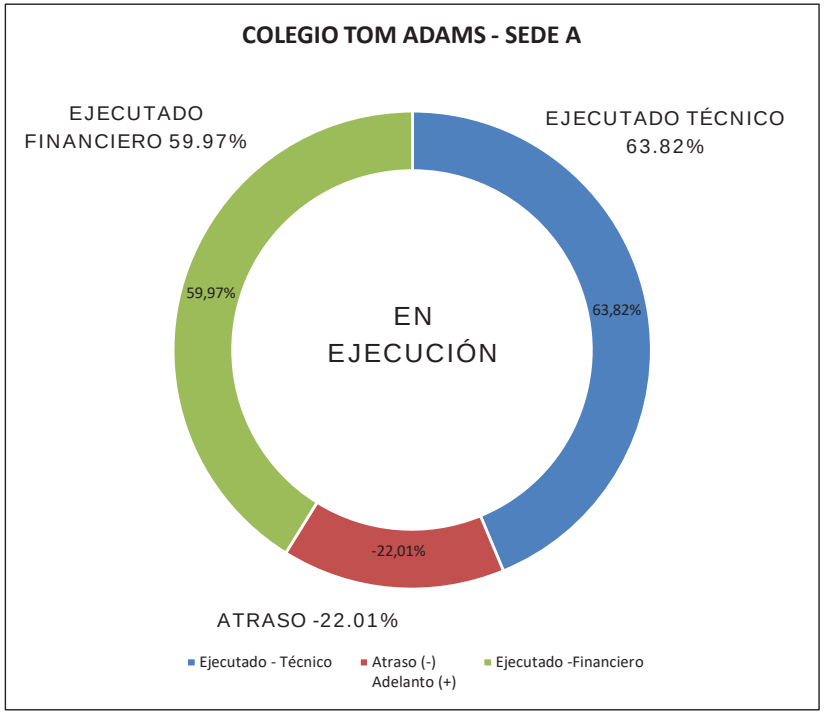


SAN PEDRO CLAVER - SEDE A				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	2,19%	7,15%	4,96%	1,14%
DE	20,11%	7,15%	-12,96%	1,14%
O	22,07%	7,15%	-14,92%	1,14%
IIO	22,88%	21,01%	-1,87%	1,14%
	23,33%	27,31%	3,98%	22,27%
	24,04%	27,31%	3,27%	22,27%
L 6	24,58%	23,32%	-1,26%	22,27%
LIO	32,52%	24,52%	-8,00%	22,27%
LIO	27,82%	25,41%	-2,41%	22,27%
LIO	31,57%	30,92%	-0,65%	30,92%
L 3	85,76%	38,63%	-47,13%	30,92%
	87,42%	41,68%	-45,74%	30,92%
	90,41%	49,06%	-41,35%	49,06%
	90,70%	50,37%	-40,33%	49,06%
	90,70%	50,99%	-39,71%	49,06%

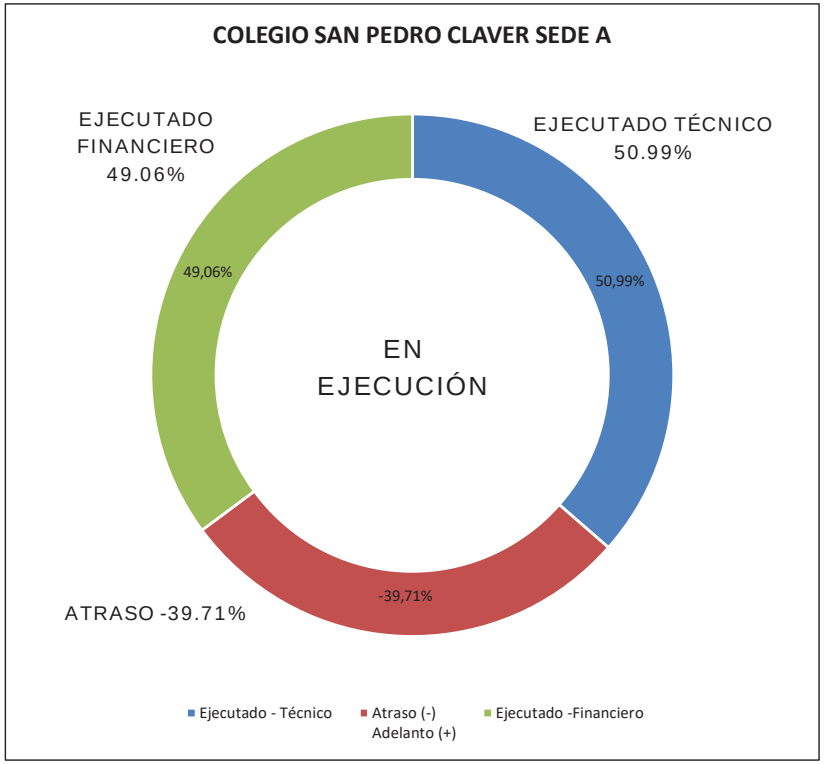


PINAR DEL RIO - SEDE C				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
O	0%	0%	0%	0%
IIO	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
L 6	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	7,09%	0%	-7,09%	0%
L 3	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0,00%	9,71%	9,71%	9,71%
	7,09%	11,68%	4,59%	9,71%
	14,15%	33,87%	19,72%	9,71%

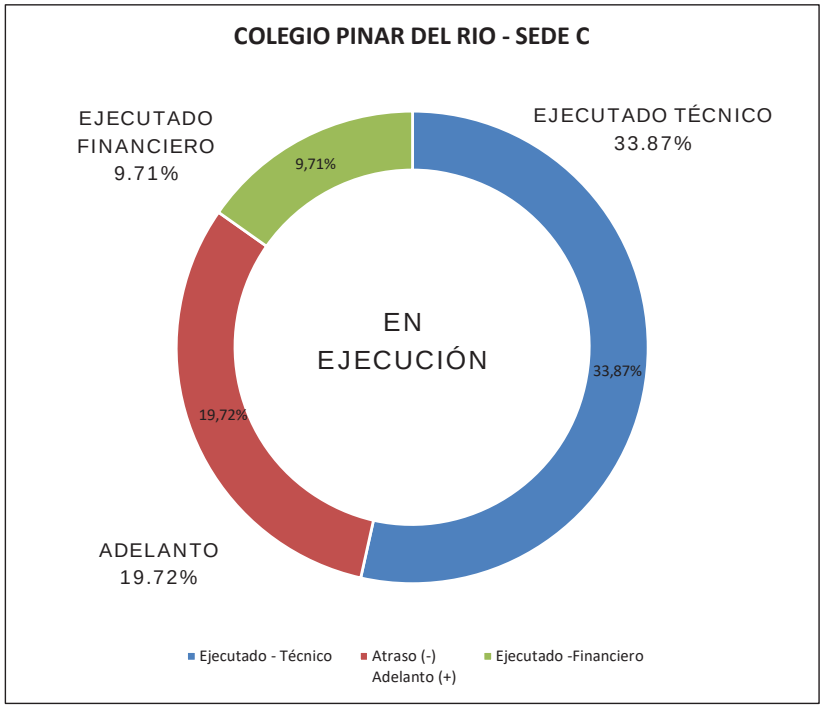


DILE KENNEDY				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
E	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
E	0%	0%	0%	0%
O	0%	0%	0%	0%
IO	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
L 6	0%	0%	0%	0%
IO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
3	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	3,52%	0%	-3,12%	0%

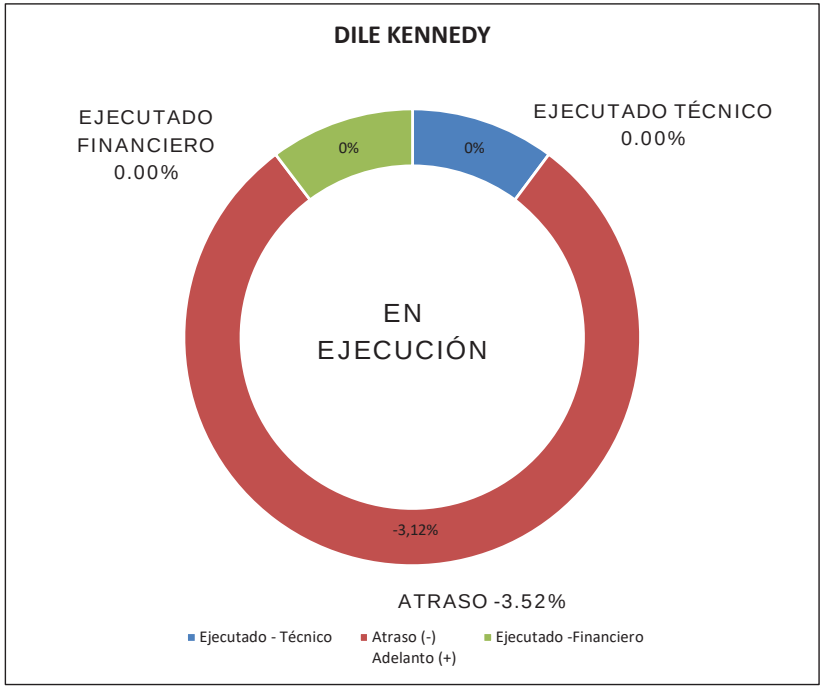


INEM Francisco de Paula Santander Sede B				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
E	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
E	0%	0%	0%	0%
O	0%	0%	0%	0%
IO	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
L 6	0%	0%	0%	0%
IO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
3	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	6,12%	0%	-6,12%	0%
	16,74%	0%	-16,74%	0%

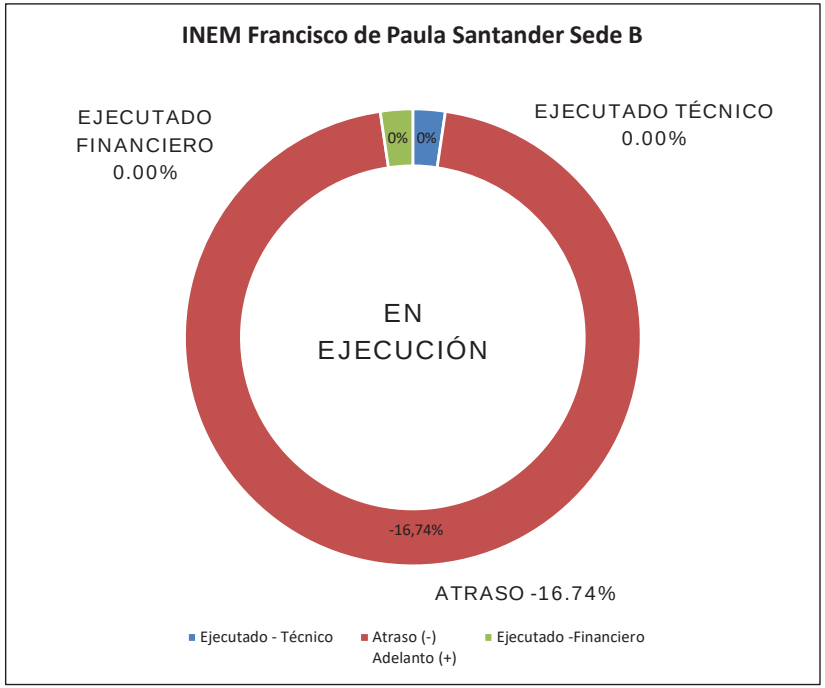


KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
E	0%	0%	0%	0%
O	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
E	0%	0%	0%	0%
O	0%	0%	0%	0%
IO	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
L 6	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
L 3	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	1,52%	7,72%	6,20%	0%

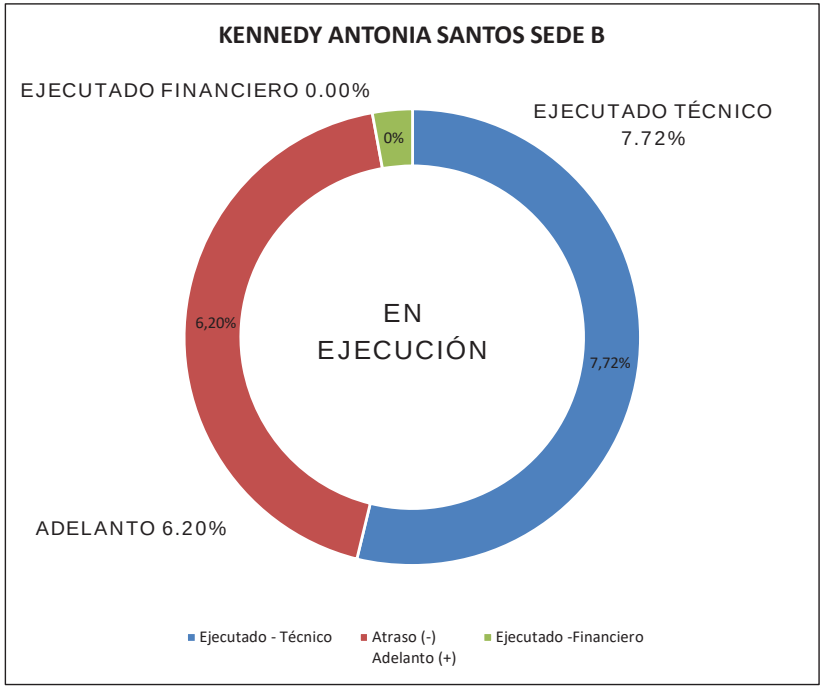

DILE FONTIBON				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
O	0%	0%	0%	0%
NIO	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
L 6	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
L 3	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	1,30%	0,38%	-0,92%	0%

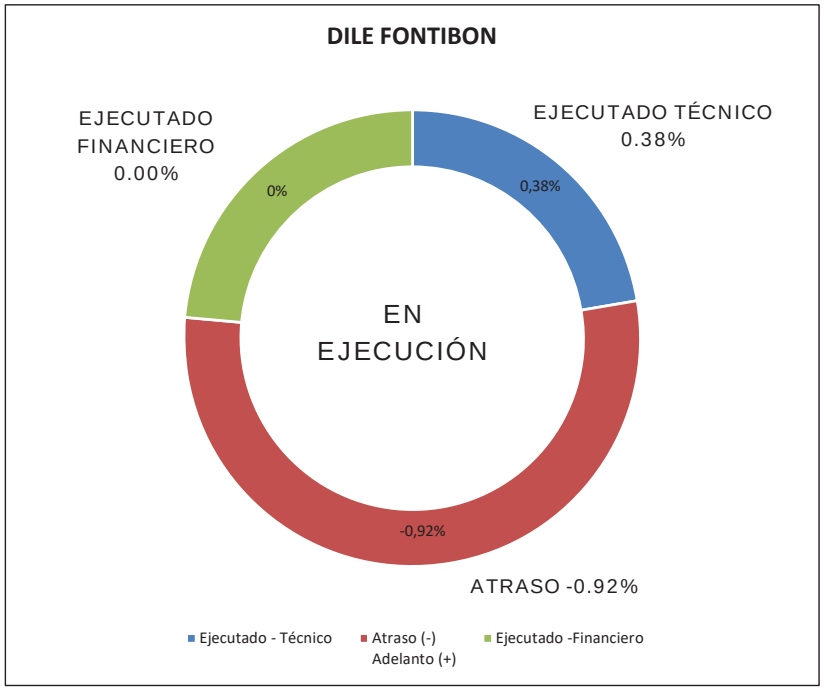

OTIC				
	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
RIL	0%	0%	0%	0%
RIL	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
YO	0%	0%	0%	0%
DE	0%	0%	0%	0%
O	0%	0%	0%	0%
NIO	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
L 6	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
LIO	0%	0%	0%	0%
L 3	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%

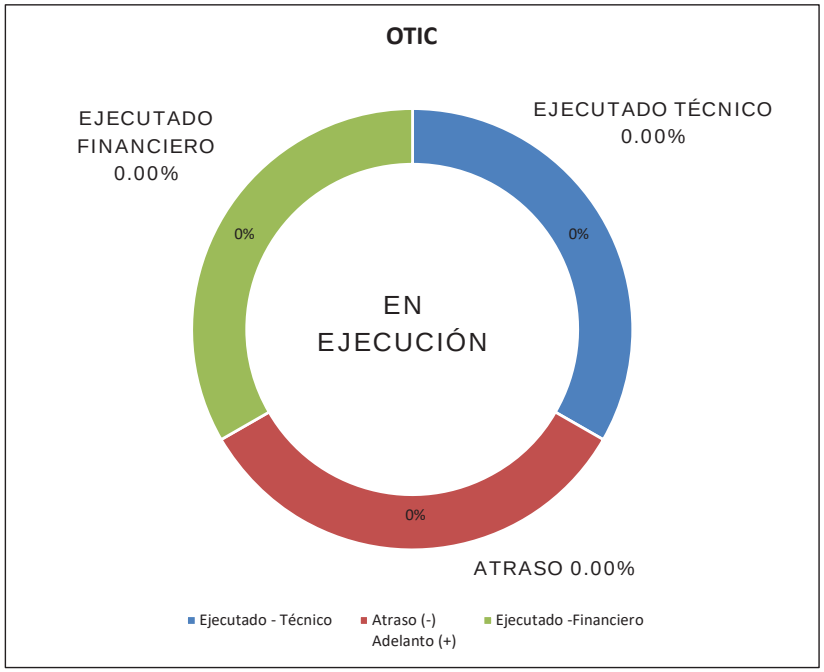

RESIDENTE INTERVENTORÍA
JHON EDISON REYES ROJAS

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MARTIN RAFAEL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 20 DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		
CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA	INFORME FOTOGRÁFICO	20
INTERVENTORIA CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO	OBRA 14 FRENTES INTERVENIDOS	

COLEGIO INEM SEDE A - ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACIÓN DE CUBIERTA.







COLEGIO EL JAPON - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PERGOLA, INSTALACIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS





DILE FONTIBON





COLEGIO SAN RAFAEL SEDE A







REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 20 DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		
CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA	INFORME FOTOGRÁFICO	20
INTERVENTORIA CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO	OBRA 14 FRENTES INTERVENIDOS	

COLEGIO TOM ADAMS - CONSTRUCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.





COLEGIO SAN PEDRO CLAVER - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y FUNDIDA DE PLACA DE CONTRAPISO.







COLEGIO INTEGRADO FONTIBON







COLEGIO PABLO VI - PICADO Y PAÑETE DE MUROS EXISTENTES, EXCAVACIONES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA Y DESMONTE DE VENTANAS EXISTENTES.









REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 20 DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA	INFORME FOTOGRÁFICO	20
INTERVENTORIA CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO	OBRA 14 FRENTES INTERVENIDOS	

COLEGIO LA AMISTAD - CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACIÓN DE CUBIERTA, CARGUE DE PISO PARA INSTALACIÓN DE PORCELANATO.







COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN SEDE A - DEMOLICIÓN Y FUNDIDA DE PLACA DE CONCRETO PLAZOLETA INTERNA.








COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA - INSTALACIÓN DE PUERTAS








LA AMISTAD - PINAR DEL RIO SEDE C







	INFORME SEMANAL	21

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION

SEMANA N°	21	DEL	1 de septiembre de 2024	AL	7 de septiembre de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	Contrato No .	No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	Fecha de Iniciación	15/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	Fecha de Terminación	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	Plazo Inicial	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 504.777.262	Valor inicial	$ 6.322.397.994
Adiciones	$ 79.569.271,00	Adiciones	0
Prorroga	TRES (3) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS. (31-12-2024)	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20%	-4,05%
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%
16	GRUPO 7	16,70%	6,56%	23,26%	31,55%	-8,29%
17	GRUPO 7	23,26%	2,18%	25,44%	34,28%	-8,84%
18	GRUPO 7	25,44%	10,33%	35,77%	37,69%	-1,92%
19	GRUPO 7	35,77%	1,19%	36,96%	42,30%	-5,34%
20	GRUPO 7	36,96%	1,97%	38,93%	45,96%	-7,03%
21	GRUPO 7	38,93%	2,24%	41,17%	49,60%	-8,43%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | ACTIVIDADES

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	96,73%	49,94%	-46,79%	96,73%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salones del segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Construcción e instalación de estructura metalica y cubierta, para la pergola de la zona de juegos exterior. Instalación de tuberia electrica. Pintado de muros interiores.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizarón el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	61,40%	52,91%	-8,49%	61,40%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquín e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
3	DILE Fontibón	2,04%	6,17%	4,13%	2,04%	1. Cambio de Cielo Raso y puertas. 2. Suministro e instalación de tanque de agua. 3. Se revisara por parte de la SED, una plataforma o ascensor para personal en condición de discapacidad.	Instalación de estructura para cielo raso	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto.
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Construcción de cerramiento en malla, de los equipos de aire acondicionado externos.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	29,89%	0,00%	-29,89%	29,89%	1.- Mantenimiento de CUBIERTAS 2.- Mantenimiento de JUNTAS edificios (queden como las del fondo) 3.- Impermeabilización de Terrazas 4.- Cambio de piezas de GRES rotas 5.- Refuerzo ventanas aulas 304 y 305	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.

6	Gabriel Betancourt Mejía	10,38%	40,47%	30,09%	10,38%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	Instalación de ventanas.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
7	KENNEDY SEDE A	97,11%	100%	2,89%	97,11%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Las actividades de intervención ya fueron terminadas, se encuentra en proceso de entrega.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
8	LA AMISTAD SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	1-Construcción de auala modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Instalación de cubierta, para la zona de alimentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
9	SAN RAFAEL SEDE A	46,62%	37,98%	-8,64%	46,62%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Instalación de adoquines.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
10	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	21,92%	33,87%	11,95%	21,92%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Instalación de ventanas y puertas.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
11	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	55,10%	54,48%	-0,62%	55,10%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta, construcción e instalación de estructura metalica. Instalación de cubierta. Atención de emergencia, cambio de tuberia de agua potable.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
12	El Japón	100,00%	92,47%	-7,53%	100,00%	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	Construcción e intalación de estructura metalica. Instalación de de tuberia e cableado electrico.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. En reunión realizada en el Colegio, por parte de la SED se solicito la construcción de una pergola sobre el area restante de la zona de alimentación
13	Tom Adams	95,14%	79,59%	-15,55%	95,14%	1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance. 3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	Construcción y montaje de estructura metalica, en la zona de alinmentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
14	KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B	1,67%	9,24%	7,57%	1,67%	1. - Mejoramiento integralde 2 baterias de baños 2 - Cambio de cubiertas en los baños 3 - Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias, 4-Cambio de pisos en 7 aulas 5-Cambio de carpinteria metalica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balonzos	Demolición de placa existente y excavaciones para estructura de pavimento.	El 19 de julio del 2024 se definio el inicio de las actividades en este colegio de acuerdo al recorrido realizado el 14 de mayo, entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio. El contratista se encuentra a la espera de la entrega del colegio por parte de la SED para el incio de actividades, de acuerdo a la reunión del 12 de agosto del 2024, las instalaciones seran habilitadas el 23 de agosto del 2024.
15	Paulo VI SEDE A	18,64%	12,19%	-6,45%	18,64%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañete de muros existentes. Desmonte de ventanas. Instalación de tuberia de desague. Instalación de tuberia agua potable. Fundida de viga de cimentación.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	90,70%	51,17%	-39,53%	90,70%	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal.	Mamposteria para antepechos. Cinta de concreto.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024.


16	SAN PEDRO CLAVER SEDE 7	90,70%	51,17%	-39,53%	90,70%	2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Desmonte, nivelación e instalación de adoquines existentes.	Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
17	DILE Kennedy	5,92%	0,00%	-5,92%	5,92%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto.
NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.								

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO INCIAL INCLUIDO AIU	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	$ 6.322.397.994	$ 2.137.008.309,00	$ 4.185.389.685	66,20%
MODIFICATORIO.	$ -	$ -	$ -	$ -

3.1. VALOR DE LAS ACTAS			
Descricion de las actas		Valor acta	Saldo del contrato
Acta de corte N°1.	Comprende el periodo del 15 de abril al 14 de mayo del 2024	$ 61.303.102,00	$ 6.261.094.892
Acta de corte N°2.	Comprende el periodo del 15 de mayo al 14 de junio del 2024	$ 358.335.384,00	$ 5.902.759.508
Acta de corte N°3.	Comprende el periodo del 15 de junio al 14 de julio del 2024	577.341.488,00	$ 5.325.418.020
Acta de corte N°4.	Comprende el periodo del 15 de julio al 14 de agosto del 2024	1.140.028.335,00	$ 4.185.389.685
Acta de corte N°5.			
Acta de corte N°6.			
Acta de corte N°7.			
Acta de corte N°8.			
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA Y PORCENTAJE EJECUCION MAS MODIFICATORIO	$ 2.137.008.309	33,80%

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
OFICIALES	0	OFICIALES	9
AYUDANTES	0	AYUDANTES	19
ALMACENISTA	0	ALMACENISTA	1
MUJERES NO CALIFICADAS	0	MUJERES NO CALIFICADAS	0
INSPECTOR DE OBRA O INTERVENTORIA	2	INSPECTOR DE OBRA	3
INGENIERO RESIDENTE OBRA E INTERVENTORIA	2	INGENIERO RESIDENTE	2
DIRECTOR DE OBRA O INTERVENTORIA	1	DIRECTOR DE OBRA	1
ASESOR SST	1	ASESOR SST	1
AUXILIAR SST	1	AUXILIAR SST	1
ASESOR AMBIENTAL	1	ASESOR AMBIENTAL	1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

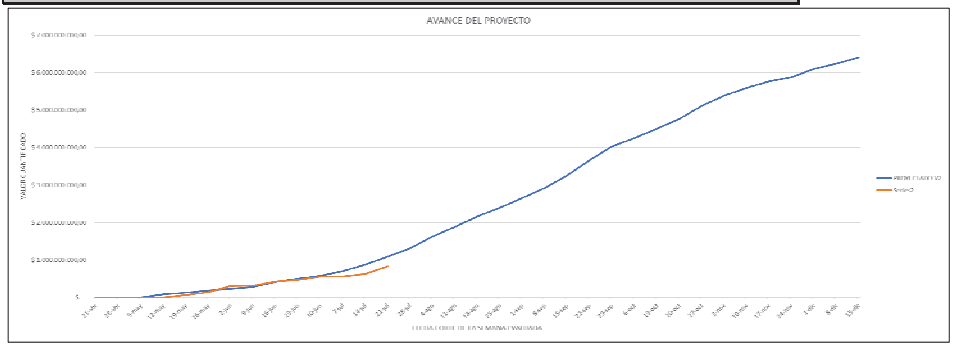

BALANCE DEL CONTRATO				
No.	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO V2	DIFERENCIA
1	Integrado de Fontibón	$ 109.963.240,00	$ 199.272.460,89	$ -89.309.220,89
2	Villemar el Carmen	$ 130.265.276,00	$ 140.705.181,13	$ -10.439.905,13
3	DILE Fontibón	$ 83.662.772,00	$ 112.598.025,34	$ -28.935.253,34
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	$ 12.621.176,00	$ 12.705.194,82	$ -84.018,82
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	$ 257.631.233,00	$ 20.931.326,70	$ 236.699.906,30
6	Gabriel Betancourt Mejía	$ 137.470.832,00	$ 138.973.186,13	$ -1.502.354,13
7	Kennedy Sede A	$ 282.844.409,94	$ 168.966.452,81	$ 113.877.957,13
8	La Amistad Sede A	$ 291.400.787,00	$ 132.860.767,71	$ 158.540.019,29
9	San Rafael - Sede A	$ 419.806.996,00	$ 568.362.073,60	$ -148.555.077,60
10	Paulo VI	$ 1.070.438.856,10	$ 860.241.316,16	$ 210.197.539,94
11	La Amistad Pinar del Rio	$ 237.789.266,00	$ 124.683.607,70	$ 113.105.658,30
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	$ 932.915.494,00	$ 1.287.054.496,80	$ -354.139.002,80
13	El Japón	$ 341.508.416,36	$ 201.222.498,75	$ 140.285.917,61
14	Tom Adams	$ 323.933.646,00	$ 141.147.610,90	$ 182.786.035,10
15	Kennedy ANTONIA SANTOS SEDE B	$ 412.697.198,60	$ 375.814.029,97	$ 36.883.168,63
16	San Pedro Claver	$ 608.667.636,00	$ 775.815.363,32	$ -167.147.727,32
17	DILE Kennedy	$ 394.884.590,00	$ 349.194.251,16	$ 45.690.338,84
	Emergencias	$ 373.896.169,00	$ 373.896.169,00	$ -
	TOTAL	$ 6.422.397.994,00	$ 5.984.444.012,89	$ 437.953.981,11

PROGRAMACION SEMANAL

PRESUPUESTO ASIGNADO													
No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
1	**Integrado de Fontibón**	E	Versalles			$ 199.272.461	KR 108 #22-34						En intervención
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	190,4			$ 5.697,00	$ 844.986,21	$ 1.084.708,80	0,54%	190,40	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	198,42			$ 33.321,00	$ 5.150.387,80	$ 6.611.552,82	3,32%	198,42	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	107,49			$ 25.899,00	$ 2.168.640,27	$ 2.783.883,51	1,40%	107,49	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	328,38			$ 19.300,00	$ 4.937.083,43	$ 6.337.734,00	3,18%	328,38	
	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M	240,6			$ 12.004,00	$ 2.249.873,33	$ 2.888.162,40	1,45%	240,60	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).			M2	172,87			$ 231.879,00	$ 31.226.082,99	$ 40.084.922,73	20,12%	172,87	
2	**Villemar el Carmen**	A	Villemar El Carmen			$ 140.705.181	CL 20D #96G-51						Sin intervención
								0	0	0	0	0	
3	**DILE Fontibón**	N/A				$ 112.598.025	CL 25B #88-55						Sin intervención
								0	0	0	0	0	
4	**Fábrica de Tizas - OTIC Data Center**	N/A				$ 12.705.195	CL 17 # 68-83						Sin intervención
								0	0	0	0	0	
5	**INEM Francisco de Paula Santander**	B	Casablanca			$ 20.931.327	KR 79N #35A-09 sur						Sin intervención
								0	0	0	0	0	
6	**Gabriel Betancourt Mejía**	C	Villa Mejia Tagaste			$ 138.973.186	CL 11a # 88a-27						Sin intervención
								0	0	0	0	0	
7	**Kennedy**	B	Antonia Santos II			$ 375.814.030	CL 25 sur #69c-34						En intervención
								0	0	0	0	0	
8	**La Amistad**	C	Pinar Del Rio			$ 124.683.608	KR 83 #40bis-36 sur						En intervención
								0	0	0	0	0	
9	**San Rafael**	A	San Rafael			$ 568.362.074	TV 78I #42B-81 sur						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	-			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	583,37			$ 5.697,00	$ 2.588.968,52	$ 3.323.458,89	0,46%	583,37	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	40,80			$ 31.660,00	$ 1.006.253,80	$ 1.291.728,00	0,18%	40,80	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	97,13			$ 33.321,00	$ 2.521.203,34	$ 3.236.468,73	0,44%	97,13	
	MANTENIMIENTOS												
	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)			M2	8,80			$ 34.827,00	$ 238.745,50	$ 306.477,60	0,04%	8,80	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)			M2	97,13			$ 193.088,00	$ 14.609.828,96	$ 18.754.637,44	2,57%	97,13	
	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA			M2	97,13			$ 4.613,00	$ 349.038,47	$ 448.060,69	0,06%	97,13	
10	**Paulo VI**	A	Paulo VI			$ 860.241.316	KR 78N #41-17/21 sur						En intervención
										0			
11	**La Amistad**	A	La Amistad			$ 132.860.768	KR 78 #35-30 sur						En intervención
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	0,00			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	100,05			$ 5.697,00	$ 444.017,18	$ 569.984,85	0,33%	100,05	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	30,06			$ 31.660,00	$ 741.372,28	$ 951.699,60	0,56%	30,06	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M3	3,55			$ 306.480,00	$ 847.553,17	$ 1.088.004,00	0,64%	3,55	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	100,05			$ 33.499,00	$ 2.610.870,88	$ 3.351.574,95	1,97%	100,05	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	7,06			$ 28.198,00	$ 155.081,31	$ 199.077,88	0,12%	7,06	
	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	6,00			$ 138.026,00	$ 645.132,04	$ 828.156,00	0,49%	6,00	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	48,29			$ 68.329,00	$ 2.570.388,26	$ 3.299.607,41	1,93%	48,29	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	15,01			$ 193.254,00	$ 2.259.673,24	$ 2.900.742,54	1,70%	15,01	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	23,28			$ 212.676,00	$ 3.856.895,91	$ 4.951.097,28	2,90%	23,28	
	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CAL. 10, HUECO DE 2"X 2"			M2	7,06			$ 118.295,00	$ 650.590,25	$ 835.162,70	0,49%	7,06	
12	**INEM Francisco de Paula Santander**	A	Inem Francisco De Paula			$ 20.931.327	CL 38C sur # 79-08						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	-			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	2.150,00			$ 5.697,00	$ 9.541.598,50	$ 12.248.550,00	45,59%	2.150,00	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	211,90			$ 31.660,00	$ 5.226.107,35	$ 6.708.754,00	24,97%	211,90	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)			UN	181,00			$ 10.034,00	$ 1.414.780,71	$ 1.816.154,00	6,76%	181,00	
	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO			UN	12,00			$ 81.832,00	$ 764.963,78	$ 981.984,00	3,65%	12,00	
	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)			M	168,00			$ 6.053,00	$ 792.166,39	$ 1.016.904,00	3,78%	168,00	
13	**El Japón**	A	El Japon			$ 201.222.499	KR 78G #38C-11 sur						En intervención
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	-			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	218,92			$ 5.697,00	$ 971.556,63	$ 1.247.187,24	0,48%	218,92	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	57,70			$ 31.660,00	$ 1.423.059,90	$ 1.826.782,00	0,71%	57,70	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS										0,00%		
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	240,44			$ 66.647,00	$ 12.483.138,33	$ 16.024.604,68	6,20%	240,44	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	240,44			$ 33.499,00	$ 6.274.440,73	$ 8.054.499,56	3,12%	240,44	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	71,16			$ 80.080,00	$ 4.439.115,68	$ 5.698.492,80	2,21%	71,16	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	32,84			$ 193.254,00	$ 4.943.882,03	$ 6.346.461,36	2,46%	32,84	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	32,84			$ 212.676,00	$ 5.440.741,48	$ 6.984.279,84	2,70%	32,84	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION			M2	218,92			$ 102.814,00	$ 17.533.723,52	$ 22.508.040,88	8,71%	218,92	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2.96 kg/m2)			M2	256,14			$ 22.800,00	$ 4.549.343,30	$ 5.839.992,00	2,26%	256,14	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO			M3	21,89			$ 59.753,00	$ 1.018.924,34	$ 1.307.993,17	0,51%	21,89	
14	**Tom Adams**	**A**	**Tom Adams**			**$ 141.147.611**	**CL 40J sur #78-08**						**En intervención**
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	-			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	153,53			$ 5.697,00	$ 681.358,89	$ 874.660,41	0,48%	153,53	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	28,40			$ 31.660,00	$ 700.431,57	$ 899.144,00	0,50%	28,40	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M3	1,51			$ 306.480,00	$ 360.508,53	$ 462.784,80	0,26%	1,51	
	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M	7,27			$ 98.488,00	$ 557.768,76	$ 716.007,76	0,40%	7,27	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	13,62			$ 28.198,00	$ 299.179,53	$ 384.056,76	0,21%	13,62	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	0,90			$ 13.736,00	$ 9.630,29	$ 12.362,40	0,01%	0,90	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	41,33			$ 80.080,00	$ 2.578.255,36	$ 3.309.706,40	1,83%	41,33	
	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CAL. 10, HUECO DE 2"X 2"			M2	7,89			$ 118.295,00	$ 727.076,07	$ 933.347,55	0,52%	7,89	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	CORTE DE RAICES ARBOL A NIVEL DE EMPRADIZACION			UN	1,00			$ 429.805,00	$ 334.817,32	$ 429.805,00	0,24%	1,00	
15	**Kennedy**	**A**	**Kennedy**			**$ 168.966.453**	**CL 5 sur #72a-69**						**Sin intervención**
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	491,00			$ 5.697,00	$ 2.179.034,82	$ 2.797.227,00	1,29%	491,00	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	104,00			$ 31.660,00	$ 2.564.960,66	$ 3.292.640,00	1,52%	104,00	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	116,02			$ 24.468,00	$ 2.211.402,48	$ 2.838.777,36	1,31%	116,02	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	608,87			$ 14.193,00	$ 6.731.862,51	$ 8.641.691,91	3,98%	608,87	
	DESMONTE DE ADOQUIN EN CONCRETO MACIZO 10 ANCHO X20 LARGO X 4.5 ALTO CM COLOR OCRE INCLUYE DEMOLICION DE CINTAS Y TRASIEGO DE MATERIAL			M2	58,01			$ 25.811,00	$ 1.166.390,99	$ 1.497.296,11	0,69%	58,01	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	LIMPIEZA DE PLACA BASE MEJORAMIENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	58,01			$ 7.470,00	$ 337.566,95	$ 433.334,70	0,20%	58,01	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM			M2	58,01			$ 294.039,00	$ 13.287.530,10	$ 17.057.202,39	7,86%	58,01	
16	**San Pedro Claver**	**A**	**San Pedro Claver**			**$ 775.815.363**	**KR 79C #41B-51 sur**						**En intervención**
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	-			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	545,80			$ 5.697,00	$ 2.422.234,63	$ 3.109.422,60	0,31%	545,80	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	90,20			$ 31.660,00	$ 2.224.610,11	$ 2.855.732,00	0,29%	90,20	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	61,22			$ 66.647,00	$ 3.178.413,45	$ 4.080.129,34	0,41%	61,22	
	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	11,09			$ 89.974,00	$ 777.293,50	$ 997.811,66	0,10%	11,09	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	12,10			$ 80.080,00	$ 754.824,34	$ 968.968,00	0,10%	12,10	
	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	273,80			$ 68.329,00	$ 14.573.872,56	$ 18.708.480,20	1,88%	273,80	
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	33,10			$ 51.806,00	$ 1.335.809,46	$ 1.714.778,60	0,17%	33,10	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	78,75			$ 193.254,00	$ 11.855.380,93	$ 15.218.752,50	1,53%	78,75	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	78,75			$ 212.676,00	$ 13.046.845,06	$ 16.748.235,00	1,68%	78,75	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)			M3	3,46			$ 908.627,00	$ 2.449.053,07	$ 3.143.849,42	0,32%	3,46	
	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)			M	105,60			$ 141.097,00	$ 11.606.951,16	$ 14.899.843,20	1,50%	105,60	
	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION			M2	545,80			$ 102.814,00	$ 43.714.170,91	$ 56.115.881,20	5,63%	545,80	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI			KG	1.499,37			$ 6.691,00	$ 7.815.131,78	$ 10.032.284,67	1,01%	1.499,37	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2.96 kg/m2)			M2	638,59			$ 22.800,00	$ 11.342.098,62	$ 14.559.852,00	1,46%	638,59	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"X3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE			UN	18,00			$ 207.295,00	$ 2.906.683,80	$ 3.731.310,00	0,37%	18,00	
	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M			M2	11,52			$ 36.233,00	$ 325.157,09	$ 417.404,16	0,04%	11,52	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO			M3	50,51			$ 59.753,00	$ 2.351.113,21	$ 3.018.124,03	0,30%	50,51	
17	**DILE Kennedy**	**N/A**				**$ 349.194.251**	**KR 78j #39 sur (esquina)**						**Sin intervención**

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
										0			
Total						$ 4.344.424.674			$ 326.897.628,32	$ 419.638.485,48			

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

En las actividades de ejecuciòn comprendido entre el periodo del 1 al 7 de septiembre del 2024, se presenta un retraso acumulado del -8,43%, entre ejecutado vs programado, aumentando en un -1,40%, respecto a lo reportado en la semana anterior. Se acalara que la fecha del contrato termina el 14 de diciembre.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

a). El dia 15 de abril se suscribio el acta de inicio del contrato de obra

b). I.E.D. KENNEDY. Ya fueron concluidas las actividades de intervención sobre este colegio. Por otra parte se realizo un recorrido para la verificación de los pendientes. A la espera de la atención de los pendientes para la entrega final.

c). EN JARDIN INFANTIL INTEGRADO DE FONTIBÓN SEDE E. Durante este periodo se realizo la instalación de la tuberia para las redes electricas e iluminación, contrucción e instalación de estructura metalica y fundida de placa de concreto para el tanque de agua potable, tambien se iniciaron con las actividades de pintura de muros interiores.

d). I.E.D. INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A. El Contratista de obra continua con el desmonte de cubierta, contrución e instalación de la estructura metalica e instalación de cubierta. Por otra parte se continua con las actividades de la demolición de piso, excavaciones e instalación de tuberia para la atención de la emergencia.

e). I E.D SAN RAFAEL. El Contratista de obra continua con las actividades de instalación de adoquines.

f). I E.D EL JAPON. El Contratista esta realizando actividades de construcción e instalación de estructura metalica para la pergola en la zona restante. Tambien realizo actividades de instalación de tuberia para redes electricas e iluminación.

g). I E.D LA AMISTAD. Continua con la construcción e instalación de la estructura metalica, actividades de instalación de cubierta, cargue de piso e instalación de porcelanato.

h). I E.D TOM ADAMS. El Contratista continua con las actividades de construción e instalación de estructura metalica e instalación de cubierta.

j). I E.D SAN PEDRO CLAVER. El Contratista continua con las actividades de instalación de mamposteria de antepechos, desmonte, nivelación e instalación de adoquines existentes, cintas de concreto.

k). PABLO VI. El Contratista de obra continua con actividades de demolición y picado de muros existentes, tambien con la actividad de demolición de pisos, adicionalmente esta realizando actividades de pañete de muros, excavaciones para instalación de tuberia, instalación de tuberia y desmonte de ventaneria.

l). VILLEMAR EL CARMEN SEDE A. El Contratista durante esta semana no realizo actividades.

m). COLEGIO PINAR DEL RIO SEDE C. El Contratista durante esta semana realizo actividades de desmonte de ventaneria y puertas existentes, como la instalación de las nuevas ventanas y puertas.

n). COLEGIO GABRIE BETANCOURTH. El Contratista se encuentra realizando actividades de instalación de ventanas.

o). COLEGIO KENNEDY ANTONIO SANTOS SEDE B. El Contratista inicio con las actividades de demolición de la placa existente y excavaciones para la nueva estructura de pavimento.

p). DILE FONTIBON. El Contratista se encuentra realizando actividades de montaje de estructura para instalación de cielo raso.

2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.

a). **PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.** La Interventoría remitio a la SED la aprobación del presupuesto y programación entregados por el Contratista de Obra el 5 y 9 de agosto del 2024, respectivamente.

b). Respecto a el avance de obra, se evidencia que el Contratista tiene un atraso del -8.43%, entre lo programado y ejecutado.

c). Respecto la solicitud de inicio de proceso sancionatorio remitido por la Interventoría, debido a la falta de personal y baja ejecución en las actividades de obra, lo cual genero una baja facturación, fue desarrollada una reunión el 11 de agosto del 2024 con representación de las partes (SED, Contratista e Interventoría), en las instalaciones de la SED, en donde se trato el tema del atraso reportado y los compromisos por parte del Contratista de Obra para ponerse al día en este atraso.

De lo anterior se concluyo que, el Contratista de Obra se compromete a subsanar el porcentaje de atraso con la facturación del proximo periodo, la cual seria con corte al 14 de agosto del 2024.

El Contratista de obra logro alcanzar la facturación propuesta, sin embargo el porcentaje de retraso respecto a lo proyectado es del -5.34%, con corte al acta parcial de obra No. 4.

3. JURIDICO Y CONTRACTUAL.


a). Debido a que el Contrato de Interventoría termina el proximo 4 de septiembre del 2024, la SED e Interventoría se encuentran realizando los tramites pertinentes para la prorroga de este, con el fin de continuar con el seguimiento del Contrato de Obra, el cual, contractualmente, termina el proximo 14 de diciembre del 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA


Durante la semana fueron desarrolladas actividades de excavaciones, rellenos, demoliciones de muros, pañeta de muros, contrución e instalación de estructura metalica, instalación de cubierta, demarcaciòn de zonas de alimentación, instalación de tuberia electrica y de iluminación, instalación de ventanas y puertas, entre otras.

DIAGRAMAS CIRCULARES


COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE E VERSALLES				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	6,98%	0%	-6,98%	31,15%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	28,36%	2%	-26,61%	31,15%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	46,53%	0%	-46,53%	31,15%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	52,26%	20,21%	-32,05%	31,15%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	54,24%	40,68%	-13,56%	31,15%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	61,07%	40,68%	-20,39%	31,15%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	78,75%	31,15%	-47,60%	31,15%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	85,33%	31,15%	-54,18%	31,15%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	45,56%	34,25%	-11,31%	31,15%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	50,27%	35,76%	-14,51%	35,76%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	53,43%	35,76%	-17,67%	35,76%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	59,88%	37,70%	-22,18%	35,76%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	61,61%	45,06%	-16,55%	45,06%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	63,34%	45,73%	-17,61%	45,06%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	67,88%	47,69%	-20,19%	45,06%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	96,73%	49,94%	-46,79%	45,06%

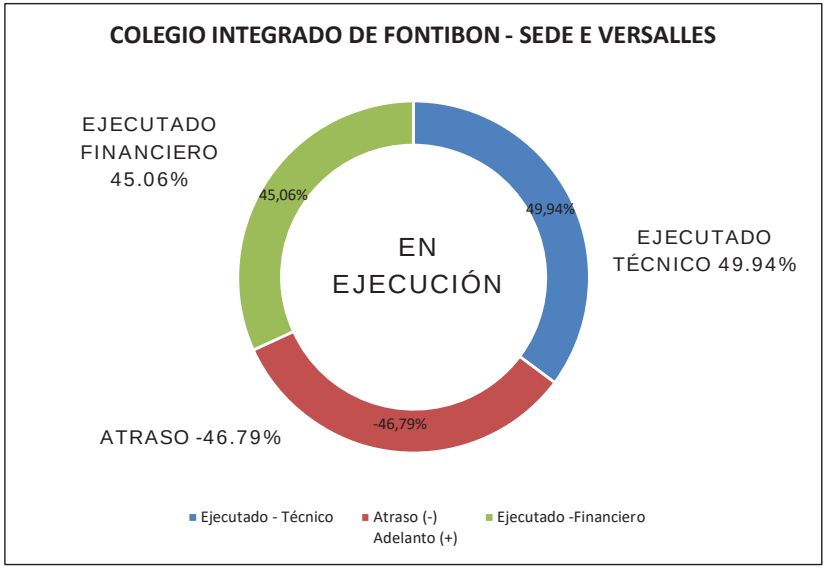


VILLEMAR DEL CARMEN SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	8,67%	2,70%	-5,97%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	16,05%	5,83%	-10,22%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	11,80%	11,35%	-0,45%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	16,68%	11,35%	-5,33%	8,02%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	6,21%	8,37%	2,16%	8,37%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	9,49%	20,51%	11,02%	8,37%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	21,90%	50,86%	28,96%	50,86%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	35,56%	50,86%	15,30%	50,86%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	49,89%	52,75%	2,86%	50,86%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	61,40%	52,91%	-8,49%	50,86%

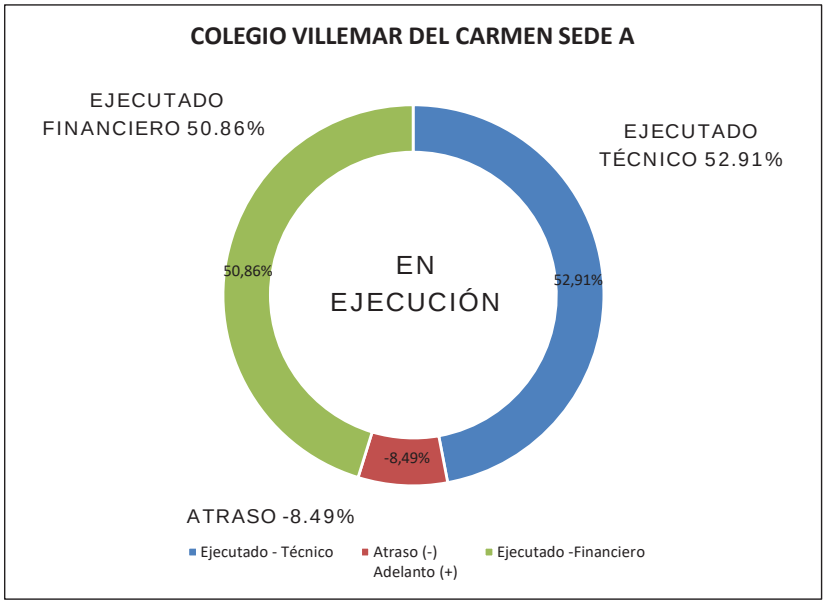


GABRIEL BETANCOURTH MEJIA SEDE C VILLA MEJIA TAGASTE				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	1,15%	0%	-1,06%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	3,41%	0%	-3,32%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	3,05%	0%	-3,05%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	18,10%	18,10%	18,10%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	3,05%	19,21%	16,16%	18,10%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	6,71%	30,14%	23,43%	18,10%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	10,38%	40,47%	30,09%	18,10%

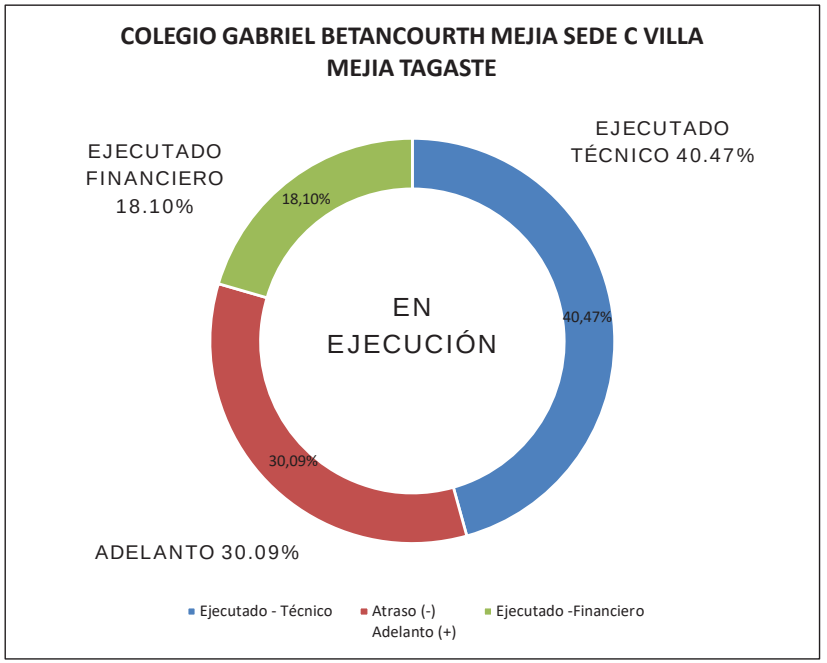


KENNEDY - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	10,16%	0%	-10,15%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	12,65%	0%	-12,65%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	12,98%	0%	-12,98%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	19,71%	13,97%	-5,74%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	21,12%	8,97%	-12,15%	16,71%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	25,52%	8,97%	-16,55%	16,71%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	28,85%	19,99%	-8,86%	16,71%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	33,88%	26,64%	-7,24%	16,71%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	70,15%	47,70%	-22,45%	16,71%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	80,89%	47,70%	-33,19%	46,10%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	91,61%	78,20%	-13,41%	46,10%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	94,57%	82,95%	-11,62%	46,10%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	95,19%	100%	4,81%	100%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	95,80%	100%	4,20%	100%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	96,43%	100%	3,57%	100%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	97,11%	100%	2,89%	100%

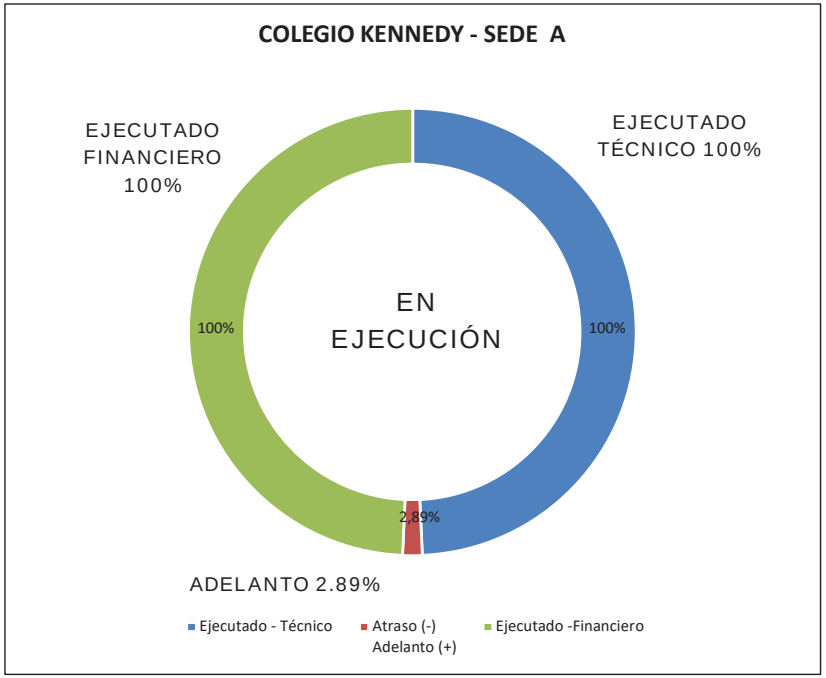


LA AMISTAD - SEDE A				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	7,95%	5,23%	-2,71%	4,89%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	31,42%	5,23%	-26,19%	4,89%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	36,66%	5,23%	-31,43%	4,89%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	41,91%	11,85%	-30,06%	4,89%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	48,28%	11,85%	-36,43%	9,20%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	54,66%	11,85%	-42,81%	9,20%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	59,90%	14,73%	-45,17%	9,20%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	66,76%	18,17%	-48,59%	9,20%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	48,96%	22,71%	-26,25%	9,20%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	53,65%	47,54%	-6,11%	47,54%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	59,56%	68,62%	9,06%	47,54%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	60,24%	70,65%	10,41%	47,54%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	65,99%	84,59%	18,60%	84,59%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	85,16%	84,59%	-0,57%	84,59%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	99,43%	87,18%	-12,25%	84,59%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	0%	84,59%

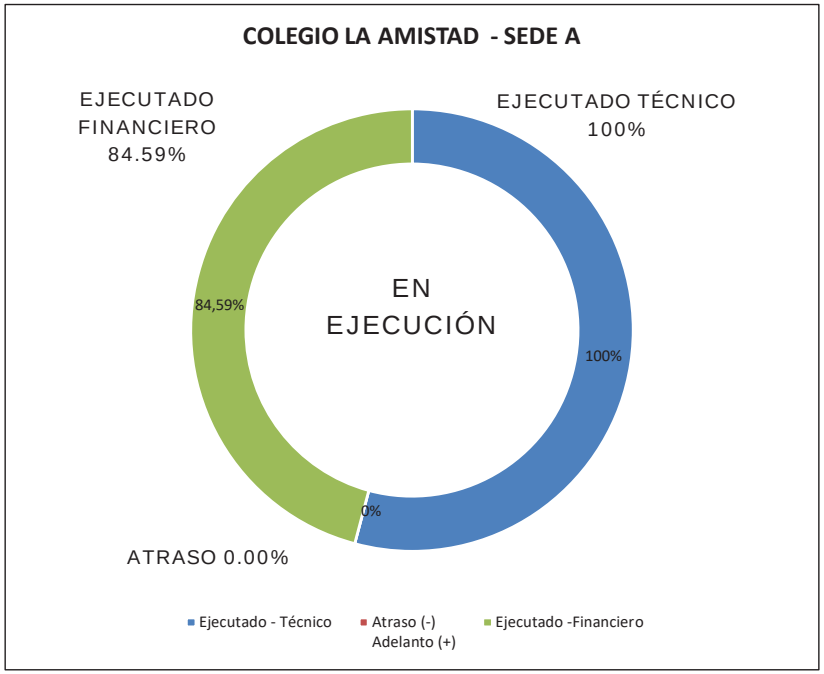


SAN RAFAEL - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0,00%	0,70%	0,70%	0,69%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0,00%	0,70%	0,70%	0,69%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0,00%	0,70%	0,70%	0,69%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0,00%	3,88%	3,88%	0,69%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	3,30%	6,35%	3,05%	5,61%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	11,66%	6,35%	-5,31%	5,61%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	13,02%	15,67%	2,65%	5,61%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	15,14%	16,16%	1,02%	5,61%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	21,96%	26,68%	4,72%	5,61%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	30,78%	26,68%	-4,10%	21,14%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	20,84%	22,85%	2,01%	21,14%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	23,23%	25,50%	2,27%	21,14%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	25,62%	33,79%	8,17%	33,79%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	43,80%	35,37%	-8,43%	33,79%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	44,66%	35,97%	-8,69%	33,79%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	46,62%	37,98%	-8,64%	33,79%

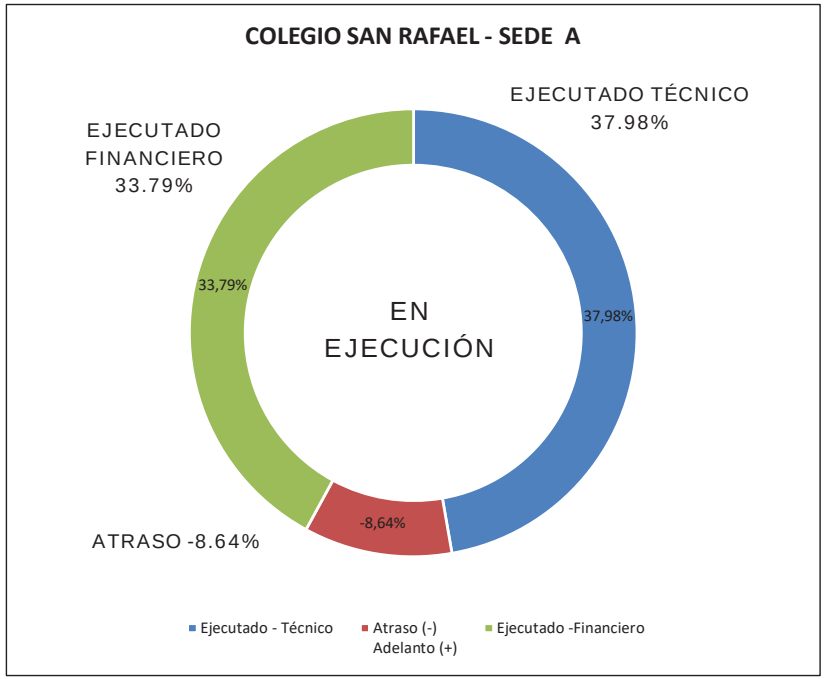


PAULO VI				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0,55%	0,25%	-0,30%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0,95%	1,34%	0,39%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	2,12%	2,37%	0,25%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	3,32%	2,37%	-0,95%	1,62%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	3,19%	3,09%	-0,10%	1,62%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	5,89%	3,09%	-2,80%	1,62%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	10,44%	9,16%	-1,28%	9,16%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	13,31%	9,49%	-3,82%	9,16%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	15,98%	11,88%	-4,10%	9,16%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	18,64%	12,19%	-6,45%	9,16%

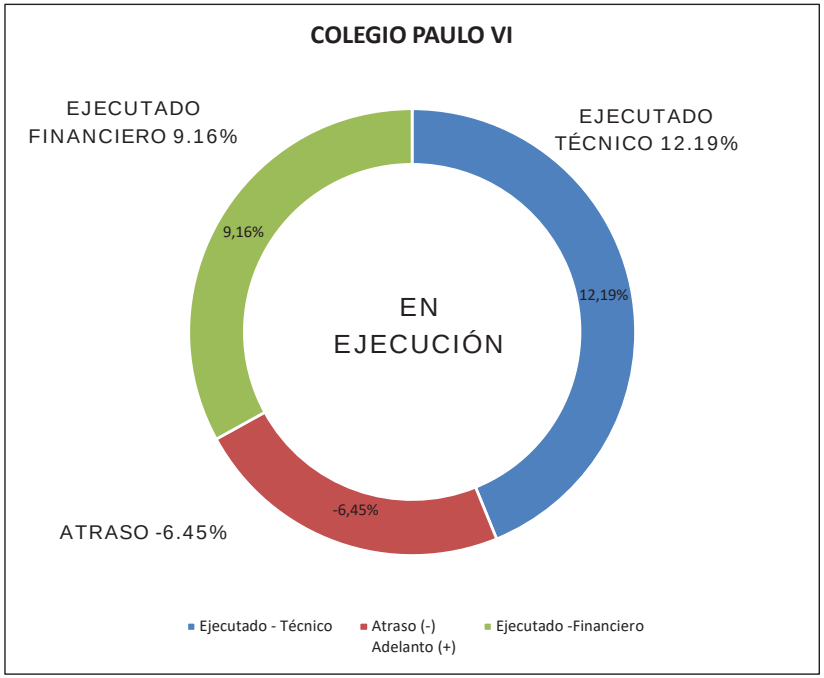


INEM SEDE A FRANCISCO DE PAULA SANTANDER				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	1,92%	1,11%	-0,81%	1,10%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	1,94%	1,11%	-0,83%	1,10%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	2,03%	1,11%	-0,92%	1,10%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	3,46%	1,31%	-2,15%	1,10%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	5,67%	2,38%	-3,29%	1,74%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	7,83%	2,38%	-5,45%	1,74%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	7,49%	4,54%	-2,95%	1,74%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	7,83%	5,59%	-2,24%	1,74%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	10,15%	6,35%	-3,80%	1,74%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	13,48%	15,41%	1,93%	15,41%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	28,76%	33,19%	4,43%	15,41%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	34,01%	34,43%	0,42%	15,41%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	39,26%	50,34%	11,08%	50,34%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	44,52%	50,34%	5,82%	50,43%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	49,77%	52,41%	2,64%	50,34%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	55,10%	54,48%	-0,62%	50,43%

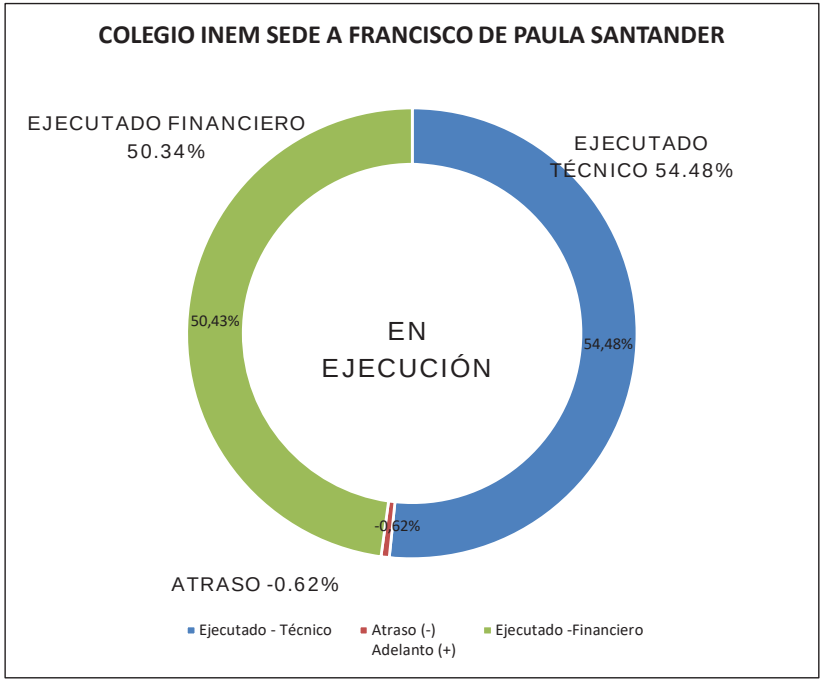


EL JAPON - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	16,69%	42,36%	25,67%	14,70%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	30,17%	42,36%	12,19%	14,70%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	43,05%	42,36%	-0,69%	14,70%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	51,50%	42,36%	-9,14%	14,70%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	58,10%	42,36%	-15,74%	41,64%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	64,70%	42,36%	-22,34%	41,64%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	70,13%	47,45%	-22,68%	41,64%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	77,37%	53,65%	-23,72%	41,64%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	68,45%	55,21%	-13,24%	41,64%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	72,93%	64,88%	-8,05%	64,88%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	89,09%	72,99%	-16,10%	64,88%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	91,62%	72,99%	-18,63%	64,88%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	99,75%	81,44%	-18,31%	81,44%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	100%	81,44%	-18,56%	81,44%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	100%	85,67%	-14,33%	81,44%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	100%	92,47%	-7,53%	81,44%

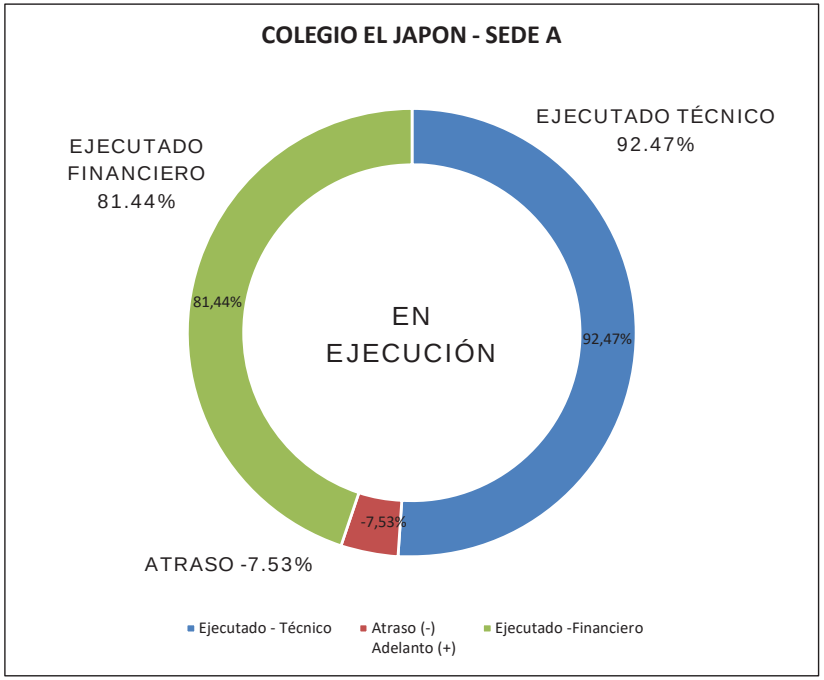


TOM ADAMS - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	5,13%	5,38%	0,25%	1,02%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	9,25%	5,38%	-3,87%	1,02%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	13,83%	5,38%	-8,45%	1,02%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	15,01%	5,38%	-9,63%	1,02%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	17,29%	5,38%	-11,91%	5,62%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	20,32%	5,38%	-14,94%	5,62%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	25,21%	14,67%	-10,54%	5,62%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	43,08%	20,84%	-22,24%	5,62%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	36,55%	32,24%	-4,31%	5,62%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	43,93%	32,24%	-11,69%	24,14%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	50,60%	31,20%	-19,40%	24,14%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	55,76%	31,20%	-24,56%	24,14%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	59,90%	59,97%	0,07%	59,97%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	64,04%	62,24%	-1,80%	59,97%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	85,83%	63,82%	-22,01%	59,97%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	95,14%	79,59%	-15,55%	59,97%

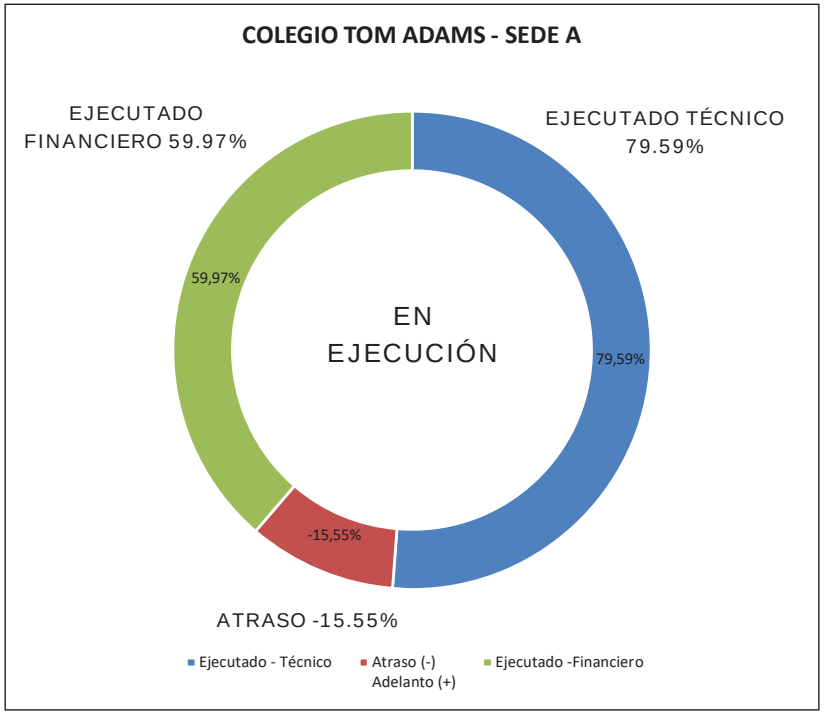


SAN PEDRO CLAVER - SEDE A				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	2,19%	7,15%	4,96%	1,14%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	20,11%	7,15%	-12,96%	1,14%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	22,07%	7,15%	-14,92%	1,14%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	22,88%	21,01%	-1,87%	1,14%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	23,33%	27,31%	3,98%	22,27%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	24,04%	27,31%	3,27%	22,27%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	24,58%	23,32%	-1,26%	22,27%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	32,52%	24,52%	-8,00%	22,27%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	27,82%	25,41%	-2,41%	22,27%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	31,57%	30,92%	-0,65%	30,92%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	85,76%	38,63%	-47,13%	30,92%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	87,42%	41,68%	-45,74%	30,92%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	90,41%	49,06%	-41,35%	49,06%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	90,70%	50,37%	-40,33%	49,06%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	90,70%	50,99%	-39,71%	49,06%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	90,70%	51,17%	-39,53%	49,06%

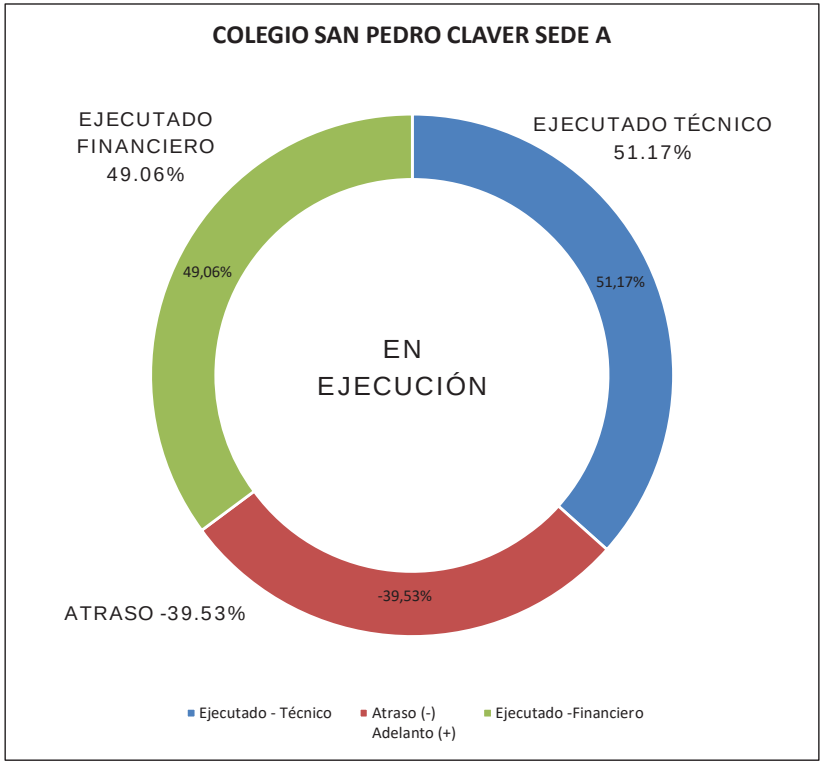


PINAR DEL RIO - SEDE C				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	7,09%	0%	-7,09%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0,00%	9,71%	9,71%	9,71%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	7,09%	11,68%	4,59%	9,71%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	14,15%	33,87%	19,72%	9,71%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	21,92%	33,87%	11,95%	9,71%

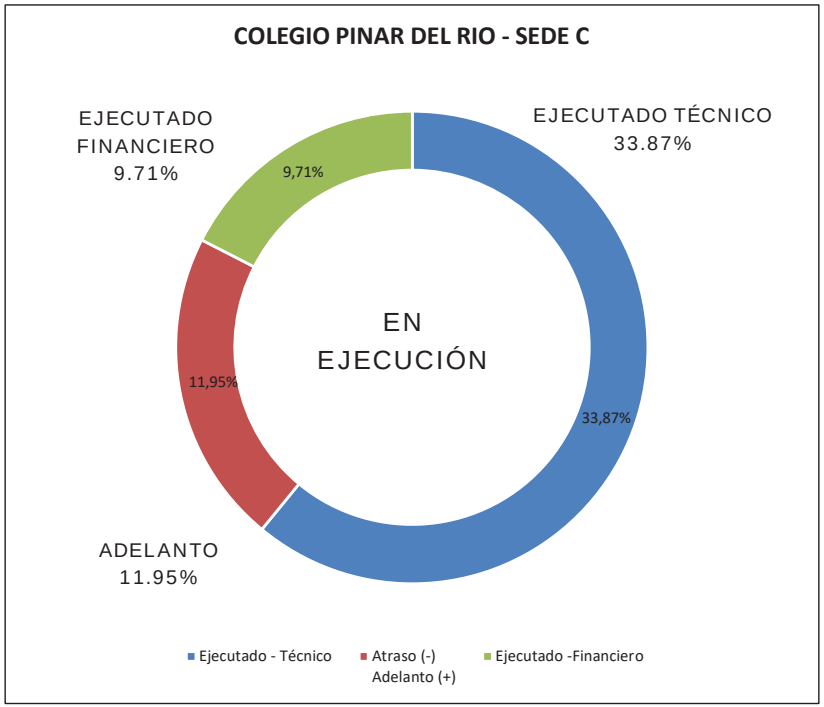


DILE KENNEDY				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	3,52%	0%	-3,12%	0%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	5,92%	0%	-5,92%	0%

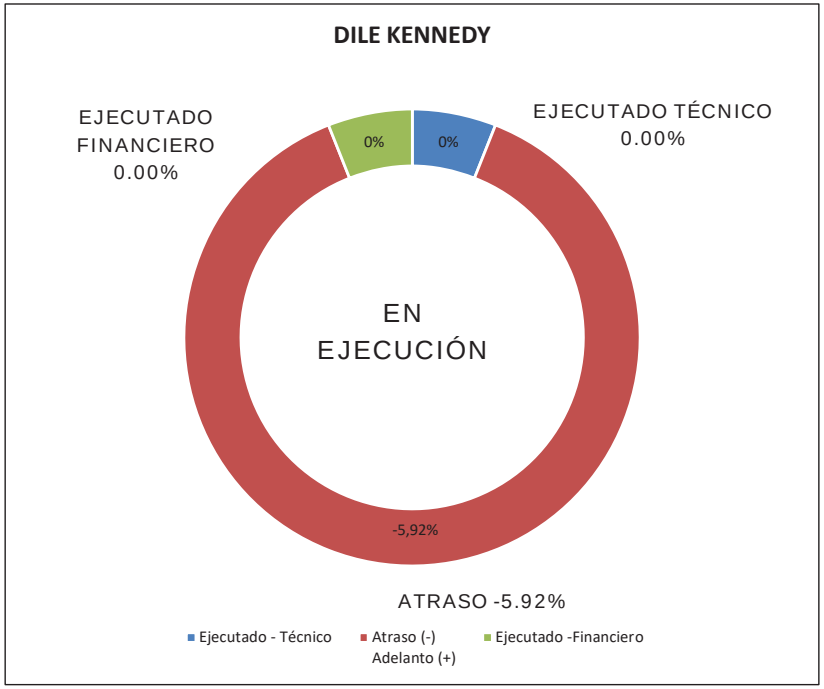


INEM Francisco de Paula Santander Sede B				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	6,12%	0%	-6,12%	0%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	16,74%	0%	-16,74%	0%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	29,89%	0%	-29,89%	0%

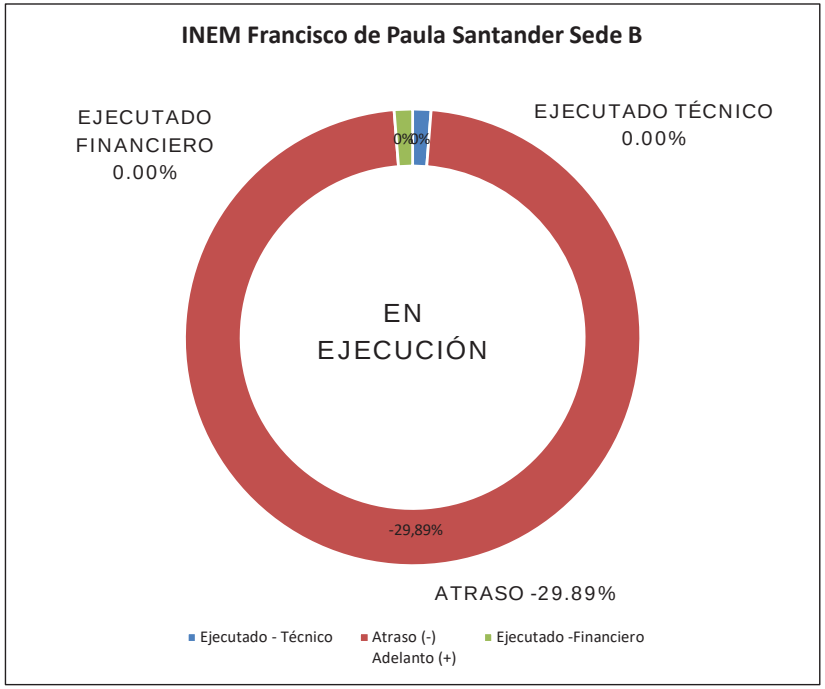


KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	1,52%	7,72%	6,20%	0%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	1,67%	9,24%	7,57%	0%

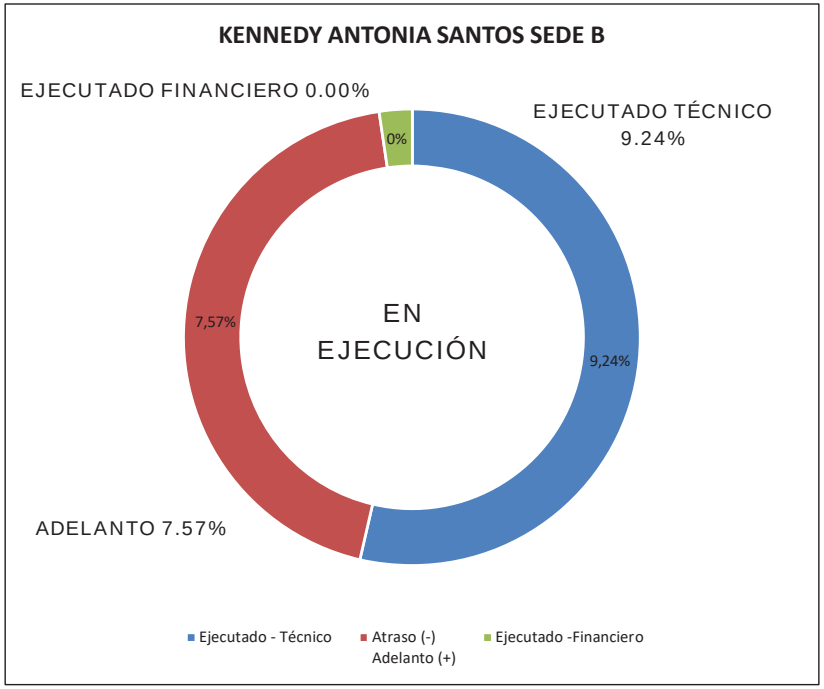

DILE FONTIBON				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	1,30%	0,38%	-0,92%	0%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	2,04%	6,17%	4,13%	0%

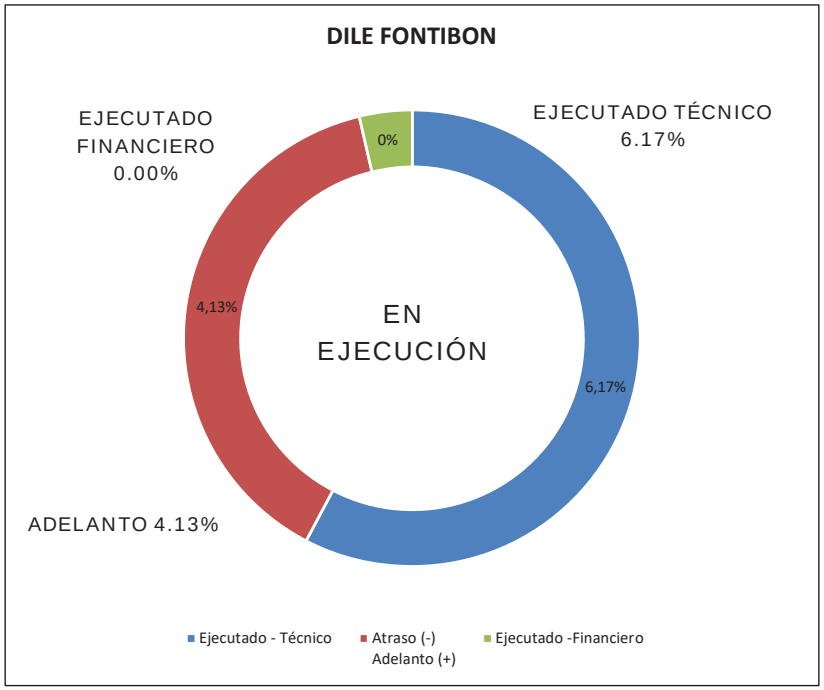

OTIC				
Semana	Programado	Ejecutado - Técnico	Atraso (-) Adelanto (+)	Ejecutado - Financiero
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17. DEL 5 AL 10 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
18. DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
19. DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
20. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
21. DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE	0%	0%	0%	0%

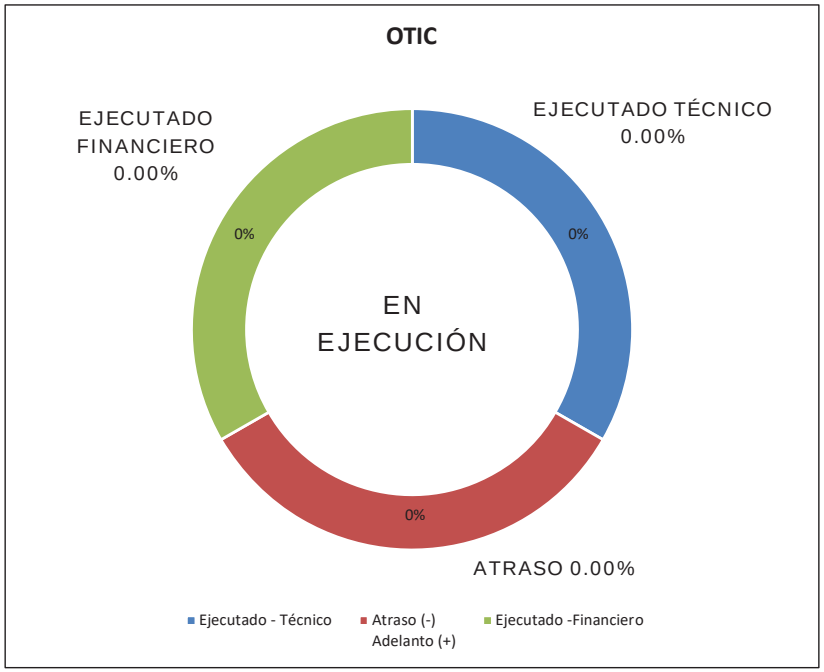

RESIDENTE INTERVENTORÍA
JHON EDISON REYES ROJAS

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MARTIN RAFAEL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 21 DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA	INFORME FOTOGRÁFICO	21
INTERVENTORIA CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO	OBRA 14 FRENTES INTERVENIDOS	

COLEGIO INEM SEDE A - ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACIÓN DE CUBIERTA.










COLEGIO EL JAPON - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PERGOLA, INSTALACIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS

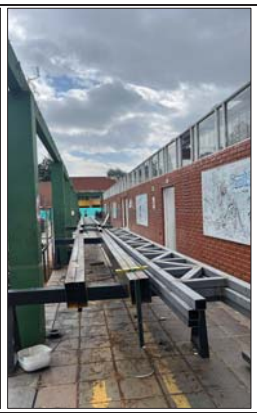


DILE FONTIBON

COLEGIO SAN RAFAEL SEDE A







REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 21 DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA	INFORME FOTOGRÁFICO	21
INTERVENTORIA CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO	OBRA 14 FRENTES INTERVENIDOS	

COLEGIO TOM ADAMS - CONSTRUCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.





COLEGIO SAN PEDRO CLAVER - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y FUNDIDA DE PLACA DE CONTRAPISO.










COLEGIO INTEGRADO FONTIBON - PINTURA DE LAS INSTALACIONES E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA

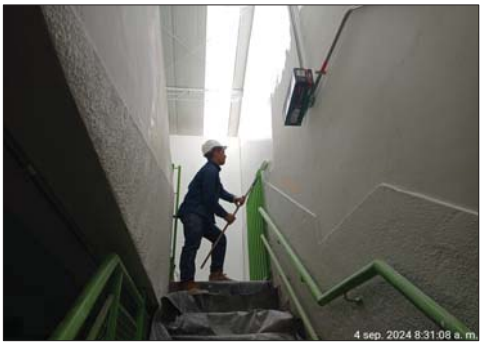



COLEGIO PABLO VI - PICADO Y PAÑETE DE MUROS EXISTENTES.














REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 21 DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA	INFORME FOTOGRÁFICO	21
INTERVENTORIA CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO	OBRA 14 FRENTES INTERVENIDOS	

COLEGIO LA AMISTAD - INSTALACIÓN Y EMBOQUILLADO DE PORCELANATO.









COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN SEDE A - LIMPIEZA DE GRAFITIS SOBRE MURO DE FACHADA.









COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA - INSTALACIÓN DE PUERTAS Y PERGOLAS









LA AMISTAD - PINAR DEL RIO SEDE C - INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS










ANEXO AMBIENTAL

CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES	ACTA DE ASISTENCIA - CHARLAS Y/O CAPACITACIONES /PAUSAS ACTIVAS	Version 1 Abril/2024 SST-FOT 004

FECHA: 4 Septiembre DURACIÓN: 15 min.

Cuidado de drenaje Urbano - Protección de sumideros.

CAPACITADOR: Angie Rojas Landinez. CARGO: Prof Ambiental

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Edilberto Rodrigues	Construtransportes	Ayudante	Edilberto
2	Jeison Cadena	Contratransportes.	Ayudante	Jeisson
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	ACTA DE ASISTENCIA - CHARLAS Y/O CAPACITACIONES /PAUSAS ACTIVAS	Version 1 Abril/2024 SST-FOT 004

FECHA: 06 - Septembe. DURACIÓN: 15 min.

Cuidado de drenaje Urbano- Proteccion sumideros.

CAPACITADOR: Angie Rojas Londiño CARGO: Prof. Ambiental

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Germán Alberto Suarez	A y H Torres	Ayudante	
2	Jorge Uber Franco	A y H Torres	Ayudante	
3	Brayan Steven Hermosa	A y H Torres	Ayudante	
4	Carlos Avendaño	A y H Torres	Ayudante	
5	Luis Dailon Hoyos	A y H Torres	Ayudante	
6	Yherley Torres Franco	A y H Torres	Oficial	
7	David Zubata Vargas	A y H Torres	Oficial	
8	Jose Gregorio Maita	A y H Torres	oficial	
9	Hector Adolfo Ciprian	A y H Torres	Oficial	
10	Ovidio Bustamante	A y H Torres	Ayudante	
11	Teofilo Guzman Aldana	A y H Torres	Ayudante	
12	Pedro Torres Hernandez	A y H Torres	Oficial	
13	Maicol Rodriguez Hernandez	A y H Torres	Ayudante	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	ACTA DE ASISTENCIA - CHARLAS Y/O CAPACITACIONES /PAUSAS ACTIVAS	Version 1 Abril/2024 SST-FOT 004

FECHA: 11 Septiembre 2024. **DURACIÓN:** 18 min.

Cuidado de drenaje urbano - Protección de sumideros

CAPACITADOR: Angie Alejandra Rojas Landínez. **CARGO:** Prof. Ambiental.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Edwin Antonio	Construtrasporles	Ayudante	Edwin Antonio
2	Yordi Rodriguez	Construtrasporles	AYO	
3	Nicolas Rey	Construtrasporles	Ayudante.	Nicolas Rey
4	Arnold Jose Venecia	ARM	Ayudante	
5	Elerick Rodriguez	ARM	Ayudante	Elerick R.
6	Ana lucia Camelo.	ARM.	SST.	Anacamelo.
7	Sofia Vallejo Largo	A y A Torres	SST	Sofia Vallejo
8	Oban Mogollón S.	Construcentrosp.	cofic.	
9	Anderson Ortiz	ARM.	insp. SST	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	REPORTE PLANTA DE APROVECHAMIENTO SECAM JR - UVAL												
	CLIENTE:					**CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES**							
	FECHA:							**Corte No. 1**					
No.	**REMISIÓN SECAM**	**PLACA**	**CONDUCTOR**	**EMPRESA**	**CLASE DE MATERIAL**	**DIFERENCIA**	**FECHA DE ENTRADA**	**FECHA DE SALIDA**	**PESO DE ENTRADA**	**PESO DE SALIDA**	**M3**	**ORIGEN**	**OBSERVACIÓN**
1	24950	SNT929	EDGAR TALERO	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES	SUB BASE GRAN TIPO C	20	6/09/2024 8:17	6/09/2024 8:17	20000	20000	20,00	PLAZA DE LAS AMERICAS	
2	24957	SNT929	EDGAR TALERO	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES	SUB BASE GRAN TIPO C	20	6/09/2024 10:48	6/09/2024 10:48	20000	20000	20,00	PLAZA DE LAS AMERICAS	
3	24990	SNT929	EDGAR TALERO	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES	SUB BASE GRAN TIPO C	20	9/09/2024 13:28	9/09/2024 13:29	20000	20000	20,00	CARVAJAL	
4	25031	SNT929	EDGAR TALERO	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES	SUB BASE GRAN TIPO C	20	11/09/2024 12:10	11/09/2024 12:10	20000	20000	20,00	CARVAJAL	
										TOTAL	80,00		

SECAM J.R. S.A.S

NIT. 830.507.163-0

DESPACHADO

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DIRECCION CRA 1 # 314 A96 BOSA

Recibo Número: 24950

Placa: SNT929

Bruto: 0

Tara: 0

Neto: 0

Precio: 0

10 m3

Entrada: 6/09/2024 8:17:42 a. m.

Salida: 6/09/2024 8:17:45 a. m.

Empresa: CONSORCIO EDIFICACIONI DISTRITALES

Producto: SUB BASE GRAN TIPO C

Conductor: EDGAR TALERO

Origen: PLAZA DE LAS AMERICAS

SEGUNDA VERSION 2023

SECAM J.R. S.A.S

NIT. 830.507.163-0

DESPACHADO

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DIRECCION CRA 1 # 314 A96 BOSA

Recibo Número: 24957

Placa: SNT929

Bruto: 0

Tara: 0

Neto: 0

Precio: 0

10 m3.

Entrada: 6/09/2024 10:48:13 a. m.

Salida: 6/09/2024 10:48:18 a. m.

Empresa: CONSORCIO EDIFICACIONI DISTRITALES

Producto: SUB BASE GRAN TIPO C

Conductor: EDGAR TALERO

Origen: PLAZA DE LAS AMERICAS

SEGUNDA VERSION 2023

COPIA DEL RECIBO ORIGINAL

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0

DESPACHADO

SECAM J.R.
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
DESARROLLO - CEL - 318 [illegible]

Recibo Número: 24990

Placa: SNT929
Bruto: 0
Tara: 0
Neto: 0
Precio: 0

20 M3

Entrada: 9/09/2024 1:28:55 p. m.
Salida: 9/09/2024 1:29:00 p. m.
Empresa: CONSORCIO EDIFICACIONI DISTRITALES
Producto: SUB BASE GRAN TIPO C
Conductor: EDGAR TALERO
Origen: CARVAJAL

SEGUNDA VERSION EXITOS



SECAM J.R. S.A.S

NIT. 830.507.163-0

DESPACHADO

SECAM J.R. S.A.S

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DESARROLLO CEL - 314 450 4382

Recibo Número: 25031

Placa: SNT929

Bruto: 0

Tara: 0

Neto: 0

Precio: 0

20 m³

Entrada: 11/09/2024 12:10:53 p. m.

Salida: 11/09/2024 12:10:57 p. m.

Empresa: CONSORCIO EDIFICACIONI DISTRITALES

Producto: SUB BASE GRAN TIPO C

Conductor: EDGAR TALERO

Origen: CARVAJAL

SEGUNDA VERSION 2023

SUMINISTROS DE MATERIALES PÉTREOS RANGEL S.A.S



Ejecución de Obras Civiles,
Movimiento de Tierras y
Alquiler de Volquetas y Maquinaria

¡La Calidad que su obra necesita!

COMPROBANTE DE ENTREGA
No. 37163

Fecha: 21 08 2024

Cliente: ARM

Obra ó Proyecto: [illegible] Dirección: [illegible]

Material: [illegible] Cantidad: 15m3

Conductor: [illegible] Placa: WCS 316

Recibido Por: Jose Feliz

Cargo: Residente

Firma de Recibido:

Observaciones:

Cra. 72 C Bis # 2 A - 29 sur Of. 201 601 467 3256 - 313 402 3586
rangelsuministros@hotmail.com / Bogotá, D.C. - Colombia

OFICINA

SUMINISTROS DE MATERIALES PÉTREOS RANGEL S.A.S



Ejecución de Obras Civiles,
Movimiento de Tierras y
Alquiler de Volquetas y Maquinaria

¡La Calidad que su obra necesita!

COMPROBANTE DE ENTREGA
No. 39808

Fecha: 21 08 24

Cliente: ARM

Obra ó Proyecto: colegio Pablo 6 Dirección: Kennedy

Material: Arena de Rio Cantidad: 15M

Conductor: Jhonatan castro Placa: EOR395

Recibido Por: [illegible] DANTE

Cargo:

Firma de Recibido:

Observaciones: 79355 604

Cra. 72 C Bis # 2 A - 29 sur Of. 201 601 467 3256 - 313 402 3586
rangelsuministros@hotmail.com / Bogotá, D.C. - Colombia

OFICINA

PLACA DEL VEHÍCULO:	**TSN892**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10022570434**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Público**	CLASE DE VEHÍCULO:	**CAMIONETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**N300**
MODELO:	**2013**	COLOR:	**BLANCO LUNA**
NÚMERO DE SERIE:	**LZWACAGA2D7001239**	NÚMERO DE MOTOR:	**LAQ*8C40210318***
NÚMERO DE CHASIS:	**LZWACAGA2D7001239**	NÚMERO DE VIN:	**LZWACAGA2D7001239**
CILINDRAJE:	**1206**	TIPO DE CARROCERÍA:	**VAN**
TIPO COMBUSTIBLE:	**GAS GASOL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**09/09/2012**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
86531583	21/09/2023	22/09/2023	21/09/2024	910	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	VIGENTE
1991849	21/09/2022	22/09/2022	21/09/2023	910	LIBERTY SEGUROS S.A.	NO VIGENTE
12731800004260	18/09/2021	20/09/2021	19/09/2022	910	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
79159894	19/09/2020	20/09/2020	19/09/2021	910	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
11765200019580	31/08/2019	09/09/2019	08/09/2020	910	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
104

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352012000166072

I/E
I

FECHA IMPORT.
23/06/2012

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
09/09/2012

FECHA EXP. LIC. TTO.
24/03/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.

LT06003531315

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022570395

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TSN892	CHEVROLET	N300	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.206	BLANCO LUNA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	VAN	GASGASOL	7

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
LAQ*8C40210318*	N	LZWACAGA2D7001239

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LZWACAGA2D7001239	N	LZWACAGA2D7001239	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BELTRAN LOZANO NUMAEL	C.C. 79790507

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 171348171

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVIFULL SAS

NIT: 900959412

No. de Certificado de Acreditación: 16-OIN-042-001

Fecha de expedición: 2024/01/26

Fecha de vencimiento: 2025/01/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TSN892

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1206

NRO. MOTOR: LAQ*8C40210318*

NRO. CHASIS: LZWACAGA2D7001239

VIN: LZWACAGA2D7001239

LÍNEA: N300

COLOR: BLANCO LUNA

NOMBRE PROPIETARIO: NUMAEL BELTRAN L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO ANDRES QUIROGA DIAZ

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
4308004280676000	08/07/2023	09/07/2023	08/07/2024	320	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
83703561	07/07/2022	08/07/2022	07/07/2023	320	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
15083200504460	05/07/2021	06/07/2021	05/07/2022	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
12940000009270	01/07/2020	02/07/2020	01/07/2021	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
12940000004870	03/05/2019	04/05/2019	03/05/2020	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

PLACA DEL VEHÍCULO:	**XKJ127**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10028080842**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Particular**	CLASE DE VEHÍCULO:	**VOLQUETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**FORD**	LÍNEA:	**F 600**
MODELO:	**1959**	COLOR:	**ROJO**
NÚMERO DE SERIE:	**F60J9H37814**	NÚMERO DE MOTOR:	**08G0222821**
NÚMERO DE CHASIS:	**F60J9H37814**	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	**5800**	TIPO DE CARROCERÍA:	**PLATON**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**20/10/1995**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/COTA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167519463

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 13 SAS

NIT: 901417787

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-026

Fecha de expedición: 2023/08/01

Fecha de vencimiento: 2024/08/01

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XKJ127

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1959

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5800

NRO. MOTOR: 08G0222821

NRO. CHASIS: F60J9H37814

VIN:

LÍNEA: F 600

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: MESIAS G. GUEVARA J.

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO MIGUEL VERGARA HERNANDEZ

VOLQUETA PLACA AJB925



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008384935

PLACA: AJB925	MARCA: FORD	LÍNEA: SIN LINEA		MODELO: 1946
CILINDRADA CC: 5.700	COLOR: VERDE			SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL		CAPACIDAD Kg/PSJ: 8000
NÚMERO DE MOTOR: 21369040		REG: N	VIN: ******	
NÚMERO DE SERIE: 18T5452046-RG		REG: S	NÚMERO DE CHASIS: 18T5452046	REG: S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MARTINEZ BELTRAN WILLIAM

IDENTIFICACIÓN: C.C. 79255740

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: ******

I/E: I

FECHA IMPORT.: 01/01/1950

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 01/01/1946

FECHA EXP. LIC. TTO.: 11/11/2014

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT01005326753

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	5	20	2024	5	22	2025	5	21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
88173928 - 609464184	AJB925	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	5700	1946

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FORD	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: SINLINEA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
21369040	18T5452046	NA	8,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
WILLIAM MARTINEZ	3102268420	CC	79255740	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80001522	88173928	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 919.000	$ 477.800	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.398.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.20 19:02:14 -05:00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170916069

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MI CARRERA EXPRESS

NIT: 900755392

No. de Certificado de Acreditación: 16-OIN-038-001

Fecha de expedición: 2024/01/08

Fecha de vencimiento: 2025/01/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	AJB925	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FORD	**MODELO:**	1946
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5700	**NRO. MOTOR:**	21369040
NRO. CHASIS:	18T5452046	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: WILLIAM MARTINEZ B.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CESAR AUGUSTO RIVERA GOMEZ

VOLQUETA PLACA VSB607



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10007167022

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
VSB607	FORD	SIN LINEA	1954

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.200	ROJO GRIS	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	8000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
08G0067296	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
F80K4H31800	N	F80K4H31800	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
ALDANA GOMEZ HERMOGENES — C.C. 7930924[illegible]



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
1	I	01/01/1954	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
08/07/1961	24/05/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEY MOV CUND/ZIPAQUIRA

LT01004850429

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	11	24	2023	11	25	2024	11	24

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
86887045 - 608300512	VSB607	CARGA O MIXTOS	PARTICULAR	5200	1954

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
6	FORD	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: SIN LINEA	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
08G0067296	F80K4H31800	NA	8,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HERMOGENES ALDANA GOMEZ	3107504262	CC	79309246	CAJICA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80001522	86887045	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 776.000	$ 403.500	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.181.600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167494524

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA UNIMILENIO

NIT: 900225056

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-039-001

Fecha de expedición: 2023/08/01

Fecha de vencimiento: 2024/08/01

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	VSB607	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FORD	**MODELO:**	1954
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5200	**NRO. MOTOR:**	08G0067296
NRO. CHASIS:	F80K4H31800	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	ROJO GRIS		

NOMBRE PROPIETARIO: HERMOGENES ALDANA G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES

VOLQUETA PLACA EKD741



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024683511

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EKD741	CHEVROLET	SIN LINEA	1954

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.000	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	4000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
93722195	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
X	N	X	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
ESCOBAR VELASQUEZ MARIA MAGDALENA — C.C. 39662898



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
5058	I	26/09/1966	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/11/1967	03/12/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA

LT07001184476

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO MES DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)
2023-11-27	2023-11-28	2024-11-27

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15651501110330	EKD741	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	5000	1954

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHICUL: LINEA DEL VEHICULO

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
93722195	XXXXXXXXXXXXXXX		4.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ESCOBAR VELASQUEZ, MARIA MAGDALENA	3134612392	CC	39662898	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 537000	$ 279200	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 818300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS	263,13 (1) / 701,68 (2) UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8.77
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

«Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169881168

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2023/11/28

Fecha de vencimiento: 2024/11/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EKD741

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1954

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5000

NRO. MOTOR: 93722195

NRO. CHASIS: X

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: MARIA M. ESCOBAR V.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

VOLQUETA PLACA SCI118



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027351340

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SCI118	FORD	B 600	1975

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.000	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	4000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
466JM2U049550	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
B615VX41969	N	B615VX41969	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SAQUE CRUZ SINDY NATALIA	C.C. 1024528781

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	12	27	2023	12	28	2024	12	27

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
87229519 - 608550233	SCI118	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	5000	1975

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	FORD		PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO	B 600	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
466JM2U049550	B615VX41969	NA	4,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SINDY SAQUE CRUZ	3103261701	CC	1024528781	CAJICA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	87229519	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
31	$ 537.000	$ 279.200	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 818.300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero
Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncia ante la Superintendencia

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170815665

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2024/01/11

Fecha de vencimiento: 2025/01/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SCI118

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1975

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5000

NRO. MOTOR: 466JM2U049550

NRO. CHASIS: B615VX41969

VIN:

LÍNEA: B 600

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: SINDY N. SAQUE C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

VOLQUETA PLACA SNT929

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031892493

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SNT929	SCANIA	P410 CB8X4Z	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.740	BLANCO NEGRO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16258

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
8206546	N	9BSP8X400D3821174

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9BSP8X400D3821174	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

TALERO CASTAÑEDA EDGAR FERNANDO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 80489470

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482013000116460	I	21/03/2013	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/04/2013	28/05/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT06005331634

SOAT

PREVISC

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-07-19	2024-07-20	2025-07-19

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TON	MODELO
3308005868333000	SNT929	CARGA O MIXTO	PUBLICO	12740	2011

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	SCANIA	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: P410 CB8X4Z	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPAC.
8206546	9BSP8X400D3821174	9BSP8X400D3821174	16

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TALERO CASTAÑEDA, EDGAR FERNANDO	3213633167	CC	80489470	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	13602	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1162490	$ 604400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1769990

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTA
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	(UVT)
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180	SALARI MÍNIMO LEGALE
	750	DIARIOS VIGENT

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual es posible descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, ingrese desde su teléfono marcando #345, para recibir la atención necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con autoridad de tránsito.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he acepto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 174857890

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2024/07/29

Fecha de vencimiento: 2025/07/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SNT929	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	SCANIA	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	12740	**NRO. MOTOR:**	8206546
NRO. CHASIS:	9BSP8X400D3821174	**VIN:**	9BSP8X400D3821174
LÍNEA:	P410 CB8X4Z		
COLOR:	BLANCO NEGRO		

NOMBRE PROPIETARIO: EDGAR F. TALERO C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

PIN AMBIENTAL VEHÍCULOS

VEHÍCULO:	VOLQUETA DOBLETROQUE
PLACA:	**EQR395**
MARCA:	INTERNATIONAL
MODELO:	2020
PIN AMBIENTAL:	**22986**
FECHA DE REGISTRO	**28-02-2024**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172593474

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SANTA LIBRADA SAS
SIGLA: CDA SANTA LIBRADA SAS

NIT: 900554707

No. de Certificado de Acreditación: 15-OIN-033-001

Fecha de expedición: 2024/03/23

Fecha de vencimiento: 2025/03/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EQR395	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10824	**NRO. MOTOR:**	35358242
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT7LN812627	**VIN:**	3HTWYAHT7LN812627
LÍNEA:	7600 SBA 6X4		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: SUMINISTROS DE MATERIALES PETREOS RANGEL SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUIS CARLOS PALOMINO RINCON

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	03	15	2024	03	16	2025	03	15

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901085093201	EQR395	VOLQUETA	PÚBLICO	10824	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	13

LÍNEA VEHÍCULO: 7600 SBA 6X4

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35358242	3HTWYAHT7LN812627	3HTWYAHT7LN812627	15.9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SUMINISTROS DE MATERIALES PETREOS	3194224837	NT	900734807	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901085093201	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$1,162,400.00	$604,400.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,768,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028718919

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
EQR395	INTERNATIONAL	7600 SBA 6X4	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.824	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	15900

NÚMERO DE MOTOR
35358242

REG N

VIN
3HTWYAHT7LN812627

NÚMERO DE SERIE
3HTWYAHT7LN812627

REG N

NÚMERO DE CHASIS
3HTWYAHT7LN812627

REG N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SUMINISTROS DE MATERIALES PETREOS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900734807

RESTRICC[illegible]AD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
375

DECLARACIÓN DE I[illegible]
48201900900553

VE
I

FECHA IMPORT.
22/11/2019

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIE
******



FECHA MATRÍCULA
14/02/2020

FECHA [illegible] C. TTO.
23/03/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07002369322

PIN AMBIENTAL VEHÍCULOS

VEHÍCULO:	VOLQUETA DOBLETROQUE
PLACA:	**WCS 816**
MARCA:	INTERNATIONAL
MODELO:	2014
PIN AMBIENTAL:	**24866**
FECHA DE REGISTRO	**29-02-2024**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168606899

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2023/09/25

Fecha de vencimiento: 2024/09/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WCS816

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2014

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35311570

NRO. CHASIS: 3HTWYAHTXEN772658

VIN: 3HTWYAHTXEN772658

LÍNEA: WORKSTAR 7600 SBA 6X4

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: GLORIA Y. LEON S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2023-09-12	2023-09-13	2024-09-12

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508005422791000	WCS816	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10831	2014

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA 6X4	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35311570	3HTWYAHTXEN772658	3HTWYAHTXEN772658	16.58

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LEON SOSA, GLORIA YANETH		CC	52039622	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13543	0	PEREIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

PAOLA MERCADO

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] **Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

[2] **Para las demás tarifas no citadas en (1).**

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020348494

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WCS816	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16580

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35311570	N	3HTWYAHTXEN772658

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HTWYAHTXEN772658	N	3HTWYAHTXEN772658	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LEON SOSA GLORIA YANETH

IDENTIFICACIÓN
C.C. 52039622

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482013000347260

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	29/08/2013	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
16/09/2013	24/02/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07000221299

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 26.08.2024 08:24:19
FOLIO: 242924939
PEDIDO: 242924938

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: EKD741
Observaciones

CEMEX RCD
Espacio para Sello
23 AGO 2024

CLIENTE
Usuario :Heidy Johanna Quintero Ramirez
DESPACHADO
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 26.08.2024 11:44:32
FOLIO: 242927268
PEDIDO: 242927266

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

CEMEX RCD
Espacio para Sello
23 AGO 2024

OC:
Observaciones
Espacio para Observaciones
DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Edwin Alexis Rodriguez Zapata
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

EKD741

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 26.08.2024 12:13:53
FOLIO: 242927626
PEDIDO: 242927625

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

CEMEX RCD
Espacio para Sello
23 AGO 2024

OC: SC1118
Observaciones
Espacio para Observaciones
DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Julieth Viviana Bonces Contreras
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIAl

FECHA Y HORA 26.08.2024 15:11:35
FOLIO: 242931171
PEDIDO: 242931170

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: EKD741
Observaciones

CLIENTE
Usuario :Heidy Johanna Quintero Ramirez
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIAl

FECHA Y HORA 27.08.2024 10:42:28
FOLIO: 242944318
PEDIDO: 242944317

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones

CLIENTE
Usuario :Elizabeth Novoa Coronado
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 27.08.2024 14:04:15
FOLIO: 242947175
PEDIDO: 242947174

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: EKD741 15990 48000
Observaciones

CLIENTE
Usuario :Heidy Johanna Quintero Ramirez
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo



CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 28.08.2024 13:01:36
FOLIO: 242959851
PEDIDO: 242959850

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA


EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: SCI118 2063 48000
Observaciones

RCD
cemex
Espacio para Sello
28 AGO 2024
DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Elizabeth Novoa Coronado
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

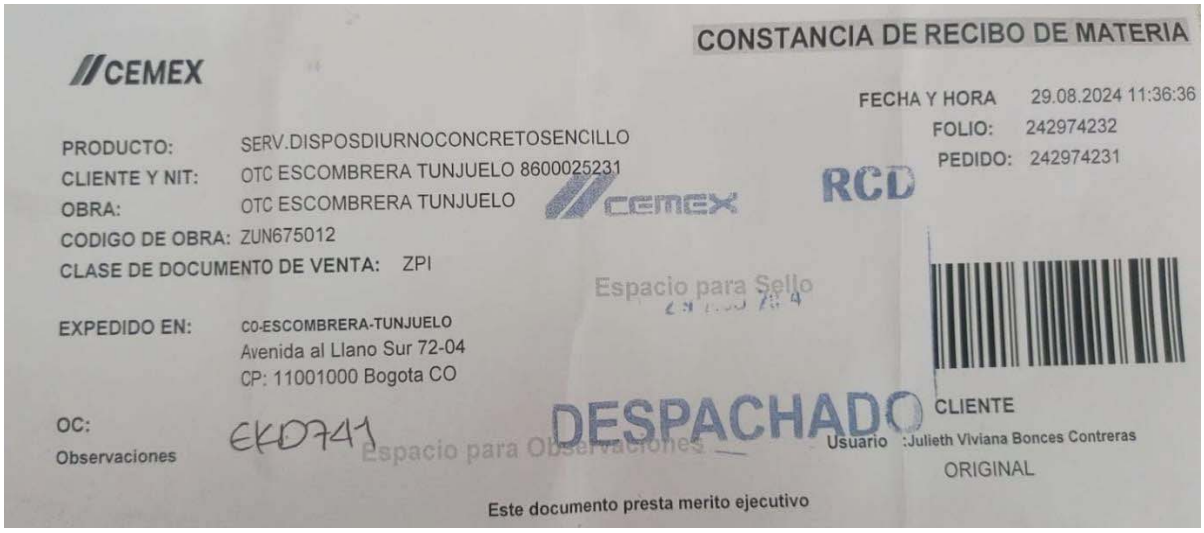

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 29.08.2024 11:36:36
FOLIO: 242974232
PEDIDO: 242974231

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: EKD741
Observaciones

RCD
CEMEX
Espacio para Sello
DESPACHADO
Espacio para Observaciones

CLIENTE
Usuario :Julieth Viviana Bonces Contreras
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo



CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 15.08.2024 08:16:35
FOLIO: 242814851
PEDIDO: 242814850

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: XKJ127 19848 48000
Observaciones

RCD
CEMEX
15 AGO 2024
Espacio para Sello
DESPACHADO
Espacio para Observaciones

COMPAÑIA
Usuario :Yeimy Lorena Perez Garcia
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo



Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A002551-024-2024 Generado el: 2024-08-22**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2024-08-22 14:34:09

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** MESIAS GUEVARA **IO DE IDENTIFICACION:** 74333395 **LACA VEHICULO:** XKJ127 **N-TRANS:** 19848 **PO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MESIAS GUEVARA **NIT:** 74333395 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** KENNEDY **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

SIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	**TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)**	**CANTIDAD: (m3 Y Ton)**
rvaciones:	Heterogéneo	6 (m3) aproximadamente- 7.68 Ton

re del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

rmación incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministr
mpleta y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos
veb www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de u
r favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas informa

Powered by CamScanner

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 06.09.2024 07:47:38
FOLIO: 243060888
PEDIDO: 243060886

PRODUCTO: SERV.DISPDIURNOCONCRETOLIMPIOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

Espacio para Sello

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

DESPACHADO

CLIENTE

OC: SC1118
Observaciones

Espacio para Observaciones

Usuario :Heidy Johanna Quintero Ramirez

ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 06.09.2024 07:34:39
FOLIO: 243060735
PEDIDO: 243060734

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

Espacio para Sello

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

DESPACHADO

CLIENTE

OC: EKD 741
Observaciones

Espacio para Observaciones

Usuario :Heidy Johanna Quintero Ramirez

ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 06.09.2024 11:09:48
FOLIO: 243064275
PEDIDO: 243064274

RCD

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

Espacio para Sello

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

DESPACHADO

CLIENTE

OC: SC1118
Observaciones

Espacio para Observaciones

Usuario :Heidy Johanna Quintero Ramirez

ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

CEMEX

FECHA Y HORA 06.09.2024 13:48:23
FOLIO: 243065958
PEDIDO: 243065957

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCAVACIÓNSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones

Espacio para Sello
cemex RCD
0 SEP 2024
DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Edwin Alexis Rodriguez Zapata
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

CEMEX

FECHA Y HORA 06.09.2024 15:46:22
FOLIO: 243067128
PEDIDO: 243067127

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCAVACIÓNSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: EK0741
Observaciones

CLIENTE
Usuario :Julieth Viviana Bonces Contreras
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

CEMEX

FECHA Y HORA 06.09.2024 12:52:30
FOLIO: 243065362
PEDIDO: 243065361

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCAVACIÓNSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: EK0741
Observaciones

Espacio para Sello
06 SEP 2024
DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Julieth Viviana Bonces Contreras
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 06.09.2024 09:03:12
FOLIO: 243062724
PEDIDO: 243062723

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

RCL

Espacio para Sello
07 SEP 2024

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones VSB607

Espacio para Despacho
DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Heidy Johanna Quintero Ramirez
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A003490-014-2024 **Generado el: 2024-09-06**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2024-09-06 16:42:34

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DAVID MONDRAGON **NO DE IDENTIFICACION:** 1024510199 **PLACA VEHICULO:** VSB607 **PIN-TRANS:** 9353 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**DAVID MONDRAGON **NIT:** 1024510199 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** MC 1 DE MAYO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	4 (m3) aproximadamente- 5.12 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 07.09.2024 06:53:15
FOLIO: 243072176
PEDIDO: 243072175

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: SCI118 2063 48000
Observaciones

Espacio para Sello

RCD
DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Heidy Johanna Quintero Ramirez
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 07.09.2024 10:07:39
FOLIO: 243074709
PEDIDO: 243074708

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: EKD741 15990 48000
Observaciones

RCD
CEMEX
SEP 2024
DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Yeimy Lorena Perez Garcia
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 07.09.2024 10:26:50
FOLIO: 243074820
PEDIDO: 243074819

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: SCI118 2063 48000
Observaciones

RCD
CEMEX
SEP 2024
DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Yeimy Lorena Perez Garcia
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A003490-016-2024 **Generado el: 2024-09-07**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2024-09-07 11:33:37

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DAVID MONDRAGON **NO DE IDENTIFICACION:** 1024510199 **PLACA VEHICULO:** VSB607 **PIN-TRANS:** 9353 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**DAVID MONDRAGON **NIT:** 1024510199 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** FUNDADORES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	7 (m3) aproximadamente- 8.96 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A003490-015-2024 **Generado el: 2024-09-07**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2024-09-07 06:54:14

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DAVID MONDRAGON **NO DE IDENTIFICACION:** 1024510199 **PLACA VEHICULO:** VSB607 **PIN-TRANS:** 9353 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**DAVID MONDRAGON **NIT:** 1024510199 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** 1 DE MAYO AV BOYACA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	6 (m3) aproximadamente- 7.68 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.



CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIAl

FECHA Y HORA 09.09.2024 07:47:18
FOLIO: 243084346
PEDIDO: 243084343

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: JIB505 2040 48000
Observaciones

CEMEX RCD 04 SEP 2024 DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :EDIN DAVIDI ORTIZ ANGULO
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo



CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 09.09.2024 08:25:07
FOLIO: 243084827
PEDIDO: 243084826

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: EKD741 15990 48000
Observaciones

CEMEX RCD Espacio para Sello 04 SEP 2024 DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Julieth Viviana Bonces Contreras
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo



CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 09.09.2024 10:06:57
FOLIO: 243086254
PEDIDO: 243086253

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: VSB607
Observaciones

CEMEX RCD Espacio para Sello 04 SEP 2024 DESPACHADO

CLIENTE
Usuario :Julieth Viviana Bonces Contreras
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo
