	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

3734-2023 JUNTA DE ACCIÓN VEREDA ALTO BERLIN
4123-2023 JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SAN JUAN BAJO
4311-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN

Contrato de Obra No. 4269-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CERRO AZUL

Contrato de Interventoría No. 4968-2023 **Interventoría:** CYCOS S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal vereda Alto Berlin, vereda San Juan Bajo, vereda Alto San Juan, corregimiento Cerro Azul, municipio de San Pablo del departamento de Bolívar, para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** JUNIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		13
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		14
2.1	Localización		15
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		18
2.4	Características técnicas del proyecto		20
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		23
3.1	Información general del contrato		23
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		26
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		36
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		36
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		36
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	36
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	37
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	38
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		38
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	38
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		38
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	39
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	39
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		39
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo		39
			39
	• Seguimiento Programa de Obra		39
	• Seguimiento Programa de Inversiones		39
			39
	• Actas de Comité de Obra		39
	• Actas de Reunión		39
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		40
5.1	Información general del contrato		40
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		41
5.3	Informe matriz de riesgos.		41
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		42
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	52
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	52
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	53
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	53
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		53
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		53
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	53
7	**Conclusiones y recomendaciones**		54
8	**Anexos**		56
8.1	Registro fotográfico y video del avance de las obras		57
8.2	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		77
8.3	Formatos MEPI		207

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 060 **de fecha** 22 de diciembre de 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA:	31/05/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR — **PERIODO MES:** MAYO

CONVENIO No.: 4269-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRO AZUL, MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CERRO AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4968 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VALLES S.A.S. C.Y.C.O.V — **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ

PLAZO INICIAL: 9 DIAS
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2024
PLAZO ACUMULADO: 9.73 Meses

VALOR INICIAL : $ 199.113.563,00
VALOR ADICIONALES: $
VALOR ACUMULADO: $
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	174
Estructuras	Alcantarillas	N/A	
	Muro de Contención	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especifique cuales)		N/A	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas	N/A	N/A	N/A
	Muro de Contención	N/A	N/A	N/A
Mantenimiento				
Otros (Especifique cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$149.520.213
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$4.335.606
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$45.256.121
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$199.113.960

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$91.799.964	$109.321.305
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0
VALOR EJECUTADO	$0	$0

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	117.539.399,99
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	91.799.963,99
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		78%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16

REGISTRO FOTOGRÁFICO









PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SUNCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALVARO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218412- CAU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
	VERSION	
	PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** JUNIO

CONVENIO No.: 4311-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO SAN JUAN MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN.

PLAZO INICIAL: 4 DIAS
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 31/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 4,57 Meses

VALOR INICIAL : $ 198.131.340,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4968 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	177
Estructuras	Alcantarillas	N/A	
	Muro de Contención	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)		N/A	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	0	59
Estructuras	Alcantarillas	N/A	N/A	N/A
	Muro de Contención	N/A	N/A	N/A
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$144.537.041
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$4.336.111
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$49.258.188
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$198.131.340

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$56.533.805	$116.616.255
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0
VALOR EJECUTADO	$0	$0

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 152.316.843,85
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 116.616.254,93
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 77%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **16**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** JUNIO

CONVENIO No.: 4123-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN JUAN BAJO DEL MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN BAJO

PLAZO INICIAL: N/A
FECHA DE INICIO: 27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 4.8 MESES

VALOR INICIAL : $ 198,614,244.00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4968 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	155
Estructuras	Alcantarillas	N/A	
	Muro de Contención	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)		N/A	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	74	114
Estructuras	Alcantarillas	N/A	N/A	N/A
	Muro de Contención	N/A	N/A	N/A
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$144,036,948
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$4,321,108
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$49,256,188
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$197,614,244

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$30,247,759	$115,229,558
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0
VALOR EJECUTADO	$0	$0

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 112,348,819.44
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 115,229,558.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 103%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** JUNIO

CONVENIO No.: 3734-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO BERLIN, MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ LA TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA ALTO BERLÍN

PLAZO INICIAL:	9 DIAS	31/12/2023	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	**VALOR INICIAL :**	$ 198,272,438.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29/12/2023	**VALOR ADICIONALES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	18/01/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024	**DESEMBOLSO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	4.87 Meses	**DESEMBOLSO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4968 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	137
Estructuras	Alcantarillas	N/A	
	Muro de Contención	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)		N/A	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	25	63
Estructuras	Alcantarillas	N/A	N/A	N/A
	Muro de Contención	N/A	N/A	N/A
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$144,673,499
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$4,340,205
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$49,266,149
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$198,279,853

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$68,279,128	$128,556,060
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0
VALOR EJECUTADO	$0	$0

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 128,556,059.70	**64.8%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 128,556,059.70	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100.00%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor, Dirección Territorial

2024 **ME DE INTERVENTORÍA MENSUAL No. 6_ JUNIO 1 AL 30 DE 2024**

CONTRATO NO. 4968-2023

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL””





INFORME TECNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA
(Periodo Junio de 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Entidad Contratante

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA

4968 DE 2023
Nº de contrato de Interventoría

NUMERO DE CONVENIO, CONTRATISTA Y OBJETO

JUNTA DE ACCIÓN VEREDA ALTO BERLÌN-3734-2023

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SAN JUAN BAJO-4123

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN BAJO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN-4311-2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA ALTO SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL-4269-2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	CARGO	FECHA	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente de interventoría Jhoan Ferney Quintero	30/06/2024	V00
REVISÓ Y APROBÓ	Director de interventoría Nelson Vargas Almario	30/06/2024	V00

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
2.1. Localización 9
2.2. Municipios en la zona de influencia 10
2.2.1. vereda alto berlin 11
2.2.2. vereda san juan bajo 11
2.2.3. vereda alto san juan 12
2.2.4. corregimiento cerro azul 12
2.3. estado inicial de la vía 13
2.4. Características técnicas del proyecto 15
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 18
3.1. Información general del contrato 18
3.1.1. convenio solidario junta de acción comunal vereda alto berlin 18
3.1.2. convenio solidario junta de acción comunal vereda san juan bajo 19
3.1.3. convenio solidario junta de acción comunal vereda alto san juan 20
3.1.4. convenio solidario junta de acción corregimiento cerro azul 21
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 21
3.3. Seguimiento Ítems no previstos 31
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 31
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 31
4.1. InformeS SemanaLES 31
4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 32
4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 33
4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 33
4.5. Estado General del Tiempo 33
4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 33
4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 34
4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 34
4.9. Otros documentos seguimiento mensual 34

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 34
4.9.2. Seguimiento Programa de Obra 34
4.9.3. Seguimiento Programa de Inversiones. 34
4.9.4. Actas de Comité de Obra 34
4.9.5. Actas de Reunión 34
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 35
5.1. Información general del contrato 35
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 36
5.3. Informe del Programa Anual de Caja - PAC 36
5.4. Informe matriz de riesgos 36
5.5. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría. 47
5.5.1. Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 47
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 47
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 47
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 47
6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 48
6.4. Seguimiento Garantías Contrato de InterventoríA 48
6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 48
6.6. Otros documentos seguimiento mensual 48
6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 48
6.6.2. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 48
6.6.3. Seguimiento al Plan de Cargas 49
7. Conclusiones y recomendaciones 49
8. Anexos 50
8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras 50
8.3. FORMATOS INVIAS MEPI-MN1-IN 50

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Información general del convenio de obra 3734-2023 18
Tabla 2. Información general del convenio de obra 4123-2023 19
Tabla 3. Información general del convenio de obra 4311-2023 20
Tabla 4. Información general del convenio de obra 4269-2023 21
Tabla 5. Chequeo equipo mínimo exigido en el Anexo técnico 32
Tabla 6. Personal de obra 33
Tabla 7. Resumen totalizado del estado del tiempo en el periodo 33
Tabla 8. Información general del Contrato de Interventoría 35
Tabla 9. Seguimiento a los Riesgos del Contrato de Obra, Etapa de ejecución 37
Tabla 10 Personal interventoría periodo del informe 47
Tabla 11. Garantía de cumplimiento exigida según Contrato de Interventoría 48

RELACIÓN DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto 9
Ilustración 2. Ubicación general de los convenios en el Municipio 10
Ilustración 3. Ubicación convenio Alto Berlín 11
Ilustración 4. Ubicación convenio San Juan Bajo 11
Ilustración 5. Ubicación convenio Alto San Juan 12
Ilustración 6. Ubicación vereda Tabacurú 12
Ilustración 7 Ubicación convenio Alto Berlín 13
Ilustración 8. Ubicación convenio San Juan Bajo 14
Ilustración 9. Ubicación convenio Alto San Juan 14
Ilustración 10. Ubicación Corregimiento Cerro Azul 15
Ilustración 11. Planta típica placa huella 16
Ilustración 12. Sección transversal placa huella 16
Ilustración 13. Sección longitudinal placa huella 17
Ilustración 14. Sección longitudinal viga riostra 17
Ilustración 15. Detalle sección transversal viga riostra y refuerzo 17
Ilustración 16. Detalle cuneta 18
Ilustración 17. Vaciado de cinta de placa huella- Vereda Alto Berlín 23
Ilustración 18. Formaleta para cinta de placa huella- Vereda Alto Berlín 23
Ilustración 19. Vaciado de concreto ciclópeo- Alto Berlín 24
Ilustración 20. Panorámica placa huella - vereda Alto Berlín 24
Ilustración 21. Excavación para cuentas – vereda Alto Berlín 25
Ilustración 22. Panorámica construcción placa huella – San Juan Bajo 25
Ilustración 23. Vía para paso vehicular – San Juan Bajo 26

Ilustración 24. Vaciado de concreto cinta de placa huella – San Juan Bajo 26
Ilustración 25. Vaciado de cuneta – San Juan Bajo 27
Ilustración 26. Afectación de acceso vial – San Juan Bajo 27
Ilustración 27. Valla – Alto San Juan 28
Ilustración 28. Vaciado de cinta de placa huella – Alto San Juan 28
Ilustración 29. Panorámica de placa huella – Cerro azul 29
Ilustración 30. Disposición de materiales y equipos en obra - Cerro azul 29
Ilustración 31. Vaciado de cuneta-Cerro azul 30
Ilustración 32. Panorámica vía-Cerro azul 30

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) está comprometido con Propósito de implementar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos Fortalecimiento de la infraestructura no concesionada de la red vial nacional, Especialmente en lo que respecta a las vías terciarias. El objetivo de estas iniciativas se basa en mejorar las condiciones de movilidad y Estándares de servicio para estas vías.

Como resultado, se desarrolló un plan de camino comunitario para la paz. En general, uno de sus objetivos es mejorar significativamente la calidad de transporte. Asimismo, su foco está en optimizar la prestación de servicios. Garantizar conexiones eficientes entre producción, distribución y consumo. Este enfoque integral no sólo apunta a facilitar el movimiento de mercancías; personas, también promueve la integración territorial y promueve desarrollo justo y sostenible.


En el marco de loa proyectos mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total el **Instituto Nacional de Vías** contrató los convenios 3734-2023, 4123-2023, 4311-2023, 4269-2023 en el Municipio de San Pablo Bolívar con las **OAC** vereda Alto Berlín, San Juan Bajo, Alto San Juan y corregimiento Cerro Azul que tiene por objeto “**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN, VEREDA SAN JUAN BAJO, VERDA ALTO SAN JUAN Y CORREGIMIENTO DE CERRO AZUL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**”, asimismo, el Instituto Nacional de Vías mediante licitación pública a través de la plataforma Secop II, adjudicó el contrato de interventoría 4966-2023 con objeto **“INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”** el cual firmó contrato el 14 de Diciembre del 2023 con el objetivo de realizar el acompañamiento a las OAC, además de cumplir con sus obligaciones contractuales para las cuales fueron seleccionadas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar, Municipio de San Pablo, como se muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 1. Localización del proyecto

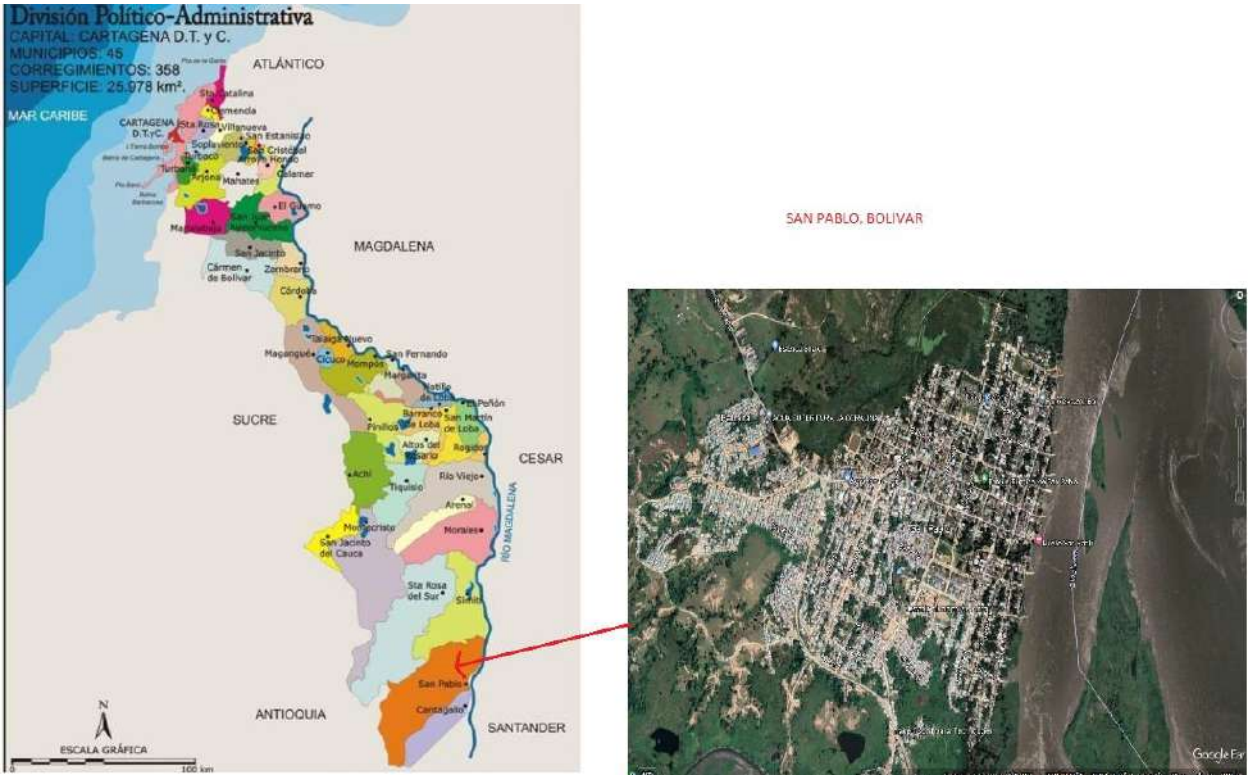

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

San Pablo es un municipio de Colombia, que se encuentra situado al sur del Departamento de Bolívar a 576 kilómetros de la Capital de la República, sobre la margen izquierda del río Magdalena en su recorrido medio y al norte del río Cimitarra. Territorialmente ocupa hacia el occidente un alto porcentaje de la Serranía de San Lucas, sistema orográfico del Sur de Bolívar. Su posición geográfica es la 7° 09' 00" de Latitud Norte y 75° 56' 00" de longitud. San Pablo de Cimitarra, limita al norte con el municipio de Santa Rosa del Sur y Simití departamento de Bolívar, al sur con el municipio de Cantagallo, al oeste con Remedios y Segovia uh (departamento de Antioquia) y al este con el municipio de Puerto Wilches (departamento de Santander)

Ilustración 2. Ubicación general de los convenios en el Municipio



2.2.1. VEREDA ALTO BERLIN

Ilustración 3. Ubicación convenio Alto Berlín




2.2.2. VEREDA SAN JUAN BAJO

Ilustración 4. Ubicación convenio San Juan Bajo



2.2.3. VEREDA ALTO SAN JUAN

Ilustración 5. Ubicación convenio Alto San Juan

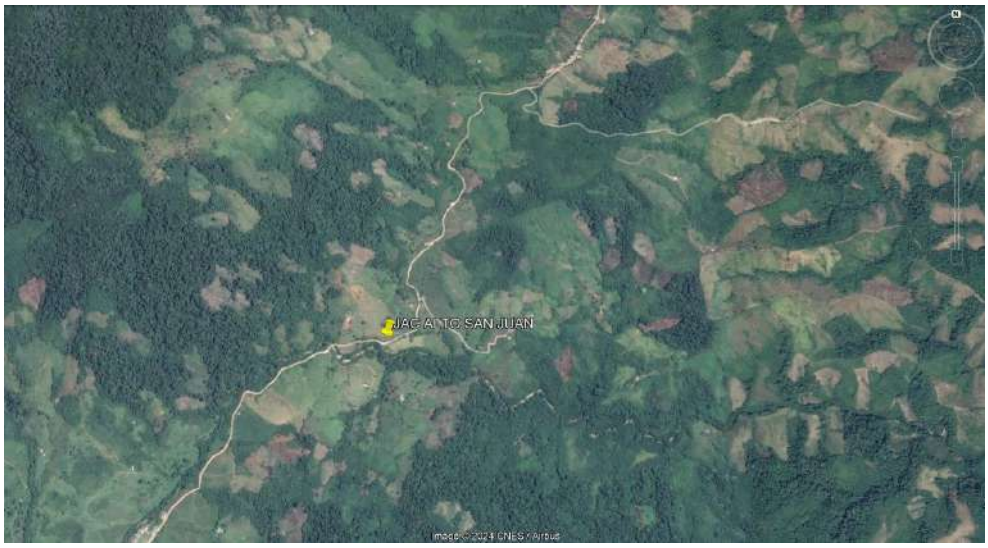

2.2.4. CORREGIMIENTO CERRO AZUL

Ilustración 6. Ubicación vereda Tabacurú



2.3. ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En los sectores que han sido identificados como prioritarios para la intervención en cada una de las veredas previamente mencionadas en el municipio de San Pablo, actualmente no cuentan con ningún tipo de pavimento, identificando la vía en mal estado. Se propone llevar a cabo la construcción de placa-huella en estas áreas como medida para mejorar la infraestructura vial y garantizar una mejor seguridad a cada uno de los habitantes del área de influencia de cada convenio.

Dicha propuesta implica la implementación de un pavimento con placa-huella, de acuerdo con las directrices establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Este enfoque busca proporcionar condiciones de circulación óptimas en vías terciarias. La aplicación de placa-huella en estos sectores prioritarios representa una solución efectiva, brindando beneficios como la mejora de las condiciones de movilidad, la reducción de costos de construcción y mantenimiento, así como la posibilidad de utilizar recursos y mano de obra locales.

Ilustración 7 Ubicación convenio Alto Berlín



Ilustración 8. Ubicación convenio San Juan Bajo



Ilustración 9. Ubicación convenio Alto San Juan



Ilustración 10. Ubicación Corregimiento Cerro Azul



2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades u obras a ejecutar se definen en concordancia con la guía de diseño de pavimentos con placa-huella del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Este tipo de pavimento se presenta como una solución adecuada para vías terciarias de carácter veredal, donde se tiene las actividades de mejoramiento principales

Excavaciones varias sin clasificar

Subbase granular tipo C

Concreto reforzado resistencia 21 MPa

Concreto ciclópea resistencia 14MPa

Acero de refuerzo FY=420 MPa

Ilustración 11. Planta típica placa huella

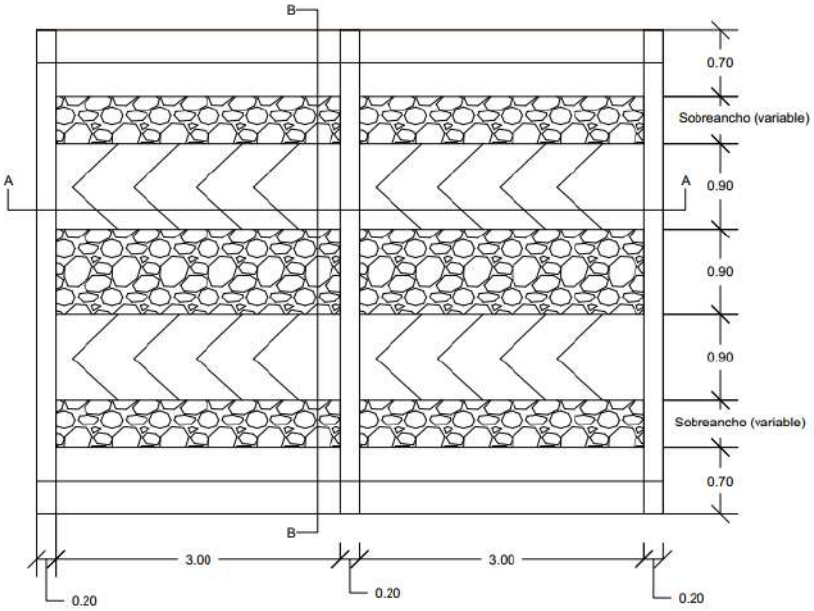


Ilustración 12. Sección transversal placa huella

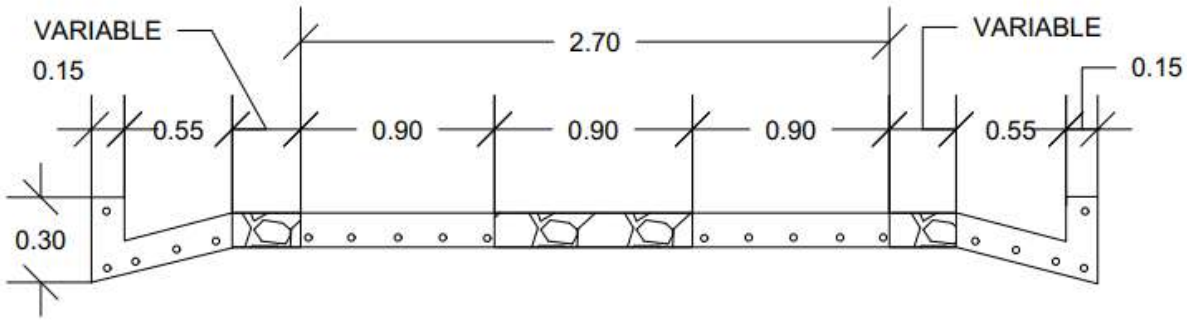


Ilustración 13. Sección longitudinal placa huella

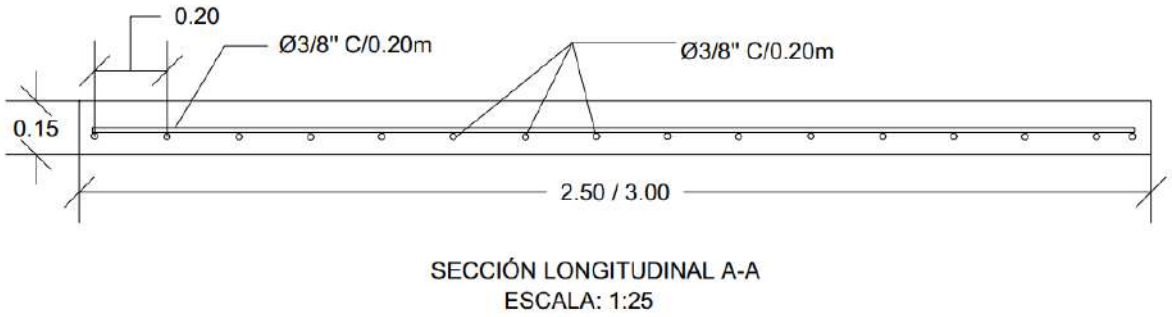


Ilustración 14. Sección longitudinal viga riostra.



Ilustración 15. Detalle sección transversal viga riostra y refuerzo


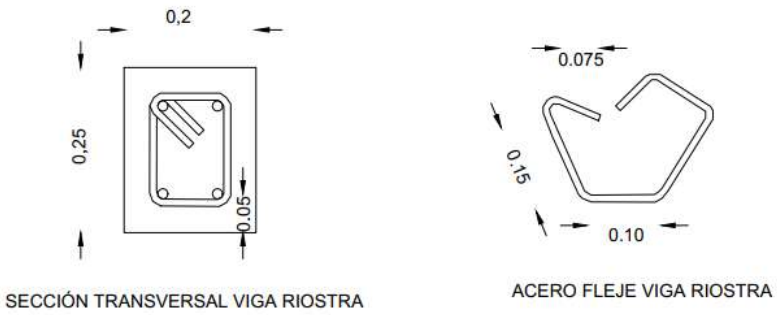


Ilustración 16. Detalle cuneta

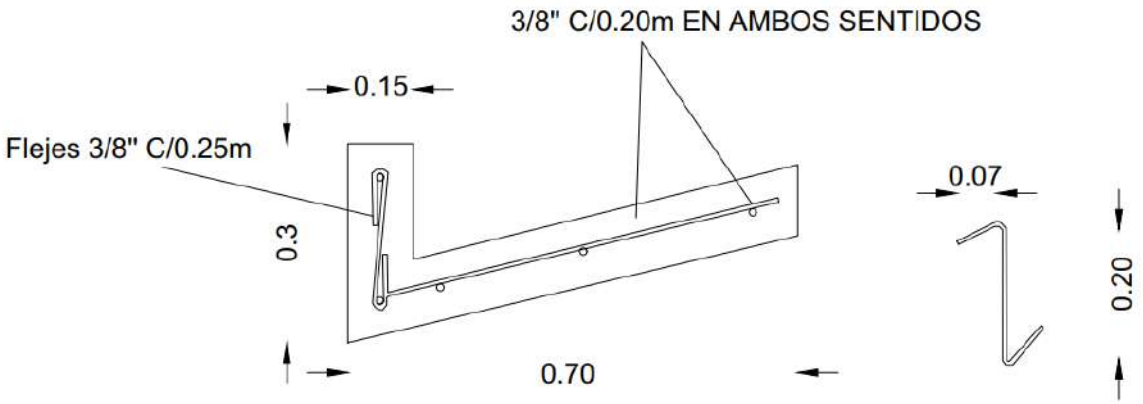

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Se presenta la información de cada uno de los convenios

3.1.1. CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN

Tabla 1. Información general del convenio de obra 3734-2023

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC VEREDA ALTO BERLIN NIT 829.003.736-3
CONTRATO No	3734-2023
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal vereda Alto Berlín, Municipio de San Pablo del Departamento de Bolívar, para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
PLAZO INICIAL:	13 días
INICIACIÓN	18 de diciembre de 2023

TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN	29 de Diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	18 de enero de 2024
PRORROGA I	18 de enero de 2024
PLAZO ADICIONAL	103 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2024
PRORROGA II	30 de Abril de 2024
PLAZO ADICIONAL	Dos (2) Meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Junio de 2024
PRORROGA III	27 de junio de 2024
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$199.215.438 Incluido IVA

3.1.2. CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN BAJO

Tabla 2. Información general del convenio de obra 4123-2023

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC VEREDA SAN JUAN BAJO NIT 900.117.632-3
CONTRATO No	4123-2023
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal vereda San Juan Bajo, Municipio de San Pablo del departamento de Bolívar, para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
PLAZO INICIAL:	N/A
INICIACIÓN	20/02/2024
TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICACION I	20/02/2024
PLAZO ADICIONAL	Plazo 4 meses a partir del 20/02/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20/06/2024
PRORROGA III	19 de junio de 2024

PLAZO ADICIONAL	Doce (12) días y un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$198.614244 Incluido IVA

3.1.3. CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN

Tabla 3. Información general del convenio de obra 4311-2023

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC VEREDA ALTO SAN JUAN NIT 900.119.217-9
CONTRATO No	4311-2023
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal vereda Alto San Juan, Municipio de San Pablo del departamento de Bolívar, para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
PLAZO INICIAL:	4 días
INICIACIÓN	27 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN	29 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	18 de enero de 2024
PRORROGA I	18 de enero de 2024
PLAZO ADICIONAL	103 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2024
PRORROGA II	30 de Abril de 2024
PLAZO ADICIONAL	Dos (2) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Junio de 2024
PRORROGA III	27 de junio de 2024
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$199.131.340 Incluido IVA

3.1.4. CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN CORREGIMIENTO CERRO AZUL

Tabla 4. Información general del convenio de obra 4269-2023

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA	JAC CORREGIMIENTO CERRO AZUL NIT 829.004.374-5
CONTRATO No	4269-2023
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal Corregimiento cerro Azul, Municipio de San Pablo del departamento de Bolívar, para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
PLAZO INICIAL:	9 días
INICIACIÓN	22 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN	29 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	18 de enero de 2024
PRORROGA I	18 de enero de 2024
PLAZO ADICIONAL	103 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2024
PRORROGA II	30 de Abril de 2024
PLAZO ADICIONAL	Dos (2) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Junio de 2024
PRORROGA III	27 de junio de 2024
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$199.113.940 Incluido IVA

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 1 de junio y 30 de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades en desarrollo del proyecto:

Cada Junta de acción comunal llevo a cabo las siguientes actividades para la construcción de la placa huella.

Técnico

- Localización y replanteo
- Instalación de formaleta para concreto ciclópeo
- Vaciado de concreto ciclópeo
- Se figuran flejes para viga riostra y se arma canasta viga riostra
- Se realiza excavación para viga riostra
- Se instala viga riostra y amarra el acero longitudinal y trasversal de la cinta de placa huella
- Se realiza vaciado de cinta de placa huella con mezcla de 21MPa in situ
- Se realiza excavaciones para bordillo y cuneta
- Se arma acero para bordillo
- Se instala el acero longitudinal y transversal de cuneta.

Financiero

- Se cotizan materiales y se buscan nuevos proveedores.
- Se tramitan solicitud de desembolsos a interventoría
- Legalización de desembolsos con soportes
- Pago de retenciones de proveedores a la Dian
- Pago de seguridad social a personal.
- Manejo de pagos por banca virtual de banco agrario

Recursos humanos

- Revisión de documentación del personal
- Entrega de dotación para protección personal

Ilustración 17. Vaciado de cinta de placa huella- Vereda Alto Berlín

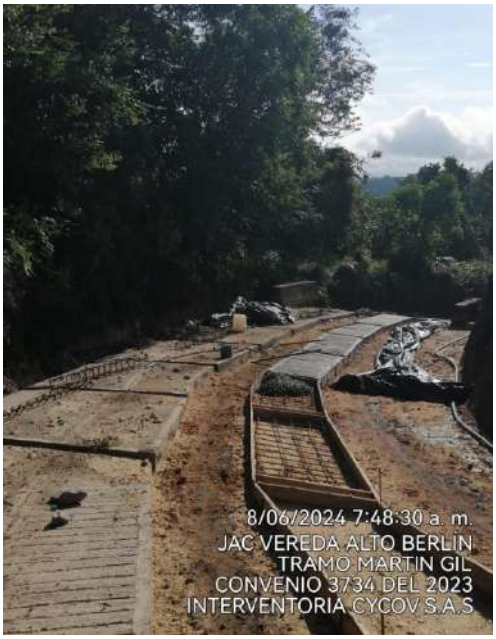


Ilustración 18. Formaleta para cinta de placa huella- Vereda Alto Berlín

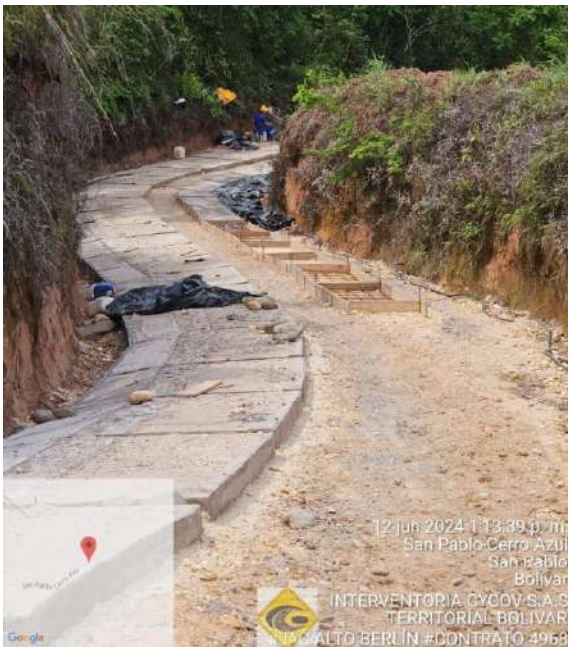


Ilustración 19. Vaciado de concreto ciclópeo- Alto Berlín



Ilustración 20. Panorámica placa huella - vereda Alto Berlín



Ilustración 21. Excavación para cuentas – vereda Alto Berlín



Ilustración 22. Panorámica construcción placa huella – San Juan Bajo



Ilustración 23. Vía para paso vehicular – San Juan Bajo



Ilustración 24. Vaciado de concreto cinta de placa huella – San Juan Bajo



Ilustración 25. Vaciado de cuneta – San Juan Bajo



Ilustración 26. Afectación de acceso vial – San Juan Bajo



Ilustración 27. Valla – Alto San Juan



Ilustración 28. Vaciado de cinta de placa huella – Alto San Juan

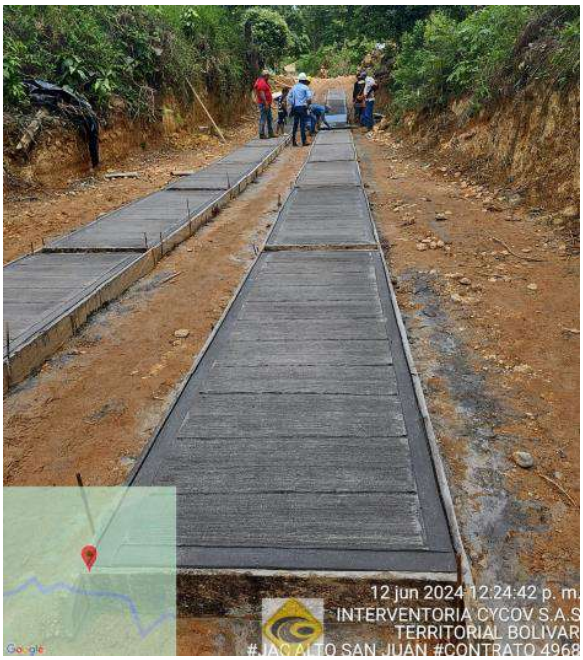


Ilustración 29. Panorámica de placa huella – Cerro azul




Ilustración 30. Disposición de materiales y equipos en obra - Cerro azul



Ilustración 31. Vaciado de cuneta-Cerro azul



Ilustración 32. Panorámica vía-Cerro azul

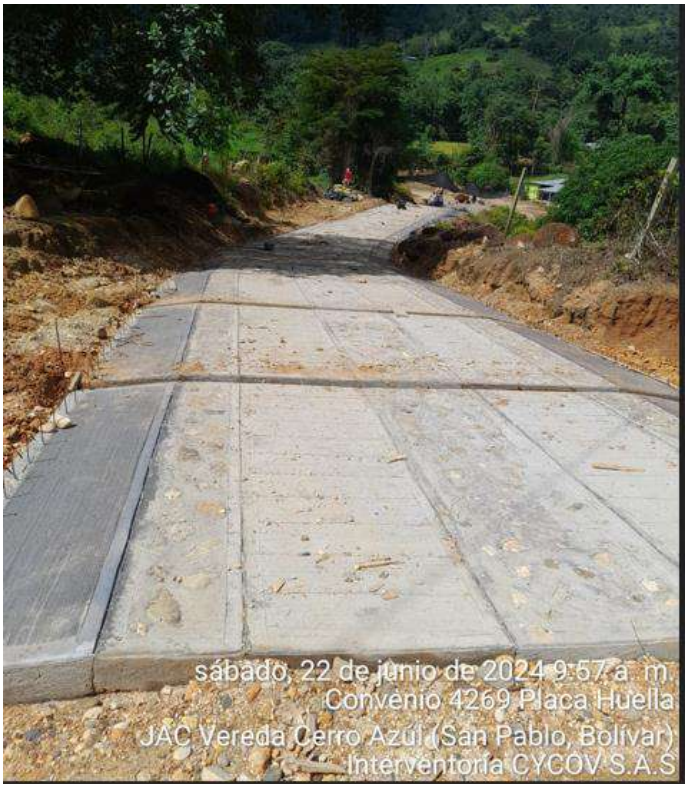

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

No se tienen ítems no previstos para el periodo reportado.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a las actividades de los contratistas de cada convenio, como revisión de los documentos del personal y sus afiliaciones, elementos de protección personal.
- Acompañamiento técnico y constante al contratista del figurado del acero e instalación de acuerdo a los diseños estructurales
- Supervisión en los vaciados de concreto de acuerdo a lo requerimiento del contrato tanto su resistencia como su curado
- Registro, autorizaciones y aprobaciones de cuentas en la banca virtual para los pagos de nómina, proveedor de materiales de cada uno de los convenios.
- Reuniones virtuales y visitas en campo con el fin de supervisar cada uno de los componentes a desarrollar por el contratista.
- Acompañamiento financiero, técnico y legal al contratista con el fin de desarrollar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Los convenios iniciaron dieron inicio con actividades de obra como lo son:

- Figurado de acero e instalación longitudinal y transversal
- Instalación de formaletas para cinta de placa huella
- Instalación de formaletas para concreto ciclópeo
- Vaciados de concreto ciclope y de cinta de placa huella
- Instalación de acero para cuenta
- Instalación de acero para bordillo.
- Vaciado de cuenta y bordillo
- Estas actividades son repetitivas.

4.1. INFORMES SEMANALES

Durante el periodo se presentaron oportunamente los informes semanales los cuales van de viernes a jueves de cada semana.

En el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de 2024 se presentaron los informes semanales número 17, 18, 19, 20 como anexo al presente informe

- Semana 21 del 01/06/2024 al 07/06/2024
- Semana 22 del 08/06/2024 al 14/06/2024
- Semana 23 del 15/06/2024 al 21/06/2024
- Semana 24 del 22/06/2024 al 28/06/2024

Ver anexos - Informes semanales Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante el presente periodo, dadas las actividades adelantadas por la OAC, se tuvo maquinaria y equipo disponible en el proyecto. Se presenta a continuación la lista de chequeo del equipo mínimo requerido por el proyecto y se presenta como anexo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4:

Tabla 5. Chequeo equipo mínimo exigido en el Anexo técnico

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) peso de operación (Kg) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	0
Cizalla manual de 90 cm	1	0
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	0
Ruteadora	1	0
Compresor (barrido y soplado)	1	0
Camioneta D – 300	1	0
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Compresor 120 HP, con martillo	1	0
Vibrador de concreto	1	0
Aspersor manual	1	0
Total	12	0

.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo al presente se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 con la información del personal del OAC vinculado durante el periodo del presente informe.

CARGO	MINIMO SOLICITADO	EN OBRA
Ingeniero Residente de obra	1	1
Contador	1	1

Tabla 6. Personal de obra

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el presente mes aún no se presenta movimiento financiero para los convenios ya que aún no cuentan con recursos.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo al presente, se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 en el cual se plasma la información relacionada con el registro diario de horas de precipitaciones promediadas en la zona del proyecto. De dicho formato, se puede concluir:

Tabla 7. Resumen totalizado del estado del tiempo en el periodo

Clase de tiempo	Total horas/mes	Porcentaje
Seco	449	63.06%
Lluvias moderadas	159	22.33%
Lluvias intensas	104	14.61%
Total	**712**	**100%**

Lo anterior evidencia que, durante el mes de junio de 2024, el tiempo de lluvia fue del 36.94%

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Anexo al presente se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Anexo al presente se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, con la información de las garantías del Contrato de Obra.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

No aplica seguimiento al Plan de Calidad para el periodo pues no se han ejecutado obras. Se entrega anexo el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 con la información que aplica.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El presente convenio no cuenta con anticipo por lo tanto no aplica al presente informe.

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

No aplica.

4.9.3. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

No aplica

4.9.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

- Durante el presente periodo no se han generado actas de comité de obra.

4.9.5. ACTAS DE REUNIÓN

Durante el presente periodo no se han generado actas de actas de reunión.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 8. Información general del Contrato de Interventoría

CONTRATISTA	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS- NIT. 900.856.332-9
CONTRATO NUMERO	4966 de 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
PLAZO INICIAL	9 días
INICIACION	22 de Diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2023
SUSPENSION	29 de Diciembre de 2023
REINICIO DE SUSPENSION	18 de Enero de 2024
PRORROGA I	18 de Enero de 2024
PLAZO ADICIONAL	103 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Abril de 2024
PRORROGA II	30 de abril de 2024
PLAZO ADICIONAL	Dos (2) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA II	30 de Junio de 2024
PRORROGA III	30/06/2024
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
VALOR INICIAL	$ 77.789.164 INCLUIDO IVA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA III	31 de julio de 2024
ADICIÓN I	$ 36.312.651 INCLUIDO IVA
VALOR ACUMULADO	**$113.437.795** INCLUIDO IVA

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el presente mes, el Interventor realizó las siguientes actividades:

Se realizo el acompañamiento a los convenios en la solicitud de prorroga III y se da aval a la misma solicitud hasta el 31 de julio de 2024.

Se solicita prorroga III al contrato de interventoría hasta el 31 de julio

Se revisan nominas cada quincena del personal de cada junta

Para el control y seguimiento financiero: para cada desembolso se solicita un formato con las cotizaciones de proveedores y/o equipos, RUT y certificado bancario y se prueba. Luego de esto se solicita la legalización del mismo donde el contratista debe relacionar las facturas electrónicas con RUT, soporte de transferencia realizado para cada pago. Cada uno de este seguimiento se revisa y se sigue de manera meticulosa al contratista con el fin de garantizar y controlar la utilización de los recursos ejecutados en obra. Asimismo, se realiza estricto seguimiento con el pago de nóminas donde se revisa las prestaciones sociales y la vigencia de ARL por cada trabajador

Se autorizan pagos por la banca virtual de banco agrario

Se realiza el seguimiento técnico al contratista en la dosificación y curado de los concretos garantizando el cumplimiento de la resistencia.

Se realiza el acompañamiento al contratista en los trabajos de campo como levantamiento de la vía garantizando las secciones típicas de la placa huella y sus niveles.

5.3. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

No aplica para este contrato

5.4. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Se adjunta la matriz de riesgos de acuerdo al anexo técnico del convenio solidario

Tabla 9. Seguimiento a los Riesgos del Contrato de Obra, Etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL OAC -CONVENIOS SOLIDARIOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	**Desabastecimiento de materias primas e insumos.** Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	2	2	4	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	**Variación de precios durante la ejecución del contrato.** Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles.	Afectación al equilibrio económico del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo

3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional - Social	**Cambio en la ubicación de las obras menores.** Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras.	4	3	7	Riesgo Alto
5	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio

6	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Por Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista:** Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio
7	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Modificaciones a Estudios y Diseños.** Se refiere a la posibilidad de que se deban realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios por parte del Contratista de Obra, debido a cambios de la naturaleza, redes de servicios y demás técnicos o sociales necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o** por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo

9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	4	3	7	Riesgo Alto
10	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras** por efectos de la existencia de dificultades técnicas no imputables al contratista para la construcción de obras; El contratista debe ejecutar las actividades y obras necesarias de acuerdo a los valores presentados en su oferta, y el INVIAS ajustará las condiciones del plazo.	Retraso en el plazo de ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Medio

11	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de disposición de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo para las fuentes de materiales y/o para los lugares de disposición de sobrantes. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales y lugares de disposición de sobrantes a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesgo Medio

12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	**Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El r**iesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. El Contratista de Obra, asumirá los riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológicos identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra , y eventuales mayores plazos	3	3	6	Riesgo Alto

13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes:** Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	**Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo

15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	**Gestión Ambiental:** Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios.	Retraso en la Ejecución de los trabajos	3	3	6	Riesgo Alto
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	**Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto	1	2	3	Riesgo Bajo
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	**Manifestación Social**: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la construcción y puesta en servicio del proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de éste.	Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo bajo

19	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	Riesgo Medio
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto

22	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	**Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto
23	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	**Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras.** Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	1	2	3	Riesgo Bajo

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

No aplica a este convenio

5.5.1. SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD.

No aplica a este convenio.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Durante el presente periodo se utilizaron vehículos y equipos por parte de la interventoría, los cuales se relaciones en el ANEXO **MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT.**

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el presente periodo se cuenta con personal vinculado, el cual se relaciona en la siguiente tabla y en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA.

Tabla 10 Personal interventoría periodo del informe

PERSONAL INTERVENTORÍA		
CARGO	**DEDICACION**	**PROFESIONAL**
DIRECTOR INTERVENTORÍA	0,33	NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	JHOAN FERNEY QUINTERO
INSPECTOR DE INTERVENTORÌA	1	CARLOS ALBERTO MORENO VALBUENA
INSPECTOR SISO	1	YERALDIN LOAIZA PALMA
INSPECTOR DE INTERVENTORÌA	1	LUZ DAYANA RAMIREZ GONZALEZ

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el presente periodo se cuenta con informe financiero y presupuestal, y se adjunta como Anexo: **MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT**

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Según las obligaciones contractuales de la interventoría, se presenta anexo, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, con la información requerida, siendo la siguiente tabla el resumen de la Garantía de Cumplimiento único:

Tabla 11. Garantía de cumplimiento exigida según Contrato de Interventoría

No. Póliza: 580 47 994000083178

Compañía Aseguradora: Aseguradora solidaria Colombiana

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$7.712.514,40	14	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$15.425.028,80	14	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	$23.137.543,20	31	12	2023	31	12	2024

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No aplica al presente convenio.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El presente contrato no cuenta con anticipo por lo tanto no aplica.

6.6.2. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

El formato se anexa al presente informe MEPI-MN-IN-9-FR-2

6.6.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Se adjunta al presente informe

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se están realizando desembolsos para pagos de proveedores y de nómina por la banca virtual del banco agrario, el cual son revisados y verificados cada uno de los soportes
- Si se continua la temporada de lluvia generará más retrasos en las obras por lo cual se deberán tramitar las prórrogas correspondientes de cada convenio y de interventoría para dar alcance al objeto del contrato
- Se recomienda al contratista remitir información para aprobación de nómina por parte de la interventoría tres a cuatro días antes de cada quincena, esto con el fin de poder realizar la revisión correspondiente y detallada del personal y aprobar cuando se cumpla con lo solicitado.
- Se recomienda al contratista para la compra de materiales a proveedores y su correcta legalización que solamente se le debe comprar que su RUT haga énfasis en su actividad comercial relacionada con el producto que vende.
- Se tramita prorroga III de la interventoría y de los convenios hasta el 31 de julio

Tabla 12. Resumen programado ejecutado mes de abril

PERIODO JUNIO							
CONTRATO	NUMERO DE CONVENIO	JUNTA DE ACCION	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE O RETRASO
4968-2023	3734	ALTO BERLÌN	$ 176,923,230	88.8%	$ 176,923,230	88.8%	0.0%
	4123	SAN JUAN BAJO	$ 123,855,843	62.4%	$ 126,278,936	63.6%	-1.2%
	4311	ALTO SAN JUAN	$ 197,558,202	99.2%	$ 151,260,166	76.0%	23.3%
	4269	CORR CERRO AZUL	$ 197,540,940	99.2%	$ 174,403,900	87.6%	11.6%

8. ANEXOS

8.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

8.2. BITACORA

8.3. FORMATOS INVIAS MEPI-MN1-IN


ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO
CONTRATO 4968-2023

REGISTRO FOTOGRAFICO
VEREDA ALTO BERLIN


1 jun. 2024 9:46:22 a. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda Alto Berlín Contrato 4968


1 jun. 2024 9:46:29 a. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda Alto Berlín Contrato 4968

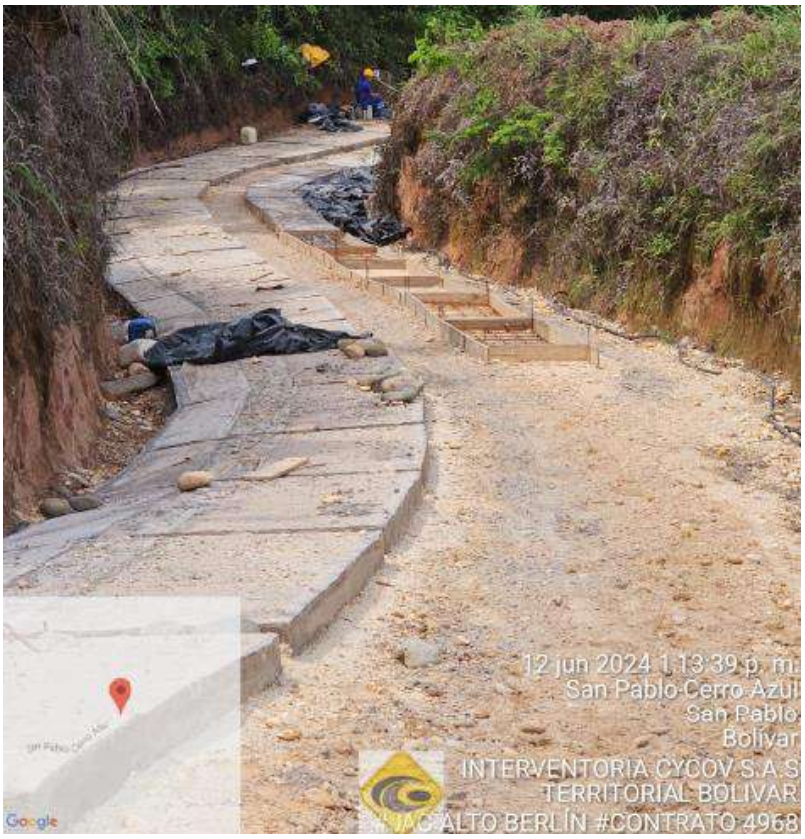
12 jun 2024 1:13:39 p. m.
San Pablo Cerro Azul
San Pablo
Bolívar
INTERVENTORIA CYCOV S.A.S
TERRITORIAL BOLIVAR
#JAC ALTO BERLÍN #CONTRATO 4968
Google


12 jun 2024 1:13:09 p. m.
INTERVENTORIA CYCOV S.A.S
TERRITORIAL BOLIVAR
#JAC ALTO BERLÍN #CONTRATO 4968



12 jun 2024 2:16:24 p. m.
INTERVENTORIA CYCOV S.A.S
TERRITORIAL BOLIVAR

REGISTRO FOTOGRAFICO
VEREDA SAN JUAN BAJO


17 jun. 2024 3:42:17 p. m
San Pablo, Bolívar
#Vereda San Juan Bajo Contrato 4968


17 jun. 2024 3:42:46 p. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda San Juan Bajo Contrato 4968


17 jun. 2024 3:43:17 p. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda San Juan Bajo Contrato 4968

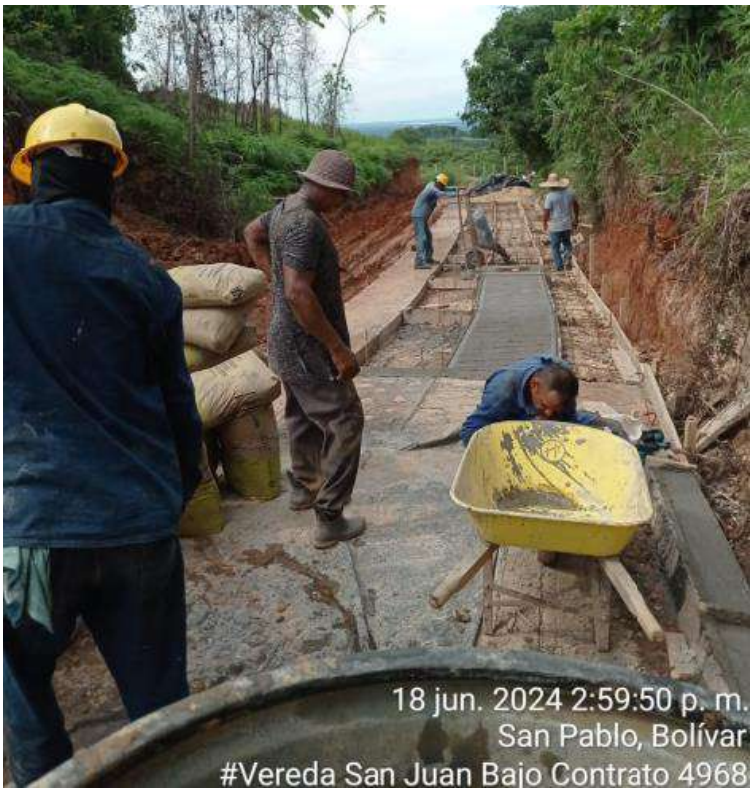
18 jun. 2024 2:59:50 p. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda San Juan Bajo Contrato 4968


20 jun. 2024 3:24:00 p. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda San Juan Bajo Contrato 4968


20 jun. 2024 3:23:53 p. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda San Juan Bajo Contrato 4968


25 jun. 2024 3:27:44 p. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda San Juan Bajo Contrato 4968


25 jun. 2024 3:27:35 p. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda San Juan Bajo Contrato 4968



25 jun. 2024 3:25:54 p. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda San Juan Bajo Contrato 4968


25 jun. 2024 3:25:18 p. m.
San Pablo, Bolívar
#Vereda San Juan Bajo Contrato 4968

REGISTRO FOTOGRAFICO
VEREDA ALTO SAN JUAN


12 jun 2024 12:33:33 p. m.
INTERVENTORIA CYCOV S.A.S
TERRITORIAL BOLIVAR
#JAC ALTO SAN JUAN #CONTRATO 4968


COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Transporte
Nuestros caminos comunitarios contribuyen a la paz total
Mantenimiento y mejoramiento de corredor vial
Vereda Alto San Juan, municipio de San Pablo, Bolívar
JAC VEREDA ALTO SAN JUAN
INVIAS
12 jun 2024 12:34:33 p. m.
INTERVENTORIA CYCOV S.A.S
TERRITORIAL BOLIVAR
#JAC ALTO SAN JUAN #CONTRATO 4968

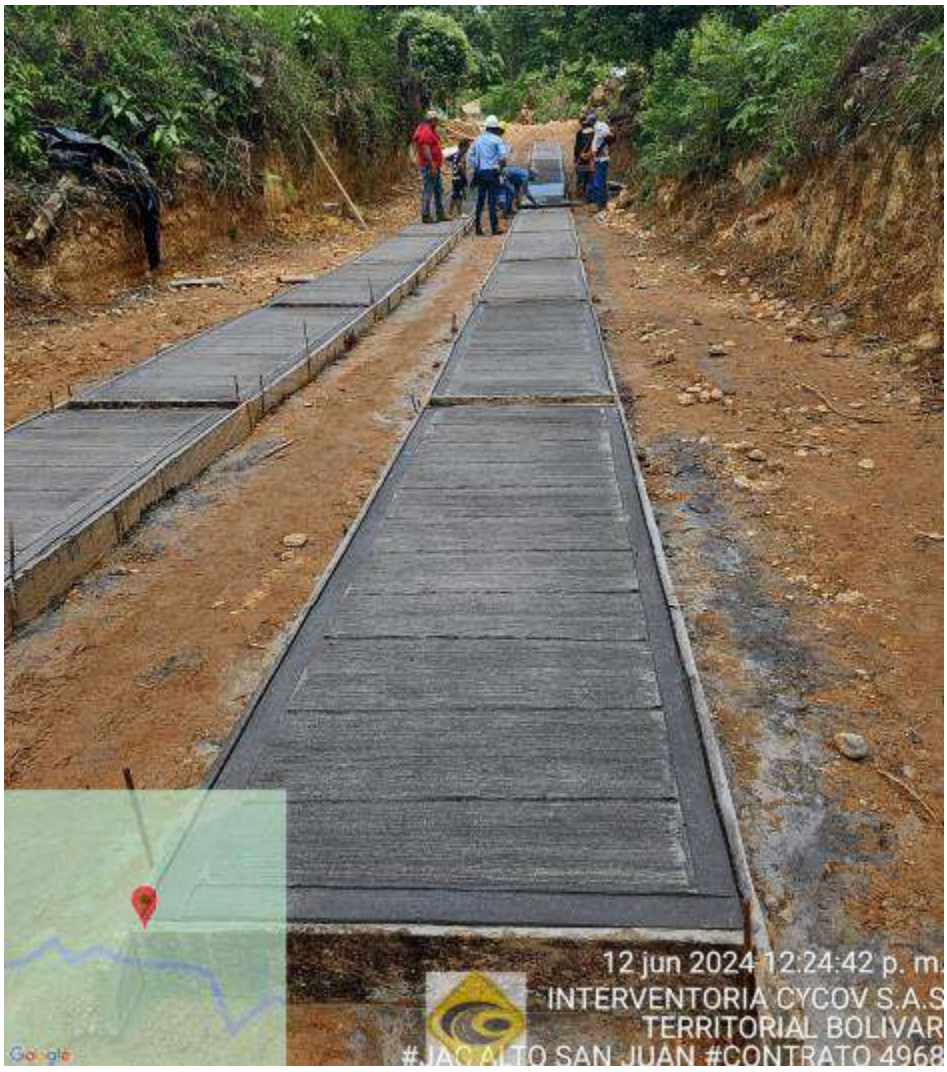
12 jun 2024 12:24:42 p. m.
INTERVENTORIA CYCOV S.A.S
TERRITORIAL BOLIVAR
Google

REGISTRO FOTOGRAFICO
CORREGIMEINTO CERRO AZUL


12 jun 2024 12:17:01 p. m.
INTERVENTORIA CYCOV S.A.S
TERRITORIAL BOLIVAR
#JAC CERRO AZUL #CONTRATO 4968


12 jun 2024 12:21:14 p. m.
INTERVENTORIA CYCOV S.A.S
TERRITORIAL BOLIVAR
#JAC CERRO AZUL #CONTRATO 4968


sábado, 22 de junio de 2024 12:24 p. m.
Convenio 4269 Placa Huella
JAC Vereda Cerro Azúl (San Pablo, Bolívar)
Interventoría CYCOV S.A.S


sábado, 22 de junio de 2024 9:57 a. m.
Convenio 4269 Placa Huella
JAC Vereda Cerro Azul (San Pablo, Bolivar)
Interventoría CYCOV S.A.S


miércoles, 26 de junio de 2024 3:56 p. m.
Convenio 4269 Placa Huella
JAC Vereda Cerro Azúl (San Pablo, Bolívar)
Interventoría CYCOV S.A.S


viernes, 28 de junio de 2024 3:16 p. m.
Convenio 4269 Placa Huella
JAC Vereda Cerro Azúl (San Pablo, Bolívar)
Interventoría CYCOV S.A.S

BITACORA

ALTO BERLIN

JONIO 1 SABADO

ORDEN DEL DIA

* ORACIÓN
* ASISTENCIA
* ACTIVIDADES EJECUIADA
* OBSERVACION E IMPREVISTO

1- SE REALIZO LA ORACION AGRADECIENDO POR EL DIA DE TRABAJO

2- SE VERIFICO LA ASISTENCIA 6 OBREROS Y EL MAESTRO

3- SE REALIZO FIGURADO, CORTE Y AMARRE DE HIERRO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS Y TAMBIEN SE IBA ADELANTANDO ESA ACTIVIDAD POR LA TARDE SE PROCEDIO A FUNDIR TRAMOS DE CICLOPEO

4 - SIN OBSERVACIONES NI IMPREVISTOS

5 - TEMPERATURA BAJA Y LLUVIAS

JUNIO 4 2024

ORDEN DEL DIA

* ORACIÓN
* ASISTENCIA
* ACTIVIDA EJECUTADA
* OBSERVACIONES

1- se realizo la oracion agradeciendo por el dia de trabajo.

2- se verifico la asistencia obrero y el maestro

3- se continuo adelantando el figurado, corte y amarre del hierro tambien se adelanto encofrado de huella)

4- sin observaciones

5- TIEMPO parcialmente seco

JUNIO 5 2024

ORDEN DEL DIA

* ORACIÓN
* ASISTENCIA
* ACTIVIDAD DEL DIA
* OBSERVACION

1 - se realizo la oracion agradeciendo por el dia de trabajo

2 - se verifico la asistencia 6 obreros y el maestro

3 - se continuo con el encofrado de las huellas y el corte, figurado y amarre del acero.

4. se registraron fuertes lluvias que impidieron laboral en el tramo de placa huella.

5 - clima lluvioso

JUNIO 6 2024

orden del dia

* oracion
* ASISTENCIA
* ACTIVIDAD
* OBSERVACIONES

1- se realizo la oracion agradeciendo por el dia de trabajo

2- se verifico la asistencia 6 obreros y el maestro

3- se realizo la fundicion o vaceado del concreto para los diferentes elemento de la placa huella.

4- sin observaciones

5- clima parcialmente seco

Junio 7 2024

Orden del dia

* oracion
* asistencia
* actividad
* observacion

1- se realizo la oracion por el dia de trabajo

2- se verifico la asistencia 6 obreros y el maestro

3- Se continuo con el vaciado del concreto en los diferente elementos de la placa huella

4- sin observación

5- clima parcialmente seco

JUNIO 8 2024

Orden del dia

* Oracion
* Asistencia
* Actividad
* Observacion

1 - se realizo la oracion agradeciendo por el dia de trabajo.

2 - se verifico la asistencia 6 obreros y el maestro

3 - se continuo con el vaciado aprovechando el dia soleado en el sitio de la obra

4 - sin observación

5 - clima parcialmente soleado

JUNIO 11 2024

Orden del dia

* oracion
* Asistencia
* Actividad
* observacion

1- se realizo la oracion por el dia de trabajo

2- se verifico la asistencia obreros y el maestro

3- se trabajo en el corte y figurado del acero debido a las fuertes lluvias presentadas.

4- fuertes lluvias en el sitio de la obra

5- Clima lluvioso

JUNIO 12 2024

orden del dia

* oracion
* Asistencia
* Actividad
* observacion

1- se realizo la oracion por el dia de trabajo

2- se verifico la asistencia de obreros y el maestro

3- se continuo figurado, corte, y amarre del acero debido a las fuertes lluvias presentadas, en la tarde se formaleteo o encofro el elemento de cuneta

4- fuertes lluvia toda la mañana

5- clima lluvioso

JUNIO 13 2024

Orden del dia

* oracion
* Asistencia
* Actividad
* Observaciones

1- se realizo la oracion agradeciendo por el dia de trabajo

2- se verifico la asistencia 6 obreros y el maestro

3- debido a las lluvias se continuo cortando hierro y amarrando de parrillas de los elementos de la placa huella.

4- lluvias en la zona de trabajo

5- clima lluvioso

JUNIO 14 2024

Orden del dia

* oracion
* asistencia
* Actividad
* observaciones

1- Se realizo la oracion respectiva agradeciendo por el dia de trabajo

2- se verifico la asistencia 6 obreros y el maestro

3- se realizo el vaceado de concreto en los diferentes elementos de la Placa huella, huellas-

4- Sin observaciones

5- clima Parcialmente seco

JUNIO 15 2024

orden del dia

* oracion
* asistencia
* actividad
* observaciones

1- se realizo la oración del dia

2- se verifico la asistencia 6 obreros y el maestro

3- se continuo con el vaciado de concreto

4- sin observación

5- clima parcialmente seco

JUNIO 17 2024

Orden del dia

* Oración
* asistencia
* actividad
* observación

1- se realizo la oracion agradeciendo por el dia de trabajo

2- se verifico la asistencia 6 obreros y el maestro

3- se iniciaron avances en el encofrado (formaleta) y vaciado de concreto

4- sin observacion

5- clima parcialmente seco.

JUNIO 18 2024

Orden del dia

* oración
* asistencia
* actividad
* observación

1- se realizo la oración del dia

2- se verifico la asistencia Gobiernos y el maestro

3- debido a las lluvias se trabajo figurado y corte de hierro, luego compactación de subbase y encofrado

4- lluvias en la zona

5- clima lluvioso

JUNIO 19 2024

orden del dia

* oracion
* asistencia
* actividad
* observacion

1- se realiza la oracion agradeciendo por el dia de trabajo

2- se verifica la asistencia 6 obreros y el maestro

3- debido a las lluvias se continua con corte y figurado del hierro luego se formaleteo los bordillos de un tanque

4- lluvias en la zona de trabajo

5- clima lluvioso.

JUNIO 20 2024

Orden del dia

* oracion
* asistencia
* actividad
* observacion

1- se realizo la respectiva oracion del dia

2- se verifico la asistencia del personal obreros y el maestro.

3- continuan (as) lluvias en la zona y percances del fluido electrico se continuo con corte y figurado del hierro

4- lluvia en la zona y sin fluido electrico

5- clima lluvioso

JUNIO 21 2024

Orden del dia

* oración
* asistencia
* Actividad
* observaciones

1- se realiza la oracion del dia por el dia de trabajo

2- se verifia la asistencia 6 obreros y el maestro

3- se realiza encofrado de ciclopeo y compactación de sub base.

4- sin fluido electrico desde el dia anterior y no se pudo enviar agua al almacenamiento

5- clima seco.

JUNIO 24 2024

Orden del dia

Oracion
asistencia
actividad
observación

* se realiza la oracion del dia agradeciendo por el dia de trabajo

* se verifico la asistencia de los trabajadores 6 obreros y el maestro.

* continua lluvias en la zona por ende se espera a que cese para continuar labores de vaciado en los ciclopeo.

* lluvia en la zona de trabajo

* clima lluvioso.

JUNIO 25 2024

Orden del dia

* oracion
* asistencia
* actividad,
* observacion

se realiza la oración del dia agradeciendo por el dia de trabajo

se verifica la asistencia del personal Gobiernos y el maestro.

se realiza vaciado de concreto en los elementos de la placa huella

sin observación

clima parcialmente seco

JUNIO 26 2024

Orden del dia

* oracion
* asistencia
* actividad
* observaciones

1- Se realiza la oracion del dia

2- Se verifica la asistencia del Personal 6 obreros y el maestro

3- se realiza vaceado de ciclopeo y cuneta se aprovecha el dia seco

4- sin observaciones

5- Clima seco.

JUNIO 27 2024

Orden del dia

* Oracion
* asistencia
* actividad
* Observaciones

1- se realiza la oracion del dia de trabajo

2- se verifica la asistencia del personal de trabajo 6 obreros y el maestro

3- se continua con vaceado del concreto en ciclopeo, huella y cuneta

4- sin observaciones

5- Clima soleado

Jueves 28 2024

Orden del dia

* Oracion
* asistencia
* actividad
* Observación

1- se realiza la oracion agradeciendo por el dia de trabajo.

2- se verifica la asistencia 6 obreros y el maestro.

3- se continua con vaciado de concreto y adicional se continuaba con encofrado

4- ~~Se~~ debido a que ya se culminaba el contrato laboral 4 obreros decidieron no continuar en el Proyecto

5 - clima soleado.

SAN JUAN BAJO

01 de Junio de 2024

- Equipos y Herramientas.
Herramienta menor, 1 mezcladora de concreto, 1 vibro-Compactador tipo canguro, 1 Planta eléctrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

- Personal en obra.
1 Ingeniero Residente, 1 maestro, 1 Oficial y 4 Ayudantes de Construcción

- Estado del tiempo = Soleado
- Descripción de actividades.

Corte Figurado y armado de acero, formaletado y Posterior fundición de concreto reforzado f'c = 21 MPa y concreto ciclopeo Resistencia f'c = 14 MPa.

- Responsables.

Jhoan Fernel Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA CYCOV S.A.S.

Mayer Díaz Rojas.
Ing. Residente de obra

02 de Junio de 2024.

⊖ Descripción de Actividades.

Dia no laborable Por ser dominical.

⊖ Responsables.

Walter Diaz Rojas.
ING. Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
Cycon S.A.S.

03 de Junio de 2024.

⊖ Equipos y Herramientas
Herramienta menor, 1 Mezcladora de Concreto, 1 vibro-compactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

⊖ Personal en obra.
1 ING. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de Construcción

⊖ estado del tiempo = soleado

⊖ Descripción de Actividades.
Corte, Figurado y armado de acero, formaleteado y Posterior Fundición de concreto reforzado $f'c = 21$ MPa y concreto ciclopeo Resistencia $f'c = 14$ MPa.

Powered by CamScanner

- Responsables

Jhoan Fernel Quintero N.
Malfer Díaz Rojas
ING. Residente de obra
VoBo INTERVENTORIA
CyCOV S.A.S

04 de Junio de 2024

- Equipos y Herramientas.

Herramienta menor, 1 Mezcladora de concreto, 1 Vibro-compactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

- Personal en obra

1. ING. Residente, 1 maestro, 1 Oficial y 4 Ayudantes de construcción

- Estado del tiempo = Soleado.

- Descripción de Actividades.

Corte, figurado y armado de acero, formaleteado y posterior fundición de concreto reforzado F'C = 21 MPa y concreto ciclopeo Resistencia F'C = 14 MPa.

- Responsables.

Jhoan Fernel Quintero N.
Malfer Díaz Rojas.
ING. Residente de Obra
VoBo INTERVENTORIA
CyCOV S.A.S.

Powered by CamScanner

05 de Junio de 2024.

⊖Equipos y Herramientas.
Herramienta menor, 1 Mezcladora de Concreto, 1 vibro-Compactador tipo Canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

⊖Personal en obra
1 ING. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de construccion

⊖Estado del tiempo: Soleado.
⊖Descripción de Actividades:
Corte, Figurado y armado de acero, formaleteado y Posterior Fundición de concreto reforzado $f'c = 21$ Mpa y Concreto Ciclopeo Resistencia $f'c = 14$ Mpa.

⊖Responsables.

Jhoan Fernel Quintero N.
VoBo INTERVENTORIA.
CyCOV S.A.S

Nafer Díaz Rojas.
ING. Residente de obra

06 de Junio de 2024

⊖Equipos y Herramientes
Herramienta menor, 1 Mezcladora de concreto, 1 vibro-Compactador tipo Canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

Powered by CamScanner

- Personal en obra.
1 ING. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de Construcción

- estado del tiempo - Soleado
- Descripción de Actividades
Corte, Figurado y armado de acero, famaleteado y Posterior fundición de concreto reforzado F'C=21 MPa. y concreto ciclopeo Resistencia F'C=14 MPa.

- Responsables.

Jhoan Farney Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCov S.A.S.

Maifer Díaz Rojas.
Ing. Residente de Obra

07 de Junio de 2024.

- Equipos y Herramientas.
Herramienta Menor, 1 Mezcladora de Concreto, 1 Vibro-Compactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

- Personal en obra:
1 ING. Residente, 1 maestro, 1 Oficial y 4 Ayudantes de Obra.

- Estado del tiempo: lluvias dispersas.

- Descripción de Actividades.
Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, formaleteado y Posterior fundición de concreto reforzado de F'C = 21 MPa y concreto ciclopeo Resistencia F'C = 14 MPa.

Powered by CamScanner

⊖ Responsables

Jhoan Fernel Quintero A.
Maiker Díaz Rojas. VoBo INTERVENTORIA
ING. Residente de obra. CyCav. S.A.S

08 de Junio de 2024.

⊖ Equipos y Herramientas.
Herramienta menor, 1 Mezcladora de concreto, 1 vibro-compactador tipo canguro, 1 planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

⊖ Personal en Obra.
1. ING. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de Construcción

⊖ Estado del tiempo. Lluvias Dispersas.
⊖ Descripción de Actividades.
Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, Formaleteado y Posterior Fundición de Concreto reforzado de F'c = 21 MPa. y Concreto ciclopeo resistencia F'c = 14 MPa.

⊖ Responsables.

Jhoan Fernel Quintero A.
Maiker Díaz Rojas. VoBo INTERVENTORIA
Ing Residente de Obra CyCav. S.A.S

Powered by CamScanner

09 de Junio de 2024

⊖ Descripción de Activia

Dia no laborable Por ser dominical.

⊖ Responsables

Maifer Díaz Rojas.
Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero N.
VoBo INTERVENTORIA
cy cov. S. A. S

10 de Junio de 2024.

⊖ Equipos y Herramientas.
Herramienta menor, 1 Mezcladora de Concreto, 1 vibro-compactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

⊖ Personal en obra
1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de Construcción

⊖ Estado del tiempo: lluvias dispersas.
⊖ Descripción de Actividades.
Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, Formaleteado y Posterior fundición de concreto reforzado de f'c = 21 Mpa y concreto ciclopeo resistencia f'c = 14 Mpa.

⊖ Responsables.

Maifer Díaz Rojas
Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero N.
VoBo INTERVENTORIA
cy cov. S. A. S

Powered by CamScanner

11 de Junio de 2024.

- Equipos y Herramientas
Herramienta menor, 1 mezcladora de Concreto, 1 Vibro-Compactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

- Personal en obra
1 ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de construcción

- Estado del tiempo = lluvias dispersas
- Descripción de Actividades
Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, Formaleteado y Posterior fundición de concreto reforzado de f'c = 21 MPa y concreto ciclopeo resistencia f'c = 14 MPa
- Responsables

Jhoan Farnel Quintero R.

Maifer Diaz Rojas
ING. Residente de Obra

Vo Bo INTERVENTORIA
Cycov S.A.S

Powered by CamScanner

12 de Junio de 2024

- Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 mezcladora de Concreto, 1 vibro. Compactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

- Personal en Obra

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 Oficial y 4 Ayudantes de Construcción

- Estado del tiempo. Lluvias dispersas
- Descripción de Actividades

Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, formaleteado y posterior fundición de concreto reforzado de f'c = 21 Mpa y concreto ciclopeo resistencia f'c = 14 Mpa.

- Responsables

Marfer Díaz Rojas
ING. Residente de Obra

Jhoan Fernel Quintero A.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCov S.A.S

Powered by CamScanner

13 de Junio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas
Herramienta menor, 1 Mezcladora de Concreto, 1 Vibro-Compactador tipo Canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

⊖ Personal en Obra.
1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 Oficial y 4 Ayudantes de Construcción

⊖ Estado del tiempo = lluvias dispersas

⊖ Descripción de Actividades
Corte, Figurado y armado de acero de refuerzo, formaleteado y Posterior fundición de concreto reforzado de f'c = 21 Mpa y concreto ciclopeo resistencia f'c = 14 Mpa.

⊖ Responsables

Maiker Diaz Rojas
Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernel Quintero R.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCav S.A.S

14 de Junio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas
Herramienta menor, 1 mezcladora de concreto, 1 vibro-compactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

⊖ Personal en obra
1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de Construcción

Powered by CamScanner

- Estado del tiempo = lluvias Continuas
- Descripción de Actividades

Continua el Proceso de Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, el avance de obra se a visto afectado Por las constantes lluvias.

- Responsables

Maifer Díaz Rojas
ING. Residente de Obra

Jhoan Fernel Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCov S.A.S

15 de Junio de 2024

- Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 Mezcladora de Concreto, 1 vibro-compactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

- Personal en Obra

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de Construcción

- Estado del tiempo = lluvias Continuas.
- Descripción de Actividades

Continua el Proceso de Corte figurado y armado de acero de refuerzo, el avance de obra se a visto afectado Por las constantes lluvias.

- Responsables

Maifer Díaz Rojas ING. Residente

Jhoan Fernel Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCov S.A.S.

Powered by CamScanner

16 de Junio de 2024

- Descripción de Actividades

Dia no laborable Por ser dominical.

- Responsables

Jhoan Farnel Quintero N.

Maifer Diaz Pojas
Ing. Residente de Obra

V/o Bo INTERVENTORIA
CyCoV S.A.S

17 de Junio de 2024

- Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 Mezcladora de concreto, 1 Vibro-Compactador tipo Canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

- Responsables en obra

Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de Construcción

- Estado del tiempo: Lluvias Continuas
- Descripción de Actividades

Continua el Proceso de corte, figurado y armado de acero de refuerzo, el avanze de obra se avisto afectado Por las Constantes lluvias.

- Responsables

Jhoan Farnel Quintero N.

Maifer Diaz Pojas
Ing. Residente de obra

V/o Bo INTERVENTORIA
CyCoV S.A.S

Powered by CamScanner

18 de Junio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas
Herramienta menor, 1 Mezcladora de concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

⊖ Personal en obra
1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial, y 4 Ayudantes de Construcción

⊖ Estado del tiempo: lluvias Continuas.

⊖ Descripción de Actividades.
Continua el Proceso de Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, el avance de obra se a visto afectado por las Constantes lluvias.

⊖ Responsables

Jhoan Fernel Quintero M.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCon. S.A.S

Maxfer Diaz Rojas.
Ing. Residente de Obra

19 de Junio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas
Herramienta menor, 1 Mezcladora de Concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

⊖ Personal en obra
1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 Ofical y 4 Ayudantes de Construcción

Powered by CamScanner

⊖ Estado del tiempo = lluvias Continuas.
⊖ Descripción de Actividades
Continua el Proceso de Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, el avance de obra se a visto afectado Por las constantes lluvias

⊖ Responsables

Jhoan Fernel Quintero N.
Yaifer Diaz Rojas
ING. Residente de obra
V/o Bo INTERVENTORIA
CyCar S.A.S

20 de Junio de 2024
⊖ Equipos y Herramientas
Herramienta menor, 1 Mezcladora de Concreto, 1 vibrocompactador, tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

⊖ Personal en obra
1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Aycodantes de construcción

⊖ Estado del tiempo = lluvias Continuas.
⊖ Descripción de Actividades
Continua el Proceso de Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, el avance de obra se a visto afectado por las Constantes lluvias.

⊖ Responsables

Jhoan Fernel Quintero N.
Yaifer Diaz Rojas
ING. Residente de Obra
V/o Bo INTERVENTORIA
CyCar S.A.S

Powered by CamScanner

21 de Junio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 Mezcladora de Concreto, 1 Vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

⊖ Personal en obra.

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 Oficial y 4 Ayudantes de Construcción

⊖ Estado del tiempo - lluvias continuas.

⊖ Descripción de Actividades

Pese a las continuas lluvias continua las Actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo, y se realiza el Vaciado de concreto ciclopeo.

⊖ Responsables

Walter Diaz Pajas
ING. Residente de Obra

Jhoan Fernay Quintero A.
V/o Bo INTERVENTORIA
CYCOV S.A.S

22 de Junio de 2024

⊖Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 Mezcladora de concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

⊖Personal en obra

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de Construccion

⊖Estado del tiempo = lluvias continuas

⊖Descripción de Actividades

Pese a las constantes lluvias continuas las Actividades de corte, figurado y armado de acero refuerzo, y se realiza el vaciado de concreto ciclopeo

⊖Responsables

Maifer Diaz Rojas
ING. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero A.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCon S.A.S

23 de Junio de 2024

⊖Descripción de Actividades

Dia no laborable Por ser dominical

⊖Responsables

Maifer Diaz Rojas
Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero A.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCon S.A.S

Powered by CamScanner

24 de Junio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 mezcladora de Concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

⊖ Personal en Obra

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 Ofical y 4 Ayudantes de Construcción

⊖ Estado del tiempo: lluvias Continuas

⊖ Descripción de Actividades

Pese a las Constantes lluvias, Continua las Actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo, y se realiza el Vaciado de concreto ciclopeo.

⊖ Responsables

Maifer Diaz Rojas
Ing. Residente de obra

Jhoan Ferney Cuentas
V° B° INTERVENTORIA
CYCOU S.A.S

25 de Junio de 2024

⊖ Equipos y Herramienta.

Herramienta menor, 1 mezcladora de concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

⊖ Personal en obra.

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 ofical y 4 Ayudantes de construcción

Powered by CamScanner

⊖ Estado del tiempo - lluvias Continuas.

⊖ Descripción de Actividades

Pese a las constantes lluvias continua las Actividades de Corte, Figurado y armado de acero de refuerzo, y se realiza el vaciado de concreto ciclopeo

⊖ Responsables

Jhoan Fernel Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCon S.A.S

Haifer Diaz Rojas
Ing. Residente de Obra

26 de Junio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 Mezcladora de concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

⊖ Personal en obra

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 ofical, y 4 Ayudantes de Construcción

⊖ Estado del tiempo - lluvias continuas

⊖ Descripción de Actividades

Pese a las constantes lluvias continua las actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo, y se realiza el vaciado de concreto ciclopeo

⊖ Responsables

Jhoan Fernel Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCon. S.A.S

Haifer Diaz Rojas
Ing. Residente de obra

Powered by CamScanner

27 de Junio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 mezcladora de Concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

⊖ Personal en Obra

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial, y 4 Ayudantes de Construcción

⊖ Estado del tiempo = lluvias Continuas

⊖ Descripción de Actividades

Pese a las Constantes lluvias continua las actividades de Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, y se realiza el vaciado de Concreto ciclopeo.

⊖ Responsables

Maifer Diaz Rojas
Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernay Quintero A.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCal S.A.S

28 de Junio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 mezcladora de concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts

⊖ Personal en obra

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 Oficial y 4 Ayudantes de construcción.

Powered by CamScanner

- Estado del tiempo: lluvias dispersas.
- Descripción de Actividades

Continua el Proceso de corte, figurado y armado de acero de refuerzo y Vaciado de concreto reforzado de f'c=21 MPa.

- Responsables

Maifer Díaz Rojas
Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernay Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCon S.A.S

29 de Junio de 2024

- Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 Mezcladora de concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 lts.

- Personal en obra

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de construcción

- Estado del tiempo = lluvias dispersas
- Descripción de la Actividad

Continua el Proceso de corte, figurado y armado de acero de refuerzo y Vaciado de concreto reforzado de f'c=21 MPa

- Responsables

Maifer Díaz Rojas
Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernay Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCon S.A.S

Powered by CamScanner

30 Junio de 2024

⊖ Descripción de Actividades

Dia no laborable Por ser dominical.

⊖ Responsables

Jhoan Fernel Quintero N.

Nalfer Diaz Rojas
Ing. Residente de obra

Vo Bo INTERVENTORIA
CyCOV S. A. S

01 de Julio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 mezcladora de concreto, 1 vibrocompactador tipo Canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

⊖ Personal en obra.

1. Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes de construcción

⊖ Estado del tiempo: lluvias dispersas

⊖ Descripción de la Actividad

Continuo el Proceso de corte, figurado y armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto reforzado de f'c = 21 Mpa

⊖ Responsables

Jhoan Fernel Quintero N.

Nalfer Diaz Rojas
Ing Residente de obra

Vo Bo INTERVENTORIA
CyCOV S. A. S

Powered by CamScanner

02 de Julio de 2024

⊖Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 mezcladora de Concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 LTS

⊖Personal en obra

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de Construcción

⊖Estado del tiempo: lluvias dispersas

⊖Descripción de Actividades

Continua el Proceso de coste, figurado y armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto reforzado de F'c=21 MPa.

⊖Responsables

Naifer Diaz Rojas
Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernay Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCOV S.A.S

03 de Julio de 2024

⊖Equipos y Herramientas

Herramienta menor, 1 mezcladora de concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 LTS.

⊖Personal en obra

1 Ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de Construcción

⊖Estado del tiempo: lluvias dispersas

Powered by CamScanner

⊖ Descripción de Actividades
Continua el Proceso de corte, figurado y armado de acero de refuerzo, y vaciado de concreto reforzado de f'c=21 MPa

⊖ Responsables

Naifer Diaz Rojas
Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernel Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCov S. A. S

04 de Julio de 2024

⊖ Equipos y Herramientas
Herramienta menor, 1 Mezcladora de concreto, 1 vibrocompactador tipo canguro, 1 Planta electrica, 1 tanque de almacenamiento de 1000 Lts.

⊖ Personal en obra
1 ing. Residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes de construcción

⊖ Estado del tiempo: lluvias dispersas.
⊖ Descripción de Actividades
Continua el Proceso de corte, figurado y armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto reforzado de f'c=21 MPa

⊖ Responsables

Naifer Diaz Rojas
Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernel Quintero N.
Vo Bo INTERVENTORIA
CyCov S. A. S

Powered by CamScanner

SAN JUAN ALTO

Sabado, 01 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Seco

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro General de obra
1 Oficial de obra
4 Obreros

Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana

Fin de laboras: 12:00 P.M.

Actividad.

Se inicia la jornada con la charla y oración a Dios como es de costumbre, se realizaron ejercicios de calistenia, se continuó con el encofrado para huellas y la instalación de acero de las huellas.

Observaciones:

En la jornada no se presentaron novedades ni atrasos que afectaran las actividades.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Lunes, 03 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Seco

Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro general de obra
1 Oficial de obra
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana

Fin de labores: 5:00 P.M.

Se inicio la jornada con la charla y oración a Dios como es habitual, se realizaron ejercicios de calistenia y se continuó con la formaleta para la fundida de huellas, el armado de acero en las huellas y la fundida de unos metros de huellas.

Observaciones:

No se presentaron anomalias ni atrasos que afectaran las actividades que se programaron.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Martes, 04 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias moderadas
Personal: 1 Residente de obra
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
4 obreros
Herramienta y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada laboral como es de costumbre con la oración a Dios y los ejercicios de calestenia, Posterior a ello se prosiguió a adecuar los implementos para fundir los metros de huellas que ya estaban formaleteadas.

Observación:
Debido a la presencia de lluvias en la zona se optó por suspender actividades.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing. Residente de interventoría

Miercoles, 05 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias Moderadas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramienta y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.

Se inició la jornada laboral como es de costumbre con la oración a Dios y los ejercicios de calestenia, Posterior a ello se continuó con la fundida de huellas y los primeros metros de placa.

observación:

Por la Presencia de lluvias se opto' por suspender las actividades programadas.

Ing Residente de dora.

Jhoan Farid Quintero A.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 06 de junio
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 oficial
4 obreros
Herramienta y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada como es habitual con la oración a Dios y se realizó ejercicios de calistenia, posterior a ello se continuó con la fundida de huellas y Piedra Pegada central.

Observación.
No se Presentaron novedades en la jornada que atrasaran las actividades programadas.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero R.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Viernes, 07 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima. Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramienta y Equipos - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobombas
- Vibrador de concreto
- Vibrocorrecadador Tipo rana
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inició la jornada como es de costumbre con la oración a Dios y la calestenia, se procedió a continuar con la fundida de Piedra pegada central y la fundida de huellas hasta terminar la jornada.

Observación:
No se presentaron novedades ni atrasos que afectaran el desarrollo de las actividades Programadas.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Sábado, 08 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 12:00 P.M.

Actividad:
No se pudo realizar actividades en la jornada debido a las altas precipitaciones que se presentaron en la zona.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Lunes, 10 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

Se inició la jornada con la oracion a Dios y los ejercicios de calestenia como es habitual, Posterior a ello se continuó con la fundida de Piedra Pegada central.

Observacion:

Debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona no se pudo continuar con las actividades Previstas.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Martes. 11 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: lluvias moderadas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador tipo rana
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inició la jornada como es de costumbre con La oración a Dios, se realizó ejercicios de calestenia, posterior a ello se continuó con la fundida de Piedra Pegada central.

observación:
Debido a las lluvias presentadas en la zona se optó por suspender las actividades debido a que se podrán afectar los acabados finales

Ing. Residente de obra

Jhoan Ferney Quintero A.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Miercoles, 12 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias moderadas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inicio la jornada como es habitual con la oración a Dios y con la realización de ejercicios de calistenia, se continúo con la Fundida de huellas. Piedra Pegada central y se empezó con el encofrado de Piedra Pegada lateral.

observación:
Por las Precipitaciones Presentadas en la tona se suspenderon las actividades Programadas.

Ing. Residente de obra

Jhodir Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 13 junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipo: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bolsas (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana
Fin de labores: 5:00 P.M

Actividad:
Se inicio la jornada con la charla inicial y oración a Dios como es habitual, luego se realizó ejercicios de calestenia, posterior a ello se prosiguió a hacer el encofrado de Piedra pegada lateral.

Observación:
Debido a la fuertes precipitaciones que se presentaron en la zona nose Pudo continuar con la ejecución de actividades programadas.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero N.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Viernes, 14 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: lluvias intensa
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Debido a las fuertes precipitaciones que se presentaron en la zona, no se pudieron ejecutar las actividades que se programaron.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

40

Sabado, 15 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 12:00 P.M.

Actividad

No se pudo ejecutar las actividades programadas de la jornada debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernay Quintero A.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Lunes, 17 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada con la charla y oración a Dios como es habitual, luego se hicieron ejercicios de calestenia. Posterior a ello se prosiguió a seguir con el encofrado y fundida de piedra pegada central y lateral.

Observación.
No se Presentaron novedades en la jornada que afectara el desarrollo de las actividades Programadas.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farney Quintero A.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Martes, 18 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.

Debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona no se pudo ejecutar las actividades programadas.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

Miercoles, 19 de junio de 2024

Inicio: 7:00 AM.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

Por las fuertes lluvias que se presentaron en la zona no se pudo realizar las actividades previstas en la jornada.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 20 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inició la jornada laboral como de costumbre con La charla, oración a Dios y ejercicios de calistenia, Posterior a ello se inició la fundida de cuneta

Observación:
No se pudo realizar actividades en la jornada de la mañana, a causa de las altas precipitaciones que se presentaron en la zona, Se trabajó en la jornada de la tarde.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farnel Quintero N.
Ing. Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Viernes, 21 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada como es habitual con la oración a Dios y ejercicios de calistenia, Posterior a ello, se continuó con la fundida de cuneta.

Observacion:
No se presentó ninguna novedad, ni atrasos que afectaran las actividades previstas en la jornada laboral.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero R.
Ing Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Sabado, 22 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrodomestica.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de Labores: 7:00 A.M.

Actividad.
Debido a las fuertes precipitaciones no se pudo realizar las actividades que estaban programadas en la jornada

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero A.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Lunes, 24 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Obreros
Herramientas y Equipos: - Herramientas Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada como es habitual con la charla inicial, oración a Dios y ejercicios de calestenia, Posterior a ello se continuó con la fundida de Piedra Pegada central y lateral.

Observación:
No se Presentaron novedades que alteraran las actividades Previstas de la jornada.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

48

Martes, 25 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona no se pudo ejecutar las actividades programadas en la Jornada

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Miercoles, 26 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora de 2 bultos (Trompo)
- Electrobombas.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inicio la jornada laboral como de costumbre con la oración a Dios, se realizaron ejercicios de calestenia, Posterior a ello se continuó con la fundida de piedra Pegada, fundida de canaleta y armado de formaleta para huellas.

Observacion:
No se Presentaron anomalias en la obra y se pudo trabajar con normalidad.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero N.
Ing Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 27 de junio de 2024
Inicio: 7:00 AM.
Clima: Lluvias Moderadas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Debido a las lluvias que se presentaron en la zona no se pudo ejecutar las actividades programadas.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes, 28 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias Moderadas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrolcombo.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividades

Se inicio la tornada con la oración a Dios y con los ejercicios de calestenia como es habitual. Posterior a ello se siguió con el armado y formaleteada de los ultimos metros de huellas.

Observación.

Debida a las lluvias que se presentaron en la zona se optó por suspender las actividades programadas.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero M.

Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Sabado, 29 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

No se pudo realizar las actividades previstas en la jornada debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero A.
Ing. Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Martes, 02 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibradora de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividades
Se inició la jornada laboral como es de costumbre con la oración a Dios, luego se realizaron ejercicios de calestenia. Posterior a ello, se procedio al retiro de rocas que estaban en la via.

Observación.
Las actividades que estaban previstas no se pudieron ejecutar con normalidad, ya que se realizó actividades no previstas que fue el retiro de rocas en la via.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Miercoles, 03 de julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias moderadas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.

Se inicio la jornada con la charla inicial, oracion a Dios como es de costumbre y se hicieron los ejercicios habituales de calentamiento, posterior a ello se realizo la fundida de huellas y cunetas.

Observaciones:

Debido a las precipitaciones que se presentaron en la tarde se suspende actividades para que no afecte los acabados Finales.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Jueves, 04 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobombas
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona, no se pudo ejecutar las actividades programadas para la jornada.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Viernes, 05 de julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

No se pudo realizar actividades debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing residente de interventoria

Powered by CamScanner

Sabado, 06 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima. Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 12:00 P.M.

Actividad
Se inició la jornada como es de costumbre con la oración a Dios y ejercicios de calistenia, posterior a ello se continuó con la fundida de huellas y cunetas.

Observacion:
No se presentaron novedades en la jornada que afectara el desarrollo de actividades.

Ing Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Lunes, 08 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Motosierra 2 tiempos (Trompo
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada con la habitual charla inicial y oración a Dios, posterior se hicieron ejercicios de calestenia, se procedió a continuar la fundida de huellas y cunetas, se realizo retiro de rocas en la vía.

Observaciones:
No se pudo trabajar con normalidad debido a que se encontraron rocas en la vía, por lo que se suspenden actividades para el retiro de las mismas.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 09 de julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

clima: lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipo: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador tipo rana

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

No se pudo ejecutar las actividades programadas debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farney Quintero M.
Ing. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

Miercoles, 10 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la tornada como de costumbre con la oración a Dios y los ejercicios de calistenea, Posterior a ello se continuó con la fundida de Piedra Pegada y huellas.

Observación:
No se Pudo trabar con las actividades Previstas, ya que se Procedió a Proteger la Placa huella terminada de las rocas que aparecian en la vía.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 11 de julio
Inicio: 7:00 AM
clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana
Fin de las actividades: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada laboral con la charla inicial y oración a Dios como es costumbre y ejercicios de calestenia, Posterior a ello se continuó con la fundida de piedra pegada y cunetas.

observacion
No se Presentaron novedades en la jornada.

Ing Residente de obra.

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Viernes, 12 de julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima. Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramienta y Equipo:
- Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultos (trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactada Tipo rana.

Fin de labores: 5.00 P.M.

Actividad

Debido a las fuertes lluvias no se pudo ejecutar las actividades que se tenían previstas para la jornada.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

Sabado, 13 de Julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

clima: lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipo: - Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

fin de labores: 12:00 P.M.

Actividad

Se presentaron altas precipitaciones, por lo que no se pudo realizar las actividades programadas para la jornada.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero A.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Lunes, 15 de julio de 2024
Inicio: 7:00 AM.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramienta y Equipos: – Herramienta Menor
– Mezcladora 2 bultos (Trompo)
– Electrobomba.
– Vibrador de concreto
– Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inicio la jornada como es de costumbre con la oracion a Dios y la cabstencia, posteriormentes se continua con las actividades de Piedra Pegada y cunetas.

Observación:
No se Presentaron novedades ni atrasos que afectaran las actividades de la jornada.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 16 de julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Seco

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

Se inició la jornada como es habitual con la charla inicial oracion a Dios y los ejercicios de calestenia, luego se continuó con actividades de fundida de piedra pegada y cunetas y unos metros de bordillo.

Observación:

No se Presentaron novedades durante la jornada.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Miercoles, 17 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició con la jornada laboral con la charla inicial oración a Dios como es habitual, se hicieron ejercicios de calestenia y se prosiguió en la fundida de Piedra pegada y cunetas, así mismo algunos metros de bordillos.

Observaciones
No se Presentaron novedades en la jornada.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Jueves, 18 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
clima: Seco
Personal · 1 Residente
· 1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrada de concreto
- Vibrocompactador.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inició la jornada laboral con la charla inicial y oración a Dios como es costumbre, se realizó ~~ejercicios~~ de calestenea. Posterior a ello se prosiguió con la fundida de piedra pegada y cunetas

Observación:
No se presentaron anomalías que afectaran el desarrollo de las actividades programadas de la jornada.

Ing Residente de obra.

Jhoan Fernel. Quintero N.
Ing. Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Viernes, 19 de Julio de 2024

Inicio: 7:00 AM.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

No se pudo ejecutar las actividades programadas d la jornada, debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interven

Powered by CamScanner

CERO AZUL

Sabado, 01 de Junio. de 2024.
Inicio: 07:00 A.M.
Clima: Seco.
Personal: 1 Residente de obra.
1 Maestro General de Obra
1 Oficial de Obra
4 Obreros.
Herramienta y equipos: - Herramienta menor
- Trompo (Mezcladora 2 bultos)
- Vibrador de concreto.
- Rana (Vibro compactador)
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad:
Se Inicia la jornada con la charla y calestenia o Calentamiento Previo habitual, se continuó con la formaleteada y colocación de el Acero de refuerzos para su posterior fundida la cual se programo para la proxima semana.

Observaciones:
en la jornada no se presentaron anomalias ni atra sos, pero si se trabajo la jornada completa puesto que los Sabados se trabaja hasta las 10:00 A.M.

Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de Interventor

NKB

Powered by CamScanner

Lunes, 03 de junio de 2024.
Inicio: 7:00 AM.
Clima: seco.
Personal: 1 Residente de Obra
1 Maestro General de Obra.
1 Oficial de obra.
4 Obreros.
Herramienta y equipos: - Herramienta menor
- Trompo (Mezcladora 2 bultos)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto.
- Vibrocompactador Tipo Rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad:
Se inició la jornada habitual con la charla y la oración a Dios, luego la calestenia y continuamos con la instalación de la formaleta para fundir los primeros metros de Placas, de los carriles derechos. Una vez armado el Acero de refuerzo y las formaletas se prosigio a dejar listo todo para continuar con la fundida el día de mañana esperando terminar a más tardar el día miercoles 05 de junio.

Observaciones:
No se presentaron ninguna serie de Retrasos ni motivos que causaran retrazos en la actividad que se programo para el día, siendo este un festivo.

Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernel Quintero R.
Ing. Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 04 de junio de 2024
Inicio: 07:00 A.M.
Clima: Lluvias Moderadas.
Personal: 1 Residente de Obra.
1 Maestro General de Obra.
1 Oficial de obra.
4 Obreros.
Herramienta y Equipos: - Herramienta menor.
- Mezcladora 2bultos CTrompo
- Electrobomba
- Vibrador de concreto.
- Vibrocompactador de Tipo Ra
Fin de Labores: 5:00P.M.

Actividad.
Se Inició la jornada laboral con la Oración a Dios como es habitual, luego la calestenia y se procigio a adecuar los implementos para fundir los metros que ya teniamos formaleteados y con sus respectivos aceros de Refuerzos Instalados.

Observación:
Por la presencia de lluvias se opto por parar la fundida puesto que si aumentaban las precipitacion sería perjudicial para los acabados finales.

Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernel Quintero A.
Ing. Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles, 05 de junio de 2024.
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias Moderadas.
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 oficial
4 obreros.
Herramienta y Equipos: - Herramienta menor.
- Mezcladora 2 bultos (Trompo).
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto.
- Vibrocompactador Tipo Rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se Inició la jornada laboral con la Oración a Dios como de constumbre, luego la calestenia y se continuó con la fundida de las placas faltantes, estas no se empezaron hasta que no se pudo drenar el agua producto de las precipitaciones leves que calleron.

Observación:
Por la presencia de lluvias no se pudo continuar en la jornada de la mañana con la fundida y tocó terminar de fundir en las horas de la tarde

Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernel Quintero
Ing. Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

Jueves, 06 de junio de 2024.
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco.
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 oficial
4 Obreros.
Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto.
- Vibrocompactador tipo Rana.
Fin de Labores: 5:00P.M.

Actividad.
Se Inició la jornada laboral con la Oración a dios y la calestenia y se Inicio a formaletear y fundir la piedra pegada lateral alcanzando los 2m de piedra pegada lateral.

Observación:
No se presentaron novedades en la jornada laboral.

Ing. Residente de Obra

Jhoan Farnel Quintero N.
Ing. Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes, 07 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial.
4 Obreros.
Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrocompactador Tipo Rana
- Vibrador de concreto.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se Inicio la jornada laboral como de costumbre con la Oración a Dios y se realizaron los Ejercicios de Calestenia, Una vez finalizadas estas actividades se prosigió con la fundida de la piedra pegada lateral y se formaleteo unos metros de la piedra pegada central.

Observación.
No se presentaron novedades en el transcurso del día.

Ing. Residente de Obra

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

Sabado, 08 de junio de 2024.
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias Intensas.
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial.
4 Obreros.
Herramienta y equipos: - Herramienta menor.
- Mezcladora 2bultos (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo Rana.
Fin de labores: 12:00 P.M

Actividad.
No se pudo realizar actividades debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona.

Ing. Residente de Obra

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes, 10 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias Intensas.
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Obreros.
Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Vibrador de concreto
- Electrobomba.
- Vibrocompactador Tipo Rana.
Fin de labores: 5:00 P.M

Actividad.
Se inicio la jornada como de costumbre con la oraci a Dios y la calestenia posterior a ello se continuó con la fundida de las piedras pegadas centrales y laterales.

Observación:
debido a las fuertes lluvias fue necesario paxar las actividades hasta que el terreno pudo ser apto para continuar con la actividad programada.

Ing. Residente de Obra

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 11 de Junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias Moderadas.
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta menor.
- Mezcladora 2 bultos (Trompo).
- Vibrador de concreto.
- Electrobomba.
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 PM.

Actividad.
Se inició la jornada laboral como de costumbre con la oración a Dios y se realizaron los ejercicios de calistenia, Posterior a ello se continuó con la fundida de Piedra Pegada centrales y laterales.

Observación:
Por la Presencia de lluvias en la zona se optó por parar la fundida puesto que si aumentaba la precipitación sería perjudicial para los acabados finales.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero A.
Ing. Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Miercoles, 12 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias Moderadas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Vibrador de concreto
- Electrobomba.
- Vibrocompactadora Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada laboral como de costumbre con la oración a Dios y los ejercicios de calistenia, se procede con la fundida de piedra pegada central e instalación de cuneta, finalmente fundida de placas unas metas.

Observación.
Por la Presencia de lluvias en la zona no se pudo continuar en la mañana, y tocó terminar en las horas de la tarde.

Ing Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

Jueves, 13 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas.
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 oreros.
Herramientas y Equipos: - Herramientas Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto.
- Vibrocompactador Tipo Rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Debido a las fuertes precipitaciones no se pudo realizar las actividades que se tenian Previstas.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

Viernes, 14 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramienta y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se iba a proseguir con las actividades previstas pero por causas de las fuertes precipitaciones no se pudo ejecutar lo programado.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernay Quintero A.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

Sabado, 15 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto.
- Vibrocompactador Tipo Rana.

Fin de labores: 12:00 P.M.

Actividad.

No se pudo realizar actividades debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

Lunes, 17 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrotambor
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.

Se inició la jornada laboral como de costumbre con la oración a Dios y se realizaron ejercicios de calistenia, posterior a ello se continuó con la instalación de cuneta y fundición de placas.

Observación:

No se presentaron novedades en la jornada laboral.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farney Quintero N.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

42

Martes, 18 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobombas
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.

No se pudo realizar las actividades previstas debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la zona.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

Miercoles, 19 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Obreros
Herramientas y Equipos:
- Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la zona no se ejecutó las actividades Programadas.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 20 de Junio de 2024

INICIO: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

Se iba a continuar con las actividades previstas pero debido a las fuertes lluvias presentadas no se pudo ejecutar lo programado.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Viernes, 21 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Seco

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

Se inició la jornada laboral como de costumbre con la oración a Dios y la calestenia, Posterior a ello se realizo la fundición de placas y fundición de cuneta.

Observación:

No se Presentaron novedades que afectaran la jornada laboral y se trabajó con normalidad.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farney Quintero M.
Ing Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

Sabado, 22 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipo: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 12:00 P.M.

Actividad.

Se inició la jornada laboral como es de costumbre con la oración a Dios y con ejercicios de calistenia, Posteriormente se continuó con fundición de cuneta y la fundición de Vigarriostra.

Observación:

Se presentó Precipitación en las primeras horas, a Pesar de eso se Pudo continuar con las actividades Previstas.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

Lunes, 24 de junio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Seco

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipo: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

Se inició la jornada laboral como es de costumbre con la oración a Dios y con las ejercicios de calistenia, se prosigue a continuar con la fundida de viga riostra e instalación de formaletas para huellas.

Observación:

No se presentaron novedades en la jornada laboral.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

40

Martes, 25 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inició la jornada laboral como es de costumbre con la oración a Dios, luego se realizaron ejercicios de calestenia, posterior a ello se prosiguió a realizar la instalación de formaletas para las huellas.

Observación.
Se trabajó con normalidad en la jornada de la mañana, pero se optó por suspender actividades en la jornada de la tarde debido a los fuertes precipitaciones que se presentaron en la zona.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

Miercoles, 26 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inició la jornada laboral como es costumbre con la oración a Dios y calistenia, se prosiguió a la fundida de huellas hasta finalizar la jornada laboral.

Observación.
No se presentaron novedades en la jornada laboral.

Ing. Residente de Obra

Jhoan Farney Quintero M.
Ing. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

Jueves, 27 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias moderadas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Obreros
Herramienta y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada laboral como es de costumbre con una oración a Dios, luego se hicieron ejercicios de calestenia. Posterior a ello se procedió con la instalación de piedra pegada.

Observación.
Se suspendieron actividades en la jornada de la tarde debido a las lluvias que se presentaron en la zona e impidieron el desarrollo de las actividades.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

Viernes, 28 de junio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias moderadas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Obreros
Herramientas y Equipos: - Herramientas Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada laboral con la (jornada laboral) oración a Dios y ejercicios de calestenia como es de costumbre, Se procedió con la fundida de Piedra Pegada e instalación de Piedra Pegada, y fundida de cunetas.

Observacion:
A Pesar de Presenciar lluvias en la zona en las primeras horas del dia, se Pudo continuar con la jornada laboral.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

Sabado, 29 de junio 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Obreros

Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana

Fin de labores: 12:00 P.M.

Actividad

Debido a la Precipitación fuerte que se presentó en la ~~zon~~ no se pudo ejecutar las actividades programadas.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

Martes, 02 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inició la jornada laboral como es de costumbre con una oración a Dios, luego se hicieron ejercicios de calestenia, Posterior a ello se continuó con la fundida de Piedra Pegada hasta terminar la jornada.

Observación.
No se Presentaron novedades que afectaran o atrasaran las actividades de la jornada.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

Miercoles, 03 de julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias moderadas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros.

Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.

Se inicio la jornada laboral como de costumbre con la charla inicial y oración a Dios. luego se realizaron ejercicios de calestenia, Posterior a ello se procedió a hacer fundida de piedra pegada lateral.

Observaciones.

En las horas de la mañana se presentaron lluvias moderadas sin embargo, se pudo continuar con las actividades previstas.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnay Quintero M.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Jueves, 04 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició la jornada laboral como es de costumbre con la oración a Dios y calestenia, luego se procedió a la instalación de hierro para cunetas.

Observación.
A pesar de las fuertes precipitaciones en las horas de la mañana se pudo trabajar en el armado para las cunetas en la jornada de la tarde.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Viernes 05 de julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos - Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultas (trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.

No se pudo ejecutar las actividades previstas en la jornada laboral debido a las altas precipitaciones que se Presentaron en la zona.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernay Quintero A.
Ing. Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

Sabado, 06 de Julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: (Lluvias) Seco

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.

Se inició la jornada laboral como de costumbre con la oración a Dios y la calestenia posterior a ello se realizó la fundida de cunetas.

Actividad.

No se presentaron novedades en la jornada laboral.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernay Quintero M.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Lunes, 08 de julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Seco

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

Se inició la jornada laboral con la oración a Dios como es habitual, luego la calistenia y posterior a ello se prosiguió a la fundida de piedra pegada central y lateral.

Observación.

No se presentaron novedades en la jornada laboral.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farney Quintero M.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Martes, 09 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias intensas
Personal: 1 Residencia
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bolsas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Por las fuertes lluvias presentadas en la zona no se pudo ejecutar las actividades programadas.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Miercoles, 10 julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Seco

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.

Se inicio la jornada laboral como es de costumbre con la oración a Dios y la cabotenia, luego se prosiguio con la fundida de bordillo, rampa de acceso.

Observación.

No se presentaron novedades en la jornada laboral.

Ing. Residente de obra

Jhoan Fernel Quintero N.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 11 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos:
- Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto
- Vibrocompactador Tipo rana.

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inició la jornada laboral como es de costumbre con la oración a Dios y se realizaron ejercicios de calistenia, luego se continuó con la fundida de bordillo, rampa de acceso y dentellon hasta terminar la jornada laboral.

Observación
No se presentaron novedades que afectaran el desarrollo de las actividades en la jornada laboral y se trabajó con normalidad.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero A.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Viernes, 12 de julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

Clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad

Debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona no se pudo realizar las actividades programadas

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Sabado, 13 de Julio de 2024

Inicio: 7:00 A.M.

clima: Lluvias intensas

Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba
- Vibrador de concreto

Fin de labores: 12:00 P.M.

Actividad

Se Presentaron fuertes lluvias en la zona, lo cual no se pudo ejecutar las actividades programadas para la jornada.

Ing. Residente de obra

Jhoan Farnay Quintero A.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Lunes, 15 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima Lluvias moderadas
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramienta y Equipos: - Herramientas Menor
- Mezcladora 2 bultas (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
Fin de labores: 5:00 P.M. -

Actividad.
Se inicia la jornada con la charla inicial y oracion a Dios como es habitual, se realizan ejercicios de calestenia Luego se procede a realizar fundida de bordillos y rampas de acceso.

Observación:
Se presentan lluvias en la zona y se suspenden actividades en la jornada de la tarde para no afectar acabados finales.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farnel Quintero A.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 16 de julio de 2024
Inicio: 7:00 A.M.
Clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 oficial
4 obreros
Herramienta y Equipo: - Herramienta Menor
- Mezcladora 2 bultos (Trompo)
- Electrobomba.
- Vibrador de concreto
Fin de labores: 5.00 P.M.

Actividad
Se inicia la jornada como es de costumbre con la oración a Dios y los ejercicios de calistenia, luego se continua haciendo actividades de fundida de bordillo y se comentan a hacer labores de aseo.

Observación
No hay novedades ni atrasos en la jornada laboral.

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farnel Quintero M.
Ing. Residente de interventoria

Powered by CamScanner

00

Miercoles, 17 de julio de 2024
Inicio : 7:00 A.M.
Clima : Seco
Personal : 1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 obreros
Herramientas y Equipos: - Herramientas Menor
- Mezcladora 2 bultos
- Electrobomba
- Vibrador de concreto.
Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad
Se inició la jornada con la charla inicial, oracion a Dios como es habitual, se hicieron ejercicios de calistenia, se continuó haciendo los ultimos metros de Fundida de bordillo, rampas de acceso y labores de aseo.

Observación
No hubo anomalias ni atrasos que afectaran las actividades de la jornada.

Ing Residente de obra.

Jhoan Fernel Quintero A.
Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Jueves, 18 de julio de 2024
Inicio: 7:00 AM.
clima: Seco
Personal: 1 Residente
1 Maestro
1 oficial
4 obreros
Herramienta y Equipos: - Herramienta Menor

Fin de labores: 5:00 P.M.

Actividad.
Se inició jornada como des costumbre con la charla inicial, oración a Dios y ejercicios de calestenia, Posterior a ello se termina la obra con aseo general,

Observación:
No hubo anomalias ni atrasos que afectaran las actividades Programadas

Ing. Residente de obra.

Jhoan Farney Quintero N.
Ing. Residente de interventoría

Powered by CamScanner

FORMATOS MEPI

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 21 del 31/05/2024 al 6/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO BERLIN, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 90 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 90 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO BERLÍN

CONVENIO No. 3734 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.215.438,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.215.438,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV
INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV: 100%

CONTRATO No. 4968 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.215.438,00	$ 199.215.438		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 67.440.264		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.215.438,00	$ 131.775.174		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 88.551.189		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 24.886.606		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 144.761.614,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 67.440.263,71	46,59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 67.440.263,71	46,59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 67.440.263,71	33,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 67.440.263,71	33,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.163.331,74	4,95%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.163.331,74	4,95%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 91.551.189,00	80,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 88.551.189,00	78,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.643.268,00	7,62%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.643.268,00	7,62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no habense facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	36
*	Subbase Granular Clase C	M3	74,25
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	63,25
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16,19
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2933,82
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	36,00			36,00	100,00%
Ejec	36,00			36,00	100,00%
Prog	74,25			74,25	100,00%
Ejec	51,98			51,98	70,00%
Prog	63,25			63,25	100,00%
Ejec	23,40			23,40	37,00%
Prog	16,19			16,19	100,00%
Ejec	6,64			6,64	41,00%
Prog	2933,82			2933,82	100,00%
Ejec	1496,25			1496,25	51,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	,0
Retroexcavadora sobre llantas	1	,0
Vibrador de concreto	1	,0
Total	3	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Las obras se iniciaron el dia 29 de abril
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Se realizó socialización el 2/3/2024 en San Pablo Bolivar, con presidentes de las juntas de accion comunal de los convenios, algunos residentes de los beneficiados, entidad contranate INVIAS con la asitencia del supervisor, la interventoría, alcaldia


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La semana correspondiente se esta alistando el tramo izquierdo con la respectiva subbase y encofrado para insertar las diferentes parrillas de las huellas y continuar con la fundicion esta misma semana y hasta finalaizar, aunque se han venido presentando diferentes inconvenientes que han retraso un cierta parte la ejecucion de la obra tales como reuniones con la comunidad en la obra para definir posibles desvias para el transito vehicular, cierre de la via intervenida, fuertes lluvias en la zona, e imprevistos que se han venido solucinoando en la marcha del proyecto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Vaciado de concreto ciclopeo
> Vaciado de cinta de placa huella
> Continuar con excavaciones para viga riostra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Extendido subbase carril izquierdo



Extendido subbase y compactacion carril izquierdo



Fromaleta carril izquierdo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Acompañamiento al contratista en el inicio de actividades del carril izquierdo de la via.
> Revision de la instalacion de formaleta cumpliendo las secciones.
> Acompañamiento al contratista de obra en la construccion del desvio para transito vehicular

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 22 del 7/06/2024 al 13/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO BERLIN, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 90 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 90 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO BERLÍN

CONVENIO No. 3734 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.215.438,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.215.438,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV
INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV: 100%

CONTRATO No. 4968 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.215.438,00	$ 199.215.438		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 83.633.120		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.215.438,00	$ 115.582.318		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 94.934.782		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 18.503.013		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 144.761.614,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 83.633.119,60	57,77%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 83.633.119,60	57,77%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.633.119,60	41,98%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83.633.119,60	41,98%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.192.855,89	11,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.192.855,89	11,19%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 97.934.782,00	86,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.934.782,00	83,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no habense facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	36
*	Subbase Granular Clase C	M3	74,25
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	63,25
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16,19
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2933,82
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	36,00			36,00	100,00%
Ejec	36,00			36,00	100,00%
Prog	74,25			74,25	100,00%
Ejec	55,69			55,69	75,00%
Prog	63,25			63,25	100,00%
Ejec	28,46			28,46	45,00%
Prog	16,19			16,19	100,00%
Ejec	8,90			8,90	55,00%
Prog	2933,82			2933,82	100,00%
Ejec	2200,37			2200,37	75,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	,0
Retroexcavadora sobre llantas	1	,0
Vibrador de concreto	1	,0
Total	3	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Las obras se iniciaron el dia 29 de abril
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Se realizó socialización el 2/3/2024 en San Pablo Bolivar, con presidentes de las juntas de accion comunal de los convenios, algunos residentes de los beneficiados, entidad contranate INVIAS con la asitencia del supervisor, la interventoría, alcaldia


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

> Se realiza vaciado de cinta de plca huella mezcla in situ
> Se realiza excavaciones para viga riostra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

> Realizar vaciado de concreto ciclopeo
> Figuarar e instalar acero
> Excavaciones para cuneta y bordillo

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Extendido subbase carril izquierdo



Extendido subbase y compactacion carril izquierdo



Formaleta carril izquierdo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Acompañamiento al contratista en campo en actividades diarias
> Se realiza revision de las doscificaciones en campo así como cantidad de acero y separaciones.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 23 del 14/06/2024 al 20/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO BERLIN, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 90 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 90 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO BERLÍN

CONVENIO No. 3734 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.215.438,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.215.438,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV
INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%

CONTRATO No. 4968 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.215.438,00	$ 199.215.438		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 108.203.374		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.215.438,00	$ 91.012.064		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 104.318.376		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 9.119.419		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 144.761.614,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 108.203.374,30	74,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 108.203.374,30	74,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 108.203.374,30	54,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 108.203.374,30	54,31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.570.254,70	16,97%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.570.254,70	16,97%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 104.318.375,67	91,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 104.318.375,67	91,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: No se realizaron actividades esta semana

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	36
*	Subbase Granular Clase C	M3	74,25
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	63,25
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16,19
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2933,82
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	36,00			36,00	100,00%
Ejec	36,00			36,00	100,00%
Prog	74,25			74,25	100,00%
Ejec	66,83			66,83	90,00%
Prog	63,25			63,25	100,00%
Ejec	41,11			41,11	65,00%
Prog	16,19			16,19	100,00%
Ejec	12,14			12,14	75,00%
Prog	2933,82			2933,82	100,00%
Ejec	2493,75			2493,75	85,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	,0
Retroexcavadora sobre llantas	1	,0
Vibrador de concreto	1	,0
Total	3	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Las obras se iniciaron el dia 29 de abril
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	INGEINCA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	MATERIALES DE RIO RIO SUCIO SAS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, por tal motivo, no han remitido a esta interventoría dicha información.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: realizar la socializacion del proyecto con representante legal y profesionales 02/03-2024
La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, se espera al finalizar los estudios y diseños realizar la socializacion del proyecto.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La semana correspondiente se está alistando el tramo izquierdo con la respectiva subbase y encofrado para insertar las diferentes parrillas de las huellas y continuar con la fundición.
En el transcurso de la ejecución de las obras se han presentado diversos escenarios que han afectado directamente a la ejecución de las diferentes actividades de la obra a continuación se relaciona las causas del debido atraso en la ejecución de la obra.
•Reuniones con diferentes comunidades en el sitio de la obra en momento laboral
•Reuniones con diferentes comunidades en donde tocaba el tema de un posible desvió junto a la obra, aunque ya se había definido una vía alterna.
•Concurrido transito de motocicletas y vehículos de transporte que prestan servicio a las comunidades aledañas.
•Fuertes y consecutivas lluvias en la zona de trabajo.
•Reuniones con las comunidades por cierre de la vía alterna debido al daño ocasionado por el tránsito y las fuertes lluvias.
•Reuniones con grupos armados que hacen presencia en la zona
NOTA: las actividades se han venido ejecutando aun que se hace necesario solicitar una prorroga de 15 dias al convenio

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se realizarán las siguientes actividades
•Encofrado de huellas por el carril izquierdo
•Figurado de acero de refuerzo
•Vaciado de concreto para huellas
•Vaciado de concreto para vigas
•Vaciado de concreto para ciclópeo
•Desencofrado

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vaciado de concreto en huellas



Placa huella vaciada



Avance placa huella fundido

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Acompañamiento al contratista en campo en actividades diarias.
> Se realiza seguimiento y acompañamiento al vaciado de concreto en huellas.
> Se realiza seguimiento y acompañamiento a la placa huella vaciada y al avance de placa huella fundido.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 24 del 21/06/2024 al 27/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO BERLIN, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 90 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 90 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO BERLÍN

CONVENIO No.: 3734 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.215.438,00

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.215.438,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%

CONTRATO No.: 4968 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 36.312.651,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.215.438,00	$ 199.215.438		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 128.556.060		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.215.438,00	$ 70.659.378		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 110.701.969		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 2.735.826		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 144.761.614,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 128.556.059,70	88,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 128.556.059,70	88,81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 128.556.059,70	64,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 128.556.059,70	64,53%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.352.685,40	14,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.352.685,40	14,06%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.701.969,00	97,59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 110.701.969,00	97,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No se realizaron actividades esta semana

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 89% — Avance o Atraso Físico %:

Meta Física Ejecutada %: 89%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	36
*	Subbase Granular Clase C	M3	74,25
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	63,25
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16,19
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2933,82
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	36,00			36,00	100,00%
Ejec	36,00			36,00	100,00%
Prog	74,25			74,25	100,00%
Ejec	68,31			68,31	92,00%
Prog	63,25			63,25	100,00%
Ejec	55,03			55,03	87,00%
Prog	16,19			16,19	100,00%
Ejec	13,76			13,76	85,00%
Prog	2933,82			2933,82	100,00%
Ejec	2699,11			2699,11	92,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	,0
Retroexcavadora sobre llantas	1	,0
Vibrador de concreto	1	,0
Total	3	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Las obras se iniciaron el dia 29 de abril

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	INGEINCA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	MATERIALES DE RIO RIO SUCIO SAS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, por tal motivo, no han remitido a esta interventoría dicha información.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: realizar la socializacion del proyecto con representante legal y profesionales 02/03-2024
La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, se espera al finalizar los estudios y diseños realizar la socializacion del proyecto.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La semana correspondiente se está alistando el tramo izquierdo con la respectiva subbase y encofrado para insertar las diferentes parrillas de las cunetas y el ciclopeo de 45 cm y posterior realizar la fundicion de las mismas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se realizarán las siguientes actividades
•Encofrado de cunetas por el carril izquierdo
•Figurado de acero de refuerzo
•Vaciado de concreto para cuneta
•Vaciado de concreto para vigas
•Vaciado de concreto para ciclópeo
•Desencofrado

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Avance placa huella previamente vaciado



Formaleta de bordillos de las placa huellas



Armado de hierro para los bordillos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Acompañamiento al contratista en campo en actividades diarias.
> Se realiza seguimiento y acompañamiento al avance de placa huella previamente vaciado
> Se realiza seguimiento y acompañamiento al encofrado para los bordillos de las placa huella.
> Se realiza seguimiento y acompañamiento al armado de hierro.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 21 del 31/05/2024 al 6/06/2024 Último Informe Semanal SI .
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN BAJO, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 140 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se realizará la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 140 ml, ancho de vía 4,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizarán para la construcción actividades como: Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclópeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN BAJO

CONVENIO No.: 4123 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 198.614.244,00
FECHA DE INICIO: 20/02/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.614.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV
INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%

CONTRATO No.: 4968 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.614.244,00	$ 198.614.244		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 90.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.614.244,00	$ 108.614.244		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 88.551.189	$ 88.551.189		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 24.886.606,00	$ 24.886.606		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 144.036.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 89.000.000,00	61,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 90.000.000,00	62,48%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.000.000,00	61,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 89.000.000,00	44,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 90.000.000,00	45,31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.000.000,00	0,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.500.000,00	3,12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.576.921,00	3,18%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 91.551.189,00	80,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 88.551.189,00	78,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 64% — Avance o Atraso Físico %: 1%
Meta Física Ejecutada %: 65%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4
*	Subbase Granular Clase C	M3	106,7
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	85,4
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	19,8
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	4003
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,00			4,00	100,00%
Ejec	4,00			4,00	100,00%
Prog	106,70			106,70	100,00%
Ejec	106,70			106,70	100,00%
Prog	24,00			24,00	28,10%
Ejec	24,24			52,14	61,05%
Prog	14,00			14,00	70,71%
Ejec	14,54			14,54	73,41%
Prog				4003,00	100,00%
Ejec				4003,00	100,00%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Vibrocompactador tipo Canguro	1	1
Planta Electrica	1	1
Electrobomba de 1 Hp	1	1
Total	4	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Se dá inicio al proceso Constructivo de la Placa Huellas en el único sector a intervenir
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera Ingeinca, Km 4 Sector Guarigua Via a Simiti	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	Material subbase Granular, Triturado, Arena y Piedra Bolo	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se cuenta con una certificación emitida por la Alcaldía Municipal de San Pablo que avala la calidad de Los materiales petreos de construcción tales como la subbase granular, arena, triturado y Piedra Bolo.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: Inicia el Proceso Constructivo de Placa Huellas iniciando con Formaleteado y Finaliza el corte, figurado y amarre de acero de Refuerzo, para posterior fundición de Concreto reforzado de 21 Mpa y Concreto ciclópeo.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Se realizó socialización el 2/3/2024 en San Pablo Bolivar, con presidentes de las juntas de accion comunal de los convenios, algunos residentes de los beneficiados, entidad contranate INVIAS con la asitencia del supervisor, la interventoría, alcaldía.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana comprendida entre el 31 Mayo al 06 de Junio de 2024, se realizó las actividades de corte, figurado y armado de acero, Formaleteado y posterior fundición de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) y Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado en la semana comprendida entre el 07 al 13 de Junio de 2024 Continuar con el proceso de fundición de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) y fundición de Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G), en el sector denominado San Juan bajo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



DETALLES DE CONCRETO CUNETAS Y PLACAS REFORZADAS



FUNDICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI



DETALLES DE PLACAS REFORZADAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Acompañamiento a la junta de acción comunal en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
> Revisión de la dosificación del concreto
> Revisión y supervisión de las separaciones de acero
> Se revisan medidas de cinta de placa huella y berma
> Se revisa pendiente de cuneta

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 22 del 7/06/2024 al 13/06/2024 Último Informe Semanal SI . (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN BAJO, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 140 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizará la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 140 ml, ancho de vía 4,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizarán para la construcción actividades como: Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclópeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN BAJO		
CONVENIO No.	4123 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.614.244,00
FECHA DE INICIO:	20/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.614.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024 Y LO NECESARIO		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%		
CONTRATO No.	4968 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.614.244,00	$ 198.614.244		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 88.423.079		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.614.244,00	$ 110.191.165		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 94.934.782	$ 94.934.782		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 18.503.013,00	$ 18.503.013		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 144.036.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 89.000.000,00	61,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 86.923.079,00	60,35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.076.921,00)	61,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 89.000.000,00	44,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 88.423.079,00	44,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (576.921,00)	-0,29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.500.000,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.500.000,00	1,04%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 97.934.782,00	86,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.934.782,00	83,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75% — Avance o Atraso Físico % 7%
Meta Física Ejecutada % 68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4
*	Subbase Granular Clase C	M3	106,7
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	85,4
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	19,8
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	4003
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,00			4,00	100,00%
Ejec	4,00			4,00	100,00%
Prog	106,70			106,70	100,00%
Ejec	106,70			106,70	100,00%
Prog	24,00			24,00	28,10%
Ejec	24,24			52,14	61,05%
Prog	14,00			14,00	70,71%
Ejec	14,54			14,54	73,41%
Prog				4003,00	100,00%
Ejec				4003,00	100,00%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Vibrocompactador tipo Canguro	1	1
Planta Electrica	1	1
Electrobomba de 1 Hp	1	1
Total	4	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Se dá inicio al proceso Constructivo de la Placa Huellas en el único sector a intervenir
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera Ingeinca, Km 4 Sector Guarigua Via a Simiti	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	Material subbase Granular, Triturado, Arena y Piedra Bolo	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se cuenta con una certificación emitida por la Alcaldía Municipal de San Pablo que avala la calidad de Los materiales petreos de construcción tales como la subbase granular, arena, triturado y Piedra Bolo.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: Inicia el Proceso Constructivo de Placa Huellas iniciando con Formaleteado y Finaliza el corte, figurado y amarre de acero de Refuerzo, para posterior fundición de Concreto reforzado de 21 Mpa y Concreto ciclópeo.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: realizar la socializacion del proyecto con representante legal y profesionales 02-03-2024
Se dá inicio al proceso de construcción de Placa Huellas en la Vereda San Juan Bajo zona rural del Municipio de San Pablo Bolivar, Realizando las actividades de Corte, figurado y armado de acero de Refuerzo, Formaleteado y Fundición de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) y Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G), se realizan tomas de densidades.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana comprendida entre el 07 Al 13 de Junio de 2024, se realizó las actividades de corte, figurado y armado de acero, Formaleteado no se avanzó mucho producto de las constantes lluvias que dificultó el acceso de materiales de construcción tales como arena y triturado.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado en la semana comprendida entre el 14 al 20 de Junio de 2024 Continuar con el proceso de fundición de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) y fundición de Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G), en el sector denominado San Juan bajo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



DETALLES DE CONCRETO CUNETAS Y PLACAS REFORZADAS



FUNDICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI



DETALLES DE PLACAS REFORZADAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Revisión y acompañamiento al contratista en el vaciado del concreto
> Revisión y acompañamiento del curado del concreto
> Se revisa documentación del personal
> Se hace seguimiento al cumplimiento de los requerimientos contractuales
> Se revisa técnicamente que se cumplan con los diseños estructurales

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 23 del 14/06/2024 al 20/06/2024 | Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN BAJO, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 140 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizará la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 140 ml, ancho de vía 4,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizarán para la construcción actividades como: Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclópeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN BAJO

CONVENIO No.	4123 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.614.244,00
FECHA DE INICIO:	20/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.614.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024 Y LO NECESARIO		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%		
CONTRATO No.	4968 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.614.244,00	$ 198.614.244		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 93.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.614.244,00	$ 105.614.244		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 104.318.376	$ 104.318.376		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 9.119.419,33	$ 9.119.419		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 144.036.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.000.000,00	65,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93.423.079,00	64,86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (576.921,00)	65,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 94.000.000,00	47,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.000.000,00	46,82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.000.000,00)	-0,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.000.000,00	2,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.000.000,00	2,78%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 104.318.375,67	91,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 104.318.375,67	91,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No se realizaron actividades esta semana

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 80% | Avance o Atraso Físico %: -5%

Meta Física Ejecutada %: 75%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4
*	Subbase Granular Clase C	M3	106,7
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	85,4
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	19,8
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	4003
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,00			4,00	100,00%
Ejec	4,00			4,00	100,00%
Prog	106,70			106,70	100,00%
Ejec	106,70			106,70	100,00%
Prog	24,00			24,00	28,10%
Ejec	24,24			52,14	61,05%
Prog	14,00			14,00	70,71%
Ejec	14,54			14,54	73,41%
Prog				4003,00	100,00%
Ejec				4003,00	100,00%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Vibrocompactador tipo Canguro	1	1
Planta Electrica	1	1
Electrobomba de 1 Hp	1	1
Total	4	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Se dá inicio al proceso Constructivo de la Placa Huellas en el único sector a intervenir

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera Ingeinca, Km 4 Sector Guarigua Vía a Simiti	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	Material subbase Granular, Triturado, Arena y Piedra Bolo	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se cuenta con una certificación emitida por la Alcaldía Municipal de San Pablo que avala la calidad de Los materiales petreos de construcción tales como la subbase granular, arena, triturado y Piedra Bolo.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: Continúa el Proceso Constructivo de Placa Huellas iniciando con Formaleteado y Finaliza el corte, figurado y amarre de acero de Refuerzo, para posterior fundición de Concreto reforzado de 21 Mpa y Concreto ciclópeo.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: realizar la socializacion del proyecto con representante legal y profesionales 0303-2024
Se dá inicio al proceso de construcción de Placa Huellas en la Vereda San Juan Bajo zona rural del Municipio de San Pablo Bolivar, Realizando las actividades de Corte, figurado y armado de acero de Refuerzo, Formaleteado y Fundición de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) y Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G), se realizan tomas de densidades.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana comprendida entre el 14 Al 20 de Junio de 2024, se realizó las actividades de corte, figurado y armado de acero, Formaleteado no se avanzó mucho producto de las constantes lluvias que dificultó el acceso de materiales de construcción tales como arena y triturado.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado en la semana comprendida entre el 21 al 27 de Junio de 2024 Continuar con el proceso de fundición de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) y fundición de Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G), en el sector denominado San Juan bajo.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



DETALLES DE CONCRETO CUNETAS Y PLACAS REFORZADAS



FUNDICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI



DETALLES DE PLACAS REFORZADAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Revisión a los detalles de concreto, cunetas y placas reforzadas.
> Revisión y acompañamiento en la fundicion de placas en concreto reforzado
> Se revisa documentación del personal
> Se hace seguimiento al cumplimiento de los requerimientos contractuales
> Se revisa técnicamente que se cumplan con los diseños estructurales

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

SEMANA No.: 24 del 21/06/2024 al 27/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TABACURÙ, MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL Z TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 130 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 130 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TABACURÚ

CONVENIO No.	4768-2023	VALOR INICIAL:	$ 200.243.393,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.243.393,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024 Y LO NECESARIO		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%

CONTRATO No.	4966 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 77.789.164,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 38.208.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.997.909,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.243.393,00	$ 200.243.393		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 91.800.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.243.393,00	$ 108.443.393		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.997.909,00	$ 115.997.909		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 110.701.969		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.997.909,00	$ 5.295.940		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 147.541.990,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 92.000.000,00	62,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93.800.000,00	63,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.800.000,00	1,22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 92.000.000,00	45,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 91.800.000,00	45,84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (200.000,00)	-0,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.701.969,20	95,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 110.701.969,20	95,43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	5,90%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	5,90%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No se realizaron actividades esta semana

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 70%
Meta Física Ejecutada %: 67%
Avance o Atraso Físico %: 3%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,6
*	Subbase Granular Clase C	M3	122
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	84,4
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	37,1
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	3923
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	4,6			4,6	100,00%
Ejec	4,6			4,6	100,00%
Prog	122			122	100,00%
Ejec	122			122	100,00%
Prog	20			20	23,70%
Ejec	22			22	26,07%
Prog	10			10	26,95%
Ejec	12			12	32,35%
Prog	423			3923	100,00%
Ejec	423			3923	100,00%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Electrobomba de 2 Hp	1	1
Planta Electrica	1	1
Herramienta menor	1	1
Total	4	4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Continúa el proceso de Fundición de concreto ciclopeo y placa reforzada de 21 Mpa.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Inicia el proceso de Fundición de placas en concreto reforzado y concreto ciclopeo

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera Ingeinca, Km 4 Sector Guarigua Vía a Simití	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	**Material subbase Granular, Triturado, Arena y Piedra Bolo**	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se cuenta con una certificación emitida por la Alcaldía Municipal de San Pablo Bolívar que avala la calidad de los materiales Petreos a Utilizar como lo son La Subbase granular, arena y Triturado.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, por tal motivo, no han remitido a esta interventoria dicha información.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se dá Inicio a las actividades programadas para la Construcción de la Placa Huellas en el Sector denominado Tabacurú, zona Rural del Municipio de San Pablo Bolivar, Realizando actividades de conformación de la subrasante en el tramo 2 y suministro de subbase, arena y triturado.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo comprendido entre el 21 al 27 de Junio del 2024 en el sector a intervenir llamado Tabacurú, zona Rural del Municipio de San Pablo Bolivar, se vio afectado por las constantes lluvias que dificultaron y atrasaron laa obras apenas Realizando actividades de conformación de la subrasante en el tramo 2 , suministro de subbase, arena y triturado y corte figuado y amarre de acero de refuerzo para posterior formaleteado y vaceado.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana comprendida entre el 28 de Junio y el 04 de Julio del 2024 se tiene programado continuar con el encofrado y vaceo de Placa Huella con Ciclopeo y Placa Reforzada de 21 Mpa en el Tramo 2.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



DETALLES DE BORDILLOS TRAMO 2 PLACA HUELLA



DETALLES DE AMARRE DE ACERO DE REFUERZO



DETALLES DE FORMALETEADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Se realiza seguimientos a los detalles de los bordillos en el tramo 2 placa huella
>Acompañamiento y supervision a los detalles de amarre de acero de refuerzo, asi como al formaleteado y armado de acero de refuerzo.
> Se revisa documentación del personal
> Se hace seguimiento al cumplimiento de los requerimientos contractuales
> Se revisa técnicamente que se cumplan con los diseños estructurales

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 21 del 30/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI .
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO SAN JUAN, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 95 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 95 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN

CONVENIO No. 4311 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.131.340,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.131.340,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV
INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%

CONTRATO No. 4968 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.131.340,00	$ 199.131.340		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 125.211.712		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.131.340,00	$ 73.919.628		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 88.551.189	$ 88.551.189		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 24.886.606,00	$ 24.886.606		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 153.529.566,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 105.660.378,13	68,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 94.333.560,69	61,44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.326.817,44)	-7,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 30.878.151,23	15,51%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 136.538.529,36	68,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 125.211.711,92	62,88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.326.817,44)	-5,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.552.155,24	10,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.552.155,24	10,13%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 91.551.189,00	80,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 88.551.189,00	78,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.500,00	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.500,00	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 68,82% — Avance o Atraso Físico % -7,4%
Meta Física Ejecutada % 61,44%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	71
*	Subbase Granular Clase C	M3	71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	61,02
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,03
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2290
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	27,74			27,74	45,45%
Ejec	16,64			16,64	27,27%
Prog	17,50			17,50	69,92%
Ejec	2,50			2,50	9,99%
Prog	1603,00			1603,00	70,00%
Ejec	1832,00			1832,00	80,00%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Vibro Compactador tipo Rana	1	1
Electro Bomba	1	1
Mezcladora bulto y 1/2	1	1
Total	4	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA GUARIGUA, SAN PABLO, BOLIV.	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	SUBBASE	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	Ferreteria la 17, SAN PABLO, BOLIVAR	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	VARILLAS DE 3/8" PARA FIGURADO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: PERMISOS SUMINISTRADO POR DECRETO MUNICIPAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, por tal motivo, no han remitido a esta interventoría dicha información.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Se realizó socialización el 2/3/2024 en San Pablo Bolivar, con presidentes de las juntas de accion comunal de los convenios, algunos residentes de los beneficiados, entidad contrante INVIAS con la asitencia del supervisor, la interventoría, alcaldía.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Esta Semana se realizó las siguientes actividade: INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM 2 (60.000 PSI) Y CONCRETO CICLOPEO DE 14Mpa. esta actividad corresponde a lo establecido en la programación, asi mismo se presento retraso en una actividades puesto que se opto por terminar el la totalidad de las placas en los primeros 41 metros aproximadamente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se continuará con fundidas de placas y piedra pegada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%
4	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%
11	0.00%	0.00%	0.00%
12	0.00%	0.00%	0.00%
13	3.66%	1.73%	-1.93%
14	7.32%	3.46%	-3.86%
15	12.88%	5.19%	-7.69%
16	18.45%	8.86%	-9.59%
17	30.11%	16.87%	-13.25%
18	39.85%	25.04%	-14.81%
19	49.59%	30.32%	-19.27%
20	59.33%	46.69%	-12.64%
21	68.91%	61.44%	-7.47%
22	78.49%		
23	88.07%		
24	97.66%		
25	100.00%		
Actual	68.91%	61.44%	-7.47%



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ENCOFRADO PARA HUELLAS



FUNDIDA DE HUELLAS



INSTALACION DE ACERO SOBRE LAS HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Acompañamiento a la junta de acción comunal en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
> Revisión de la dosificación del concreto
> Revisión y supervisión de las separaciones de acero traslapo y recubrimiento
> Se revisan medidas de cinta de placa huella
> Se supervisa la dosificacion de la mezcla del concreto y su vibrado para garantizar su resistencia.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 22 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI .
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO SAN JUAN, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 95 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 95 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN

CONVENIO No. 4311 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.131.340,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.131.340,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV
INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%

CONTRATO No. 4968 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.131.340,00	$ 199.131.340		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 144.194.773		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.131.340,00	$ 54.936.567		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 94.934.782	$ 94.934.782		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 18.503.013,00	$ 18.503.013		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 153.529.566,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 121.212.533,37	78,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 109.885.715,93	71,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.326.817,44)	-7,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 34.309.056,92	17,23%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 155.521.590,29	78,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 144.194.772,85	72,41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.326.817,44)	-5,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.552.155,24	10,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.552.155,24	10,13%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 97.934.782,00	86,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.934.782,00	83,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 78,95% — Avance o Atraso Físico % -7,4%
Meta Física Ejecutada % 71,57%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	71
*	Subbase Granular Clase C	M3	71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	61,02
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,03
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2290
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	33,28			33,28	54,55%
Ejec	22,19			22,19	36,36%
Prog	20,00			20,00	79,90%
Ejec	5,00			5,00	19,98%
Prog	1832,00			1832,00	80,00%
Ejec	2061,00			2061,00	90,00%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Vibro Compactador tipo Rana	1	1
Electro Bomba	1	1
Mezcladora bulto y 1/2	1	1
Total	4	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA GUARIGUA, SAN PABLO, BOLIV.	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	SUBBASE	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	Ferreteria la 17, SAN PABLO, BOLIVAR	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	VARILLAS DE 3/8" PARA FIGURADO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: PERMISOS SUMINISTRADO POR DECRETO MUNICIPAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Se realizó socialización el 2/3/2024 en San Pablo Bolivar, con presidentes de las juntas de accion comunal de los convenios, algunos residentes de los beneficiados, entidad contranate INVIAS con la asitencia del supervisor, la interventoria, alcaldia

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Esta Semana se realizó las siguientes actividade: INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM 2 (60.000 PSI) Y CONCRETO CICLOPEO DE 14Mpa. esta actividad corresponde a lo establecido en la programación, asi mismo se presento retraso en una actividades puesto que se opto por terminar el la totalidad de las placas en los primeros 41 metros aproximadamente.
Se realiza vaciado de concreto ciclopeo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se continuará con fundidas de placas y piedra pegada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%
4	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%
11	0.00%	0.00%	0.00%
12	0.00%	0.00%	0.00%
13	3.66%	1.73%	-1.93%
14	7.32%	3.46%	-3.86%
15	12.88%	5.19%	-7.69%
16	18.45%	8.86%	-9.59%
17	30.11%	16.87%	-13.25%
18	39.85%	25.04%	-14.81%
19	49.59%	30.32%	-19.27%
20	59.33%	46.69%	-12.64%
21	68.91%	61.44%	-7.47%
22	78.49%	71.57%	-6.92%
23	88.07%		
24	97.66%		
25	100.00%		
Actual	78.49%	71.57%	-6.92%



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



FUNDIDA DE HUELLAS



ENCOFRADO PARA PIEDRA PEGADAS LATERALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

>Revisión y acompañamiento al contratista en el vaciado del concreto
>Revisión y acompañamiento del curado del concreto
>Se revisa documentación del personal
>Se hace seguimiento al cumplimiento de los requerimientos contractuales
>Se revisa técnicamente que se cumplan con los diseños estructurales

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 23 del 14/06/2024 al 20/06/2024 | Último Informe Semanal SI | - (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO SAN JUAN, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 95 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 95 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN

CONVENIO No. 4311 de 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 199.131.340,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.131.340,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV
INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%

CONTRATO No. 4968 de 2023
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00
VALOR ADICIONES: $ 36.312.651,00
VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.131.340,00	$ 199.131.340		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 152.112.705		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.131.340,00	$ 47.018.635		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 104.318.376	$ 104.318.376		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 9.119.419,33	$ 9.119.419		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 153.529.566,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.764.688,61	89,08%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 114.372.741,93	74,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (22.391.946,68)	-14,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 37.739.962,62	18,95%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 174.504.651,22	87,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 152.112.704,54	76,39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (22.391.946,68)	-11,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.552.155,24	10,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.487.026,00	2,92%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 104.318.375,67	91,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 104.318.375,67	91,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: No se realizaron actividades esta semana

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 89,08% | Avance o Atraso Físico % -14,6%
Meta Física Ejecutada % 74,50%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	71
*	Subbase Granular Clase C	M3	71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	61,02
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,03
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2290
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	44,38			44,38	72,73%
Ejec	27,74			27,74	45,45%
Prog	20,00			20,00	79,90%
Ejec	7,50			7,50	29,96%
Prog	1832,00			1832,00	80,00%
Ejec	2290,00			2290,00	100,00%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Vibro Compactador tipo Rana	1	1
Electro Bomba	1	1
Mezcladora bulto y 1/2	1	1
Total	4	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA GUARIGUA, SAN PABLO, BOLIV	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	SUBBASE	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	Ferretería la 17, SAN PABLO, BOLIVAR	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	VARILLAS DE 3/8" PARA FIGURADO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: PERMISOS SUMINISTRADO POR DECRETO MUNICIPAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, por tal motivo, no han remitido a esta interventoría dicha información.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: realizar la socializacion del proyecto con representante legal y profesionales 0303-2024
La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, se espera al finalaizar los estudios y diseños realizar la socializacion del proyecto.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Esta Semana se realizó las siguientes actividade: INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM 2 (60.000 PSI) Y CONCRETO CICLOPEO DE 14Mpa. esta actividad corresponde a lo establecido en la programación, asi mismo se presento retraso en unas actividades puesto que se grandes precipitaciones que no permitieron el normal proceder de las actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se continuará con fundidas de placas, cunetas y piedra pegada.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%
4	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%
11	0.00%	0.00%	0.00%
12	0.00%	0.00%	0.00%
13	3.66%	1.73%	-1.93%
14	7.32%	3.46%	-3.86%
15	12.88%	5.19%	-7.69%
16	18.45%	8.86%	-9.59%
17	30.11%	16.87%	-13.25%
18	39.85%	25.04%	-14.81%
19	49.59%	30.32%	-19.27%
20	59.33%	46.69%	-12.64%
21	68.91%	61.44%	-7.47%
22	78.49%	71.57%	-6.92%
23	88.07%	74.50%	-13.58%
24	97.66%		
25	100.00%		
Actual	88.07%	74.50%	-13.58%

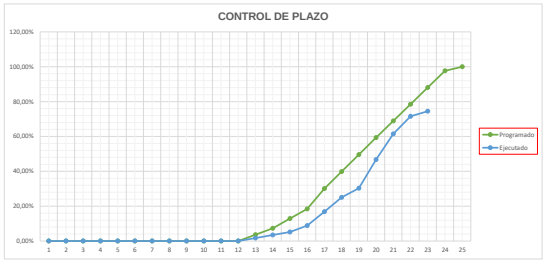

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



FUNDIDA DE HUELLAS



ENCOFRADO PARA PIEDRA PEGADAS LATERALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

>Revisión y acompañamiento al contratista en la fundida de piedra pegada.
>Revisión y acompañamiento en la fundida de huellas y encofrado para piedras pegadas laterales.
>Se revisa documentación del personal.
>Se hace seguimiento al cumplimiento de los requerimientos contractuales.
>Se revisa técnicamente que se cumplan con los diseños estructurales.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 24 del 21/06/2024 al 27/06/2024 | Último Informe Semanal SI | - (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO SAN JUAN, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 95 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 95 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN		
CONVENIO No.	4311 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.131.340,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.131.340,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%		
CONTRATO No.	4968 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.131.340,00	$ 199.131.340		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 157.787.123		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.131.340,00	$ 41.344.217		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 110.701.969	$ 110.701.969		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.735.825,80	$ 2.735.826		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 153.529.566,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 152.316.843,85	99,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 116.616.254,93	75,96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (35.700.588,92)	-23,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 41.170.868,31	20,68%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 193.487.712,15	97,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 157.787.123,24	79,24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (35.700.588,92)	-17,93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.552.155,24	10,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.243.513,00	1,46%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.701.969,20	97,59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 110.701.969,20	97,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No se realizaron actividades esta semana

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,21% | Avance o Atraso Físico % -23,3%

Meta Física Ejecutada % 75,96%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	71
*	Subbase Granular Clase C	M3	71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	61,02
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,03
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2290
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	49,93			49,93	81,82%
Ejec	27,74			27,74	45,45%
Prog	22,50			22,50	89,89%
Ejec	7,50			7,50	29,96%
Prog	1832,00			1832,00	80,00%
Ejec	2290,00			2290,00	100,00%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Vibro Compactador tipo Rana	1	1
Electro Bomba	1	1
Mezcladora bulto y 1/2	1	1
Total	4	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA GUARIGUA, SAN PABLO, BOLIV	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	SUBBASE	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	Ferreteria la 17, SAN PABLO, BOLIVAR	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	VARILLAS DE 3/8" PARA FIGURADO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: PERMISOS SUMINISTRADO POR DECRETO MUNICIPAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, por tal motivo, no han remitido a esta interventoría dicha información.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: realizar la socializacion del proyecto con representante legal y profesionales 0303-2024
La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, se espera al finalaizar los estudios y diseños realizar la socializacion del proyecto.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Esta Semana se realizó las siguientes actividade: FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM 2 (60.000 PSI) Y CONCRETO CICLOPEO DE 14Mpa. esta actividad corresponde a lo establecido en la programación, asi mismo se presento retraso en casi todas las actividades puesto que las fuertes lluvias impidieron que se pudiese trabajar con normalidad.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se continuará con fundidas de placas, cunetas y piedra pegada.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%
4	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%
11	0.00%	0.00%	0.00%
12	0.00%	0.00%	0.00%
13	3.66%	1.73%	-1.93%
14	7.32%	3.46%	-3.86%
15	12.88%	5.19%	-7.69%
16	18.45%	8.86%	-9.59%
17	30.11%	16.87%	-13.25%
18	39.85%	25.04%	-14.81%
19	49.59%	30.32%	-19.27%
20	59.33%	46.69%	-12.64%
21	68.91%	61.44%	-7.47%
22	78.49%	71.57%	-6.92%
23	88.07%	74.50%	-13.58%
24	97.66%	75.96%	-21.70%
25	100.00%		
Actual	97.66%	75.96%	-21.70%

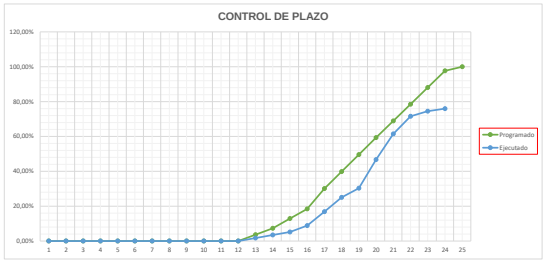

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



ENCOFRADO PARA FUNDIDA DE HUELLAS DE LOS ULTIMOS METROS



FUNDIDA DE CUNETAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

>Revisión y acompañamiento al contratista en la fundida de piedra pegada.
>Revisión y acompañamiento encofrado para fundida de huellas y fundida de cunetas.
>Se revisa documentación del personal.
>Se hace seguimiento al cumplimiento de los requerimientos contractuales.
>Se revisa técnicamente que se cumplan con los diseños estructurales.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 22 del 6/05/2024 al 12/05/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRO AZUL, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 95 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 100 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL

CONVENIO No. 4269 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.113.940,00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.113.940,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%

CONTRATO No. 4968 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 36.312.651,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.113.940,00	$ 199.113.940		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 157.415.468		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.113.940,00	$ 41.698.472		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 94.934.782	$ 94.934.782		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 18.503.013,00	$ 18.503.013		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 153.512.740,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 121.195.707,15	78,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 123.106.853,08	80,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.911.145,92	78,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 34.308.615,38	17,23%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 121.195.707,15	60,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 157.415.468,46	79,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 36.219.761,31	18,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.552.155,24	10,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.408.461,12	13,95%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 97.934.782,00	86,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.934.782,00	83,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 78,95% — Avance o Atraso Físico % 1,24%

Meta Física Ejecutada % 80,19%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	71
*	Subbase Granular Clase C	M3	71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	61,02
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,03
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2290
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	71			71,00	100,00%
Ejec	71			71,00	100,00%
Prog	33,28			33,28	54,55%
Ejec	22,19			22,19	36,36%
Prog	20,00			20,00	79,90%
Ejec	15,00			15,00	59,93%
Prog	1832,00			1832,00	80,00%
Ejec	2061,00			2061,00	90,00%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibro Compactador tipo Rana	1	1
Electro Bomba	1	1
Mezcladora 1 1/2 bultos	1	1
Total	4	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SE CUENTA CON UN SOLO TRAMO DE EJECUCION — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA GUARIGUA, SAN PABLO, BOLIV	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	SUBBASE	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	Ferretería la 17, SAN PABLO, BOLIVAR	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	VARILLAS DE 3/8" PARA FIGURADO CEMENTO Y MAS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: PERMISOS SUMINISTRADO POR DECRETO MUNICIPAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Se realizó socialización el 2/3/2024 en San Pablo Bolivar, con presidentes de las juntas de accion comunal de los convenios, algunos residentes de los beneficiados, entidad contratate INVIAS con la asitencia del supervisor, la interventoría, alcaldía

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Esta Semana se realizó las siguientes actividade: EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM 2 (60.000 PSI), CONCRETO CICLOPEO DE 14Mpa. esta actividad corresponde a lo establecido en la programación, asi mismo se presento retraso en dos actividades puesto que se opto por terminar el la totalidad de las placas en los primeros 40 metros terminando este objetivo en su totalidad.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se Continuará Fundidas de placa huellas para la proxima semana.
* Se Continuará Fundiendo Ciclope.
* Se Continuará Fundiendo bordillo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%
4	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%
11	0.00%	0.00%	0.00%
12	0.00%	0.00%	0.00%
13	3.66%	4.72%	1.06%
14	7.32%	9.45%	2.13%
15	12.88%	15.84%	2.95%
16	18.45%	22.23%	3.78%
17	30.11%	28.63%	-1.48%
18	39.85%	30.29%	-9.56%
19	49.59%	31.96%	-17.63%
20	59.33%	50.84%	-8.49%
21	68.91%	66.25%	-2.66%
22	78.49%	80.19%	1.70%
23	88.07%		
24	97.66%		
25	100.00%		
Actual	78.49%	80.19%	1.70%



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE PIEDRA RAJONADA



INSTALACION DE PIEDRA PEGADA LATERAL



INSTALACION DE PIEDRA PEGADA CENTRAL



INSTALACION DE PIEDRA PEGADA CENTRAL



INSTALACION DE CUNETA



FUNDIDA DE PLACAS.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Acompañamiento al contratista en la calidad del concreto, vaciado y su vibracion, ademas de su correcto curado para garantizar la calidad
> Acompañamiento al contratista y revision de la documentacion del personal de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 23 del 14/06/2024 al 20/06/2024 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRO AZUL, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 95 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 100 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL

CONVENIO No. 4269 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.113.940,00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.113.940,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%

CONTRATO No. 4968 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 36.312.651,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.113.940,00	$ 199.113.940		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 166.520.705		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.113.940,00	$ 32.593.235		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 104.318.376	$ 104.318.376		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 9.119.419,33	$ 9.119.419		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 153.512.740,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.747.862,39	89,08%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 128.781.227,62	83,89%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.966.634,78)	89,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 37.739.476,92	18,95%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 136.747.862,39	68,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 166.520.704,54	83,63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 29.772.842,15	14,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.552.155,24	10,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.674.374,54	3,70%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 104.318.375,67	91,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 104.318.375,67	91,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.564,50	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No se realizaron actividades esta semana

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 89,08% — Avance o Atraso Físico % -5,19%

Meta Física Ejecutada % 83,89%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	71
*	Subbase Granular Clase C	M3	71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	61,02
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,03
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2290
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	71			71,00	100,00%
Ejec	71			71,00	100,00%
Prog	38,83			38,83	63,64%
Ejec	24,96			24,96	40,91%
Prog	22,50			22,50	89,89%
Ejec	16,25			16,25	64,92%
Prog	2061,00			2061,00	90,00%
Ejec	2290,00			2290,00	100,00%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibro Compactador tipo Rana	1	1
Electro Bomba	1	1
Mezcladora 1 1/2 bultos	1	1
Total	4	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SE CUENTA CON UN SOLO TRAMO DE EJECUCION — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CANTERA GUARIGUA, SAN PABLO, BOLIV	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	SUBBASE	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	Ferreteria la 17, SAN PABLO, BOLIVAR	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	VARILLAS DE 3/8" PARA FIGURADO CEMENTO Y MAS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: PERMISOS SUMINISTRADO POR DECRETO MUNICIPAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, por tal motivo, no han remitido a esta interventoría dicha información.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: realizar la socializacion del proyecto con representante legal y profesionales 0303-2024
La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, se espera al finalaizar los estudios y diseños realizar la socializacion del proyecto.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Esta Semana se realizó las siguientes actividade: INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM 2 (60.000 PSI), CONCRETO CICLOPEO DE 14Mpa. esta actividad corresponde a lo establecido en la programación, asi mismo se presento retraso en dos actividades puesto que las lluvias no permitieron un avance significativo en el normal y correcto transcurrir de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se Continuará Fundidas de placa huellas para la proxima semana.
* Se Continuará Fundiendo Ciclope.
* Se Continuará Fundiendo bordillo.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%
4	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%
11	0.00%	0.00%	0.00%
12	0.00%	0.00%	0.00%
13	3.66%	4.72%	1.06%
14	7.32%	9.45%	2.13%
15	12.88%	15.84%	2.95%
16	18.45%	22.23%	3.78%
17	30.11%	28.63%	-1.48%
18	39.85%	30.29%	-9.56%
19	49.59%	31.96%	-17.63%
20	59.33%	50.84%	-8.49%
21	68.91%	66.25%	-2.66%
22	78.49%	80.19%	1.70%
23	88.07%	83.89%	-4.18%
24	97.66%		
25	100.00%		
Actual	88.07%	83.89%	-4.18%

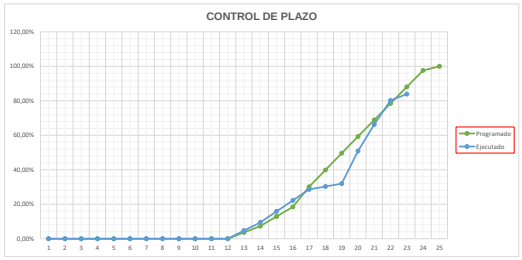

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE VIGARRIOSTRA Y CUNETA



INSTALACION DE VIGARRIOSTRA Y CUNETA



INSTALACION DE VIGARRIOSTRA Y CUNETA



INSTALACION DE VIGARRIOSTRA Y CUNETA



INSTALACION DE CUNETA



FUNDIDA DE PLACAS.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Se realiza la revision y supervision a la instalacion de vigariostras y cuneta
> Se realiza acompañamiento de la excavaciones al contratista.
> Se solicita al contratista estar actualizando la documentacion del personal de acuerdo a los cambios que realice.
> Se le recuerda al contratista los pagos de las retenciones.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 24 del 20/06/2024 al 26/06/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRO AZUL, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 95 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 100 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL

CONVENIO No.	4269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.113.940,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.113.940,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%		
CONTRATO No.	4968 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.113.940,00	$ 199.113.940		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 175.625.941		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.113.940,00	$ 23.487.999		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 153.512.740,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 152.300.017,63	99,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 134.455.602,15	87,59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (17.844.415,48)	99,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 41.170.338,46	20,68%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 152.300.017,63	76,49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 175.625.940,62	88,20%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 23.325.922,98	11,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.552.155,24	10,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.674.374,54	3,70%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69.960.336,00	61,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.640.745,25	5,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: No se realizaron actividades esta semana

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 99,21% — Avance o Atraso Físico %: -11,62%

Meta Física Ejecutada %: 87,59%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	71
*	Subbase Granular Clase C	M3	71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	61,02
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,03
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2290
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	71			71,00	100,00%
Ejec	71			71,00	100,00%
Prog	44,38			44,38	72,73%
Ejec	33,28			33,28	54,55%
Prog	25,00			25,00	99,88%
Ejec	17,50			17,50	69,92%
Prog	2290,00			2290,00	100,00%
Ejec	2290,00			2290,00	100,00%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibro Compactador tipo Rana	1	1
Electro Bomba	1	1
Mezcladora 1 1/2 bultos	1	1
Total	4	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SE CUENTA CON UN SOLO TRAMO DE EJECUCION — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CANTERA GUARIGUA, SAN PABLO, BOLIV	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	SUBBASE	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	Ferreteria la 17, SAN PABLO, BOLIVAR	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	VARILLAS DE 3/8" PARA FIGURADO CEMENTO Y MAS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: PERMISOS SUMINISTRADO POR DECRETO MUNICIPAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, por tal motivo, no han remitido a esta interventoría dicha información.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: realizar la socializacion del proyecto con representante legal y profesionales 0303-2024
La JAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, se espera al finalaizar los estudios y diseños realizar la socializacion del proyecto.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Esta Semana se realizó las siguientes actividade: INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM 2 (60.000 PSI), esta actividad corresponde a lo establecido en la programación, asi mismo se presento retraso en una actividades puesto que las lluvias no permitieron un avance significativo en el normal y correcto transcurrir de la obra, aun asi se da por terminada la actividad de concreto reforzado en huellas solo faltan cunetas, riostras y bordillos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se Continuará Fundidas de placa huellas para la proxima semana.
* Se Continuará Fundiendo Ciclope.
* Se Continuará Fundiendo bordillo.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%
4	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%
11	0.00%	0.00%	0.00%
12	0.00%	0.00%	0.00%
13	3.66%	4.72%	1.06%
14	7.32%	9.45%	2.13%
15	12.88%	15.84%	2.95%
16	18.45%	22.23%	3.78%
17	30.11%	28.63%	-1.48%
18	39.85%	30.29%	-9.56%
19	49.59%	31.96%	-17.63%
20	59.33%	50.84%	-8.49%
21	68.91%	66.25%	-2.66%
22	78.49%	80.19%	1.70%
23	88.07%	83.89%	-4.18%
24	97.66%	87.59%	-10.07%
25	100.00%		
Actual	97.66%	87.59%	-10.07%

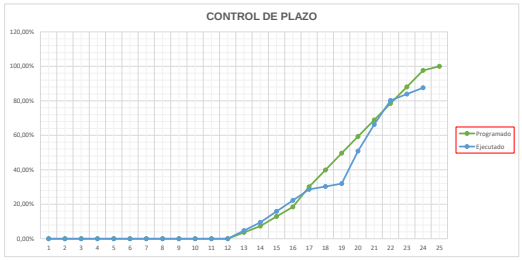

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE FORMALETAS PARA HUELLAS



FUNDIDA DE HUELLAS



FIN DE FUNDICION DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Se realiza la revision y supervision a la instalacion de formaletas para huellas
> Se realiza acompañamiento en la fundida de huellas hasta finalizar.
> Se solicita al contratista estar actualizando la documentacion del personal de acuerdo a los cambios que realice.
> Se le recuerda al contratista los pagos de las retenciones.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 21 del 30/05/2024 al 5/06/2024 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRO AZUL, MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar 95 metros de placa huella aproximadamente, siguiendo los lineamientos de los estudio y diseño los cuales tienen como referencia la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara la construcción de una placa huella de longitud aproximada de 100 ml, ancho de vía 5,00m, con sus respectivas cunetas y bordillos. Se realizaran para la construcción actividades como:Excavaciones, Subbase granular clase C, concreto reforzado de 21Mpa, concreto ciclopeo de 14Mpa y acero de refuerzo 4.200Kg/cm2.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL

CONVENIO No.	4269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.113.940,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.113.940,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

INTEGRANTES: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV. 100%

CONTRATO No.	4968 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 77.125.144,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.312.651,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 113.437.795,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.113.940,00	$ 199.113.940		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 132.576.146		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.113.940,00	$ 66.537.794		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 88.551.189	$ 88.551.189		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 24.886.606,00	$ 24.886.606		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 153.512.740,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 105.643.551,91	68,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 101.698.391,95	66,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.945.159,96)	68,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 30.877.753,85	15,51%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105.643.551,91	53,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 132.576.145,80	66,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 26.932.593,89	13,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.552.155,24	10,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.651.974,12	15,41%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 91.551.189,00	80,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 88.551.189,00	78,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.839.565,00	6,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,82% — Avance o Atraso Físico %: 2,57%

Meta Física Ejecutada %: 66,25%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	71
*	Subbase Granular Clase C	M3	71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	61,02
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,03
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	2290
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	71,00			71,00	100,00%
Ejec	71,00			71,00	100,00%
Prog	71			71,00	100,00%
Ejec	71			71,00	100,00%
Prog	27,74			27,74	45,45%
Ejec	16,64			16,64	27,27%
Prog	17,50			17,50	69,92%
Ejec	7,50			7,50	29,96%
Prog	1603,00			1603,00	70,00%
Ejec	1832,00			1832,00	80,00%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Vibro Compactador tipo Rana	1	1
Electro Bomba	1	1
Mezcladora 1 1/2 bultos	1	1
Total	4	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: SE CUENTA CON UN SOLO TRAMO DE EJECUCION — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA GUARIGUA, SAN PABLO, BOLIV.	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	SUBBASE	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	Ferretería la 17, SAN PABLO, BOLIVAR	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	VARILLAS DE 3/8" PARA FIGURADO CEMENTO Y MAS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: PERMISOS SUMINISTRADO POR DECRETO MUNICIPAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

OBSERVACIONES: La IAC se encuentra en etapa de elaboración de estudios y diseños, por tal motivo, no han remitido a esta interventoría dicha información.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Se realizó socialización el 2/3/2024 en San Pablo Bolivar, con presidentes de las juntas de accion comunal de los convenios, algunos residentes de los beneficiados, entidad contranate INVIAS con la asitencia del supervisor, la interventoría, alcaldía

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Esta Semana se realizó las siguientes actividade: EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM 2 (60.000 PSI), CONCRETO CICLOPEO DE 14Mpa. esta actividad corresponde a lo establecido en la programación, asi mismo se presento retraso en una actividades puesto que se opto por terminar el la totalidad de las placas en los primeros 40 metros puesto que a esa distancia se tiene el desvio estipulado y una vez cumpla el tiempo de curado a sus 28 dias esta sera habilitada dejando los 40 metros como desvia y para ese momento ya se contara con la fundida de los 3 metros restantes y la culminacion de la totalidad de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se Continuará Fundidas de placa huellas para la proxima semana.
* Se Continuará Fundiendo Ciclope.
* Se Fundiran 80 ml de bordillo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%
4	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%
11	0.00%	0.00%	0.00%
12	0.00%	0.00%	0.00%
13	3.66%	4.72%	1.06%
14	7.32%	9.45%	2.13%
15	12.88%	15.84%	2.95%
16	18.45%	22.23%	3.78%
17	30.11%	28.63%	-1.48%
18	39.85%	30.29%	-9.56%
19	49.59%	31.96%	-17.63%
20	59.33%	50.84%	-8.49%
21	68.91%	66.25%	-2.66%
22	78.49%		
23	88.07%		
24	97.66%		
25	100.00%		
Actual	68.91%	66.25%	-2.66%



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ENCOFRADO PARA PIEDRA PEGADAS Y VIGAS RIOSTRAS



FUNDIDA DE PLACAS.



FUNDIDA DE PLACAS.



FUNDIDA DE PLACAS.



ORACION A DIOS Y CALESTENIA ANTES DE EMPEZAR JORNADA LABORAL



FUNDIDA DE PLACAS.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

> Se realiza la revision y supervision de las doscificaciones del concreto de 21MPa y concreto ciclopeo
> Se realiza acompañamiento de la excavaciones al contratista.
> Se solicita al contratista estar actualizando la documentacion del personal de acuerdo a los cambios que realice.
> Se le recuerda al contratista los pagos de las retenciones.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NELSON VARGAS ALMARIO

Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 30-jun **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 3734-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4968-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
mezcladora		1 BULTO	Vereda alto berlin	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
rana compatadora		N/A	Vereda alto berlin	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Vibrador de concreto		N/A	Vereda alto berlin	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Moto bomba		N/A	Vereda alto berlin	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																
TOTAL ACTIVO																																
TOTAL EN REPARACIÓN																																
TOTAL INACTIVO																																

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los equipos se encuentran inactivos tempralmente debido a que no es necesario por el momento utilizarlos pero ya se encuentran en el sitio de la obra, activa realizada excavaciones varias sin clasificar para su ejecucion del 100% que segun la programacion equivale al 0.66%

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JOHAN JHILBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-426293 NTS

Firma
Nombre: Jhoan Ferney Quintero Molina
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 66202-275182RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4123-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN BAJO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4968-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR E12		SAN JUAN BAJO	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	
RETROCARGADOR	JOHN DEERE 310 G		SAN JUAN BAJO	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	
2 VOLQUETAS	DOGDE 600	7 M3	SAN JUAN BAJO	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): o…….DIAS LABORADOS, x……DIAS NO LABORADOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: KAIFER DIAZ ROJAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-180671

Jhoan Ferney Quintero R.
Firma
Nombre: JHOAN FERNEY QUINTERO
Residente de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 66202-275182RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4269-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO ALTO SAN JUAN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4968-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CAT-420D		VEREDA CERRO AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ELECTROBOMBA			VEREDA CERRO AZUL	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1					
COMPACTADOR TIPO RANA			VEREDA CERRO AZUL	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1					
MEZCLADORA 1 1/2			VEREDA CERRO AZUL	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1					
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72	80,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	24	26,67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	2	2,22%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	13,33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): LA RETRO ESCAVADORA SE MANTUVO INACTIVA EN LO TRANSCURRIDO DEL MES 12 DIAS ESTO OCURRIO DEBIDO A QUE NO ERAN NECESARIAS SU OPERACIONES EN LA OBRA, ASI MISMO LA MEZCLADOR SUFRIO UN DAÑO.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ALFREDO RODRIGUEZ MATUTE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0551037

Firma
Nombre: JHOAN FERNEY QUINTERO MOLINA
Residente de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 66202-275182RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 26/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4269-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO ALTO SAN JUAN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4968-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA	CAT-420D		VEREDA CERRO AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ELECTROBOMBA			VEREDA CERRO AZUL	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1					
COMPACTADOR TIPO RANA			VEREDA CERRO AZUL	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1					
MEZCLADORA 1 1/2			VEREDA CERRO AZUL	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1					
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72	80,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	24	26,67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	2	2,22%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	13,33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): LA RETRO ESCAVADORA SE MANTUVO INACTIVA EN LO TRANSCURRIDO DEL MES 12 DIAS ESTO OCURRIO DEBIDO A QUE NO ERAN NECESARIAS SU OPERACIONES EN LA OBRA, ASI MISMO LA MEZCLADOR SUFRIO UN DAÑO.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ALFREDO RODRIGUEZ MATUTE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0551037

Firma Jhoan Ferney Quintero M.
Nombre: JHOAN FERNEY QUINTERO MOLINA
Residente de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 66202-275182RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO DE OBRA No: 3734-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4968-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAVIER DARIO MARIN SABALA	1042211265	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA CIERRO AZUL	$ 650.000,00	$ 45.300	V	NUEVA EPS	7935409491	$ 81.300	PORVENIR	7935409491	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
2	CESAR AUGUSTO RUIZ ROJAS	1050542238	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA CIERRO AZUL	$ 650.000,00	$ 45.300	V	NUEVA EPS CM	7935409491	$ 81.300	PORVENIR	7935409491	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
3	DUVAN FELIPE SERENO TUIRAN	1050554613	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA CIERRO AZUL	$ 650.000,00	$ 45.300	V	NUEVA EPS CM	7935409491	$ 81.300	PORVENIR	7935409491	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
4	EVER HERNANDEZ GUIZA	13852031	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA CIERRO AZUL	$ 650.000,00	$ 45.300	V	NUEVA EPS CM	7935409491	$ 81.300	COLPENSIONES	7935409491	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
5	TOMAS ENRIQUE ANAYA MARTINEZ	8743500	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA CIERRO AZUL	$ 650.000,00	$ 45.300	V	NUEVA EPS CM	7935409491	$ 81.300	COLPENSIONES	7935409491	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
6	RICARDO FONSECA MARTINEZ	8829103	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA CIERRO AZUL	$ 650.000,00	$ 45.300	V	CAJACOP EPS S.A.S	7935409491	$ 81.300	PORVENIR	7935409491	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
7	JAVIER ALDANA RODELO	8829666	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA CIERRO AZUL	$ 650.000,00	$ 61.300	V	NUEVA EPS CM	7935409491	$ 110.000	PORVENIR	7935409491	$ 104.000	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	
8	EGER BONILLA SERNA	91326278	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA CIERRO AZUL	$ 650.000,00	$ 45.300	V	NUEVA EPS CM	7935409491	$ 81.300	PORVENIR	7935409491	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
9																			
10																			
11																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
La contadora y el ingeniero residente realizan sus aportes independientemente y los trabajadores es responsable el contratista

El contratista adiunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del oresente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOHAN JHILBERTO HERNANDEZ AGUILAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-426293

Firma
Nombre: Nelson Vargas Almario
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1900218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO DE OBRA No: 4123-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4968-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

NOMBRE ARL: Suramericana **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CORPOS ARIZA SNEIDER	1002361510	Oficial	$ 1.760.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		$1.760.000	$122.500	5	NUEVA E.P.S	7935134204	$ 220.000	PORVENIR	7935134204	$ 208.000	$ 70.400	$ 35.200	$ 52.800	
2	DIAZ LASTRE YERSON	1005177929	Ayudante	$ 1.300.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x		$ 910.000	$ 63.400	5	NUEVA E.P.S	7935134204	$ 113.800	PORVENIR	7935134204	$ 208.000	$ 36.400	$ 18.200	$ 27.300	
3	DOMINGUEZ MARQUEZ JULIO	1104126424	Ayudante	$ 1.300.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		$1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS CM	7935134204	$ 162.500	PORVENIR	7935134204	$ 281.600	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	CARDONA CARDONA PEDRO LUIS	13887899	Ayudante	$ 1.300.000																															$ -	$ 90.500	5	NUEVA E.P.S	7935134204	$ 162.500		7935134204	$ 368.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	OLARTE GONZALEZ LUIS ROBERTO	6788863	Ayudante	$ 1.300.000																															$ -	$ 90.500	5	NUEVA EPS CM	7935134204	$ 162.500		7935134204	$ 368.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	LOZANO ALBERTO	73590942	Avudante	$ 1.300.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		$ 346.667	$ 24.200	5	SUBS COOSALUD ESS	7935134204	$ 43.400	PORVENIR	7935134204	$ 90.133	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
7	PERALTA MANRIQUE ILDEBRANDO	91437831	Ayudante	$ 1.300.000	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		$ 303.334	$ 21.200	5	SUBS COOSALUD ESS	7935134204	$ 38.000	PORVENIR	7935134204	$ 83.199	$ 12.200	$ 6.100	$ 9.200	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

o.....DIAS LABORADOS, x.....DIAS NO LABORADAS

El contratista adjunta la certificación de fecha may-24 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MAIFER DIAZ ROJAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-180671

Firma
Nombre: Nelson Vargas Almario
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 1900218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO DE OBRA No: 4123-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4968-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

NOMBRE ARL: Suramericana **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CACUA PEREZ ROSEMBER	1002361997	Ayudante	$1.300.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			$1.300.000	$ 90.500	5	SUBS COOSALUD ESS	7935157311	$ 162.500	PORVENIR	7935157311	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	VIRGUEZ HOYOS JORGE ENRIQUE	10178773	Ayudante	$1.300.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			$1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS CM	7935157311	$ 162.500	PORVENIR	7935157311	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	PALMERA MERINO JOSE	1068348974	Oficial	$1.760.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			$1.760.000	$122.500	5	NUEVA EPS CM	7935157311	$ 220.000	PORVENIR	7935157311	$ 281.600	$ 70.400	$ 35.200	$ 52.800	
4	GORDON DIAZ WILLINTON	73238671	Maestro	$2.300.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			$2.300.000	$160.100	5	SUBS ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	7935157311	$ 287.500	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION	7935157311	$ 368.000	$ 92.000	$ 46.000	$ 69.000	
5	MEJIA PEREZ ALEXANDER	8770156	Ayudante	$1.300.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$563.334	$ 39.300	5	NUEVA EPS CM	7935157311	$ 70.500	COLFONDOS	7935157311	$ 368.000	$ 22.600	$ 11.300	$ 17.000	
6	SIERRA TORREZ AUGLO GELIS	8828854	Ayudante	$1.300.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$520.000	$ 36.200	5	NUEVA EPS CM	7935157311	$ 65.000	PORVENIR	7935157311	$ 90.133	$ 20.800	$ 10.400	$ 15.600	
7	JULIAO PACHECO YARLINSSON	8829412	Ayudante	$1.300.000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$520.000	$ 36.200	5	NUEVA E.P.S	7935157311	$ 65.000	PORVENIR	7935157311	$ 83.199	$ 20.800	$ 10.400	$ 15.600	
8	ESPANA GARCIA BLADIMIR MANUEL	9195271	Ayudante	$1.300.000	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$216.667	$ 15.100	5	NUEVA E.P.S	7935157311	$ 27.100	PORVENIR	7935157311	$ 173.333	$ 8.700	$ 4.400	$ 6.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

o.....DIAS LABORADOS, x.....DIAS NO LABORADAS

El contratista adiunta la certificación de fecha may-24 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (1) continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MABER DIAZ ROJAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-180671

Firma
Nombre: Nelson Vargas Almario
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 1900218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO DE OBRA No: 3734-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4968-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	OVER MANUEL SALAS CALCEDO	1047214150	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.320.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN	$ 1.320.000,00	$ 91.900	V	NUEVA EPS	1744248557	$ 52.800	PORVENIR	1744248557	$ 52.800	$ -	$ -	$ -	
2	CARLOS FARID QUIROGA FIGUEROA	1050542611	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.320.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN	$ 1.320.000,00	$ 91.900	V	NUEVA EPS	1744248557	$ 52.800	PORVENIR	1744248557	$ 52.800	$ -	$ -	$ -	
3	WILLINTON YARLEY ACEVEDO PARDO	105054006	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.320.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN	$ 1.320.000,00	$ 91.900	V	NUEVA EPS	1744248557	$ 52.800	PROTECCION	1744248557	$ 52.800	$ -	$ -	$ -	
	MARTIN ALBERTO CARPINTERO MACIAS	1097183293	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.320.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN	$ 1.320.000,00	$ 91.900	V	NUEVA EPS	1744248557	$ 52.800	PROTECCION	1744248557	$ 52.800	$ -	$ -	$ -	
4	JEIFER PEREZ VIANA	1192803954	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.320.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN	$ 1.320.000,00	$ 91.900	V	NUEVA EPS	1744248557	$ 52.800	PROTECCION	1744248557	$ 52.800	$ -	$ -	$ -	
5	RAFAEL ARLBERTO ANAYA CARO	72232652	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.320.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN	$ 1.320.000,00	$ 91.900	V	NUEVA EPS	1744248557	$ 52.800	PORVENIR	1744248557	$ 52.800	$ -	$ -	$ -	
6	EDUARDO ENRUIOUE RUEDAS GALVIS	91446913	AUXILIAR CONSTRUCCION	$ 1.320.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC COMUNAL VEREDA ALTO BERLIN	$ 1.320.000,00	$ 91.900	V	NUEVA EPS	1744248557	$ 52.800	PORVENIR	1744248557	$ 52.800	$ -	$ -	$ -	
7																			
8																			
9																			
10																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

La contadora y el ingeniero residente realizan sus aportes independientemente y los trabajadores es responsable el contratista

El contratista adiunta la certificación de fecha ---------- a la aue se refiere la nota 8 del oresente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOHAN JHILBERTO HERNANDEZ AGUILAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-426293

Firma
Nombre: Nelson Vargas Almario
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1900218812-CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 3734 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO BERLÌN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4968 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	20	17	24	18	24	14	24	17	24	24	13	12	14	24	16	24	24	11	24	16	13	18	24	24	12	14	13	22	595,5
Lluvias moderadas	0	0	0	4	7,5	0	6	0	10	0	7	0	0	11	12	10	0	8	0	0	13	0	8	11	6	0	0	12	10	11	2	148,5
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOHAN JHILBERTO HERNANDEZ AGUILAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-426293

Firma
Nombre: Jhoan Ferney Quintero Molina
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 66202-275182RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 4123 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4968 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4		102
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	4	4	4		48
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	0	6	6	6	6	6	6	0	0	0		92
Total horas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Durante la semana se logró los objetivos principales que fue la preparación del terreno y el procesamiento del acero de refuerzo

Firma
Nombre: MAIFER DIAZ BOJAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-180671

Firma Jhoan Ferney Quintero M.
Nombre: JHOAN FERNEY QUINTERO MOLINA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 66202-275182RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Residente de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 4311-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4968 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total mm
Seco		0	0		0			0	0		0							0	0				0			0		0						0
Lluvias moderadas	2,5					1	1						4,5	4,8																				13,8
Lluvias intensas				22						34		18			31	52	43			87	38	35		4,6	1,6		95							459,6
Total horas	2,5	0	0	22	0	1	1	0	0	34			0	18	4,5	4,8	31	0	0	87	38	35	0	4,6	1,6	0	95	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

DICHO REGISTRO ESTA SOPORTADO BAJO EL INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, CUYOS DATOS FUERON ARROJADOS POR LA ESTACION COL COOPERATIVO CON CODIGO 23205020 Y LATITUD 7.475 LONGITUD -73.92555556 ALTITUD 165 DE SAN PABLO, BOLIVAR, ES BIEN SABIDO QUE POR LA GEOGRAFIA DEL LUGAR DE EJECUCION NOS ENCONTRAMOS CON UN TERRENO ROCOSO ARCILLOSO EL CUAL AL ESTAR EN CONTACTO CON LAS PRECIPITACIONES CAUSA UN DIFICIL MANEJO DEL MISMO Y ES POR ESTE MOTIVO QUE LOS DIAS QUE SE PRESENTARON GRANDES PRECIPITACIONES NO SE PUDO ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Firma
Nombre: ALFREDO RODRIGUEZ MATUTE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0551037

Firma Jhoan Ferney Quintero M.
Nombre: JHOAN FERNEY QUINTERO MOLINA
Residente de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 66202-275182RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 4311-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4968 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CYCOV

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total mm
Seco		0	0		0			0	0		0							0	0				0			0		0						0
Lluvias moderadas	2,5					1	1						4,5	4,8																				13,8
Lluvias intensas				22						34		18			31	52	43			87	38	35		4,6	1,6		95							459,6
Total horas	2,5	0	0	22	0	1	1	0	0	34			0	18	4,5	4,8	31	0	0	87	38	35	0	4,6	1,6	0	95	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

DICHO REGISTRO ESTA SOPORTADO BAJO EL INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, CUYOS DATOS FUERON ARROJADOS POR LA ESTACION COL COOPERATIVO CON CODIGO 23205020 Y LATITUD 7.475 LONGITUD -73.92555556 ALTITUD 165 DE SAN PABLO, BOLIVAR, ES BIEN SABIDO QUE POR LA GEOGRAFIA DEL LUGAR DE EJECUCION NOS ENCONTRAMOS CON UN TERRENO ROCOSO ARCILLOSO EL CUAL AL ESTAR EN CONTACTO CON LAS PRECIPITACIONES CAUSA UN DIFICIL MANEJO DEL MISMO Y ES POR ESTE MOTIVO QUE LOS DIAS QUE SE PRESENTARON GRANDES PRECIPITACIONES NO SE PUDO ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Firma
Nombre: ALFREDO RODRIGUEZ MATUTE
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0551037

Firma Jhoan Ferney Quintero M.
Nombre: JHOAN FERNEY QUINTERO MOLINA
Residente de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 66202-275182RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3734-2023 4123-2023 4311-2023 4269-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal vereda Alto Cañabraval, vereda PAtio bonit, corregimiento de Cañabraval y vereda tabacuru, municipio de San Pablo del departamento de Bolívar, para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN VEREDA ALTO BERLIN; JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SAN JUAN BAJO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CERRO AZUL

FECHA DE INICIO: (Indicar dia, mes y año) **PLAZO INICIAL:** **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4968-2023 (Indicar numero y año)

INTERVENTOR: CYCOV SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

No se ha dado inicio a obra

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma N/A	Firma N/A	Firma N/A	Firma N/A
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4968-2023

INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE OBRAS VIALES S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3734-2023, 4123-2023, 4311-2023, 4269-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN VEREDA ALTO BERLIN; JUNTA DE ACCIÓN VEREDA SAN JUAN BAJO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO SAN JUAN; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CERRO AZUL

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA AKT 125	MODELO: 2015 PLACA: RPO-25D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA BENELLI 180	MODELO: 2023 PLACA: XQM-99F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: No se realizo mantenimiento a las motocicletas.

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920218812-CAU

Firma
Nombre: NELSON EDUARDO ROMERO HERNÁNDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 15219-21989 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4968 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: junio de 2024 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO DE OBRA No: CS 3734 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO BERLÍN
CS 4123 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN
CS 4311 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO SAN JUAN
CS 4269 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO CERRO AZUL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1399723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	4968 DE 2023	$ 77.125.144,00	$ -
						$ 36.312.651	
TOTAL						$ 113.437.795,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 113.437.795**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
0					N/A	N/A	N/A	1399723 DEL 19/12/2023	$ 113.437.795,00	$ 113.437.795,00		
1	DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 113.437.795,00	$ 113.437.795,00		
2	DEL 18 AL 31 DE ENERO 2024	$ -	$ -	$ -					$ 113.437.795,00	$ 113.437.795,00		
3	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$ -	$ -	$ -					$ 113.437.795,00	$ 113.437.795,00		
4	DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024	$ 22.752.144,60	$ 4.322.907,00	$ 27.075.052,00					$ 86.362.743,00	$ 86.362.743,00		
5	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 16.196.600,00	$ 3.077.354,00	$ 19.273.954,00					$ 67.088.789,00	$ 67.088.789,00		
6	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 18.666.600,00	$ 3.546.654,00	$ 22.213.254,00					$ 44.875.535,00	$ 44.875.535,00		
7	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 18.140.600,00	$ 3.446.714,00	$ 21.587.314,00					$ 23.288.221,00	$ 23.288.221,00		
TOTALES		**$ 75.755.944,60**	**$ 14.393.629,00**	**$ 90.149.574,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 23.288.221,00**	**$ 23.288.221**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 15.986.600,00	$ 3.037.454,00	$ 19.024.054,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 2.154.000,00	$ 409.260,00	$ 2.563.260,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19 (G)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 18.140.600,00	$ 3.446.714,00	$ 21.587.314,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
INTERVENTORIA - CYCOV S.A.S
CC 42142580 DE PEREIRA

Firma
Nombre:NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No:15219-21989 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4968-2023 **INTERVENTOR:** CYCOV SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 77.125.144,00

VALOR ACUMULADO: $ 113.437.795,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NELSON ROMERO HERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.712.514,00	14	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.425.028,80	14	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 23.137.543,20	31	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 580 - 47 - 994000083178

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.343.779,00	22	12	2023	31	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 22.687.559,00	22	12	2023	31	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 34.031.338,50	31	12	2023	31	7	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 580 47 994000083178

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

Firma
NELSON ROMERO HERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 15219-21989 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5804386356

PÓLIZA No: 580 - 47 - 994000083178 ANEXO: 6

AGENCIA EXPEDIDORA: **PEREIRA** COD. AGENCIA: 580 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	07	2024	09	07	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.856.332-9**

DIRECCIÓN: CALLE 97 16 00 LOCAL 03 EDIFICIO PALMAS DE BELMONTE CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA TELÉFONO: 6063204544

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	22/12/2023	31/01/2025	11,343,779.50
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/12/2023	31/07/2027	22,687,559.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/07/2025	34,031,338.50

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 4968 DEL 14/12/2023, REFERENTE A: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL QUE SE LE IMPONGA Y SU VIGENCIA SE EXTIENDE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

*****ANEXO DE MODIFICACION*****
SEGUN PRORROGA 03 DE JUNIO 30/2024, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO 4968-2023, HASTA EL 31/07/2024, QUEDANDO SEGUN SE REGISTRA.

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN IGUAL.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****68,062,677.00	$ **********25,050	$*****5,000.00	$ ********5,709	$ **********35,759

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	5302	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000580438635

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBD0207C0A0CF97C58

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECIBO DE CAJA No. 580201477

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

AGENCIA PEREIRA	TRANSACCIÓN Nro. 580309736	FECHA DE RECAUDO 16/07/2024	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.			C.C o NIT 900856332
TOMADOR PÓLIZA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000083178 - NRO. ELECTRÓNICO 5804386356			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS			VALOR RECIBO $ 35,759.00
PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000083178 - ANEXO 6 AGENCIA PEREIRA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-900856332 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S. . VALOR PAGADO $ 35,758.96 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 580309736			



FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: LONDOÑO RIVERA JOHN JAIRO

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOL-050000
Fecha: 2024-07-25 14:55:11

SEÑOR(A):
JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CYCOV SAS
Calle 97 No. 16-00 Local 01 Edificio Palmas Belmonte
Cycov.sas@gmail.com
PEREIRA, RISARALDA

Asunto: Aprobación de garantía contrato No. 4968-2023 Anexo modificatorio No.6 póliza de cumplimiento según adición prorroga No 4968-3-2023-2024

Respetada señora.

Para el efecto de asegurar el cumplimiento del contrato de interventoría No. 4968- 2023 cuyo objeto consiste en: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", nos permitimos aprobar el anexo Modificatorio No. 6 de la póliza única de cumplimiento de conformidad con la ley 80 de 1993 y las cláusulas del contrato que versan sobre el tema:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA No. 580-47- 994000083178- **ANEXO MODIFICATORIO No. 6**

Amparos	**Sumas asegurada**	**Vigencia**			
Cumplimiento	$11,343.779.50	del	22-12-2023	al	31-01-2025
Salarios, Prest. Sociales	$22.687,559.00	del	22-12-2023	al	31-07-2027
Calidad del Servicio	$34.031,338.50	del	31-12-2023	al	31-07-2025

Como quiera que el contratista constituyera las pólizas cumpliendo los amparos exigidos en su valor y vigencia procedemos a impartir su aprobación.

Cordialmente,

Fabian Ernesto Arango Pineda.
Director Territorial Bolivar (E)

Proyectado Por: OLGA LEÓN MENDOZA
Revisado Por: Maria Fernanda Molinares Torres
Aprobado Por:

Copia Interna a:

Copia Externa a:
