

CONSORCIO SVP JR

Pacho 29 de octubre de 2024.

Ingeniera.
ANNGIE TATIANA BUSTOS GUTIERREZ
Secretaria de Planeación y Obas Publicas

Asunto: CONTRATO DE SUMINISTRO No CS-00234 DE 2024

Referencia: Solicitud de prorroga #2.

Por medio de la presente me permito informar que la ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No CS-00234 DE 2024** cuyo objeto es: **SUMINISTRO Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE REPARCHEO EN EL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA** porcentaje el porcentaje de ejecución a la fecha es del 84.19%, quedando por ejecutar el 15,81% para la finalización del proyecto de la referencia, así las cosas me permito solicitar prórroga #2 bajo las siguientes consideraciones:

- Se firma acta de inicio el día 01 de agosto de 2024, con un plazo de ejecución de 45 días, con una fecha de terminación del 14 de septiembre de 2024.


- El 14 de septiembre de 2024, se suscribió la prórroga No. 1 por un término de 45 días, con nueva fecha de terminación el 31 de octubre de 2024, por motivos de paro nacional de transportadores.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que desde su fecha de iniciación hasta el momento se vienen presentando fenómenos adversos a la entrega del suministro como lo es el paro nacional de transportadores y ahora el estado climático me permito hacer referencia al siguiente análisis meteorológico en el cual se basa dicha solicitud de prorroga #2.


TV 13 No.27A-42 Edifico Bella Ofelia, Barrio El Diamante
Cel 3132527074 – 3112599332
Email. administrativo@valcharoconstructores.com
Granada –Meta

CONSORCIO SVP JR

- **ESTADO CLIMITACO AGOSTO 2024:**

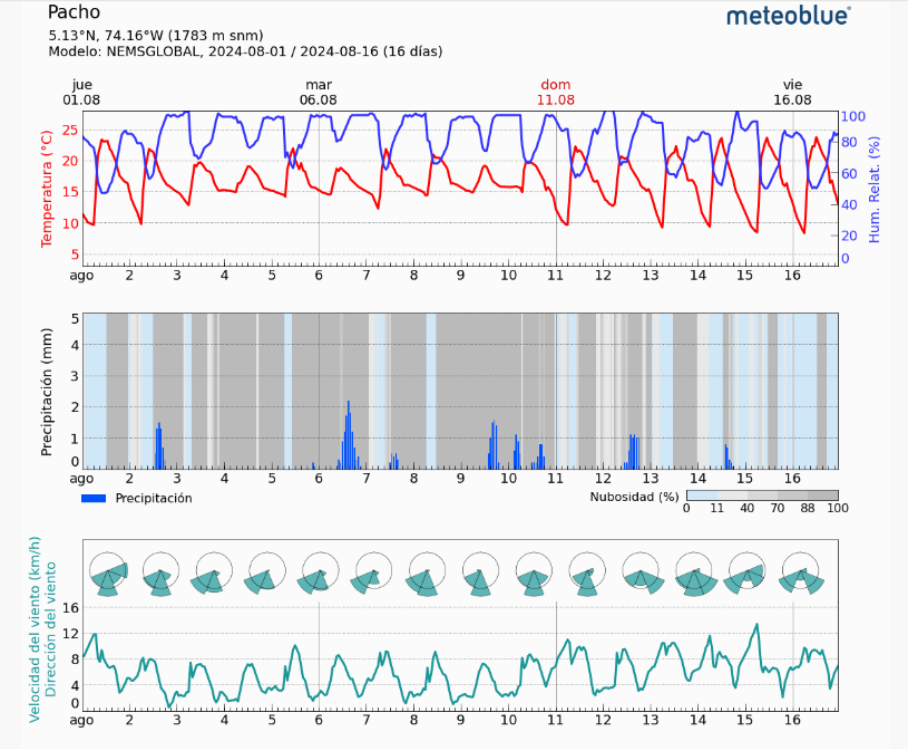

- **ESTADO CLIMITACO SEPTIEMBRE 2024:**

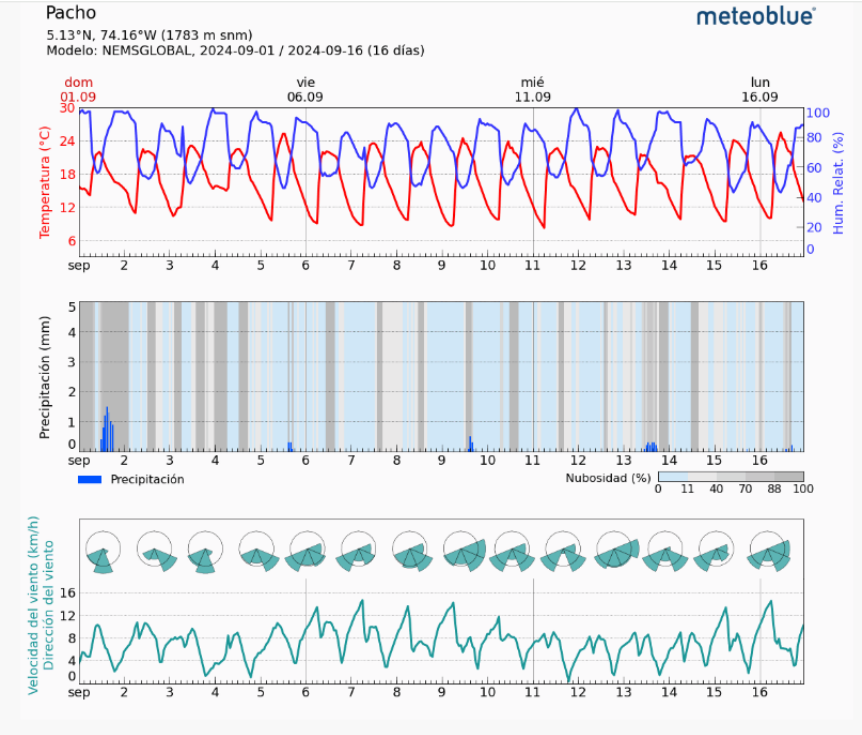

TV 13 No.27A-42 Edifico Bella Ofelia, Barrio El Diamante
Cel 3132527074 – 3112599332
Email. administrativo@valcharoconstructores.com
Granada –Meta

Así las cosas, es importante hacer referencia que el contrato a pesar de ser suministro su finalidad es el reparcheo actividades de obra las cuales se deben realizar a cielo abierto echo que ha generado un atraso significativo en la entrega del suministro ya que por las fuertes precipitaciones que se han venido generando *(ver imágenes anteriores)* no se ha podido realizar la entrega en los tiempos contractuales, es asi que solicito respetuosamente la prorroga #2 al contrato de la referencia por un termino de cuarenta y cinco (45) días, tiempo que requerimos para poder ejecutar el 100% del proyecto.

De ante mano le agradezco por su atención prestada, quedo atento a cualquier solicitud.

Cordialmente,

Nombre: **Rodrigo Valencia Chávez**
C. C. No.: 17.344.951 de Villavicencio
Representante Legal: CONSORCIO SVP JR

TV 13 No.27A-42 Edifico Bella Ofelia, Barrio El Diamante
Cel 3132527074 – 3112599332
Email. administrativo@valcharoconstructores.com
Granada –Meta
