OBJETO DEL CONTRATO:

"LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI"

LUGAR EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	AEROPUERTO EL RIO DE AMALFI					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	08	DE	JULIO	DE	2024	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31	DE	DICIEMBRE	DE	2024	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($116.899.268,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAMUS Y COMPAÑIA con NIT 901.842.873-4					
SUPERVISOR:	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN					

A continuación, presentamos una reseña de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato de Obra No. 24000696 H4 02 DE 2024; las actividades corresponden al primer corte y registro fotográfico del proceso constructivo, el cual hace parte integral del presente informe.

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE OBRA

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 24000696 H4 02 DE 2024 cuyo alcance es "LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI", se llevó a cabo las actividades programadas en la primera frecuencia brindando condiciones de seguridad operacional, eficiencia, y funcionabilidad del aeropuerto.

Se realizó el mantenimiento de las zonas verdes, cerramiento, fumigación y canales del Aeropuerto el Rio de Amalfi, el cual aborda la limpieza de las áreas perimetrales internas, consistente en el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, arbustos, limpieza manual del cerramiento (mallas) y la limpieza de canales (desmalezado y retiro de sedimentos), reconformación de los canales en tierra y la restitución de la geometría de este.

A continuación, se presenta el aeropuerto, con una breve descripción de las actividades ejecutadas:

- AEROPUERTO EL RIO – AMALFI

Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas., Se realizó el mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas; franjas de seguridad }

declaradas del aeropuerto, cabeceras, áreas de radio ayudas, y demás zonas verdes del aeropuerto, con el fin de garantizar la altura máxima aceptable del prado de 13 cm.

Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal, Se realizó en el reacondicionamiento de la sección hidráulica de los canales de drenaje, zanjas de coronación, disipadores, box culverts revestidos y no revestidos realizando la corrección de pendiente, limpieza y disposición final de los materiales. Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante.

Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura máxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado, Consistió en la limpieza de todo el guarda fuego del cerramiento tanto interno como externo removiendo la capa vegetal de la capa natural, dejando el corte a ras; esta operación se realizó por medios manuales o mecánicos de acuerdo al terreno, incluyendo la limpieza del cerramiento a una altura de 2.5 metros, corte de las ramas de los árboles que se encontraban dentro del cerramiento o de cualquier maleza que estaba enredada en el cerramiento y el corte de las ramos de los árboles de predios vecinos que sobre pasaban el cerramiento; todo esto incluye el tendido del alambre púa que se encuentra por encima del cerramiento.

Aplicación de matamalezas (combatran, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes, Al momento de realizar la fumigación se garantizó que no hubiera contaminación de las fuentes de aguas superficiales que drenen en la zona, las fumigaciones se realizaron en el momento que no se presentó ninguna clase de lluvia, el método de aplicación fue el denominado mochila el cual consistió en un recipiente o tanque con bombeo manual, para lo cual se fumigo todo el aérea que estaba estipulado en la frecuencia.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
2	LOTE 2 AEROPUERTO EL RIO DE AMALFI-ANTIOQUIA							
	1	x		Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	68,00	$ 609.000,00	41.412.000,00
	2	x		Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	Ml	7.308,00	$ 6.100,00	44.578.800,00
	3	x		Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	Ml	5.200,00	$ 4.430,00	23.036.000,00
	4	x		Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	30,00	$ 233.256,00	6.997.680,00
Subtotal								$ 116.024.480,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 116.024.480,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 874.788,00
VALOR TOTAL	$ 116.899.268,00

}

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

De acuerdo al contrato de obra No. 24000696 H4 02 DE 2024, se realizaron las siguientes actividades y cantidades de obra durante el periodo comprendido del 15 de julio de 2024 y el 02 de agosto de 2024; donde se adelantó el desarrollo de la primera frecuencia del contrato, dando cumplimiento a cada uno de los ítems programados para tal fin:

43200C1285 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE AMALFI, OTU Y PUERTO BERRIO								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
2	LOTE 2 AEROPUERTO EL RIO DE AMALFI-ANTIOQUIA							
	1	x		Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	17,00	$ 609.000,00	10.353.000,00
	2	x		Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	Ml	3.404,00	$ 6.100,00	20.764.400,00
	3	x		Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	Ml	2.450,00	$ 4.430,00	10.853.500,00
	4	x		Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	7,50	$ 233.256,00	1.749.420,00
Subtotal								$ 43.720.320,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 43.720.320,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 329.637,33
VALOR TOTAL	$ 44.049.957,33

}

REGISTRO FOTOGRAFICO

AEROPUERTO DE AMALFI	
ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO	
	
	
	

}



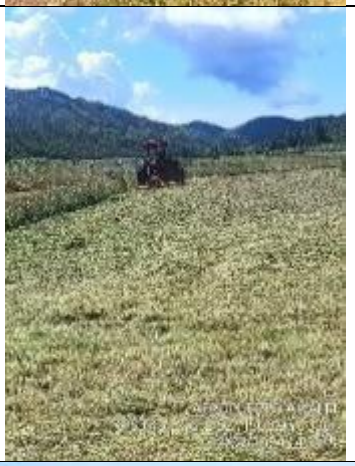
}

Dirección: carrera 77 bis # 69 a – 80 apto 402
Correo: camusingenieriasas@gmail.com
Celular: 3143222706

}



AEROPUERTO AMAL
6°53'40", -75°2'53", 491.2m,
17/07/2024 11:37

AEROPUERTO AMAL

}












AEROPUERTO AMALTI

}

}

LIMPIEZA DE CANALES	
	
	
	

}

}

}

LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO	
	
	
	

}

}

FUMIGACION


TRANSPORTE	
	
	

}

Atentamente,

Nombre del Contratista: CONSORCIO CAMUS Y COMPAÑIA
Representante legal: MONICA ROJAS FLOREZ
C. C. No.1.022.413.783 DE BOGOTÁ
Correo electrónico: camusingenieriasas@gmail.com
Teléfono: 3143222706

}
