| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 14/01/2024
(Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA SEMANA No.: 6 del 8/01/2024 al 14/01/2024 Último Informe S
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SONADORA, MUNICIPIO DE GUATAPE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJO MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS: 28,6 UN
ROCERIA:0,24 HA
PLACA HUELLA:128 ML

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Tipo de obra: construcción de una placa huella
Dimensiones: la placa huella tendrá como longitud 160 ml , un ancho de la vía de 4,1m -5m , así como un espesor de : 15cm, contara con cunetas y bordillos vaciados en situ con un concreto de 21 Mpa, dicho concreto también se preparará en obra
Material utilizado: Base granular invias 2013, cemento Holcim
Concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos
Subbase Granular Clase C
Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)
Equipamiento y maquinaria utilizada: Vibrador, concretadora

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA, MUNICIPIO DE GUATAPE

CONVENIO No. 3229 - 2023 VALOR INICIAL: $ 200.838.037,00
FECHA DE INICIO: 4/12/2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200.838.037,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 4567 - 2023 VALOR INICIAL: $
FECHA DE INICIO: 5/12/2023 VALOR ADICIONES: $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5/03/2024 VALOR ANTICIPO: N/
VALOR AMORTIZADO: N/
SALDO POR AMORTIZAR: N/

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 200.838.037 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 200.838.037 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 101.756.308 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO DE VIGENCIA** | $ 101.756.308 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ | 199.838.037,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ | - |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ | - |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | - |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ | - |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | - |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | - |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ | - |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ | - |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | - |

Observaciones: LOS VALORES ANTERIORES SE CALCULARON SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | - |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | - |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | placa huella | ml | 160 |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| concretadora | | |
| vibrador | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA SONADORA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN:

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| PERMISO MINERO: | SI | | NO | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |

UBICACIÓN:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

FINCA 32 VEREDA LA SONADORA

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA PORQUE A LA FECHA EL CONTRATISTA NO CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA INICIAR Y POR DEMORAS EN EL TRAMITE BANCARIO, ESTA PENDIENTE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ADELANTAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES LOS MÁS PRONTO POSIBLE

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física program

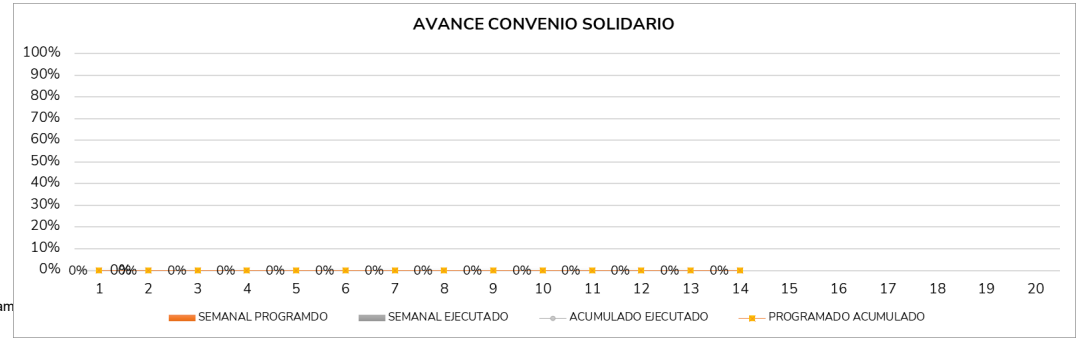


## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

supervisión continua de las actividades ejecutadas en el cumplimiento de las especificaciones técnicas
revisión de las cantidades de obra
revisión del cumplimiento de las obligaciones del personal que se encuentra ejecutando la obra
revisión de la señalización y del uso de los implementos de seguridad
Revisión de las PQR por parte de la comunidad
atención de cualquier solicitud que requiera el contratista
Seguimiento a la programación para el cumplimiento del plazo contractual
Revisar el cumplimiento del manejo de residuos solidos
hacer los ensayos requeridos para garantizar la calidad de los trabajos realizados

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ANA MARIA MARQUEZ RESTREPO

Matrícula Profesional No.: 05202-108779 ant

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semanal SI ☐

)RAMIENTO Y

101.756.308,00

-

101.756.308,00

/A

/A

/A

