	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA SEMANA No.: 8 del 22/01/2024 al 28/01/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAUDALITO, MUNICIPIO DE EL SANTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA ALCANTARILLAS: 8 UN
ROCERIA:0,56 HA
PLACA HUELLA:71 ML
MURO EN GAVION: 1 UN

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Tipo de obra: construcción de una placa huella
Dimensiones: la placa huella tendrá como longitud 90 ml , un ancho de la vía de 4,1m -5m , así como un espesor de : 15cm, contara con cunetas y bordillos vaciados en situ con un concreto de 21 Mpa, dicho concreto también se preparará en obra, rehabilitacion de obras transversales existentes con longitud de 100 ml.
Material utilizado: SUBBASE GRANULAR TIPO C
Concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos y concreto ciclopeo de 14MPA
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos
Subbase Granular Clase C
Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)
Equipamiento y maquinaria utilizada: Vibrador, concretadora

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO, MUNICIPIO DEL SANTUARIO		
CONVENIO No.	3346 - 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.115.110,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.115.110,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUMAR S.A.S		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4567 - 2023	VALOR INICIAL:	$ 101.756.308,00
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 101.756.308,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/03/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.115.110			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.115.110			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 101.756.308			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			

SALDO DE VIGENCIA	$ 101.756.308			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.115.110,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: LOS VALORES ANTERIORES SE CALCULARON SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
*	placa huella	ml	90
*	Obras transversales	ml	100
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
concretadora		
vibrador		
herramienta menor		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA GUAUDALITO, MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

		DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI		NO	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

FINCA 32 VEREDA LA SONADORA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA PORQUE A LA FECHA EL CONTRATISTA NO CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA INICIAR Y POR DEMORAS EN EL TRAMITE BANCARIO Y ESTAN PENDIENTES LAS PÓLIZAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ADELANTAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES LOS MÁS PRONTO POSIBLE

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física program

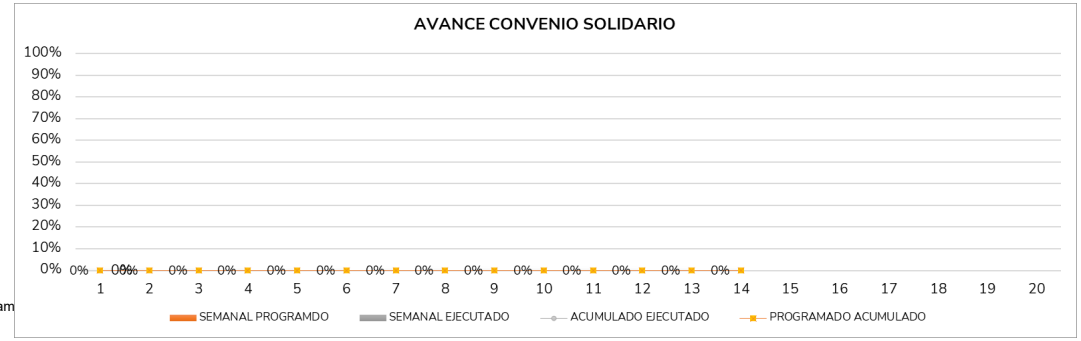

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

supervisión continua de las actividades ejecutadas en el cumplimiento de las especificaciones técnicas
revisión de las cantidades de obra
revisión del cumplimiento de las obligaciones del personal que se encuentra ejecutando la obra
revisión de la señalización y del uso de los implementos de seguridad
Revisión de las PQR por parte de la comunidad
atención de cualquier solicitud que requiera el contratista
Seguimiento a la programación para el cumplimiento del plazo contractual
Revisar el cumplimiento del manejo de residuos solidos
hacer los ensayos requeridos para garantizar la calidad de los trabajos realizados

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ANA MARIA MARQUEZ RESTREPO

Matrícula Profesional No.: 05202-108779 ant

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
