BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO**

**FECHA:** 08/08/24 **VIRTUAL** _____ **PRESENCIAL** ____X____ **LUGAR** KR 65 POR CALLE 67A SUR – CIV 6000485

**OBJETO DE LA REUNIÓN:**

Revisión propuesta de conexión red pluvial nueva a existente en el CIV 6000485

**HORA DE INICIO:** 11:20 am **HORA DE FINALIZACIÓN:**

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMBR | CONTRATISTA | | | | |
| Angie Nathaly Pedraza O. | | | | | | | | | X | Interventoría | administracion@pry.com.co | 3212376607 | |
| Luis Fernando Alarcón | | | | | | | | | X | Interventoría | | 3106803574 | |
| Edilberto Ramirez | | | | | | | | | X | CONSORCIO TAURI 2 | | 3168520985 | |
| Samuel Hernández F | | | V | | | | | | | EAAB-ESP. ALC. 74 | shernandez@aguasbogota.com.co | | |
| Edwin Rodríguez Gutierrez | | | . | | | | | | X | consorcio tauri 2 | coordinacion.tauri2@gmail.com | 3232333012 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.




Powered by CamScanner

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Se realiza recorrido de Obra en conjunto: Por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB - Zona 4, los Ingenieros Samuel Hernandez y Yessica Granados; por la Interventoría, los ingenieros Luis Fernando Alarcon y Angié Nathaly Pedraza y por el contratista el Ingeniero Edwin Rodriguez.
Se revisa propuesta de conexión de la red pluvial nueva a la existente en el CIV 6000485 la cual se realiza con base a visitas anteriores.

PROPUESTA CONEXIÓN RED PLUVIAL

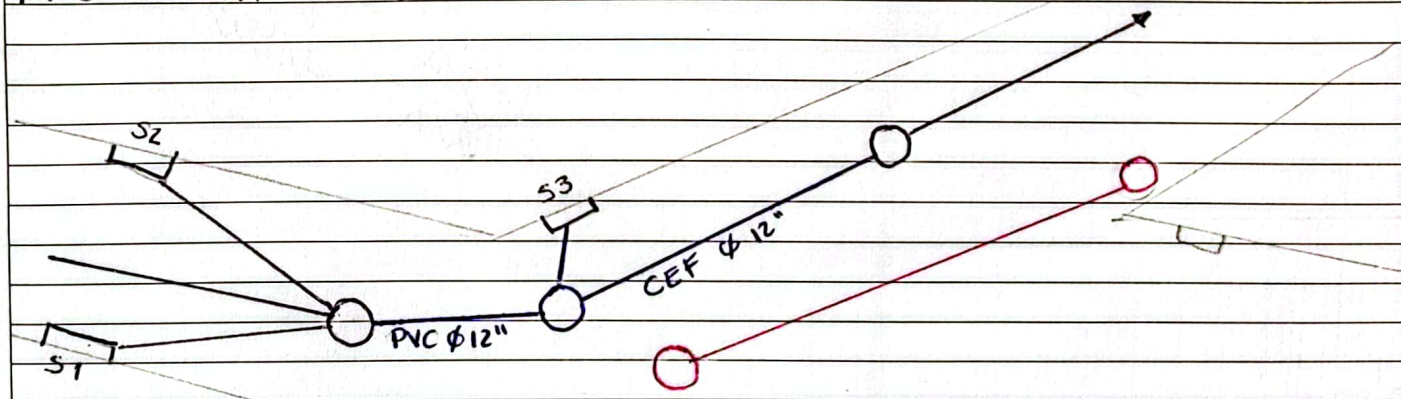


O- Red sanitaria existente
O→ Red pluvial existente
-O Red pluvial construida en COP FDLT-316-2023
⊓ Sumideros
O- Propuesta conexión red pluvial

Para verificación de cotas, se adjunta al presente la propuesta impresa, la cual fue remitida para validación el pasado 01 de agosto de 2024 vía correo electrónico.

Al respecto, el Ing. Samuel Hernandez manifiesta que teniendo en cuenta las condiciones del terreno y las cotas tan superficiales en las que se encuentra construida la red pluvial existente, la



Powered by CamScanner


**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**


propuesta presentada por el contratista en acompañamiento de la interventoría, es viable para su construcción. De igual manera se recomienda por parte de la división de alcantarillado que se mange el desnivel de entrega y salida de los caudales en el proceso constructivo de la cañuela, tratando de dar un mejor manejo a la sedimentación normal de estos sistemas.

JUAN C. EAAB-ESP.



Powered by CamScanner

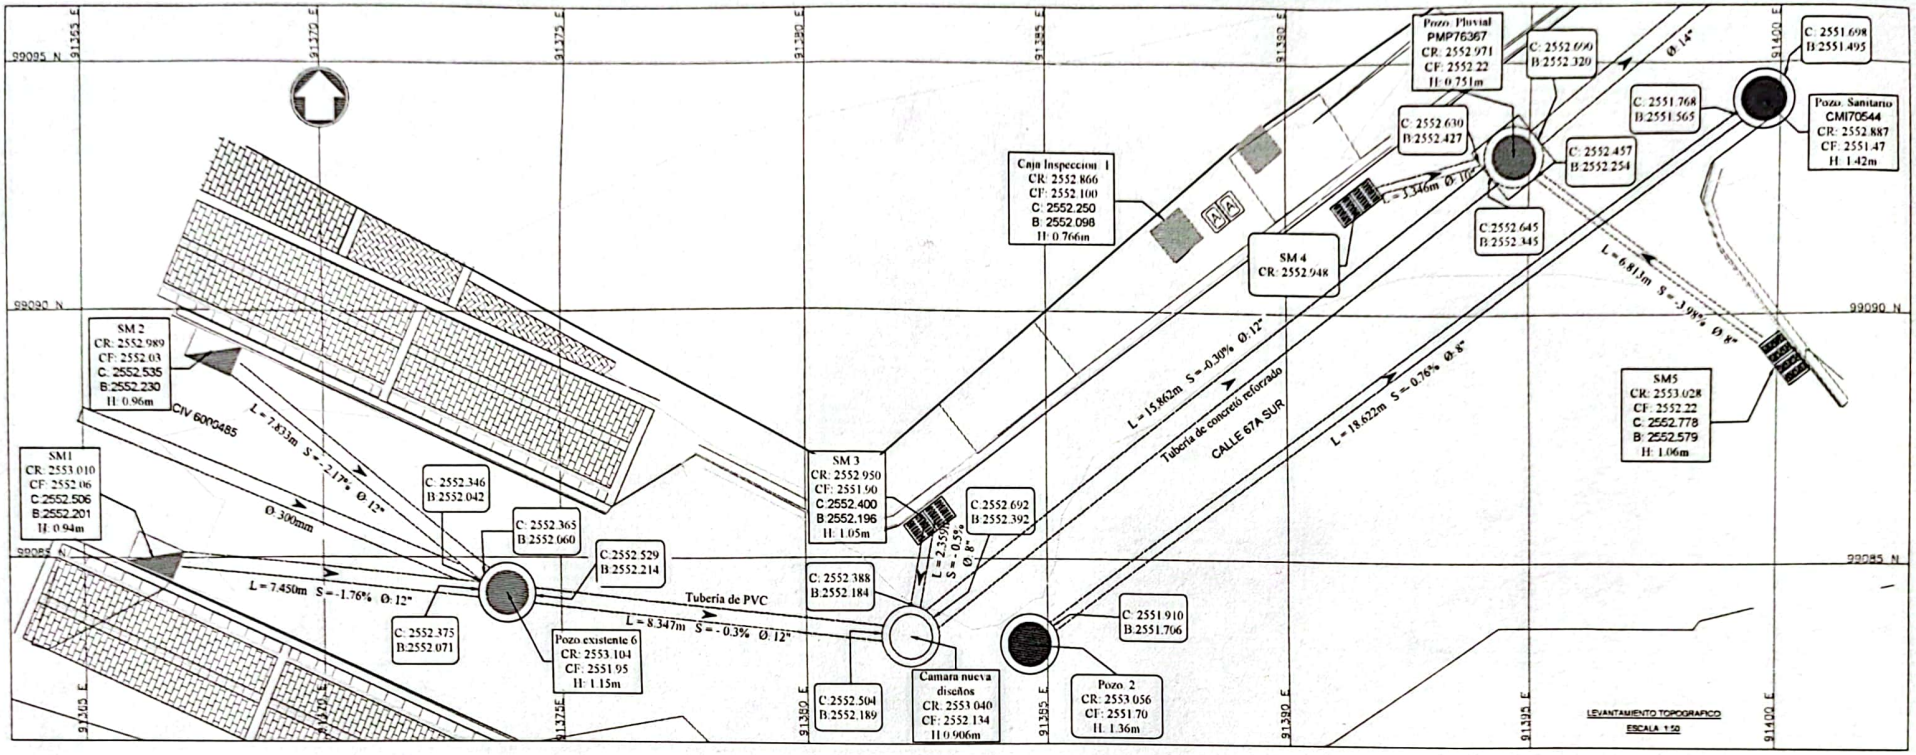

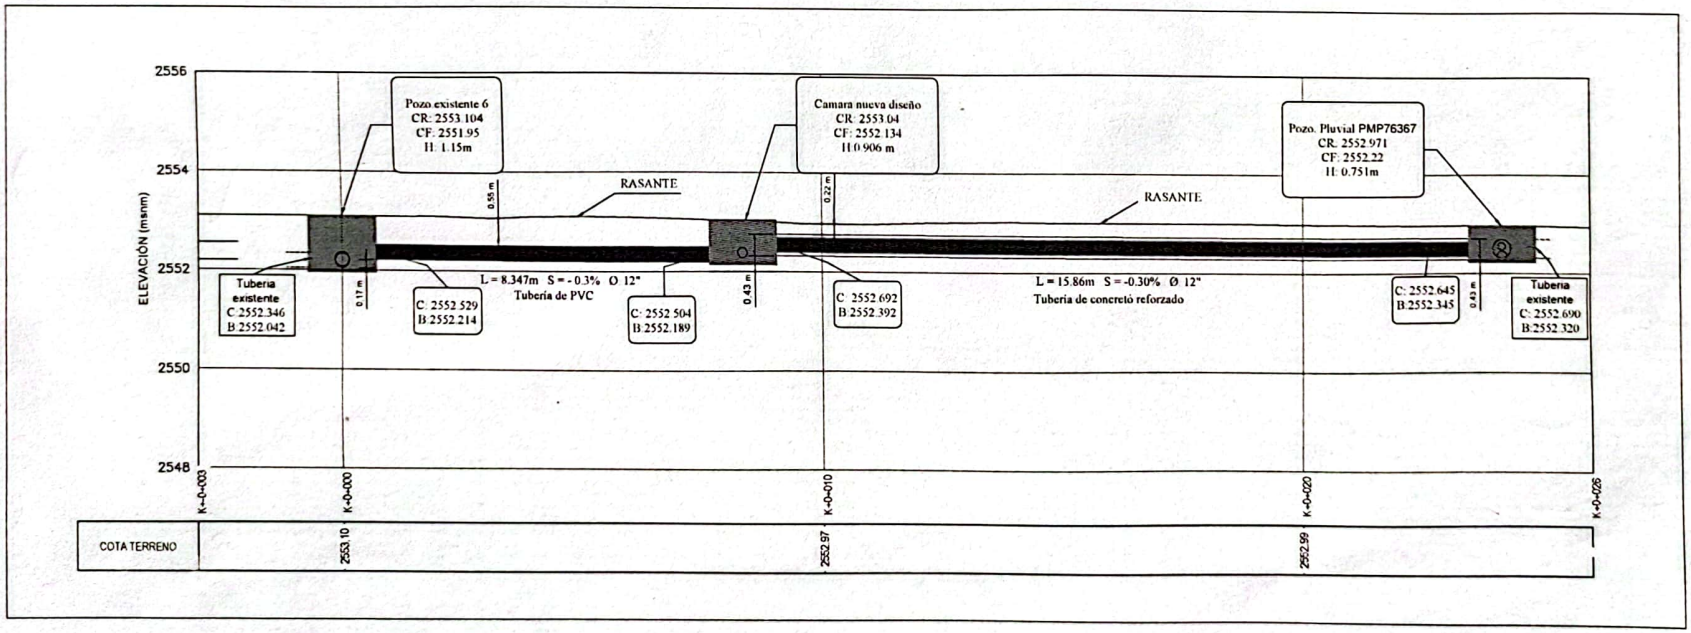
NOTAS:
1-Coordenadas con norte falso
2-Intervalo de curvas de nivel 0.70 m

PERFIL INSPECCIÓN DE POZOS

ESCALA GRÁFICA: 0 1 2 3 4 5 m

Powered by CamScanner
