CONTRATO 10-6-30025-24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24 CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE:
POLICÍA METROPOLITANA

CONTRATISTA:
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA S.A.S

BOGOTÁ - D.C
OCTUBRE DE 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES DE SEPTIEMBRE	
	
Foto 1. Estación de Policía Chapinero Cra 2 # 55-4	**Foto 2. Baños de comando operativo divisiones en vinilo área entregadas para su uso**
	
Foto 3. Segundo bloque demolición de placas fisuradas sin refuerzo de acero.	**Foto 4 fundición de placas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo malla electrosoldada.**

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com
prosoi.sas@gmail.com

	
Foto 5. Trasiego de materiales para áreas de segundo nivel	**Foto 6 trasiego interno de material.**
	
Foto 7. Replanteo de tablón de gres e instalación	**Foto 8 fundición de vigas de cimentación concreto armado.**



Foto 9. Emergencia baño áreas comunes baños segunda terraza



Foto 10. Instalación de puertas en RH con chapas en sala de monitoreo segunda terraza.



Foto 11. Instalacion de gravilla lavada para acabados de tablon de gres segunda terraza.



Foto 12. Lavado de gravilla en diferentes áreas de la Estación de Policía Chapinero.

	
Foto 13. Instalación de luminarias en área de sala de monitoreo.	**Foto 14. Instalación de lámparas de sobreponer con marco y tubería emt.**
	
Foto 15. Instalación de red eléctricas y luminarias	**Foto 16 inspecciones realizadas por sst.**

	
Foto 17 identificación y cambio de piezas de ladrillo para instalación de fachaleta.	**Foto 18 limpieza de áreas de trabajo después dela jornada laboral.**
	
Foto 19 instalación de señalización para áreas de trabajo.	**Foto 20 desmonte de cambio de manto asfaltico en foil de aluminio y pintura dituminosa.**

	
Foto 21. Retiro de tablón de gres antiguo	**Foto 22. Tablón de gres antiguo.**
	
Foto 23 Re emboquillado de muros de ladrillo a la vista con mortero 1-3.	**Foto 24. Murtos limpios y emboquillados con mortero, señalización de área de trabajo y piso con mortero de nivelación listo para la instalación de tablón de gres.**

	
Foto 25. Escarificado de placas.	**Foto 26. Aplicación de pintura bituminosa en aluminio sobre mantos asfalticos.**
	
Foto 27. Resanes de grietas para áreas con fisuras.	**Foto 28. Pintura de barandas anticorrosivo y pintura**

	
Foto 29: aplicación de pintura en esmalte metro lineal.	**Foto 30. Pintura en lamina llena m2.**
	
Foto 31 Instalación de pintura de alta asepsia en oficinas	**Foto 32 instalación de guarda escobas.**
	
Foto 33 instalación de puertas de aluminio y vidrio más película de sandblasting.	**Foto 34 pintura bajo placas.**

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA
PROSOI
Más allá de la ingeniería

	
Foto 35 aseo general permanente de tablón de gres.	**Foto 36 desmonte de cielo rasos.**
	
Foto 37 greteado de barandas	**Foto 38 instalación de muros en superboart.**
	
Foto 39 ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO. CRA 13 # 39-86.	**Foto 40 retiro de escombros.**





Cra.11 No.138-48
Edificio Torreladera
Móvil **321 639 31**
Bogotá, D. C., Colo
prosoi.com
prosoi.sas@gma

Foto 41 retiro de puestas y divisiones de orinales de casino de sub oficiales.	**Foto 42 registros hidráulicos en mal estado.**
	
Foto 43 fundición de tubería sanitaria en concreto en placa de entrepiso	**Foto 44 ajuste de bajantes para prevenir posibles humedades**
	
Foto 45 fundición de pisos impermeabilizados de 5cm en diferentes áreas (casino de sub oficiales)	**Foto 46 desmonte de piso y canaletas para área de rack**
	

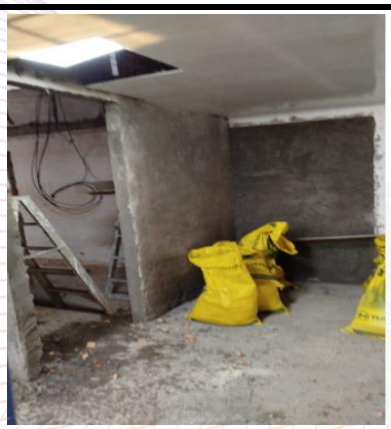

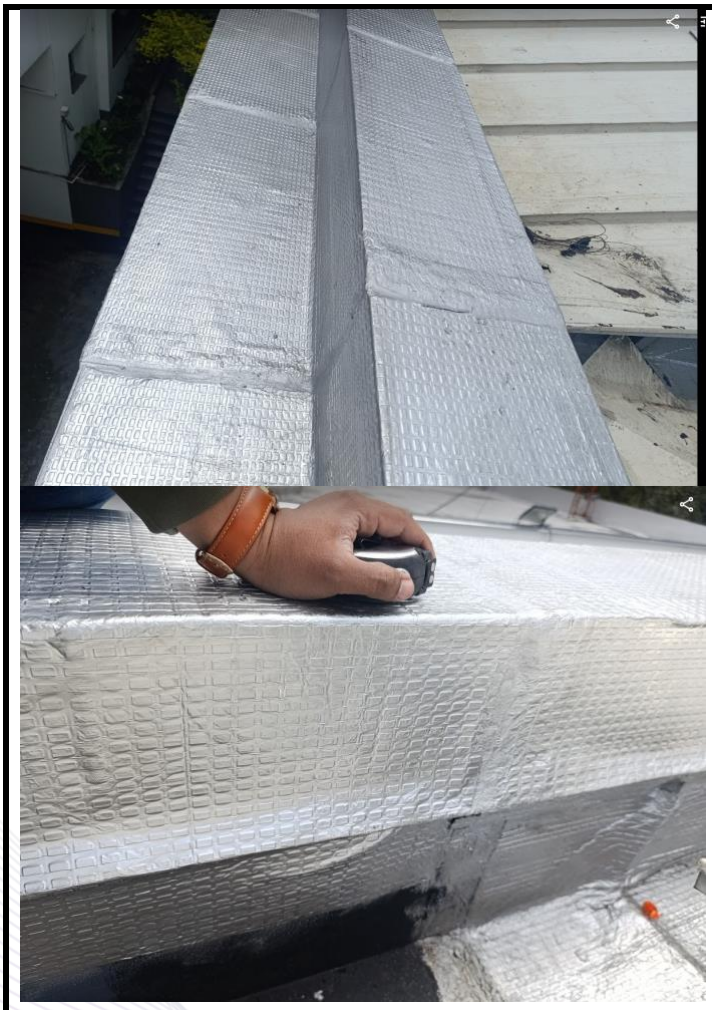
Foto 47 retiro de tubería sanitaria antiguos baños áreas de alojamiento segundo piso	Foto 48 demolición de enchapes
	
Foto 49 áreas de trabajo libres de escombros aseo permanente en las obras.	Foto 50 áreas de bajos pañetadas después del retiro del cerámico y del escarificado del muro
	
Foto 51 pañetes de muros de baños de segundo piso	Foto 52 cerrado de vano de puerta antigua de baño muro doble
	

Foto 53 desmonte de cielo razo	**Foto 54 trasiego de material a diferentes puntos de la obra.**
	
Foto 55 fundición de columnas y de vigas en área de segundo nivel de alojamientos de patrulleros"	**Foto 56 distribución de red hidráulica**



	
Foto 57 desmonte e instalación de manto en foil de aluminio y pintura bituminosa	**Foto 58 Mantenimiento retiro de vidrio, gratado de ventana, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura y manija en bronce**

DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ
Residente de Obra
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA
