Código: ZBS-FR-0074 Fecha: 14-05-2021 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:	10-6-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

UNIDAD:	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	Valor total del Contrato:	$ 2.350.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	BG. JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO	Valor inicial del Contrato:	$ 2.000.000.000,00
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:		Fecha de Inicio Contrato:	10/08/2024
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y SOLUCION EN INGENIERIA - PROSOI S.A.S	Valor Adición No. 1:	$ 350.000.000,00
		Valor Adición No. 2:	
SUPERVISOR TÉCNICO:	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA	Valor total presente formato:	$ 15.304.877,48
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:		Fecha presente formato:	07/10/2024
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA	Corte de mantenimiento:	1
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING. ALVARO RANGEL	Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	Octubre de 2024

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA XIV MÁRTIRES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	E14-02
NECESIDAD:	Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estación de Policía XIV Mártires
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Estación de Policía XIV Mártires
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A1

N.°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.19.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	50,00	63,14	$ 17.476,00	$ 1.103.434,64	
	A1-1.31.	Desmonte de tanques elevados de agua	UND	0,00	4,00	$ 39.946,00	$ 159.784,00	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A1-2.01.	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	272,87	324,93	$ 14.612,00	$ 4.747.877,16	
	A1-2.33.	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	50,00	20,14	$ 70.173,00	$ 1.413.284,22	
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA							
	A1-11.16.	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en aluminio. Incluye impermeabilización.	ML	0,00	12,41	$ 60.750,00	$ 753.907,50	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	272,87	160,00	$ 6.867,00	$ 1.098.720,00	
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	2,00	2,00	$ 73.924,00	$ 147.848,00	
18	OTROS							
	18.21.	Desmonte de tuberia de 2" en diferente material colgada y/o suspendida.	ML	0,00	60,00	$ 11.818,00	$ 709.080,00	
	18.142.	Mantenimiento, limpieza y ajustes menores de canales de diferente tipologia para alturas mayores a 3,0 metros hasta 10 metros	ML	97,00	71,14	$ 16.837,00	$ 1.197.784,18	

Código: ZBS-FR-0074 Fecha: 14-05-2021 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:		10-6-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.					
	18.143.	Mantenimiento, sondeo de puntos de aguas residuales y puntos de agua lluvia, incluye horizontales y verticales de diferente diámetro y disposición final de residuos	UND	5,00	15,00	$ 45.121,00	$	676.815,00

SUBTOTAL	$	12.008.534,70
TOTAL COSTO DIRECTO	$	12.008.534,70
ADMINISTRACIÓN 21%	$	2.521.792,29
IMPREVISTOS 0,5%	$	60.042,67
UTILIDAD 5%	$	600.426,74
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	$	114.081,08
TOTAL COSTO INDIRECTO	$	3.296.342,78
COSTO TOTAL	$	15.304.877,48
SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR		
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR		

Elaboró:
ING. ALVARO RODRIGUEZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ARQ. JEISON RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
ING. ALVARO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Verificación Técnica:
ST. YINA MILDRED ZAMBRANO
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAICES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI____ NO____ Número de Comité_____ Fecha de Comité_____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:

COMANDANTE O JEFE DE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO*
(Esta firma solo aplica para trámites de necesidades de la unidad sin delegación del gasto)

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires	NECESIDAD:	E14-02 / Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta						
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES					REF.	CONTRACTUAL		
A1-1.19.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
RETIRO DE MANTO EXISTENTE TANQUES CENTRO DE CAPACITACION	20,14	3,80	5,30	1,00	20,14				-	20,14	
TANQUE SUBTERRANEO									-	-	
MUROS LATERALES	5,75	5,00	1,15	2,00	11,50				-	11,50	
MUROS LATERALES CORTOS	4,60	4,00	1,15	2,00	9,20				-	9,20	
PISO TANQUE SUBTERRANEO	20,00	5,00	4,00	1,00	20,00	0,60	0,60	1,00	0,36	19,64	
COLUMNA CENTRAL	0,66	0,60	1,11	4,00	2,66				-	2,66	
			TOTAL							63,14	



Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S					FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO					CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires				NECESIDAD:	E14-02 / Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta					
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES								REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.31.	Desmonte de tanques elevados de agua					UNIDAD	UND		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
TANQUES ELEVADOS CENTRO DE CAPACITACION	-			4,00	4,00				-	4,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										4,00	

Observaciones:

Contratista

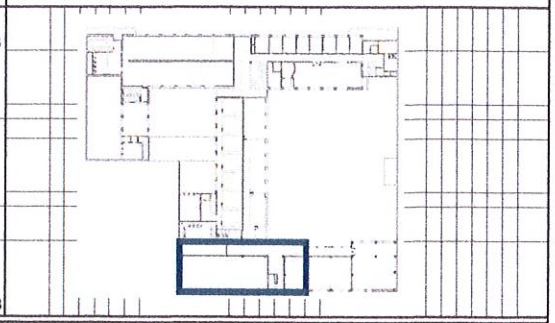
ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S				FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO				CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires			NECESIDAD:	E14-02 / Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							REF.	CONTRACTUAL	
A1-2.01.	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento				UNIDAD	M2		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
AREA DE CUBIERTA CENTRO DE CAPAITACION ENTRE LINDERO DE PREDIO HASTA CUARTA COLUMNA	324,93	28,75	11,30	1,00	324,93				-	324,93	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										324,93	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S				FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO				CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires			NECESIDAD:	E14-02 / Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS								REF.	CONTRACTUAL	
A1-2.33.	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm				UNIDAD	M2			REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MANTO AUTOPROTEGIDO EN FOIL ALUMINIO AREA DE TANQUES ELEVADOS CENTRO DE CAPACITACION	20,14	3,80	5,30	1,00	20,14				-	20,14	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										20,14	

Observaciones:

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires	NECESIDAD:		E14-02 / Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA						REF.	CONTRACTUAL		
A1-11.16.	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.			UNIDAD	ML		REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
LATERALES PERIMETRO IMPERMEABILIZACION AREA DE TANQUES	-		3,80	2,00	7,60				-	7,60	
FRONTAL PERIMETRO IMPERMEABILIZACION AREA DE TANQUES	-		4,81	1,00	4,81				-	4,81	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										12,41	

Observaciones:

Contratista

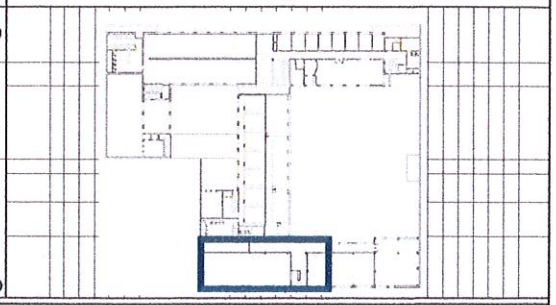
ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST.YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires		NECESIDAD:	**E14-02** / Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta						
CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS						REF.		CONTRACTUAL	
A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento			UNIDAD	M2		REF.		HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
AREA DE CUBIERTA CENTRO DE CAPAITACION ENTRE LINDERO DE PREDIO HASTA CUARTA COLUMNA	324,93	28,75	11,30	0,49	160,00				-	160,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										160,00	

Observaciones:

Contratista

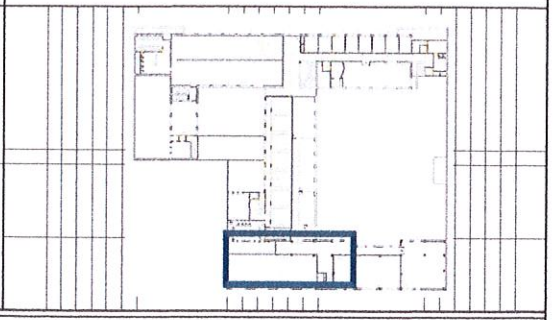
ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S					FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO					CONTRATO OBRA No.			10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA											
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires			NECESIDAD:		**E14-02** / Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta						
CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS								REF.	CONTRACTUAL		
A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales					UNIDAD	M3		REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
RCD GENERADO CON LIMPIEZA DE CANALES, RETIRO DE MANTO ASEO GENERAL DE CUBIERTA CENTRO DE CAPACITACION EN AREA RECORRIDA	2,00	0,03	71,14	1,00	2,00				-	2,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										2,00	

Observaciones:

Contratista

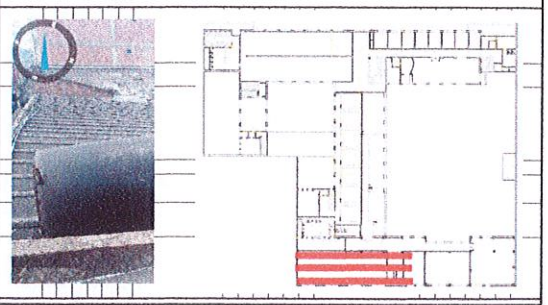
ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires	NECESIDAD:	E14-02 / Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta					
CAPITULO	OTROS					REF.	CONTRACTUAL	
18.21.	Desmonte de tubería de 2" en diferente material colgada y/o suspendida.			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CUBIERTA CENTRO DE CAPACITACION	-		20,00	3,00	60,00				-	60,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										60,00	

Observaciones:

Contratista

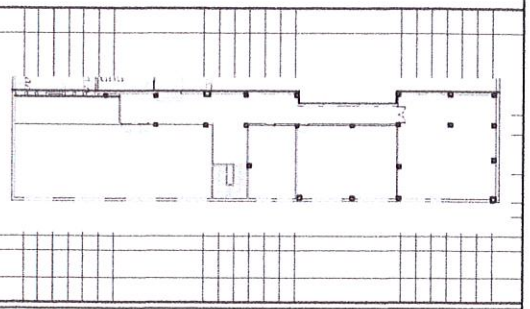
ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S					FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO					CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires			NECESIDAD:		E14-02 / Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta					
CAPITULO	OTROS								REF.	CONTRACTUAL	
18.142.	Mantenimiento, limpieza y ajustes menores de canales de diferente tipología para alturas mayores a 3,0 metros hasta 10 metros					UNIDAD	ML		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CANAL PERIMETRAL COSTADO INTERIOR EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION	-		40,55	1,00	40,55				-	40,55	
CANAL PERMIETRAL AREA CENTRAL CENTRO DE CAPACITACION	-		20,00	1,00	20,00				-	20,00	
CANAL INTERNA CUBIERTA DE POLIGONO	-		10,59	1,00	10,59				-	10,59	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-					-	
TOTAL										71,14	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

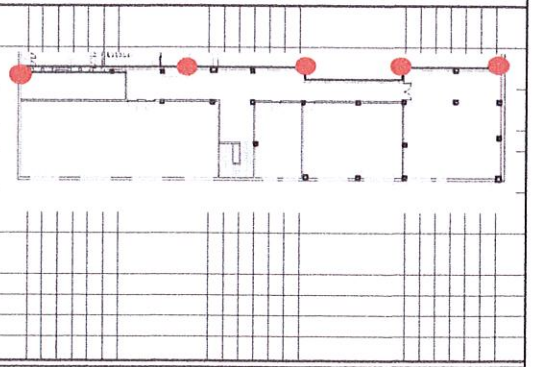
Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires		NECESIDAD:	E14-02 / Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones de cubierta					
CAPITULO	OTROS					REF.	CONTRACTUAL		
18.143.	Mantenimiento, sondeo de puntos de aguas residuales y puntos de agua lluvia, incluye horizontales y verticales de diferente diámetro y disposición final de residuos			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ORINAL BAÑO SUBOFICIALES HOMBRES				2,00	2,00					2,00	
ORINAL BAÑO AUXILIARES				4,00	4,00					4,00	
SANITARIO Y LAVAMANOS ARMERILLO				2,00	2,00					2,00	
SANITARIO BAÑOS PELUQUERIA				1,00	1,00					1,00	
SANITARIO ALOJAMIENTO SUBOFICIAL				1,00	1,00					1,00	
BAJANTES CANAL PERIMETRAL INTERNA CENTRO DE CAPACITACION				2,00	2,00					2,00	
BAJANTES CANAL INTERNA POLIGONO				1,00	1,00					1,00	
BAJANTES CANAL PERIMETRAL ALA CENTRAL ESTACION				2,00	2,00					2,00	
TOTAL										15,00	



Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST.YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
