INFORME MENSUAL MAYO

CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 4897 DE 2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

SEGUIMIENTO A LOS COVENIOS: 4464 del 2023, 4726 del 2023, 4679 del 2023.

MAYO DE 2024

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS.

VERSION N°	MES	DESCIPCION CAMBIO
01	MAYO 2024	Versión inicial

INFORME MENSUAL MAYO	CONTRATO N°4897 de 2023	01 de Mayo de 2024 a 31 de Mayo de 2024
INFORME RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

Distribución de copias:

N° Copia	Destinario de la copia
1	INVIAS – TERRITORIAL CAUCA

ELABORO (Componente convenios)	AJUSTÓ, APROBÓ	REVISO, APROBÓ
Ing. Vivian Andrea Galindo M.P. 1920230118 6 CAUCA Residente de Interventoría	Ing. Juan Carlos Sanabria M.P. 2522237430CND Director de Interventoría	Ing. JORGE MEDINA IDROBO Supervisor Territorial Cauca

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4464 de 2023,4726 de 2023,4769 de 2023 **Contratista:** JAC GUACAS/JAC AGUA BONITA/JAS ESTRELLA

Contrato de Interventoría No. 4897 DE 2023 **Interventoría:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		11,45, 78
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		11,45, 79
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		14, 46, 80
2.4	Características técnicas del proyecto		15, 47, 81
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		17, 49, 83
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		18, 50, 83
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		21, 53, 87
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		21,53, 87
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22-31, 55-64, 88-97
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	32, 65, 98
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	33,66, 99
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	35,68, 101
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	35,68, 101
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	36,69, 102
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	37, 70, 103
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	39, 73, 106
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	41, 75, 108
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	-
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	-
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	NA
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Anexo
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		110
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		111
5.3	Informes especialistas y profesionales		111
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		111
5.5	Informe matriz de riesgos.		111
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		111
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	112
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	112
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	114
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	114
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	116
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	116
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	116
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	116
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	116
7	**Conclusiones y recomendaciones**		117
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		122
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Anexo
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		-
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Anexo

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 10 **de fecha** 4 de marzo de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

INTRODUCCIÓN 8
1. CONVENIO SOLIDARIO N° 4464 DE 2023 10
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 10
1.2. LOCALIZACIÓN. 11
1.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA. 12
1.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: 13
1.5. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO. 15
1.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 16
1.5.2. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS. 19
1.5.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. 19
1.6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA. 19
1.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO. 19
1.6.2. INFORME SEMANAL 20
..... 21
1.6.3. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 30
1.6.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 31
1.6.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL. 33
1.6.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 33
1.6.7. ENSAYOS DE LABORATORIO 34
1.6.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 35
1.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 37
2. CONVENIO SOLIDARIO N° 4679 DE 2023 42
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 42
2.2. LOCALIZACIÓN 43
2.4. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 44
2.5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: 45
2.6. INFORMACION DEL CONVENIO 47
2.6.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 47
2.6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 48
2.6.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 51

2.6.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 51
2.7. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 51
2.7.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 51
2.7.2. INFORME SEMANAL.....53
2.7.3. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 63
2.7.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.....64
2.7.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL. 66
2.7.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 66
2.7.7. ENSAYOS DE LABORATORIO 67
2.7.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 68
2.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 71
3. CONVENIO 4726 DE 2023-AGUA BONITA.....76
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 76
3.2. LOCALIZACIÓN 77
3.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 78
3.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: 79
3.5. INFORMACION DEL CONVENIO 81
3.5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO.....81
3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 81
3.5.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS. 85
3.5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 85
3.6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 85
3.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 85
3.6.2. INFORME SEMANAL.....86
3.6.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 96
3.6.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.....97
3.6.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL. 99
3.6.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 99
3.6.7. ENSAYOS DE LABORATORIO 100
3.6.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 101
3.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 104
4.INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA. 108

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 108
4.2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTOR 109
4.3. INFORMES DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES. 109
4.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC. 109
4.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS. 109
4.6. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. 110
4.7. SEGUIMIENTO ESTADO TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SIG. 110
5.REPORTES EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA 110
5.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO INTERVENTORÍA 110
5.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 110
5.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA 112
5.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 112
5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 114
5.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 114
5.6.1. Seguimiento a la Inversión anticipo. 114
5.6.2. Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado. 114
5.6.3.Seguimiento plan de cargas. 114
6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 115
7.ANEXOS. 115
7.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. 115
7.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE OBRAS. 120
7.3. COPIA BITÁCORAS DE OBRA MES DE MAYO. 120

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación de Tramos que se intervienen 108
Tabla 2. Relación de correspondencia Vereda Guacas 116
Tabla 3. Relación correspondencia Vereda Estrella 117
Tabla 4. Relación correspondencia vereda Agua Bonita 119

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.Localización del Municipio de Morales en el Departamento del Cauca 11
Figura 2. Localización tramo a intervenir vereda Guacas 12
Figura 3- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas a corte 31 de Mayo de 2024 18
Figura 4. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 31 de Mayo de 2024. 18
Figura 5. Localización Municipio de Morales.....43
Figura 6.Localización de tramo a intervenir-Vereda Estrella 44
Figura 7- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas del 01 al 31 de Mayo de 2024 50
Figura 8. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 31 de Mayo de 2024 50
Figura 9.Localización del Municipio de Morales.....77
Figura 10.Localización del tramo a intervenir 78
Figura 11- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas del 01 al 31 de Mayo de 2024 84
Figura 12. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 31 de Mayo de 2024-Agua Bonita.....84

INTRODUCCIÓN

El contrato de interventoría número 4897 de 2023 "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales de las veredas: Guacas, La Estrella y Agua Bonita del Municipio de Morales Cauca, cuyos objetos buscan "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"; para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar el contrato de interventoría número 4897 de 2023 que realizará las labores de interventoría.

En el presente informe se relacionan las labores de seguimiento, control y verificación llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024, durante la ejecución del convenio 4679,4464 y 4726 de 2023, celebrado por la Junta de acción comunal de la Vereda la Estrella, las Guacas y Agua Bonita, respectivamente. Es importante resaltar que el seguimiento se ha venido realizando de forma frecuente, y se ha brindado total acompañamiento a la OAC durante el desarrollo del proyecto, a través de reuniones y recorridos a obra.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

VEREDA LAS GUACAS



Imagen: Socialización Vereda Las Guacas Municipio de Morales Cauca

CONVENIO SOLIDARIO N° 4464 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

1. CONVENIO SOLIDARIO N° 4464 DE 2023

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

En el convenio solidario número 4464 de 2023, "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** El instituto Nacional de Vías requiere materializar alianzas con actores estratégicos del nivel local, que cooperen desde diversas aristas en el marco de la ejecución de proyectos potenciales de infraestructura a cargo del INVIAS, con el propósito de generar desarrollo en las regiones, conectividad y competitividad, para lo cual se requiere el concurso de diversos actores como es el caso de los organismos de acción comunal. Que durante las últimas décadas gran parte de los recursos de inversión en infraestructura vial de los países en desarrollo en general, y de Colombia en particular, se ha concentrado en la construcción y conservación de los corredores viales principales y aunque se han realizado grandes esfuerzos en cuanto a vías de segundo y tercer nivel, los mismos no han sido suficientes para satisfacer las necesidades de las comunidades en cuanto a conectividad vial. Derivado de lo anterior, se ha generado un rezago en el desarrollo relativo de las regiones, frente a lo cual se pretende lograr un desarrollo equilibrado de las redes principales, secundarias y terciarias que tenga en cuenta las necesidades no sólo de inversión sino también de mantenimiento.

Que en atención a la autorización estatuida por el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 para la selección directa del Organismo de Acción Comunal con el cual se ejecuta EL PROYECTO, resulta aplicable en este caso lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública para esa modalidad de selección. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el OAC (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el CONVENIO por celebrarse se regirá principalmente por la Ley 2166 de 2021; en lo que le sea aplicable por los decretos ley 393 de 1991 y 591 de 1991, y el decreto 092 de 2017; y subsidiariamente por la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.


Las obras en el tramo priorizado a intervenir se ejecutan en el marco del convenio solidario número 4464 de 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de vereda de las Guacas del municipio Morales Cauca, y la interventoría está a cargo de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS mediante el contrato No. 4897 de 2023 celebrado con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

1.2. LOCALIZACIÓN.

El municipio de Morales se encuentra localizado en el Departamento del Cauca, a 41 km de la ciudad capital del departamento Cauca. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con productos como el café, la caña de azúcar, el maíz, el plátano igualmente, la ganadería, la minería de oro, carbón y la explotación forestal.

De acuerdo a lo establecido en el plan vial Municipal de Morales Cauca (2019) existen aproximadamente un total de 245 km de vías terciarias, de los cuales sólo 4.37 km se encuentra pavimentada, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales. El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Las Guacas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas Norte y punto de referencia final el Km0+529 de coordenadas de la vía denominada 26KA05-9 CRUCE RUTA 26CC05 (PORVENIR) - LA CUCHILLA -SANTAROSA, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial CAUCA del INVIAS.

Figura 1.Localización del Municipio de Morales en el Departamento del Cauca

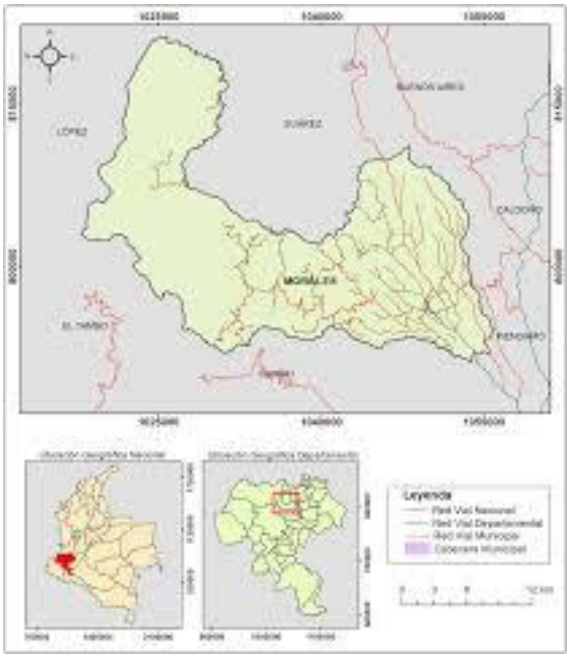

Fuente: (Gobernación del Cauca, 2024)

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad

en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente. Según el alcance de la longitud corredor (km) del proyecto que se priorizo por Instituto Nacional de Vías – INVIAS, las abscisas K00+000 a la K0+529 (529 m) como se observa en la figura.

Figura 2. Localización tramo a intervenir vereda Guacas



Fuente: Adaptado de Informe Estudios y Diseños

1.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vía que conduce de la vereda las Guacas con veredas aledañas como Santa Rosa, vía principal que de Morales conduce a cabecera Municipal de Morales y vía que conecta con el Municipio de Suarez, así durante el proceso de estructuración de la ficha técnica por parte del INVIAS se identificaron los sectores críticos a lo largo de un tramo con una longitud de 529 metros, el cual en su mayoría se encuentra en pendientes alta y mal estado, con ausencia de obras de drenaje que permitan la conservación del tramo. En un punto del tramo existe una estructura de drenaje con 3 tubos que requiere limpieza, situación que hace parte de las actividades de que realiza la junta bajo la modalidad de mingas de trabajo, esta estructura no se incluye intervenir con los recursos del convenio. Con el fin de verificar el estado actual de las obras de drenaje a lo largo del tramo objeto del mejoramiento vial, se llevó a cabo una visita de reconocimiento en compañía de la OAC de tal manera que se pudiera determinar a partir del estado, el establecimiento del tramo a intervenir, por cuanto los recursos asignados al convenio no permitirían la intervención de todos los 529 m. Así las cosas, la OAC direcciona levantamiento topográfico de 194.5 m entre las abscisas 2°48'18"N 76°39'04"W Y 2°48'17"N 76°39'10"W).

Durante el proceso de reconocimiento se logró identificar el punto de partida de la intervención a realizarse con la construcción de una placa huella (Inicio en Abscisa K0+170- Pnto de inicio actividades de construcción- 2°48'17"N 76°39'10"W que correspondería a la abscisa final del tramo), así mismo, con el diseño entregado por la OAC se logró identificar la necesidad de construcción de alcantarilla, que según el chequeo hidráulico se puede implementar de un diámetro de 24" a implementarse en la abscisa K0+100. De esta manera,

con la suscripción del convenio con la Junta de la vereda las Guacas, municipio de la Morales; en el Departamento Del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento de un corredor vial productivo garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto. Se logra establecer en los estudios y diseños que la configuración de aceros el consultor la ha propuesto para tránsitos livianos, así mismo lo ha dispuesto para las modulaciones de acuerdo a la geometría de la vía.

Dentro del tramo a intervenir, no se identifican afectaciones a viviendas. Se identifica el predio hacia el cual debe descolar la alcantarilla que se proyecta construir, la junta ha determinado el permiso de propietario.

1.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las obras proyectadas fueron producto del programa CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas. Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas.

Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías

donde las restricciones propias de pendiente y Siendo el proyecto de mantenimiento y mejoramiento, se ampliará en lo posible la calzada con el ancho de cuatro con cinco (4,5) metros como lo indica la cartilla de construcción de Placa huellas del INVÍAS. Se tratarán de mejorar las características geométricas de los tramos de las vías como los alineamientos horizontal y vertical, los bombeos y peraltes de la superficie de las placas huellas. La vía

objeto de este proyecto se encuentran catalogada como vía rural, a lo largo del proyecto 200 metros de longitud se cuenta con curvas horizontales y verticales en el límite de los parámetros indicados en la GUIA DE DISENO DE PAVIMENTOS CON PLACAHUELLA. El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

Los principales atributos de éste tipo de pavimento son:

- Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio período de servicio.

- No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.

- No requerir mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que por condiciones de rugosidad de la superficie de éste tipo de pavimento la velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.

- Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional.

- Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales. Aun no se cuenta con la geometría ni ajustes finales para este proyecto.

En el proyecto por las condiciones del trazado de vía existente, se ve la necesidad de implementación de algunos sobreanchos de acuerdo a lo referido en los ajustes de diseños, esta consideración es tenida en cuenta durante la etapa de localización y replanteo.

En el tramo fueron identificados, además, zonas con surcos bastante pronunciados que se estiman solucionar con la intervención, pero que representaran un incremento en las actividades que debe realizar la maquinaria para poder realizar la nivelación.

Del resultado de los entregables de estudios y diseños se tienen los lineamientos a seguir para el desarrollo de las obras, y las estipulaciones de modulación, de acuerdo a las curvas identificadas; así mismo estableciendo condiciones de tránsito liviano, con vehículos mucho menores a la tipología C2 y C3. Además de ello, con la recomendación de construcción de una alcantarilla.

La interventoría identifica condiciones de acceso crítico hasta el inicio de la intervención se presentan dificultades de acceso, aunque las pendientes son más bajas, las múltiples lluvias que se presentan en la zona y por la condición de la superficie se ha visto afectada considerablemente.



Estado de la vía durante el proceso de levantamiento topográfico inicial.



Dentro del tramo a intervenir, no se identifican afectaciones a viviendas. Se identifica el predio hacia el cual debe descolar la alcantarilla que se proyecta construir y presentan soporte permiso propietario.

1.5. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO.

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
No. del Convenio Solidario	4464-2023
Objeto del Convenio Solidario	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Aporte Instituto Nacional de Vías (INVIAS)	$ 200.596.428
Aporte OAC Las Guacas	$ 1.000.000
Valor total del Convenio Solidario	$ 201.596.428
Nombre del Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS
Representante legal	MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES
Fecha de Orden de inicio	22 De Diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024

Prorroga 2	01 de Mayo de 2024 hasta 31 de Mayo de 2024
Prorroga 3	01 de Junio de 2024 hasta 30 de Junio de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de Junio de 2024

1.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.


- Participación en comité operativo para evaluar situaciones asociadas a la ejecución del convenio.
- Se remitieron documentos necesarios para aprobación prórroga 3 del convenio.
- Se Continua con labores de amarre de acero para fundición de concretos desde abscisa K0+130 hasta abscisa K0+105.
- Se realizan actividades de formaleteo de abscisa K0+093 hasta K0+050.
- Se realiza acarreo de material hasta el punto de intervención de la obra.
- En el periodo reportado de actividades de obra, se logra realizar intervención con fundición de concretos hasta abscisa K0+050.
- Se toman muestras para ensayo resistencia concretos.
- Al retiro de maestro fue necesaria la vinculación de nueva persona a ocupar cargo, se recepciono hoja de vida que fue remitida a la territorial. Así mismo, se verifico afiliaciones de personal a SSS y RL.
- Se diligenciaron todos los formatos exigidos para realizar la solicitud de la prórroga 3 del convenio, así las cosas, se prorrogó hasta el 30 de Junio de 2024, teniendo en cuenta las dificultades que se han presentado en la zona, respecto de las condiciones de clima y la alteración de orden público.
- Se soportan las situaciones asociadas a la obra en la correspondiente bitácora de obra y formatos de tiempo y equipos.
- Se elaboran oficios que se relacionan en el capítulo de correspondencia.
- Se trasladan autorizaciones de pago a través de correo electrónico.
- Se logra identificar las complicaciones para disponibilidad de maquinaria que ingrese al sector, así mismo la dificultad ingreso materiales.
- Intervención parcial con placahuella de 113 mtros.

 	 
Actividades de formaleteo	Actividades de sobreacarreo de material
	
Fundición concretos ciclópeos y reforzados.	Actividades fundición de concretos
	
Actividades de fundición concretos	Actividades de fundición concretos suspendidas por condiciones climáticas




A corte del presente informe se tiene ejecución física con atrasos de acuerdo al cronograma presentado. Se han solicitado reprogramaciones de actividades, por cuanto las lluvias que se presentan en la zona han disminuido los rendimientos y la indisponibilidad de materiales en el punto de intervenciones y han generado interrupciones de las labores de fundición, finalmente con un atraso acumulado de 26%, así mismo, frente a la no existencia de personal durante las dos últimas semanas de Mayo no existió ejecución en obra, se solicitó reprogramación de obra que a la fecha no ha sido entregado.

Figura 3- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas a corte 31 de Mayo de 2024
(Porcentajes respecto a cantidades de actividad dentro del programa de obra)

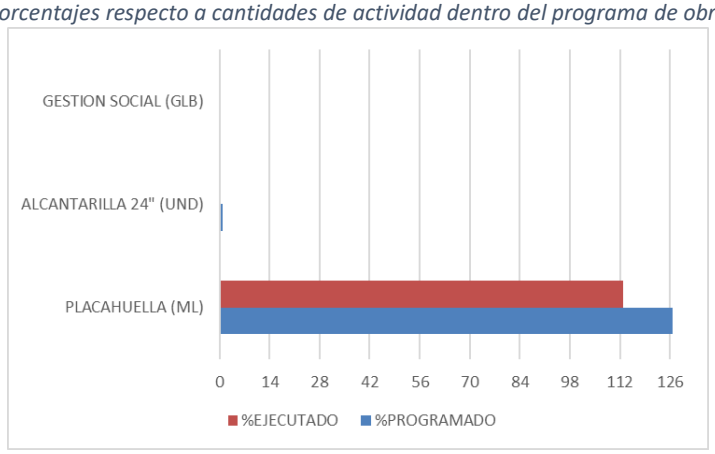

Fuente: Propia

Figura 4. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 31 de Mayo de 2024.

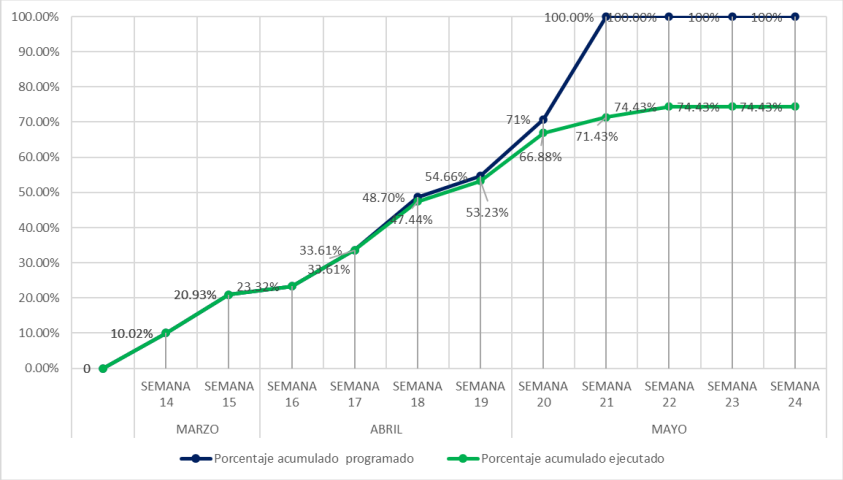

Fuente: Propia

Del periodo de 16 de Mayo a 31 de Mayo no existió ejecución de actividades en obra por falta de personal, se están evaluando las situaciones para poder realizar nuevamente vinculación. Se solicitó a la OAC presentar reprogramación.

1.5.2. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

Durante el periodo no se evaluaron situaciones respecto de otros ítems.

1.5.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- Realizar reuniones con contadores de la Junta, ingenieros residentes y representante de veeduría y de la Junta para poder transmitir las recomendaciones dadas desde la Territorial Cauca, respecto de las situaciones que se han presentado durante la ejecución.
- A corte del presente informe se tiene ejecución física con un atraso acumulado del 26%, por lo que fue solicitada prorroga 3 y a su vez se solicitó reprogramación de obra.
- Se continuará buscando garantizar el cumplimiento de lo establecido en el convenio.

1.6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

1.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA
PERIODO MES: MAYO

CONVENIO No.: 4464- 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNCIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS GUACAS

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 30/06/2024

VALOR INICIAL : $ 201,596,428.00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201,596,428.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 200,596,428.00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4897 DE 2023
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento (Placa Huella) AJUSTADO SEGÚN COTIZACIONES	ML	126.8
Estructuras	Alcantarillas de 24"	UND	1
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Disipador	UND	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento (Placa Huella) AJUSTADO SEGÚN COTIZACIONES	ml	58	113
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	0	0
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Disipador	UNIDAD	0	0

Cantidad parcial de placahuella reportada

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	155,711,235.86
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	1,000,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,885,192.14
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200,596,428

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	18,543,408.00	95,471,944.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,216,700.00	15,268,496.00
VALOR EJECUTADO	21,760,108.00	110,740,440.00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 144,333,209.66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 95,471,944.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 66.15%

Porcentaje bajo debido a que proveedores no entregan todo lo relacionado para generar el pago

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Actividades de acarreo de material



Desarrollo actividades de fundición



Desarrollo actividades de fundición



Vista después de intervención y formaleteo bordillos



Actividades de formaleteo



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1.6.2. INFORME SEMANAL

Semana 20- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 20 del 29/04/2024 al 5/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EL PROYECTO PARA DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, EN LA VEREDA LAS GUACAS, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA INICIAL EN EL PR0+000 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8063, LONGITUD: -76.6489 Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EN EL PR: 0+529 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8049, LONGITUD: -76.6527, DE LA VÍA VÍA LAS GUACAS - SANTA ROSA LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS		
CONVENIO No.	4464 de 2023	VALOR INICIAL:	$201,596,428
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$201,596,428
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103,423,259.86
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103,423,259.86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,596,428	$ 200,596,428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 94,426,139		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 106,170,289		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 103,423,260		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A			
	SALDO DE VIGENCIA	N/A			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$201,596,428	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 80,525,936.00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 13,900,205.99	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94,426,141.99	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,745,600.00	%

Observaciones:
Registros reportados de acuerdo al libro auxiliar entregado por contador de la OAC y a soportes de desembolsos remitidos por el Banco

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.423.259.86	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 66.88% — Avance o Atraso Físico % 3.92%
Meta Física Ejecutada % 70.80%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACAHUELLA	ML	126.80
	ALCANTARILLA 24"	UND	1.00
*	GESTION SOCIAL	GLB	1.0

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	60.00			60	47%
Ejec	55			55	43%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Rana compactadora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Plantra eléctrica	1	1
Motobomba	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	POPAYAN	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:

Del 29 de abril al 5 de mayo se realiza formaleteado y fundición de concretos, se presentan inconvenientes para el acceso del material debido a las fuertes lluvias presentadas a lo largo de periodo de ejecución de la obra, generando malas condiciones en la vía; sin embargo se realizaron en vehiculo liviano las actividades de formaleteo.
Se registran en bitácora las actividades desarrolladas en obra.
A la fecha las actividades de excavación para placahuella, subbase han sido desarrolladas en su totalidad.
El 01 de Mayo se suscribve autorización pago para nomina correspondiente al periodo 16 de Abril a 30 de Abril de 2024.
Las actividades correspondientes a la alcantarilla que habian sido programadas para iniciar esta semana no fueron desarrolladas, se acumula un porcentaje de atraso cercano al 26%, basandose en la programación vigente a 31 de Mayo de 2024.
Se realizan dos viajes de acarreo de material granular para fundiciones

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Se deberán seguir realizando actividades de sobreacarreo para garantizar la ejecución de actividades en obra.
Se encuentran programadas actividades de fundición de concretos reforzados, concretos ciclópeos , actividades asociadas a la construcción de alcantarilla y actividades de corte y sello de juntas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Las Guacas - Formaleteo para fundición



Vereda Las guacas - Fundición de paños en concreto ciclopeo y formaleteado de sardinel



Vereda Las Guacas - Acarreo interno de material



Vereda Las Guacas - Fundición hasta



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.	FIRMA NOMBRE: CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 21 Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 21 del 6/05/2024 al 12/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EL PROYECTO PARA DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, EN LA VEREDA LAS GUACAS, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA INICIAL EN EL PR0+000 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8063, LONGITUD: -76.6489 Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EN EL PR: 0+529 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8049, LONGITUD: -76.6527, DE LA VÍA VÍA LAS GUACAS - SANTA ROSA LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS		
CONVENIO No.	4464 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,596,428.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,596,428.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103,423,259.86
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103,423,259.86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,596,428	$ 200,596,428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 107,374,050		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 93,222,378		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,596,428.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 92,687,844.00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14,686,205.99	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 107,374,049.99	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,947,908.00	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,596,428	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -25.57%

Meta Física Ejecutada %: 74.43%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACAHUELLA	m3	126.80
ALCANTARILLA 24"	m3	1.0
GESTION SOCIAL	m3	1.0

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	115.00			115.00	90.7%
Ejec	103.00			103.00	81.2%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motobomba	1	1
Rana compactadora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Plantra eléctrica	1	1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	POPAYAN	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 6 al 15 de mayo se realiza formaleteado, fundición de concretos hasta el K 0 +055 aproximadamente y fundición de sardineles, se siguen presentando inconvenientes para el acceso del material debido a las fuertes lluvias presentadas a lo largo de período de ejecución de la obra, generando malas condiciones en la vía de acceso.
Se realiza acarreo de materiales para preparación de concretos en vehiculo liviano hasta el sitio de intervención de obra.
Se realizan actividades de fundición desde abcisa K0+120 hasta K0+105 y de K0+090 A K0+050-. Culminando con fundición parcial, pendiente bordillos de 120 ml de placahuella.
Atraso acumulado no recuperado.
Se realiza comité operativo donde se evaluan las condiciones frente a la continuidad de ejecución de la obra, por terminación de contratos del personal adscrito.
Se realizan advertencias por baja ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales.
Se solicita cargue polizas actualizadas a secop II de acuerdo a ultima prorroga.
Se remitieron documentos para devolución de rendimientos financieros al Banco.
Se realiza requerimiento para cumplimiento de obligaciones contables.
Se realiza comunicación por correo electronico para que se tenga en cuenta la forma en la que deben remitirse documentos asociados para pago.
Se realiza solicitud ajuste facturación de pago realizado en el mes de Marzo, proveedor da respuesta positiva indicando devolución en cuenta pendiente por pagar al tratarse de error de digitación.
Se realiza requerimiento para que se estableizcan medidas ante quien corresponda, de tal manera que se garantice la disponibilidad de material para el desarrollo de actividades programadas.
Se remite comunicado emitido por banco con modelo para nuevamente realizar solicitud de devolución rendimientos.
Se autoriza pagos para compra de insumo asociado a actividades de construcción de alcantarilla, pues proveedor no realizó entrega preliminar como se habia acordado, pues manifiesta ya se le adeudan materiales. Por situaciones asociadas a la celeridad con la que se requiere sea entregadi el tubo para la construcción de la alcantarilla, se suscribe formato de autorización.
Se realiza solicitud para control rendimientos de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Se deberán seguir realizando actividades de sobreacarreo para garantizar la ejecución de actividades en obra.
Se encuentran programadas actividades de fundición de concretos reforzados, concretos ciclópeos , actividades asociadas a la construcción de alcantarilla y actividades de corte y sello de juntas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Las guacas - Acarreo interno de materiales



Vereda Las guacas - Fundición de losas y cunetas en concreto reforzado en concreto en abscisas K120-K0+105



Vereda Las Guacas acabado concretos



Vereda las Guacas-Actividades de fundición Parcial desde K+090 hasta abscisa K0+050



Vereda las Guacas-Actividades de fundición ciclopeos hasta abscisa K0+40



Vereda las Guacas-Actividades de fundición ciclopeos hasta abscisa K0+40

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 252223743DCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 22- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1
FECHA	19/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 22 del 13/05/2024 al 19/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EL PROYECTO PARA DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, EN LA VEREDA LAS GUACAS, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA INICIAL EN EL PR0+000 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8063, LONGITUD: -76.6489 Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EN EL PR: 0+529 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8049, LONGITUD: -76.6527, DE LA VÍA VÍA LAS GUACAS - SANTA ROSA LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO POR PARTE DEL EQUIPO TÈCNICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS		
CONVENIO No.	4464 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,596,428.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,596,428.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103,423,259.86
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103,423,259.86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,596,428	$ 200,596,428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 111,440,650		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 89,155,778		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,596,428.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 95,606,244.00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15,834,405.99	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111,440,649.99	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,066,600.00	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,596,428	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % -25.57%
Meta Física Ejecutada % 74.43%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACAHUELLA	ML	126.80
ALCANTARILLA 24"	UND	1.0
GESTION SOCIL	GLB	1.0

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	126.80			126.80	100.0%
Ejec	113.00			113.00	89.1%
Prog	1.0			1.00	100.0%
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motobomba	1	1
Rana compactadora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Plantra eléctrica	1	1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	POPAYAN	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Se realizan actividades de fundición hasta desde abscisa K0+060 A K0+050
Durante esta semana no se ejecutaron actividades de obra. Contratos de personal de obra terminaron, no se logra vinculación bajo las mismas condiciones.
Se realiza comité operativo
Se realizó requerimiento para evaluacion de situaciones de rendimiento de obra y de temas financieros asociados a los pagos que se deben estimar a mano de obra para terminación de la obra.
Se autorizaron pagos asociados nomina de labores desarrolladas hasta el 15 de Mayo. Hasta el momento no se han remitido liquidaciones.
Se realiza requerimiento para entrega de informes por parte de la Junta.
Se remite a supervisor solicitud de prorroga 3 con los correspondientes formatos.
Se mantiene el atraso de 25,57%.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Realizar la contratación de personal para la terminación de la obra., así mismo deberá realizar la reprogramación de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actividades de fundición desdeabscisa K0+040 a k0+050

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUA CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 23- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 26/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 23 del 20/05/2024 al 26/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EL PROYECTO PARA DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, EN LA VEREDA LAS GUACAS, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA INICIAL EN EL PR0+000 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8063, LONGITUD: -76.6489 Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EN EL PR: 0+529 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8049, LONGITUD: -76.6527, DE LA VÍA VÍA LAS GUACAS - SANTA ROSA LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS

CONVENIO No.: 4464 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 201,596,428.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201,596,428.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.: 4897 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103,423,259.86
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 103,423,259.86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,596,428	$ 200,596,428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 111,440,650		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 89,155,778		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,596,428.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 95,606,244.00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15,834,405.99	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111,440,649.99	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,596,428	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -25.57%
Meta Física Ejecutada %: 74.43%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACAHUELLA	ML	126.80
ALCANTARILLA24"	UND	1.0
GESTION SOCIAL	GLB	1.0

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	POPAYAN	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Durante esta semana no se ejecutaron actividades de obra. Contratos de personal de obra terminaron, no se logra vinculación bajo las mismas condiciones.
Junta realiza remisión de documento tipo paz y salvo, indicando que al no disponer de recursos para pago de mano de obra, cuadrilla completa, manifiestan intención de desarrollar trabajos colaborativos para garantizar la temrinación de la obra., como lo habian manifestado en el comitpe de la semana anterior, la R.L. de la interventoria manifestó la posibilidad de realizaqr las labores de esta manera, sin embargo se debe realizar la contraación de maestro de obra.
Se realiza requerimiento de presentación resultados ensayos de laboratorio.
Se realiza la solicitud de prorroga 3 del convenio.
Se mantiene el atraso de 25,57%, pues junta no ha remitido reprogramaicón de obra, no ha relaizado contrataación de personal.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Realizar la contratación de personal para la terminación de la obra., así mismo deberá realizar la reprogramación de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No presenta

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A	N.A	N.A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Ejecuatar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.	FIRMA NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 24- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 2/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 24 del 27/05/2024 al 2/06/2024 | Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EL PROYECTO PARA DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, EN LA VEREDA LAS GUACAS, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA INICIAL EN EL PR0+000 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8063, LONGITUD: -76.6489 Y PUNTO DE REFERENCIA FINAL EN EL PR: 0+529 CON COORDENADAS LATITUD: 2.8049, LONGITUD: -76.6527, DE LA VÍA VÍA LAS GUACAS - SANTA ROSA LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS

CONVENIO No. 4464 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201,596,428.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 | VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201,596,428.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4897 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 103,423,259.86
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 | VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 103,423,259.86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,596,428	$ 200,596,428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 111,722,868		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 88,873,560		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,596,428.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 95,606,244.00	47.42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 16,116,624.02	7.99%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111,722,868.02	55.4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 282,218.03	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,596,428	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% | Avance o Atraso Físico %: -25.57%
Meta Física Ejecutada %: 74.43%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACAHUELLA	ML	126.80
ALCANTARILLA24"	UND	1.0
GESTION SOCIAL	GLB	1.0

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	POPAYAN	PERMISO MINERO: SI	X NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Durante esta semana no se ejecutaron actividades de obra. Contratos de personal de obra terminaron, no se logra vinculación bajo las mismas condiciones.
Junta realiza remisión de documento tipo paz y salvo, indicando que al no disponer de recursos para pago de mano de obra, cuadrilla completa, manifiestan intención de desarrollar trabajos colaborativos para garantizar la temrinación de la obra., como lo habian manifestado en el comitpe de la semana anterior, la R.L. de la interventoria manifestó la posibilidad de realizagr las labores de esta manera, sin embargo se debe realizar la contraación de maestro de obra.
Se realiza requerimiento de presentación resultados ensayos de laboratorio.
Se realiza la solicitud de prorroga 3 del convenio.
Se mantiene el atraso de 25,57%, pues junta no ha remitido reprogramaicón de obra, no ha relaizado contrataación de personal.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Realizar la contratación de personal para la terminación de la obra., así mismo deberá realizar la reprogramación de obra.

VIII ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No presenta

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A	N.A	N.A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.	FIRMA NOMBRE: JUA CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.6.3. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

La maquinaria y equipo utilizado durante el periodo reportado en el presente informe se encuentra detallado en los formatos de informe semanal y en Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4464 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS GUACAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4897 DE 2023

INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rana vibratoria	enermax	5,5 hp		A	I	A	A		I	A	I	A	I	A		A	I	I														
vibrador de concreto	condustrial	2,4 hp		I	A	I	I		I	I	A	I	A	A		I	A	I														
moto bomba	ecogen gx 200	5 hp		I	A	I	I		I	I	A	I	A	A		I	A	I														
planta eléctrica	Honda	3,8 hp		I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	A														
Trompo	xcp hi-force	10 hp		A	A	I	I		A	I	A	I	A	A		I	A	I														
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40															
			TOTAL ACTIVO	4	24	6	4		6	5	20	4	22	16		4		12															
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO	36	16	34	36	40	34	35	20	36	18	24	40	36	40	28															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	127	21%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	473	79%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): La inactividad de los equipos se debe a que las actividades en las que se requieren no son constantes por lo que se presentara dicha inactividad

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JUAN FELIPE SORIO RIOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: IVAN ANDRES CHAMORRO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202301186 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1.6.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

El personal que laboró para la obra durante el periodo de Mayo de 2024.

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONVENIO No: 4464- 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACASDEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4464- 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	nelson miller fernandez gomez	76358202	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																J.A.C GUACAS	1160000	$ 80.736	V	ASMET SALUD	9468322984	$ 145.000	PORVENIR	9468322984	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	ingreso el 9 de abril
2	sebastian victoria gueto	76292306	OFICIAL	$ 1.740.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																J.A.C GUACAS	870000	$ 60.552	V	ASMET SALUD	9468322984	$ 108.750	PORVENIR	9468322984	$ 139.200	$ 34.800	$ 17.400	$ 26.100	
4	Victor adrian velando	1059598613	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																J.A.C GUACAS	650000	$ 45.240	V	ASMET SALUD	9468322984	$ 81.250	PORVENIR	9468322984	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
5	eduin aranda araujo	4719353	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																J.A.C GUACAS	650000	$ 45.240	V	ASMET SALUD	9468322984	$ 81.250	PORVENIR	9468322984	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
6	jose omar quimbaya rivera	10752900	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																J.A.C GUACAS	650000	$ 45.240	V	ASMET SALUD	9468322984	$ 81.250	PORVENIR	9468322984	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
7	juan felipe osorio rios (*)	1059601568	ING RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	J.A.C GUACAS	1400000	$ 130.000	V	NUEVA EPS	9468322964-946	$ 175.000	PORVENIR	9468130787	$ 224.000	$ -	$ -	$ -	
8	arley danilo velasco sanchez (*)	1059597060	CONTADOR	$ 1.400.000					X	X			x	x		X	X			x	x			X	X	X				X	X		X	X	X	J.A.C GUACAS	1300000			SANITAS	9467810913	$ 162.500	PORVENIR	9467810913	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
9																																																	
10																																																	
N																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

Planilla del mes de Mayo de residente de Obra, aún no ha sido presentada, se solicitó en comité operativo el correspondiente soporte. No se ha tramitado pago. Personal fue retirado por Junta el 15 de Mayo por no disponibilidad para continuar labores bajo las condiciones pactadas.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: juan felipe osorio rios
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No 19202-316403 CAU

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1.6.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se diligencia información general de acuerdo al formato suministrado por la Territorial; sin embargo, se encuentra en revisión, por cuanto para el caso particular de este tipo de convenios, no se tramitan actas de pago parcial, sino que se realiza la administración de un desembolso.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4464 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LAS GUACAS, DEL MUNICIPIO DE MORALES, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

MES INFORME MENSUAL: MARZO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4897 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		PROGRAMA CAMINOS		NACIÓN	4464/2023	$ 200.596.428	
		JAC VEREDA LAS GUACAS		PROPIOS	4464/2023	$ 1.000.000	
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 201.596.428,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

1.6.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4464 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS GUACAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mayo DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	18	17	18	17	18	19	18	14	18	19	20	19	16	15	20																	266
Lluvias moderadas									6					6																	12
Lluvias intensas	6	7	6	7	6	5	6	10		5	4	5	8	3	4																	82
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Las condiciones climaticas interrumpieron actividades de fundición. Acabados fueron afectados. Sin actividad en obra de 16 a 31 de Mayo por falta personal

Firma
Nombre: JUAN FELIPE OSORIO RIOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: VIVIANA ANDREA GALINDO S
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202301186 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1.6.7. ENSAYOS DE LABORATORIO

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se detallan los resultados de ensayos de compactación realizados. Los resultados de resistencia concretos aún no han sido entregados.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: 4464 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESTRELLA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/A.ño)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	2/05/2024	Toma de muestras de concreto	INV-E-402	Fundición desde k 0+130 a k0 +120	4	3000 psi			
2	10/05/2024	Toma de muestras de concreto	INV-E-402	Fundición K0+090 a k0+070	4	3000 psi			
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
Aun no entregan resultados de ensayos de cilindros de concreto

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JUAN FELIPE SORIO RIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1.6.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Las pólizas correspondientes al periodo, han sido cargadas al Secop II por parte de las Oac, se realizaron solicitudes para cargue con recibo de pago para que se considerara completo el trámite. Pólizas correspondientes a la prórroga 3 solicitadas, aún no allegadas a 31 de Mayo. Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	20 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4464 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS GUACAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 22/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201.596.428,00
VALOR ACUMULADO: $ 201.596.428,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4897-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.319.286	17	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.079.821,50	17	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.478.929,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026260

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	115%	$ 232.000.000	17	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005582 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.319.286,00	30	12	2023	2	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5,00%	$ 10.079.821,50	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.478.929,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026260

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.319.286,00	30	4	2024	31	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5,00%	$ 10.079.821,50	30	4	2024	31	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.478.929,00	31	5	2024	31	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026260

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	17	11	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005582 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	17	11	2023	31	5	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005582 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES

Los anexos 01 Y 02 de cada una de las pólizas se encuentran pendientes por aprobar en SECOP II. Se realizó verificación de que las mismas fueran cargadas por la OAC.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Las pólizas correspondientes a la prorroga 3 ya fueron solicitadas, pero al corte del presente informe no han sido remitidas para su revisión.

1.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

1.6.9.1. SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 se consolida la información relacionada con el plan de inversión, que para el mes de Mayo no surtió cambios respecto de los valores asociados a cada uno de los programas de la obra.

CONVENIO No. 4464- 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS GUACAS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS GAUCAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4897-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

JUSTIFICACIÓN:
Se establece redistribución de recursos por cambios presupuesto de acuerdo a las valoraciones entregadas por parte de la Territorial Cauca, y a las situaciones que se han presentado respecto de la dificultad para el ingreso de materiales. Así mismo, se redistribuyen recursos de gastos adminsitrativos a obra y del componente de gestion ambiental; se deja unicamente recursos para el componente social preveiendo la necesidad para la actividad de cierre del proyecto.
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES (INCLUYE TRASNSPORTES Y SOBREACARREOS)	$ 65.930.685,00	$ 46.533.741,53	$ 4.821.955,86		$ 117.286.382,39	63,80%
2,3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ -	$ 13.960.798,13			$ 13.960.798,13	7,92%
4	COSTO DE PERSONAL	$ 5.969.328,00	$ 11.938.657,00	$ 6.556.070,34		$ 24.464.055,34	10,16%
5	DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON)	$ 1.889.300,00	$ -	$ -		$ 1.889.300,00	1,07%
6	REINTEGRO POLIZA (ADMON)	$ -	$ 1.421.143,00	$ 281.793,00		$ 1.702.936,00	0,81%
7	PESONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON)	$ 5.030.000,00	$ 5.030.000,00	$ 4.106.000,00		$ 14.166.000,00	5,71%
8	MAESTRO DE OBRA (ADMON)	$ 386.303,00	$ 2.832.886,00	$ 7.339.618,14		$ 10.558.807,14	1,83%
9	MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON)		$ 180.000,00			$ 180.000,00	0,10%
10	GASTOS BANCARIOS (ADMON)	$ 620.629,00	$ 620.629,00	$ 216.503,00		$ 1.457.761,00	0,70%
11	EXAMEN INGRESO PERSONAL (ADMON)	$ 175.000,00	$ 25.000,00			$ 200.000,00	0,11%
12	SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON)	$ 1.000.000,00	$ 200.000,00			$ 1.200.000,00	0,68%
13	PAPELERIA (ADMON)		$ 750.000,00			$ 750.000,00	0,43%
14	ENSAYO LABORATORIO (ADMON)		$ 3.322.188,00			$ 3.322.188,00	1,88%
15	REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS (ADMON)		$ 5.194.000,00			$ 5.194.000,00	2,95%
16	TOPOGRAFIA (ADMON)		$ 2.650.000,00			$ 2.650.000,00	1,50%
17	VALLA (ADMON)	$ 214.200,00	$ -			$ 214.200,00	0,12%
18	BODEGA (ADMON)	$ 200.000,00	$ 200.000,00			$ 400.000,00	0,23%
19	GESTION SOCIAL			$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	0,00%
TOTAL		**$ 81.415.445,00**	**$ 94.859.042,66**	**$ 24.321.940,34**	**$ -**	**$ 200.596.428,00**	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **Monica Andrea Fernandez Morales**
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 1.059.599.197

Firma:
Nombre: Leidy Mabel Perez Chud
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: CC 31,577,306

Firma:
Nombre: **Juan Felipe Osorio Rios**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **19202-316403 CAU**

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

1.6.9.2. BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO.

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-2 por parte de contador de la Junta fue registrado cada uno de los pagos realizados para el desarrollo del convenio, durante el mes de Mayo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MORALES CAUCA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4464 - 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.596.428,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4897-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA ELECTRONICA	NOM 15	30-abr-24	ELIANA GUERRERO	$ 679.000,00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 16	30-abr-24	VICTOR ADRIAN VELADO	$ 679.000,00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 14	30-abr-24	SEBASTIAN VICTORIA GUETO	$ 881.400,00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 17	30-abr-24	EDUIN ARANDA ARAUJO	$ 679.000,00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 18	30-abr-24	JOSE OMAR QUIMBAYA RIVERA	$ 679.000,00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 13	30-abr-24	NELSON MILLER FERNANDEZ GOMEZ	$ 1.148.200,00	8	MAESTRO DE OBRA (ADMON)
CONSIGNACION	RECIBO 491079471134	9-may-24	MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES	$ 631.000,00	1	MATERIALES (PAGO RETEFUENTE)
CONSIGNACION	RECIBO 491079471134	9-may-24	MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES	$ 40.000,00	5	ACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON) PAGO RETEFUE
CONSIGNACION	RECIBO 491079471134	9-may-24	MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES	$ 26.000,00	14	ENSAYO LABORATORIO (ADMON) PAG RETEFUENTE
CONSIGNACION	RECIBO 491079471134	9-may-24	MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES	$ 87.000,00	2	ALQUILER DE MAQUINARIA (PAGO RETEFUENTE)
CONSIGNACION	PLANILLA9466883344-9466883425	9-may-24	MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES	$ 756.800,00	8	MAESTRO DE OBRA (ADMON) PAG SEGURIDAD SOCIAL
CONSIGNACION	PLANILLA9466883344-9466883425	9-may-24	MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES	$ 3.085.700,00	4	COSTO PERSONAL (PAGO SEGURIDAD SOCIAL)
CONSIGNACION	PLANILLA9466883344-9466883425	9-may-24	MONICA ANDREA FERNANDEZ MORALES	$ 97.500,00	7	SONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON) SEGUR SO
FACTURA ELECTRONICA	FESF 22509	9-may-24	SOLUCIONES INTEGRALES EVA SAS	$ 1.565.408,00	1	MATERIALES
CUENTA DE COBRO	DSEE12	7-may-24	MARISO SUAREZ ARCE	$ 6.658.500,00	1	MATERIALES
NOMINA ELECTRONICA	NOM 20	30-abr-24	VICTOR ADRIAN VELADO	$ 679.000,00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 19	30-abr-24	SEBASTIAN VICTORIA GUETO	$ 881.400,00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 21	30-abr-24	EDUIN ARANDA ARAUJO	$ 679.000,00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 22	30-abr-24	JOSE OMAR QUIMBAYA RIVERA	$ 679.000,00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 23	30-abr-24	NELSON MILLER FERNANDEZ GOMEZ	$ 1.148.200,00	8	MAESTRO DE OBRA (ADMON)

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 117.286.382,39	$ 65.903.136,00	$ 8.854.908,00	$ 74.758.044,00	$ 42.528.338,39
2-3	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 13.960.798,13	$ 2.080.000,00	$ 87.000,00	$ 2.167.000,00	$ 11.793.798,13
4	COSTO PERSONAL	$ 24.464.055,34	$ 8.945.400,00	$ 9.601.500,00	$ 18.546.900,00	$ 5.917.155,34
5	DOTACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD(ADMON)	$ 1.889.300,00	$ 1.849.269,00	$ 40.000,00	$ 1.889.269,00	$ 31,00
6	REINTEGRO POLIZA (ADMON)	$ 1.702.936,00		$ -	$ -	$ 1.702.936,00
7	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON)	$ 14.166.000,00	$ 5.030.000,00	$ 97.500,00	$ 5.127.500,00	$ 9.038.500,00
8	MAESTRO DE OBRA (ADMON)	$ 10.558.807,14	$ 535.827,00	$ 3.053.200,00	$ 3.589.027,00	$ 6.969.780,14
9	MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON)	$ 180.000,00		$ -	$ -	$ 180.000,00
10	GASTOS BANCARIOS (ADMON)	$ 1.457.761,00		$ 700.209,99	$ 700.209,99	$ 757.551,01
11	EXAMEN INGRESO PERSONAL (SIN RETE)	$ 200.000,00	$ 175.000,00	$ -	$ 175.000,00	$ 25.000,00
12	SUBSIDIO DIGNATARIO	$ 1.200.000,00	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ 200.000,00
13	PAPELERIA (ADMON)	$ 750.000,00		$ -	$ -	$ 750.000,00
14	ENSAYO LABORATORIO (ADMON)	$ 3.322.188,00	$ 747.500,00	$ 26.000,00	$ 773.500,00	$ 2.548.688,00
15	REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS (ADMON)	$ 5.194.000,00		$ -	$ -	$ 5.194.000,00
16	TOPOGRAFIA (ADMON)	$ 2.650.000,00	$ 2.500.000,00	$ -	$ 2.500.000,00	$ 150.000,00
17	VALLA (ADMON)	$ 214.200,00	$ 214.200,00	$ -	$ 214.200,00	$ -
18	BODEGA (ADMON)	$ 400.000,00			$ -	$ 400.000,00
19	GESTION SOCIAL	$ 1.000.000,00			$ -	$ 1.000.000,00
	TOTALES	$ 200.596.428,00	$ 88.980.332,00	$ 22.460.317,99	$ 111.440.649,99	$ 89.155.778,01

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (___ABRIL _) : $ 959,73
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 2.187,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Algunos valores debieron ser consignados al presidente de la JAC para que con celeridad pudiera desarrollar las consignaciones y pagos de planillas de seguridad social, al no tener habilitado Botón PSE, se dispone de recibos de pago, el cual reposa en el archivo los respectivos pagos. Se ha solicitado por parte de la interventoria la realización de trámites para reintegro de rendimientos, comaprtiendo además guia compartida por territorial Cauca respecto de los procedimientos. Por otro lado, se reitero remisión de soportes autorización desembolsos, sin que a la fecha hayan sido remitidos todos los soportes para pagos pendientes. Formato elaborado de acuerdo a extractos bancarios entregados, y a información soportada con el acompañamiento del profesional contable de la Junta. Se deja claridad que al corte de diligenciamiento del formato de seguimiento desembolso del mes de Abril no se contaba con el extracto bancario que permitiera registrar con exactitud los gastos bancarios, por lo que los mismos fueron sumados en el corte del presente seguimiento.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Monica A fernandez M.
Nombre: Monica Andrea Fernandez Morales
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: MABEL PEREZ
Nombre: Leydi Mabel Perez Chud
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: Juan Felipe O.
Nombre: Juan Felipe osorio Rios
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

1.6.9.3. COPIA ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO.

Se adjunta copia de las actas de comité Operativo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

VEREDA LA ESTRELLA



Imagen: Vereda La Estrella Municipio de Morales Cauca.

CONVENIO SOLIDARIO N° 4679 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

2. CONVENIO SOLIDARIO N° 4679 DE 2023

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

En el convenio solidario número 4679 de 2023, **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** El instituto nacional de vías requiere materializar alianzas con actores estratégicos del nivel local, que cooperen desde diversas aristas en el marco de la ejecución de proyectos potenciales de infraestructura a cargo del INVIAS, con el propósito de generar desarrollo en las regiones, conectividad y competitividad, para lo cual se requiere el concurso de diversos actores como es el caso de los organismos de acción comunal. Que durante las últimas décadas gran parte de los recursos de inversión en infraestructura vial de los países en desarrollo en general, y de Colombia en particular, se ha concentrado en la construcción y conservación de los corredores viales principales y aunque se han realizado grandes esfuerzos en cuanto a vías de segundo y tercer nivel, los mismos no han sido suficientes para satisfacer las necesidades de las comunidades en cuanto a conectividad vial. Derivado de lo anterior, se ha generado un rezago en el desarrollo relativo de las regiones, frente a lo cual se pretende lograr un desarrollo equilibrado de las redes principales, secundarias y terciarias que tenga en cuenta las necesidades no sólo de inversión sino también de mantenimiento.

Que en atención a la autorización estatuida por el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 para la selección directa del Organismo de Acción Comunal con el cual se ejecuta EL PROYECTO, resulta aplicable en este caso lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública para esa modalidad de selección. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el OAC (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el CONVENIO por celebrarse se regirá principalmente por la Ley 2166 de 2021; en lo que le sea aplicable por los decretos ley 393 de 1991 y 591 de 1991, y el decreto 092 de 2017; y subsidiariamente por la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.


Las obras en el tramo priorizado a intervenir se ejecutan en el marco del convenio solidario número 4679 de 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de vereda de las La Estrella del municipio Morales Cauca, y la interventoría está a cargo de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS mediante el contrato No. 4897 de 2023 celebrado con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

2.2. LOCALIZACIÓN

El municipio de Morales se encuentra localizado en el Departamento del Cauca, a 41 km de la ciudad capital del departamento Cauca. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con productos como el café, la caña de azúcar, el maíz, el plátano igualmente, la ganadería, la minería de oro, carbón y la explotación forestal.

De acuerdo a lo establecido en el plan vial Municipal de Morales Cauca (2019) existen aproximadamente un total de 245 km de vías terciarias, de los cuales sólo 4.37 km se encuentra pavimentada, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales. El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas Norte y punto de referencia final el Km0+203 de coordenadas de la vía denominada SECTOR 26KA05-9 CRUCE RUTA 26CC05 (PROVENIR) - LA CUCHILLA VÍA SECTOR LA GUAYABERA, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial CAUCA del INVIAS.

Figura 5. Localización Municipio de Morales.

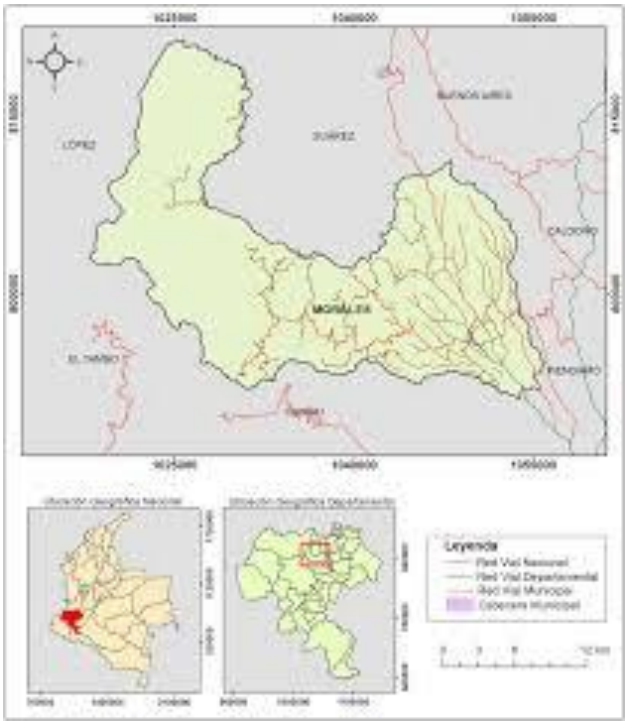


Fuente: (Gobernación del Cauca, 2024)

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías,

mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente. Según el alcance de la longitud corredor (km) del proyecto que se priorizo por Instituto Nacional de Vías – INVIAS, las abscisas K00+000 a la K0+203 (203 m) como se observa en la siguiente figura.

Figura 6.Localización de tramo a intervenir-Vereda Estrella

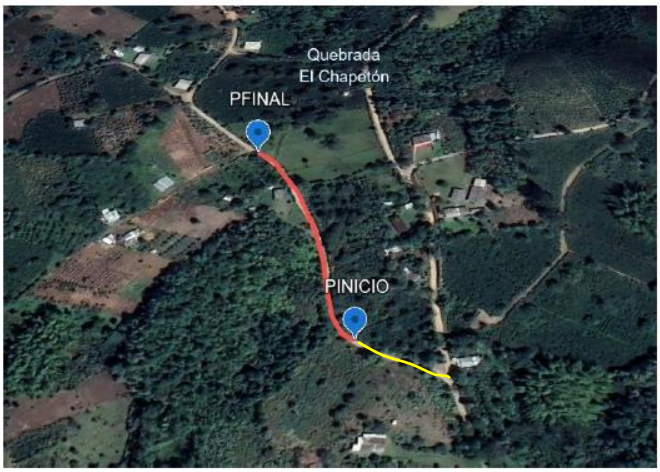

Fuente: Adaptado de Informe Estudios y Diseños

2.4. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía que conduce de la vereda las La Estrella con veredas aledañas como Carpintero y El Porvenir, que se comunica con vía principal que de Morales conduce a cabecera Municipal de Morales, así durante el proceso de estructuración de la ficha técnica por parte del INVIAS se identificaron los sectores críticos a lo largo de un tramo con una longitud de 203 metros, el cual en su mayoría se encuentra con pendientes medias, pero con una superficie de rodadura en su mayoría en mal estado, con poco material granular, con ausencia de obras de drenaje que permitan la conservación del tramo. Con el fin de verificar el estado actual de las obras de drenaje a lo largo del tramo objeto del mejoramiento vial, se llevó a cabo una visita de reconocimiento en compañía de la OAC de tal manera que se pudiera determinar a partir del estado, el establecimiento del tramo a intervenir, por cuanto los recursos asignados al convenio no permitirían la intervención de todos los 203 m. Así las cosas, la OAC direcciona levantamiento topográfico entre las abscisas 2°48'49"N 76°36"31' W Y 2°48'54"N 76°36'35"W).

Durante el proceso de reconocimiento se logró identificar el punto de partida de la intervención a realizarse con la construcción de una placa huella (Inicio en Abscisa K0+203- Punto de inicio actividades de construcción- 2°48'54"N 76°36'35"W que correspondería a la abscisa final del tramo); así mismo, con el diseño entregado por la OAC se logró identificar la necesidad de construcción de alcantarilla, que según el chequeo hidráulico se puede implementar de un diámetro de 24". De esta manera,

Dentro del tramo a intervenir, no se identifican afectaciones a viviendas. Se con la suscripción del convenio con la Junta de la vereda la Estrella, municipio de la Morales; en el Departamento Del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento de un corredor vial productivo garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto. Identifica el predio hacia el cual debe descolar la alcantarilla que se proyecta construir. Además, se evidencia presencia de sección de relleno, por lo que se sugiere durante la etapa de localización y replanteo, correr hacia borde derecho la vía, para evitar que la cuneta quede sobre zona inestable. Se identifica necesidad acceso vivienda, se determina cambio sección bordillo en ese tramo.

2.5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las obras proyectadas fueron producto del programa CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas. Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas.

Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que

los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías

donde las restricciones propias de pendiente y Siendo el proyecto de mantenimiento y mejoramiento, se ampliará en lo posible la calzada con el ancho de cuatro con cinco (4,5) metros como lo indica la cartilla de construcción de Placa huellas del INVÍAS. Se tratarán de mejorar las características geométricas de los tramos de las vías como los alineamientos horizontal y vertical, los bombeos y peraltes de la superficie de las placas huellas. La vía objeto de este proyecto se encuentran catalogada como vía rural, a lo largo del proyecto 2000 metros de longitud se cuenta con curvas horizontales y verticales en el límite de los parámetros indicados en la GUIA DE DISENO DE PAVIMENTOS CON PLACAHUELLA. El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

Los principales atributos de éste tipo de pavimento son:

- Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio período de servicio.

- No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.

- No requerir mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que por condiciones de rugosidad de la superficie de éste tipo de pavimento la velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.

- Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional.

- Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales. Aun no se cuenta con la geometría ni ajustes finales para este proyecto.

En el proyecto por las condiciones del trazado de vía existente, se ve la necesidad de implementación de algunos sobreanchos de acuerdo a lo referido en los ajustes de diseños, esta consideración es tenida en cuenta durante la etapa de localización y replanteo, respetando los bordes definidos de la vía.

En el tramo fueron identificados, zonas de relleno, sobre las cuales se recomendó no realizar intervención por cuanto comprometerían la estabilidad de taludes que se encontraban circundantes. Además de ello, se evidenció la no presencia de material granular sobre subrasante, pendientes bajas, con problemas por estancamiento de aguas.



Estado de la vía durante el proceso de reconocimiento



2.6. INFORMACION DEL CONVENIO

2.6.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
No. del Convenio Solidario	4679-2023
Objeto del Convenio Solidario	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Aporte Instituto Nacional de Vías (INVIAS)	$ 198.122.246
Aporte OAC	$ 1.000.000
Valor total del Convenio Solidario	$ 199.122.246
Nombre del Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA
Representante legal	HERNAN DARIO PEÑA
Fecha de Orden de inicio	22 De Diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Prórroga 2	01 de Mayo de 2024 hasta 31 de Mayo de 2024
Prórroga 3	01 de Junio de 2024 hasta 30 de Junio de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023

Fecha de terminación vigente	30 de Junio de 2024

2.6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

- Se llevaron a cabo comités operativos para aprobación de cotizaciones, cronograma, presupuesto ajustado de acuerdo a cotizaciones y cantidades.
- Se remitieron documentos necesarios para aprobación prórroga 3 del convenio.
- Se tomaron muestras de ensayos.
- Se continua con actividades de fundición de concretos.
- Obra con cierre de fundición de placa huella hasta abcisa K0+110.
- Se verificó afiliación de personal asociado a la obra. La OAC realiza la correspondiente vinculación al sistema de SSS y ARL.
- Se suscriben formatos de autorización de desembolsos.
- Se soportan las situaciones asociadas a la obra en la correspondiente bitácora de obra y formatos de maquinaria.
- Fundición parcial de 125 ml de placahuella.



Actividfades de formaleteo



Actividades de fundición de ciclópeos



Fundición parcial placahuella k0+080



Vibrado concreto-fundición cunetas

	
Fundición de concretos	Vista intervención hasta K0+110


A corte del presente informe se tiene ejecución física con atrasos de acuerdo al cronograma presentado para el mes de Mayo. Se han solicitado reprogramación de actividades, por cuanto las lluvias que se presentan en la zona han disminuido los rendimientos y han generado interrupciones de las labores de fundición. Así las cosas, con la programación inicial para el mes de Mayo, se tiene finalmente con un atraso acumulado de 27.41%; sin embargo, se solicitó reprogramación de acuerdo a la aprobación de la prórroga 3 del convenio, por lo que el porcentaje será redistribuido para realizar las actividades de acuerdo a nuevo plazo.

Durante comité operativo se analizan las situaciones presentadas respecto de terminación de recursos para pagos de personal, con el análisis de presupuestos y plan de inversión, pues se han advertido bajos rendimientos de obra, además de las situaciones asociadas a la no disposición del mismo personal para poder terminar las actividades asociadas a la obra. Así mismo, se logran identificar por parte de interventoría algunos saldos que podrían permitir la ampliación del alcance de la obra; sin embargo, la junta manifiesta que, por temas de tiempo, indisponibilidad de personal, y de maquinaria, prefieren cumplir con el alcance determinado inicialmente, y realizar la devolución de recursos que al final no se ejecuten. Así mismo, la interventoría exige contratación de personal calificado para la terminación de la obra, debido a las observaciones que se han dado respecto de los acabados que se presentan en obra. Se decide finalmente en comité realizar contratación de nuevo maestro y un ayudante (por OPS) que permita establecer la terminación de las obras en debida forma. De acuerdo a las orientaciones dadas por parte de la Representante legal, fue aceptada petición de Junta para poder terminar las labores determinadas para el alcance pactado, pues ya estaban los materiales estipulados para tal fin.

Así las cosas, se da exigencia de uso de elementos de protección personal y de que se establecieran las medidas necesarias para poder dar terminación a la obra. La situación de


orden público dificultó la consecución de nuevo personal, la disposición de mano de obra calificada de la zona, por lo que desde el 16 de Mayo no se evidenció desarrollo de labores en obra.

Figura 7- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas del 01 al 31 de Mayo de 2024
(Porcentajes respecto a cantidades de actividad dentro del programa de obra)

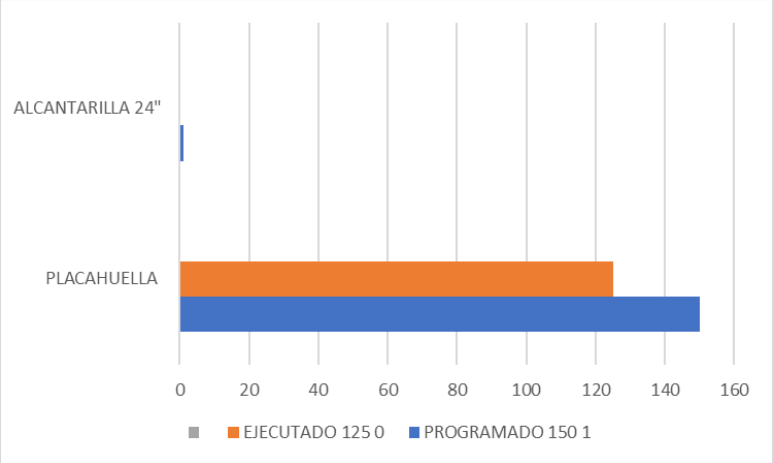

Fuente: Propia

Figura 8. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 31 de Mayo de 2024

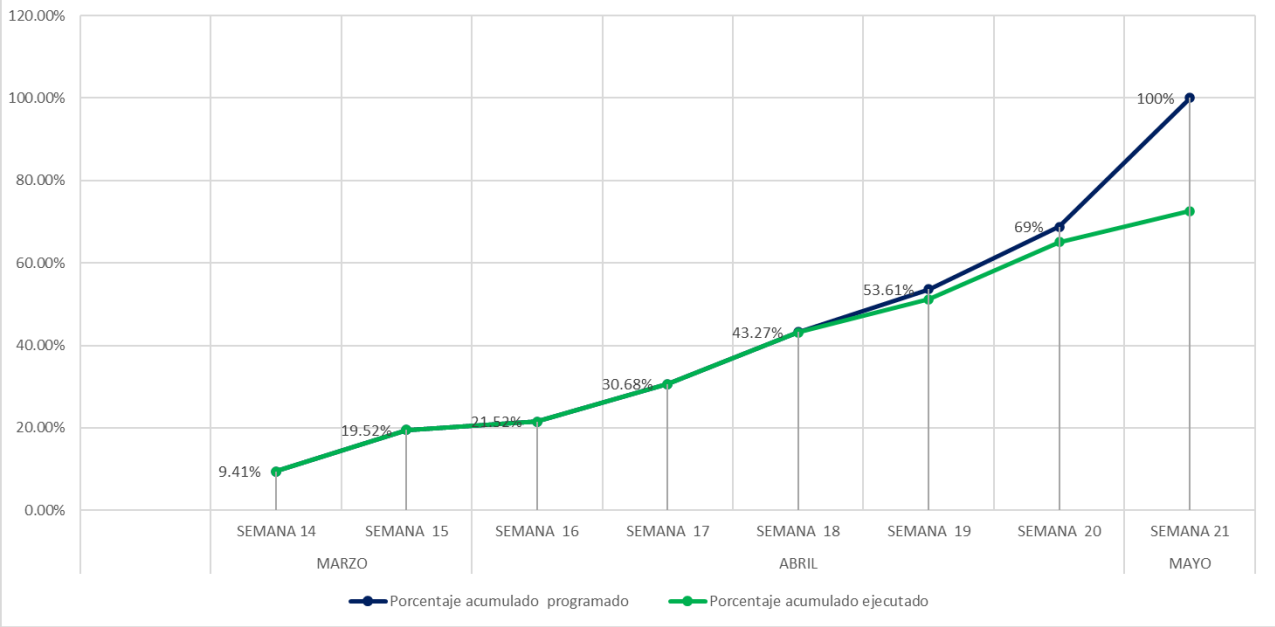

Fuente: Propia

2.6.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

De acuerdo a las consultas realizadas en la Territorial Cauca con el supervisor, no se da aplicación. Las actividades de obra, son las necesarias para cumplir las metas establecidas. El tipo de control llevado a cabo se trata específicamente de que se cumpla con el alcance de obra y de acuerdo a las especificaciones técnicas. Es así como los capítulos de obra contemplan la construcción de 150 metros lineales de placa huella y de una alcantarilla de 24"de acuerdo a la recomendación del estudio hidrológico e hidráulico.

2.6.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Realizar reunión para evaluar las situaciones financieras del convenio, respecto de pagos que se adeudan, por no presentación completa de documentos por parte de proveedores.
- Realizar reuniones con contadores de la Junta, ingenieros residentes y representante de veeduría y de la Junta para toma de decisiones respecto de ejecución de convenio.
- Suscribir plan de contingencia para que se cumpla con las actividades de obra faltantes en el último término otorgado.
- Al corte del mes de Mayo se tiene un avance de obra del 72.6%.

2.7. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

2.7.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** MAYO

CONVENIO No.: 4679 - 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 30/06/2024

VALOR INICIAL : $ 199.122.246,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.122.246,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 198.122.246,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento (Placa Huella) AJUSTADO SEGÚN COTIZACIONES	ML	150
Estructuras	Alcantarillas de 24"	UND	1
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento (Placa Huella) AJUSTADO SEGÚN COTIZACIONES	ml	53	93
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	0	0
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

Cantidad completa de placahuella reportada

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.477.671,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	1.308.342,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.336.233,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 198.122.246

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	16.985.808,00	92.746.792,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.032.484,21	19.367.495,47
VALOR EJECUTADO	21.018.292,21	112.114.287,47

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 139.077.887,40
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 92.746.792,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 66,69%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

Pagos con no cumplimiento de documentos para realizarse, proveedores para pago contraentrega

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actividades colocación aceros y formaleteo hasta K0+080



Actividades de fundición de concretos



Fundición de concreto ciloopeo



Desarrollo actividades de fundición



Fundición parcial hasta abcisa K0+080



Fundición hasta abscisa K0+110

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25222374300CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2.7.2. INFORME SEMANAL

Semana 20- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 20 del 29/04/2024 al 5/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas latitud: 2.8138, longitud: -76.6081 y punto de referencia final en el PR: 3+220 con coordenadas latitud: 2.8355, longitud: -76.6221, de la vía sector La Guayabera a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA

CONVENIO No. 4679 de 2023 VALOR INICIAL: $ 199.122.246,00

FECHA DE INICIO: 15/11/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 199.122.246,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4897 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 103.423.259,86

FECHA DE INICIO: 15/11/2023 VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 103.423.259,86

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.122.246		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 95.042.995,26		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 104.079.251		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.122.246,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 82.451.184,00	41,4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.591.811,26	6,3%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 95.042.995,26	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.947.000,00	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.122.246,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 66,93% Avance o Atraso Físico % -1,51%

Meta Física Ejecutada % 65,42%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
PLACAHUELLA	ML	150
ALCANTARILLA 24"	UND	1,00
GESTION SOCIAL	GLB	1,0

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102,00			102,00	68,0%
Ejec	100			100	66,7%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador tipo rana	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Mezcladora de concreto	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CAUCA	PERMISO MINERO: SI	X NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	1


OBSERVACIONES: Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda La Estrella.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 29 de abril al 5 de Mayo se realiza en zonas de cuneta compactación con compactador tipo rana por arrastre de material por lluvia, se realiza fundición de paños en concreto reforzado hasta K0+100, fundición de paños en concreto ciclopeo hasta k 0+095 aproximadamente y fundición de vigas riostras

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 6 al 15 de mayo se continuará con fundición de paños en concreto rigido, paños en concreto ciclopeo, cunetas y sardineles

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda la Estrella - Fundición de concreto ciclopeo



Vereda la estrella - Instalación de acero para cuneta y sardinel



Vereda la estrella - Conformación de subbase en cuneta de acuerdo a pendiente

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 21- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1

FECHA: 11/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 21 del 6/05/2024 al 11/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas latitud: 2.8138, longitud: -76.6081 y punto de referencia final en el PR: 3+220 con coordenadas latitud: 2.8355, longitud: -76.6221, de la vía sector La Guayabera a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA		
CONVENIO No.	4679 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.122.246,00
FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.122.246,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.423.259,86
FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103.423.259,86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.122.246		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 107.871.803		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 91.250.443		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.122.246,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 95.279.992,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.591.811,26	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 107.871.803,26	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.828.808,00	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.122.246,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 80,06% Avance o Atraso Físico % -3,81%
Meta Física Ejecutada % 76,25%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* PLACAHUELLA	ML	150
ALCANTARILLA 24"	UND	1
GESTION SOCIAL	GLB	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	130,00			130	86,7%
Ejec	125			125	83,3%
Prog					
Ejec					
Prog					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibrocompactador	1	1
Vibrador de concreto	1	1
rana vibratoria	1	1
trompo	1	1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CAUCA	PERMISO MINERO: SI	X NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	1


OBSERVACIONES: Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda La Estrella.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 6 al 11 de mayo se realiza fundición Parcial de paños en concreto reforzado hasta K0 + 075, con formaleteo hasta abscisa k0+080 Aproximadamente.

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 16 al 19 de mayo se continuará con fundición de paños en concreto rígido, paños en concreto ciclopeo, cunetas y sardineles

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda la Estrella - Fundición de paños en concreto reforzado



Vereda la estrella - Vibrado de concreto para cunetas



Vereda la estrella - Actividades de formaleteo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 22- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 18/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 22 del 12/05/2024 al 18/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas latitud: 2.8138, longitud: -76.6081 y punto de referencia final en el PR: 3+220 con coordenadas latitud: 2.8355, longitud: -76.6221, de la vía sector La Guayabera a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA

CONVENIO No.	4679 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.122.246,00
FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.122.246,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.423.259,86
FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103.423.259,86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.122.246		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 107.871.803		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 91.250.443		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.122.246,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 95.279.992,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.591.811,26	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 107.871.803,26	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.828.808,00	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.122.246,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 80,06% Avance o Atraso Físico % -3,81%
Meta Física Ejecutada % 76,25%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* PLACAHUELLA	ML	150
ALCANTARILLA 24"	UND	1
GESTION SOCIAL	GLB	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	130,00			130	86,7%
Ejec	125			125	83,3%
Prog					
Ejec					
Prog					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibrocompactador	1	1
Vibrador de concreto	1	1
rana vibratoria	1	1
trompo	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CAUCA	PERMISO MINERO: SI	X NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	1


OBSERVACIONES: Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda La Estrella en el mes de Marzo

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 12 al 15 de mayo se termina fundición de paños en concreto reforzado hasta K0+ 080, fundición de concreto ciclopeo hasta k 0+65 aproximadamente y terminación fundición de cunetas hasta k0+080 aproximadamente.
Personal en obra hasta 15 de Mayo de 2024

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 16 al 19 de mayo se continuará con fundición de paños en concreto rígido, paños en concreto ciclopeo, cunetas y sardineles

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



continuidad actividades de fundición ciclopeos y losas



Fundición completa hasta abscisa K0+080

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 252237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 23- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 25/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 23 del 19/05/2024 al 25/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas latitud: 2.8138, longitud: -76.6081 y punto de referencia final en el PR: 3+220 con coordenadas latitud: 2.8355, longitud: -76.6221, de la vía sector La Guayabera a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA			INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.		
				INTEGRANTES:	UNICO		
CONVENIO No.	4679 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.122.246,00	CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.423.259,86
FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.122.246,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103.423.259,86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.122.246		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 111.818.803		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 87.303.443		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.122.246,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 97.995.992,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 13.822.811,26	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111.818.803,26	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.947.000,00	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.122.246,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% Avance o Atraso Físico % -23,75%
Meta Física Ejecutada % 76,25%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* PLACAHUELLA	ML	150
ALCANTARILLA 24"	UND	1
GESTION SOCIAL	GLB	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	130,00			130	86,7%
Ejec	125			125	83,3%
Prog	1,00			1	100,0%
Ejec					
Prog					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora de llantas	1	1
Vibrocompactador	1	1
Vibrador de concreto	1	1
rana vibratoria	1	1
trompo	1	1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CAUCA	PERMISO MINERO: SI	X NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	O
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	O
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI	1

OBSERVACIONES: Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda La Estrella.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Desde el 16 de Mayo no se tiene vinculación de personal en obra. A la fecha se ha realizado fundición parcial de 125 ml de placahuella

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
la OAC deberá remitir documentos de afiliación para poder vincular a personal y continuar con actividades de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Se mantiene



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NA	NA	NA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.
Solicitud suscripción plan de contingencia.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 24. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 24 del 26/05/2024 al 1/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda La Estrella, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas latitud: 2.8138, longitud: -76.6081 y punto de referencia final en el PR: 3+220 con coordenadas latitud: 2.8355, longitud: -76.6221, de la vía sector La Guayabera a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA			INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.		
				INTEGRANTES:	UNICO		
CONVENIO No.	4679 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.122.246,00	CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.423.259,86
FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	-	FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.122.246,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103.423.259,86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.122.246		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 112.114.287		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 87.007.959		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.122.246,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 97.995.992,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14.118.295,47	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112.114.287,47	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 295.484,21	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.122.246,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% Avance o Atraso Físico % -23,75%
Meta Física Ejecutada % 76,25%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* PLACAHUELLA	ML	150
ALCANTARILLA 24"	UND	1
GESTION SOCIAL	GLB	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	130,00			130	86,7%
Ejec	125			125	83,3%
Prog	1,00			1	100,0%
Ejec					
Prog					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora de llantas	1	1
Vibrocompactador	1	1
Vibrador de concreto	1	1
rana vibratoria	1	1
trompo	1	1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CAUCA	PERMISO MINERO: SI	X NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	1

OBSERVACIONES: Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda LaEstrella en el mes de marzo


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Desde el 16 de Mayo no se tiene vinculación de personal en obra. A la fecha se ha realizado fundición parcial de 125 ml de placahuella

EL CONTRATISTA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
la OAC deberá remitir documentos de afiliación para poder vincular a personal y continuar con actividades de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Se mantiene



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NA	NA	NA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.
Solicitud suscripción plan de contingencia.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Matricula Profesional No.: 252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA S.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

2.7.3. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

La maquinaria y equipo utilizado durante el periodo reportado en el presente informe se encuentra detallado en los formatos de informe semanal y en Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-24
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4679 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESTRELLA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4897 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Retroexcavadora de llantas	hyundai	100 hp																																
Vibrocompactador	Hyundai	131 hp																																
Rana vibratoria	enermax	5,5 hp		A	A	I	A		I	A	A	A	I	A	I	I	I	I																
vibrador de concreto	condustrial	2,4 hp		I	A	A	I		A	I	I	I	A	I	A	A	A	A																
trompo	Toyama XP	13 hp		I	A	A	I		A	I	I	I	A	I	A	A	A	A																
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																
TOTAL ACTIVO				1	10	15			10		1	1	8	4	8	6	10	12																
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO				23	14	9	24		14	24	23	23	16	20	16	18	14	12																

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	336	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	86	26%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	250	74%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): La inactividad de los equipos se debe a que las actividades en las que se requieren no son constantes por lo que se presentara dicha inactividad

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JUAN FELIPE OSORIO RIOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: VIVIAN ANDREA GALINDO S
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-301186 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2.7.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

El personal que laboró para la obra durante el periodo de Mayo de 2024.

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4679 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4897-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
2	arturo arboleda hurtado	76291977	Maestro	$ 2,500,000	x x x x x x x x x x x x x x x	J.A.C ESTRELLA	$ 1,250,000	$ 87,000	V	ASMET SALUD	946842966	$ 156,250	PORVENIR	946842966	$ 200,000	$ 50,000	$ 25,000	$ 37,500	
3	sandra camila tombe guevara	1007352641	Obrero	$ 1,300,000	x x x x x x x x x x x x x x x	J.A.C ESTRELLA	$ 650,000	$ 45,240	V	ASMET SALUD	946842966	$ 81,250	PORVENIR	946842966	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
4	duvan alfredo bermudez trochez	1059604552	Obrero	$ 1,300,000	x x x x x x x x x x x x x x x	J.A.C ESTRELLA	$ 650,000	$ 45,240	V	ASMET SALUD	946842966	$ 81,250	COLPENSIONES	946842966	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
5	arley dagua pavi	1061538299	Obrero	$ 1,300,000	x x x x x x x x x x x x x x x	J.A.C ESTRELLA	$ 650,000	$ 45,240	V	AIC	946842966	$ 81,250	PORVENIR	946842966	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
6	didimo polanco paz	1059601992	Obrero	$ 1,300,000	x x x x x x x x x x x x x x x	J.A.C ESTRELLA	$ 650,000	$ 45,240	V	NUEVA EPS	946842966	$ 81,250	PORVENIR	946842966	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
8	Juan felipe osorio rios (*)	1059601568	ing residencial	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Juan Felipe Osorio	$ 1,400,000	$ 97,440	V	NUEVA EPS	9468130787-946	$ 175,000	PORVENIR	9468130787	$ 224,000	$ -	$ -	$ -	
9	Arley danilo velasco sanchez (*)	1059597060	contador	$ 1,400,000	X X X X X X X X X X X	Arley Danilo Velasco	$ 1,300,000			SANITAS	9467810913	$ 162,500	PORVENIR	9467810913	$ 208,000	$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Juan Felipe O.
Firma
Nombre: Juan Felipe Osorio Rios
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Vbo.
Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2.7.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se diligencia información general de acuerdo al formato suministrado por la Territorial; sin embargo, se encuentra en revisión, por cuanto para el caso particular de este tipo de convenios, no se tramitan actas de pago parcial, sino que se realiza la administración de un desembolso.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4679 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LA ESTRELLA, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

MES INFORME MENSUAL: MARZO — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4897 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		PROGRAMA CAMINOS		NACIÓN	4679/2023	$ 198.122.246	
		JAC VEREDA LA ESTRELLA		PROPIOS	4679/2023	$ 1.000.000	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.122.246,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2.7.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4679 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESTRELLA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	19	17	18	16		20	18	14	18	20	19		17	16	19	15																246
Lluvias moderadas						4			6					4	5	9																28
Lluvias intensas	5	7	6	8			6	10		4	5		7	4																		62
Total horas	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24																

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
En campo de las semanas de 16 de Mayo a 30 de Mayo no existió ejecución de actividades de obra.

Juan Felipe O.

Firma
Nombre: JUAN FELIPE OSORIO RIOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma
Nombre: VIVIAN ANDREA GALINDO S
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-301186 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2.7.7. ENSAYOS DE LABORATORIO

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se detallan los resultados de ensayos de realizados, no han sido entregados los resultados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: 4679 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	3/05/2024	Toma de cilindros de concreto	INV-E-402	Fundición cunetas k0+150 - k0+200	4	3000 PSI			
2	6/05/2024	Toma de cilindros de concreto	INV-E-402	Fundición concreto reforzado k0+150 - k0+120	4	3000 PSI			
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
Junta aún no entrega resultados de ensayos de cilindros, ya han sido solicitados.

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma: Juan Felipe O.
Nombre: JUAN FELIPE SORIO RIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2.7.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Las pólizas correspondientes al periodo, han sido cargadas al Secop II por parte de las Oac, se realizaron solicitudes para cargue con recibo de pago para que se considerara completo el trámite. Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4679 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199,122,246.00

VALOR ACUMULADO: $ 199,122,246.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4897-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39,824,450	28	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9,956,112.50	28	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59,736,675.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026235

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	117%	$ 232,000,000	28	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005569 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20.00%	$ 39,824,450.00	29	12	2023	2	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5.00%	$ 9,956,112.50	29	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.00%	$ 59,736,675.00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026235

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20.00%	$ 39,824,450.00	30	4	2024	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5.00%	$ 9,956,112.50	29	12	2023	31	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.00%	$ 59,736,675.00	31	5	2024	31	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026235

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260,000,000.00	28	11	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005569 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260,000,000.00	28	11	2023	31	5	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005569 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Los anexos 01 y 02 de cada una de las pólizas se encuentran pendientes por aprobar en SECOP II. Se realizó verificación de que las mismas fueran cargadas por la OAC.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

2.5.9.1. SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 se consolida la información relacionada con el plan de inversión modificado y aprobado por comité operativo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 01/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4679 - 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4897-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

JUSTIFICACIÓN:
Se planea comprar el primer mes parte de los materiales para garantizar ejecucion de obra dada la demora en el proceso del desembolso y la logistica del sitio de obra. Es necesario el ajuste de acuerdo al último balance realizado de acuerdo a orientaciones de la Territortial Cauca de reinversión de recursos correspondientes al PAGA, así mismo por ajuste de APU de acuerdo a las cotizaciones de la zona.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES (Incluido transporte)	$ 65.930.685,00	$ 45.272.569,00	$ 5.898.776,38		$ 117.102.030,38	67,65%
2-3	ALQUILER DE MAQUINARIA+EQUIPOS	$ -	$ 10.314.912,40			$ 10.314.912,40	6,28%
4	COSTO DE PERSONAL	$ 7.093.525,00	$ 10.466.196,00	$ 7.501.007,22		$ 25.060.728,22	10,68%
5	DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON)	$ 1.889.300,00	$ -	$ -		$ 1.889.300,00	1,15%
6	REINTEGRO POLIZA (ADMON)	$ -	$ 1.421.143,00	$ 246.856,20	$ -	$ 1.667.999,20	0,86%
7	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON)	$ 5.030.000,00	$ 4.330.000,00	$ 4.330.000,00		$ 13.690.000,00	5,69%
8	MAESTRO DE OBRA (ADMON)	$ 2.073.997,00	$ 4.147.953,00	$ 4.977.525,80		$ 11.199.475,80	3,79%
9	MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON)		$ 180.000,00			$ 180.000,00	0,11%
10	GASTOS BANCARIOS (ADMON)	$ 620.629,00	$ 620.629,00			$ 1.241.258,00	0,76%
11	EXAMEN INGRESO PERSONAL (ADMON)	$ 175.000,00				$ 175.000,00	0,11%
12	SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON)	$ 1.000.000,00	$ 200.000,00			$ 1.200.000,00	0,73%
13	PAPELERIA (ADMON)		$ 750.000,00			$ 750.000,00	0,46%
14	ENSAYO LABORATORIO (ADMON)		$ -	$ 3.885.000,00		$ 3.885.000,00	0,00%
15	REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS (ADMON)			$ 5.194.000,00		$ 5.194.000,00	0,00%
16	TOPOGRAFIA (ADMON)		$ 2.650.000,00			$ 2.650.000,00	1,61%
17	VALLA (ADMON)	$ 214.200,00	$ -			$ 214.200,00	0,13%
18	BODEGA (ADMON)			$ 400.000,00		$ 400.000,00	0,00%
19	GESTION SOCIAL			$ 1.308.342,00		$ 1.308.342,00	
	TOTAL	**$ 84.027.336,00**	**$ 80.353.402,40**	**$ 33.741.507,60**	$ -	**$ 198.122.246,00**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Herman Dario Peña
Nombre: **Herna Dario Peña**
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 4.722.036

Firma: MABEL PEREZ
Nombre: Leidy Mabel Perez Chud
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: Juan Felipe O.
Nombre: **Juan Felipe Osorio Rios**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

2.5.9.2. BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO.

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-2 por parte de contador de la Junta fue registrado cada uno de los pagos realizados para el desarrollo del convenio, durante el mes de Mayo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MORALES CAUCA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4679 - 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 198,122,246.00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4897-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA ELECTRONICA	NOM 14	30-abr-24	ARTURO ARBOLEDA HURTADO	$ 1,231,000.00	8	MAESTRO DE OBRA (ADMON)
NOMINA ELECTRONICA	NOM 15	30-abr-24	SANDRA CAMILA TOMBE GUEVARA	$ 679,000.00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 16	30-abr-24	DUVAN ALFREDO BERMUDEZ TROCHEZ	$ 679,000.00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 17	30-abr-24	ARLEY DAGUA PAVI	$ 679,000.00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM 18	30-abr-24	DIDIMO POLANCO PAZ	$ 679,000.00	4	COSTO PERSONAL
FACTURA ELECTRONICA	FESF22510	7-may-24	SOLUCIONES INTEGRALES EVA SAS	$ 1,565,408.00	1	MATERIALES
CUENTA DE COBRO ELECTRONIC	DSEE12	7-may-24	MARISOL SUAREZ ARCE	$ 6,658,500.00	1	MATERIALES
CONSIGANCION	RECIBO DE PAGO 4910794709974	7-may-24	BANCO AVVILLAS	$ 631,000.00	1	MATERIALES (PAGO RETEFUENTE
CONSIGNACION	RECIBO DE PAGO 4910794709974	7-may-24	BANCO AVVILLAS	$ 40,000.00	5	DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON) PAGO RETEFUENTE
CONSIGNACION	RECIBO DE PAGO 4910794709974	7-may-24	BANCO AVVILLAS	$ 26,000.00	14	ENSAYO LABORATORIO (ADMON) PAGO RETEFUENTE
CONSIGNACION	PLANILLA 9466857973-9466859753	7-may-24	HERNA DARIO PEÑA	$ 1,111,500.00	8	MAESTRO DE OBRA (ADMON) SEGURIDAD SOCIAL
CONSIGNACION	PLANILLA 9466857973-9466859753	7-may-24	HERNA DARIO PEÑA	$ 2,698,900.00	4	COSTO PERSONAL (PAGO SEGURIDAD SOCIAL)
CONSIGNACION	PLANILLA 9466857973-9466859753	7-may-24	HERNA DARIO PEÑA	$ 97,500.00	7	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON) SEGURIDAD SOCIAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM0019	19-may-24	ARTURO ARBOLEDA HURTADO	$ 1,231,000.00	8	MAESTRO DE OBRA (ADMON)
NOMINA ELECTRONICA	NOM0020	19-may-24	SANDRA CAMILA TOMBE GUEVARA	$ 679,000.00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM0021	19-may-24	DUVAN ALFREDO BERMUDEZ TROCHEZ	$ 679,000.00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM0022	19-may-24	ARLEY DAGUA PAVI	$ 679,000.00	4	COSTO PERSONAL
NOMINA ELECTRONICA	NOM0023	19-may-24	DIDIMO POLANCO PAZ	$ 679,000.00	4	COSTO PERSONAL
CONCILIACION MAYO	5	31-may-24	BANCO AVVILLAS	$ 211,746.00	10	GASTOS BANCARIOS (ADMON)
CONCILIACION MAYO	5	31-may-24	BANCO AVVILLAS	$ 83,738.21	10	GASTOS BANCARIOS (ADMON) GMF

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES (incluido transporte)	$ 117,102,030.38	$ 65,931,384.00	$ 8,854,908.00	$ 74,786,292.00	$ 42,315,738.38
2-3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 10,314,912.40				$ 10,314,912.40
4	COSTO PERSONAL	$ 25,060,728.22	$ 9,829,600.00	$ 8,130,900.00	$ 17,960,500.00	$ 7,100,228.22
5	DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON)	$ 1,889,300.00	$ 1,849,269.00	$ 40,000.00	$ 1,889,269.00	$ 31.00
6	REINTEGRO POLIZA (ADMON)	$ 1,667,999.20			$ -	$ 1,667,999.20
7	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 13,690,000.00	$ 5,030,000.00	$ 97,500.00	$ 5,127,500.00	$ 8,562,500.00
8	MAESTRO DE OBRA (ADMON)	$ 11,199,475.80	$ 3,055,200.00	$ 3,573,500.00	$ 6,628,700.00	$ 4,570,775.80
9	MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON)	$ 180,000.00			$ -	$ 180,000.00
10	GASTOS BANCARIOS (ADMON)	$ 1,241,258.00	$ 763,842.26	$ 295,484.21	$ 1,059,326.47	$ 181,931.53
11	EXAMEN MEDICO INGRESO PERSONAL	$ 175,000.00	$ 175,000.00		$ 175,000.00	$ -
12	SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON)	$ 1,200,000.00	$ 1,000,000.00		$ 1,000,000.00	$ 200,000.00
13	PAPELERIA (ADMON)	$ 750,000.00			$ -	$ 750,000.00
14	ENSAYO LABORATORIO (ADMON)	$ 3,885,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,885,000.00
15	REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS (ADMON)	$ 5,194,000.00	$ 747,500.00	$ 26,000.00	$ 773,500.00	$ 4,420,500.00
16	TOPOGRAFIA (ADMON)	$ 2,650,000.00	$ 2,500,000.00		$ 2,500,000.00	$ 150,000.00
17	VALLA (ADMON)	$ 214,200.00	$ 214,200.00		$ 214,200.00	$ -
18	BODEGA (ADMON)	$ 400,000.00			$ -	$ 400,000.00
19	GESTION SOCIAL	$ 1,308,342.00			$ -	$ 1,308,342.00
	TOTALES	**$ 198,122,246.00**	**$ 91,095,995.26**	**$ 21,018,292.21**	**$ 112,114,287.47**	**$ 86,007,958.53**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (abril) : $ 785.70
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 3,183.55
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Algunos valores debieron ser consignados al presidente de la JAC para que con celeridad pudiera desarrollar las consignaciones y pagos de planillas de seguridad social, al no tener habilitado Botón PSE, se dispone de recibos de pago, el cual reposa en el archivo los respectivos pagos.

Se deja claridad que al corte de diligenciamiento del formato de seguimiento desembolso del mes de Abril no se contaba con el extracto bancario que permitiera registrar con exactitud los gastos bancarios, por lo que los mismos fueron sumados en el corte del presente seguimiento. Así mismo, por error involuntario se registro el valor de $130.000 correspondientes al pago de ARL del ingeniero residente de obra en los costos de personal, cuando realmente sumaban a costos Administrativos, por lo que en el presente formato se realizan las correcciones correspondientes, totalizando los valores que efectivamente a la fecha se han pagado por concepto de cada uno de los programas de inversión. El formato se diligencia con apoyo de profesional contable, según extracto bancario entregado por Banco. Así mismo, se deje claridad que interventoria ha realizado requerimientos a OAC para consignación de rendimientos financieros, comaprtiendo procedimiento determinado por la Territorial Cauca, a la fecha pendiente de cumplimiento.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Hernan Dario Peña
Nombre: Hernan Dario Peña
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: Mabel Perez
Nombre: Leydi Mabel Perez Chud
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: Juan Felipe O.
Nombre: Juan Felipe osorio Rios
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 19202-316403 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

2.5.9.3. COPIA ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO.

Se adjunta copia de las actas de comité Operativo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

VEREDA AGUA BONITA



Imagen: Vereda Agua Bonita Municipio de Morales Cauca.

CONVENIO SOLIDARIO N° 4726 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

3. CONVENIO 4726 DE 2023-AGUA BONITA

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

En el convenio solidario número 4726 de 2023, **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.** El instituto nacional de vías requiere materializar alianzas con actores estratégicos del nivel local, que cooperen desde diversas aristas en el marco de la ejecución de proyectos potenciales de infraestructura a cargo del INVIAS, con el propósito de generar desarrollo en las regiones, conectividad y competitividad, para lo cual se requiere el concurso de diversos actores como es el caso de los organismos de acción comunal. Que durante las últimas décadas gran parte de los recursos de inversión en infraestructura vial de los países en desarrollo en general, y de Colombia en particular, se ha concentrado en la construcción y conservación de los corredores viales principales y aunque se han realizado grandes esfuerzos en cuanto a vías de segundo y tercer nivel, los mismos no han sido suficientes para satisfacer las necesidades de las comunidades en cuanto a conectividad vial. Derivado de lo anterior, se ha generado un rezago en el desarrollo relativo de las regiones, frente a lo cual se pretende lograr un desarrollo equilibrado de las redes principales, secundarias y terciarias que tenga en cuenta las necesidades no sólo de inversión sino también de mantenimiento.

Que en atención a la autorización estatuida por el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 para la selección directa del Organismo de Acción Comunal con el cual se ejecuta EL PROYECTO, resulta aplicable en este caso lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública para esa modalidad de selección. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el OAC (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el CONVENIO por celebrarse se regirá principalmente por la Ley 2166 de 2021; en lo que le sea aplicable por los decretos ley 393 de 1991 y 591 de 1991, y el decreto 092 de 2017; y subsidiariamente por la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.


Las obras en el tramo priorizado a intervenir se ejecutan en el marco del convenio solidario número 4726 de 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de vereda de las Agua Bonita del municipio Morales Cauca, y la interventoría está a cargo de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS mediante el contrato No. 4897 de 2023 celebrado con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

3.2. LOCALIZACIÓN

El municipio de Morales se encuentra localizado en el Departamento del Cauca, a 41 km de la ciudad capital del departamento Cauca. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con productos como el café, la caña de azúcar, el maíz, el plátano igualmente, la ganadería, la minería de oro, carbón y la explotación forestal.

De acuerdo a lo establecido en el plan vial Municipal de Morales Cauca (2019) existen aproximadamente un total de 245 km de vías terciarias, de los cuales sólo 4.37 km se encuentra pavimentada, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales. El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR: 0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS de la vía denominada Vía Agua Bonita con código 19473-002.

Figura 9.Localización del Municipio de Morales

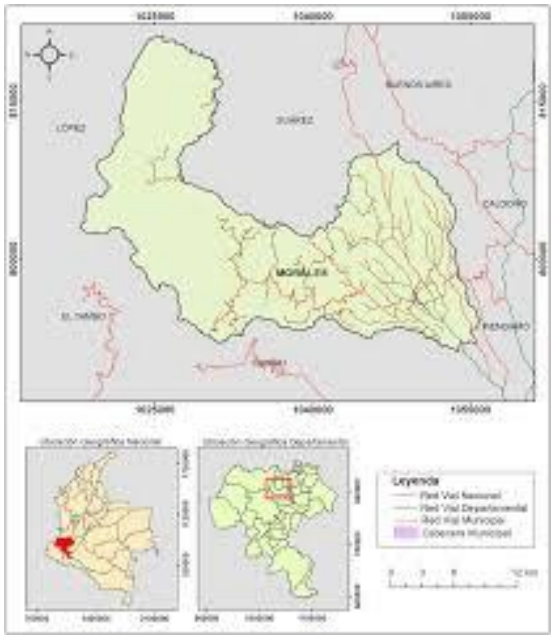

Fuente: (Gobernación del Cauca, 2024)

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente. Según el alcance de la longitud corredor (km) del proyecto que se priorizo por Instituto Nacional de Vías – INVIAS, las abscisas K00+000 a la K0+843 (843 m) como se observa en la figura 1 sin embargo el punto de intervención de acuerdo a lo concluido en la etapa de revisión de estudios y diseños y a lo determinado como la necesidad sentida de la comunidad está dado entre las coordenadas 2°48'48"N 76°38'54"W y 2°48'51"N 76°38'51"W.

Figura 10.Localización del tramo a intervenir



Fuente: adaptado de Informe Estudios y Diseños

3.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía que conduce de la vereda Agua Bonita con veredas aledañas como las Guacas, la Estación, el Danubio, vía principal que de Morales conduce a cabecera Municipal de Morales y vía que conecta que conecta con vía que conduce al Municipio de Suarez, así durante el proceso de estructuración de la ficha técnica por parte del INVIAS se identificaron los sectores críticos a lo largo de un tramo con una longitud de 843 metros, el cual en su mayoría se encuentra en pendientes alta y mal estado, con ausencia de obras de drenaje que permitan la conservación del tramo. Con el fin de verificar el estado actual de las obras de drenaje a lo largo del tramo objeto del mejoramiento vial, se llevó a cabo una visita de reconocimiento en compañía de la OAC de tal manera que se pudiera determinar a partir del estado, el establecimiento del tramo a intervenir, por cuanto los recursos asignados al convenio no permitirían la intervención de todos los 843 m.

Durante el proceso de reconocimiento se logró identificar el punto de partida de la intervención a realizarse con la construcción de una placa huella (Inicio en Abscisa K0+132.94-Punto de inicio actividades de construcción- 2°48'51"N 76°38'51"W), así mismo, con el diseño entregado por la OAC se logró identificar la necesidad de construcción de alcantarilla, que según el chequeo hidráulico se debe implementar de un diámetro de 36". De esta manera, con la suscripción del convenio con la Junta de la vereda Agua Bonita, municipio de la Morales; En El Departamento Del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento de un corredor vial productivo garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

Dentro del tramo a intervenir, no se identifican afectaciones a viviendas.





Registros estados iniciales del corredor-sobre las abscisas priorizadas para intervención

3.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las obras proyectadas fueron producto del programa CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas. Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que

permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas.

Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías

donde las restricciones propias de pendiente y Siendo el proyecto de mantenimiento y mejoramiento, de acuerdo a los diseños entregados se tiene una sección total de 5.55 m incluidas la sección de cuneta, siendo esta una sección típica en la abscisa k0+090. Se tratarán de mejorar las características geométricas de los tramos de las vías como los alineamientos horizontal y vertical, los bombeos y peraltes de la superficie de las placas huellas. La vía objeto de este proyecto se encuentran catalogada como vía rural, a lo largo del proyecto se cuenta con curvas horizontales y verticales en el límite de los parámetros indicados en la GUIA DE DISENO DE PAVIMENTOS CON PLACAHUELLA; sin embargo fue indicado en los diseños que por temas asociados a la no disponibilidad de espacios, los sobreanchos no estarían ajustados al tope de lo determinado en la guía; sin embargo, se busca garantizar la adecuada movilidad y seguridad en las secciones que presentan curvas, por lo que los diseños arrojaron secciones tipo de modulación con poca presencia de concreto ciclópeo. El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo vehicular.

Los principales atributos de éste tipo de pavimento son:

- Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio período de servicio.

- No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.

- No requerir mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que por condiciones de rugosidad de la superficie de éste tipo de pavimento la velocidad de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja velocidad es un control implícito de la accidentalidad.

- Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional.

- Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales. Aun no se cuenta con la geometría ni ajustes finales para este proyecto.

3.5. INFORMACION DEL CONVENIO

3.5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
No. del Convenio Solidario	4726-2023
Objeto del Convenio Solidario	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Aporte Instituto Nacional de Vías (INVIAS)	$ 199.103.293
Aporte OAC	$ 1.000.000
Valor total del Convenio Solidario	$ 200.103.293
Nombre del Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA
Representante legal	ISRAEL MUÑOZ
Fecha de Orden de inicio	21 De Diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de Junio de 2024

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se llevo a cabo comité operativo para aprobación pagos y determinación de situaciones asociadas a la culminación de la vinculación de nómina proyectada.
- Se diligenciaron y remitieron documentos necesarios para aprobación prórroga 3 del convenio.
- Se tomaron muestras de ensayos por parte de la JAC de resistencias concretos.

- Se realizaron actividades de formaleteo y fundición de concretos, losas, cunetas y bordillos.
- Obra con cierre de fundición de placa huella de 124 ml y se inician excavaciones para estructura salida de alcantarilla.



Comité operativo desarrollado

- Se verificó afiliación de personal asociado a la obra. La OAC realiza la correspondiente vinculación al sistema de SSS y ARL.
- Se suscriben formatos de autorización de desembolsos de acuerdo a lo aprobado en plan de inversión y cotizaciones.
- Se soportan las situaciones asociadas a la obra en la correspondiente bitácora de obra, estado tiempo y de equipo.
- Se presentan inconvenientes para continuidad de ejecución de la obra por no disposición de personal, situaciones de alteración de orden público que no permite despacho de concretos hasta la zona, además según la evaluación realizada conjuntamente con residente y contadora la nómina sólo quedo disponible hasta 15 de Mayo de 2024.



Carreteo concreto premezclado



Actividades de fundición de concretos losas y cunetas

	
Actividades formaleteo y colocación de aceros k0+090-k0+124	Actividades de fundición concretos k0+090-k0+124
	
Disposición de formaleta y aceros	Fundición de concretos hasta abscisa k0+124 parcial




Actividades de fundición terminadas

A corte del presente informe se tiene ejecución física de 80.16% con atrasos de acuerdo al cronograma presentado que ascienden a un porcentaje de 19.84%. Actividades de obra,

desarrolladas hasta el 15 de Mayo, cuando personal fue desvinculado por vencimiento de contratos, no disposición de personal. Se solicitó vinculación y afiliación de personal para poder dar continuidad a las actividades de obra. Se han solicitado reprogramaciones de actividades, teniendo en cuenta la prórroga número 3 que va hasta el 30 de Junio de 2024. Por otro lado, frente al evento de alteración de orden público presentado el 20 de Mayo de 2024, donde se presentaron ataques con artefactos explosivos en el Municipio, con afectación en vía principal que comunica al Municipio de Morales, por otro lado durante las últimas semanas de Mayo se desactivan artefactos dejados sobre vías aledañadas a estación de policía, proveedores no ingresan a la zona, personal se retira de la zona de trabajo.


Figura 11- Esquema porcentajes de ejecución actividades desarrolladas del 01 al 31 de Mayo de 2024 (Porcentajes respecto a cantidades de actividad dentro del programa de obra)-Agua Bonita

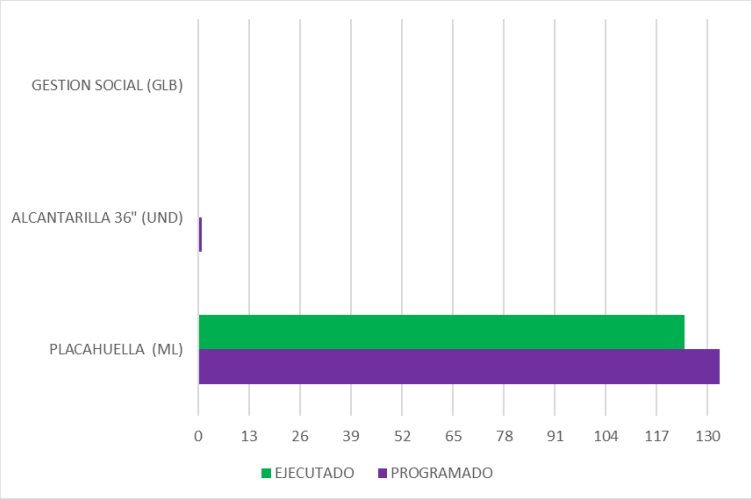

Fuente: Propia

Nota: El reporte se consolida con las actividades de obra acumuladas ejecutadas en su totalidad, no actividades parciales. Así mismo, se indica que el porcentaje de atraso reportado está dado con la programación que se tenía dada hasta 31 de Mayo, al corte del informe la JAC no había presentado reprogramación de obra.

Figura 12. Porcentajes acumulados respecto de los costos asociados a obra periodo 01 al 31 de Mayo de 2024-Agua Bonita

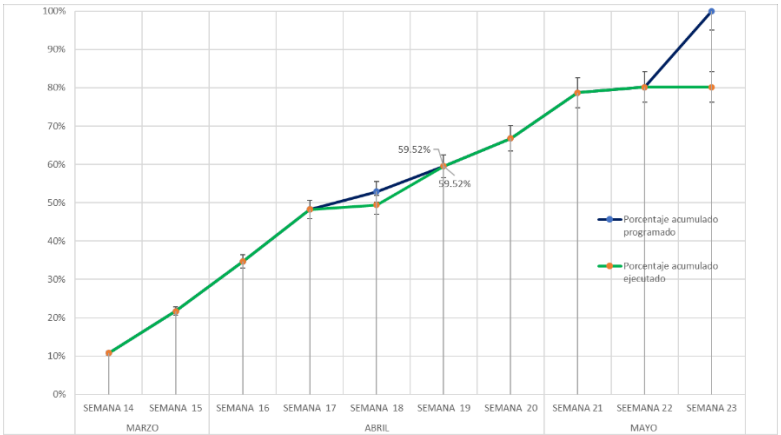

Fuente: Propia

3.5.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

De acuerdo a las consultas realizadas en la Territorial Cauca y según recomendación del estudio hidrológico e hidráulico se tramita inclusión de ítem asociado a realización de alcantarilla en material tipo PVC de 36" y un disipador; así mismo, de acuerdo a los estudios y diseños y a las especificaciones mismas se identifica la necesidad de inclusión de ítem de corte y sello de juntas. Por otro lado, se realizaron ajustes de APU de acuerdo a los precios y tipos de equipos que se disponían en la zona. Sin embargo, de acuerdo a directriz dada por supervisor del contrato de interventoría, estas actividades no hacen parte de documentos o actas que se exijan para este tipo de convenios.

3.5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Realizar diferentes reuniones junto a los ingenieros residentes de obra para definir las mejores estrategias en la ejecución del convenio.
- Realizar diferentes asesorías a los ingenieros residentes para la entrega oportuna de informes.
- Realizar reuniones con contadores de la Junta, ingenieros residentes y representante de veeduría y de la Junta para poder transmitir las recomendaciones dadas desde la Territorial Cauca, respecto de las situaciones que se han presentado durante la ejecución.
- Solicitar la realización de pagos pendientes a proveedores que ya han prestado los servicios de maquinaria, materiales, estudios, entre otros.

3.6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

3.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** MAYO

CONVENIO No.: 4726 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA BONITA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 31/05/2024

VALOR INICIAL : $ 199.103.293,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.103.293,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 198.103.293,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTO** JORGE MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento (Placa Huella) AJUSTADO SEGÚN COTIZACIONES	ML	133
Estructuras	Alcantarillas de 24"	UND	1
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento (Placa Huella) AJUSTADO SEGUN	ML	34	124
Estructuras	Alcantarillas			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

Avance placahuella parcial

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 159.451.471
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 1.000.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 38.651.822
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.103.293

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 12.059.367,00	$ 105.056.480,75
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 10.381.534,98	$ 27.236.523,75
VALOR EJECUTADO	$ 22.440.901,98	$ 132.293.004,50

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 159.451.471,05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 105.056.480,75
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 65,89%

El valor registrado corresponde al componente financiero

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERA: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actividades de formaleteo



Actividades colocación aceros y formaleto





Actividades de excavación alcantarilla e inicio actividades formaleteo





Actividades fundición de cunetas y formaleteo hasta abscisa k0+133



Finalización actividades fundición mes de Mayo

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 252223743OCND

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3.6.2. INFORME SEMANAL

Semana 20- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 4/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 20 del 28/04/2024 al 4/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR:0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

CONVENIO No. 4726 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200.103.293.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200.103.293.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.
INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4897 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 103.423.259.86
FECHA DE INICIO: 15/11/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 103.423.259.86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 200,103,293		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 109,062,145		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 91,041,148		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,103,293	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93,616,213.75	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15,445,931.00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 109,062,144.75	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones: La programación financiera aunque se encuentra programada mensualmente, la misma no se ve reflejada por cuanto los desembolsos no se han visto reflejados a los correspondientes proveedores. La programación se ha realizado de forma mensual. Los valores reportados se realizan de acuerdo a los avances de ejecución física

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.423.259.86	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7.28% Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 7.28%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACAHUELLA	ML	133
*	ALCANTARILLA 36"	UND	1.0
*	PLAN GESTION SOCIAL	GLB	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	118			118	100.0%
Ejec	118			118	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mixer	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Planta electrica	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PLANTA ROCALES Y CONCRETOS - MORALES CAUCA	PERMISO MINERO: SI	X NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES: Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda Agua Bonita, lugar donde quedó además dispuesto el buzon de sugerencias y/ PQRS


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
A la fecha se han ejecutado actividades de fundición de placahuella de 90 ml, con bordillo y cunetas.
Del 28 de abril al 4 de mayo de 2024 Se realiza instalación de formaleta de K0+120-K0+133, con la correspondiente colocación de aceros.
Se inician actividades de fundición con concreto premezlcado de losas y vigas riostras hasta abscisa K0+118.
Se realiza fundición de concreto ciclopeo.
Se inicia la excavación para la estructura de la alcantarilla.
Aunque se han realizado fundiciones parciales hasta abscisa K0+118, sólo se reporta hasta abscisa K0+110 con fundición completa.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA::
Del 5 al 11 de mayo se continuara con formaleteo y la fundición de concretos en losas y cunetas hasta abcisa K0+133

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Agua Bonita- Fundición de concreto



Vereda Agua Bonita - Fundición de concreto ciclopeo



Vereda Agua Bonita- Excavación alcantarilla

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA
Matrícula Profesional No.: 252223743OCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenitilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 21- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 11/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 21 del 5/05/2024 al 11/05/2024 Último Informe Semanal SI [ ] (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR:0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA			INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.		
				INTEGRANTES:	UNICO		
CONVENIO No.	4726 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.103.293.00	CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.423.259.86
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.103.293.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103.423.259.86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 200.103.293.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,103,293	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 95,653,213.75	47.80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 16,058,304.00	8%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111,711,517.75	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,649,373.00	1.32%

Observaciones: La programación financiera aunque se encuentra programada mensualmente, la misma no se ve reflejada por cuanto los desembolsos no se han visto reflejados a los correspondientes proveedores. La programación se ha realizado de forma mensual. Los valores reportados se realizan de acuerdo a los avances de ejecución fisica

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.423.259.86	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11.89% Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % 11.89%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACAHUELLA	ML	133
*	ALCANTARILLA 36"	UND	1.0
*	GESTION SOCIAL	GLB	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	124			124	93.2%
Ejec	124			124	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mixer	2	2
Vibrador de concreto	1	1
Planta electrica	1	1
Total	4	4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PLANTA ROCALES Y CONCRETOS - MORALES CAUCA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES: Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda Agua Bonita, lugar donde quedó además dispuesto el buzon de sugerencias y/ PQRS


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 5 al 11 de mayo de 2024 Se realiza fundición con concreto premezicado de losas y riostras, desde abscisa K0+110-K0+124,
Se continua con fundición de concretos ciclopeos desde abscisa K0+090K0+133.
Fundición de bordillos y cunetas de abcisa K0+090-K0+133.
Se continua la excavación y formaleteo para la estructura de la alcantarilla.
Actividades de fundición hasta asbcisa K0+133 sin embargo es parcializada, por lo que el reporte se realiza completo hasta abscisa K0+124.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 12 al 18 de mayo se continuara con la fundición de concretos según cronograma presentado por parte de la JAC, e inicio actividades de formaleteo y fundición de concretos alcantarilla.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Agua Bonita- Fundición de concreto



Vereda Agua Bonita - Fundición de concreto





Vereda Agua Bonita- Excavación y formaleteo alcantarilla

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA
Matrícula Profesional No.: 252237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 22- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 18/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 22 del 12/05/2024 al 18/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR:0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA		
CONVENIO No.	4726 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.103.293.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.103.293.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.423.259.86
FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103.423.259.86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 200,103,293		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 128,006,941		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 72,096,352		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,103,293	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 103,974,280.75	51.96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 24,032,660.00	12.01%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 128,006,940.75	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: La programación financiera aunque se encuentra programada mensualmente, la misma no se ve reflejada por cuanto los desembolsos no se han visto reflejados a los correspondientes proveedores. La programación se ha realizado de forma mensual. Los valores reportados se realizan de acuerdo a los avances de ejecución fisica

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.423.259.86	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1.47% Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % 1.47%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACAHUELLA	ML	133
*	ALCANTARILLA 36"	UND	1.0
*	GESTION SOCIAL	GLB	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	124			124	93.2%
Ejec	124			124	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mixer	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Planta electrica	1	1
Total	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PLANTA ROCALES Y CONCRETOS - MORALES CAUCA	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES: Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda Agua Bonita, lugar donde quedó además dispuesto el buzon de sugerencias y/ PQRS


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 12 al 18 de Mayo de 2024 se completó la fundición de cunetas abscisa K0+120 - K0+133 lateral derecho. Actividades suspendidas desde el 15 de Mayo de 2024.
Se realiza comité operativo para tratar temas puntuales respecto de la mano de obra, que según proyección inicial estaba dada hasta el 15 de Mayo de 2024.
Actividades programadas se ven suspendidas por no disposición de personal.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA::
Se reanudarán actividades una vez se defina la contratación de personal para dar continuidad a actividades de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Terminación actvidades de fundición cunetas carril derecho

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA
Matrícula Profesional No.: 252237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 23- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 25/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 23 del 19/05/2024 al 25/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR:0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA			INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.		
				INTEGRANTES:	UNICO		
CONVENIO No.	4726 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.103.293.00	CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.423.259.86
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.103.293.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103.423.259.86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 200,103,293		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 107,159,481		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 92,943,812		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,103,293	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 107,159,480.75	53.55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 24,343,565.98	12.17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 131,503,046.73	65.72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,185,200.00	1.59%

Observaciones: La programación financiera aunque se encuentra programada mensualmente, la misma no se ve reflejada por cuanto los desembolsos no se han visto reflejados a los correspondientes proveedores. Datos financieros soportados según el libro auxiliar compartido por parte de contadora

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.423.259.86	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACAHUELLA	ML	133
*	ALCANTARILLA 36"	UND	1.0
*	GESTION SOCIAL	GLB	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	124			124	93.2%
Ejec	124			124	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mixer	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Planta electrica	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PLANTA ROCALES Y CONCRETOS - MORALES CAUCA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES: Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda Agua Bonita, lugar donde quedó además dispuesto el buzon de sugerencias y/ PQRS

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 19 al 25 de mayo de 2024 no se ejecutaron actividades en obra.
Se tramitan desembolsos nomina

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA::
La JAC deberá presentar reprogramación de obra, y remitir soportes afiliación nuevo personal para poder dar continuidad a actividades de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NA	NA	NA

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.	FIRMA NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 24- Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 24 del 26/05/2024 al 1/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.8130, longitud: -76.6499 y punto de referencia final en el PR:0+843 con coordenadas latitud: 2.8151, longitud: -76.6437, de la vía Agua bonita a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA		
CONVENIO No.	4726 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.103.293.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.103.293.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.		
INTEGRANTES:	UNICO		
CONTRATO No.	4897 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.423.259.86
FECHA DE INICIO:	15/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 103.423.259.86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 200,103,293		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	$ 107,159,481		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	$ 92,943,812		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,103,293	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 107,159,480.75	53.55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 24,343,565.98	12.17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 131,503,046.73	65.72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones: La programación financiera aunque se encuentra programada mensualmente, la misma no se ve reflejada por cuanto los desembolsos no se han visto reflejados a los correspondientes proveedores. Datos financieros soportados según el libro auxiliar compartido por parte de contadora

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.423.259.86	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACAHUELLA	ML	133
*	ALCANTARILLA 36"	UND	1.0
*	GESTION SOCIAL	GLB	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	124			124	93.2%
Ejec	124			124	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mixer	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Planta electrica	1	1
Total	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PLANTA ROCALES Y CONCRETOS - MORALES CAUCA	PERMISO MINERO: SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Normal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

OBSERVACIONES: Se realizo la socialización del proyecto con la JAC de la vereda Agua Bonita, lugar donde quedó además dispuesto el buzon de sugerencias y/ PQRS

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:
Del 25 de Mayo al 01 de Junio de 2024 no se ejecutaron actividades en obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EL CONTRATISTA DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA::
La JAC deberá presentar reprogramación de obra, y remitir soportes afiliación nuevo personal para poder dar continuidad a actividades de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NA	NA	NA

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Ejecutar el proyecto en los dias propuestos por el convenio.	FIRMA NOMBRE: JUAN CARLOS SANABRIA Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

3.6.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

La maquinaria y equipo utilizado durante el periodo reportado en el presente informe se encuentra detallado en los formatos de informe semanal y en Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4726 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4897 DE 2023

INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Vibrador de concreto			AGUA BONITA			A						A	A					A															
Planta electrica			AGUA BONITA			A						A	A					A															
Mezcladora tipo trompo			AGUA BONITA		A									A																			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					1	2	2					2	2	1				2															
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
TOTAL INACTIVO																																

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	18	40
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	27	60

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligació
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: GERARDO CRUZ JIMENEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:19202 084479 CAUCA

Firma

Nombre: VIVIAN ANDREA GALINDO SANDOVAL
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202301186 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3.6.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

El personal que laboró para la obra durante el periodo de Mayo de 2024. La relación de actividad de concretos ciclópeos fue realizada mediante mezcladora, ese concreto no fue pedido en el volumen de premezclado utilizado para losas, vigas riostras, bordillos y cunetas.

Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4726 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** Leydi Mabel Pérez Chud

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN CARLOS RUIZ MEDINA	1059605194	OBRERO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA	$ 650,000.00	$ 45,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9467396634	$ 81,300	PORVENIR	9467396634	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
2	JOSE ALBEIRO MERA URRUTIA	76292269	OBRERO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA	$ 650,000.00	$ 45,300	V	A.I.C.	9467396634	$ 81,300	PORVENIR	9467396634	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
3	JAIRO ENRIQUE ALMENDRA CHAVACO	76275008	OBRERO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA	$ 650,000.00	$ 45,300	V	MALLAMAS	9467396634	$ 81,300	PORVENIR	9467396634	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
4	LUIS DELIO MURCIA	10270899	MAESTRO	$ 928,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA	$ 1,160,000.00	$ 80,800	V	SOS	9467396634	$ 145,000	PORVENIR	9467396634	$ 185,600	$ 46,400	$ 20,000	$ 38,000	
5	GERARDO CRUZ JIMENEZ*	76320700	RESIDENTE DE OBRA	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																GERARDO CRUZ	$ 2,800,000	$ 68,300	V	SANITAS	9468226760	$ 388,900	PORVENIR	9468226760	$ 497,600				
6	YASMIN ANDREA MUELAS NOGUERA *	1061707724	CONTADORA	$ 1,400,000	X	X	X	X	X	X							X	X		X	X						X	X	X	X	X	X			YASMIN ANDREA MUELAS	$ 1,600,000	$ 8,400	I	NUEVA EPS	9451320618	$ 200,000	PROTECCION	9451320618	$ 256,000				
7																																												
8																																												
9																																												
N																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GERARDO CRUZ JIMENEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3.6.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se diligencia información general de acuerdo al formato suministrado por la Territorial; sin embargo, se encuentra en revisión, por cuanto para el caso particular de este tipo de convenios, no se tramitan actas de pago parcial, sino que se realiza la administración de un desembolso.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4726 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JAC VEREDA AGUA BONITA A, DEL MUNICIPIO DE MORALES, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL — **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4897 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		PROGRAMA CAMINOS		NACIÓN	4726/2023	$ 199,103,193	
		JAC VEREDA AGUA BONITA		PROPIOS	4726/2023	$ 1,000,000	
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 200,103,193.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

3.6.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4726 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	8	12	16	14	12	16	10	13	12	15	14	18	8	19	17																	204
Lluvias moderadas	12	10	8	8	10	8	12	11	4	8	10	6	12	5	6																	130
Lluvias intensas	4	2	0	2	2	0	2	0	8	1	0	0	4	0	1																	26
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Sólo se registraron actividades de obra hasta 15 de Mayo de 2024.

Firma
Nombre: GERARDO CRUZ JIMENEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:19202 084479 CAU

Firma
Nombre: Vivian Andrea Galindo Sandoval
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 192202-301186 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3.6.7. ENSAYOS DE LABORATORIO

En Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se detallan los resultados de ensayos de compactación realizados. Los resultados de resistencia concretos aún no han sido entregados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: 4726 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA BONITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
	1/05/2024	Resistencia concreto	INV E -410	CONCRETO PLANTA	1		226 Kg/cm*	SI	
	1/05/2024	Resistencia concreto	INV E -410	CONCRETO PLANTA	1		240 Kg/cm*	SI	
	2/05/2024	Resistencia concreto	INV E -410	CONCRETO PLANTA	1		209 Kg/cm**	SI	
	2/05/2024	Resistencia concreto	INV E -410	CONCRETO PLANTA	1		218 Kg/cm**	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

*Resistencia a los 8 días
**Resistencia a los 9 días

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Gerardo Cruz Jimenez
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 19202 084479 CAUCA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3.6.8. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Las pólizas correspondientes al periodo, han sido cargadas al Secop II por parte de las Oac, se realizaron solicitudes para cargue con recibo de pago para que se considerara completo el trámite. Ver anexos Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12. Las pólizas de la prórroga 3 que ha sido tramitada a la fecha de la elaboración del presente informe no se disponían.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4679 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESTRELLA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.122.246,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.122.246,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4897-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.824.450	28	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.956.112,50	28	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.736.675,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026235

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	117%	$ 232.000.000	28	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005569 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 39.824.450,00	29	12	2023	2	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 9.956.112,50	29	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 59.736.675,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026235

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 39.824.450,00	30	4	2024	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 9.956.112,50	29	12	2023	31	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 59.736.675,00	31	5	2024	31	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026235

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	28	11	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005569 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: ____

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	28	11	2023	31	5	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005569 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: ____

OBSERVACIONES:

Los anexos 01 y 02 de cada una de las pólizas se encuentran pendientes por aprobar en SECOP II. Se realizó verificación de que las mismas fueran cargadas por la OAC.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma ____
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

3.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

3.6.9.1. SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

En formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 se consolida la información relacionada con el plan de inversión modificado y aprobado por comité operativo del mes de Abril, por cuanto en el mes de Mayo no existió modificación adicional.

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE AGUA BONITA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4726 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE AGUA BONITA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE DE AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

JUSTIFICACIÓN:
Se realizó ajuste a presupuesto de acuerdo a orientaciones de la territorial Cauca, con uso de recursos que sobran en administrativos y de gestión ambiental al proceso de obra.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES (incluido transporte)	$ 30.723.200	$ 55.911.800	$ 51.308.468,90		**$ 137.943.468,90**	69,28%
2	EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	$ 2.315.923	$ 743.810	$ 1.586.068,78		**$ 4.645.801,46**	2,33%
3	COSTO DE PERSONAL	$ 2.133.200	$ 7.816.701	$ 6.912.299,40		**$ 16.862.200,69**	8,47%
4	DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON)		$ 653.086	$ 653.085,50		**$ 1.306.171,00**	0,66%
5	REINTEGRO POLIZA (ADMON)		$ 1.423.348	$ 76.355,62		**$ 1.499.703,24**	0,75%
6	MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON)	$ 6.940.000	$ 6.940.000	$ 6.940.000,00		**$ 20.820.000,00**	10,46%
7	MAESTRO DE OBRA (Carga prestacional)	$ 1.517.765	$ 1.517.765	$ 1.517.765,00		**$ 4.553.295,00**	2,29%
8	MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON)	$ 45.000	$ 45.000	$ 45.000,00		**$ 135.000,00**	0,07%
9	GASTOS BANCARIOS (ADMON)	$ 292.178	$ 292.178	$ 292.177,59		**$ 876.532,76**	0,44%
10	SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON)	$ 400.000	$ -	$ -		**$ 400.000,00**	0,20%
11	PAPELERIA (ADMON)		$ -	$ 351.590,00		**$ 351.590,00**	0,18%
12	OTROS COSTOS (ADMON)			$ 8.129.530,00		**$ 8.129.530,00**	4,08%
13	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL			$ 1.000.000,00		**$ 1.000.000,00**	0,50%
14	VALLA (ADMON)	$ 180.000	$ -			**$ 180.000,00**	0,09%
15	BODEGA (ADMON)	$ 150.000	$ 150.000	$ 100.000,00		**$ 400.000,00**	0,20%
	TOTAL	**$ 44.697.265,4**	**$ 75.493.686,9**	**$ 78.912.340,8**	**$ -**	**$ 199.103.293,00**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: ISRAEL NUÑOZ H
Nombre:Israel Muñoz Hernandez
Representante Legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal
C.C 10.316.904

Firma: MABEL PEREZ
Nombre: Leidy Mabel Perez Chud
Representante Legal CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 31577307

Nombre: Gerardo Cruz Jimenez
Ingeniero Residente del Proyecto 19202 - 084479 CAUCA
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.6.9.2. BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO. En formato MEPI-MN-IN-6-FR-2 por parte de contador de la Junta fue registrado cada uno de los pagos realizados para el desarrollo del

convenio, durante el mes de Mayo. Los únicos no registrados corresponden a los descuentos desarrollados por concepto de transferencias bancarias.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	-

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 — **MES:** MAYO — **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4726 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 199,103,293.00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA BONITA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4897 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS- Leydi Mabel Pérez Chud

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA CORTE A 30 DE ABRIL	FORMATO DE NÓMINA	7-may-24	LUIS DELIO MURCIA	$ 612.373,00	6	MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON-MAESTRO QUINCENA-CONTADOR E INGENIERO)
NOMINA CORTE A 30 DE ABRIL	FORMATO DE NÓMINA	7-may-24	JUAN CARLOS RUIZ MEDINA	$ 679.000,00	3	COSTO DE PERSONAL
NOMINA CORTE A 30 DE ABRIL	FORMATO DE NÓMINA	7-may-24	JOSE ALBEIRO MERA URRUTIA	$ 679.000,00	3	COSTO DE PERSONAL
NOMINA CORTE A 30 DE ABRIL	FORMATO DE NÓMINA	7-may-24	JAIRO ENRIQUE ALMENDRA CHAVACO	$ 679.000,00	3	COSTO DE PERSONAL
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO	DSEA4	17-may-24	YASMIN ANDREA MUELAS NOGUERA	$ 1.300.000,00	6	MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON-MAESTRO QUINCENA-CONTADOR E INGENIERO)
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO	DSEA3	17-may-24	JAVIER RAMIREZ	$ 2.500.000,00	12	OTROS COSTOS (ADMON-Diseños,Topografía,Ensayos)
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO	DSEA2	17-may-24	YENNYFER PEREZ MARTINEZ	$ 1.500.000,00	12	OTROS COSTOS (ADMON-Diseños,Topografía,Ensayos)
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO	DSEA5	17-may-24	MARIA ALEJANDRA LOPEZ QUISOBONI	$ 2.598.000,00	12	OTROS COSTOS (ADMON-Diseños,Topografía,Ensayos)
FACTURA ELECTRONICA	CCS–100005618-CCS–100026378	17-may-24	SEGUROS MUNDIAL(REINTEGRO A LA JUNTA)	$ 76.356,00	5	REINTEGRO POLIZA (ADMON)
FACTURA ELECTRONICA	FESF22824	17-may-24	SOLUCIONES INTEGRALES EVA SAS	$ 4.179.267,00	1	MATERIALES
NOMINA AL 15 DE MAYO/2024	FORMATO DE NÓMINA	22-may-24	LUIS DELIO MURCIA	$ 1.148.200,00	6	MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON-MAESTRO QUINCENA-CONTADOR E INGENIERO)
NOMINA AL 15 DE MAYO/2024	FORMATO DE NÓMINA	22-may-24	JUAN CARLOS RUIZ MEDINA	$ 679.000,00	3	COSTO DE PERSONAL
NOMINA AL 15 DE MAYO/2024	FORMATO DE NÓMINA	22-may-24	JOSE ALBEIRO MERA URRUTIA	$ 679.000,00	3	COSTO DE PERSONAL
NOMINA AL 15 DE MAYO/2024	FORMATO DE NÓMINA	22-may-24	JAIRO ENRIQUE ALMENDRA CHAVACO	$ 679.000,00	3	COSTO DE PERSONAL
RETENCIÓN EN LA FUENTE	RECIBO DE PAGO 490 N° 4910798325557 y formulario N°3505733067762	17-may-24	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -DIAN	$ 1.453.000,00	1	MATERIALES
RETENCIÓN EN LA FUENTE	RECIBO DE PAGO 490 N° 4910798325557 y formulario N°3505733067762	17-may-24	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -DIAN	$ 26.000,00	12	OTROS COSTOS (ADMON-Diseños,Topografía,Ens
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL APORTES EN LINEA	PLANILLA APORTES N°9465398993	17-may-24	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -APORTES EN LINEA	$ 309.700,00	7	MAESTRO DE OBRA (ADMON Carga prestacional)
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL APORTES EN LINEA	PLANILLA APORTES N°9465398993	17-may-24	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL -APORTES EN LINEA	$ 2.353.100,00	3	COSTO DE PERSONAL
EXTRACTO BANCARIO		31-may-24	GASTOS BANCARIOS	$ 310.905,98	9	GASTOS BANCARIOS (ADMON)
				$ 22.440.901,98		

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 137.943.468,90	$ 87.882.713,75	$ 5.632.267,00	$ 93.514.980,75	$ 44.428.488,15
2	EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	$ 4.645.801,46	$ -	$ -	$ -	$ 4.645.801,46
3	COSTO DE PERSONAL	$ 16.862.200,69	$ 5.114.400	$ 6.427.100	$ 11.541.500,00	$ 5.320.700,69
4	DOTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ADMON)	$ 1.306.171,00	$ 1.306.083,00		$ 1.306.083,00	$ 88,00
5	REINTEGRO POLIZA (ADMON)	$ 1.499.703,24	$ 1.423.348,00	$ 76.356,00	$ 1.499.704,00	$ (0,76)
6	MAESTRO,PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ADMON-MAESTRO QUINCENA-CONTADOR E INGENIERO)	$ 20.820.000,00	$ 10.976.400,00	$ 3.060.573,00	$ 14.036.973,00	$ 6.783.027,00
7	MAESTRO DE OBRA (ADMON Carga prestacional)	$ 4.553.295,00	$ 619.100,00	$ 309.700,00	$ 928.800,00	$ 3.624.495,00
8	MEDIDAS AMBIENTALES (ADMON)	$ 135.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 135.000,00
9	GASTOS BANCARIOS (ADMON)	$ 876.532,76	$ 789.957,77	$ 310.905,98	$ 1.100.863,75	$ (224.330,99)
10	SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (ADMON)	$ 400.000,00	$ 400.000,00		$ 400.000,00	$ -
11	PAPELERIA (ADMON)	$ 351.590,00	$ -	$ -	$ -	$ 351.590,00
12	OTROS COSTOS (ADMON-Diseños,Topografía,Ensayos)	$ 8.129.530,00	$ 1.160.100,00	$ 6.624.000,00	$ 7.784.100,00	$ 345.430,00
13	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000,00
14	VALLA (ADMON)	$ 180.000,00	$ 180.000,00		$ 180.000,00	$ -
15	BODEGA (ADMON)	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00
	TOTALES	$ 199.103.293,0	$ 109.852.102,52	$ 22.440.901,98	$ 132.293.005,00	$ 66.810.288,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ($970.44) : ABRIL $ 970
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 4.133,48 **109062144,8**
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
	$ 815,64		Febrero	29/02/2024	$ 815,64
	$ 1.686,39		Marzo	31/03/2024	$ 1.686,39
	$ 970,44		Abril	30/04/2024	$ 970,00
	$ 661		Mayo	31/05/2024	$ 661

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
Se está coordinando el reintegro de rendimientos financieros. Ya fue solicitada por parte de la interventoria y se ha indicado el procedimiento indicado por la Territorial Cauca. Se registran fechas de facturas, pero fueron pagos realizados en el mes de Abril . Documento elaborado con acompañamiento de contadora dispuesta por la OAC.

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: ISRAEL NUÑOZ H.
Nombre:Israel Muñoz Hernandez
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: MABEL PEREZ
Nombre:Leydi Mabel Perez Chud
Representante Legal o Delegado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDIFICE SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.:

ORIGINAL FIRMADO
Nombre: Gerardo Cruz Jimenez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.6.9.3. COPIA ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO.

Se adjunta copia de las actas de comité Operativo.

4. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA.

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Corresponde al Contrato Oferta No. 4897 de 2023, que tiene por objeto ejercer la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de los Convenios Interadministrativos que se suscribieron con las juntas de acción comunal de las veredas: Guacas, Agua Bonita y la Estrella del Municipio de Morales en el Departamento del Cauca.

Tabla 1. Relación de Tramos que se intervienen

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIA	JUNTA
Cauca	Morales	26KA05-9 CRUCE RUTA 26CC05 (PORVENIR) - LA CUCHILLA - SANTAROSA	Las Guacas
Cauca	Morales	SECTOR 26KA05-9 CRUCE RUTA 26CC05 (PROVENIR) - LA CUCHILLA VÍA SECTOR LA GUAYABERA	La Estrella
Cauca	Morales	Via Agua Bonita - código 19473-002.	Agua Bonita

Fuente: Adaptado de diagnósticos desarrollados por profesionales técnicos INVIAS

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
No. del Contrato de Interventoría	4897 de 2023
Objeto del Convenio Solidario	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS

	COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor total	$
Nombre del Contratista	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EDIFICE SAS
Representante legal	LEIDY MABEL PEREZ CHUD
Fecha de Orden de inicio	$103.423.259,85
Prorroga 1	De 01 de Abril de 2024 hasta 30 de Abril de 2024
Prorroga 2	De 01 de Mayo de 2024 hasta 31 de Mayo de 2024
Prorroga 3	De 01 de Junio a 30 de Junio de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 de Junio de 2024
Supervisor	JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO

4.2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTOR

- Elaboración informe mensual Mayo y sus correspondientes formatos.
- Revisión para trámite de autorizaciones de desembolso de acuerdo a plan de compras.
- Participación en los comités operativos y reuniones necesarias para tratar temas de ejecución de convenios.
- Seguimiento a actividades de obra ejecutadas y emisión de observaciones a residentes de obra.
- Remisión de reportes semanales de ejecución, con diligenciamiento de matriz solicitada por territorial Cauca.
- Las demás reportadas en la relación de actividades para cada uno de los convenios en capítulos 1,2 y 3.

4.3. INFORMES DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.

Al presente se adjunta informe de profesionales.

4.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC.

No aplica.

4.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

No aplica.

4.6. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

No aplica.

4.7. SEGUIMIENTO ESTADO TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SIG.

No aplica

5. REPORTES EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA

5.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan los vehículos utilizados en el periodo del informe para el seguimiento del proyecto. Se anexa al presente informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/5/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION NACIONAL DE VIAS-INVIAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4897 DE 2023

INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

CONTRATO DE OBRA No. 2023, 4726 DE 2023, 4676

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTOCICLETA	Modelo: 2023, Placa FIF85G color AZUL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	Modelo: 2020, Placa IZN57F color NEGRO GRIS NA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firma
Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

5.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa al presente informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INT.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4897-2023

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE OBRA No.: 4464 DE 2023, 4726 DE 2023, 4679 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JUAN CARLOS SANABRIA	79.267.382	Director	$ 1.734.000	X		X		X		X		X		X		X		x															0,1	EDIFICE SAS	1.734.000	$ 120.000	V	COMPENSAR	79758084	$ 69.000	Colfondos	77788088	$ 496.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2	VIVIAN ANDREA GALINDO SANDOVAL	1.061.799.003	Residente	$ 3.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,5	EDIFICE SAS	3.100.000	$ 215.800	V	SERV.OCC. SALUD-EPS	79758084	$ 124.000	Porvenir	77788088	$ 277.400	N/A	N/A	N/A	N/A
3	SARA ALEJANDRA PINEDA NIÑO	1072749260	Social	$ 840.000	X		X		X		X		X		X		X		x			X		X		X		X		X		X	x	0,3	ORION SAS	840.000	$ 19.500	V	Compensar	79758084	$ 35.000	Colfondos	72843612	$ 104.000	N/A	N/A	N/A	N/A
4	DIANA PAOLA CADENA RAMOS	1018451763	Ambiental	$ 840.000	X		X		X		X		X		X		X		x			X		X		X		X		X		X	x	0,3	ORION SAS	840.000	$ 19.500	V	Compensar	79758084	$ 35.000	Colfondos	72843612	$ 104.000	N/A	N/A	N/A	N/A
6	ADRIANA ISABEL CARDENAS	1018451763	Inspector sst	$ 1.200.000	X		X		X		X		X		X		X		x			X		X		X		X		X		X	x	0,3	ORION SAS	1.200.000	$ 19.500	V	Compensar	79758084	$ 35.000	Colfondos	72843612	$ 104.000	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 7.714.000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30 de abril 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-40631 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

5.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

A la fecha no se han presentado desembolsos por pagos.

5.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Se anexa al presente informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/5/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/4/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 103,423,259.85

VALOR ACUMULADO: $ 103,423,259.85 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,342,326	11	12	2023	31	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31,026,978	11	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 31,026,978	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU 100012245

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27de diciembre de 2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,342,326	11	12	2023	31	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31,026,978	11	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 31,026,978	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU 100012245

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,342,326	29	12	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31,026,978	29	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31,026,978	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100012245

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,342,326	1	5	2024	1	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales	30%	$ 31,026,978	1	5	2024	1	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31,026,978	31	5	2024	31	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100012245

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CA[illegible]S SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: N° 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

No Aplica

5.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

5.6.1. Seguimiento a la Inversión anticipo.

No aplica

5.6.2. Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado.

Se anexa al presente informe el Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas.

5.6.3. Seguimiento plan de cargas.

Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-3 Seguimiento Plan de Cargas. No aplica, no se han generado pagos a la fecha.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las OAC ha presentado atrasos en la ejecución del convenio, que ha logrado identificarse que en su mayoría ha sido por la reducción de los rendimientos por lluvias frecuentes durante las jornadas de fundición y en algunos casos, como se documentó por la imposibilidad de ingreso de insumos por parte de los proveedores. Así mismo, las situaciones de orden público que se presentaron en el mes de mayo dificultaron la ejecución de actividades.
- Existen desembolsos que se han desarrollado a la junta de acción comunal o presidente, como es el caso de la seguridad social y pagos de rete fuente, por cuanto corresponden a situaciones que el Banco no estipulaba realizar bajo los medios de pago que estipula el proveedor.
- Buscar alternativas con la Territorial Cauca para que los trámites administrativos ante los bancos se tarden menos tiempo.
- Las juntas no remiten a tiempo los soportes para pago a proveedores, aunque están aprobadas cotizaciones, estipularon pagos contra entrega, por lo que a la fecha la junta adeuda servicios que aún no han sido cobrados por proveedores mediante la presentación de las correspondientes cuentas de cobro.
- Las juntas no entregan con prontitud los documentos solicitados, aún cuando se establecen compromisos en comités y se remiten solicitudes escritas a los correos electrónicos oficiales de las Juntas.
- A la fecha las Juntas de Estrella y Guacas no han entregado resultados de las muestras de concreto tomadas para evaluación de resistencia.
- En la Estrella se han presentado atrasos considerables, no han logrado equiparar la programación propuesta, han tenido dificultades con el personal, respecto de los rendimientos exigidos y el uso de elementos de protección personal.
- La vereda Agua Bonita adeuda aún material de subbase desde el mes de Marzo, que debió ser adquirido con otro proveedor de la zona por falta de inventario por parte de proveedor inicial. Se ha solicitado y manifiestan proveedor no ha realizado entrega de la correspondiente cuenta de cobro.
- Se deberán establecer mecanismos conducentes a la celeridad con la que las Juntas entreguen los documentos para poder hacer efectivos los pagos, y para que oportunamente entreguen los documentos que se solicitan.

7. ANEXOS.

7.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

La remisión de correspondencia relacionada con la ejecución de la obra y actividades propias de la ejecución del convenio se desarrolló durante el periodo a través de correo electrónico oficial dado por parte de cada Junta de acción comunal, y desde correo personal de residente

de interventoria, que a su vez son trasladados a R.L. de Interventoría o al correo oficial de la interventoría, los demás llamados quedan documentados en las correspondientes actas de comité operativo o de reunión llevadas a cabo.

Tabla 2. Relación de correspondencia Vereda Guacas

FECHA	NÚMERO	REFERENCIA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
1/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC GUACAS	Interventoría	Solicitud pago Nomina electrónica quincena 16 a 30 abril
2/05/2024	SN	SR	Interventoría	JAC GUACAS	Respuesta pago nomina electronica y traslado a R.L. Interventoria
4/05/2024	SN	SR	Res Interventoria	R.L. Interventoria	Remisión documentos devolución rendimientos financieros JAC GUACAS
6/05/2024	RT-04-06052024	Convenio 4679,4726,4464 de 2023	Interventoria	JAC GUACAS	Solicitud de actualización de Pólizas y cargue a plataforma SECOP II
7/05/2024	RT-05-07052024	Convenio 4679,4464 de 2023	Interventoria	JAC GUACAS	Solicitud requerimiento obligaciones Contables
7/05/2024	Correo electronico	Convenio 4679,4726,4464 de 2023	Interventoria	JAC GUACAS	NOVEDAD PRESENTACIÓN DOCUMENTOS
7/05/2024	Correo electronico	Convenio 4679,4464 de 2024	Interventoria	JAC GUACAS	Solicitud ajuste FACTURACION - devoluciones
8/05/2024	Correo electronico	SR	JAC GUACAS	Interventoria	Respuesta ajuste facturacion
8/05/2024	RT-06-08052024	Convenio 4679 ,4464 de 2023	Interventoria	JAC GUACAS	REQUERIMIENTO DISPONIBILIDAD DE MATERIALES
9/05/2024	Correo electronico	Convenio 4679,4464 de 2023	RES Interventoria, JAC LAS GUACAS	R.L. Interventoria	Remisión segundo oficio devolución 4*1000 JAC GUACAS Y ESTRELLA
9/05/2024	SN	SR	Interventoria	JAC GUACAS	TRASLADO FORMATO MODELO PARA SOLICITUD

					REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMITIDO POR EL BANCO
10/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC GUACAS	R.L. Interventoría	Autorización de pagos Guacas
15/05/2024	Correo electrónico	SR	Interventoría	JAC GUACAS	Solicitud control de rendimientos obra
14/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC GUACAS	Interventoría	Remisión autorización pago rete fuente
16/05/2024	Correo electrónico	SR	Res Interventoría	R.L. Interventoría	Reenvío para autorización pagos
17/05/2024	SN	SR	JAC GUACAS	Interventoría	Solicitud prorroga 3 convenio 4464 de 2023
19/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC GUACAS	Interventoría	Autorización pago nomina 1 a 15 de mayo
20/05/2024	Correo electrónico	SR	Res Interventoría	R.L. Interventoría	Reenvío para autorización pagos nomina
20/05/2024	Correo electrónico	SR	Interventoría	Territorial Cauca	DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA N° 03 CONVENIOS MORALES
21/05/2024	RT-07-21052024	Convenio 4679,4464 de 2023	Interventoría	JAC GUACAS	Requerimiento Informes
22/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC GUACAS	Interventoría	Paz y salvo mano de obra hasta 15 de mayo de 2024
29/05/2024	Correo electrónico	SR	Res Interventoría	R.L. Interventoría, EDIFICE	Reenvío comunicación remitida por parte de la Junta Guacas
30/05/2024	RT-08-30052024	Convenio 4679 ,4464 de 2023	Interventoría	JAC GUACAS	Solicitud resultados ensayos resistencia de concretos.

SR: SIN REFERENCIA
SN: SIN NÚMERO

Tabla 3. Relación correspondencia Vereda Estrella

FECHA	NÚMERO	REFERENCIA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
1/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC GUACAS	Interventoría	Solicitud pago Nomina electrónica quincena 16 a 30 abril
2/05/2024	SN	SR	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	Respuesta pago nomina electrónica y

					traslado a R.L. Interventoría
6/05/2024	RT-04-06052024	Convenio 4679,4726,4464 de 2023	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	Solicitud de actualización de Pólizas y cargue a plataforma SECOP II
6/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC LA ESTRELLA	Interventoría	Autorización pago seguridad social y retención en la fuente abril
7/05/2024	SN	SR	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	Respuesta interventoría respecto autorización pagos
7/05/2024	RT-05-07052024	Convenio 4679,4464 de 2023	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	Solicitud requerimiento obligaciones Contables
7/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC LA ESTRELLA	Interventoría	Documentos firmados rendimientos financieros
7/05/2024	Correo electrónico	SR	Res. Interventoría	R.L. Interventoría	Reenvío documentos rendimientos financieros
7/05/2024	Correo electrónico	Convenio 4679,4726,4464 de 2023	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	NOVEDAD PRESENTACIÓN DOCUMENTOS
7/05/2024	Correo electrónico	Convenio 4679,4464 de 2024	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	Solicitud ajuste FACTURACION - devoluciones
8/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC LA ESTRELLA	Interventoría	Respuesta ajuste facturación
8/05/2024	RT-06-08052024	Convenio 4679 ,4464 de 2023	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	REQUERIMIENTO DISPONIBILIDAD DE MATERIALES
9/05/2024	Correo electrónico	Convenio 4679,4464 de 2023	RES Interventoría, JAC LA ESTRELLA	R.L. Interventoría	Remisión segundo oficio devolución 4*1000 JAC GUACAS Y ESTRELLA
9/05/2024	SN	SR	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	TRASLADO FORMATO MODELO PARA SOLICITUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMITIDO POR EL BANCO
15/05/2024	Correo electrónico	SR	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	Solicitud control de rendimientos obra
17/05/2024	SN	SR	JAC LA ESTRELLA	Interventoría	Solicitud prorroga 3 convenio 4679 de 2023
19/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC LA ESTRELLA	Interventoría	Autorización pago nomina mayo
20/05/2024	Correo electrónico	SR	Res.interventoria	R.L. Interventoría	Reenvio pago nomina mayo

20/05/2024	Correo electrónico	SR	Interventoria	Territorial Cauca	DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA N° 03 CONVENIOS MORALES
21/05/2024	RT-07-21052024	Convenio 4679,4464 de 2023	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	Requerimiento Informes
26/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC LA ESTRELLA	Interventoría	Remisión libro auxiliar corte 26 de Mayo de 2024
28/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC LA ESTRELLA	Interventoría	Paz y salvo mano de obra hasta 15 de mayo de 2024
29/05/2024	Correo electrónico	SR	Res Interventoría	R.L. Interventoría, EDIFICE	Reenvío comunicación remitida por parte de la Junta la Estrella
30/05/2024	RT-08-30052024	Convenio 4679 ,4464 de 2023	Interventoría	JAC LA ESTRELLA	Solicitud resultados ensayos resistencia de concretos.

SR: SIN REFERENCIA
SN: SIN NÚMERO

Tabla 4. Relación correspondencia vereda Agua Bonita

FECHA	NÚMERO	REFERENCIA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
2/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC AGUA BONITA	Interventoria	Envío documentos para tramite de pagos nomina
2/05/2024	Correo electronico	SR	JAC AGUA BONITA	Interventoria	Hoja de vida Maestro Luis Murcia
2/05/2024	Correo electronico	SR	res interventoria	invias.edifice@gmail.com	Reenvio Hoja de vida Maestro Luis Murcia
2/05/2024	Correo electronico	SR	res interventoria	R.L. Interventoria	Reenvio para revision autorizacion pagos
6/05/2024	RT-04-06052024	Convenio 4679,4726,4464 de 2023	Interventoria	JAC AGUA BONITA	Solicitud de actualización de Pólizas y cargue a plataforma SECOP II
7/05/2024	RT-05-07052024	Convenio 4679,4464 de 2023	Interventoria	JAC AGUA BONITA	Solicitud requerimiento obligaciones Contables
7/05/2024	Correo electronico	SR	Res. Interventoria	R.L. Interventoria	Reenvio documentos rendimientos financieros
7/05/2024	Correo electronico	Convenio 4679,4726,4464 de 2023	Interventoria	JAC AGUA BONITA	NOVEDAD PRESENTACIÓN DOCUMENTOS
9/05/2024	SN	SR	Interventoría	JAC AGUA BONITA	TRASLADO FORMATO MODELO PARA SOLICITUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMITIDO POR EL BANCO
10/05/2024	Correo electrónico	SR	JAC AGUA BONITA	Interventoría	SOPORTES PARA PAGO ADMINISTRATIVOS Y TUBO CORRUGADO

10/05/2024	Correo electrónico	SR	Res Interventoría	R.L. INTERVENTORIA	Reenvío soportes para autorización pagos
10/05/2024			JAC AGUA BONITA	Interventoria	VERIFICACIÓN DE SOPORTES PARA PAGO ADMINISTRATIVOS Y TUBO CORRUGADO
14/05/2024	Correo electronico	SR	JAC AGUA BONITA	Interventoria	solictud de transferencias retefuente y planilla seguridad social
15/05/2024	Correo electronico	SR	Res. Interventoria	R.L. Interventoria	Reenvio solicitud transferencias
15/05/2024	Correo electronico	SR	Interventoria	JAC AGUA BONITA	Solicitud control de rendimientos obra
17/05/2024	Correo electronico	SR	JAC AGUA BONITA	Interventoria	Nómina a 15 de mayo/2024
17/05/2024	SN	SR	JAC AGUA BONITA	Interventoría	Solicitud prorroga 3 convenio 4726 de 2023
20/05/2024	Correo electronico	SR	Res. Interventoria	JAC AGUA BONITA	Respuesta pago nomina a corte 15 de Mayo de 2024
20/05/2024	Entrega fisica	SR	JAC AGUA BONITA	Interventoria	Información provisiones nomina
20/05/2024	Correo electronico	SR	Interventoria	Territorial Cauca	DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA N° 03 CONVENIOS MORALES
21/05/2024	Correo electronico	SR	JAC AGUA BONITA	Interventoria	Oficio autorización pago nomina
21/05/2024	Correo electronico	SR	res interventoria	R.L. Interventoria	Reenvio para revision autorizacion pagos nomina
21/05/2024	RT-07-21052024	Convenio 4679,4464 de 2023	Interventoria	JAC AGUA BONITA	Requerimiento Informes
22/05/2024	Correo electronico	SR	Res. Interventoria	R.L. Interventoria - invias.edifice@gmail.com	traslado de información JAC Agua Bonita, Solicitud e información para continuidad de trabajos Jac Agua Bonita con proyección respuesta
28/05/2024	Correo electronico	SR	JAC AGUA BONITA	Interventoria	Paz y salvo mano de obra hasta 15 de mayo de 2024
30/05/2024	RT-08-30052024	Convenio 4679 ,4464 de 2023	Interventoria	JAC AGUA BONITA	Solicitud resultados ensayos resistencia de concretos.
31/05/2024	Correo electronico	SR	JAC AGUA BONITA	Interventoria	Solicitud de transferencias

SR: SIN REFERENCIA

SN: SIN NÚMERO

7.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE OBRAS.

Se anexa resumen en fichas fotográficas de la ejecución durante el mes de Mayo, donde se refleja los estados Antes y Después de la intervención.

7.3. COPIA BITÁCORAS DE OBRA MES DE MAYO.

Se adjuntan las bitácoras para el periodo del presente informe, para cada uno de los convenios objeto de la presente interventoría.

ANEXOS

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 7	**Dirección Territorial INVIAS:** CAUCA	**Fecha:** 16/05/2024
Vereda – Municipio - Departamento: Agua Bonita-Morales Cauca		
No. Convenio(s) Solidario(s): 4726 de 2023		
Ejecutor(es): Junta de acción Comunal Agua Bonita		

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Israel Muñoz Hernández	JAC Agua Bonita	Representante legal
Lidia María Gómez	JAC Agua Bonita-Delegada	Veedor
Yasmin Andrea Muelas Noguera	JAC Agua Bonita	Contadora
Gerardo Cruz	JAC Agua Bonita	Residente de obra
Vivian Andrea Galindo Sandoval	Interventoría	Residente de Interventoría
Juan Carlos Sanabria	Interventoría	Director interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Presentar a los miembros del comité y la veeduría ciudadana para verificación de quórum para toma de decisiones.
2. Realizar verificación de compromisos reunión anterior.
3. Realizar valoración y revisión de la reprogramación presentada por la JAC.
4. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

AGENDA DEL COMITE: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Lectura acta de comité anterior y verificación de compromisos.
2- Evaluación y aprobación de cotizaciones.
3- Información respecto de los diseños presentados.
4- Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	Se realiza lectura acta de comité anterior y se realiza verificación de compromisos: Asistentes a reunión. Presencialmente, veeduría, presidente de la junta y residente de interventoría. Conexión telefónica virtual residente de obra y contadora.
2.	Evaluación compromisos acta anterior.:

Scanned with MOBILE SCANNER

	Remisión oportuna de formatos para solicitud de desembolsos. Se ha dado cumplimiento parcial, aún faltan pagos por autorizar según los servicios recibidos en obra.
3.	La JAC AGUA BONITA presenta reprogramación de obra, sin embargo, hace la claridad que respecto a pagos de mano de obra con cargo al convenio sólo fue posible cuantificarlo hasta el 15 de Mayo, que por situaciones asociadas al clima que afectaron los rendimientos de mano de obra, no fue posible terminar la totalidad de las actividades contempladas en el presupuesto ajustado. Así las cosas, proponen que el desarrollo de las actividades faltantes, aclarando que ya están realizadas todas las actividades de formaleteo y disposición de aceros hasta la abscisa final del tramo, las desarrollarán con el acompañamiento voluntario de la comunidad (teniendo en cuenta que los trabajadores asociados a nomina son habitantes de la vereda y han manifestado su voluntad para trabajar). Frente a esta inquietud se establece comunicación telefónica con la representante legal de la Interventoría (MABEL PEREZ) quien establece que es posible acceder a la propuesta establecida por la Junta, pero deberá realizarse un documento por parte de la contadora y los trabajadores donde se manifieste la paz y salvo por concepto de aportes, pagos y parafiscales con todo el personal, que además se indique en la misma, que no se realizará ninguna reclamación futura. Por otro lado, se establece por parte de la interventoría la necesidad de que se pueda estipular que los trabajos voluntarios deberán contar con el acompañamiento técnico del ingeniero y que se deberán eximir de cualquier responsabilidad a la JAC por cualquier situación que se pueda presentar, y que además continúen realizando el uso de los elementos de protección suministrados. La Junta manifiesta que evaluara una posible solicitud de prórroga teniendo en cuenta las situaciones que tienen atrasadas en los temas documentales y de obra.
4.	Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría: -Entregar la reprogramación acotando las situaciones de costeo que se están indicando en el presente comité. -Revisar las cantidades asociadas a concretos que se entregaron en la última reprogramación entregada. -Revisar bien los costos asociados a los componentes administrativos y asociados a la carga prestacional del maestro, de tal manera que se pueda garantizar el uso de todos los recursos asociados para el convenio, y en caso de estipularse un incremento en el alcance por excedentes, se pueda realizar oportunamente. Frente a esta estipulación miembro de comité y veeduría consideran que no es prudente el incremento de meta física, puesto que por las condiciones logísticas, en la zona está muy complicado consecución de personal y no se puede cumplir con la meta inicial, por lo que consideran prudente realizar devolución en caso de presentarse saldos. • Presentación inmediata de los formatos solicitados correspondientes al mes de Abril y Mayo. • En obra realizar actividades de relleno laterales hacia los costados de bordillo para evitar socavaciones por lluvia.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Scanned with MOBILE SCANNER

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	Se realiza aprobación del plan de inversión de la obra y de los costos administrativos. Para el caso de mano de obra, se determina trabajos para 5 personas en total.
3.	Realizar la presentación de los documentos solicitados por la interventoría para que las labores en campo se desarrollen mediante trabajo voluntario por parte de los mismos trabajadores que venían asociados a nómina. Presentar además la paz y salvos.
4.	Se solicita por parte de la interventoría: - Informar oportunamente cualquier novedad que afecte las condiciones tratadas en el presente comité. - Realizar oportunamente la remisión de formatos para pagos a proveedores. - Revisar bien los costos asociados a los componentes administrativos y asociados a la carga prestacional del maestro, de tal manera que se pueda garantizar el uso de todos los recursos asociados para el convenio, y en caso de estipularse un incremento en el alcance por excedentes, se pueda realizar oportunamente. - Autorización pagos personal hasta el 15 de Mayo.

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X___ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X___ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Presentación de paz y salvo y documentos de trabajo voluntario.	JAC/contadora	Máximo lunes 20 de Mayo de 2024
Entregar a nuevo personal los elementos de protección personal y overoles. Realizar vinculación y nueva contratación	JAC/contadora	
Solicitud de prórroga en caso de considerarse	JAC	20 de Mayo de 2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
NA	NA	NA

Scanned with MOBILE SCANNER

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROPOSICIONES Y VARIOS.


Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
NA	NA	NA

FIRMAS DE ASISTENTES:

ISRAEL MUÑOZ

Nombre:
Cargo: Presidente OAC ISRAEL MUÑOZ

Nombre:
Cargo: Residente de Obra



Nombre:
Cargo: Res. Interventoría

Nombre:
Cargo: Contadora JAC

Nombre: Lidia Nau. Gm R
Cargo: Delegado Veeduría

Nombre:
Cargo: Interventoria

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Scanned with MOBILE SCANNER

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 7	**Dirección Territorial INVIAS:** CAUCA	**Fecha:** 16/05/2024
Vereda – Municipio - Departamento: La Estrella-Morales Cauca		
No. Convenio(s) Solidario(s): 4679 de 2023		
Ejecutor(es): Junta de acción Comunal La Estrella		

PARTICIPANTES

Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Hernán Dario Peña	JAC La Estrella	Representante legal
Emilson Ávila	JAC La Estrella-delegado	Veedor
Arley Danilo Velasco	JAC la Estrella	Contador
Juan Felipe Osorio	JAC la Estrella	Residente de obra
Juan Carlos Sanabria	Interventoría	Director Interventoría
Vivian Andrea Galindo Sandoval	Interventoría	Residente de Interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Presentar a los miembros del comité y la veeduría ciudadana para verificación de quórum para toma de decisiones.
2. Realizar verificación de compromisos reunión anterior.
3. Realizar valoración y revisión de la reprogramación presentada por la JAC.
4. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

AGENDA DEL COMITE: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Lectura acta de comité anterior y verificación de compromisos.
2- Evaluación y aprobación de cotizaciones.
3- Información respecto de los diseños presentados.
4- Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	Se realiza lectura acta de comité anterior y se realiza verificación de compromisos: Asistentes a reunión. Presencialmente, veeduría, contador, presidente de la junta y residente de interventoría
2.	Evaluación compromisos acta anterior.: Remisión oportuna de formatos para solicitud de desembolsos. Se ha dado cumplimiento parcial, aún faltan pagos por autorizar según los servicios recibidos en obra.

Scanned with MOBILE SCANNER

3.	La JAC LA ESTRELLA presenta reprogramación de obra, sin embargo, hace la claridad que respecto a pagos de mano de obra con cargo al convenio sólo fue posible cuantificarlo hasta el 15 de Mayo, que por situaciones asociadas al clima que afectaron los rendimientos de mano de obra, así mismo los bajos rendimientos que presentó la mano de obra hasta la fecha, no fue posible terminar la totalidad de las actividades contempladas en el presupuesto ajustado. Así las cosas, proponen que el desarrollo de las actividades faltantes, que corresponden a construcción de alcantarilla, y a fundición de alrededor de 25 ml de placahuella, las desarrollarán con el acompañamiento voluntario de la comunidad (teniendo en cuenta que los trabajadores asociados a nomina son habitantes de la vereda, excepto la necesidad que tendrían para vincular el maestro, que les tocaría buscar y orientar su pago con los recursos asociados a gastos administrativos. Frente a esta inquietud se establece comunicación telefónica con la representante legal de la Interventoría (MABEL PEREZ) quien establece que es posible acceder a la propuesta establecida por la Junta, pero deberá realizarse un documento por parte del contador y los trabajadores donde se manifieste la paz y salvo por concepto de aportes, pagos y parafiscales con todo el personal, que además se indique en la misma, que no se realizará ninguna reclamación futura. Por otro lado, se establece por parte de la interventoría la necesidad de que se pueda estipular que los trabajos voluntarios deberán contar con el acompañamiento técnico del ingeniero y que se deberán eximir de cualquier responsabilidad a la JAC por cualquier situación que se pueda presentar, y que además continúen realizando el uso de los elementos de protección suministrados. La Junta manifiesta que evaluara una posible solicitud de prórroga teniendo en cuenta las situaciones que tienen atrasadas en los temas documentales y de obra.
4.	Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría: -Entregar la reprogramación acotando las situaciones de costeo que se están indicando en el presente comité. -Revisar las cantidades asociadas a concretos que se entregaron en la última reprogramación entregada. -Revisar bien los costos asociados a los componentes administrativos y asociados a la carga prestacional del maestro, de tal manera que se pueda garantizar el uso de todos los recursos asociados para el convenio, y en caso de estipularse un incremento en el alcance por excedentes, se pueda realizar oportunamente. Frente a esta estipulación miembro de comité y veeduría consideran que no es prudente el incremento de meta física, puesto que, por las condiciones logísticas, en la zona está muy complicado consecución de personal y no se puede cumplir con la meta inicial, por lo que consideran prudente realizar devolución en caso de presentarse saldos, considerando que, logrando la construcción de los 150 metros, establecen positivamente el impacto en la comunidad. • Presentación inmediata de los formatos solicitados correspondientes al mes de Abril y Mayo. • En obra realizar actividades de relleno laterales hacia los costados de bordillo para evitar socavaciones por lluvia.

Scanned with MOBILE SCANNER

	• Realizar actividades para garantizar acceso a vivienda, bordillo que no puede ser ejecutado a la misma altura en 6 metros de acceso.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	Se realiza aprobación del plan de inversión de la obra y de los costos administrativos. Para el caso de mano de obra, se determina necesidad de vinculación de un maestro y dos ayudantes.
3.	Realizar la presentación de los documentos solicitados por la interventoría para que las labores en campo se desarrollen mediante trabajo voluntario por parte de los mismos trabajadores que venían asociados a nómina. Presentar además la paz y salvos.
4.	Se solicita por parte de la interventoría: -Informar oportunamente cualquier novedad que afecte las condiciones tratadas en el presente comité. -Realizar oportunamente la remisión de formatos para pagos a proveedores. -Revisar bien los costos asociados a los componentes administrativos y asociados a la carga prestacional del maestro, de tal manera que se pueda garantizar el uso de todos los recursos asociados para el convenio, y en caso de estipularse un incremento en el alcance por excedentes, se pueda realizar oportunamente. -Autorización pagos personal hasta el 15 de Mayo.

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO _X___	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO _X___	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Presentación de paz y salvo y documentos de trabajo voluntario.	JAC/contador	Máximo lunes 20 de Mayo de 2024
Entregar a nuevo personal los elementos de protección personal y overoles. Realizar vinculación y nueva contratación	JAC/contador	
Solicitud de prórroga	JAC	20 de Mayo de 2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
NA	NA	NA

Scanned with MOBILE SCANNER

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre:
Cargo: Contador

Nombre:
Cargo: Interventor

Emilson Avila V
Nombre: Emilson Avila V
Cargo: Representante Veeduría Ciudadana

Hernan Dario Peño
Nombre: Hernan Dario Peño
Cargo: Presidente JAC La Estrella

Diana Paola Velasco
Nombre: Diana Paola Velasco
Cargo: Secretaria JAC La Estrella

Juan Felipe O.
Nombre: Juan Felipe O.
Cargo: Residente de obra

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Scanned with MOBILE SCANNER

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 7	**Dirección Territorial INVIAS:** CAUCA	**Fecha:** 16/05/2024
Vereda – Municipio - Departamento: Las Guacas-Morales Cauca		
No. Convenio(s) Solidario(s): 4464 de 2023		
Ejecutor(es): Junta de acción Comunal Las Guacas		

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Mónica Fernández	JAC Las Guacas	Representante legal
Emilsen Muelas	JAC Las Guacas -delegado	Veedora
Arley Danilo Velasco	JAC Las Guacas	Contador
Juan Felipe Osorio	JAC Las Guacas	Residente de obra
Juan Carlos Sanabria	Interventoría	Director Interventoría
Vivian Andrea Galindo Sandoval	Interventoría	Residente de Interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Presentar a los miembros del comité y la veeduría ciudadana para verificación de quórum para toma de decisiones.
2. Realizar verificación de compromisos reunión anterior.
3. Realizar valoración y revisión de la reprogramación presentada por la JAC.
4. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

AGENDA DEL COMITE: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Lectura acta de comité anterior y verificación de compromisos.

2- Evaluación y aprobación de cotizaciones.

3- Información respecto de los diseños presentados.

4- Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar).***

Tema	Resumen
1.	Se realiza lectura acta de comité anterior y se realiza verificación de compromisos: Asistentes a reunión. Presencialmente, veeduría, contador, presidente de la junta y residente de interventoría
2.	Evaluación compromisos acta anterior.: Remisión oportuna de formatos para solicitud de desembolsos. Se ha dado cumplimiento parcial, aún faltan pagos por autorizar según los servicios recibidos en obra. Respecto de la remsilón de pagos de seguridad social y retefuente, se dio cumplimiento el 14 de Mayo de 2024.
3.	La JAC LA ESTRELLA presenta reprogramación de obra, sin embargo, hace la claridad que respecto a pagos de mano de obra con cargo al convenio sólo fue posible cuantificarlo hasta el

Scanned with MOBILE SCANNER

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	15 de Mayo, que por situaciones asociadas al clima que afectaron los rendimientos de mano de obra, así mismo los bajos rendimientos que presentó la mano de obra hasta la fecha, la dificultad de los ingresos de material, que aún no se han completado para la terminación de la obra; por lo que no fue posible terminar la totalidad de las actividades contempladas en el presupuesto ajustado. Así las cosas, proponen que el desarrollo de las actividades faltantes, aclarando que están pendientes actividades de fundición de alrededor de 9 metros de placa huella y la construcción de la alcantarilla, tubería que aún no ha llegado a la zona de trabajo. Sugieren que dichas actividades las realizarán con el acompañamiento voluntario de la comunidad (teniendo en cuenta que los trabajadores asociados a nomina son habitantes de la vereda, excepto la necesidad que tendrían para vincular el maestro, que les tocaría buscar y orientar su pago con los recursos asociados a gastos administrativos. Frente a esta inquietud se establece comunicación telefónica con la representante legal de la Interventoría (MABEL PEREZ) quien establece que es posible acceder a la propuesta establecida por la Junta, pero deberá realizarse un documento por parte del contador y los trabajadores donde se manifieste la paz y salvo por concepto de aportes, pagos y parafiscales con todo el personal, que además se indique en la misma, que no se realizará ninguna reclamación futura. Por otro lado, se establece por parte de la interventoría la necesidad de que se pueda estipular que los trabajos voluntarios deberán contar con el acompañamiento técnico del ingeniero y que se deberán eximir de cualquier responsabilidad a la JAC por cualquier situación que se pueda presentar, y que además continúen realizando el uso de los elementos de protección suministrados. La Junta manifiesta que evaluara una posible solicitud de prórroga teniendo en cuenta las situaciones que tienen atrasadas en los temas documentales y de obra.
4.	Solicitudes y recomendaciones por parte de la Interventoría: -Entregar la reprogramación acotando las situaciones de costeo que se están indicando en el presente comité. -Revisar las cantidades asociadas a concretos que se entregaron en la última reprogramación entregada. -Revisar bien los costos asociados a los componentes administrativos y asociados a la carga prestacional del maestro, de tal manera que se pueda garantizar el uso de todos los recursos asociados para el convenio, y en caso de estipularse un incremento en el alcance por excedentes, se pueda realizar oportunamente. Frente a esta estipulación miembro de comité y veeduría consideran que no es prudente el incremento de meta física, puesto que, por las condiciones logísticas, en la zona está muy complicado consecución de personal, y el acceso de materiales está complicado y se ha dificultado cumplir con la meta inicial, por lo que consideran prudente realizar devolución en caso de presentarse saldos, considerando que, logrando la construcción de los 127 metros, establecen positivamente el impacto en la comunidad, debido a que se realiza en el tramo más crítico. • Presentación inmediata de los formatos solicitados correspondientes al mes de Abril y Mayo.

Scanned with PDF MOBILE SCANNER

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	• En obra realizar actividades de relleno laterales hacia los costados de bordillo para evitar socavaciones por lluvia, sobre todo en zona cercana a puente. Así mismo, realizar corte adecuado de talud para descole alcantarilla.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	Se realiza aprobación del plan de inversión de la obra y de los costos administrativos. Para el caso de mano de obra, se determina necesidad de vinculación de un maestro y dos ayudantes.
3.	Realizar la presentación de los documentos solicitados por la interventoría para que las labores en campo se desarrollen mediante trabajo voluntario por parte de los mismos trabajadores que venían asociados a nómina. Presentar además la paz y salvos.
4.	Se solicita por parte de la interventoría: -Informar oportunamente cualquier novedad que afecte las condiciones tratadas en el presente comité. -Realizar oportunamente la remisión de formatos para pagos a proveedores. -Revisar bien los costos asociados a los componentes administrativos y asociados a la carga prestacional del maestro, de tal manera que se pueda garantizar el uso de todos los recursos asociados para el convenio, y en caso de estipularse un incremento en el alcance por excedentes, se pueda realizar oportunamente. -Autorización pagos personal hasta el 15 de Mayo.

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO _X___	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO _X___	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO __X__	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Presentación de paz y salvo y documentos de trabajo voluntario.	JAC/contador	Máximo lunes 20 de Mayo de 2024
Entregar a nuevo personal los elementos de protección personal y overoles. Realizar vinculación y nueva contratación	JAC/contador	
Solicitud de prórroga	JAC	20 de Mayo de 2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la activ	Medio de verificación
NA	NA	NA

Scanned with MOBILE SCANNER

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Arley Daniela Velasco Sanchez
Cargo: Contador

Nombre:
Cargo: Interventor

Nombre: Monica Andrea Fernandez Morales
Cargo: Presidente de la JAC Guacas

Nombre:
Cargo: Secretaria de la JAC

Nombre: Por Emilse Muelos
Cargo: Representante veeduría ciudadana

Nombre: Juan Felipe Osorio.
Cargo: Residente de obra

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Scanned with MOBILE SCANNER

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte

JAC LAS GUACAS
Municipio de Morales, Cauca



ANTES (Marzo)

230
Beneficiarios directos e indirectos

66,8 %
Avance de ejecución





DESPUÉS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte

JAC LAS GUACAS
Municipio de Morales, Cauca



ANTES (Marzo)

230
Beneficiarios directos e indirectos

74,43%
Avance de ejecución





DESPUÉS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte

JAC LA ESTRELLA
Municipio de Morales, Cauca



ANTES (Marzo)

240
Beneficiarios directos e indirectos

51,23%
Avance de ejecución



DESPUÉS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte

JAC LA ESTRELLA
Municipio de Morales, Cauca



ANTES

240
Beneficiarios directos e indirectos

72,59 %
Avance de ejecución





DESPUÉS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

28 de Abril al 15 de Mayo de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte

JAC AGUA BONITA
Municipio de Morales, Cauca



ANTES

350
Beneficiarios

66,8 %
Avance de ejecución



DESPUÉS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte

JAC AGUA BONITA
Municipio de Morales, Cauca



ANTES

350
Beneficiarios

80,16 %
Avance de ejecución





DESPUÉS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1 de Mayo de 2024 4464

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 Ayudantes

Equipo: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se continua con amarre de acero desde K0+130 a K0+105
Se realiza fundición de concreto ciclopeo desde K0+130 a K0+130. Se realiza acarreo de arena y triturado

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

2 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 Ayudantes

Equipo: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición de concreto reforzado desde K0+130 a K0+120. Se realiza traslado de arena, triturado y cemento

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

3 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 Ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba mezcladora

Actividades:
Se continua con armado de acero y formaleteado hasta K0+305

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

4 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 Ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba mezcladora

Actividades:
Se continua con formaleteado y amarre de acero hasta K0+305

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

6 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 Ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba mezcladora

Actividades:
Se continua con formaleteado desde K0+90 y se avanza en excavacion de riostras y fundición de solados.
Se realiza traslado de arena y tritarado internos.dia en mal ~~dado~~.
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

7 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 Ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se continua con amarre de acero hasta K0+105 y se continua con formaleteado hasta K0+60
Formaleteo y amarre en zapata cneto. (K0+105)

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

8 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición de concreto desde K0+120 a K0'+105

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.

9 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se avanza en amarre de acero y formaleteado hasta K0+60

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

10 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 Ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición desde K0+93 a K0+75
Se realiza traslado de arena y cemento

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.

11 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora.

Actividades:
Se continua con fundición hasta K0+060 y se continua con formaleteado hasta K0+045 aproximadamente y excavación y fundición de solados para riostras
Se realiza transporte de material triturado y arena

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

13 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se continua con formaleteado y amarre de acero hasta K0+045
Se realiza traslado de cemento, arena y triturado

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.

14 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se continua con fundición desde K0+60 a K0+050 aproximadamente. Se realiza acarreo interno de arena y triturado

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

15 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 3 ayudantes

Equipos: Rana compactadora, vibrador de concreto, planta, motobomba, mezcladora

Actividades:
Se realiza formaleteado de sardineles desde K0+93 aproximadamente hasta K0+050 y se retira formaleta de paños fundidos

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

4679

1 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza formaleteado para concreto ciclopeo y fundición desde K0+120 a K0+130, se avanza en amarre de acero y formaleteado de paños en concreto rígido
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

2 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza conformación de canetas y se avanza en formaleteado e instalación de acero

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

3 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición de cunetas desde K0+200 a K0+150
y
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

4 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se continua con fundición de cunetas desde K0+200 a K0+150 margen derecho y se realiza formaleteado y amarre de acero

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

6 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición de concreto rigido desde K0+140 a K0+120

Se diligencia formata del estado del tiempo

Juan Felipe O.

7 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudanbe

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se continua conformación de cunetas y amarre de acero, amarre de acero y formaleteado para paños en concreto hasta K0+110

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

8 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición de concreto ciclopeo central desde K0+140 a K0+120 y se continua con armado de acero y formale

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

9 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición de paños en concreto desde K0+120 a K0+110, se continua con perfilado y ajuste de excavación para la alcantarilla, se avanza en formaleteado de berma desde K0+110 a K0+090

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

10 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se continua con formaleteado de bermas desde K0+110 a K0+080 y se realiza fundición

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.

11 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza armado de acero y formaleteado de paños en concreto reforzado desde K0+110 a K0+80 y formaleteado de sardineles desde K0+200 a K0+110. Se realiza observación por Formaleta. acabado, nivel.
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O

Scanned with MOBILE SCANNER

13 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición de paños en concreto desde K0+130 a K0+080 y sardineles desde K0+200 a K0+130

Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

14 de Mayo de 2024

Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza fundición de ciclopeo desde K0+120 a K0+080 y cunetas y vigas riostras hasta K0+130. Problemas acabado Por lluvia.
Se diligencia formato del estado del tiempo

Juan Felipe O.

Scanned with MOBILE SCANNER

15 de Mayo de 2024


Personal:
1 Maestro y Ayudantes

Equipos: Rana vibratoria, vibrador de concreto, mezcladora

Actividades:
Se realiza formaleteado de sardineles y fundición a ras

Se diligencia formato del estado del tiempo.

Juan Felipe O.



Scanned with MOBILE SCANNER

MAYO 01/2024 4726

- LIMPIEZA EN OBRA
- SE REALIZA RECOLECCION Y ACOPIO DE FORMALETA

ABSCISAS K0+090 - K0+120

Scanned with CamScanner
MOBILE SCANNER

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO 1
OFICIAL 1
AYUDANTE 2

MAYO 02/2024

PERSONAL EN OBRA	EQUIPO
MAESTRO 1	MEZCLADORA 1
OFICIAL 1	
AYUDANTE 2	

SE FUNDE SOLADO DE CONCRETO SE INICIA EN STA'IDICION FORMALETA DE KO+120 AL KO+133

SE REALIZA ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

MAYO 03/2024

SE REALIZA FUNDICION DE CONCRETO DE LOSAS DE LA PISTA HUELLA

ABSCISA KO+120 A KO+133 Y ABSCISAS KO+090 A KO+120 SE FIGURA Y ARMA ACERO DE REFUERZO DILATADORES

PERSONAL EN OBRA	EQUIPO
MAESTRO 1	MIXER 1
OFICIAL 1	VIBRADOR 1
AYUDANTE 2	PLANTA ELECTRICA 1

Scanned with MOBILE SCANNER

MAYO 04/2024

- SE FUNDE CUNETA CON BORDILLO CON CONCRETO PREMEZCLADO
- SE FUNDE CONCRETO CICLOPEO.

ABSCISAS KO+090 A KO+133

PERSONAL EN OBRA

		EQUIPO	
MAESTRO	1	MIXER	1
OFICIAL	1	MEZCLADORA	
AYUDANTE	2	VIBRADOR	
		PLANTA ELECTRICA	

MAYO 05/2024.

DOMINGO - NO HUBO ACTIVIDAD EN OBRA

MAYO 06/2024

- SE ARMA FORMALETA DE LOSA Y MUROS

ABSCISAS KO+090 A KO+133

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO 1
OFICIAL 1
AYUDANTE 2

MAYO 07/2024

- SE CONTINUA CON EL ARMADO DE FORMALETA

ABSCISAS KO+090 A KO+133

Scanned with MOBILE SCANNER

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO 1
OFICIAL 1
AYUDANTE 2

MAYO 08 / 2024

- SE REALIZA EXCAVACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCANTARILLA
ABSCISA KO+133

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO 1
OFICIAL 1
AYUDANTE 2

MAYO 09 / 2024

SE REALIZO FUNDICION DE LOSAS Y MUROS DE LA PILA HUELLA - CICLO PREMEZCLADO
ABSCISA KO+090 A KO+133

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO 1
OFICIAL 1
AYUDANTE 2

EQUIPO

MIXER 1
VIBRADOR 1
PLANTA ELECTRICA 1

MAYO 10 / 2024

SE FUNDE CUNETA Y BORDILLO CON CONCRETO PREMEZCLADO

ABSCISA KO+090 A KO+133

Scanned with MOBILE SCANNER

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
INGENIERO	1	MIXER	1
OFICIAL	1	VIBRADOR	1
AYUDANTE	2	PLANTA ELECTRICA	1

MAYO 11/2024

SE PEDIDO FUNDICION CON CONCRETO CICLOPEO

OBSERVADO K0+090 A K0+133

SE FUNDICIONADO ALCANTARILLA DE OBSERVADO K0+133

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
INGENIERO	1	MEZCLADORA	1
OFICIAL	1		
AYUDANTE	2		

EL RESTO DEL TIEMPO SE CONSIGNA EN EL FORMATO RESPECTIVO

MAYO 12/2024

DOMINGO - NO HUBO ACTIVIDAD EN OBRA

MAYO 13/2024

LUNES FESTIVO - NO HUBO ACTIVIDAD EN OBRA

Scanned with MOBILE SCANNER

MAYO 14/2024

SE RETIRA FORMALETA

SE INICIA CON LIMPIEZA DE FORMALETA

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	2

MAYO 15/2024

SE INSTALA FORMALETA

OBSERVACIONES KO+090 A KO+133

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	2

MAYO 16/2024

SE FUNDE CONCRETO CON BORDILLO CON CONCRETO PREMEZCLADO

OBSERVACIONES KO+090 A KO+133

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
MAESTRO	1	MINER	1
OFICIAL	1	VIBRADOR	1
AYUDANTE	2	PLANTA ELECTRICA	1

Scanned with CamScanner

MAYO 17/2024

LIMPIEZA PERSONAL DE OBRA

SE RETIRA FORMALETA DE LOS TRAMOS FUNDIDOS

PERSONAL EN OBRA

MAESTRO 1
OFICIAL 1
AYUDANTE 2

MAYO 18/2024

SE INICIA INSTALACION DE FORMALETA

OBJETOS #0+090 A #0+133

MAYO 19/2024

DOMINGO: NO HUBO ACTIVIDAD EN OBRA

MAYO 20/2024

DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO - SE SUSPENDEN ACTIVIDADES

Scanned with CamScanner MOBILE SCANNER

MAYO 21 /2024
MAYO 22 /2024
MAYO 23 /2024
MAYO 24 /2024
MAYO 25 /2024
MAYO 26 -DOMINGO
MAYO 27 /2024
MAYO 28 /2024
MAYO 29 /2024
MAYO 30 /2024
MAYO 31 /2024

NO HUBO ACTIVIDAD EN OBRA

SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS LOS DESPACHOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES LO QUE HACE IMPOSIBLE REALIZAR ACTIVIDADES EN OBRA.
Además no se contó con Personal Vinculado.

Scanned with MOBILE SCANNER
