SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 05

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 de 2023
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3394 de 2023

INTERVENTORÍA
CONSORCIO VALTOR



INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PERIODO:
JULIO DE 2024

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CUADRO DE ASPECTOS CONTRACTUALES

Contratista de obra:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA
convenio Solidario No.:	3394-2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Fecha de iniciación:	04 de diciembre de 2023
Fecha de vencimiento inicial:	31 de diciembre de 2023
Suspensión No.1	07 de diciembre de 2023
Prórroga No. 01:	19 de enero de 2024
Prorroga No. 02:	26 de abril de 2024
Prorroga No. 03:	05 de julio de 2024
Fecha de terminación actual:	Hasta el 31 de julio de 2024

Interventor:	CONSORCIO VALTOR
Contrato Interventoría No:	4760 DE 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Fecha de inicio:	18 de diciembre de 2023
Fecha de vencimiento inicial:	31 de diciembre de 2023
Suspensión No.1	29 de diciembre de 2023
Suspensión No. 2	17 de enero de 2024
Ampliación a suspensión No.1	28 de febrero de 2024
Reinicio No. 1	17 de enero de 2024
Reinicio No. 2	28 de febrero de 2024
Reinicio No. 3	21 de marzo de 2024
Prórroga No. 01:	21 de marzo de 2024
Prorroga No. 2:	26 de abril de 2024
Prórroga No. 3	05 de julio de 2024

Fecha de terminación actual:	Hasta el 31 de julio de 2024

1. INTRODUCCIÓN.

En el presente informe de Interventoría correspondiente al periodo de Julio de 2024, se describen las actividades desarrolladas dentro del plazo de desarrollo del convenio No. 3394 de 2023 de acuerdo al programa caminos comunitarios de la paz total en colaboración con el INVIAS para el mantenimiento y mejoramiento vial, aumento de la velocidad comercial y comodidad al transitar la vía principal que da acceso a la vereda LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, departamento del Huila y en contemplación de lo siguiente:

- El Proyecto está a cargo de la SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
- El Ingeniero Wilder Orley Salazar Cuellar, fue designado como Supervisor del contrato de Interventoría.
- El Convenio No.: 3394 de 2023 se encuentra activo y cuenta con los recursos asignados en el banco AV Villas
- El contrato tiene como fecha de finalización del convenio el 31 de julio de 2024.
- Que el presente Informe Mensual de Interventoría No.: 05, se elaboró atendiendo lo establecido en el MANUAL DE INTERVENTORÍA del INVIAS y en él, se describen las principales actividades desarrolladas durante el periodo.

Esta interventoría se hace responsable de la información suministrada y el contenido del presente documento como el tercer informe del convenio para reportar las actividades y en general el proceso de ejecución del proyecto de mejoramiento vial de la vía principal que da acceso a la VEREDA SAN ANTONIO mediante la construcción de placa huella con la longitud que nos entrará a determinar el presupuesto así como el alcance del convenio a presentar por el ingeniero residente de obra y de esta manera mejorar la red vial de la zona. A la fecha el balance de obra arroja un alcance de 145 m de placa huella, un canal de 66m de longitud y una alcantarilla.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

Las actividades por ejecutar bajo el alcance del contrato de obra número 3394 de 2023 van a ser desarrolladas en un (01) tramo como se muestra a continuación:

• Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

• Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras.

• Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

El tramo esta ubicados en la vereda SAN ANTONIO, municipio de Timaná en el departamento del Huila.

En la Figura 1 se presenta la localización del tramo:

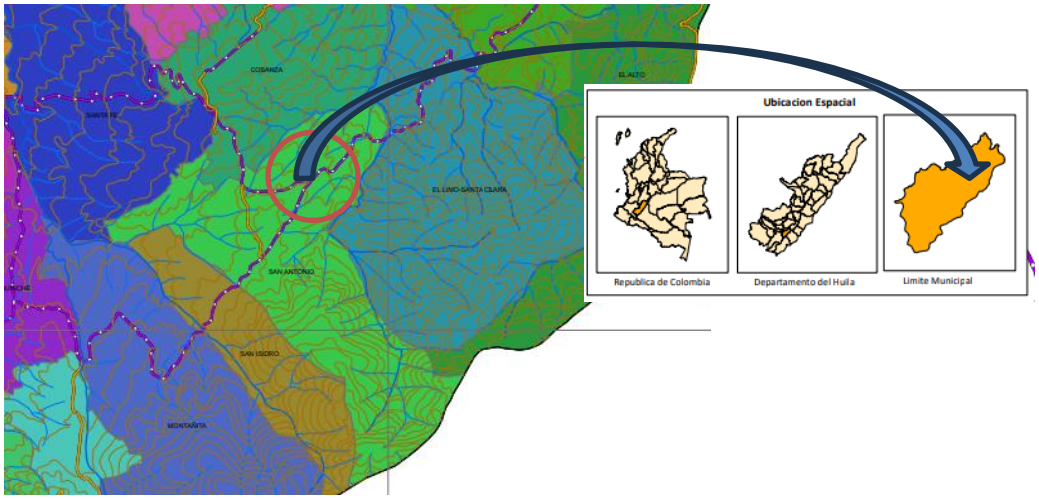


Figura 1. Localización General del Proyecto

TRAMO 1

Localización: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Timaná, departamento del Huila, en la vereda San Antonio, teniendo como punto de referencia inicial salida del caserío en la vía San Antonio – Cosanza con coordenadas decimales NORTE 1.962576 OESTE 75.887187 y punto de referencia final las coordenadas decimales NORTE 1.964089 OESTE 75.888048, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.

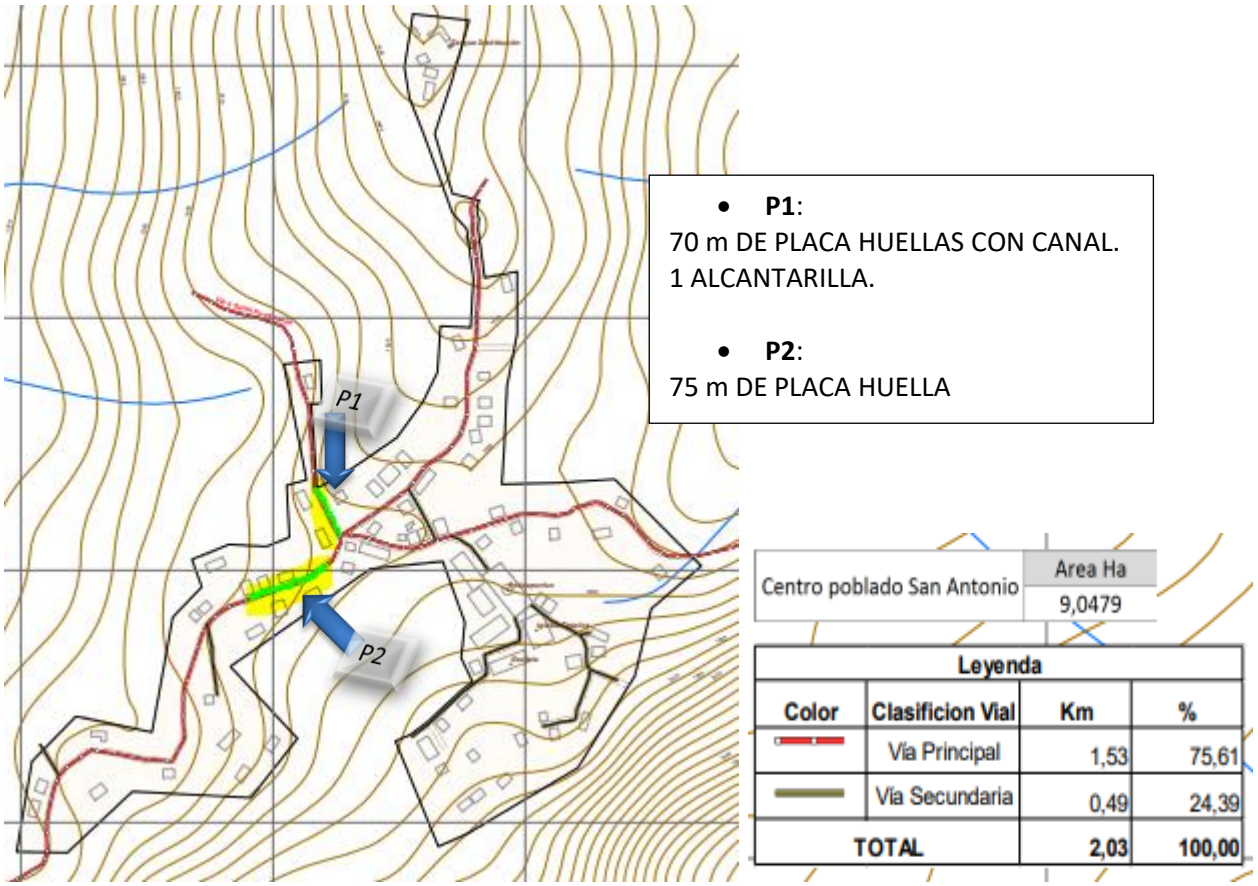


Figura 2. Localización especifica del Proyecto tramo 1

Algunos beneficios:

- ☑ **Mejora de la accesibilidad**: El mejoramiento vial tipo placa huella facilita el acceso a comunidades remota, permitiendo que los residentes y las empresas puedan desplazarse de manera más eficiente.

- ☑ **Incremento de la seguridad en la vía:** El mejoramiento de la vía tipo placa huella puede ayudar a reducir los accidentes de tráfico y mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras.

- ☑ **Impulso al desarrollo económico**: Aumento de la conectividad entre diferentes áreas, mejora la velocidad comercial de la zona. Esto puede estimular el desarrollo económico local al fomentar el comercio, el turismo y la inversión en la región.

- ☑ **Mejora de la calidad de vida:** Con una vía más transitable, los residentes locales pueden acceder con mayor facilidad a servicios básicos como atención médica, educación y mercados. Además, se reduce el tiempo de viaje y el desgaste de los vehículos, lo que contribuye a mejor calidad de vida para los habitantes del sector.

En resumen, el proyecto de mejoramiento vial tipo placa huella puede traer una serie de beneficios significativos para el sector en la VEREDA SAN ANTONIO obteniendo de esta forma un impulso económico y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del sector.

2.2. Inventario y Estado Inicial de las vías

En la visita a la obra se realizó el análisis al tramo y se evidenció deterioro en el afirmado y en los drenajes por lo que es necesario el mejoramiento de la vía mediante la construcción de la placa huella para mejorar las condiciones de tránsito y seguridad y de esta manera aportar a la velocidad comercial del sector.

ESTADO INICIAL DE LAS VIAS

A continuación, se encuentra el registro fotográfico de las condiciones iniciales del proyecto de construcción de la placa huella.

Tramos No.01



Tramo 1, sector SAN ANTONIO, estado actual de la vía P1



Tramo 1, sector SAN ANTONIO, inspección obras de drenaje P1



Tramo 1, sector SAN ANTONIO, ALCANCE DEL PROYECTO P2



Tramo 1, sector SAN ANTONIO, estado actual de la vía P2

2.3. Características técnicas del proyecto.

Con relación al convenio No.: 3394 de 2023 en la construcción de aproximadamente ciento cuarenta y tres (142) metros lineales de placa huella y una alcantarilla de acuerdo con el presupuesto inicial realizado por el INVIAS, de acuerdo a las cantidades que arroja estudios y diseños, se realizó ajuste al presupuesto y un balance de obra en el que se proyecta la construcción de una alcantarilla, un canal lateral de 66 m y una longitud de 145m de placa huella.

A continuación, se encuentra el resumen de las obras programadas para ejecutar dentro del contrato:

DESCRIPCIÓN

- Base granular cumpliendo con INV 320-13, INV 300-13 y NT1
- Preparación del terreno para garantizar un excelente afirmado.
- Transporte de materiales de afirmado para la base.
- Topografía
- Estudio de suelos y laboratorios para estimar el CBR de diseño.
- Excavaciones varias sin clasificar.
- Mejoramiento y raspado de la rasante con motoniveladora
- Rocería
- Compactación del material granular con vibro compactador.
- Concreto Resistencia 21 Mpa tipo (E)
- Placas de concreto vaciada in situ.
- Cuneta de concreto vaciada in situ.
- Canal de concreto vaciada in situ.
- Figurado de Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
- Bordillo de concreto vaciado in situ; No incluye la conformación de la superficie de apoyo
- Concreto Resistencia 21 Mpa para Alcantarilla y Concreto ciclópeo de 14 Mpa.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1 Información General del Contrato.

Convenio Solidario No.: 3394-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO NIT: 813.005.634 - 1
Dirección correspondencia:	VEREDA SAN ANTONIO
Teléfono:	322-776 85 95
Correo electrónico:	ved.sanantonio.timana@gmail.com
Valor inicial del contrato incluido IVA:	$ 188.472.114,00 COP
Fecha de inicio del contrato:	04 de diciembre de 2023
Plazo inicial del contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1:	07 de diciembre de 2023
Prórroga No. 2:	26 de abril de 2023
Prórroga No. 3:	05 de Julio de 2023
Fecha de terminación actualizada:	31 de julio de 2024
Programa de Inversiones vigente:	Sin programa de inversión
Póliza:	Compañía aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS: 1007857 Responsabilidad Civil.

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Durante el presente mes, comprendido entre el 01 de JULIO de 2024 hasta 31 de JULIO de 2024, se realizaron las actividades que se relacionan a continuación:

se construyó placa huella en 85 m
en análisis financiero se proyectó construcción de 18m más de placa huella para la vía que conecta a la vereda San Isidro.
Se construyo ciclópeo para los 18m.
se construyó placa huella en 103 m vía que conecta a la vereda San Isidro.

Se hallo una filtración de agua en el canal y se debió proyectar un filtro francés en 4m, para que a futuro no registre daños la placa
Se construyo ciclópeo para 70 m vía que conecta San Antonio con la Vereda Cosanza
Se continuo con la construcción de 69,78 m de placa huella hacia la vía de Cosanza, de lo cual ya se ejecutó el concreto ciclópeo y parte de las losas.
Se construyo un filtro francés de 6,5m para manejo de aguas subterráneas, para evitar infiltraciones a la placa huella.
se finalizó al 100% las obras.
El aporte económico de la comunidad permitió que el alcance físico del convenio fuera del 138%
Se realizo comité operativo para aprobación de pagos definitivos y aprobación de compra de materiales para el componente social.
se recopilo la documentación para trasferencias finales a proveedores

3.3 Seguimiento Ítems no previstos:

A la fecha no hubo ningún imprevisto por lo que no se adjunta al informe mensual.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Convenio	Valor ejecutado básico	Porcentaje ejecutado (%)
3394-2023	$253.504.212	135%

Tabla 1 avance de obra

A continuación, se detallan las gestiones realizadas por la Interventoría durante el periodo correspondiente al presente informe:

- se construyó placa huella en 85 m
- en análisis financiero se proyectó construcción de 18m más de placa huella para la vía que conecta a la vereda San Isidro.
- Se construyo ciclópeo para los 18m.
- se construyó placa huella en 103 m vía que conecta a la vereda San Isidro.
- Se hallo una filtración de agua en el canal y se debió proyectar un filtro francés en 4m, para que a futuro no registre daños la placa
- Se construyo ciclópeo para 70 m vía que conecta San Antonio con la Vereda Cosanza
- Se continuo con la construcción de 69,78 m de placa huella hacia la vía de Cosanza, de lo cual ya se ejecutó el concreto ciclópeo y parte de las losas.
- Se construyo un filtro francés de 6,5m para manejo de aguas subterráneas, para evitar infiltraciones a la placa huella.
- se finalizó al 100% las obras.
- El aporte económico de la comunidad permitió que el alcance físico del convenio fuera del 138%

- Se realizo comité operativo para aprobación de pagos definitivos y aprobación de compra de materiales para el componente social.
- se recopilo la documentación para trasferencias finales a proveedores

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4.1 Informe Semanal

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-03, se registra de manera resumida las actividades y progreso del contrato de obra.
Se presenta copia del informe semanal, el original fue radicado en el INVIAS Territorial Huila y copia de los cuales se remitió al Gestor del contrato:

- ☑ Informe Semanal No. 15 periodo: 28 de JUNIO de 2024 hasta 04 de JULIO de 2024
- ☑ Informe Semanal No. 16 periodo: 05 de JULIO de 2024 hasta 11 de JULIO de 2024
- ☑ Informe Semanal No. 17 periodo: 12 de JULIO de 2024 hasta 18 de JULIO de 2024
- ☑ Informe Semanal No. 18 periodo: 19 de JULIO de 2024 hasta 25 de JULIO de 2024
- ☑ Informe Semanal No. 19 periodo: 26 de JULIO de 2024 hasta 01 de AGOSTO de 2024

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, se registra el control diario para el periodo de la maquinaria y el equipo dispuesto en obra.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se registra el control diario de personal dispuesto en la obra en cumplimiento de previsto en el pliego de condiciones. formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, se presenta el informe financiero y presupuestal.
De acuerdo con el contrato de obra, se pagará al contratista mediante actas de corte, revisadas y aprobadas por la Interventoría, previo anexo del programa de inversión del correspondiente mes y de la presentación de los soportes de pago de seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista.

4.5 Estado General del Tiempo

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, se presenta el registro del estado general del tiempo imperante en la zona del proyecto durante el presente mes.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, se registra los informes de laboratorio iniciales realizados en la contratación de estudio y diseños.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

se presenta el seguimiento de las garantías y seguros del contrato de obra, las cuales se encuentran vigentes a la fecha del presente informe. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Acta de aprobación de estudios y diseños

A la fecha el convenio no se ha realizado la aprobación oficial de estudios y diseños, las JAC no han radicado en físico.

4.9.2 Acta mensual pagos del convenio

Se relaciona en el ACTA PARCIAL DE PAGOS DEL CONVENIO.

4.9.3 Resumen mensual estado general del proyecto

formato suministrado por el INVIAS para el convenio “RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO”

4.9.4 Manejo de desembolso

4.9.4.A Informe inversión buen manejo desembolso

Se realiza seguimiento a al programa de inversiones formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2

4.9.4.B Plan Inversión Desembolso Mensual

Se proyecta formato MEPI-MNIN-6-FR-1 para el programa de inversiones y la reprogramación de acuerdo a los desembolsos.

4.9.5 Actas de comité de operativo y de obra.

- Actas de comité de operativo C4 y sus anexos

4.9.6 Actas de reunión.

No se llevaron a cabo las actas de reunión durante el periodo y se documentación va de acuerdo con el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 Información general del contrato.

Contrato de Interventoría No.:	4760 de 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIO DE TIMANÁEN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Contratista:	CONSORCIO VALTOR
Dirección correspondencia:	Carrera 48 #6-83 casa 107 NEIVA
Teléfono:	3114821018
Correo electrónico:	valtorcaminospaztotal@gmail.com
Valor del contrato incluido IVA:	$ 83.623.321,00
Fecha de inicio del contrato:	18 de diciembre de 2023
Plazo inicial del contrato:	Hasta 31 de diciembre 2023
Fecha de terminación actual:	31 de julio de 2024
Pólizas:	Compañía aseguradora: Mundial de seguros N. 100011698

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Socialización de los convenios a la comunidad y JAC en compañía del personal de Invias Territorial Huila Recorrido a tramo de la vía donde se va a realizar el mejoramiento vial con el fin de identificar los problemas en el sitio los cuales serán intervenidos con el convenio.
- Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista
- Control de permanencia del personal calificado y no calificado
- Revisión de los diferentes documentos presentados por el contratista
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato
- Archivo actualizado de la Interventoría
- Comunicados dirigidos al contratista
- Comunicados dirigidos al INVIAS
- Reuniones con el contratista
- Asistir a las reuniones citadas por el INVIAS
- Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el Contratista en los sectores donde se desarrollan las obras
- Elaboración de informes semanales
- Elaboración de informe mensual
- Medición y cuantificación de cantidades de obra
- Supervisión de ejecución de obras

5.3 Informe Especialistas

Durante el periodo no se presentó informe del profesional Social

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría hace el respectivo seguimiento al convenio No.: 3394-2023 con el director e ingeniero Residente de Interventoría de acuerdo como se relaciona a continuación:

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría:

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se presenta el equipo utilizado por la Interventoría durante el periodo del presente informe.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría:

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría:

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría:

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, se presenta el plan de cargas del contrato de interventoría No.: 4760-2023

6.6.2 Acta de costos

Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1, se presenta Acta de costos del contrato de interventoría No.: 4760-2023

6.6.3 Hoja de ruta y orden de pago contrato de interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-2, se presenta Hoja de ruta y orden de pago del contrato de interventoría No.: 4760-2023

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

TRAMOS No. 01 VEREDA LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ.

OBSERVACIONES

☑ El convenio No.: 3394 de 2023 terminó a satisfacción las obras proyectadas superando la meta física inicial proyectada por el instituto nacional de vías INVIAS.

☑ El convenio No.: 3394 de 2023 Terminó el proyecto con un avance de obra que corresponde al 135% de las actividades ejecutadas y un porcentaje programado acumulado del 138%, debido a que esta pendiente la obra social con participación comunitaria.

CONCLUSIONES

Se recibe por parte de la interventoría las siguientes obras:

- Limpieza de obras menores de drenaje 6 unidades.
- Desmonte y limpieza de zonas no boscosas 0.6 Ha.
- Construcción de placa huella 176.1m donde se incluyeron 92m^2, que fueron proyectados como metros lineales.
- Construcción de una alcantarilla tipo I.
- Filtro Frances 6.5m.
- Canal revestido 64m.

CONCLUSIÓN GENERAL:

Las obras se realizaron de acuerdo los estudios y diseños entregados por los profesionales, al igual que en los laboratorios realizados se dio cumplimiento a los requerimientos de densidades y resistencias.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo


8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras.

Se anexa formato de registro fotografico.

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

No Se anexa formato de registro fotográfico, no se ha recibido la NO OBJECIÓN del componente social.

Atentamente,



_____
DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Contrato No.: 4760 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ASPECTOS GENERALES DE INTERVENTORÍA

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

Convenio Solidario No. 3394-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

Contrato de Interventoría No. 4760-2023 **Interventoría:** CONSORCIO VALTOR

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PLAZO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR INICIAL :**	$ 188.472.114,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	**VALOR ADICIONALES:**	$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:	7/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.472.114,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	19/01/2024	**DESEMBOLSO CONCEDIDO:**	$ 188.472.114,00
PRORROGA:	5/07/2024	**DESEMBOLSO AMORTIZADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2024		
PLAZO ACUMULADO:	7 MESES		

Objeto Contrato de Interventoria:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR INICIAL :**	$ 83.623.321,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	**VALOR ADICIONALES:**	$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:	17/01/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 83.623.321,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	21/03/2024	**DESEMBOLSO CONCEDIDO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2024	**DESEMBOLSO AMORTIZADO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	7 MESES		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA — **PERIODO MES:** JULIO DE 2024

CONVENIO No.: 3394-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 4/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 7/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/01/2024
PRORROGA 5/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 7 meses

VALOR INICIAL : $ 188.472.114,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 188.472.114,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 188.472.114,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4760-2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR — **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Wilder Orlev Salazar Cuellar

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	m	142
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Canal	m	
Mantenimiento			
	Rocería	Ha	0,6
	Limpieza alcantarilla	UND	6

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Mejoramiento	m	85	85
Estructuras	Alcantarillas	UND	0,8	1
	Canal	m	66	66
Mantenimiento			0	0
	Rocería	Ha		0,6
	Limpieza alcantarilla	UND		6

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 141.413.444,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.242.403,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.816.267,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 187.472.114,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 213.092.945,00	$ 213.092.945,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 95.000,00	$ 95.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 40.316.267,00	$ 40.316.267,00
VALOR EJECUTADO	$ 253.504.212,00	$ 253.504.212,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio


INVERSIÓN EN OBRA


INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 187.472.114,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 253.504.212,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 135,22%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTOGRAFIA 1: MAPA DIVISIÓN VEREDAL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO







FOTOGRAFIA 2: VIA A INTERVENIR





FOTOGRAFIA 3: FILTRO FRANCES



Foto 4



FOTOGRAFIA 4: ANTES - DESPUÉS





FOTOGRAFIA 5: ANTES - DESPUÉS



Fo



FOTOGRAFIA 6: ANTES - DESPUÉS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

COMENTARIO. Se dio reinicio al contrato de interventoria el dia 21/03/2024, para ese entoces ya se habia realizado la socialización y se programo reunion con el equipo de trabajo propuesto para avanzar en comité operativo C1

Firma

Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

31/07/2024

Contrato de Obra No. 3394-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

Contrato de Interventoría No. 4760-2023 **Interventoría:** CONSORCIO VALTOR

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** JULIO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANÁ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4760-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VALTOR

CONTRATO DE OBRA No. 3394-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA HONDA	PLACAS SJE21E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA KTM 200	PLACAS EVV186	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA PULSAR	PLACAS OS264E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	85	85	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
												0,8	1																			
												66	66																			

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
NO SE HA INICIADO OBRAS

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND

Firma

Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO VALTOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANÁ

CONTRATO DE OBRA No.: 3394-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	DORA CRISTINA TORRES	53.124.968	DIRECTORA	$ 2.900.000																															0,5	VALTOR	40%	$ 15.700	V	SANITAS	9467852328	$ 162.500	COLPENSIONES	9466986151	$ 208.000	$ -			
2	GLORIA CONSUELO FIGUEROA	26.455.998	RESIDENTE	$ 2.600.000																															1	VALTOR	100%	$ 181.000	V	SANITAS	9467670374	$ 104.000	COLPENSIONES	9466986151	$ 416.000	$ 104.000			
3	JENIFER SUAREZ	40.944.806	INSPECTOR	$ 1.300.000																															1	VALTOR	100%	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9467670374	$ 52.000	COLFONDOS	9466986151	$ 208.000	$ 52.000			
4	GERARDO TORRES	4.948.812	INSPECTOR	$ 1.300.000																															1	VALTOR	100%	$ 90.500	V	SANITAS	9467670374	$ 52.000	COLPENSIONES	9466986151	$ 208.000	$ 52.000			
5																																																		
6																																																		
7																																																		
8																																																		
9																																																		
10																																																		
N																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

JUNIO DE 20

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANÁ

CONTRATO DE OBRA No: 3394-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
1/11/2023	183223	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA	10	NACION	CC-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 83.623.321	
		TOTAL				$ 83.623.321	

85
0,8
66

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 83.623.321,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	18- 29 DE DICIEMBRE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	183223 . 22/04/2024	$ 83.623.320	$ 83.623.320		
2	21- 31 DE MARZO 2024	$ 3.419.600	$ 649.724	$ 4.069.324	$ -	$ -	$ -	183223 . 22/04/2024	$ 79.553.996	$ 79.553.996		
3	01- 30 DE ABRIL 2024	$ 14.565.000	$ 2.767.350	$ 17.332.350	$ -	$ -	$ -	183223 . 22/04/2024	$ 62.221.646	$ 62.221.646		
4	01- 31 DE MAYO 2024	$ 18.523.000	$ 3.519.370	$ 22.042.370	$ -	$ -	$ -	183223 . 22/04/2024	$ 40.179.276	$ 40.179.276		
5	01- 30 DE JUNIO 2024	$ 17.815.400	$ 3.384.926	$ 21.200.326	$ -	$ -	$ -	183223 . 22/04/2024	$ 18.978.950	$ 18.978.950		
6	01-31 DE JULIO 2024	$ 11.248.500	$ 2.137.215	$ 13.385.715	$ -	$ -	$ -	183223 . 22/04/2024	$ 5.593.235	$ 5.593.235		
TOTALES		**$ 65.571.500**	**$ 12.458.585**	**$ 78.030.085**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND

Firma
Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 37/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 83.623.321,00

VALOR ACUMULADO: $ 83.623.321,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.362.332,10	30	11	2023	30		2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 16.724.664,20	30	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 25.886.996,30	30	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011698

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 1/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 37/07/2024 (Día / Mes / Año)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 8.362.332,10	30 / 11 / 2023	30 / 6 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 16.724.664,20	30 / 11 / 2023	31 / 12 / 2026
Calidad del servicio	30%	$ 25.886.996,30	30 / 12 / 2023	31 / 12 / 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011698

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 8.362.332,10	28 / 2 / 2024	5 / 10 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 16.724.664,20	28 / 2 / 2024	5 / 4 / 2027
Calidad del servicio	30%	$ 25.886.996,30	5 / 4 / 2024	5 / 4 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011698

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/02/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 8.362.332,10	21 / 3 / 2024	6 / 12 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 16.724.664,20	21 / 3 / 2024	6 / 6 / 2027
Calidad del servicio	30%	$ 25.886.996,30	30 / 4 / 2024	30 / 4 / 2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 37/07/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011698

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 23/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.362.332,10	26	4	2024	19	2	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 16.724.664,20	26	4	2024	19	8	2027
Calidad del servicio	30%	$ 25.886.996,30	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011698

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.362.332,10	8	7	2024	19	2	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 16.724.664,20	8	7	2024	19	8	2027
Calidad del servicio	30%	$ 25.886.996,30	31	7	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100011698

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/07/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	37/07/2024
	(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND

Firma

Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4027-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO VALTOR

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 3394-2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ---x- APROBADO: SI ------- N ------- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ----- NO --------X----- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ----- NO

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ---x- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND

Firma
Nombre: ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ
Director de Obra

Firma
Nombre: Wilder Orley Salazar Cuellar
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

												RETENCION EN LA FUENTE		RETENCION DE ICA		DUCUEMNTOS NECESARIOS				
#	TIPO ID,	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION PAGO	No FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR ANTES DE IMPUESTO	IMPUESTO IVA	OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA	APROBACION COMITÉ OPERATIVO	EGRESO Y No CHEQUE	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	VALOR A PAGAR	RUT	CUENTA DE COBRO O FACTURA	PLANILLA DE APORTES	ESTADO
47	CC	1080934346	ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ	REEMBOLSO CAJA MENOR		$ 400.000,00	$ -	Ok	SI	CE 047	$ 400.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -	**$ 400.000,00**	SI	NO		
48	NIT	8000197268-4	DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS DIAN	PAGO RETENCION MES DE JUNIO		$ 797.000,00		Ok	SI	CE 048	$ 797.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -	**$ 797.000,00**	SI	SI		
49	NIT	900319291-2	ASOPAGOS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS JUNIO JUNTA	30316620	$ 814.200,00		Ok	SI	CE 049	$ 814.200,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -	**$ 814.200,00**	SI	SI		
50	NIT	900319291-2	ASOPAGOS	PAGO PLANILLA S.S.MAESTRO DANIEL SCARPETTA MES JUNIO	30212527	$ 574.600,00	$ -	Ok	SI	CE 050	$ 574.600,00	0%	$ -	0,00%	$ -	**$ 574.600,00**	SI	SI		
51	CC	1031176074	LEIDY CAMILA ANTURI BOLAÑOS	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING RESIDENTE		$ 3.500.000,00		Ok	SI	CE 051	$ 3.500.000,00	6,00%	$ 210.000,00	0,00%	$ -	**$ 3.290.000,00**	SI	SI		
52	CC	1080933646	DILLI LORENA ROJAS	PAGO HONORARIO CONTADOR		$ 1.400.000,00		Ok	SI	CE 052	$ 1.400.000,00	10,00%	$ 140.000,00	0,00%	$ -	**$ 1.260.000,00**	SI	SI		
53	CC	1083884190	NESTOR PINEDA GAMBOA	PAGO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE	M-64	$ 3.420.000,00	$ -	Ok	SI	CE 053	$ 3.420.000,00	1%	$ 34.200,00	0,00%	$ -	**$ 3.385.800,00**	SI	SI		
54	CC	1084897539	DANIEL SCARPETTA GARCIA	PAGO COMO MAESTRO OBRA CON UN AVNCE DE 103 MTS LINEALES INCLUIDO BORDILLOS		$ 4.856.000,00	$ -	Ok	SI	CE 054	$ 4.856.000,00	2%	$ 107.120,00	0,00%	$ -	**$ 4.748.880,00**	SI	NO		
55	NIT	1080935755-7	JENNY PAOLA CUESTA CARDENAS	PAGO MADERA	FE-177	$ 900.000,00	$ -	Ok	SI	CE 055	$ 900.000,00	0%	$ -	0,00%	$ -	**$ 900.000,00**	SI	SI		
56	CC	900193879-9	DEIMAR REALPE	SALARIO OFICIAL 50%		$ 1.001.000,00		Ok	SI	CE 056	$ 1.001.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -	**$ 1.001.000,00**	SI			
57	CC	1084866393	MILTON ANDRES PAME	SALARIO AYUDANTE OBRA 50%		$ 635.667,00		Ok	SI	CE 057	$ 635.667,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -	**$ 635.667,00**	SI			
58	CC	4900941	LUIS SANTANILLA BARRERA	PAGO TRANSPORTE SUBBASE Y MATERIAL MIXTO		$ 290.000,00	$ -	Ok	SI	CE 058	$ 290.000,00	1,00%	$ 2.900,00	0,00%	$ -	**$ 287.100,00**	SI	SI		
59	CC	79740655	JEREMIAS TIMANA HOYOS	PAGO TRANSPORTE SUBBASE Y MATERIAL MIXTO		$ 3.500.000,00	$ -	Ok	SI	CE 059	$ 3.500.000,00	1%	$ 35.000,00	0,00%	$ -	**$ 3.465.000,00**	SI	SI		
60	CC	83212278	YAMITH LEANDRO SALAZAR	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS		$ 720.000,00	$ -	Ok	SI	CE 060	$ 720.000,00	4%	$ 26.400,00	0,00%	$ -	**$ 693.600,00**	SI	SI		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 6/08/2024 (Día / Mes / Año)

Acta No. 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 3394-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: VIA TRAMO K0+000 AL K0+145 CORREDOR VIAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANÁ

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

INTERVENTOR: CONSORCIO VALTOR **CONTRATO No.** 4760 - 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 188.472.114,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 188.472.114,00

PLAZO (MESES): 8

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 7 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
47	ROSA ALEJANDRA YATE CANCHEZ	1080934346	0	16/07/2024	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00
48	DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS DIAN	8000197268-4	0	16/07/2024	$ 797.000,00	$ -	$ 797.000,00
49	ASOPAGOS	900319291-2	30316620	16/07/2024	$ 814.200,00	$ -	$ 814.200,00
50	ASOPAGOS	900319291-2	30212527	16/07/2024	$ 574.600,00	$ -	$ 574.600,00
51	LEIDY CAMILA ANTURI BOLAÑOS	1031176074	0	16/07/2024	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00
52	DILLI LORENA ROJAS	1080933646	0	16/07/2024	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00
53	NESTOR PINEDA GAMBOA	1083884190	M-64	16/07/2024	$ 3.420.000,00	$ -	$ 3.420.000,00
54	DANIEL SCARPETTA GARCIA	1084897539	0	16/07/2024	$ 4.856.000,00	$ -	$ 4.856.000,00
55	JENNY PAOLA CUESTA CARDENAS	1080935755-7	FE-177	16/07/2024	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00
56	DEIMAR REALPE	900193879-9	0	16/07/2024	$ 1.001.000,00	$ -	$ 1.001.000,00
57	MILTON ANDRES PAME	1084866393	0	16/07/2024	$ 635.667,00	$ -	$ 635.667,00
58	LUIS SANTANILLA BARRERA	4900941	0	16/07/2024	$ 290.000,00	$ -	$ 290.000,00
59	JEREMIAS TIMANA HOYOS	79740655	0	16/07/2024	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00
60	YAMITH LEANDRO SALAZAR	83212278	0	16/07/2024	$ 720.000,00	$ -	$ 720.000,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 22.808.467,00	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 154.054.249
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 12.030.887
TOTAL PAGOS	$ 22.808.467,00	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 166.085.136

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Rosa Alejandra Yate S.
Nombre: ROSA ALEJANDRA YATE SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: JOSE LUIS VALDERRAMA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: Leidy Camila Anturi
Nombre: LEIDY CAMILA ANTURI BOLAÑOS
Ingeniero residente del proyecto

Matrícula Profesional No.: 091037-0567108 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3394-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 188.472.114,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 188.472.114,00

PLAZO ACUMULADO: 7,5 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 MARZO DE 2024	2 ABRIL DE 2024	3 MAYO DE 2024	4 JUNIO DE 2024	5 JULIO DE 2024	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	$2.273.256	1,61%	1,61%	% P		1,61%								
	$2.273.256	1,61%	$2.273.256	$ P		$2.273.256								
				$ E		$0	$2.273.256							
				% E		0,00%	1,61%							
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$106.205	0,08%	0,08%	% P		0,08%								
	$106.205	0,08%	$106.205	$ P		$106.205								
				$ E		$0	$106.205							
				% E		0,00%	0,08%							
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	$119.606.868	84,58%	75,56%	% P		0,00%	0,00%	66,09%	9,56%					
	$106.848.999	75,56%	$106.848.999	$ P		$0	$0	$93.372.873	$13.516.126					
				$ E		$0	$0	$93.372.873	$13.516.126					
				% E		0,00%	0,00%	66,09%	9,56%					
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	$19.427.115	13,74%	12,35%	% P		13,74%								
	$17.462.186	12,35%	$17.462.186	$ P		$19.427.115								
				$ E		$0	$17.462.186							
				% E		0,00%	12,35%							
TOTAL OTROS ITEMS (CANAL Y FILTRO)	$14.722.798	10,41%	10,41%	% P		0,00%	5,00%	4,00%	1,41%					
	$14.722.798	10,41%	$14.722.798	$ P		$0	$7.070.672	$5.656.538	$1.995.588					
				$ E		$0	$2.268.269	$8.484.807	$3.409.722					
				% E		0,00%	2,00%	6,00%	2,41%					
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 141.413.444,00**	**100%**	**100,00%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 141.413.444,00**	**100%**	**$ 141.413.444,00**											

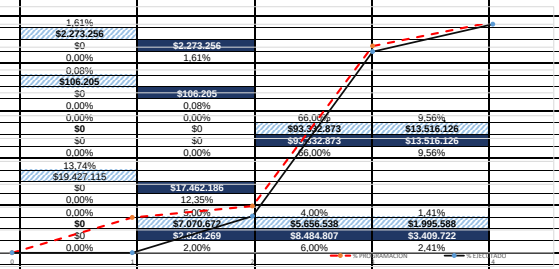

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		**15,42%**	**5,00%**	**70,00%**	**10,97%**					
	VALOR (Miles de Pesos)		**$21.806.576**	**$7.070.672**	**$98.989.411**	**$15.511.714**					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		**15,42%**	**20,42%**	**90,42%**	**101,39%**					
	VALOR (Miles de Pesos)		**$21.806.576**	**$28.877.248**	**$127.866.659**	**$143.378.373**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		**0,00%**	**16,03%**	**72,00%**	**11,97%**					
	VALOR (Miles de Pesos)		**$0**	**$22.669.916**	**$101.817.680**	**$16.925.848**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		**0,00%**	**16,03%**	**88,03%**	**100,00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)		**$0**	**$22.669.916**	**$124.487.596**	**$141.413.444**					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PAGA	$ 4.242.403,00 / $ 4.242.403,00	$ -	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.816.267,00 / $ 41.816.267,00	$ 40.316.267,00	$ 96,41
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 46.058.670,00	$ 40.316.267,00	$ 96,41
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 46.058.670,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 187.472.114,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 187.472.114,00**	**$ 181.729.711,00**	**$ 96,94**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
NO SE JECUTÓ OBRA

Aprueba Firma: Rosa Alejandra Yate S.
Nombre: ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre:JOSE LUIS VALDERRAMA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: DORA CRISTINA TORRES
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma Leidy Camila Antury
Nombre: LEIDY CAMILA ANTURY
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	6/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3394-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

PLAZO INICIAL: 1 MES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 8 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 188.472.114,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 188.472.114,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1 MARZO DE 2024	2 ABRIL DE 2024	3 MAYO DE 2024	4 JUNIO DE 2024	5 JULIO DE 2024	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	$2.273.256	1,61%	1,61%	% P		1,61%	1,61%							
	$2.273.256	1,61%	$2.273.256	$ P		$2.273.256	$2.273.256							
				$ E		$0	$2.273.256							
				% E		0,00%	1,61%							
ESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOS	$106.205	0,08%	$0	% P		0,08%	0,08%							
	$106.205	0,08%	$106.205	$ P		$106.205	$106.205							
				$ E		$0	$106.205							
				% E		0,00%	0,08%							
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	$119.606.868	84,58%	$1	% P		0,00%	0,00%	66,00%	9,56%					
	$106.848.999	75,56%	$106.848.999	$ P		$0	$0	$93.022.873	$13.516.125					
				$ E		$0	$0	$93.022.873	$13.517.126					
				% E		0,00%	0,00%	66,00%	9,56%					
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	$19.427.115	13,74%	$0	% P		13,74%	13,74%							
	$17.462.186	12,35%	$17.462.186	$ P		$19.427.115	$19.427.115							
				$ E		$0	$17.462.186							
				% E		0,00%	12,35%							
TOTAL OTROS ITEMS (CANAL Y FILTRO)	$14.722.798	0,00%	$0	% P		0,00%	0,00%	4,00%	1,41%					
	$14.722.798	10,41%	$14.722.798	$ P		$0	$7.070.672	$5.656.588	$1.995.588					
				$ E		$0	$3.548.269	$8.484.807	$3.409.722					
				% E		0,00%	2,00%	6,00%	2,41%					
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 141.413.444,00	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 141.413.444,00	100%												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	15,42%	5,00%	70,00%	10,97%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$21.806.576	$7.070.672	$98.989.411	$15.511.714						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	15,42%	20,42%	90,42%	101,39%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$21.806.576	$28.877.248	$127.866.659	$143.378.373						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	16,03%	72,00%	11,97%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$22.669.916	$101.817.680	$16.925.848						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	16,03%	88,03%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$22.669.916	$124.487.596	$141.413.444						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PAGA	$ 4.242.403,00 / $ 4.242.403,00	$ -	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.816.267,00 / $ 41.816.267,00	$ 40.316.267,00	$ 96,41
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
N/A	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 46.058.670,00	$ 40.316.267,00	$ 96,41
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 46.058.670,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 187.472.114,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 187.472.114,00**	**$ 181.729.711,00**	**96,94**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
DURANTE EL MES SE PRESENTARON FUERTES Y CONSTANTES LLUVIAS

Aprueba Firma: Rosa Alejandra Yate S.
Nombre: ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE LUIS VALDERRAMA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ANTONIO

CONTRATO No. 3394-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4760-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VALTOR

MAQUINARIA Y EQUIPO				jul-24																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VOLQUETA	KODIAK	6M3	SAN ANTONIO	A						A						A		A			A	A		A										
MEZCLADORA		1 BULTO	SAN ANTONIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO				2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/08/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: LEIDY CAMILA ANTURI BOLAÑOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0567108 CND

Firma

Nombre:GLORIA CONSUELO FIGUEROA PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-389821

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	6/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 3394-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ANTONIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4760-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	DILLI LORENA ROJAS GUAYAN*	1080933646	CONTADORA	$ 1.400.000		X		X	X		X	X	X		X		X	X		X	X	X		X		X	X		X	X		X	X		JAC SAN ANTONIO			I	SANITAS EPS			PORVENIR			N/A	N/A	N/A	
2	LEIDY CAMILA ANTURI BOLAÑOS*	1031176074	RESIDENTE OBRA	$ 3.500.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC SAN ANTONIO			V	NUEVA EPS	29967822		PORVENIR	29967822		N/A	N/A	N/A	
3	MILTON ANDRÉS PAME	1084866393	AYUDANTE	MÍNIMO															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC SAN ANTONIO			V							N/A	N/A	N/A	
4	DEIMAR REALPE	12181239	AYUDANTE	MÍNIMO															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC SAN ANTONIO			V							N/A	N/A	N/A	
6	DANIEL SCARPETTA	1084897539	OFICIAL-MAESTRO	SALARIO-CONTRATO												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC SAN ANTONIO		$ 173.300	V				$ 173.300		$ 173.300	N/A	N/A	N/A	
7																																																	
8																																																	
9																																																	
10																																																	
N																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

CONTADORA Y RESIDENTE DE OBRA APROBADAS HOJAS DE VIDA

El contratista adjunta la certificación de fecha _____, a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 3394-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ANTONIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
19/07/2023	138023	Caminos comunitarios de la paz total	13	NACIÓN	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 185.092.653	
			13	NACIÓN	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 2.379.461	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 187.472.114,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/08/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Rosa Alejandra Yate S.
Nombre: ROSA ALEJÁNDRA YATE SANCHEZ
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 3394-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ANTONIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4760-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	20	18	24	17	22	16	22	22	19	20	18	23	18	24	24	22	12	17	19	20	22	18	24	24	24	24	19	24	24	24		624
Lluvias moderadas	2	6	0	7	2	8	2	2	5	4	6	1	6	0	0	2	12	7	5	2	2	6	0	0	0	0	5	0	0	0		92
Lluvias intensas	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5
Total horas																																

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LEIDY CAMILA ANTURI BOLAÑOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0567108 CND

Firma
Nombre: GLORIA CONSUELO FIGUEROA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-389821CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-11 VERSIÓN: 1 PAGINA:

FECHA: 6/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 3394-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN ANTONIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4760-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	2/06/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	ART 630 13	PR0+40	1		108,70%	SI	NINGUNA
2	12/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	ART 630 13	PR0+80	1		96,80%	SI	NINGUNA
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma Rosa Alejandra Yate S.
Nombre: ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

	FECHA	6/08/2024 (Día / Mes / Año)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/08/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 3394-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 4/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 188.472.114,00

VALOR ACUMULADO: $ 188.472.114,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4760-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VALTOR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.694.423,00	18	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.423.606,00	18	9	2023	18	9	2028
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.541.635,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002980

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	123%	$ 232.000.000,00	18	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1007857 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/10/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%		18	9	2024	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%		18	9	2023	1	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%		30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002980

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	123%	$ 232.000.000,00	2	12	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1007857 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 2/02/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.694.423,00	1	3	2025	15	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.423.606,00	1	5	2027	16	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.541.635,00	15	7	2024	15	7	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002980

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/04/024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	30	4	2024	15	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1007857 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/04/024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	15	7	2024	15	8	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1007857 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.694.423,00	16	5	2025	1	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.423.606,00	16	5	2027	1	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.541.635,00	31	7	2024	31	7	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/08/2024
(Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002980

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre : DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-160322 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 3394-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA

FECHA DE INICIO: 4/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3394-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VALTOR

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ------ APROBADO: SI ------- N ------- VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO --------X---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO --------X----

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ----X- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3394 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 15 del 28/06/2024 al 4/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 6 UND
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 0,6 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 142 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO TIMANA		
R. LEGAL:	ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ		
CONVENIO No.	3394 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.472.114,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 188.472.114,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
PRÓRROGA No. 2:	26/04/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	15/07/2024		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSOROCIO VALTOR		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL		
CONTRATO No.	4760 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 83.623.321,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 83.623.321,00
PRÓRROGA No. 1:	21/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA No. 2:	26/04/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.472.114			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.472.114			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 83.623.321			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 83.623.321			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.413.444,00**	**75,03%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 124.047.755,00	87,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 124.924.555,00	88,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 876.800,00	0,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.000.000,00	31,82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 49.000.000,00	34,65%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 4.000.000,00	2,83%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.242.403,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 4.242.403,00	100,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ 95.000,00	2,24%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.816.267,00**	**22,19%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 22.883.316,00	54,72%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 21.533.316,00	51,50%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 10.584,61	
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 187.472.114,00**	**99,47%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ 24.508.251,00	13,07%
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 141.666.748,00	75,57%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.623.321,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.288.329,05	87,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.364.001,88	4,02%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.364.001,88	4,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 83% — Avance o Atraso Físico % 1%
Meta Física Ejecutada % 82%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	IND	6
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,6
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	142
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1
*	CANAL REVESTIDO	UND	70

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec	6				100,0%
Prog	0,6				100,0%
Ejec	0,6				100,0%
Prog	103				72,5%
Ejec	98				69,0%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	70				100,0%
Ejec	70				100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETA		1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
RETROEXCAVADORA	1	1
COMPACTADOR MANUAL - RANA		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via San Antonio - Cosanza

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ORITOGUAZ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: LICENCIA AMBIENTAL EN TRAMITE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: RADICADO ANTE EL INVIAS.

OBSERVACIONES: SE RADICO COMPONENTE AMBIENTAL ETAPA INICIAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La San Antonio

OBSERVACIONES:
SE RADICO COMPONENTE SOCIAL INICIAL, SE ESPERA LA NO OBJECIÓN PARA INICIAR CON LA ACTIVIDAD SOCIAL


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se construyo placa huella en 85 m
en analisis finaciero se proyecto construcción de 18m mas de placa huella para la via que conecta a la vereda San Isidro.
Se construyo ciclopeo para los 18m.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se proyecta terminar la totalidad de la obra en la via hacia San Isidro.
Iniciar con la via hacia la vereda de Cosanza.
Balance financiero para no pasar el monto del desembolso.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ciclopeo



armado de acero



losas y cunetas fundidas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*aprobación de desembolso del 50% finales de estudios y diseños.
*Acompañar y garantizar que los materiales que llegan a obra se usen de acuerdo a sus especificaciones técnicas
* Apoyo a la programcion de obra para optimizar los tiempos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL

Matrícula Profesional No.: 25202-160322 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3394 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 16 del 5/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 6 UND
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 0,6 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 142 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO TIMANA		
R. LEGAL:	ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ		
CONVENIO No.	3394 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.472.114,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 188.472.114,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
PRÓRROGA No. 2:	26/04/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	15/07/2024		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSOROCIO VALTOR		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL		
CONTRATO No.	4760 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 83.623.321,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 83.623.321,00
PRÓRROGA No. 1:	21/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA No. 2:	26/04/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.472.114			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.472.114			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 83.623.321			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 83.623.321			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.413.444,00**	**75,03%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 156.647.755,00	110,77%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 154.924.555,00	109,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.723.200,00)	-1,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32.600.000,00	23,05%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.000.000,00	21,21%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (2.600.000,00)	-1,84%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.242.403,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 4.242.403,00	100,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ 95.000,00	2,24%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.816.267,00**	**22,19%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 22.883.316,00	54,72%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 21.533.316,00	51,50%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 10.584,61	
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 187.472.114,00**	**99,47%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 141.666.748,00	75,57%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.623.321,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.070.826,72	90,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.782.497,67	3,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.782.497,67	3,33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 83%
Meta Física Ejecutada % 82%
Avance o Atraso Físico % 1%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	IND	6
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,6
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	142
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1
*	CANAL REVESTIDO	UND	70

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec	6				100,0%
Prog	0,6				100,0%
Ejec	0,6				100,0%
Prog	163				114,8%
Ejec	130				91,5%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	70				100,0%
Ejec	70				100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETA		1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
RETROEXCAVADORA	1	1
COMPACTADOR MANUAL - RANA		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via San Antonio - Cosanza

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ORITOGUAZ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: LICENCIA AMBIENTAL EN TRAMITE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: RADICADO ANTE EL INVIAS.

OBSERVACIONES: SE RADICO COMPONENTE AMBIENTAL ETAPA INICIAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La San Antonio

OBSERVACIONES:
SE RADICO COMPONENTE SOCIAL INICIAL, SE ESPERA LA NO OBJECIÓN PARA INICIAR CON LA ACTIVIDAD SOCIAL


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se construyo placa huella en 103 m via que conecta a la vereda San Isidro.
Se hallo una filtracion de agua en el canal y se debio proyectar un filtro frances en 4m, para que a futuro no registre daños la placa
Se construyo ciclopeo para 70 m via que conecta San Atonio con la Vereda Cosanza

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

finalizar 70m de placa huella.
Construcción de 4m de filtro.
Balance financiero para no pasar el monto del desembolso.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ciclopeo



armado de acero



losas y cunetas fundidas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*aprobación de desembolso del 50% finales de estudios y diseños.
*Acompañar y garantizar que los materiales que llegan a obra se usen de acuerdo a sus especificaciones técnicas
* Apoyo a la programcion de obra para optimizar los tiempos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL

Matrícula Profesional No.: 25202-160322 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3394 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 17 del 12/07/2024 al 18/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 6 UND
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 0,6 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 142 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO TIMANA		
R. LEGAL:	ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ		
CONVENIO No.	3394 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.472.114,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 188.472.114,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
PRÓRROGA No. 2:	26/04/2024		$ -
PRÓRROGA No. 3:	5/07/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31/07/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSOROCIO VALTOR		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL		
CONTRATO No.	4760 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 83.623.321,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 83.623.321,00
PRÓRROGA No. 1:	21/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA No. 2:	26/04/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No.3:	5/07/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.472.114			
	EJECUTADO DE LA VIGÉNCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.472.114			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 83.623.321			
	EJECUTADO DE LA VIGÉNCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 83.623.321			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.413.444,00**	**75,03%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 169.247.755,00	119,68%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 166.924.555,00	118,04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.323.200,00)	-1,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.600.000,00	8,91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.000.000,00	8,49%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (600.000,00)	-0,42%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.242.403,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 4.242.403,00	100,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ 95.000,00	2,24%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.816.267,00**	**22,19%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 34.760.196,00	83,13%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 32.533.316,00	77,80%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 11.536,53	
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 187.472.114,00**	**99,47%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 141.666.748,00	75,57%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.623.321,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.853.324,38	94,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.782.497,67	3,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.782.497,67	3,33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90% — Avance o Atraso Físico % 1%
Meta Física Ejecutada % 89%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	IND	6
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,6
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	142
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1
	FILTRO FRANCES	UND	6,5
*	CANAL REVESTIDO	UND	64

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec	6				100,0%
Prog	0,6				100,0%
Ejec	0,6				100,0%
Prog	176,1				124,0%
Ejec	145				102,1%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	6,5				100,0%
Ejec	6,5				100,0%
Prog	64				100,0%
Ejec	64				100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETA		1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
RETROEXCAVADORA	1	1
COMPACTADOR MANUAL - RANA		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via San Antonio - Cosanza

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ORITOGUAZ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	BUENOS AIRES	PERMISO MINERO:	SI X	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: LICENCIA AMBIENTAL EN TRAMITE YUMA EN TRAMITE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: RADICADO ANTE EL INVIAS

OBSERVACIONES: SE RADICO COMPONENTE AMBIENTAL ETAPA INICIAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La San Antonio

OBSERVACIONES:
SE RADICO COMPONENTE SOCIAL INICIAL, SE ESPERA LA NO OBJECIÓN PARA INICIAR CON LA ACTIVIDAD SOCIAL


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continuo con la construcción de 69,78 m de placa huella hacia la via de Cosanza, de lo cual ya se ejecuto el concreto ciclopeo y parte de las losas.
Se construyo un filtro frances de 6,5m para manejo de aguas subterraneas, para evitar infiltraciones a la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Esta pendiente los sobreanchos, el dentellon y los bordillos. Finalizacion de obras
pendiente la NO OBJECION para aprobación de compra de materiales de obra social con participación comunitaria.
Balance de cierre de obras.
Verificar y realizar balance de los aportes economicos de la comunidad para mayor alcance fisico

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



18m de placa huella con aporte economico de la comunidad



filtro frances



losas y cciclopeos fundidos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*aprobación de desembolso del 50% finales de estudios y diseños.
*Acompañar y garantizar que los materiales que llegan a obra se usen de acuerdo a sus especificaciones técnicas
* Apoyo a la programcion de obra para optimizar los tiempos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL

Matrícula Profesional No.: 25202-160322 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3394 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 18 del 19/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 6 UND
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 0,6 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 142 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO TIMANA		
R. LEGAL:	ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ		
CONVENIO No.	3394 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.472.114,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 188.472.114,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
PRÓRROGA No. 2:	26/04/2024		$ -
PRÓRROGA No. 3:	5/07/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31/07/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSOROCIO VALTOR		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL		
CONTRATO No.	4760 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 83.623.321,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 83.623.321,00
PRÓRROGA No. 1:	21/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA No. 2:	26/04/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No.3:	5/07/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.472.114			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.472.114			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 83.623.321			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 83.623.321			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.413.444,00**	**75,03%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 213.092.945,00	150,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 213.092.945,00	150,69%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 43.845.190,00	31,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 46.168.390,00	32,65%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 2.323.200,00	1,64%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.242.403,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 4.242.403,00	100,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ 95.000,00	2,24%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.816.267,00**	**22,19%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41.816.267,00	100,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 40.316.267,00	96,41%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 11.536,53	
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 187.472.114,00**	**99,47%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 141.666.748,00	75,57%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.623.321,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 81.635.822,05	97,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.782.497,67	3,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.782.497,67	3,33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 113%
Meta Física Ejecutada % 113%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	IND	6
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,6
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	142
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1
	FILTRO FRANCES	UND	6,5
*	CANAL REVESTIDO	UND	64

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec	6				100,0%
Prog	0,6				100,0%
Ejec	0,6				100,0%
Prog	176,1				124,0%
Ejec	176,1				124,0%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	6,5				100,0%
Ejec	6,5				100,0%
Prog	64				100,0%
Ejec	64				100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETA		1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
RETROEXCAVADORA	1	1
COMPACTADOR MANUAL - RANA		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía San Antonio - Cosanza

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ORITOGUAZ	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN: BUENOS AIRES	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: LICENCIA AMBIENTAL EN TRAMITE YUMA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: RADICADO ANTE EL INVIAS

OBSERVACIONES: SE RADICO COMPONENTE AMBIENTAL ETAPA INICIAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La San Antonio


OBSERVACIONES:
SE RADICO COMPONENTE SOCIAL INICIAL, SE ESPERA LA NO OBJECIÓN PARA INICIAR CON LA ACTIVIDAD SOCIAL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se finalizo al 100% las obras.
El aporte economico de la comunidad permitio que el alcance fisico del convenio fuera del 138%
Se realizo comité opreativo para aprobación de pagos definitivos y aprobación de compra de materiales para el componente social.

Ejecución de la obra social para la escuela.
Radicar documentación para transferencia economicas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sobreancho y dentellon



sobreancho curva



FIN DE LAS OBRAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*aprobación de desembolso del 50% finales de estudios y diseños.
*Acompañar y garantizar que los materiales que llegan a obra se usen de acuerdo a sus especificaciones técnicas
* Apoyo a la programcion de obra para optimizar los tiempos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL

Matrícula Profesional No.: 25202-160322 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3394 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 19 del 26/07/2024 al 1/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 6 UND
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 0,6 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 142 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO TIMANA		
R. LEGAL:	ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ		
CONVENIO No.	3394 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.472.114,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 188.472.114,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
PRÓRROGA No. 2:	26/04/2024		$ -
PRÓRROGA No. 3:	5/07/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31/07/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSOROCIO VALTOR		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL		
CONTRATO No.	4760 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 83.623.321,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 83.623.321,00
PRÓRROGA No. 1:	21/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA No. 2:	26/04/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No.3:	5/07/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.472.114			
	EJECUTADO DE LA VIGÉNCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.472.114			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 83.623.321			
	EJECUTADO DE LA VIGÉNCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 83.623.321			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.413.444,00**	**75,03%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 213.092.945,00	150,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 213.092.945,00	150,69%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.242.403,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 4.242.403,00	100,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ 95.000,00	2,24%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.816.267,00**	**22,19%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41.816.267,00	100,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 40.316.267,00	96,41%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 11.536,53	
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 187.472.114,00**	**99,47%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ 32.605.682,00	17,39%
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 174.272.430,00	92,96%

Observaciones: La comunidad realizo aportes economicos para la compra de materiales de ferreteria y agregados.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.623.321,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83.623.320,38	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.987.498,95	2,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.987.498,95	2,38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 113%
Meta Física Ejecutada % 113%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	IND	6
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,6
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	142
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1
	FILTRO FRANCES	UND	6,5
*	CANAL REVESTIDO	UND	64

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec	6				100,0%
Prog	0,6				100,0%
Ejec	0,6				100,0%
Prog	176,1				124,0%
Ejec	176,1				124,0%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog	6,5				100,0%
Ejec	6,5				100,0%
Prog	64				100,0%
Ejec	64				100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETA		1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
RETROEXCAVADORA	1	1
COMPACTADOR MANUAL - RANA		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via San Antonio - Cosanza

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ORITOGUAZ	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN: BUENOS AIRES	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: LICENCIA AMBIENTAL EN TRAMITE YUMA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: RADICADO ANTE EL INVIAS

OBSERVACIONES: SE RADICO COMPONENTE AMBIENTAL ETAPA INICIAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La San Antonio


OBSERVACIONES:
SE RADICO COMPONENTE SOCIAL INICIAL, SE ESPERA LA NO OBJECIÓN PARA INICIAR CON LA ACTIVIDAD SOCIAL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se recopilo la documentación para trasferencias finales a proveedores

<El maestro no estuvo de acuerdo con el corte de obra que realizo la JAC y se programa recibo de obra para 02 de agosto de 2024 y verificar cantidades.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



localización obra social



solicitud comunidad -obra social



aprobación de compra materiales -obra social

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*aprobación de desembolso del 50% finales de estudios y diseños.
*Acompañar y garantizar que los materiales que llegan a obra se usen de acuerdo a sus especificaciones técnicas
* Apoyo a la programcion de obra para optimizar los tiempos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL

Matrícula Profesional No.: 25202-160322 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	
ACTIVIDADES DE 01 ABRIL A 30 DE ABRIL 2024		**FECHA ELABORACIÓN**	# # 6 2024	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANA	**CONVENIO N°**	3394-2023	**MUNICIPIO**	TIMANA
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VALTOR	**CONTRATO N°**	4027-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA SAN ANTONIO - TIMANÁ				

			
Descripción: EXCAVACIÓN FILTRO FRANCES	Descripción:FILTRO FRANCES	Descripción: FORMALETA	Descripción: ACERO SOBREANCHO
			
Descripción: FUNDICIÓN SOBREANCHO	Descripción: INGRESO AGUA ALCANTARILLA	Descripción: ANTES VIA COSANZA	Descripción: DESPUES VIA COSANZA
			
Descripción: ANTES VIA COSANZA	Descripción: DESPUES VIA COSANZA	Descripción: ANTES VÍA SAN ISIDRO	Descripción: DESPUES VIA SAN ISIDRO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INFORME MENSUAL No. 4

CONVENIO 3394/2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES DE JULIO DE 2024



DATOS DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO: 3394 DE 2023

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO

TIMANA NIT 813.005.634-1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO TIMANA

REPRESENTANTE LEGAL: ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ

VALOR INICIAL: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS $188.472.114

APORTES: El INSTITUTO realiza un aporte en dinero correspondiente CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS **($187.472.114),** MONEDA CORRIENTE.

El OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS **($1.000.000,00),** MONEDA CORRIENTE.

VALOR ADICIONAL: $ 0

FECHA DE INICIO: 04/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

INTERVENTORÍA

INTERVENTOR: CONSORCIO VALTOR

REPRESENTANTE LEGAL: DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

CONTRATO: 4760 DE 2023

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Timaná ubicado en el departamento del Huila, en su Esquema de Ordenamiento Territorial EOT el cual establece el promover soluciones efectivas y sostenibles en materia de acceso en cuanto a infraestructura vial terciaria para la correcta operación del transporte y el cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial del municipio al igual que mejorar la calidad de vida de la comunidad teniendo como base el mejoramiento de las vías en la zona rural, al servicio de la comunidad.

El municipio de Timaná cuenta con una malla vial rural de 258,47 Km, de los cuales solo el 48% se encuentra a nivel aceptable para el desplazamiento, mientras que el 52% en mal estado de las vías generando dificultad para el desplazamiento de la población, la extracción de sus cosechas y adquisición de bienes y servicios que se encuentran en los centros poblados y a los otros lugares rurales para el acceso a los servicios de salud, educación el desarrollo de proyectos productivos.

Actualmente el programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, tiene como objetivo principal promover soluciones efectivas y sostenibles en materia de acceso en cuanto a infraestructura vial mediante la construcción de placa huellas en el municipio de Timaná ubicado en el departamento del Huila, Según Convenio Solidario Invias No. 3394 de 2023 y el cual será desarrollado por la JAC de la VEREDA SAN ANTONIO por intermedio de la representante legal ROSA ALEJANDRA YATE SANCHEZ.

ALCANCE DEL CONVENIO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la **VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA** de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Timaná, departamento del Huila, en la vereda San Antonio, teniendo como punto de referencia inicial salida del caserío en la vía San Antonio – Cosanza con coordenadas decimales NORTE 1.962576 OESTE 75.887187 y punto de referencia final las coordenadas decimales NORTE 1.964089 OESTE 75.888048, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de mejoramiento vial establecido en el Convenio N°3394 de 2023, se encuentra Ubicado dentro del Área rural del Municipio de Timaná – en el departamento de Huila, en el corredor vial que conduce del caserío de la vereda San Antonio a la vereda Cosanza municipio de Timaná, tal como se observa en las imágenes siguientes:





Google Earth


DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA


Las actividades de obras a desarrollar para el presente proceso establecidos de baja complejidad técnica, ya que consisten en la ejecución de un mejoramiento de la vía existente mediante la construcción de Placa huella sobre la vía que comunica desde la vereda San Antonio– hasta la vereda Cosanza denominada terciaria o una vía rural del municipio de Timaná, esto debido a que estas vías presentan socavaciones y deterioro por causa de las lluvias, tránsito y mala estructura del sector.

Las actividades a ejecutar en el presente proceso son: obras menores de drenaje, Desmonte y limpieza de zonas no boscosas, Excavaciones varias, Subbase Granular Clase C, Concreto Clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI), Concreto Ciclópeo (Concreto clase D f' c=21 MPa), Acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI), excavaciones en roca en seco, relleno para estructuras con suelo, Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior, Suministro e instalación de saco suelo.

Actividad	**Descripción**
Limpieza obras menores de drenaje	Este trabajo consiste en realizar la limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Este trabajo consiste en el conjunto de actividades de cortar, recoger y remover zonas no boscosas.
Excavaciones varias sin clasificar	Este trabajo consiste en el conjunto de actividades de excavar, remover, cargar, transportar y colocar en los sitios de disposición o desecho.
Subbase Granular Clase C	Suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de subbase.
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	Consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado y acabado de los concretos para la circulación vehicular, etc
Concreto Ciclópeo	Consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado y acabado de los concretos para la circulación vehicular, empleado en la construcción de placa huella y alcantarilla.
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Se coloca para absorber y resistir esfuerzos provocados por cargas y cambios volumétricos por temperatura y que queda ahogado dentro de la masa del concreto.
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	Suministro, transporte y colocación de la tubería de concreto reforzado para alcantarilla.

PLANOS PLACA HUELLA A EJECUTAR

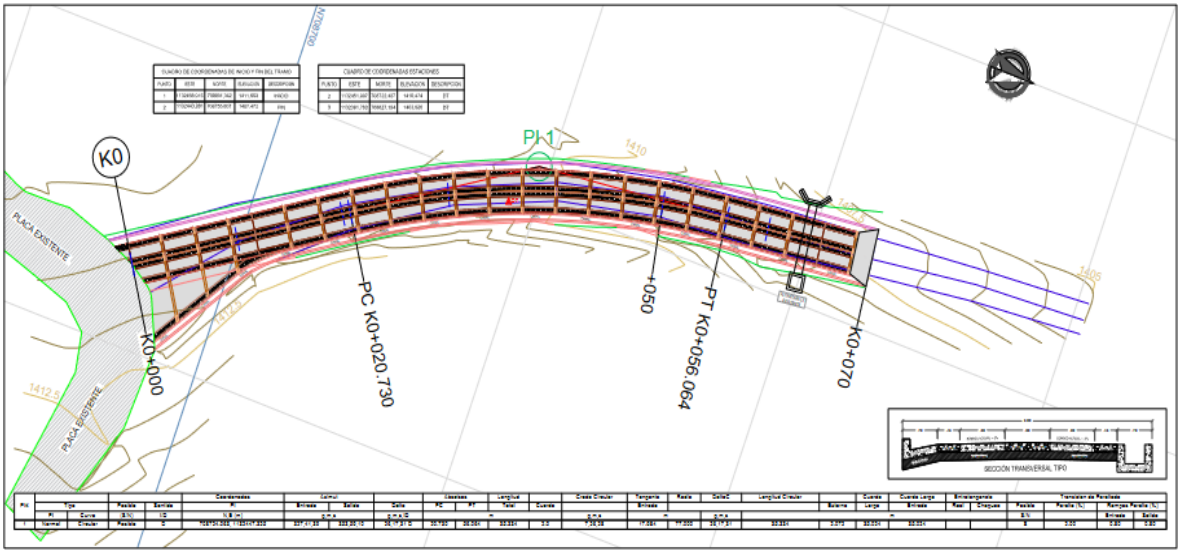

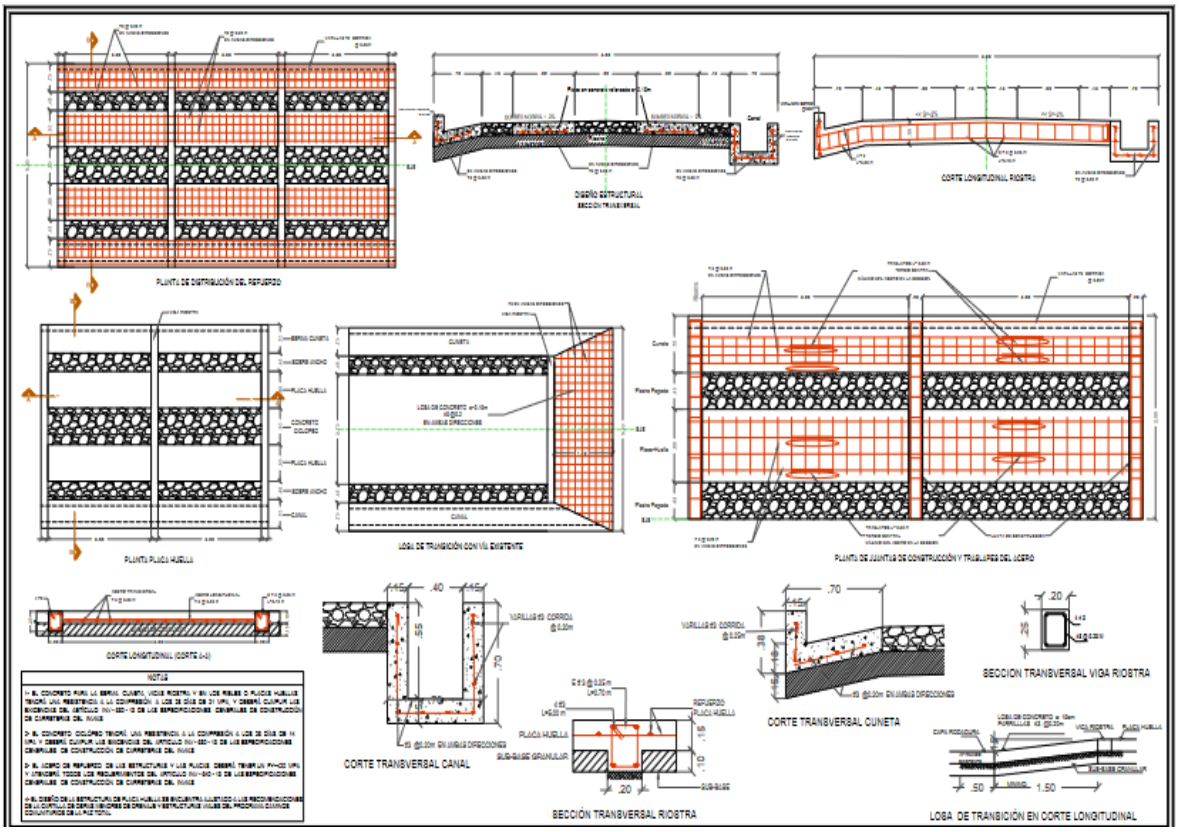

CONSOLIDADO ACTIVIADES REALIZADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024

Durante el primer mes de ejecución del proyecto a desarrollar, el cual se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Timaná, departamento del Huila, en la vereda San Antonio, teniendo como punto de referencia inicial salida del caserío en la vía San Antonio – Cosanza con coordenadas decimales NORTE 1.962576 OESTE 75.887.187 y punto de referencia final las coordenadas decimales NORTE 1.964089 OESTE 75.888048, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS., el domicilio contractual en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, del convenio se llevaron a cabo actividades tales como se muestran a continuación:

- Asistencia en instalaciones del Instituto Nacional de vías INVIAS en Neiva, temas a tartar: avance de proyectos, observaciones y/o inconvenientes presentados durante la ejecución del convenio, lo anterior, con el finde mejorar la ejecución y cumplimiento de los programas.
- Se solicitaron las respectivas cotizaciones para la realización de los estudios y diseños necesarios para llevar a cabo la construcción de la placa huella en la vereda San Antonio del municipio de Timaná.
- Verificación del cumplimiento con aporte de herramienta menor por el valor de 1 millón de pesos por parte de la Junta de Acción Comunal, para remitir posteriormente oficio a la interventoría con dicha información del aporte.
- Se solicitaron cotizaciones de los elementos de protección personal.
- Se solicitaron las cotizaciones de vallas según diseño de interventoría.
- Se solicitaron cotizaciones de la maquinaria amarilla y equipos.
- Se solicitaron cotizaciones para el suministro de materiales como acero, cemento, agregados.
- Se solicitaron cotizaciones para el transporte de los agregados.
- Se solicitaron cotizaciones de la mano de obra de maestros de obra.
- Se solicitaron hojas de vida para oficial y ayudantes.
- En comité técnicos se revisaron cada una de las cotizaciones, se compararon entre sí para luego definir con los representantes de la Junta de acción comunal los proveedores.
- En compañía de la interventoría se llevó a cabo visita técnica al lugar de ejecución del convenio, verificando el estado de la vía.
- Se realizó socialización con los participantes de la Junta de acción comunal para definir los tramos a intervenir y proceder con los estudios y diseños de esta placa huella.
- En consideración de los tramos definidos por la comunidad para intervenir, se procedió a realizar acompañamiento y direccionamiento a la comisión topográfica para realizar el levantamiento topográfico de los tramos a intervenir.

- Se realizó acompañamiento a la comisión enviada a realizar los apiques en la zona, apiques necesarios para tomar las muestras para el estudio de suelos.
- Asistencia de manera virtual a comités técnicos de apoyo para el diligenciamiento de formatos requeridos por el manual de interventoría del INVIAS.
- Se solicitan las respectivas facturas electrónicas para las cantidades de materiales solicitadas a cada proveedor escogido anteriormente en comité.
- Se avanza con el diligenciamiento de los formatos requeridos en el componente ambiental y social del proyecto, como planes de inversión y formatos de actualización y radicación de proyectos.
- Se realiza limpieza de alcantarillas con apoyo por parte de la comunidad de la vereda San Antonio.
- Se reciben estudios y diseños de la placa huella entregados por Fabian Andrés Burbano López.
- Se realiza proyección de cantidades para la construcción de 145 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024

Durante el segundo mes de ejecución del convenio se llevaron a cabo actividades tales como se muestran a continuación:

- Se solicitaron facturas electrónicas o cuentas de cobro para las cantidades de materiales, herramientas y/o maquinaria proyectados a usar durante la construcción de la placa huella.
- Asistencia a reunión virtual con los residentes de obra para verificar el estado o avance de la ejecución del proyecto en cada una de las veredas.
- Se definió la cantidad de acero que se pediría figurado al proveedor de este, dando a conocer las medidas de los ganchos y flejes.
- Se realizaron cotizaciones para la compra de un buzón de sugerencias en acrílico, buzón requerido dentro del componente social del proyecto.
- Compra del buzón en Pitalito, proveedor: IMPACTO CREATIVO.
- Se realiza la ubicación e instalación del buzón de sugerencias en acrílico transparente.
- Se coordinó la entrega y recibo de materiales de ferretería, los cuales fueron recibidos en el transcurso de algunos días.
- También se recibieron los tubos en concreto reforzado de 36” en el lugar de ejecución del proyecto para la construcción de la alcantarilla.
- Transporte y suministro del material de sub-base para la placa huella.
- Se coordinó el transporte de material mixto de ¾” para la construcción de la alcantarilla y del canal.

- Localización y replanteo de la placa huella.
- Excavación mecánica y manual para la construcción de la alcantarilla y del canal.
- Movimiento de material de excavación de la alcantarilla existente.
- Instalación de los tubos de 36” en concreto reforzado para la alcantarilla sobre solado de limpieza y nivelación.
- Instalación de material de relleno sobre los tubos de 36”, se realizó compactación del suelo.
- Excavación manual y mecánica para desplazamiento de la ubicación de las mangueras de 2” y ¾” del gas, ya que estos eran obstáculo para la construcción de la alberca de la alcantarilla.
- Debido a las condiciones climáticas y el terreno donde se construye la alberca de la alcantarilla se debió realizar nuevamente excavación mecánica y manual del material proveniente de obra aledaña a esta que fue movido por las fuertes y constantes lluvias.
- Excavación mecánica y manual para las aletas de la alcantarilla.
- Figurado y amarre de acero para alberca y descole de alcantarilla.
- Instalación de formaleta para alberca y descole de la alcantarilla.
- Instalación de concreto para alberca y descole de alcantarilla.
- Toma de cilindro y prueba de asentamiento del concreto usado en la construcción de la alcantarilla.
- Figurado y amarre de acero para la construcción de canal en el margen derecho de la vía que de San Antonio conduce a Cosanza.
- Figurado y amarre de acero para las vigas riostras a usar en la placa huella.
- Instalación de concreto para la construcción del canal en el margen derecho de la vía que de San Antonio conduce a Cosanza.
- Instalación de acero para la construcción del canal en el margen derecho de la vía que de San Antonio conduce a Cosanza.
- Formaletas en madera para la construcción de la placa huella.
- Diligenciamiento de formatos requeridos del aspecto ambiental y social del proyecto.
- Cajeo de la vía que de San Antonio conduce a San Isidro con retroexcavadora, se realiza el respectivo retiro de material en volqueta.
- Reposición de tubería de alcantarillado, red domiciliaria de 4” en tubo corrugado, el cual fue dañado con las actividades de excavación mecánica para cajeo de vía.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO

Durante el mes de junio de 2024, se presentaron inconvenientes con el personal de obra y debido a las condiciones climáticas (afectaciones por las lluvias presentadas) la obra se retrasó un poco, sin embargo, se realizaron actividades tales como:

- Excavaciones mecánicas para cajeo de via.
- Corte, amarre e instalación de acero para el canal a construir.
- Instalación de formaleta y concreto para la continuación de la construcción del canal, sin completarlo al 100%.
- Arreglo de tubería del acueducto veredal por daños causados por las excavaciones mecánicas y manuales.
- Movimientos de material de excavación hasta botadero.
- Amarrado de acero para vigas riostras.
- Con la motoniveladora, retroexcavadora y volquetas en campo se realizó el extendido de material de subbase acopiado cerca a la vía.
- Se realizó la compactación de la subbase con vibro compactador de los dos tramos.
- En los lugares cercanos a los pozos donde el vibro compactador no pudo realizar la compactación del suelo, se realizó la compactación de este con vibro compactador tipo rana.
- Se realizó cambio de material en zonas donde no se compactó de manera correcta la vía.
- Con el terreno listo, se realizó la instalación de formaletas para el concreto ciclópeo de la placa huella.
- Excavación manual para la instalación de las vigas riostras.
- Fundición e instalación de concreto ciclópeo.
- Corte y amarre de acero para las losas de concreto.
- Instalación de acero para bordillos de la placa huella.
- Instalación de concreto para las losas de concreto y vigas riostras.
- Construcción de sumidero para alcantarilla.
- Toma de cilindro y prueba de asentamiento del concreto usado en la construcción de la alcantarilla.
- Ensayo para la toma de densidades del suelo.

Las actividades realizadas después la compactación de la subbase, se realizaron para 85 metros de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO

En el transcurso del último periodo de ejecución de la obra del convenio solidario No. 3394 de 2023 INVIAS se continuó con el tramo inicial, así como la construcción del tramo hacia la vía Cosanza, el cual consta de 65 metros lineales de placa huella y los sobreanchos a lo largo de la vía. Para lo cual se realizaron actividades como:

- Corte de acero para losas de concreto de los últimos 18 metros de placa huella.
- Amarre de acero para losas, cunetas y vigas de los 18 metros de placa huella finales del primer tramo.
- Fundición de losas de concreto, dentellón, cuentas, vigas, rampa de acceso y sobreancho de los metros restantes del primer tramo.
- Corte de aceros para la instalación de formaleta de bordillos del primer tramo que conduce hacia San Isidro.
- Instalación de formaleta para bordillos del primer tramo.
- Fundición de bordillos en ambos costados de la vía del primer tramo ejecutado.

Seguidamente, se realizaron actividades en el otro tramo que conduce hacia la vereda Cosanza, tales como:

- Instalación de formaleta para concreto ciclópeo de placa huella.
- Fundición de concreto ciclópeo a lo largo de la placa huella.
- Retiro de formaleta de concreto ciclópeo.
- Corte de acero para las losas de concreto (transversales).
- Excavaciones manuales para la instalación de vigas riostras.
- Instalación y amarre de vigas riostras, acero longitudinal y transversal para losas de concreto, sobreanchos y rampa de acceso.
- Instalación y amarre de acero para bordillos.
- Instalación de formaleta para bordillos en ambos costados de la vía.
- Fundición de vigas riostras, losas de concreto, cunetas, sobreanchos, bordillos y rampa de acceso.
- Toma de dos muestras de concreto cilíndricas para llevar a laboratorio, una de losas de concreto y otra de los bordillos.
- Excavaciones para filtro francés.
- Instalación de filtro francés, por una longitud de 6,5 m.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



Excavación para filtro.



Instalación de filtro francés.



Concreto ciclópeo tramo 1.



Fundición losas de concreto tramo 1-



Fundición rampa de acceso y losas de concreto via San Isidro



Bordillos tramo vía San Isidro.



Instalación de formaleta para concreto ciclópeo vía Cosanza.



Instalación de concreto ciclópeo tramo 2 vía Cosanza.



Instalación y amarre de acero para losas y vigas riostras.



Instalación de acero para losas de concreto vía Cosanza.



Instalación de acero en sobreanchos.



Fundición de losas de concreto tramo 2 vía Cosanza.



Toma muestras de concreto para laboratorio.

LEIDY CAMILA ANTURI BOLAÑOS
ING. RESIDENTE DE OBRA
MP. 091037-0567108 CND

01 07 24

CONVENIO 3391 DE 2023

* Se quitan formaleta de los concretos ciclopeos instalados ayer.
* Corte de acero para losas de concreto
* Excavación para instalación de vigas riostras.
* Instalación de vigas riostras.
* Amarre e instalación de acero para bordillos.
* Amarre de parrillas para losas de concreto.

02 07 24

CONVENIO 3391 DE 2023

* Fundición de vigas riostras
* Fundición de losas de placa huella.
* Fundición canetas de placa huella.

03/07/24

CONVENIO 3391 DE 2023.

- Instalación de formaleta para concreto ciclópeo (18 m).
- Corte de acero para losas.
- Instalación y amarre de acero para losas.
- Fundición de concreto ciclópeo en los 18m ultimos.

DD MM AA
04 07 24

CONVENIO 3394 DE 2023

- Excavaciones manuales para instalación de vigas riostras.
- Instalación de vigas riostras, amarre de las mismas
- Instalación y amarre de acero de bordillo.
- Fundición de las placas de concreto.

Leidy A.

05 04 24

CONVENIO 3394 DE 2023

- Instalación de formaleta para la construcción del bordillo en el costado derecho de la vía.

- Corte de acero para la formaleta del bordillo.

- Fundición de bordillo en el margen derecho de la vía, sentido San Antonio - San Isidro.

06 07 24

CONVENIO 3394 DE 2023

- Se quita formaleta del costado que se fundió ayer, para ponerla en el otro margen de la vía.

* Se funde bordillo del costado izquierdo de la vía.

0807 24

CONVENIO 3394 DE 2023

* Se da inició con el otro tramo, por lo que con la madera adicional que se compró, se inicia la formaleteada para la instalación del concreto ciclópeo en esta parte.

* Se cortó la madera necesaria. y se niveló para evitar afectaciones visuales en la instalación del concreto ciclópeo.

Leidy

09 07 24

CONVENIO 3394 DE 2023

- Colocacion de piedra para el concreto ciclopeo.

- Excavación manual para instalacion de filtro al lado del canal construido.

- Fundición e instalacion de concreto ciclopeo en los 65 m aprox de placa Huella.

- Compactación de suelo (rana).

Leidy A.

DD MM AA
10 07 24

CONVENIO 3394 DE 2023

- Se quita formaleta del concreto ciclópeo fundido ayer.

- Se continúa con excavación manual para instalación de filtro en Geotextil.

- Instalación de formaleta para el restante de concreto ciclópeo. de la placa huella.

- Fundición de concreto ciclópeo.

Jesús Ayala.

11 07 24

CONVENIO 3394 DE 2023

- Corte de acero para losas de concreto.
- Instalación de acero para vigas.
- Instalación de acero para losas de concreto.

Leidy A.

DD MM AA
12 07 23

CONVENIO 3391 DE 2023

* Fundición de losas de concreto.
* Fundición vigas de amarre.
* Terminados de vigas y losas.
* Fundición cuneta.

Leidy A.

13 07 24.

CONVENIO 3394 DE 2023.

- Recolección de residuos.
- (Ordenar). Desformaleteear bordillos.
- Instalación de rejilla en sumidero de alcantarilla.

Lewis A.

17 09 24

CONVENIO 3394 DE 2023

- Fundición de losas de concreto.
- Fundición vigas de amarre.
- Instalación de acero para rampa.
- Fundición de ramper.

18 07 24

CONVENIO 33941 DE 2023

- Corte de acero para losas en sobre ancho.
- Amarre de acero de losas de concreto en sobreancho.
- Figurado de acero para bordillo.
- Amarre de acero (ganchos) para bordillo.
- Instalación de acero para bordillo.

Leisly A.

DD MM AA
19 07 24

CONVENIO 3391 DE 2023

* Amarre de acero para losas de concreto tramo vía Cosanza.
* Fundición de losas de concreto tramo hacia la vía Cosanza.
* Fundición vigas riostras tramo vía Cosanza en espacio de Sobreancho.
* Acabados de losas de concreto.

20 07 24

CONVENIO 3391 DE 2023

* Fundición losa de concreto en sobreancho de la vía que conduce de San Antonio a Cosanza.
* Corte de acero para formaletear bordillos.
* Formaleteada de bordillo (un solo lado).
* Fundición de bordillo formaleteado.

Leidy A.

20/07/21

CONVENIO 3394 DE 2023

- Desinstalar formaleta de bordillo fundido el dia anterior.
- Formaletear el otro bordillo del tramo que conduce hacia Cosanzea.
- Fundición de bordillo formaleteado.

Leidy A.

22 07 24

CONVENIO 3394 DE 2023.

* Se retira formaleta de bordillos fundidos el día sábado 20/07.
* Se realizan limpiezas.
* Se terminan los trabajos de obra.

Fernley A.

INFORME FINANCIERO DE LA VEREDA SAN ANTONIO DE TIMANA HUILA
CONVENIO SOLIDARIO 3394 DE 2023
JULIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	REF	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL PAGADO	
VALOR TOTAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**$ -**	0,00%

MATERIALES

DESCRIPCION	REF	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL PAGADO	
PAGO MADERA	FACT 177	1	$ 900.000	$ 900.000	
TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES				**$ 900.000,00**	0,48%

TRANSPORTE

DESCRIPCION	REF	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL PAGADO	
MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE	NESTOR PINEDA	1	$ 3.420.000,00	$ 3.385.800,00	
TRANSPORTE MATERIAL MIXTO Y BOTES	LUIS SANTANILLA		$ 290.000,00	$ 287.100,00	
TRANSPORTE MATERIAL MIXTO Y SUB-BASE	JEREMIAS TIMANA		$ 350.000,00	$ 3.465.000,00	
TRANSPORTE RANA	YAMITH SALAZAR	1	$ 80.000,00	$ 79.200,00	
TOTAL DE TRANSPORTE				**$ 7.217.100,00**	3,85%

MANO DE OBRA (GASTOS LABORALES)

DESCRIPCION	DESDE	HASTA		VALOR	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	1-jun-24	30-jun-24	$ 814.200	$ 806.400,00	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAESTRO DANIEL SCARPETTA GARCIA	17-jun-24	30-jun-24	$ 574.600	$ 574.600,00	
LEIDY CAMILA ANTURI PAGO SERVICIOS(ING RESIDENTE)	3-jun-24	2/07/2024	$ 3.500.000	$ 3.290.000,00	
DEIMAR REALPE OFICIAL	2-jul-24	15/07/2024	$ 1.001.000	$ 1.001.000,00	
MILTON ANDRES PAME COMO AYUDANTE	2-jul-24	15/07/2024	$ 635.667	$ 635.667,00	
DANIEL SCARPETTA GARCIA	2-jun-24	10/07/2024	$ 4.748.880	$ 4.748.880,00	
TOTAL DE PAGOS LABORALES				**$ 11.056.547,00**	5,90%

ALQUILER MAQUINARIA

YAMITH LEANDRO SALAZAR MUÑOZ	16-jun-24	20-jun-24	640.000,00	$ 614.400,00	
TOTAL GASTOS ALQUILER MAQUINARIA				**$ 614.400,00**	0,00

GASTOS VARIOS

				$ -	

DESCUENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	DESDE	HASTA		VALOR	
COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240702				$ 3.950,00	
NOTA DEBITO IVA				$ 750,00	
NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4*1000				$ 18,80	
DEBITO TRANSFERENCIA OFICINA CENTRO DE CANJE -RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$ 657,95	
NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4*1000				$ 2,63	
COMISION TRANSFERENCIA			13550	$ 162.600,00	
NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4*1000				$ 89.630,59	
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS				**$ 257.609,97**	

ADMINISTRACION

DESCRIPCION	REF	CANTIDAD		VALOR TOTAL PAGADO	
PAGO HONORARIOS CONTADOR	DILLI LORENA ROJAS	1	1400000	$ 1.260.000,00	
REEMBOLSO CAJA MENOR	ROSA YATE	2	400000	$ 400.000,00	
PAGO RETENCION PRACTICADAS EN EL MES DE JUNIO	DIAN		797.000	$ 797.000,00	
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS				**$ 2.457.000,00**	

PAGA
GASTOS DE COMITES

DESCRIPCION	REF	CANTIDAD	VALOR TOTAL PAGADO	
TOTAL DE GASTOS PAGA			**$ -**	

INGRESOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	DESDE	HASTA		VALOR	
REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES				$ 3.950,00	
DEVOLUCION IVA				$ 750,00	0%
REINTEGRO COMISION DE TRANSFERENCIAS			13550	$ 379.400,00	
DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000				$ 1.536,40	
RENDIMIENTO FINANCIERO JUNIO	1/06/2024	30/06/2024		$ 293,97	
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS				**$ 385.930,37**	12%

TOTAL DE GASTOS DEL PROYECTO				**$ 22.502.657**	

SALDO INICIAL		GASTOS DEL PROYECTO JUNIO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	
$	187.472.114,00	$ 22.502.656,97	$ 46.112.006,98	$ 23.995.280,38	DIFERENCIA
$	187.472.114,00				1,43
			SALDO BCO	23.995.278,95	
